



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

OF/ TRT/ SENG-035-16
Ao Ilmo. Sr. Diretor de Administração
Dr. Cristiano Barros Reis.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2017.

06
1622
R
M

ePAD 2.578/2017 - RELATÓRIO AFERIÇÃO 12Aª ETAPA – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Almenara na rua Mário José de Souza, nº 30 - CC 01/14 – 11/DEZ/14. Contrato 15SR009.

01. Trata-se de construção do Fórum da Justiça do Trabalho de Almenara/MG, na Rua Mário José de Souza nº 30, atualmente funcionando em imóvel adaptado de terceiros. O projeto arquitetônico foi desenvolvido tendo como norteador programa de padronização de postos de trabalhos e em conformidade com as orientações técnicas fornecidas pela Prefeitura local, prevendo ampliação futura para área de 2.825,10 m², num terreno com 1.610,10 m², de acordo com os projetos e levantamentos fornecidos e aprovados pelas repartições competentes do Município. O objeto desta licitação será a construção de uma 1ª etapa com área de 1.583,38 m² onde poderão funcionar a Vara de Trabalho, serviços auxiliares de apoio e garagem coberta.

02. A contratada foi a RIMUS CONSTRUTORA LTDA. - EPP, CNPJ nº 22.573.893/0001-05, estabelecida na Rua Tenente Garro, 394, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte - MG, Tel 3281-3332, responsável técnico Eng.º Ricardo Matta Musacchio, brasileiro, CREA 5.516/3, CPF nº 402.434.516-87, Cel. 98394-3374, ART 14201500000002536427, CEI 51.231.02379/78, Alvará 080/14, sendo a construtora responsável pela execução da totalidade dos serviços especificados, mesmo em caso de omissões na planilha de preços e nos projetos, entregando o Fórum nos termos especificados, pelo preço global de R\$ 1.606.386,77.

03. Através do e-pad 26041/16 foi solicitado um aditivo de prazo, com vencimento em 31 de dezembro de 2016 e também a alteração do cronograma dividindo-se as duas últimas etapas restantes em quatro novas, lembramos que o e-pad ainda está pendente de aprovação das autoridades competentes. Dessa forma, foi solicitado à fiscalização que a mesma visitasse a obra para conferência do andamento entre os dias 16 e 18 de janeiro.

05. Seguindo solicitação para encaminhamento da 12Aª etapa para análise das instâncias superiores e possível aprovação da referida etapa, e também da definição quanto à atitude a ser tomada em relação ao atraso de obra.

06. Dessa forma, encaminhamos o referido relatório de aferição:

SERVIÇOS TÉCNICOS

Não foram entregues até o momento os projetos de As Built, ficando para serem aferidos na 12Bª etapa.

MAQUINAS E FERRAMENTAS

Foi considerada a 12Aª etapa do cronograma, referente ao andaime e proteção para finalização da estrutura, chapiscos e rebocos em alturas elevadas, acumulando o total de 100%, uma vez que é o necessário para a 12Aª etapa, mas a empresa já havia realizado 100% do serviço de reboco externo na medição anterior, superando assim o percentual previsto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Foi considerado prestado a 12Aª etapa do cronograma, do total de 14 etapas de obra com relação a engenheiro, mestre de obras e vigia, representando um total 95,80% dos itens 04.01 a 04.03, conforme previsto no cronograma físico financeiro ajustado para a obra de empreitada global.

LIMPEZA DA OBRA

Foi considerada prestada a 12Aª etapa do cronograma do total de 14 etapas de obra com relação à limpeza geral da obra, representando um total 95,80% do item 05.01.

ALVENARIA

Foi concluído o serviço de alvenaria, cumprindo-se assim o necessário para liberação da 12Aª etapa.

ESQUADRIAS

Foi concluído o serviço de esquadrias cumprindo-se assim o necessário para a liberação da 12Aª etapa.

VIDROS E ESPELHOS

Foram instalados os vidros e espelhos necessários para a liberação da 12Aª etapa.

REVESTIMENTO

Foi concluído o serviço de revestimento cumprindo-se assim o necessário para a liberação da 12Aª etapa.

PINTURA

Foi concluído o serviço de pintura cumprindo-se assim o necessário para a liberação da 12Aª etapa.

PAVIMENTAÇÃO

Ficará pendente a parte do passeio de entrada por onde passará o cabeamento da CEMIG para ligação definitiva da rede elétrica, no mais, está pendente a pavimentação da escada de acesso às caixas d'água, mas o total realizado atinge o percentual necessário para a liberação da etapa.

ELÉTRICA E SPDA

Estão instalados os quadros com alimentadores, barramentos, disjuntores e conectores, malha de captação para o SPDA, infraestrutura para entrada de energia (exceto ramal de entrada) e dados (exceto entrada de dados a partir do poste da concessionária), foram instaladas tomadas de energia e interruptores, cumprindo assim o previsto para a etapa.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Ficará pendente a instalação da barra de apoio localizada próxima ao lavatório.

As porcentagens indicadas são a título de exemplo e proporcionalidade dos eventos previstos, sem entrar no mérito de medição, que não é o caso.

SERVIÇO	% AFERIÇÃO ANTERIOR	% EXECUTADA AFERIÇÃO ATUAL	% EXECUTADA ACUMULADA	% PREVISTA ACUMULADA 12Aª ETAPA
03.00-MAQ. E FERRAMENTAS	97,75%	2,25%	100%	100%
04.00- ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	91,60%	4,20%	95,80%	95,80%
05.00-LIMPEZA DA OBRA	91,60%	4,20%	95,80%	95,80%
10.00-ESQUADRIAS	100%	0%	100%	100,00%



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

07
1623
M

13.00-IMPERMEABILIZAÇÃO	94,60%	5,40%	100%	100%
17.00 - PINTURA	100%	0%	100%	100%
18.00-PAVIMENTAÇÃO	99,30%	0%	99,30%	99,30%
20-ELÉTRICA E SPDA	99,0%	0%	99,0%	99,0%
21-CABEAMENTO ESTRUTURADO	97,9%	0%	97,9%	97,9%
22.00-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	98,00%	16,86%	98,00%	98,9%

ETAPA	VALORES
12Aª ETAPA	R\$ 46.700,18
VALOR PAGO ACUMULADO	R\$ 1.624.473,28 (97%)

07. A aferição referente à 12Aª etapa foi realizada nos dias 16 e 18 de janeiro em visita do fiscal à obra acima referida, encaminhamos também o ofício de alteração da fiscalização da obra, uma vez que a partir de agora o fiscal da obra é o Sr. Gilberto de Castro Lustosa.

18. Assim submetemos à consideração os fatos para que as autoridades competentes analisem sobre a definição do pagamento da etapa e após encaminhe para a Secretaria de Controle Interno para análise do relatório de medição.


Gilberto de Castro Lustosa - Fiscal


Marcone Dimitrov Souza Cardoso - Fiscal Auxiliar


Eng.º Breno Dias Rodrigues - Engenheiro Eletricista



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

OF/ TRT/ SENG-034-16
Ao Ilmo. Sr. Diretor de Administração
Dr. Cristiano Barros Reis.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2017.

10
7
1624
me

ePAD 2.578/2017 - RELATÓRIO AFERIÇÃO 11Bª ETAPA – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Almenara na rua Mário José de Souza, nº 30 - CC 01/14 – 11/DEZ/14. Contrato 15SR009.

01. Trata-se de construção do Fórum da Justiça do Trabalho de Almenara/MG, na Rua Mário José de Souza nº 30, atualmente funcionando em imóvel adaptado de terceiros. O projeto arquitetônico foi desenvolvido tendo como norteador programa de padronização de postos de trabalhos e em conformidade com as orientações técnicas fornecidas pela Prefeitura local, prevendo ampliação futura para área de 2.825,10 m², num terreno com 1.610,10 m², de acordo com os projetos e levantamentos fornecidos e aprovados pelas repartições competentes do Município. O objeto desta licitação será a construção de uma 1ª etapa com área de 1.583,38 m² onde poderão funcionar a Vara de Trabalho, serviços auxiliares de apoio e garagem coberta.

02. A contratada foi a RIMUS CONSTRUTORA LTDA. - EPP, CNPJ nº 22.573.893/0001-05, estabelecida na Rua Tenente Garro, 394, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte - MG, Tel 3281-3332, responsável técnico Eng.º Ricardo Matta Musacchio, brasileiro, CREA 5.516/3, CPF nº 402.434.516-87, Cel. 98394-3374, ART 14201500000002536427, CEI 51.231.02379/78, Alvará 080/14, sendo a construtora responsável pela execução da totalidade dos serviços especificados, mesmo em caso de omissões na planilha de preços e nos projetos, entregando o Fórum nos termos especificados, pelo preço global de R\$ 1.606.386,77.

03. Através do e-pad 26041/16 foi solicitado um aditivo de prazo, com vencimento em 31 de dezembro de 2016 e também a alteração do cronograma dividindo-se as duas últimas etapas restantes em quatro novas, lembramos que o e-pad ainda está pendente de aprovação das autoridades competentes. Dessa forma, foi solicitado à fiscalização que a mesma visitasse a obra para conferência do andamento entre os dias 16 e 18 de janeiro.

05. Seguindo solicitação para encaminhamento da 11Bª etapa para análise das instâncias superiores e possível aprovação da referida etapa, e também da definição quanto à atitude a ser tomada em relação ao atraso de obra.

06. Dessa forma, encaminhamos o referido relatório de aferição:

MAQUINAS E FERRAMENTAS

Foi considerada a 11Bª etapa do cronograma, referente ao andaime e proteção para finalização da estrutura, chapiscos e rebocos em alturas elevadas, acumulando o total de 100%, uma vez que é o necessário para a 11Bª etapa, mas a empresa já havia realizado 100% do serviço de reboco externo na medição anterior, superando assim o percentual previsto.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Foi considerado prestado a 11Bª etapa do cronograma, do total de 14 etapas de obra com relação a engenheiro, mestre de obras e vigia, representando um total 91,60% dos itens 04.01 a 04.03, conforme previsto no cronograma físico financeiro ajustado para a obra de empreitada global.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

LIMPEZA DA OBRA

Foi considerada prestada a 11Bª etapa do cronograma do total de 14 etapas de obra com relação à limpeza geral da obra, representando um total 91,60% do item 05.01.

ALVENARIA

Foi concluído o serviço de alvenaria, cumprindo-se assim o necessário para liberação da 11Bª etapa.

ESQUADRIAS

Foi concluído o serviço de esquadrias cumprindo-se assim o necessário para a liberação da 11Bª etapa.

VIDROS E ESPELHOS

Foram instalados os vidros e espelhos necessários para a liberação da 11Bª etapa.

REVESTIMENTO

Foi concluído o serviço de revestimento cumprindo-se assim o necessário para a liberação da 11Bª etapa.

PINTURA

Foi concluído o serviço de pintura cumprindo-se assim o necessário para a liberação da 11Bª etapa.

PAVIMENTAÇÃO

Ficará pendente a parte do passeio de entrada por onde passará o cabeamento da CEMIG para ligação definitiva da rede elétrica, no mais, está pendente a pavimentação da escada de acesso às caixas d'água, mas o total realizado atinge o percentual necessário para a liberação da etapa.

ELÉTRICA E SPDA

Estão instalados os quadros com alimentadores, barramentos, disjuntores e conectores, malha de captação para o SPDA, infraestrutura para entrada de energia (exceto ramal de entrada) e dados (exceto entrada de dados a partir do poste da concessionária), foram instaladas tomadas de energia e interruptores, cumprindo assim o previsto para a etapa.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Ficará pendente a instalação da barra de apoio localizada próxima ao lavatório.

As porcentagens indicadas são a título de exemplo e proporcionalidade dos eventos previstos, sem entrar no mérito de medição, que não é o caso.

SERVIÇO	% AFERIÇÃO ANTERIOR	% EXECUTADA AFERIÇÃO ATUAL	% EXECUTADA ACUMULADA	% PREVISTA ACUMULADA 11Bª ETAPA
03.00-MAQ. E FERRAMENTAS	97,75%	2,25%	100%	100%
04.00- ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	87,40%	4,20%	91,60%	91,60%
05.00-LIMPEZA DA OBRA	87,40%	4,20%	91,60%	91,60%
10.00-ESQUADRIAS	98,31%	1,69%	100%	100,00%
14.00-REVESTIMENTO	81,8%	18,2%	100%	100%
17.00 - PINTURA	63,90%	36,10%	100%	100%
18.00-PAVIMENTAÇÃO	99,30%	0%	99,30%	99,30%
20-ELÉTRICA E SPDA	96,68%	2,32%	99,00%	97,90%
21-CABEAMENTO ESTRUTURADO	77,65%	20,25%	97,90%	95,80%



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

H
P
1625
m

22.00-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	81,14%	16,86%	98,00%	82,70%
---	--------	--------	--------	--------

ETAPA	VALORES
11Bª ETAPA	R\$ 62.017,24
VALOR PAGO ACUMULADO	R\$ 1.507.622,71 (94%)

07. A aferição referente à 11Bª etapa foi realizada nos dias 16 e 18 de janeiro em visita do fiscal à obra acima referida, encaminhamos também o ofício de alteração da fiscalização da obra, uma vez que a partir de agora o fiscal da obra é o Sr. Gilberto de Castro Lustosa.

18. Assim submetemos à consideração os fatos para que as autoridades competentes analisem sobre a definição do pagamento da etapa e após encaminhe para a Secretaria de Controle Interno para análise do relatório de medição.


Gilberto de Castro Lustosa - Fiscal


Marcone Dimitrov Souza Cardoso - Fiscal Auxiliar


Eng.º Breno Dias Rodrigues - Engenheiro Eletricista

12
2
16/01/2017

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/7

Emitida em:
30/01/2017 às 10:25:51

Competência:
20/01/2017

Código de Verificação:
11738c2b



RIMUS CONSTRUTORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 22.573.893/0001-05

RUA TENENTE GARRO, 394, Santa Efigênia - Cep: 30240-360

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0349094/001-8

MG

Email: rimus@rimus.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.298.583/0001-41

Inscrição Municipal: 0186045/001-3

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 225, FUNCIONÁRIOS - Cep: 30112-020

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2017/1

Discriminação do(s) Serviço(s)

11ª-B MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DO TRABALHO EM ALMENARA/MG, EM TERRENO COM 1.640,10M2, CONFORME CONTRATO:11371/2015, SITUADO NA RUA MARIO JOSE DE SOUZA Nº30 BAIRRO:PARQUE SÃO JOÃO EM ALMENARA/MG - RETENÇÕES 5,85% - PIS:R\$403,11; COFINS:R\$1.860,52; IR:R\$744,21; CSLL:R\$620,17 - RETENÇÕES DE ISS SOMENTE SOBRE 50% MÃO DE OBRA R\$31.008,62 - BANCO:756 - SICOOB CREDIFIEMG - AGÊNCIA:3330 CONTA:704-8 - RIMUS CONSTRUTORA LTDA.

Construção Civil: Matrícula CEI: 51.231.02379/78 ART: 2536427

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/02-88 / Construção de edificações comerciais de qualquer tipo

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3101706 / Almenara

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: **R\$ 62.017,24**

Valor dos serviços: **R\$ 62.017,24**

(-) Descontos: **R\$ 0,00**

(-) Deduções: **R\$ 31.008,62**

(-) Retenções Federais: **R\$ 3.628,01**

(-) Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00**

(-) ISS Retido na Fonte: **R\$ 1.550,43**

(=) Base de Cálculo: **R\$ 31.008,62**

Valor Líquido: **R\$ 56.838,80**

(x) Alíquota: **5%**

(=) Valor do ISS: **R\$ 1.550,43**

Retenções Federais:

PIS: R\$ 403,11 COFINS: R\$ 1.860,52 IR: R\$ 744,21 CSLL: R\$ 620,17



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



"Declaro que foi prestado o serviço a que se refere e apresenta documento."
 Em, 31/01/2017

 Gilberto de Castro Luciosa
 Diretoria de Engenharia
 TRT - 3ª Região

1627
M
13
7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/8

Emitida em:
30/01/2017 às 10:31:10

Competência:
20/01/2017

Código de Verificação:
4659c76c



RIMUS CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CPF/CNPJ: 22.573.893/0001-05 Inscrição Municipal: 0349094/001-8
 RUA TENENTE GARRO, 394, Santa Efigênia - Cep: 30240-360
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email: rimus@rimus.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.298.583/0001-41 Inscrição Municipal: 0186045/001-3
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIAO
 AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 225, FUNCIONÁRIOS - Cep: 30112-020
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2017/2

Discriminação do(s) Serviço(s)

REAJUSTE 11ª-B MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DO TRABALHO EM ALMENARA/MG, EM TERRENO COM 1.640,10M2, CONFORME CONTRATO:11371/2015, SITUADO NA RUA MARIO JOSE DE SOUZA Nº30 BAIRRO:PARQUE SÃO JOÃO EM ALMENARA/MG - RETENÇÕES 5,85% - PIS:R\$30,16; COFINS:R\$139,19; IR:R\$55,67; CSLL:R\$46,40 - RETENÇÕES DE ISS SOMENTE SOBRE 50% MÃO DE OBRA R\$2.319,76 - BANCO:756 - SICOOB CREDIFIEMG - AGÊNCIA:3330 CONTA:704-8 - RIMUS CONSTRUTORA LTDA.

Construção Civil: Matrícula CEI: 51.231.02379/78 ART: 2536427

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/02-88 / Construção de edificações comerciais de qualquer tipo

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3101706 / Almenara

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 4.639,51	Valor dos serviços:	R\$ 4.639,51
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 2.319,76
(-) Retenções Federais:	R\$ 271,42	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 115,99	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.319,75
Valor Líquido:	R\$ 4.252,10	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 115,99

Retenções Federais:

PIS: R\$ 30,16 COFINS: R\$ 139,19 IR: R\$ 55,67 CSLL: R\$ 46,40



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



"Declaro que foi prestado o serviço a que se refere o presente documento."
 Em, 31/01/2017
 Gilberto de Castro Lustosa
 Diretoria de Engenharia
 TRT - 3ª Região

1628
1628
1628

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/9

Emitida em:
30/01/2017 às 10:36:49

Competência:
20/01/2017

Código de Verificação:
7b4002ad



RIMUS CONSTRUTORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 22.573.893/0001-05

RUA TENENTE GARRO, 394, Santa Efigênia - Cep: 30240-360

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0349094/001-8

MG

Email: rimus@rimus.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.298.583/0001-41

Inscrição Municipal: 0186045/001-3

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIAO

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 225, FUNCIONÁRIOS - Cep: 30112-020

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2017/3

Discriminação do(s) Serviço(s)

12ª-A MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DO TRABALHO EM ALMENARA/MG, EM TERRENO COM 1.640,10M2, CONFORME CONTRATO:11371/2015, SITUADO NA RUA MARIO JOSE DE SOUZA Nº30 BAIRRO:PARQUE SÃO JOÃO EM ALMENARA/MG - RETENÇÕES 5,85% - PIS:R\$303,55; COFINS:R\$1.401,01; IR:R\$560,40; CSLL:R\$467,00 - RETENÇÕES DE ISS SOMENTE SOBRE 50% MÃO DE OBRA R\$23.350,09 - BANCO:756 - SICOOB CREDIFIEMG - AGÊNCIA:3330 CONTA:704-8 - RIMUS CONSTRUTORA LTDA.

Construção Civil: Matrícula CEI: 51.231.02379/78 ART: 2536427

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/02-88 / Construção de edificações comerciais de qualquer tipo

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3101706 / Almenara

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: **R\$ 46.700,18**

Valor dos serviços: **R\$ 46.700,18**

(-) Descontos: **R\$ 0,00**

(-) Deduções: **R\$ 23.350,09**

(-) Retenções Federais: **R\$ 2.731,96**

(-) Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00**

(-) ISS Retido na Fonte: **R\$ 1.167,50**

(=) Base de Cálculo: **R\$ 23.350,09**

Valor Líquido: **R\$ 42.800,72**

(x) Alíquota: **5%**

(=)Valor do ISS: **R\$ 1.167,50**

Retenções Federais:

PIS: R\$ 303,55 COFINS: R\$ 1.401,01 IR: R\$ 560,40 CSLL: R\$ 467,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



"Declaro que foi prestado o serviço a que se refere o presente documento."
 Em, 31/01/2017.

 Antônio Faria
 Diretor do Centro Listado
 Diretoria de Engenharia
 TRT - 3ª Região

1629
2017
R

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/10

Emitida em:
30/01/2017 às 10:41:01

Competência:
20/01/2017

Código de Verificação:
P7091a43



RIMUS CONSTRUTORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 22.573.893/0001-05

RUA TENENTE GARRO, 394, Santa Efigênia - Cep: 30240-360

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0349094/001-8

MG

Email: rimus@rimus.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.298.583/0001-41

Inscrição Municipal: 0186045/001-3

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIAO

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 225, FUNCIONÁRIOS - Cep: 30112-020

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2017/4

Discriminação do(s) Serviço(s)

REAJUSTE 12ª-A MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DO TRABALHO EM ALMENARA/MG, EM TERRENO COM 1.640,10M2, CONFORME CONTRATO:11371/2015, SITUADO NA RUA MARIO JOSE DE SOUZA Nº30 BAIRRO:PARQUE SÃO JOÃO EM ALMENARA/MG - RETENÇÕES 5,85% - PIS:R\$22,71; COFINS:R\$104,81; IR:R\$41,92; CSLL:R\$34,94 - RETENÇÕES DE ISS SOMENTE SOBRE 50% MÃO DE OBRA R\$1.746,82 - BANCO:756 - SICOOB CREDIFIEMG - AGÊNCIA:3330 CONTA:704-8 - RIMUS CONSTRUTORA LTDA.

Construção Civil: Matrícula CEI: 51.231.02379/78 ART: 2536427

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/02-88 / Construção de edificações comerciais de qualquer tipo

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3101706 / Almenara

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 3.493,64	Valor dos serviços:	R\$ 3.493,64
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 1.746,82
(-) Retenções Federais:	R\$ 204,38	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 87,34	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.746,82
Valor Líquido:	R\$ 3.201,92	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 87,34

Retenções Federais:

PIS: R\$ 22,71 COFINS: R\$ 104,81 IR: R\$ 41,92 CSLL: R\$ 34,94



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Declaro que foi prestado o serviço a quo se refere e apresento documento.
 Em, 31/01/2017

 João de Castro Lustosa
 Diretoria de Engenharia
 TRT - 3ª Região


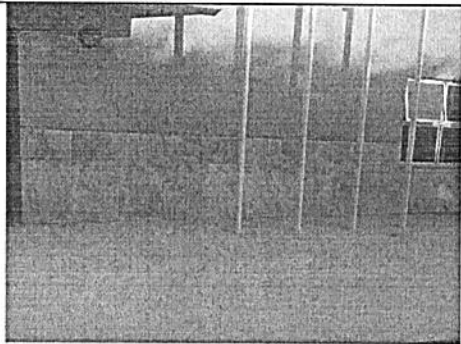
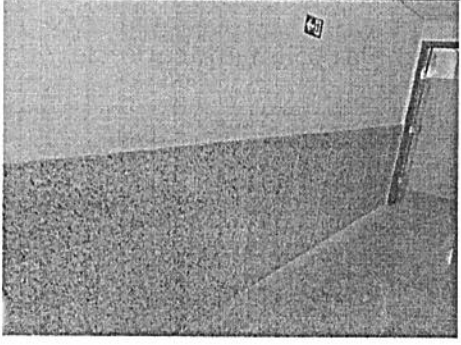
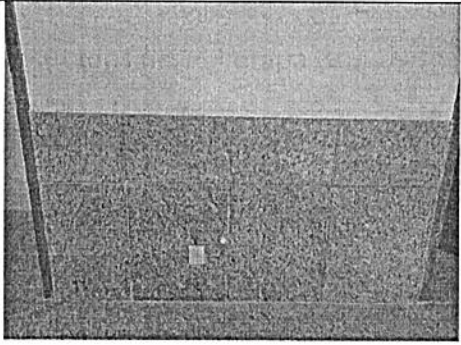


1630
Ruzh
P

OBRA:
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO ALMENARA/MG

DATA:
DEZEMBRO/2016

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

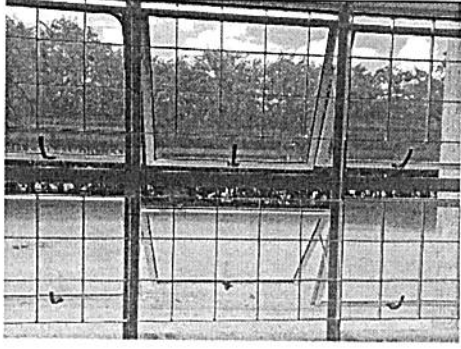
Segue relatório fotográfico referente aos serviços executados na 11ª etapa B.

	
<p>Revestimento Externo</p>	<p>Revestimento Externo</p>
	
<p>Revestimento Interno</p>	<p>Revestimento Interno</p>
	
<p>Pintura</p>	<p>Pintura</p>



25

163/04 15/2

	
Esquadria	

[Handwritten signature]

