

1. Documento: 922-2019-4

1.1. Dados do Protocolo

Número: 922/2019

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SECOI - Secretaria de Controle Interno

Data de Entrada: 11/01/2019

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: HITALO

Data de Inclusão: 02/04/2019 11:19

Descrição: Projeto Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002

1.2. Dados do Documento

Número: 922-2019-4

Nome: Cronograma - Projeto Governança em Auditoria Interna V3.pdf

Incluído Por: Secretaria de Controle Interno

Cadastrado pelo Usuário: HITALO

Data de Inclusão: 02/04/2019 11:18





























































Descrição: Cronograma - Projeto Governança em Auditoria Interna

1.3. Assinaturas no documento



















Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Hitalo Fernandes Mine Diniz	Login e Senha	02/04/2019 11:18





























































Documento Gerado em 02/04/2019 16:39:04

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração
0			0	Cronograma - Projeto Governança em Auditoria Interna V3		30%	224 dias
1			1	NORMA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA		40%	140 dias
2			1.1	NORMA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO TRT-MG		25%	140 dias
3			1.1.1	LEVANTAMENTO DE NORMAS DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DE		100%	5 dias
4			1.1.2	ELABORAÇÃO DA MINUTA DA NORMA		74%	34 dias
5			1.1.3	APROVAÇÃO DA MINUTA DA NORMA PELO SECRETÁRIO DE CONTROLE		0%	5 dias
6			1.1.4	REVISÃO DA MINUTA DA NORMA PELA SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO		0%	11 dias
7			1.1.5	APROVAÇÃO DA MINUTA DA NORMA PELO PRESIDENTE DO TRT-MG		0%	41 dias
8			1.1.6	PUBLICAÇÃO DA NORMA PELO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO		0%	23 dias
9			1.1.7	NORMA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA PUBLICADA		0%	0 dias
10			1.2	VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE OUTROS ÓRGÃOS		100%	30 dias
11			1.2.1	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VISITAS TÉCNICAS		100%	10 dias
12			1.2.2	OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS/PROCEDIMENTOS DA ATIVIDADE		100%	20 dias
13			1.2.3	VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS		100%	0 dias
14			2	MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO		33%	161 dias
15			2.1	MAPEAMENTO DO PROCESSO: AUDITORIA		38%	127 dias
16			2.1.1	LEVANTAMENTO DE PROCESSOS DE AUDITORIA DE ÓRGÃOS DE		100%	35 dias
17			2.1.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		38%	34 dias
18			2.1.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		38%	34 dias
19			2.1.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		38%	34 dias
20			2.1.5	ELABORAÇÃO DO MANUAL DA ATIVIDADE DE AUDITORIA		16%	82 dias
21			2.1.6	TREINAMENTO DOS AUDITORES INTERNOS PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO		0%	10 dias



























































Projeto: Cronograma - Projeto
Data: Ter 02/04/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração
22			2.1.7	PROCESSO DE AUDITORIA MAPEADO		0%	0 dias
23			2.2	MAPEAMENTO DO PROCESSO: ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AUDITORIA		0%	83 dias
24			2.2.1	LEVANTAMENTO DE PROCESSOS E TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE		0%	15 dias
25			2.2.2	DEFINIÇÃO DOS FLUXOS DOS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL		0%	19 dias
26			2.2.3	DEFINIÇÃO DAS TÉCNICAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO		0%	34 dias
27			2.2.4	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		0%	34 dias
28			2.2.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DOS		0%	34 dias
29			2.2.6	PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AUDITORIA MAPEADO		0%	0 dias
30			2.3	MAPEAMENTO DO PROCESSO: ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL		40%	82 dias
31			2.3.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
32			2.3.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		41%	32 dias
33			2.3.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		41%	32 dias
34			2.3.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		41%	32 dias
35			2.3.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		0%	31 dias
36			2.3.6	PROCESSO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL MAPEADO		0%	0 dias
37			2.4	MAPEAMENTO DO PROCESSO: RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO		32%	116 dias
38			2.4.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
39			2.4.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		41%	32 dias
40			2.4.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		41%	32 dias
41			2.4.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		41%	32 dias
42			2.4.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		0%	65 dias
43			2.4.6	PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO		0%	0 dias































Projeto: Cronograma - Projeto Data: Ter 02/04/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração
44			2.5	MAPEAMENTO DO PROCESSO: PARECERES NAS OBRAS E SERVIÇOS DE		40%	82 dias
45			2.5.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
46			2.5.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		41%	32 dias
47			2.5.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		41%	32 dias
48			2.5.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		41%	32 dias
49			2.5.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		0%	31 dias
50			2.5.6	PROCESSO DE ELABORAÇÃO PARECERES NAS OBRAS E SERVIÇOS DE		0%	0 dias
51			2.6	MAPEAMENTO DO PROCESSO: MONITORAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS		40%	82 dias
52			2.6.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
53			2.6.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		41%	32 dias
54			2.6.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		41%	32 dias
55			2.6.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		41%	32 dias
56			2.6.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		0%	31 dias
57			2.6.6	PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE		0%	0 dias
58			2.7	MAPEAMENTO DO PROCESSO: ORÇAMENTO E FINANÇAS		40%	82 dias
59			2.7.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
60			2.7.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		41%	32 dias
61			2.7.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		41%	32 dias
62			2.7.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		41%	32 dias
63			2.7.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		0%	31 dias
64			2.7.6	PROCESSO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS MAPEADO		0%	0 dias
65			3	PLANO DE CAPACITAÇÃO		0%	82 dias

Projeto: Cronograma - Projeto Data: Ter 02/04/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração
66			3.1	PLANO DE CAPACITAÇÃO		0%	82 dias
67			3.1.1	DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE		0%	19 dias
68			3.1.2	LEVANTAMENTO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO		0%	15 dias
69			3.1.3	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		0%	10 dias
70			3.1.4	APRESENTAÇÃO DO PLANO PARA A ESCOLA JUDICIAL		0%	38 dias
71			3.1.5	METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DEFINIDA		0%	0 dias
72			4	SITE SETORIAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NO PORTAL INSTITUCIONAL		0%	82 dias
73			4.1	SITE DA SECOI NO PORTAL INSTITUCIONAL DO TRT-MG		0%	82 dias
74			4.1.1	DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E DAS INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS NO		0%	19 dias
75			4.1.2	CRIAÇÃO DA ESTRUTURA DO SITE DA SECOI NO PORTAL INSTITUCIONAL DO		0%	49 dias
76			4.1.3	DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE DA SECOI		0%	14 dias
77			4.1.4	SITE SETORIAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NO PORTAL		0%	0 dias

Projeto: Cronograma - Projeto Data: Ter 02/04/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Gantt Chart					
				In	janeiro	In	In	Mai	In
Seg 07/01/19	Sex 29/11/19			[Task bar]					
Seg 07/01/19	Qua 31/07/19			[Task bar]					
Seg 07/01/19	Qua 31/07/19			[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 11/01/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz	[Task bar]					
Qui 07/02/19	Sex 29/03/19	3	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz	[Task bar]					
Seg 01/04/19	Sex 05/04/19	4	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa	[Task bar]					
Qui 11/04/19	Ter 30/04/19	5	SEDOC - Secretaria de Documentação	[Task bar]					
Qui 02/05/19	Sex 28/06/19	6	Presidência - Marcus Moura Ferreira	[Task bar]					
Seg 01/07/19	Qua 31/07/19	7	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa	[Task bar]					
Qua 31/07/19	Qua 31/07/19	8		[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 15/02/19			[Task bar]					
Seg 04/02/19	Sex 15/02/19		SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz;SECOI - Olavo de Oliveira Dantas	[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 01/02/19		SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz;SECOI - Olavo de Oliveira Dantas	[Task bar]					
Sex 01/02/19	Sex 01/02/19	12		[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 30/08/19			[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 12/07/19			[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz	[Task bar]					
Seg 25/02/19	Ter 16/04/19	16	EPT - Escritório de Processos de Trabalho;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz	[Task bar]					
Seg 25/02/19	Ter 16/04/19	16	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz	[Task bar]					
Seg 25/02/19	Ter 16/04/19	16	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz	[Task bar]					
Seg 25/02/19	Sex 28/06/19	16	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz	[Task bar]					
Seg 01/07/19	Sex 12/07/19	20	SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz	[Task bar]					

Projeto: Cronograma - Projeto Data: Ter 02/04/19


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Gantt Chart (janeiro, In, Mai, In)			
Sex 12/07/19	Sex 12/07/19	21			12/07		
Seg 06/05/19	Sex 30/08/19						
Seg 06/05/19	Sex 24/05/19	20	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino				
Seg 27/05/19	Sex 21/06/19	24	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino				
Seg 27/05/19	Sex 12/07/19	24	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino				
Seg 27/05/19	Sex 12/07/19	24	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino				
Seg 15/07/19	Sex 30/08/19	27	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino				
Sex 30/08/19	Sex 30/08/19	28			30/08		
Ter 29/01/19	Sex 31/05/19						
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	31	SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	31	SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	31	SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Hitalo Fernandes Mino;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Seg 15/04/19	Sex 31/05/19	34	SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Sex 31/05/19	Sex 31/05/19	35			31/05		
Ter 29/01/19	Sex 19/07/19						
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	38	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	38	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	38	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Seg 15/04/19	Sex 19/07/19	41	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa				
Sex 19/07/19	Sex 19/07/19	42			19/07		

Projeto: Cronograma - Projeto Data: Ter 02/04/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	In	janeiro	In	In	Mai	In
Ter 29/01/19	Sex 31/05/19								
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	45	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	45	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	45	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 15/04/19	Sex 31/05/19	48	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Sex 31/05/19	Sex 31/05/19	49	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Ter 29/01/19	Sex 31/05/19								
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	52	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	52	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	52	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 15/04/19	Sex 31/05/19	55	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Sex 31/05/19	Sex 31/05/19	56	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Ter 29/01/19	Sex 31/05/19								
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	59	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	59	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	59	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 15/04/19	Sex 31/05/19	62	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Sex 31/05/19	Sex 31/05/19	63	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 05/08/19	Sex 29/11/19								

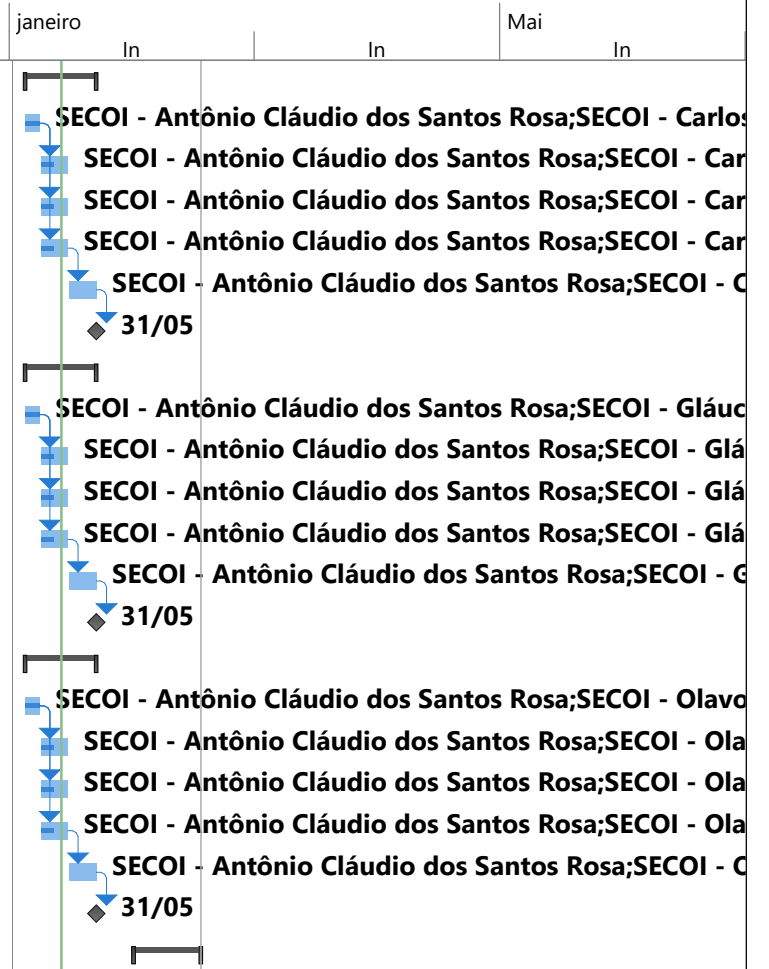

Projeto: Cronograma - Projeto Data: Ter 02/04/19	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	In	janeiro	In	In	Mai	In
Seg 05/08/19	Sex 29/11/19								
Seg 05/08/19	Sex 30/08/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz						
Seg 02/09/19	Sex 20/09/19	67	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 23/09/19	Sex 04/10/19	68	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 07/10/19	Sex 29/11/19	69	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Sex 29/11/19	Sex 29/11/19	70							
Seg 05/08/19	Sex 29/11/19								
Seg 05/08/19	Sex 29/11/19								
Seg 05/08/19	Sex 30/08/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz;SECOM - Secretaria de Comunicação						
Seg 02/09/19	Sex 08/11/19	74	SECOM - Secretaria de Comunicação						
Seg 11/11/19	Sex 29/11/19	75	SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz						
Sex 29/11/19	Sex 29/11/19	76							



Projeto: Cronograma - Projeto Data: Ter 02/04/19	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			
