






















































































Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término	Q	Q	S
0			0	AMBIENTE DA GENTE		100%	581 dias	Sex 18/07/14	Qua 30/11/16			
1			1	Estruturação da Seção de Gestão Socioambiental		100%	264 dias	Sex 21/11/14	Sex 18/12/15			
2			1.1	Levantar informações sobre estruturas similares em		100%	3 dias	Sex 21/11/14	Ter 25/11/14			
3			1.2	Articular com outros setores do Tribunal		100%	17 dias	Qua 26/11/14	Qui 18/12/14			
4			1.3	Propor estrutura e atribuições da unidade		100%	60 dias	Sex 19/12/14	Seg 23/03/15			
5			1.4	Pré-aprovar a estrutura e atribuições da unidade		100%	57 dias	Ter 24/03/15	Qui 18/06/15			
6			1.5	Aprovar e encaminhar para publicação a resolução que		100%	7 dias	Sex 19/06/15	Seg 29/06/15			
7			1.6	Estruturar seção com base na publicação		100%	120 dias	Ter 30/06/15	Sex 18/12/15			
8			1.7	SEÇÃO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL ESTRUTURADA		100%	0 dias	Sex 18/12/15	Sex 18/12/15			
9			2	Definição e implementação dos indicadores		100%	338 dias	Seg 27/10/14	Qua 16/03/16			
10			2.1	Indicadores Estratégicos		100%	135 dias	Seg 27/10/14	Qua 20/05/15			
11			2.1.1	Selecionar itens de consumo para medição		100%	13 dias	Seg 27/10/14	Qui 13/11/14			
12			2.1.2	Verificar viabilidade de medição		100%	5 dias	Sex 14/11/14	Qui 20/11/14			
13			2.1.3	Montar ficha descritiva do indicador		100%	10 dias	Sex 21/11/14	Qui 04/12/14			
14			2.1.4	Validar ficha do indicador		100%	64 dias	Sex 05/12/14	Sex 13/03/15			
15			2.1.5	Definir responsáveis pela aferição de indicador e		100%	4 dias	Seg 16/03/15	Qui 19/03/15			
16			2.1.6	Capacitar responsáveis pela aferição de indicador e		100%	39 dias	Sex 20/03/15	Qua 20/05/15			
17			2.1.7	Inserir informações iniciais no SIGEST		100%	1 dia	Qua 20/05/15	Qua 20/05/15			
18			2.2	Indicadores do PLS		100%	184 dias	Qui 18/06/15	Qua 16/03/16			
19			2.2.1	Verificar viabilidade de medição		100%	50 dias	Qui 18/06/15	Qua 26/08/15			
20			2.2.2	Definir responsáveis pela aferição de indicador e		100%	1 dia	Qui 27/08/15	Qui 27/08/15			
21			2.2.3	Consolidar informações de medição para inserção		100%	10 dias	Sex 28/08/15	Sex 11/09/15			


























































Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término	Q	Q	S
22			2.2.4	Validar fórmula de cálculo do indicador		100%	10 dias	Seg 14/09/15	Sex 25/09/15			
23			2.2.5	Formatar Mapa de Indicadores		100%	10 dias	Seg 28/09/15	Sex 09/10/15			
24			2.2.6	Capacitar responsáveis pela aferição de indicador e		0%	73 dias	Ter 13/10/15	Sex 29/01/16			
25			2.2.7	Inserir informações iniciais no SIGEST		100%	30 dias	Seg 01/02/16	Qua 16/03/16			
26			2.3	INDICADORES DEFINIDOS E IMPLEMENTADOS		100%	0 dias	Qua 16/03/16	Qua 16/03/16			
27			3	Realização de eventos nas cidades-pólo do Estado, em co		100%	144 dias	Seg 02/03/15	Seg 28/09/15			
28			3.1	Negociar com a Secretaria de Gestão Estratégica a		100%	10 dias	Seg 02/03/15	Sex 13/03/15			
29			3.2	Agendar o cronograma junto a Secretaria de Gestão		100%	51 dias	Seg 16/03/15	Seg 01/06/15			
30			3.3	Elaborar a apresentação		100%	3 dias	Ter 02/06/15	Sex 05/06/15			
31			3.4	Realizar os eventos nas cidades-pólo do Estado		100%	80 dias	Seg 08/06/15	Seg 28/09/15			
32			3.5	EVENTOS REALIZADOS		100%	0 dias	Seg 02/03/15	Seg 02/03/15			
33			4	Publicação de Instrução Normativa criando a Comissão		100%	113 dias	Seg 02/03/15	Qui 13/08/15			
34			4.1	Elaborar a minuta da Instrução Normativa		100%	8 dias	Qua 22/04/15	Seg 04/05/15			
35			4.2	Aprovar a minuta na comissão		100%	1 dia	Ter 05/05/15	Ter 05/05/15			
36			4.3	Encaminhar para revisão da Diretoria de		100%	9 dias	Qua 06/05/15	Seg 18/05/15			
37			4.4	Adequar a minuta às recomendações da DDNLJ		100%	49 dias	Ter 19/05/15	Seg 27/07/15			
38			4.5	Encaminhar para assinatura da Presidência		100%	1 dia	Seg 27/07/15	Seg 27/07/15			
39			4.6	Aguardar publicação		100%	13 dias	Ter 28/07/15	Qui 13/08/15			
40			4.7	INSTRUÇÃO NORMATIVA PUBLICADA		100%	0 dias	Seg 02/03/15	Seg 02/03/15			
41			5	Elaboração do Plano de Logística Sustentável		100%	304 dias	Sex 18/07/14	Qui 08/10/15			
42			5.1	Elaborar minuta do PLS com base nas contribuições		100%	193 dias	Sex 18/07/14	Seg 04/05/15			
43			5.2	Submeter a minuta à comissão e receber as suas		100%	1 dia	Ter 05/05/15	Ter 05/05/15			


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término	Q	Q	S
44			5.3	Agendar reunião da Comissão Permanente de		100%	8 dias	Seg 17/08/15	Qua 26/08/15			
45			5.4	Definir responsáveis pela aferição dos indicadores		100%	1 dia	Qui 27/08/15	Qui 27/08/15			
46			5.5	Elaborar planos de ação das ações que compõem o PLS		100%	10 dias	Sex 28/08/15	Sex 11/09/15			
47			5.6	Consolidar o documento final		100%	8 dias	Seg 14/09/15	Qua 23/09/15			
48			5.7	Aprovar o documento final na CPRSA		100%	1 dia	Qui 24/09/15	Qui 24/09/15			
49			5.8	Encaminhar documento para aprovação superior		100%	5 dias	Sex 25/09/15	Qui 01/10/15			
50			5.9	Aguardar a publicação		100%	5 dias	Sex 02/10/15	Qui 08/10/15			
51			5.10	PLS PUBLICADO		100%	0 dias	Qui 08/10/15	Qui 08/10/15			
52			6	Realização da Semana Conjunta do Trabalho Seguro e		0%	327 dias	Qui 12/02/15	Sex 17/06/16			
53			6.1	Agendar reunião com o Desembargador gestor do		0%	160 dias	Qui 12/02/15	Qua 07/10/15			
54			6.2	Agendar data do evento		0%	10 dias	Qui 08/10/15	Qui 22/10/15			
55			6.3	Coletar orçamentos		0%	39 dias	Sex 23/10/15	Sex 18/12/15			
56			6.4	Elaborar proposição para realização do evento		0%	5 dias	Seg 11/01/16	Sex 15/01/16			
57			6.5	Submeter a proposição para aprovação		0%	1 dia	Seg 18/01/16	Seg 18/01/16			
58			6.6	Aguardar aprovação		0%	20 dias	Ter 19/01/16	Qui 18/02/16			
59			6.7	Preparar material para divulgação do evento		0%	20 dias	Sex 19/02/16	Qui 17/03/16			
60			6.8	Divulgar o evento		0%	50 dias	Sex 18/03/16	Qui 02/06/16			
61			6.9	Receber as inscrições para o evento		0%	50 dias	Sex 18/03/16	Qui 02/06/16			
62			6.10	Preparar material para o evento		0%	50 dias	Sex 18/03/16	Qui 02/06/16			
63			6.11	Realizar o evento conjunto		0%	5 dias	Seg 13/06/16	Sex 17/06/16			
64			6.12	SEMANA CONJUNTA REALIZADA		0%	0 dias	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16			
65			7	Realização da consulta pública sobre a minuta da		100%	109 dias	Ter 01/03/16	Sex 05/08/16			


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término	Q	Q	S
66			7.1	Agentes Multiplicadores Socioambientais		100%	66 dias	Ter 01/03/16	Ter 07/06/16			
67			7.1.1	Elaborar material de divulgação sobre os Agentes		100%	35 dias	Ter 01/03/16	Sex 22/04/16			
68			7.1.2	Elaborar comunicado oficial convocando os		100%	1 dia	Seg 25/04/16	Seg 25/04/16			
69			7.1.3	Receber as manifestações dos interessados		100%	10 dias	Ter 26/04/16	Seg 09/05/16			
70			7.1.4	Nomear os Agentes Socioambientais		100%	10 dias	Ter 10/05/16	Seg 23/05/16			
71			7.1.5	Divulgar os nomes dos Agentes Socioambientais		100%	1 dia	Ter 24/05/16	Ter 24/05/16			
72			7.1.6	Criar fórum permanente de discussão dos Agentes		100%	2 dias	Qua 25/05/16	Sex 27/05/16			
73			7.1.7	Convocar os Agentes Socioambientais para curso		100%	10 dias	Ter 24/05/16	Ter 07/06/16			
74			7.1.8	AGENTES MULTIPLICADORES SOCIOAMBIENTAIS		100%	0 dias	Ter 07/06/16	Ter 07/06/16			
75			7.2	Minuta Política de Responsabilidade Socioambiental		100%	109 dias	Ter 01/03/16	Sex 05/08/16			
76			7.2.1	Levantar as ações de responsabilidade		100%	19 dias	Ter 01/03/16	Qua 30/03/16			
77			7.2.2	Elaborar a minuta da Política de RSA		100%	45 dias	Qui 31/03/16	Sex 03/06/16			
78			7.2.3	Realizar a consulta pública		100%	30 dias	Seg 06/06/16	Sex 15/07/16			
79			7.2.4	Elaborar as adequações		100%	15 dias	Seg 18/07/16	Sex 05/08/16			
80			7.3	MINUTA DA POLÍTICA RSA CONSOLIDADA		100%	0 dias	Sex 05/08/16	Sex 05/08/16			
81			8	Publicação da Política de RSA do TRT3		100%	76 dias	Seg 08/08/16	Qua 30/11/16			
82			8.1	Encaminhar minuta da Política para aprovação		100%	17 dias	Seg 08/08/16	Qua 31/08/16			
83			8.2	Aguardar publicação		100%	59 dias	Qui 01/09/16	Qua 30/11/16			
84			8.3	POLÍTICA DE RSA PUBLICADA		100%	0 dias	Qua 30/11/16	Qua 30/11/16			


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

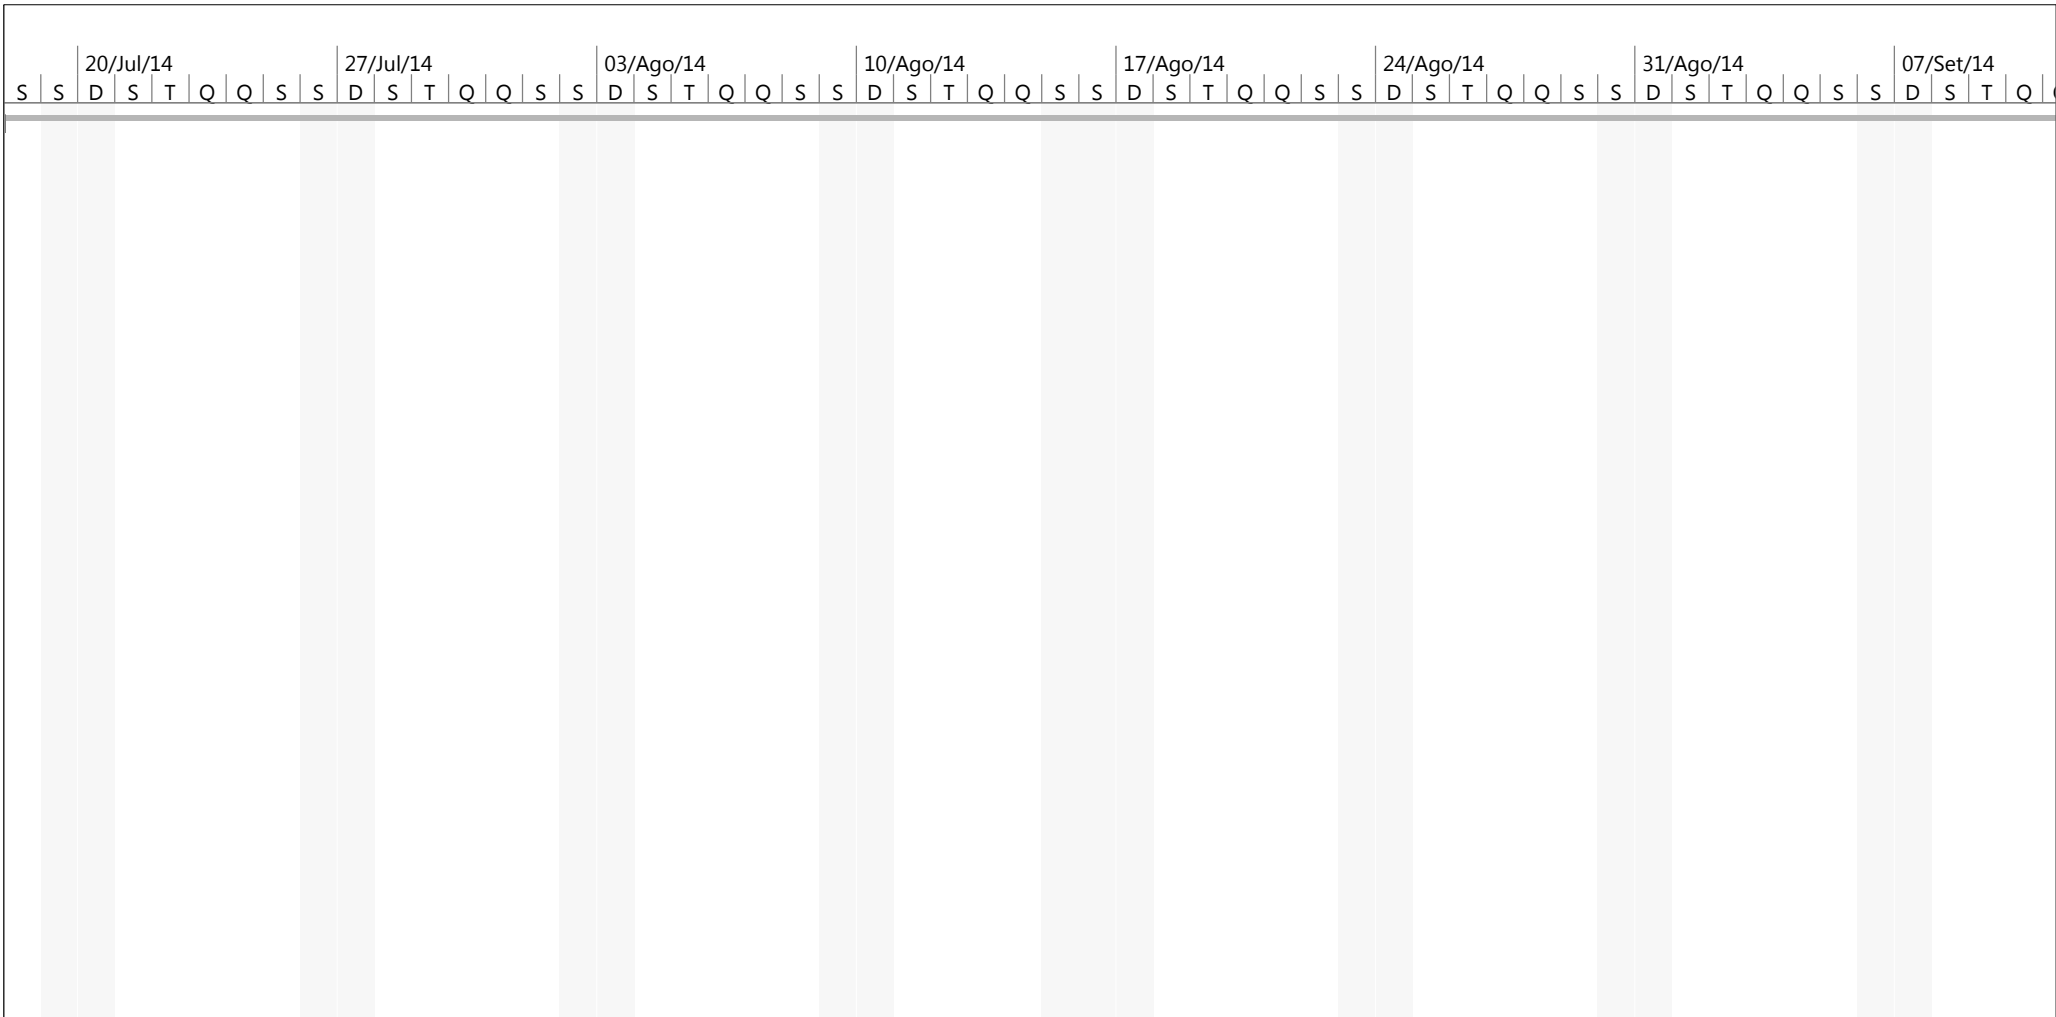


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

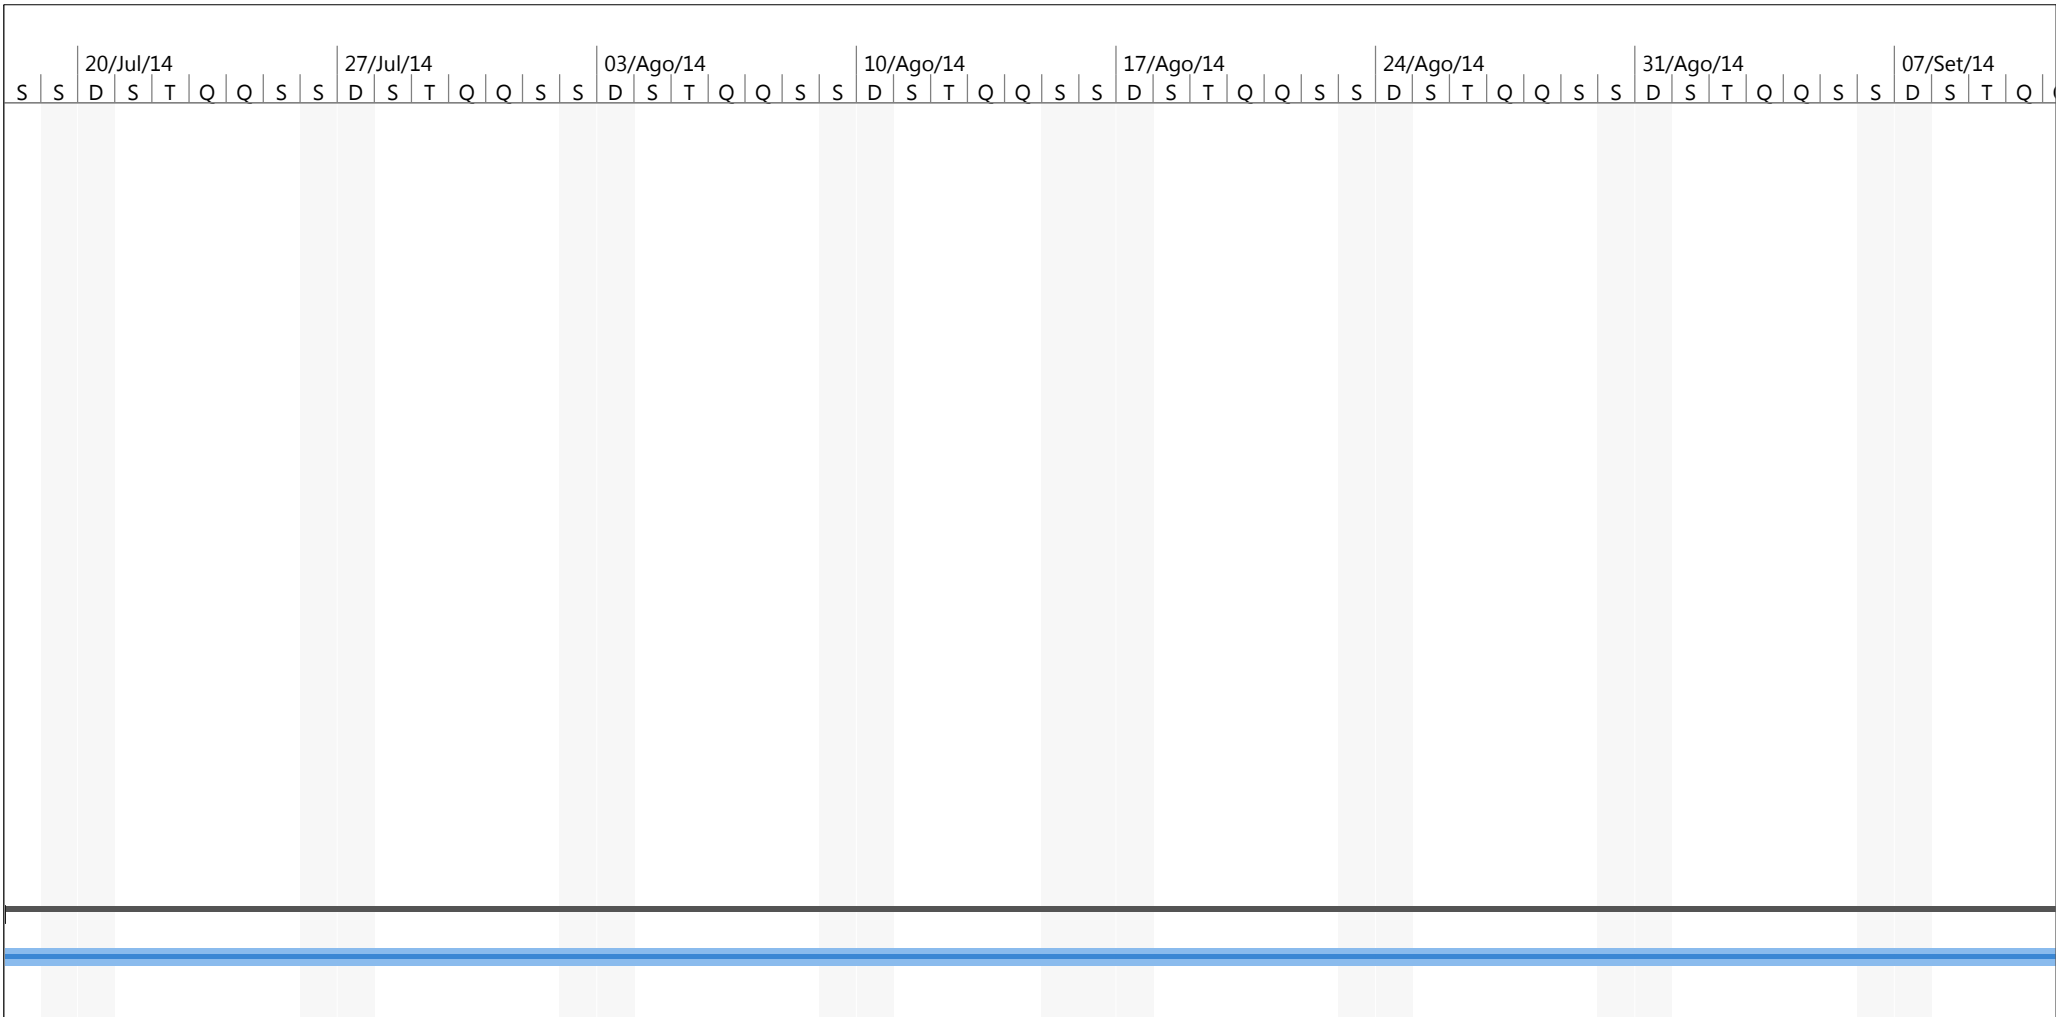


Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				







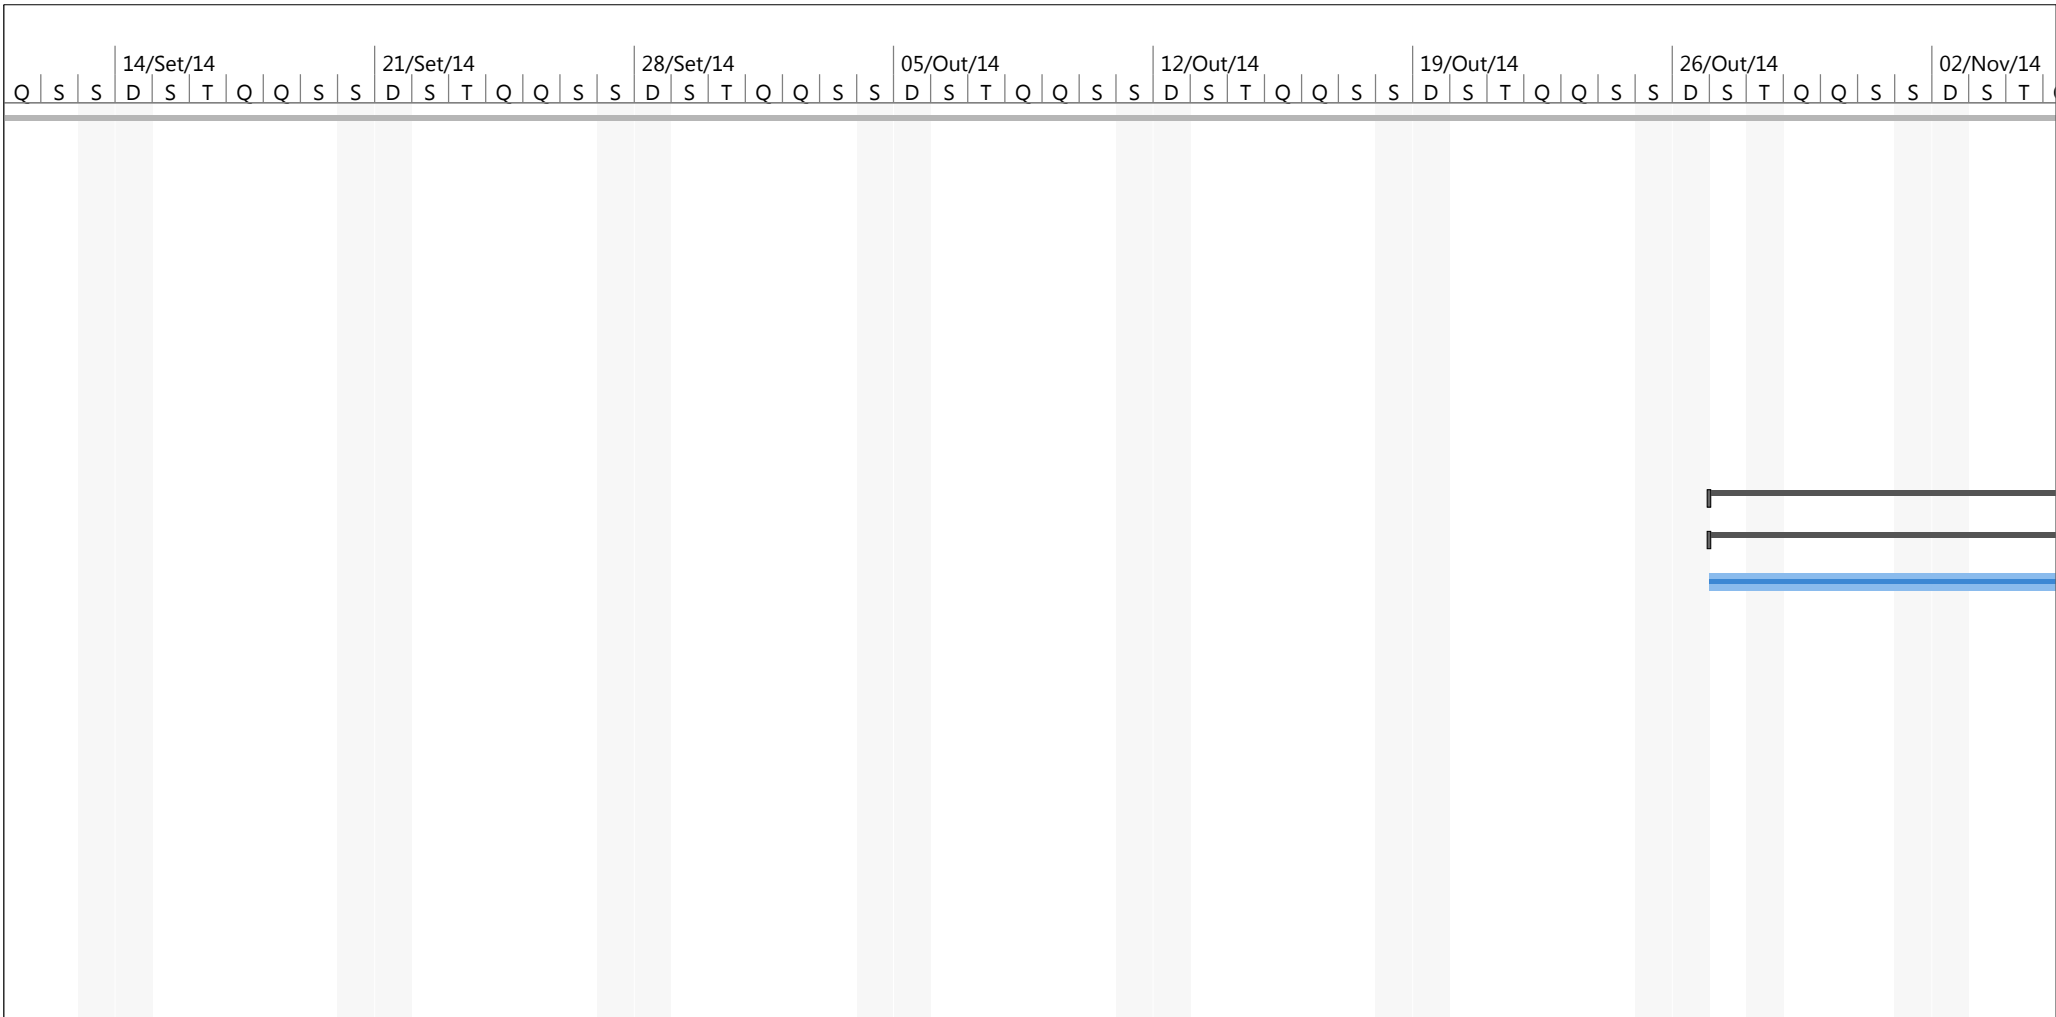














Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

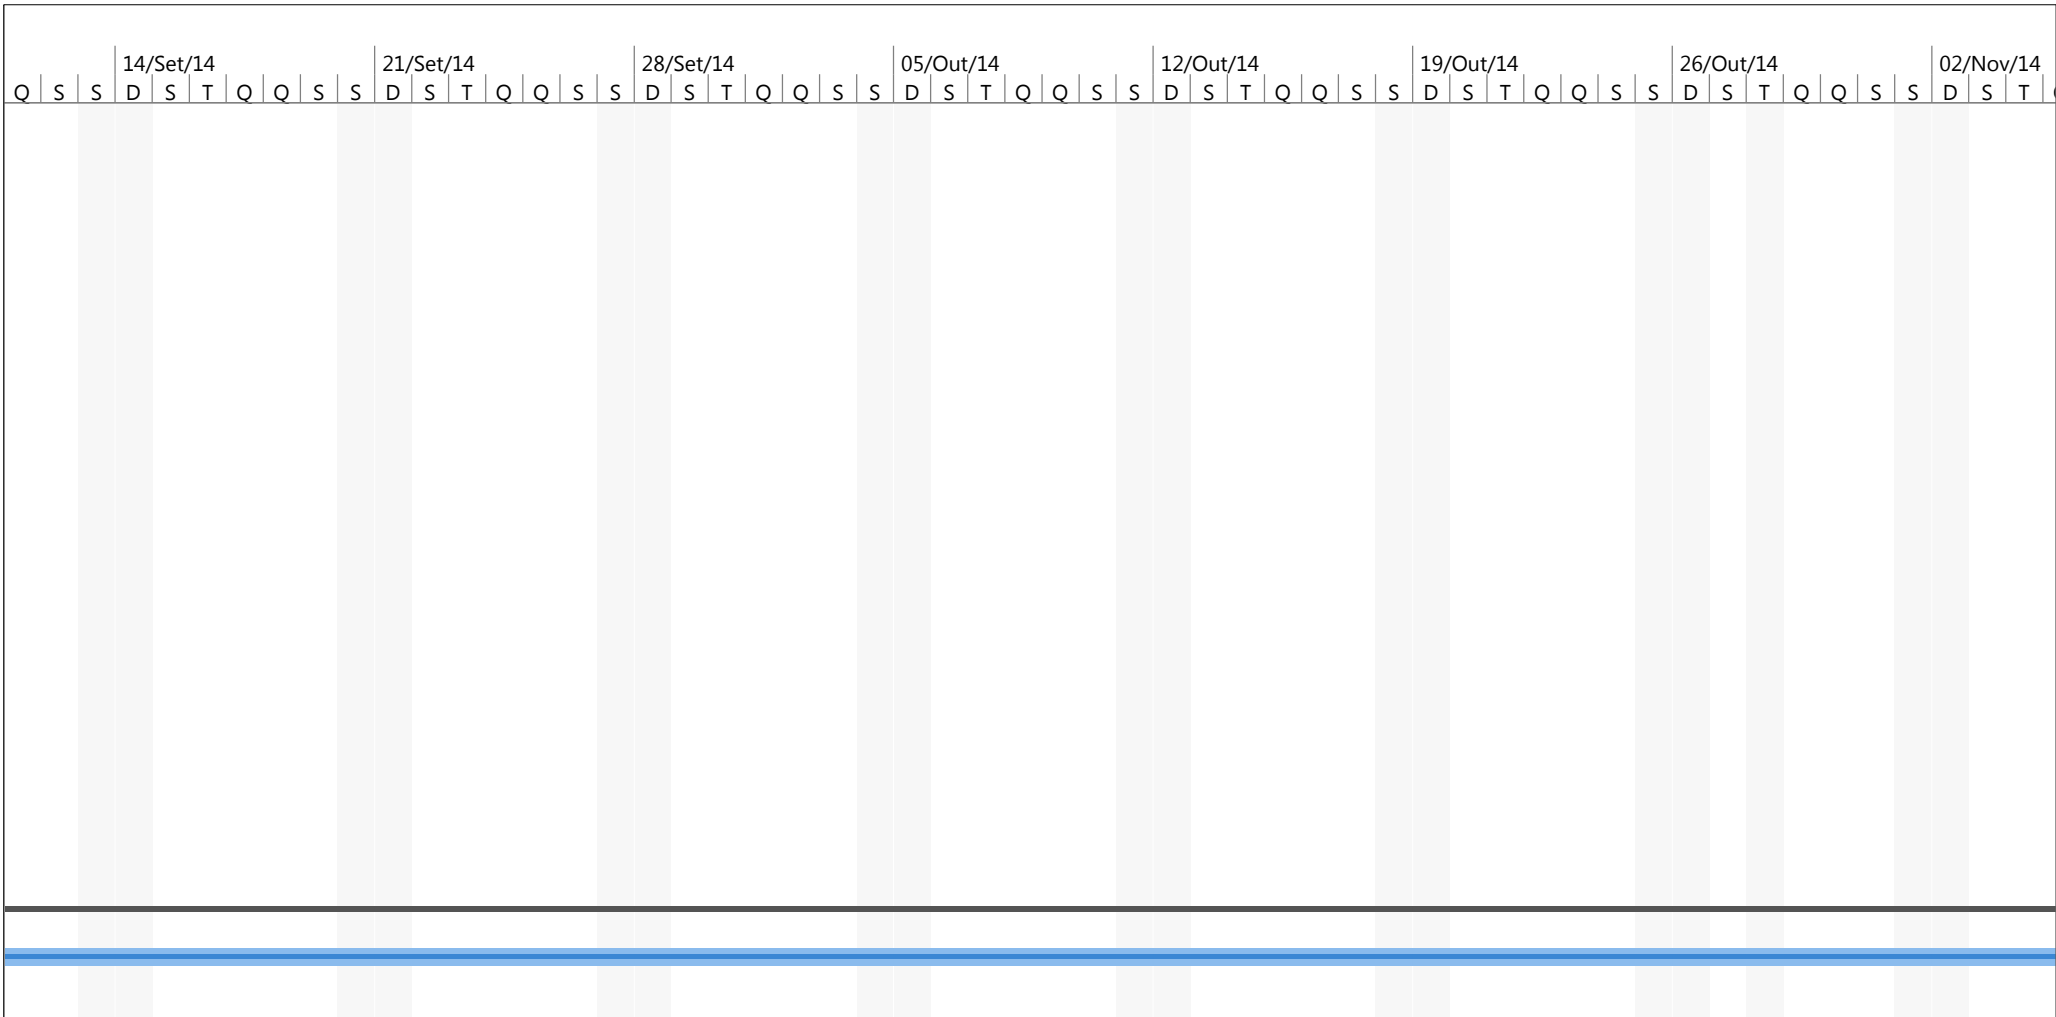

Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

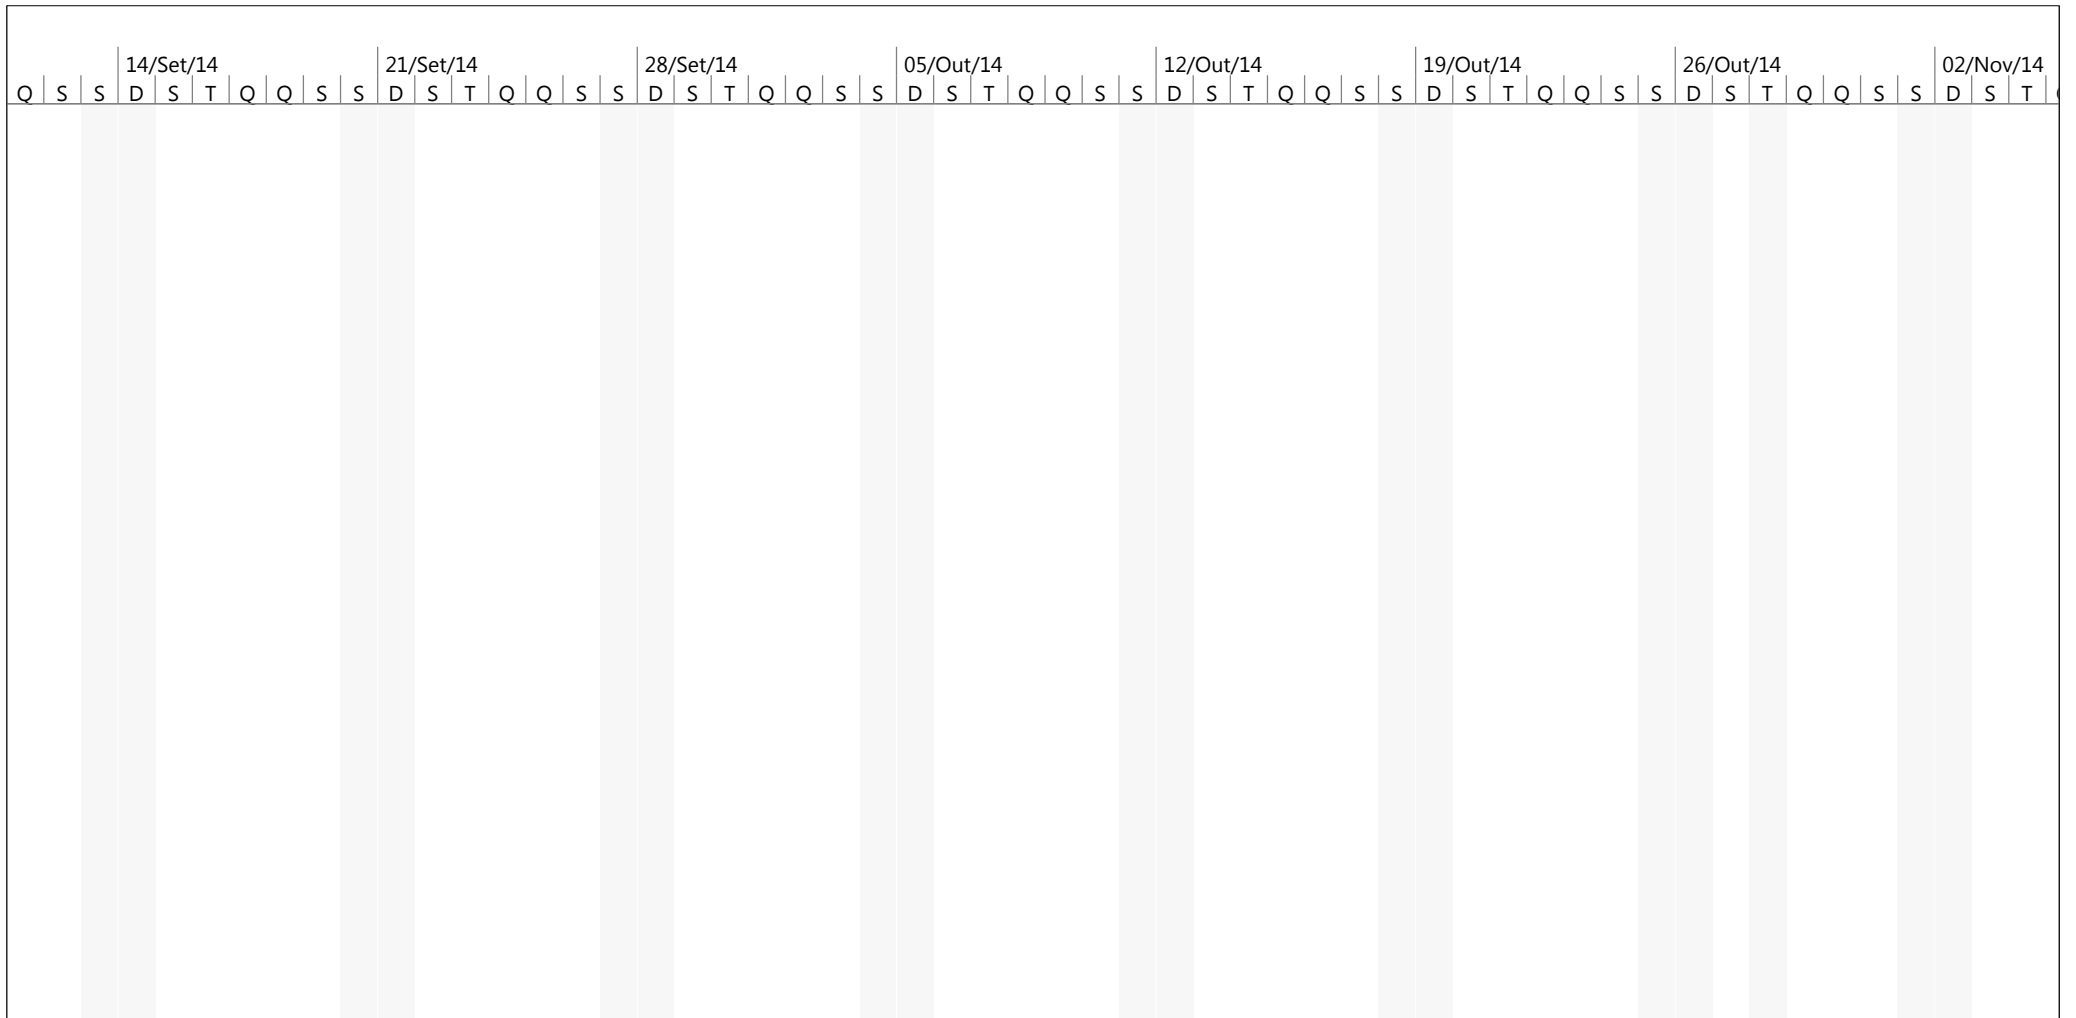


Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

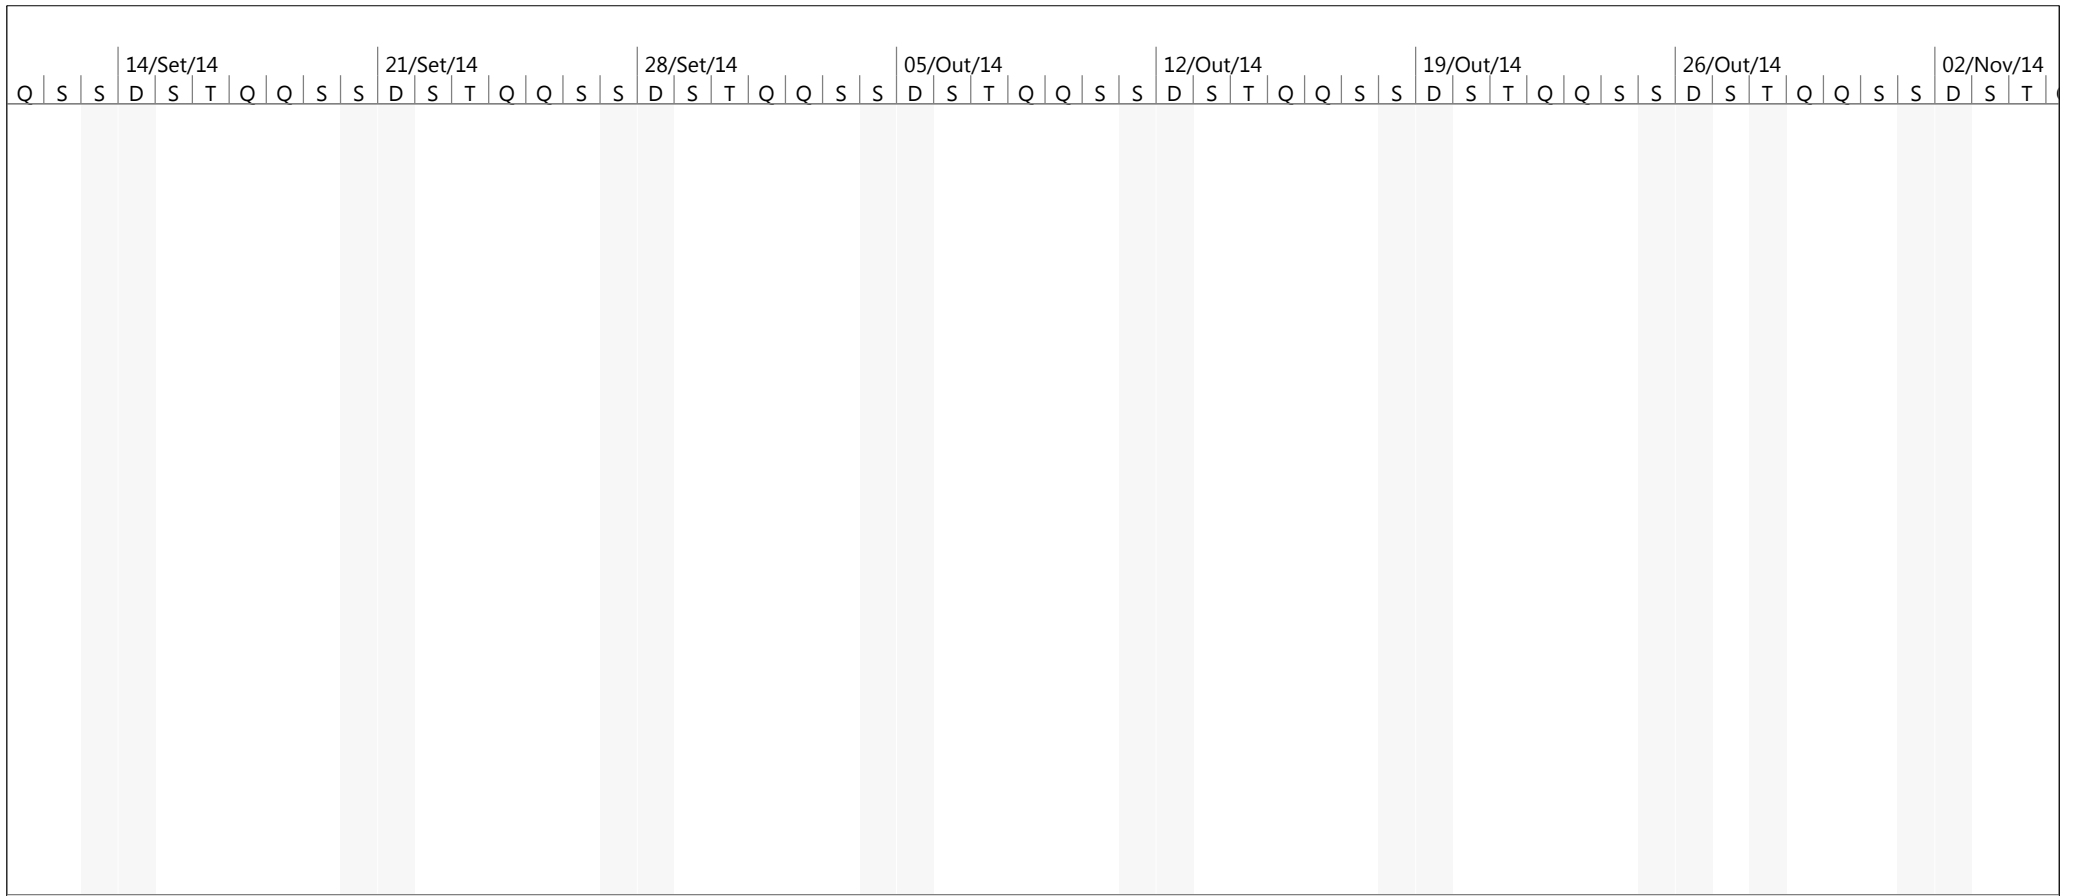


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

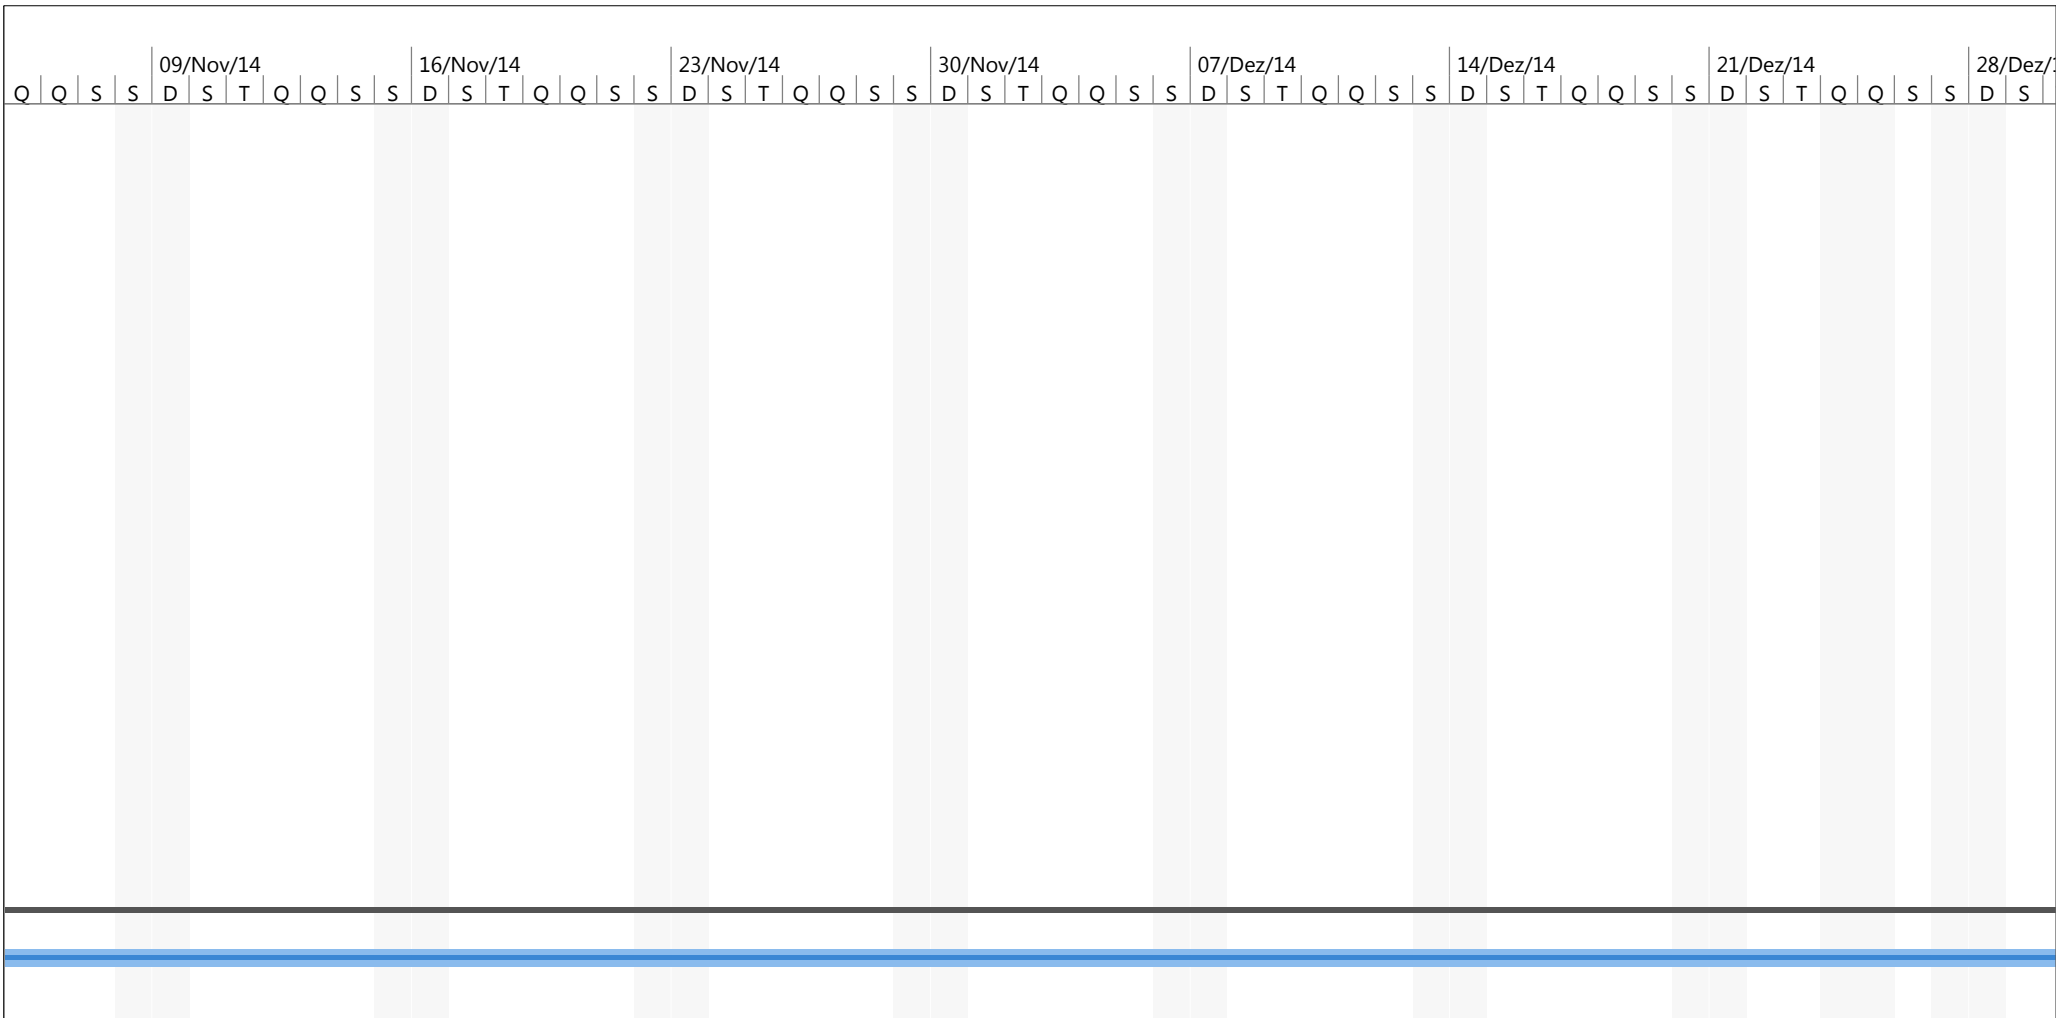

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

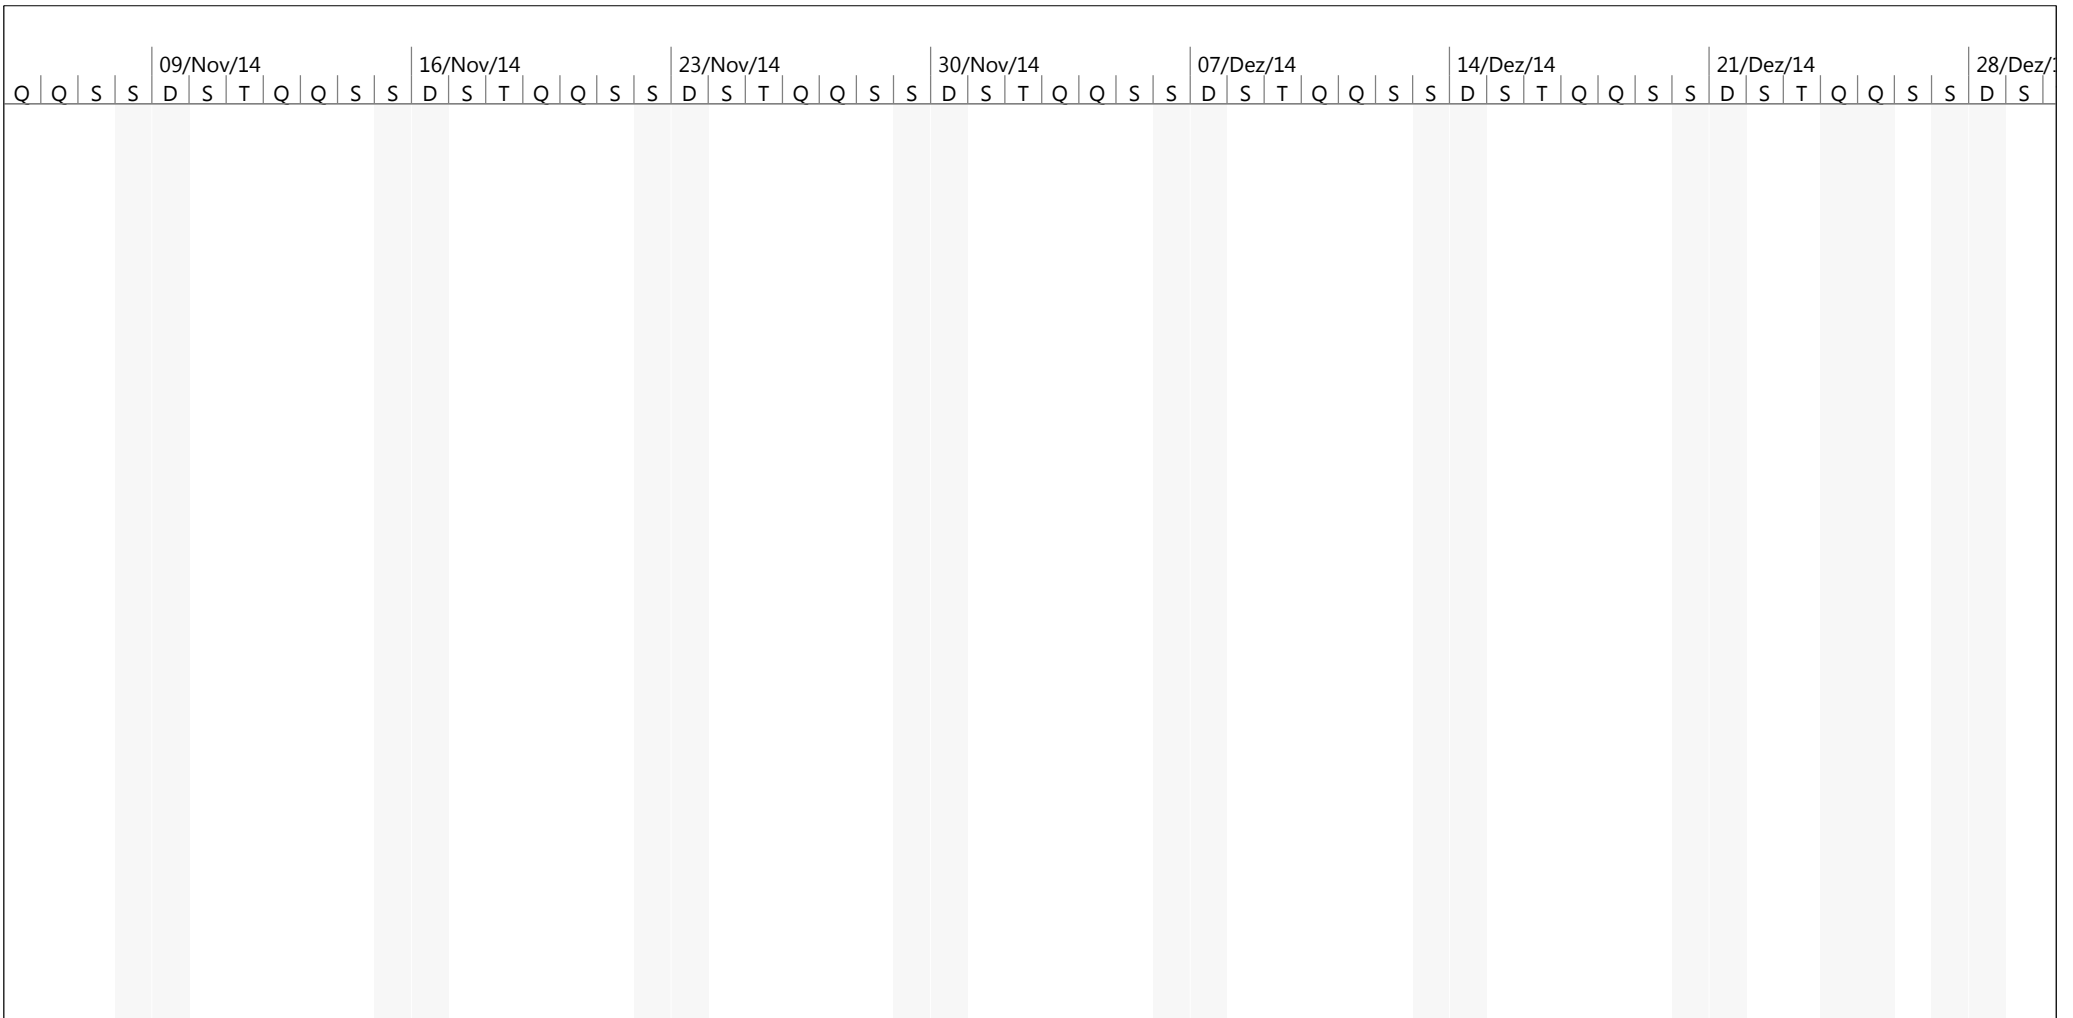


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


/14 04/Jan/15 11/Jan/15 18/Jan/15 25/Jan/15 01/Fev/15 08/Fev/15 15/Fev/15 22/F

T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D




Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

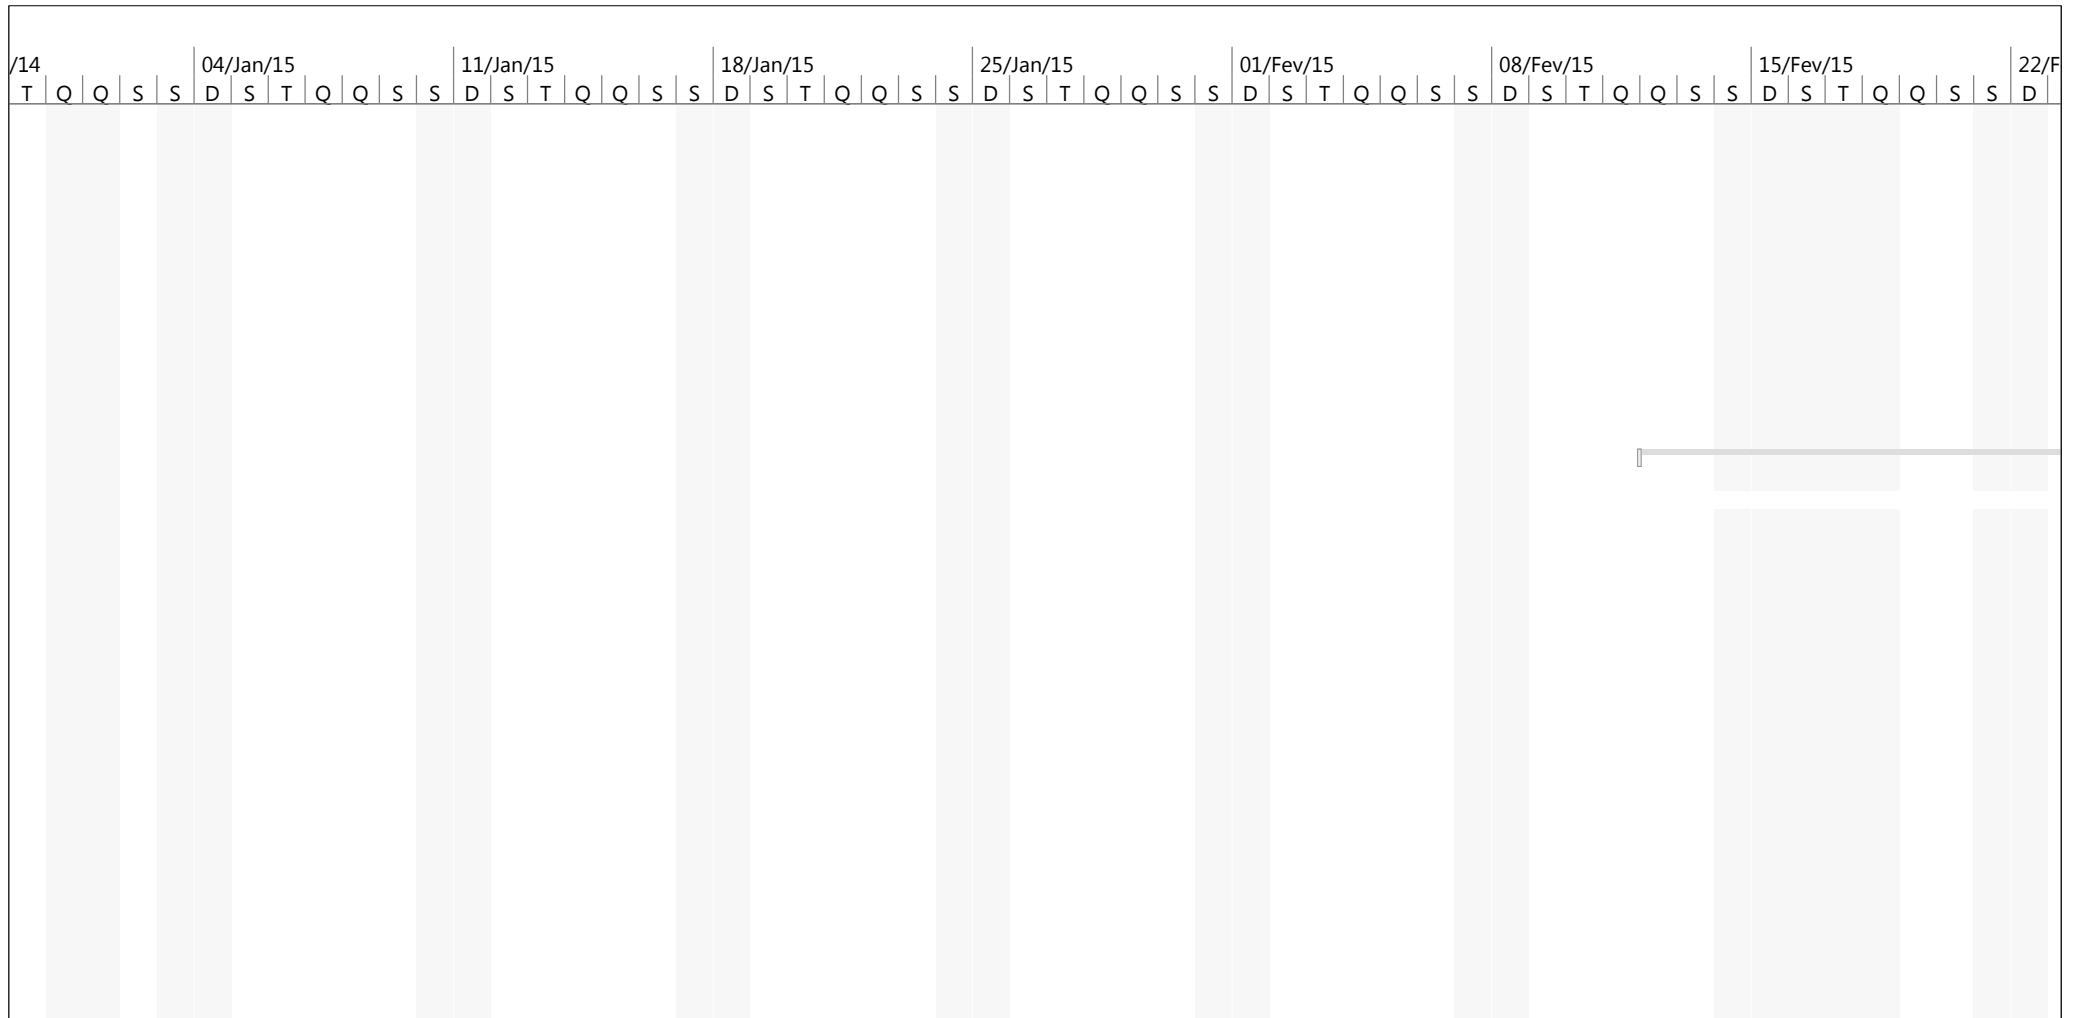


Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

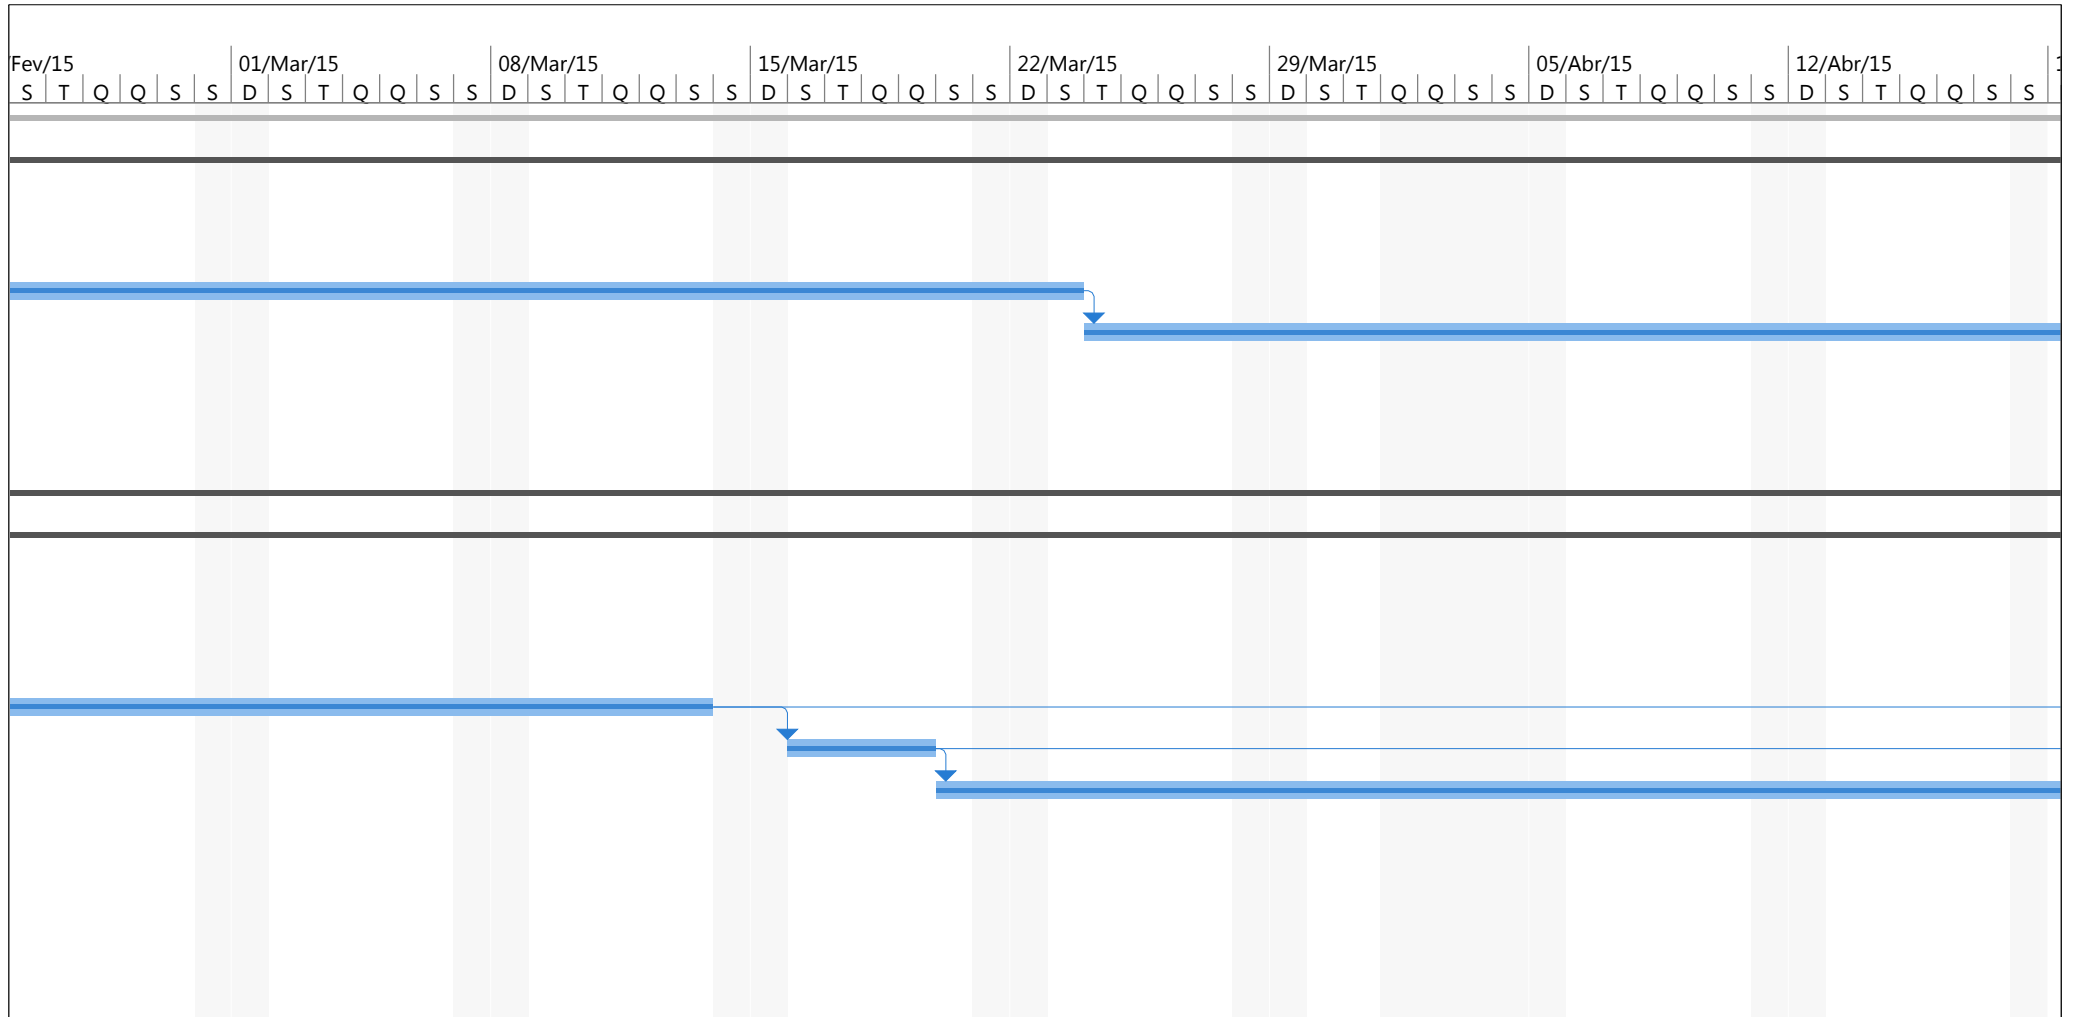

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Fev/15 01/Mar/15 08/Mar/15 15/Mar/15 22/Mar/15 29/Mar/15 05/Abr/15 12/Abr/15




◆ 02/03

◆ 02/03


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

19/Abr/15 26/Abr/15 03/Maio/15 10/Maio/15 17/Maio/15 24/Maio/15 31/Maio/15 07/Jun/15
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

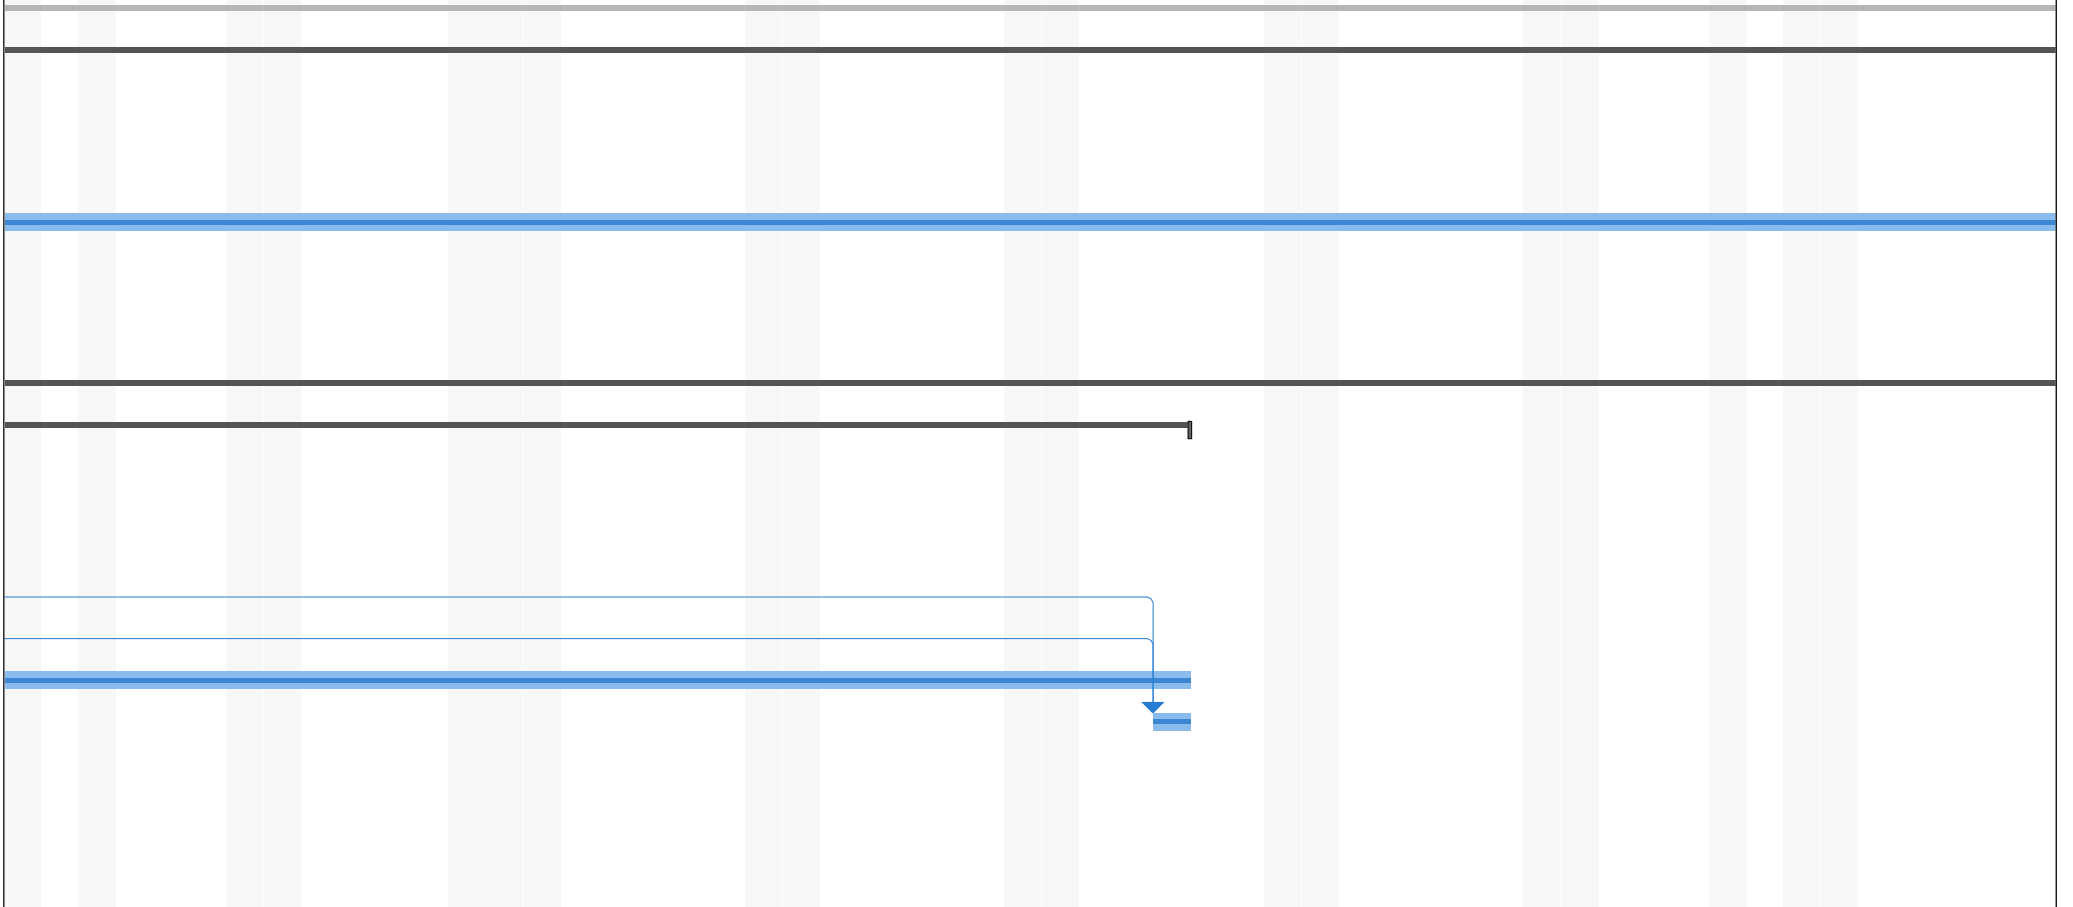

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

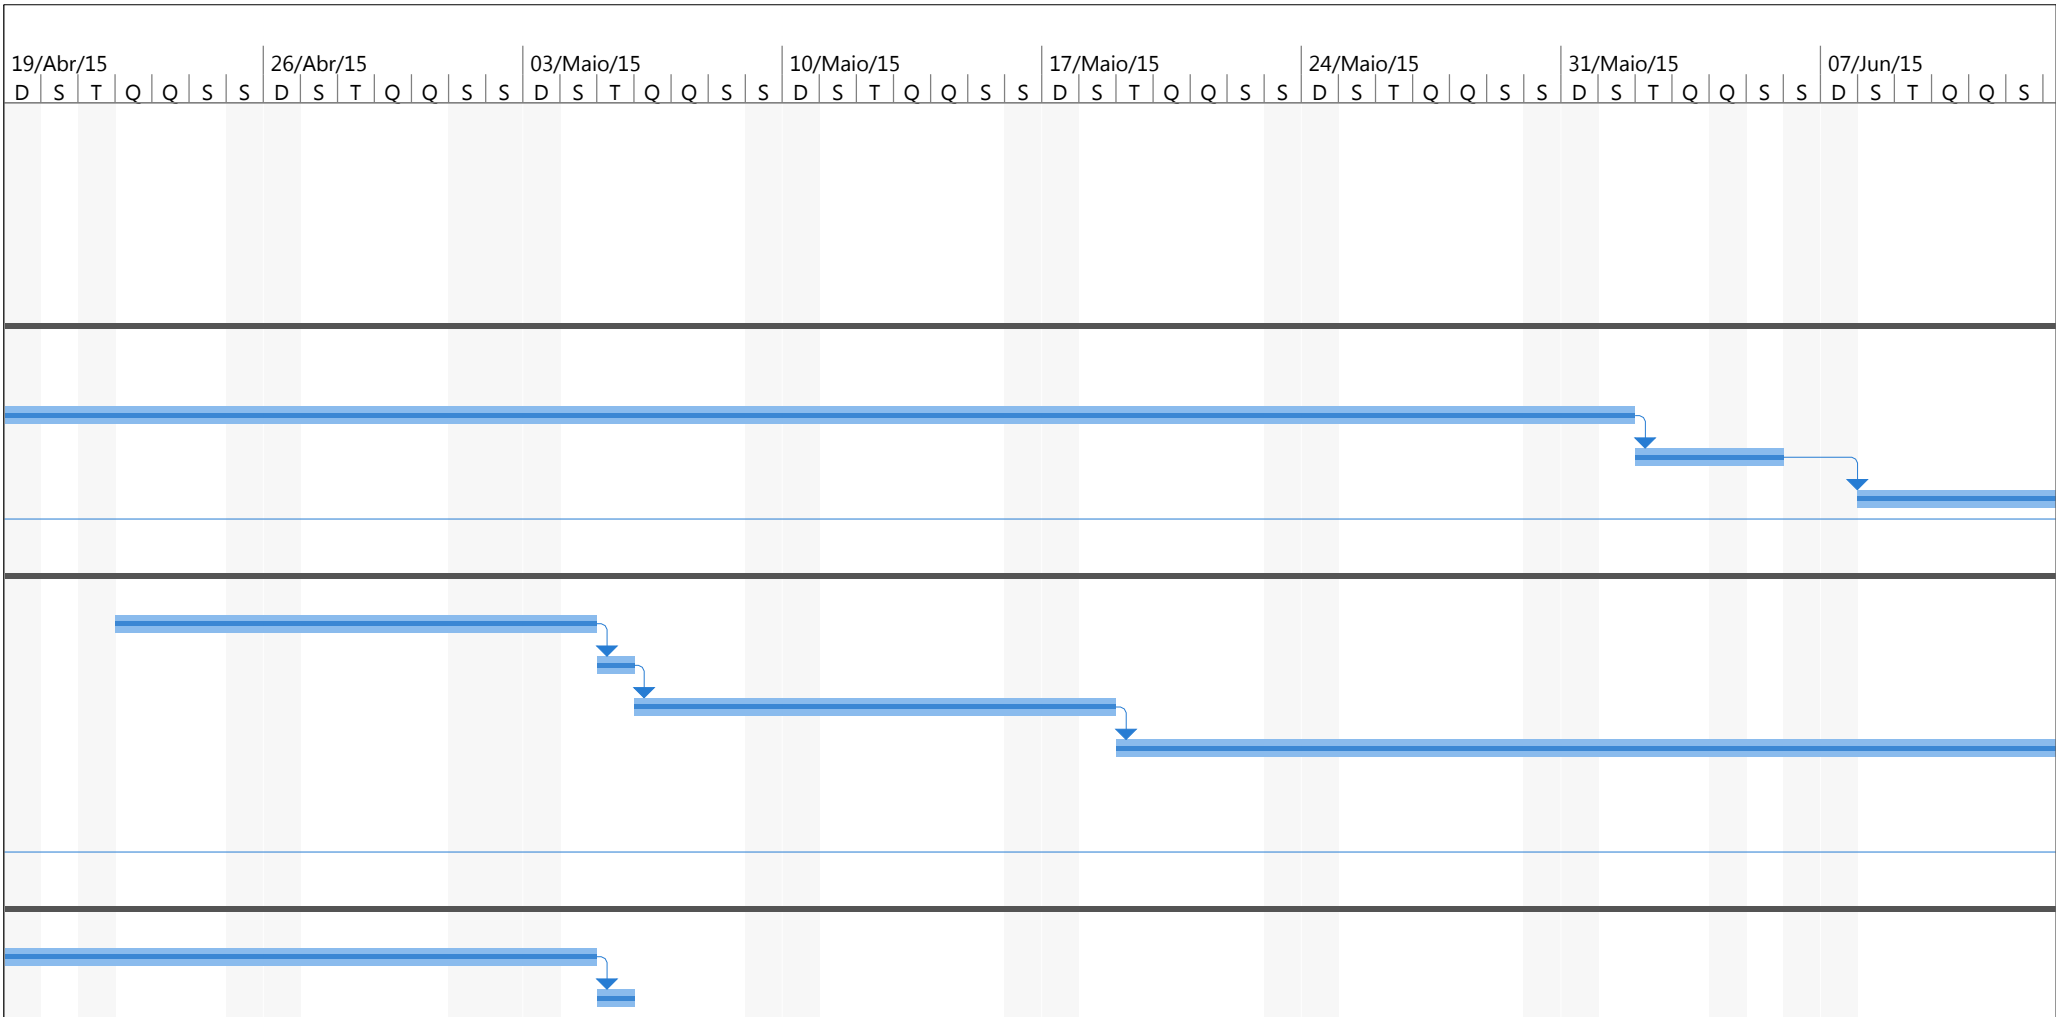







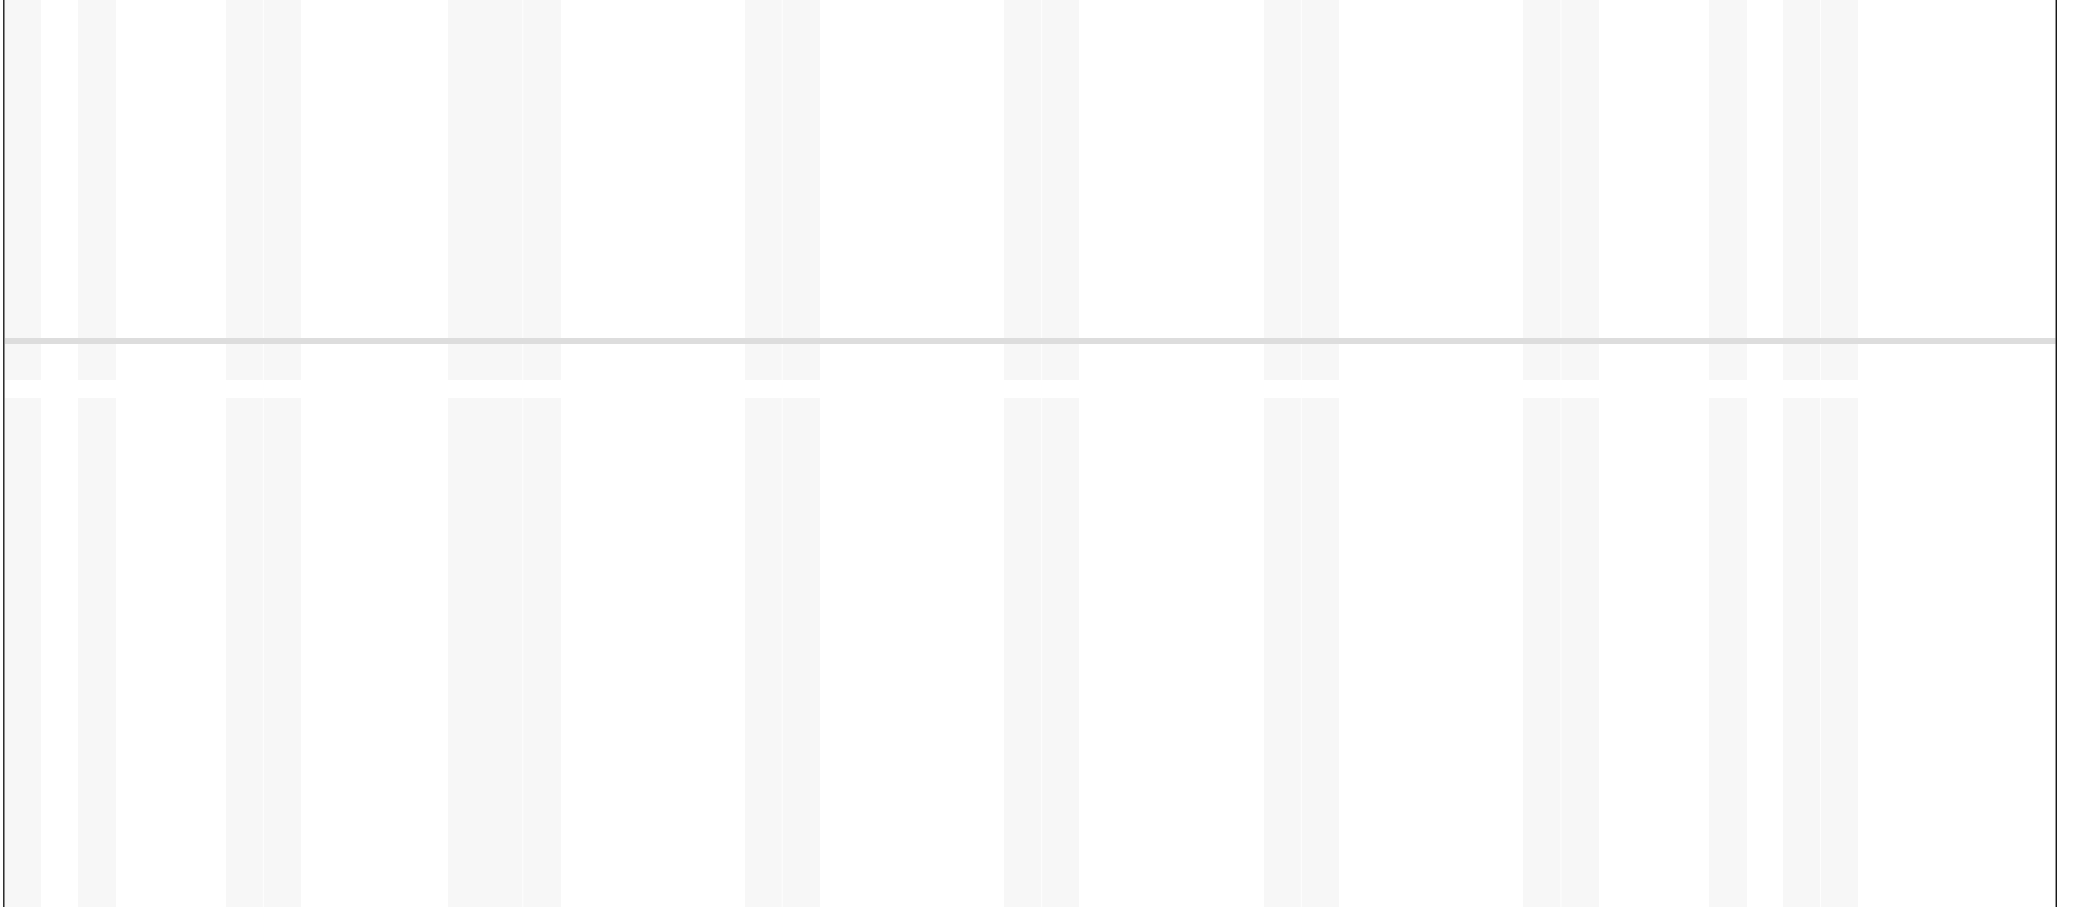











Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

19/Abr/15 | 26/Abr/15 | 03/Maio/15 | 10/Maio/15 | 17/Maio/15 | 24/Maio/15 | 31/Maio/15 | 07/Jun/15



Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17



Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

19/Abr/15 | D S T Q Q S S | 26/Abr/15 | D S T Q Q S S | 03/Maio/15 | D S T Q Q S S | 10/Maio/15 | D S T Q Q S S | 17/Maio/15 | D S T Q Q S S | 24/Maio/15 | D S T Q Q S S | 31/Maio/15 | D S T Q Q S S | 07/Jun/15 | D S T Q Q S S




Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

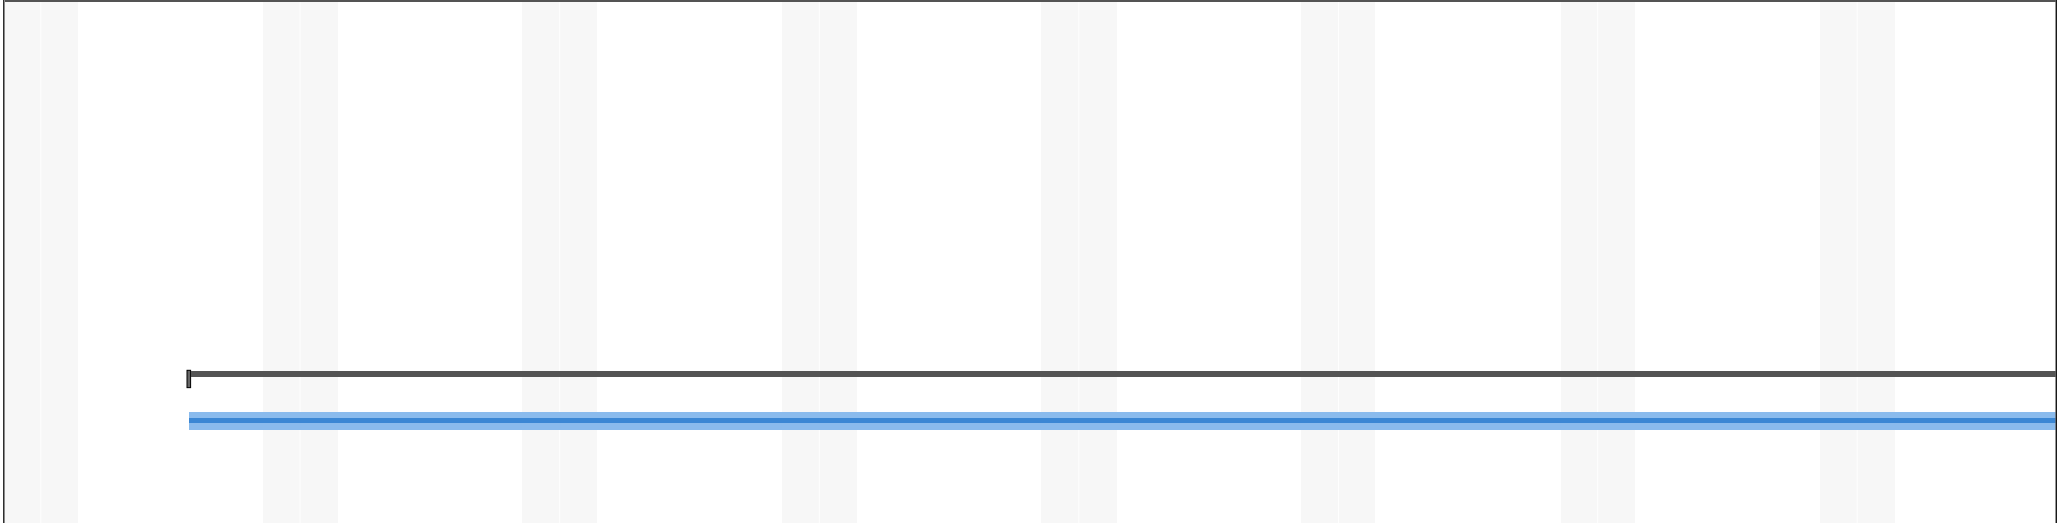


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

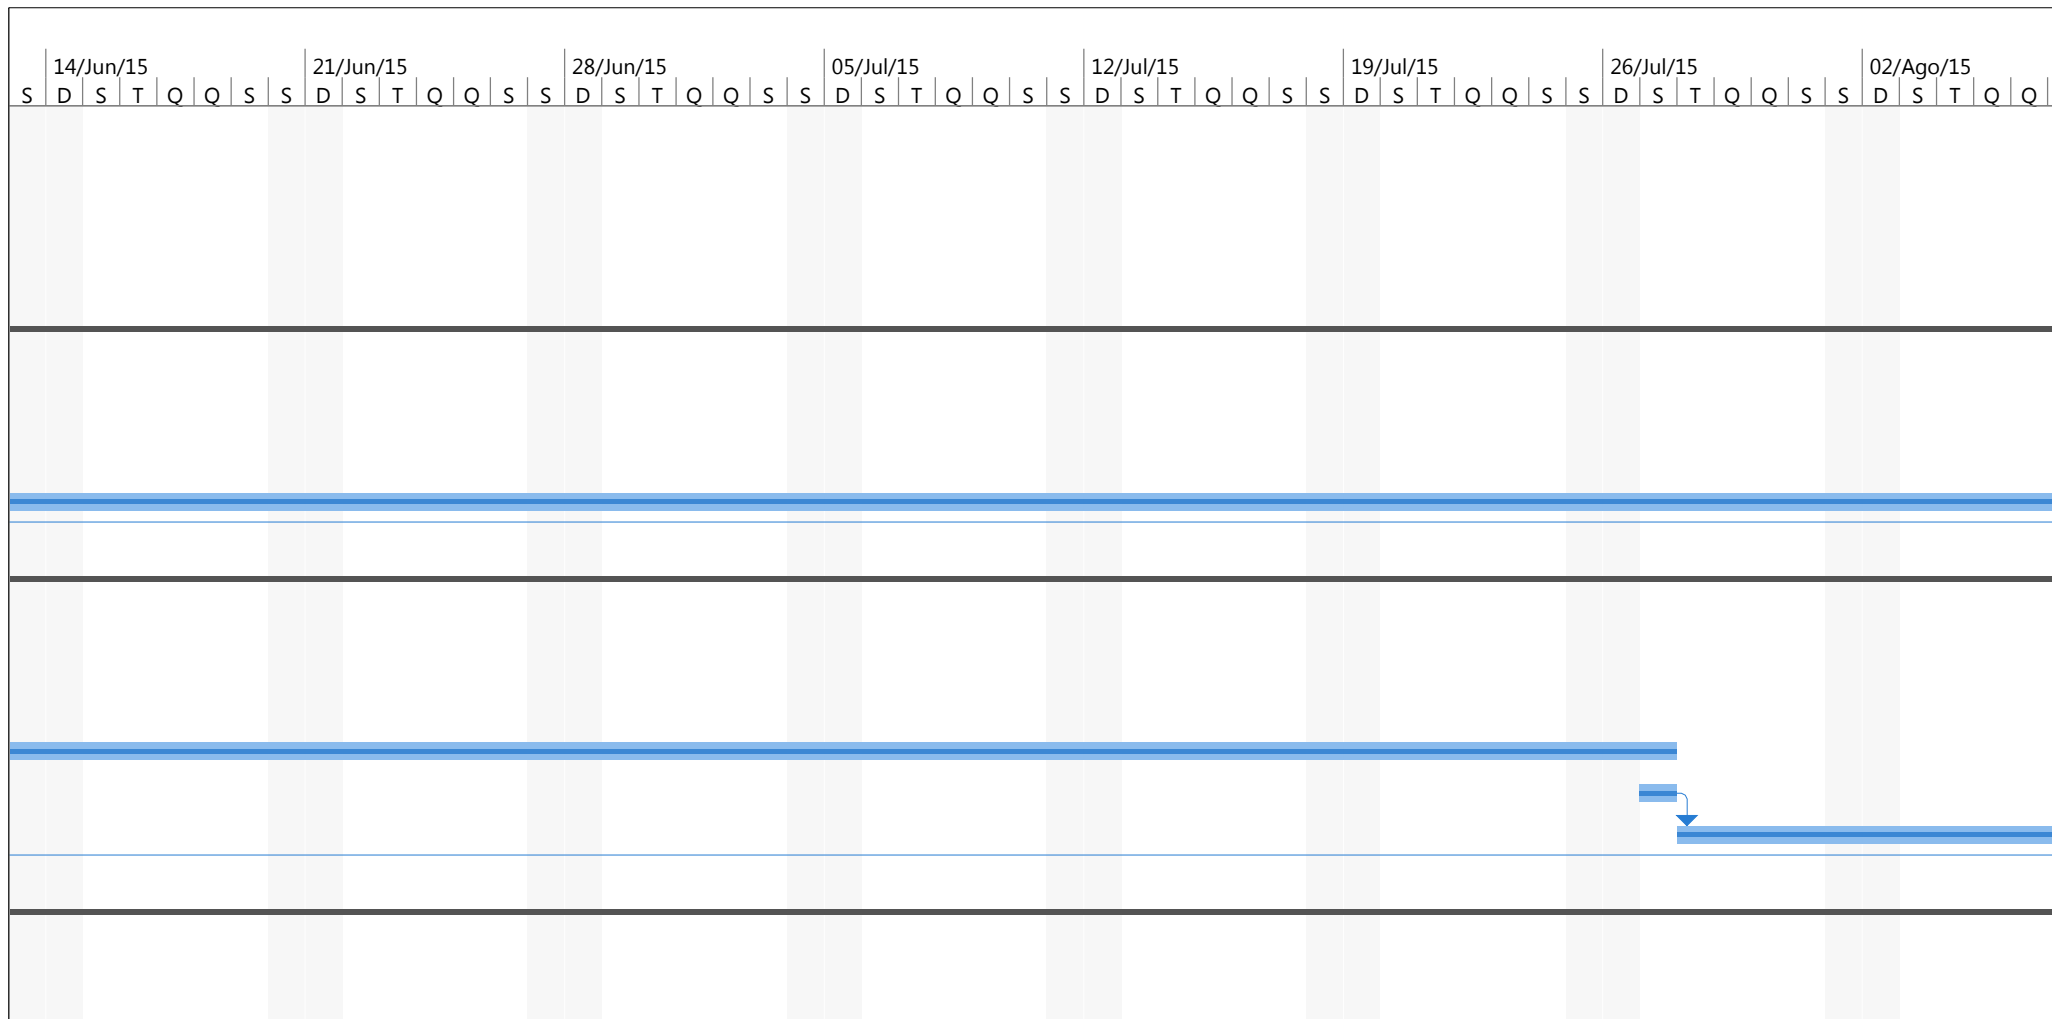

Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

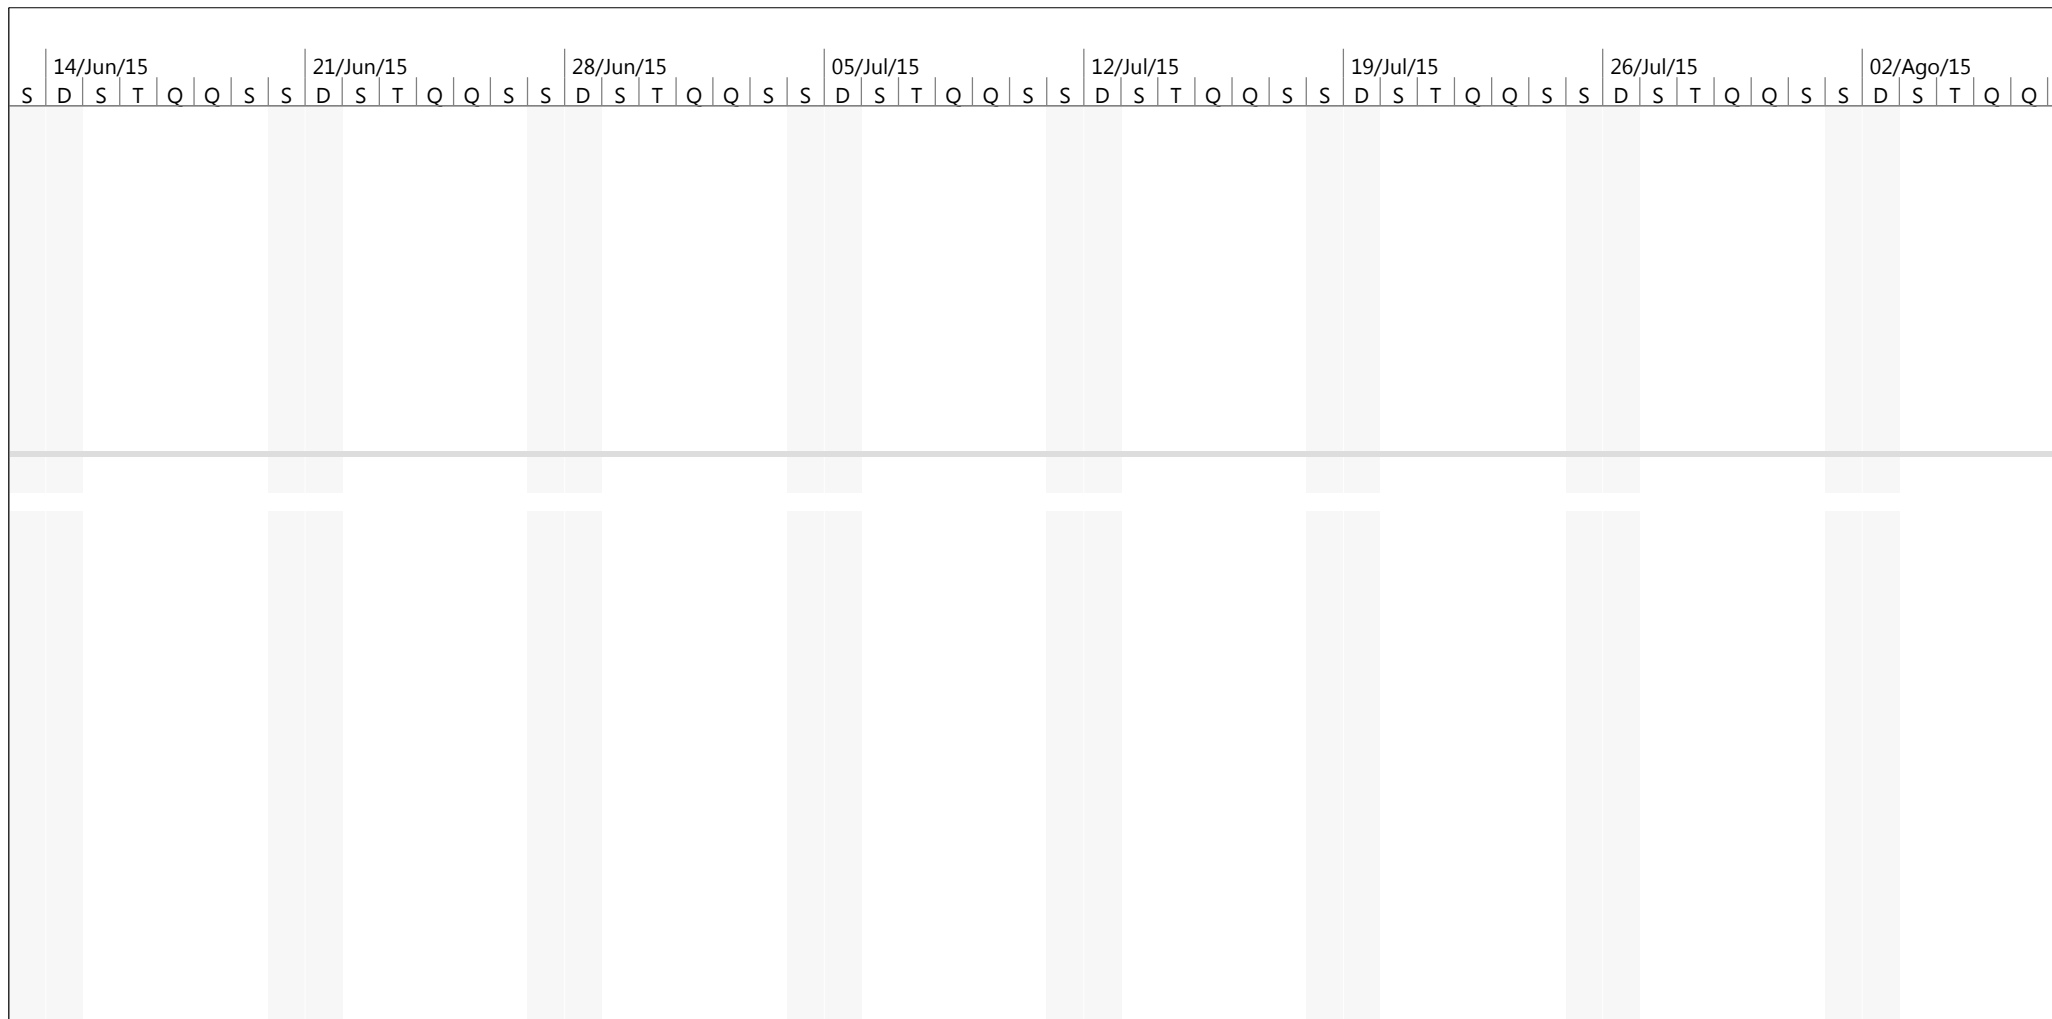


Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

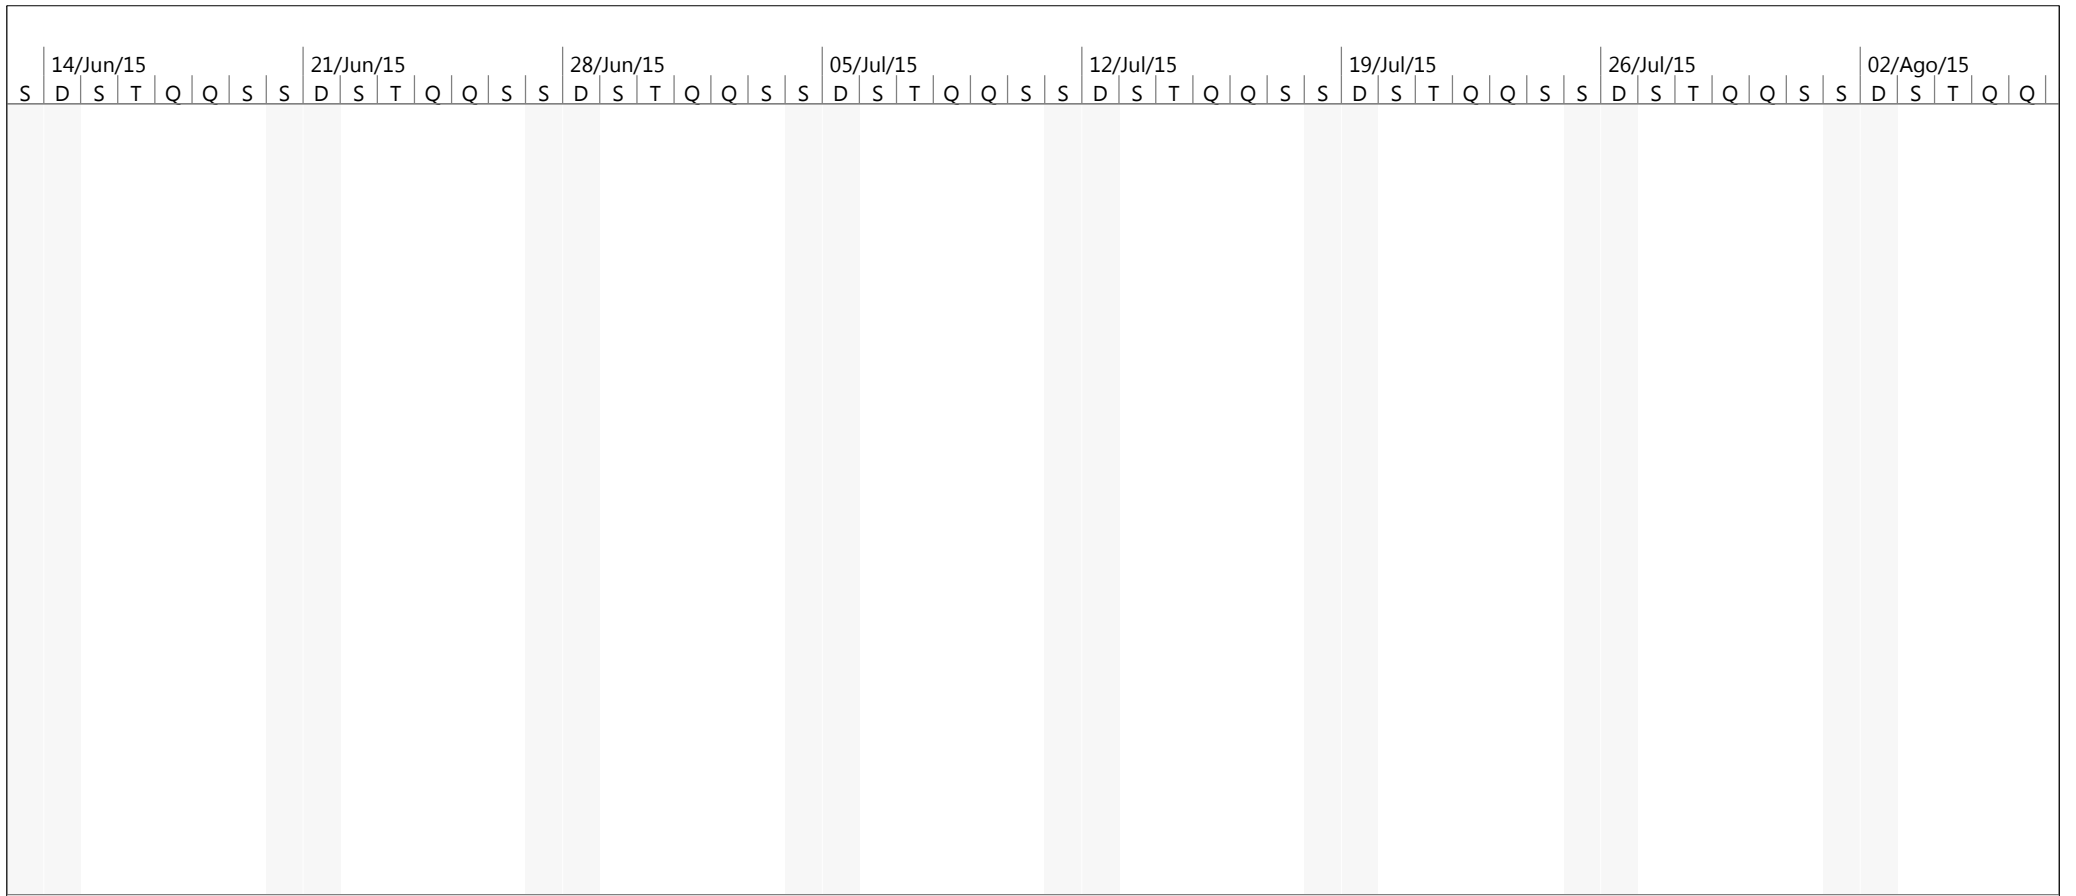


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

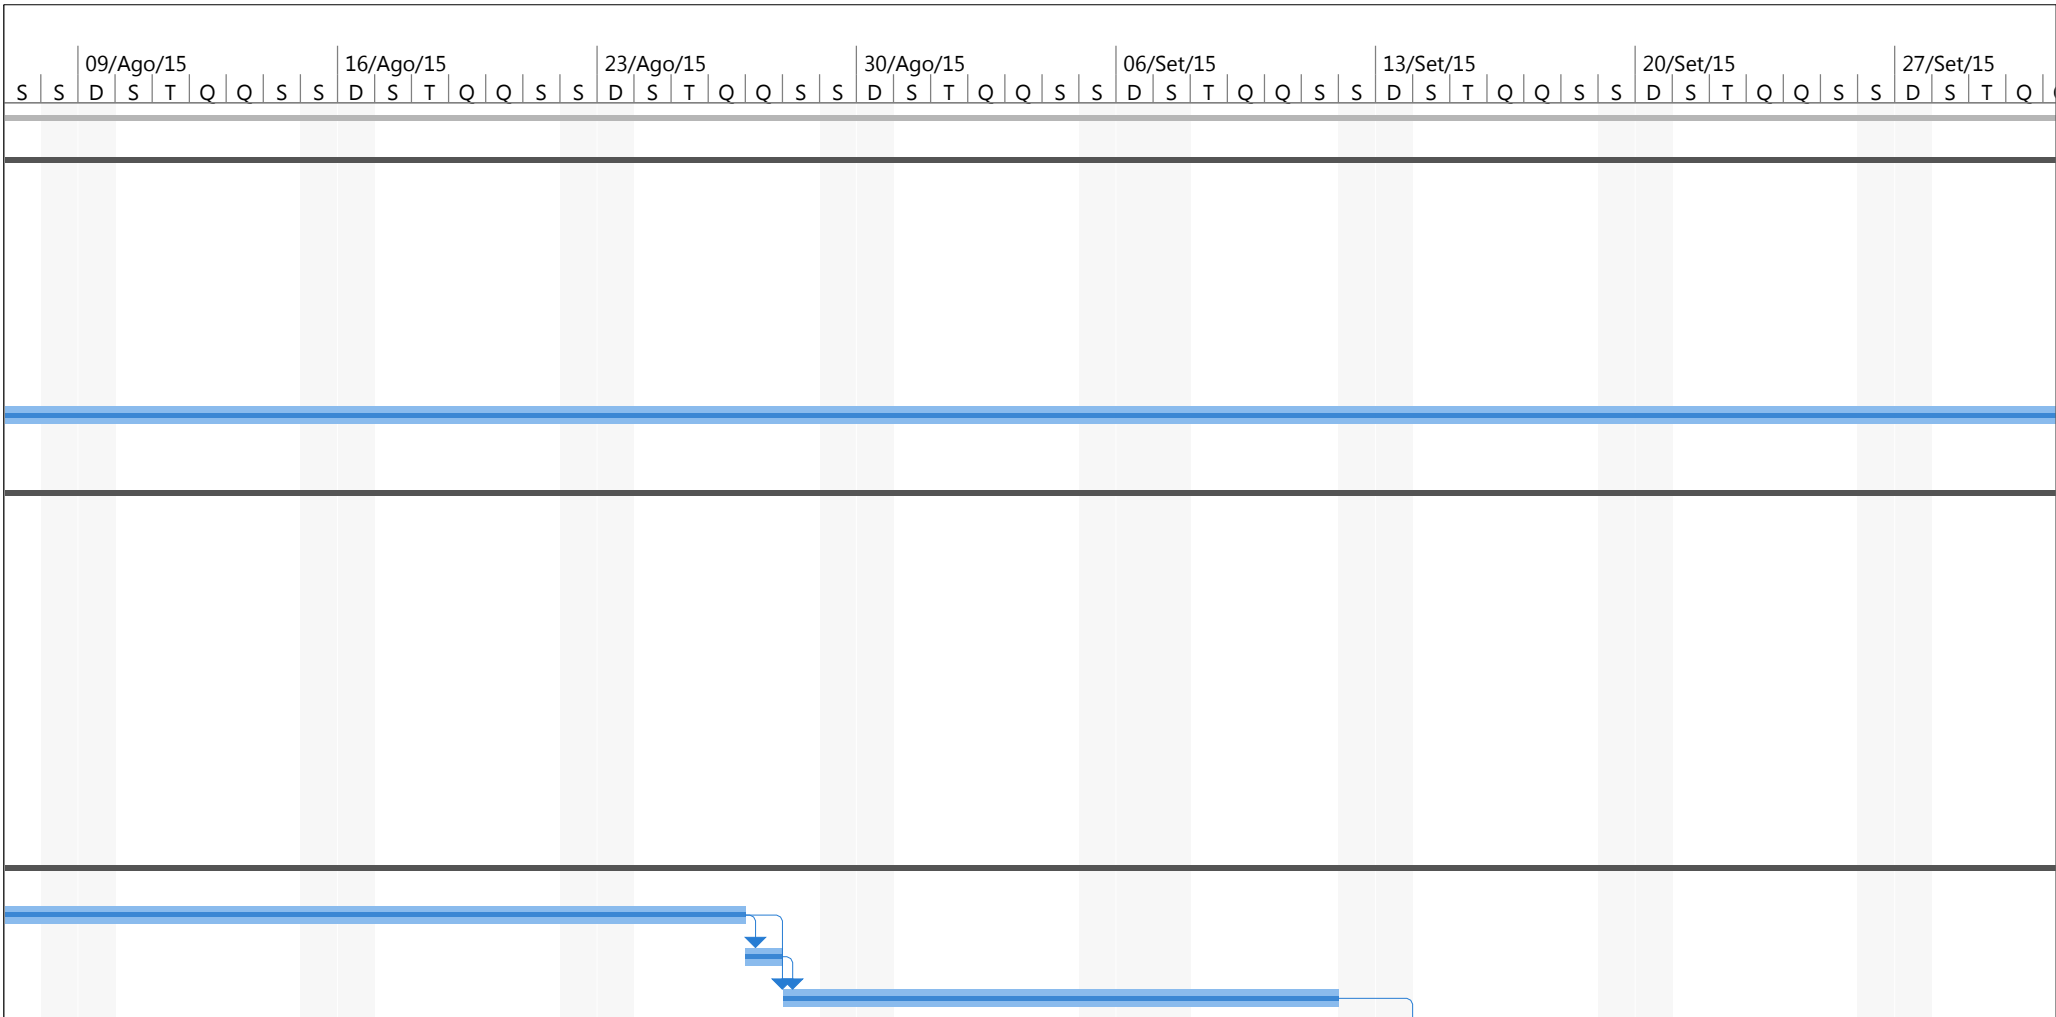


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

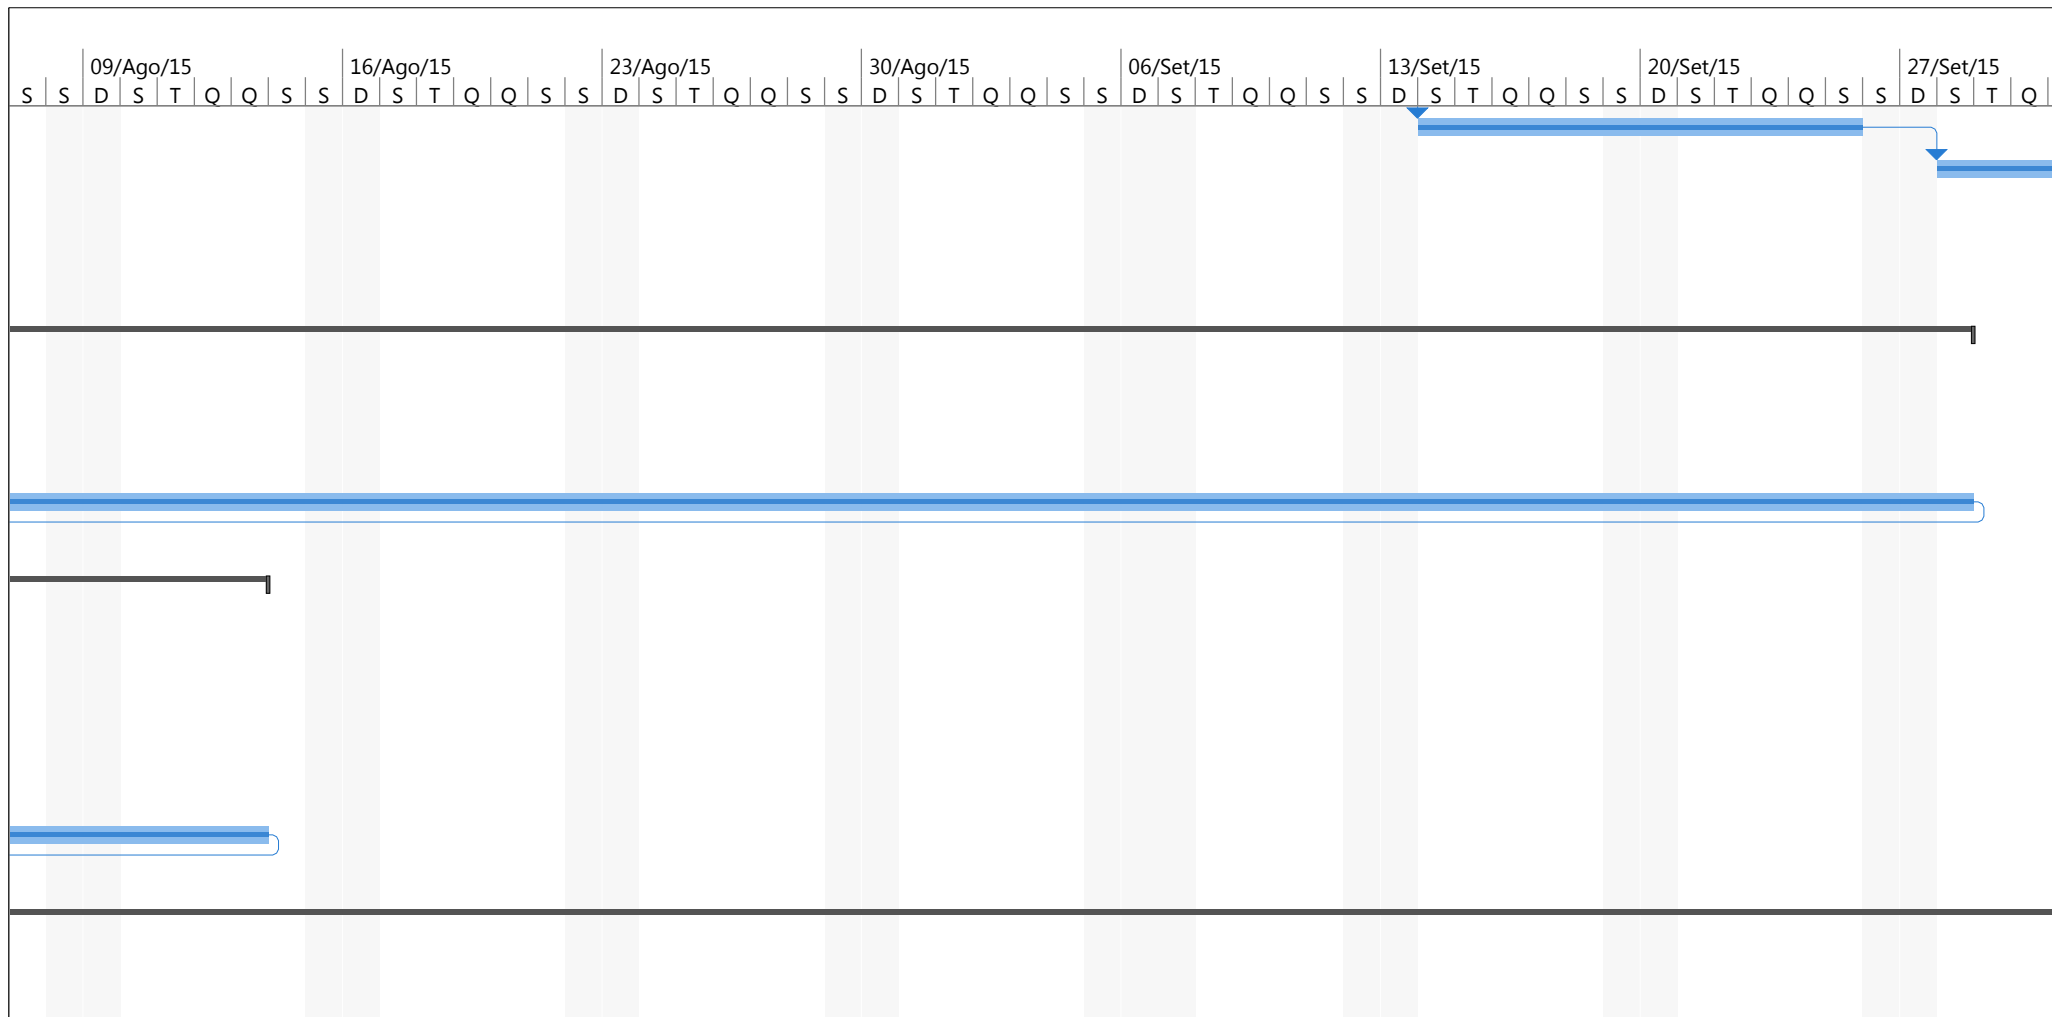


Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

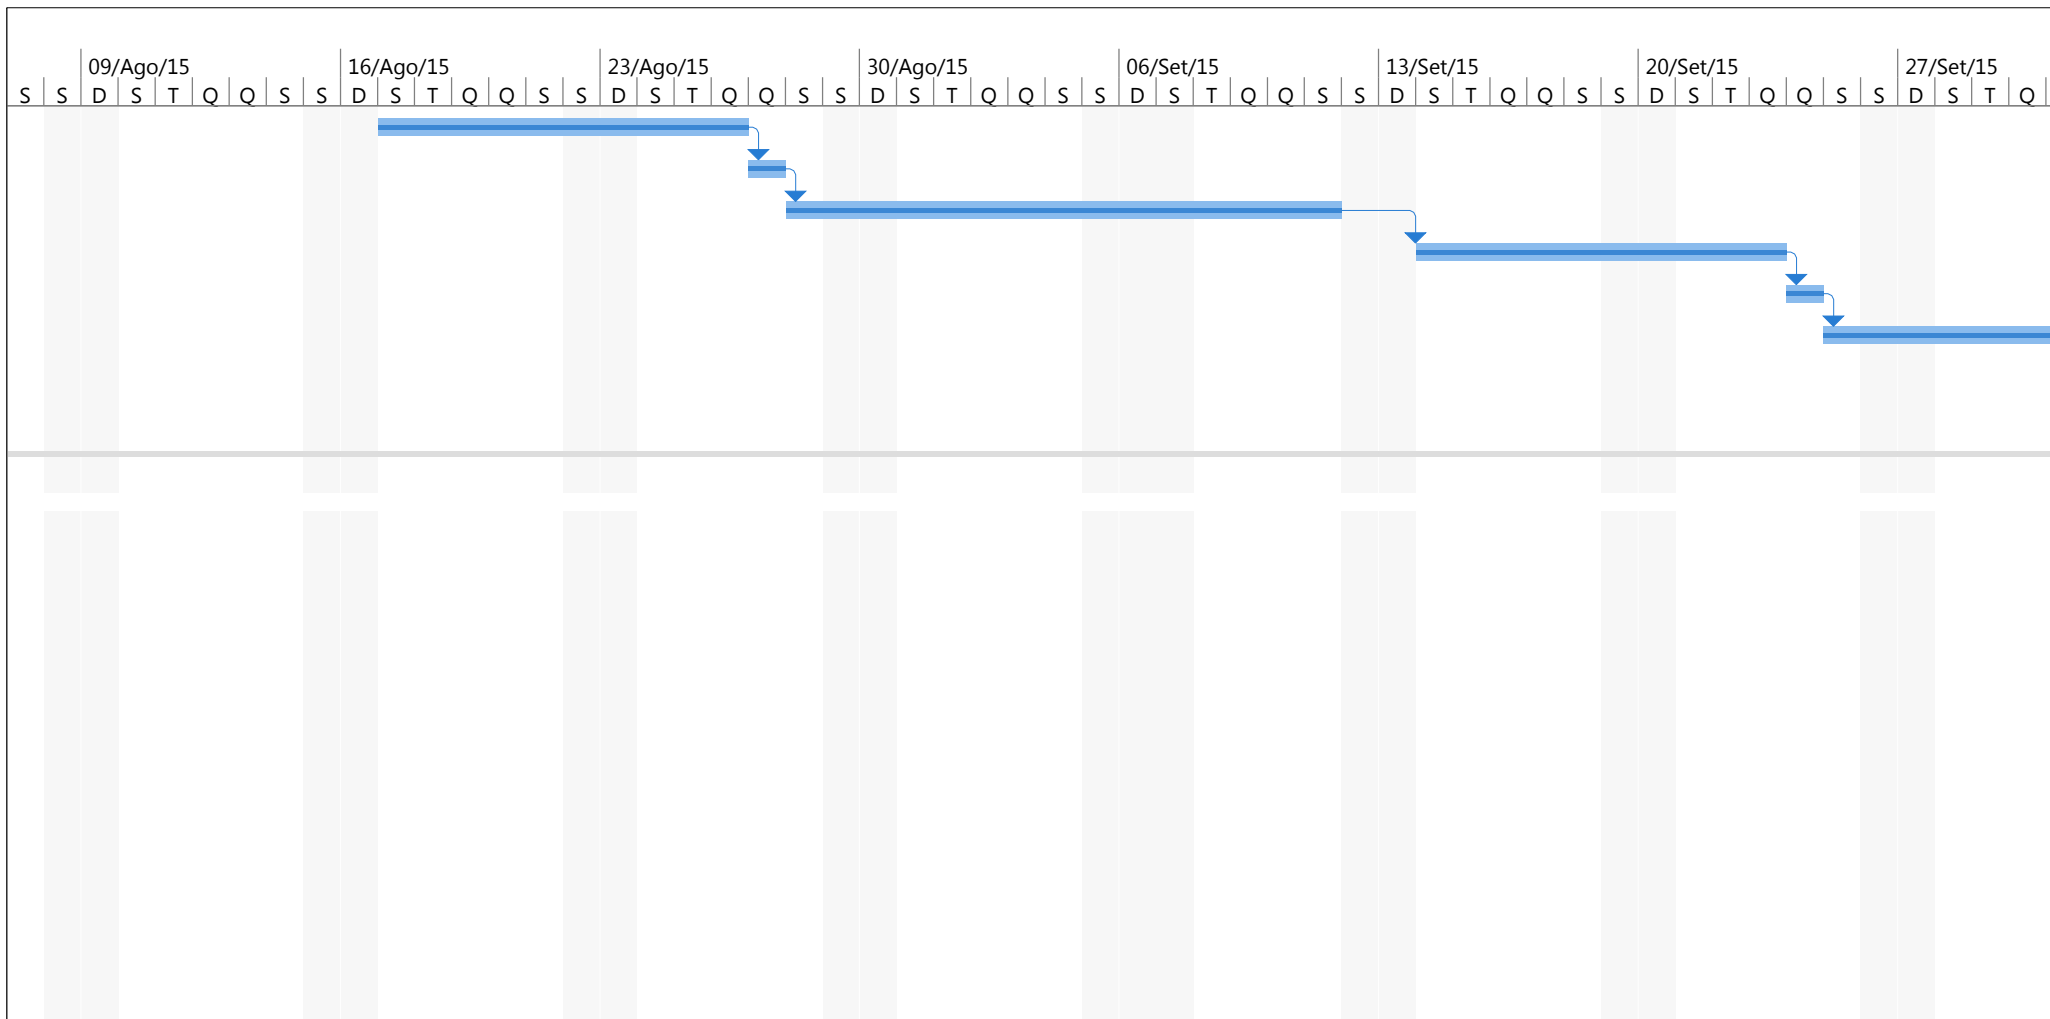


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

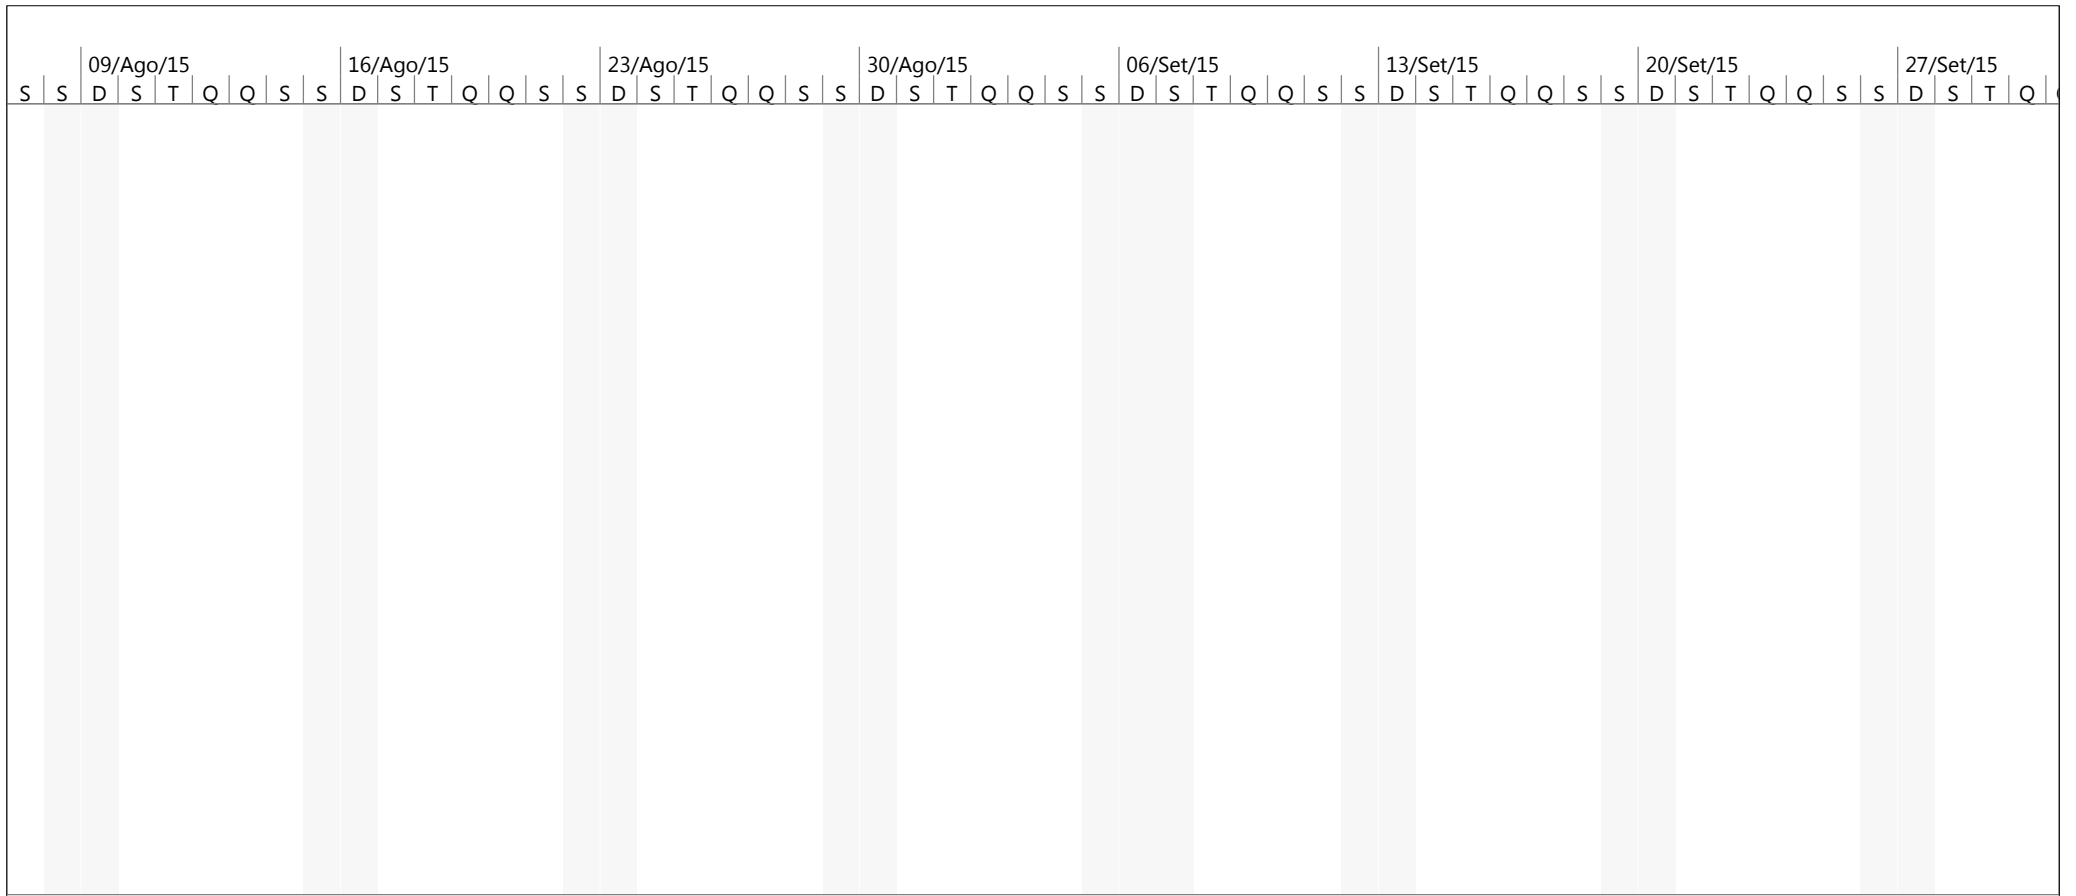


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

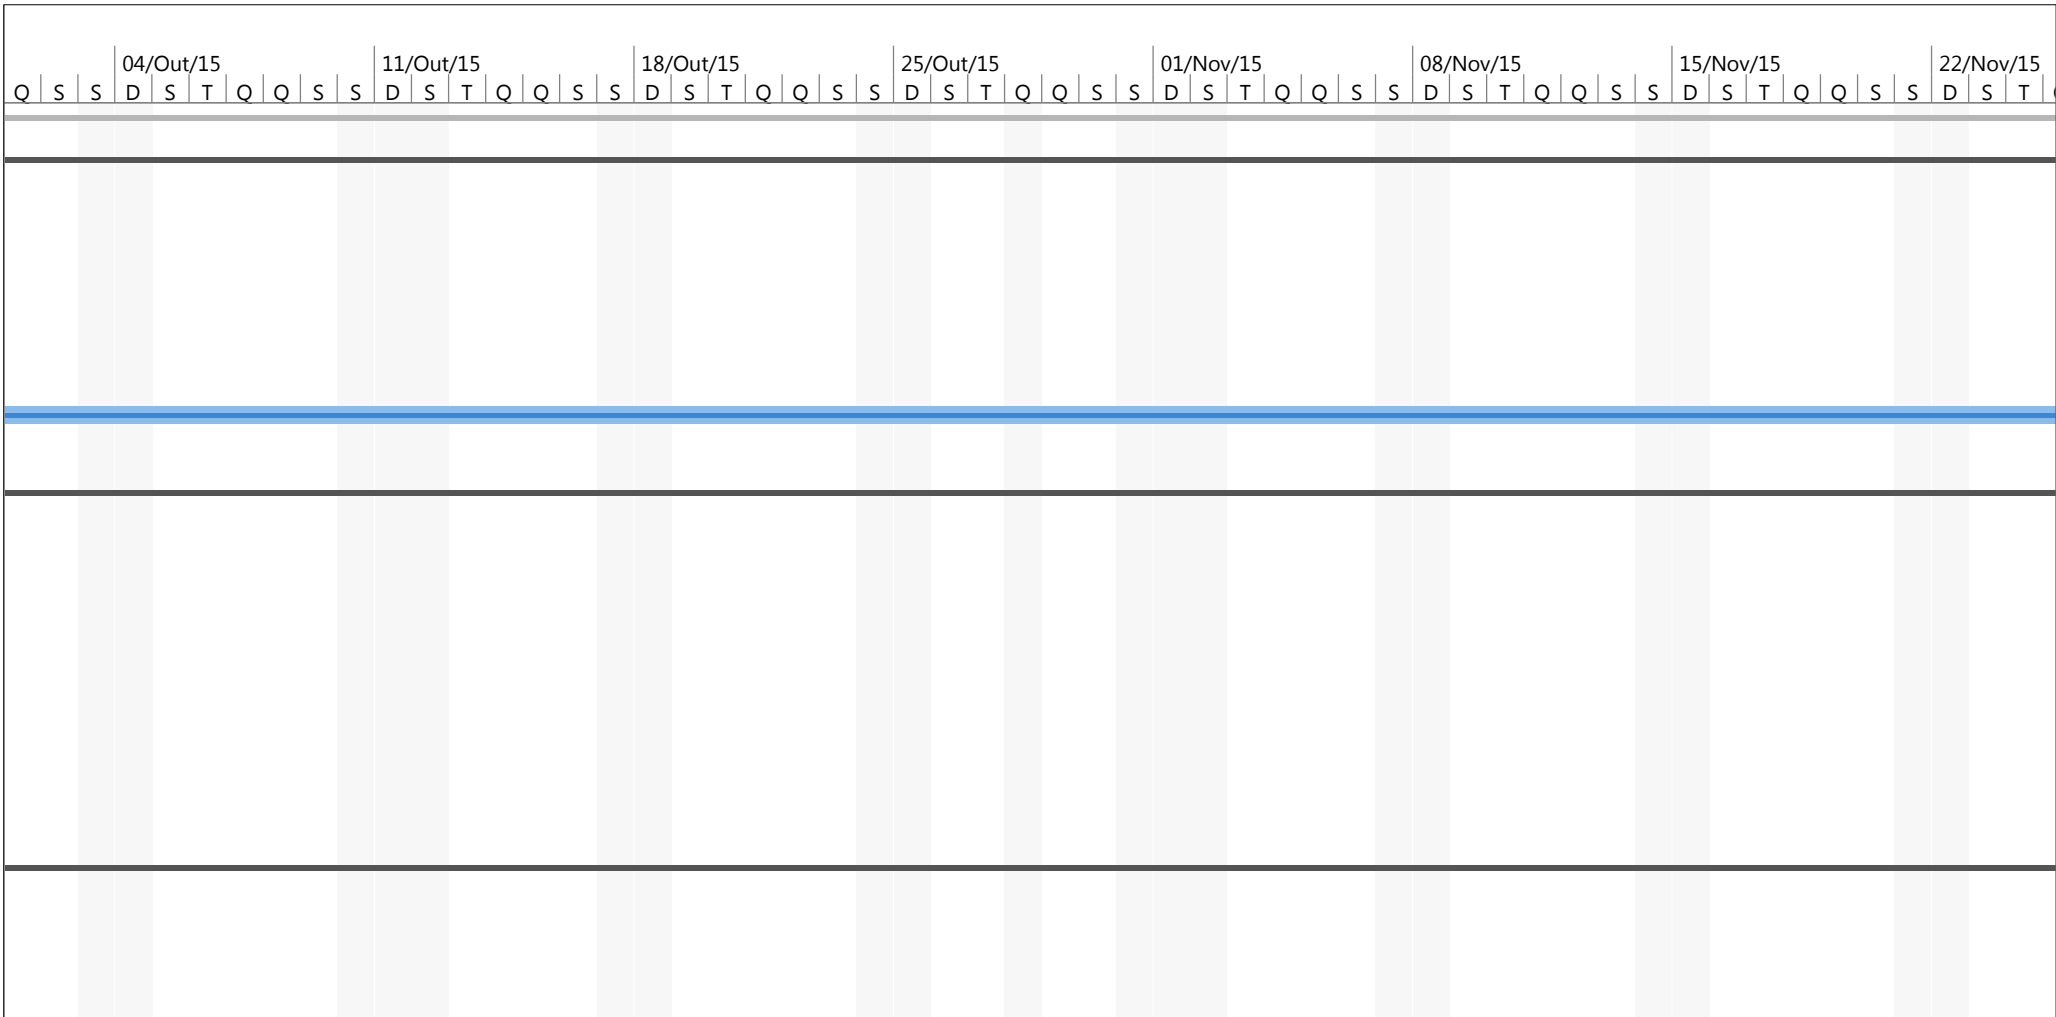


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

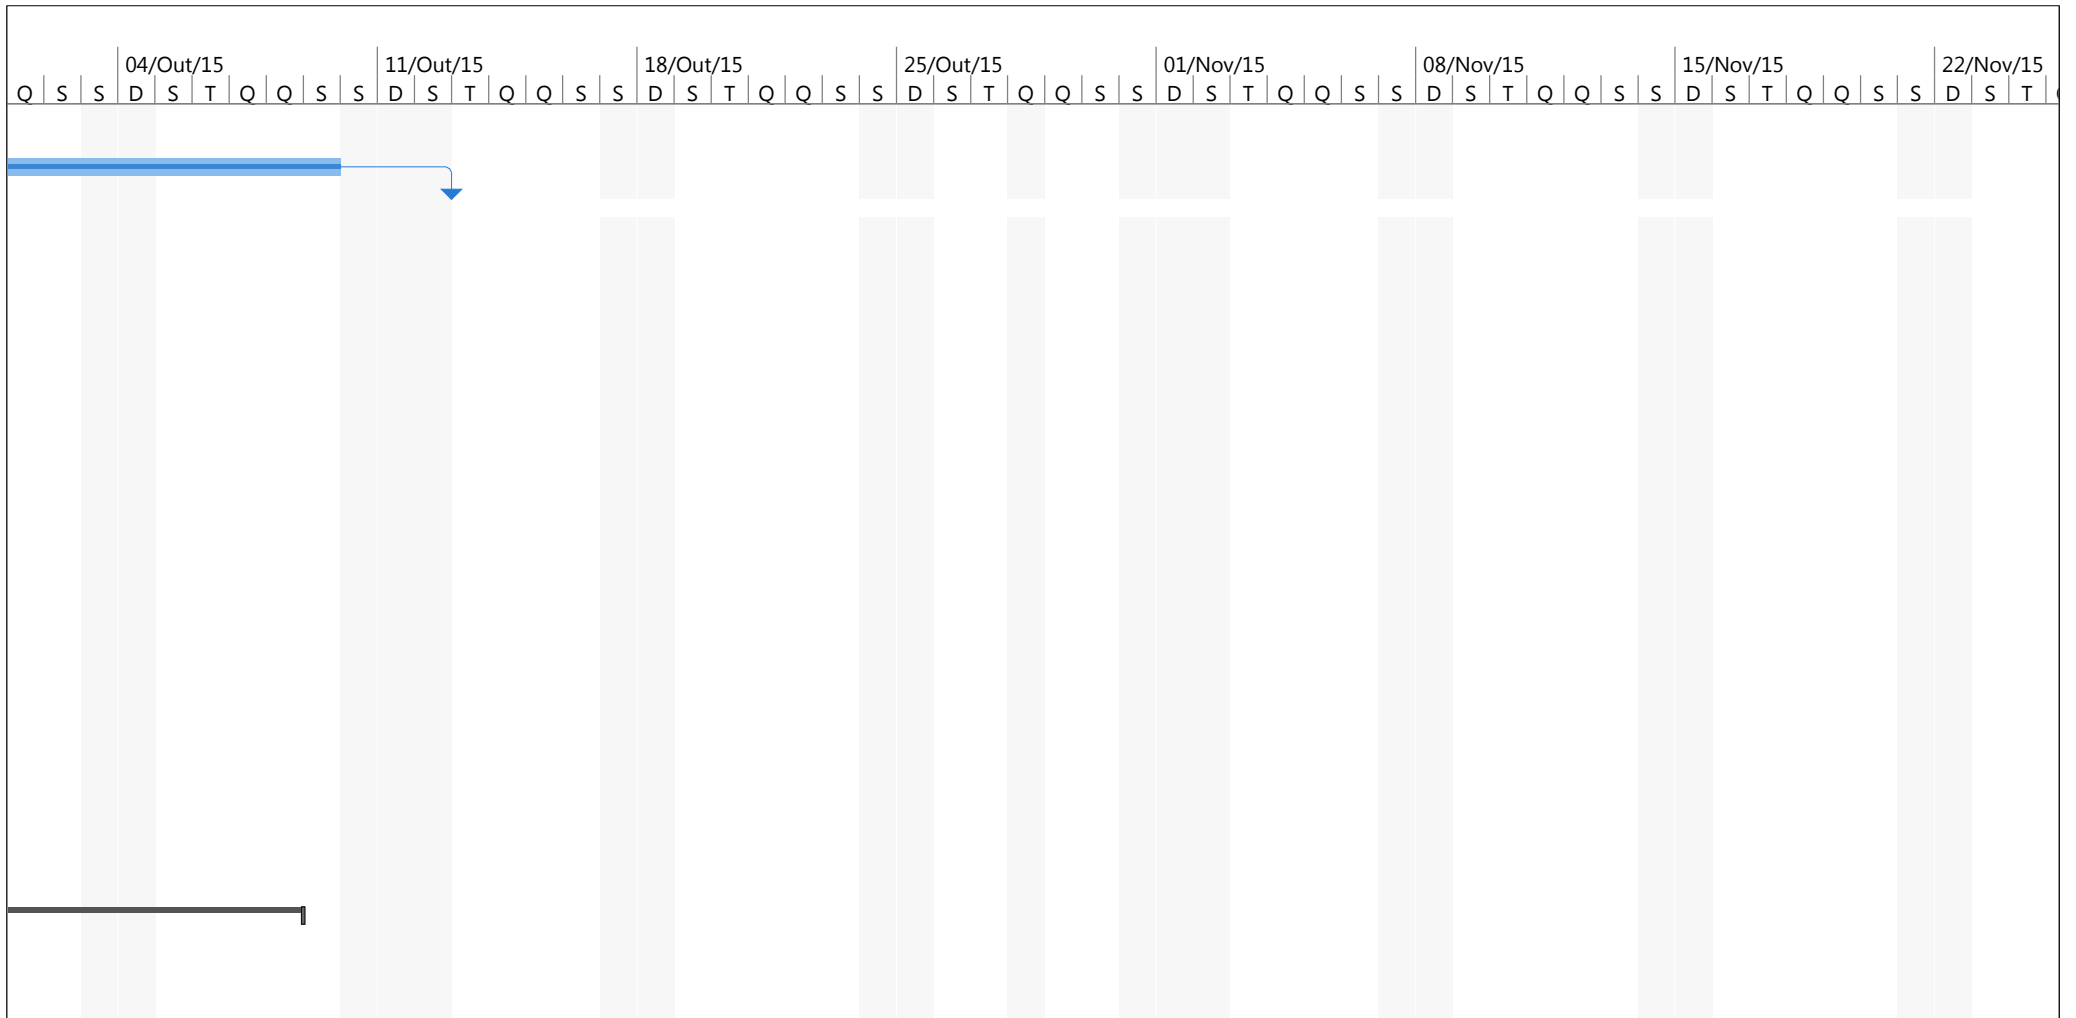


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

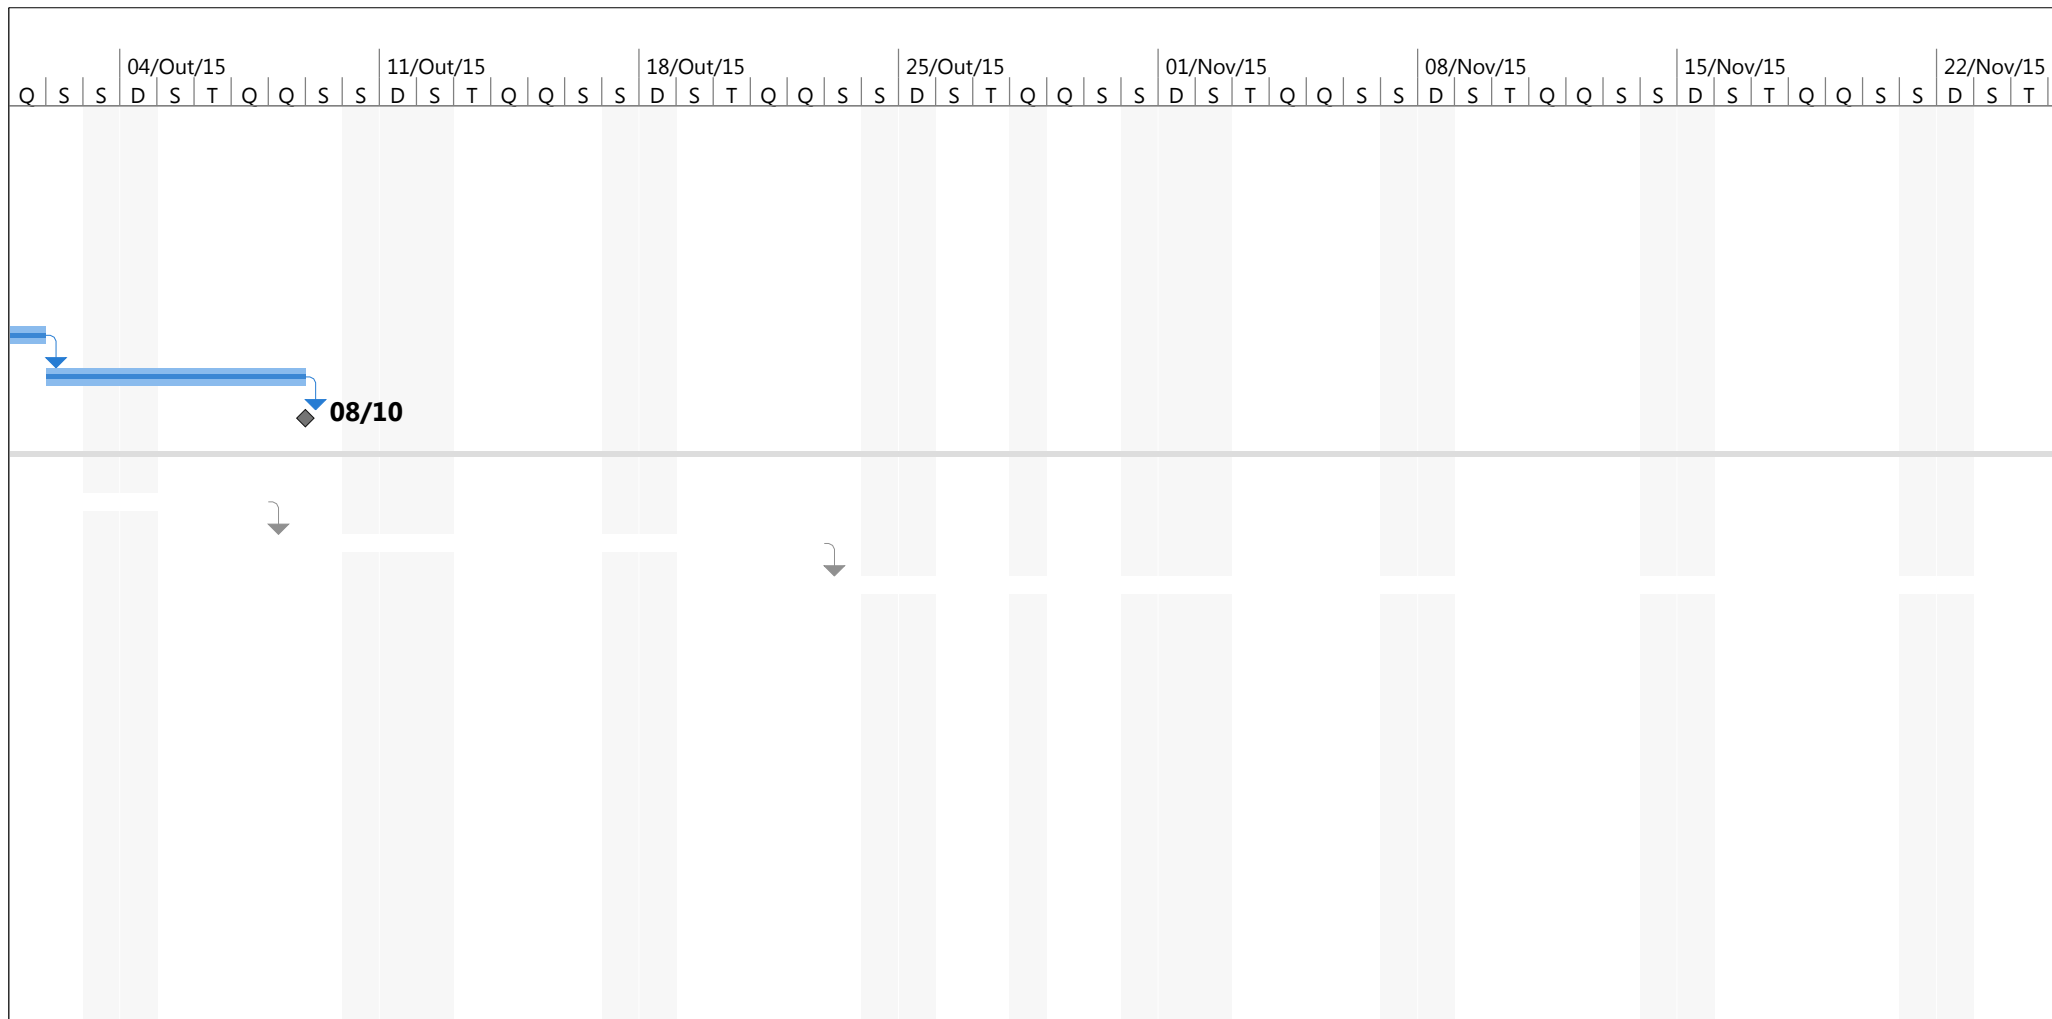


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

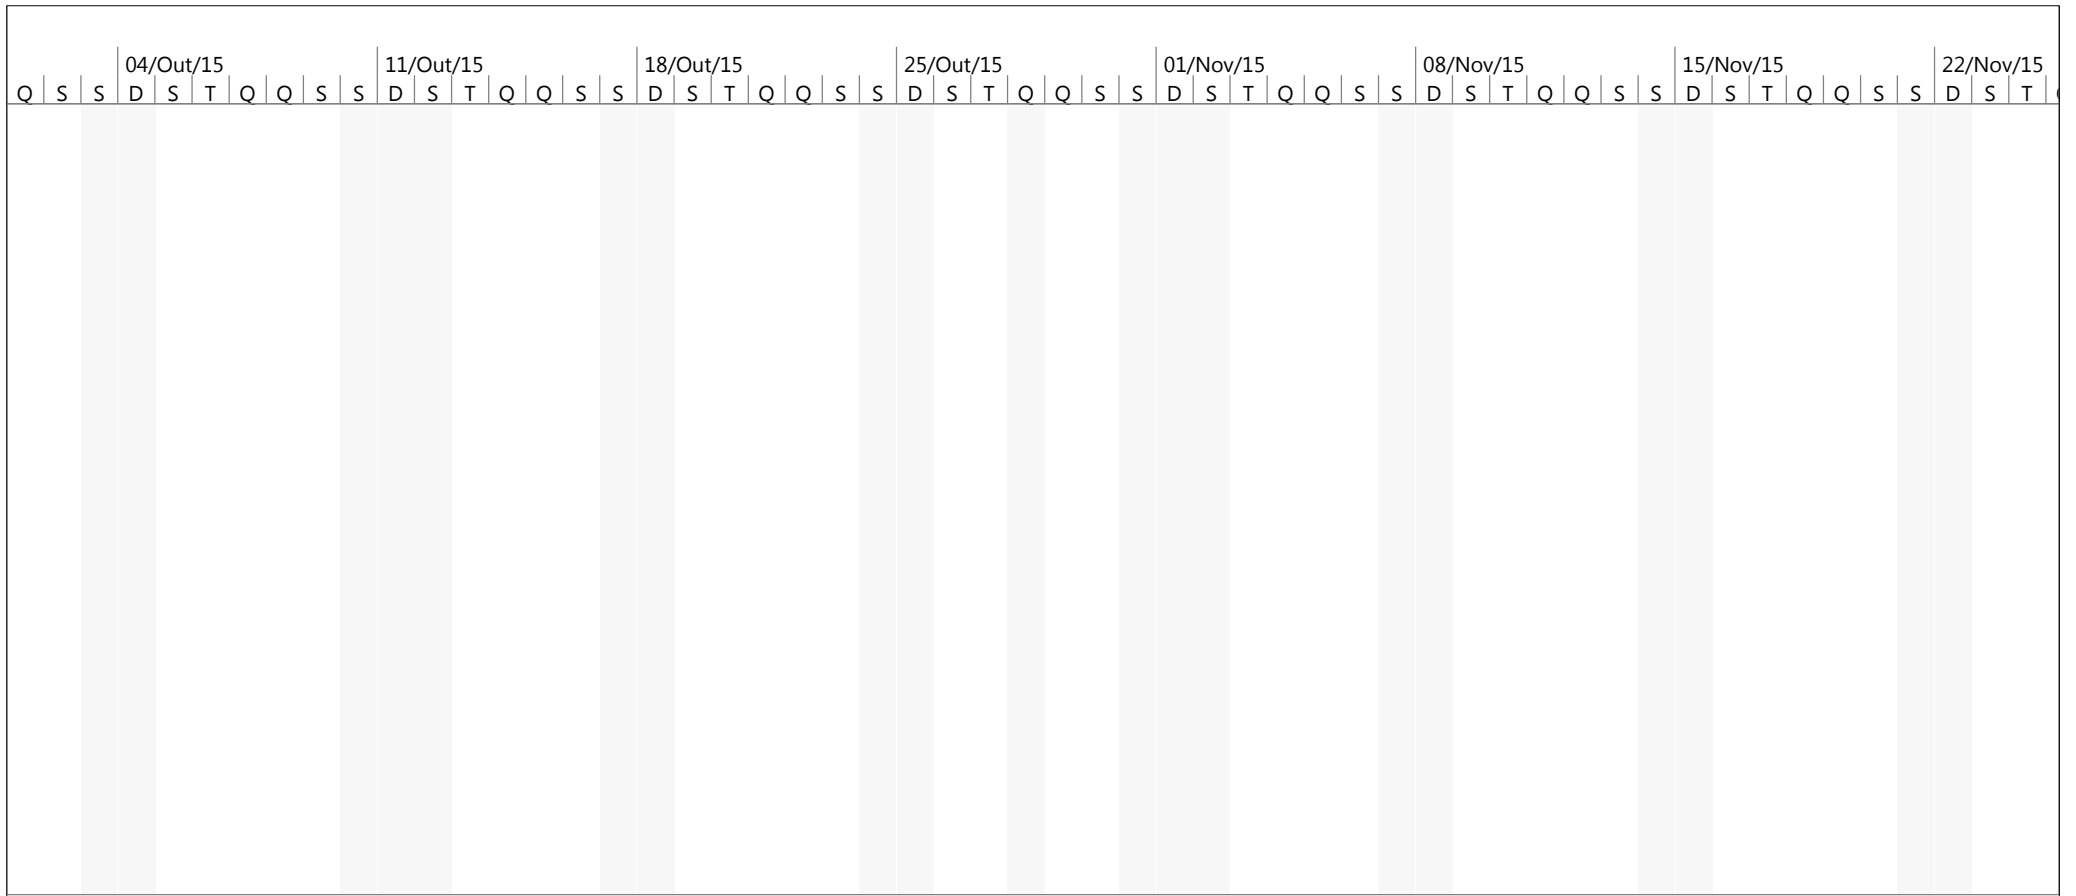


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

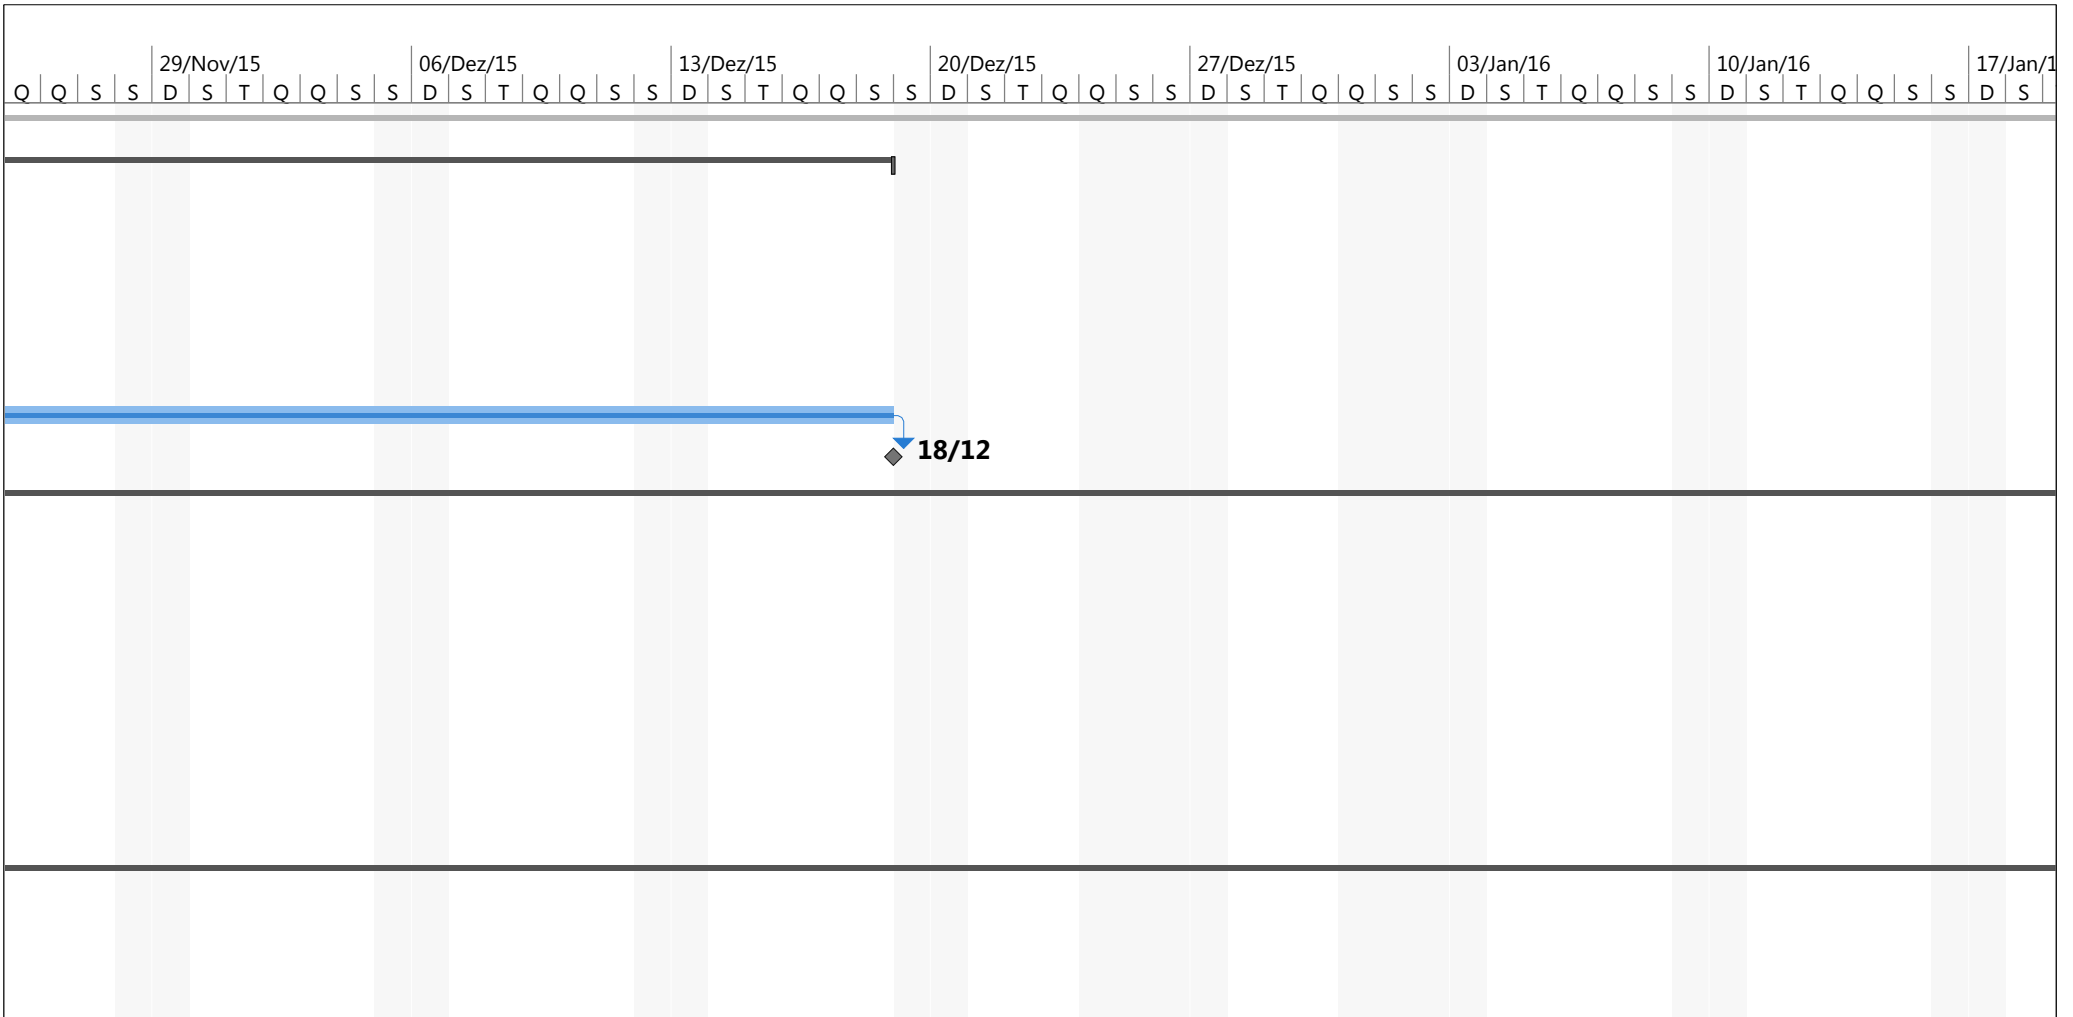


Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				




Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

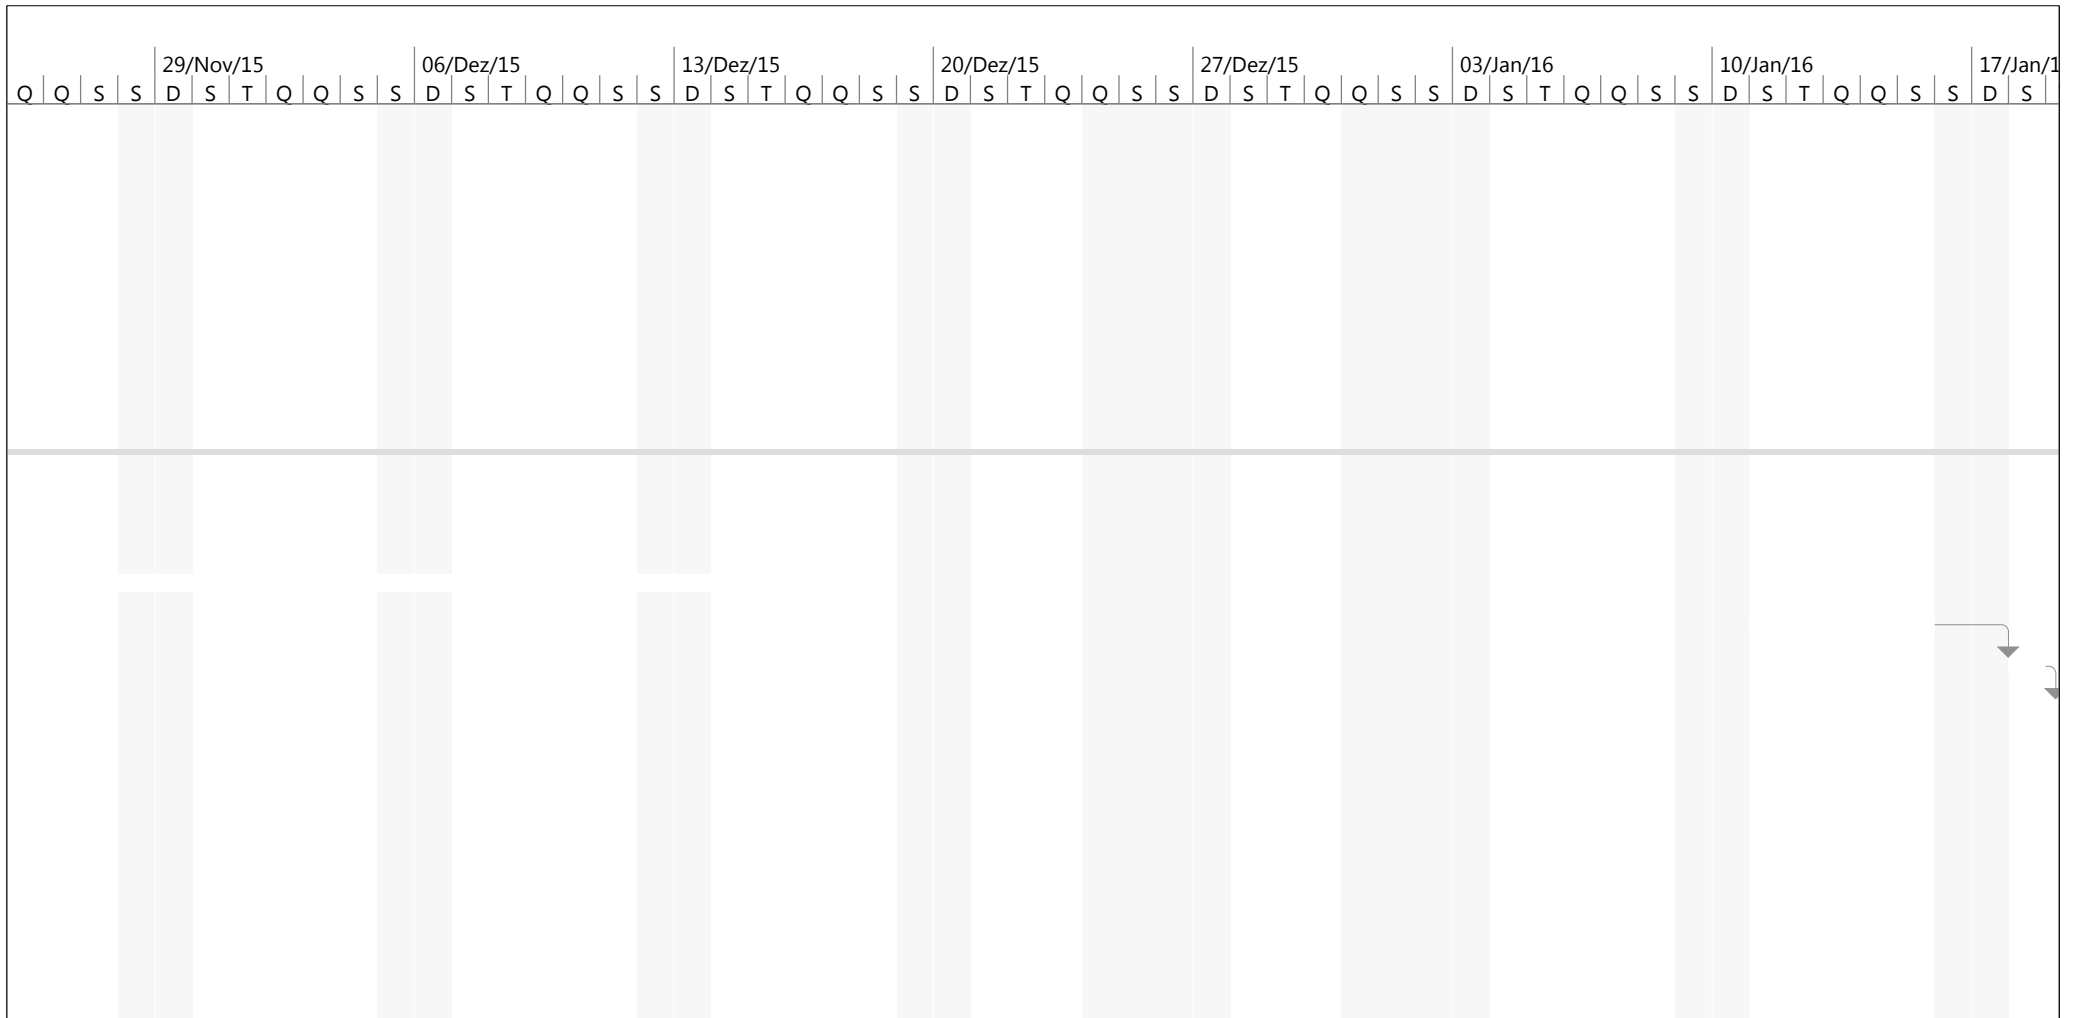


Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

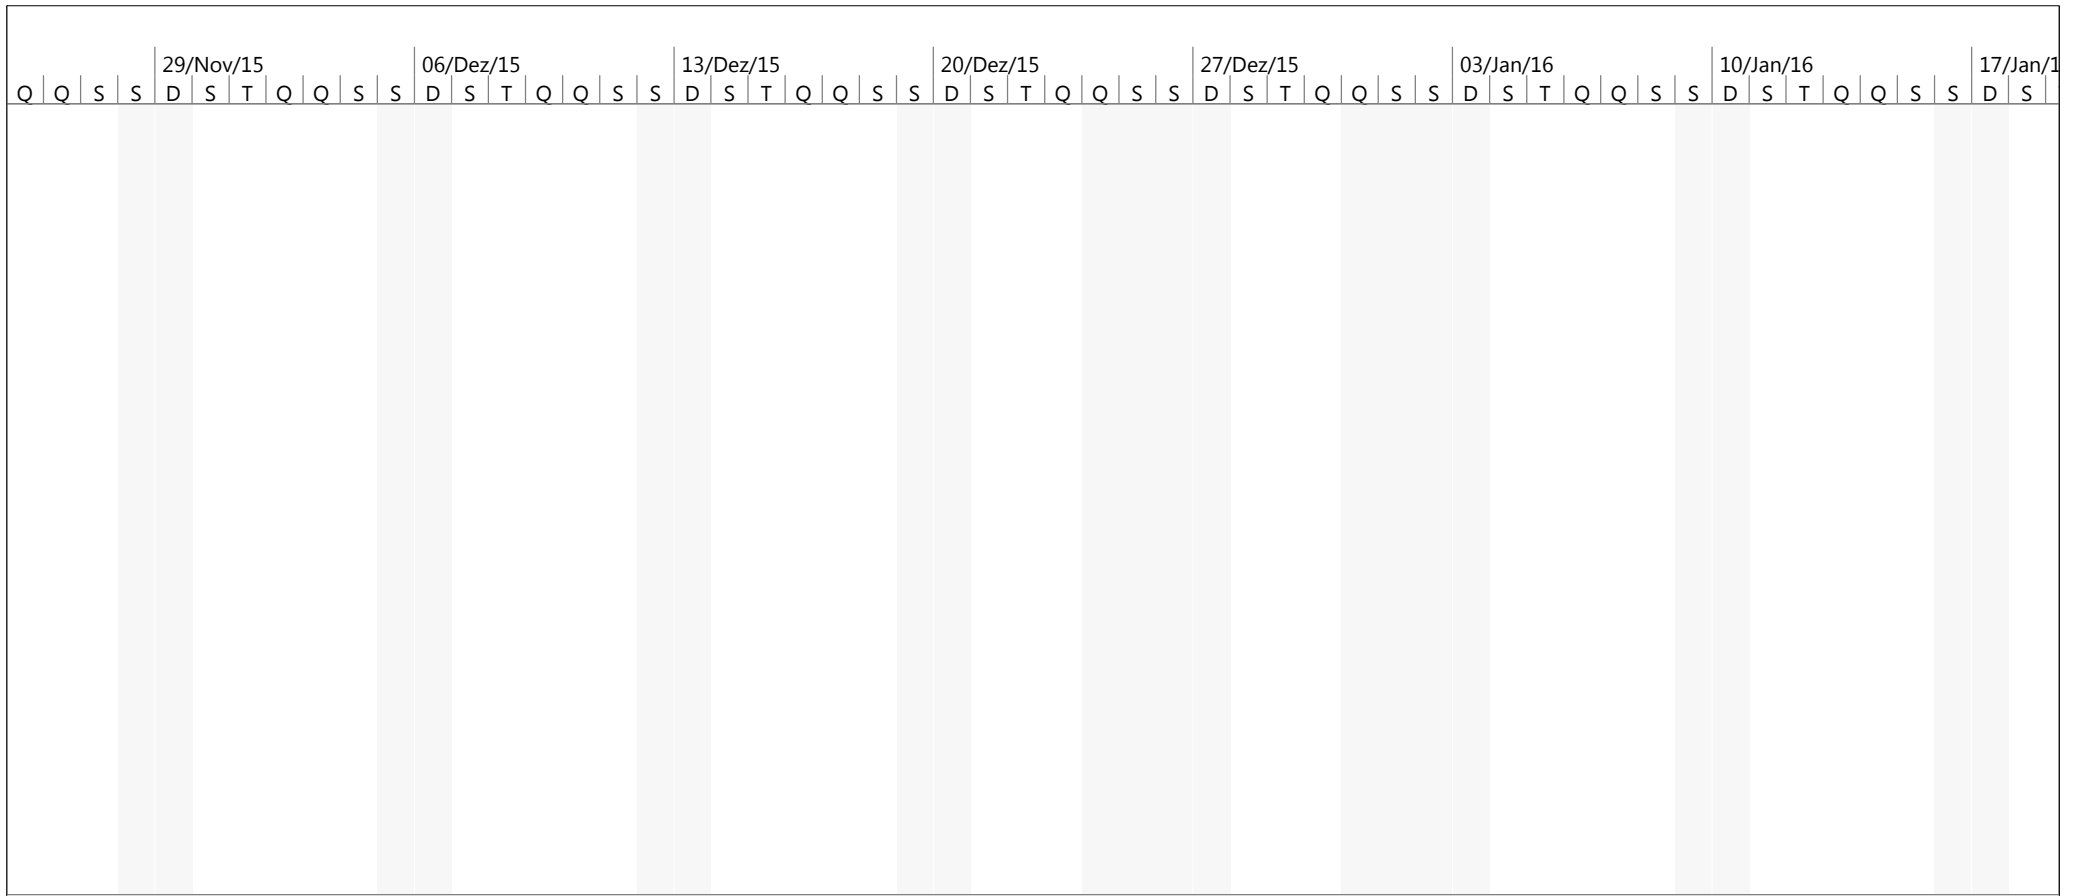







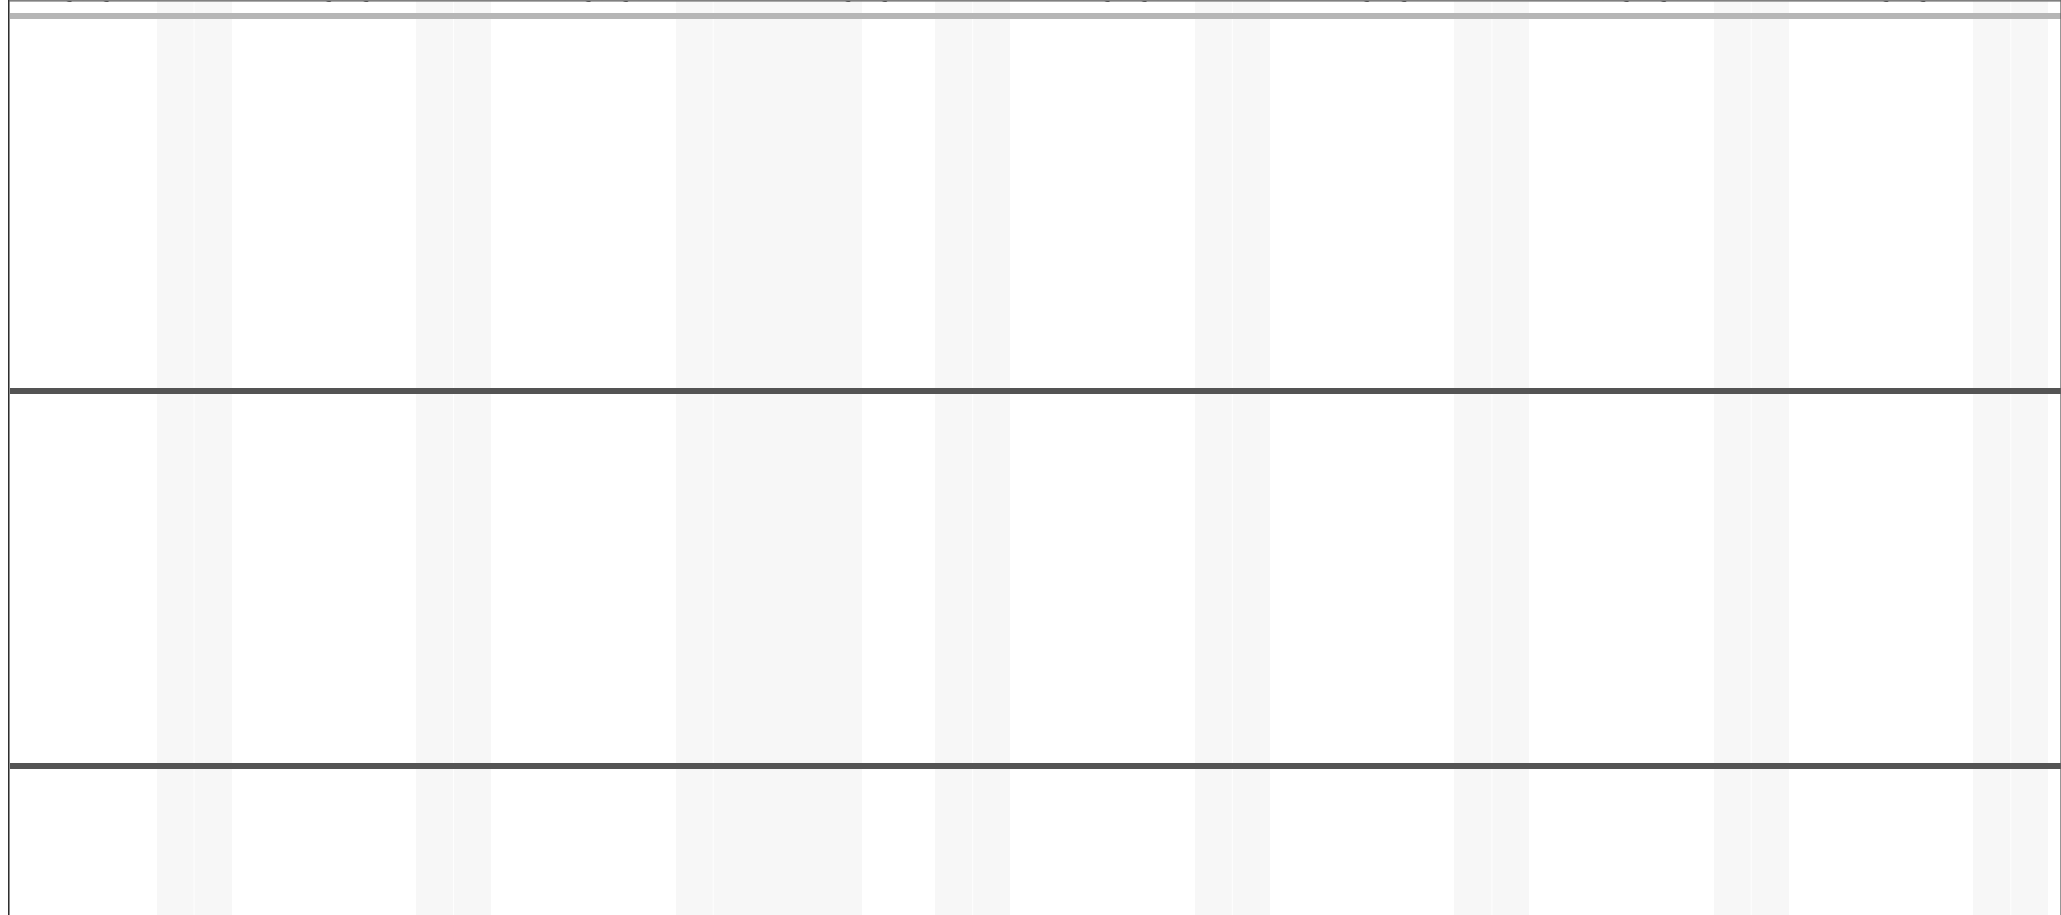











Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

16 | 24/Jan/16 | 31/Jan/16 | 07/Fev/16 | 14/Fev/16 | 21/Fev/16 | 28/Fev/16 | 06/Mar/16 | 13/Mar/16



Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

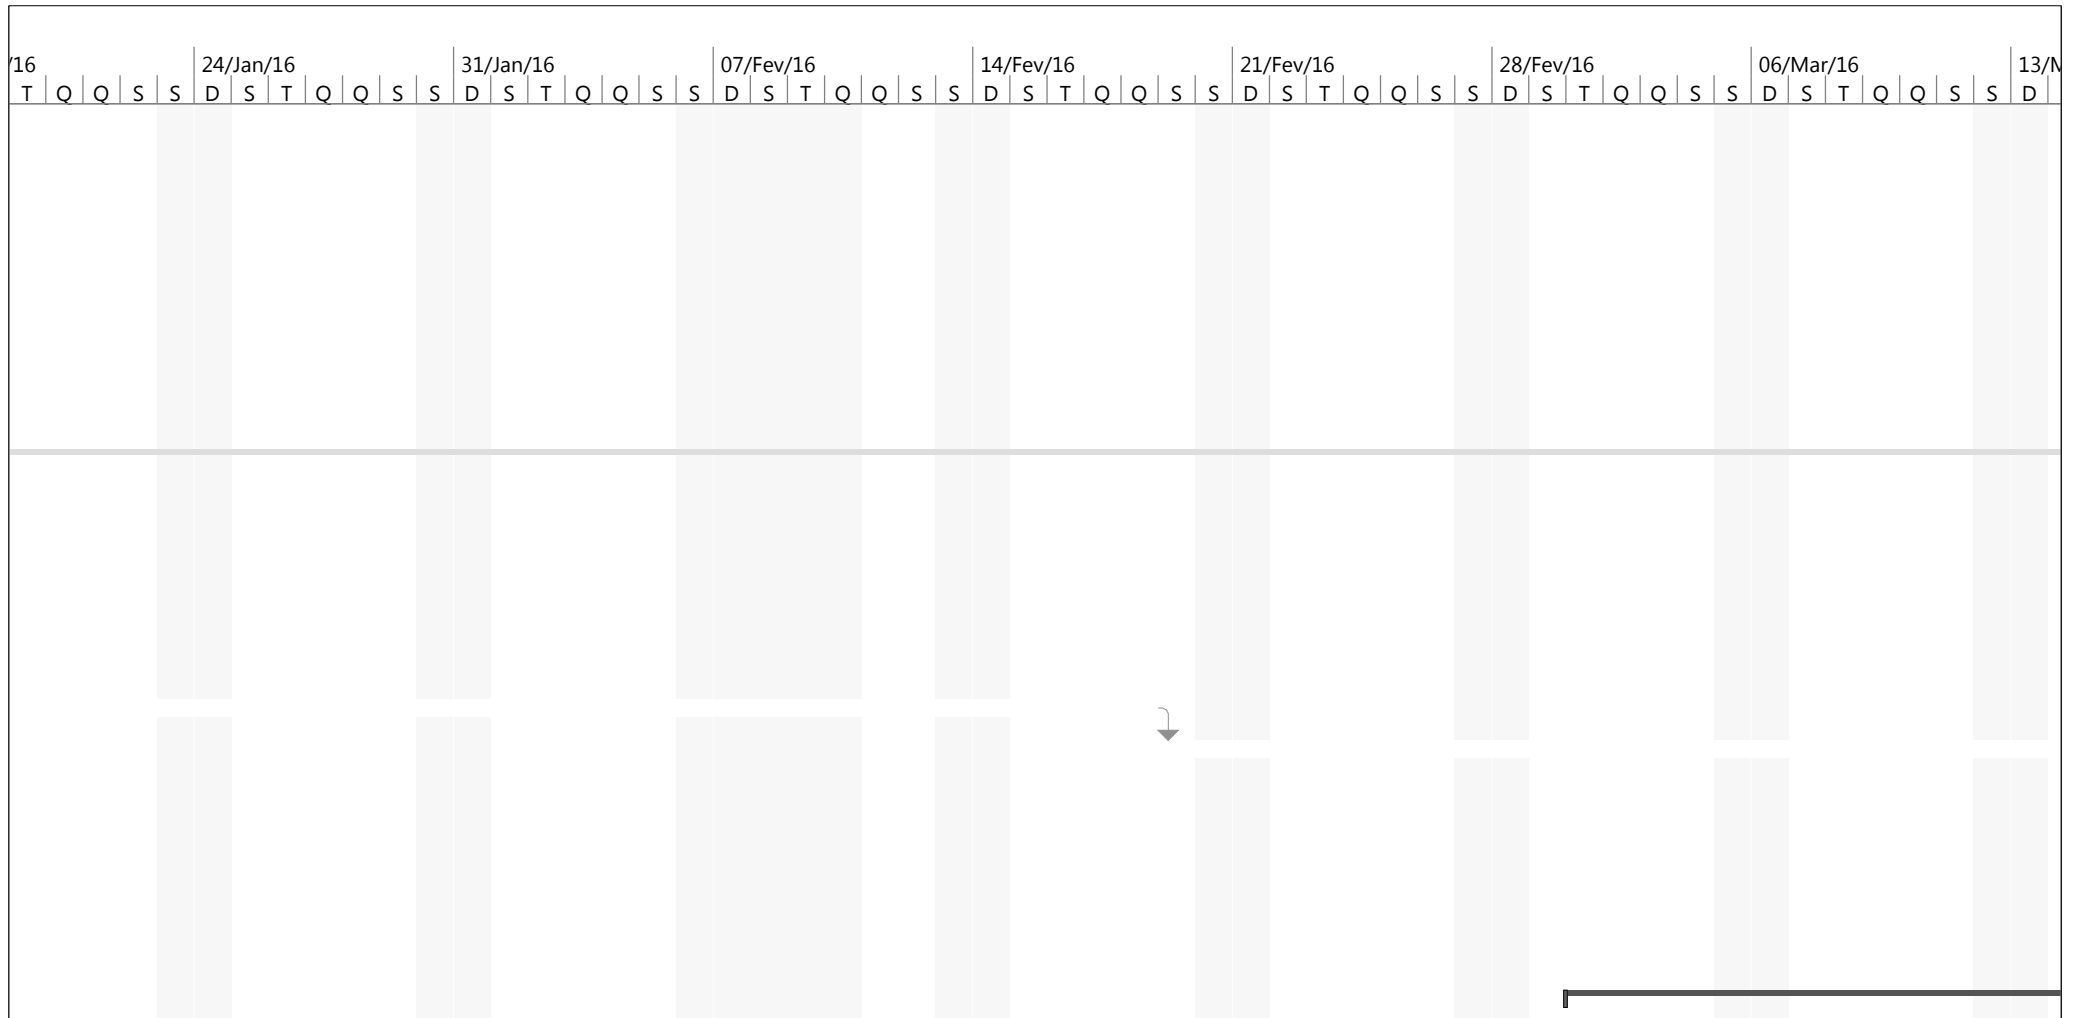

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Mar/16 | 20/Mar/16 | 27/Mar/16 | 03/Abr/16 | 10/Abr/16 | 17/Abr/16 | 24/Abr/16 | 01/Maio/16

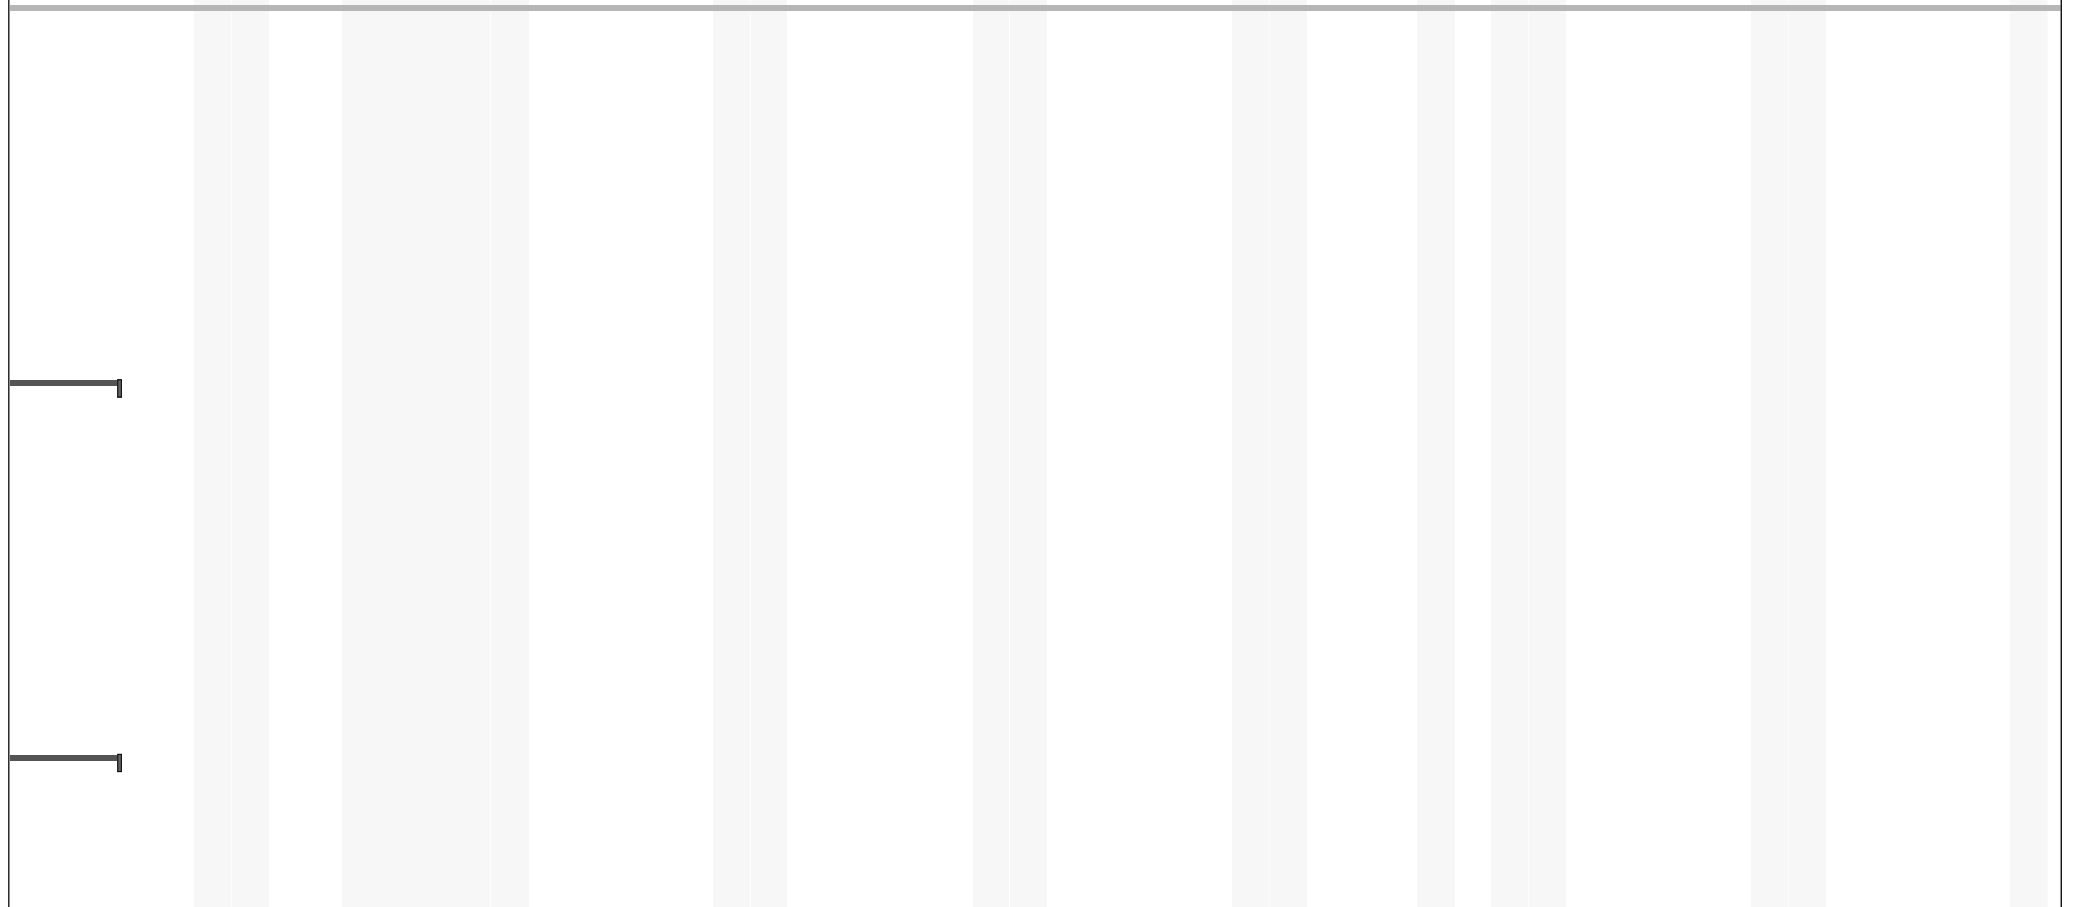



Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

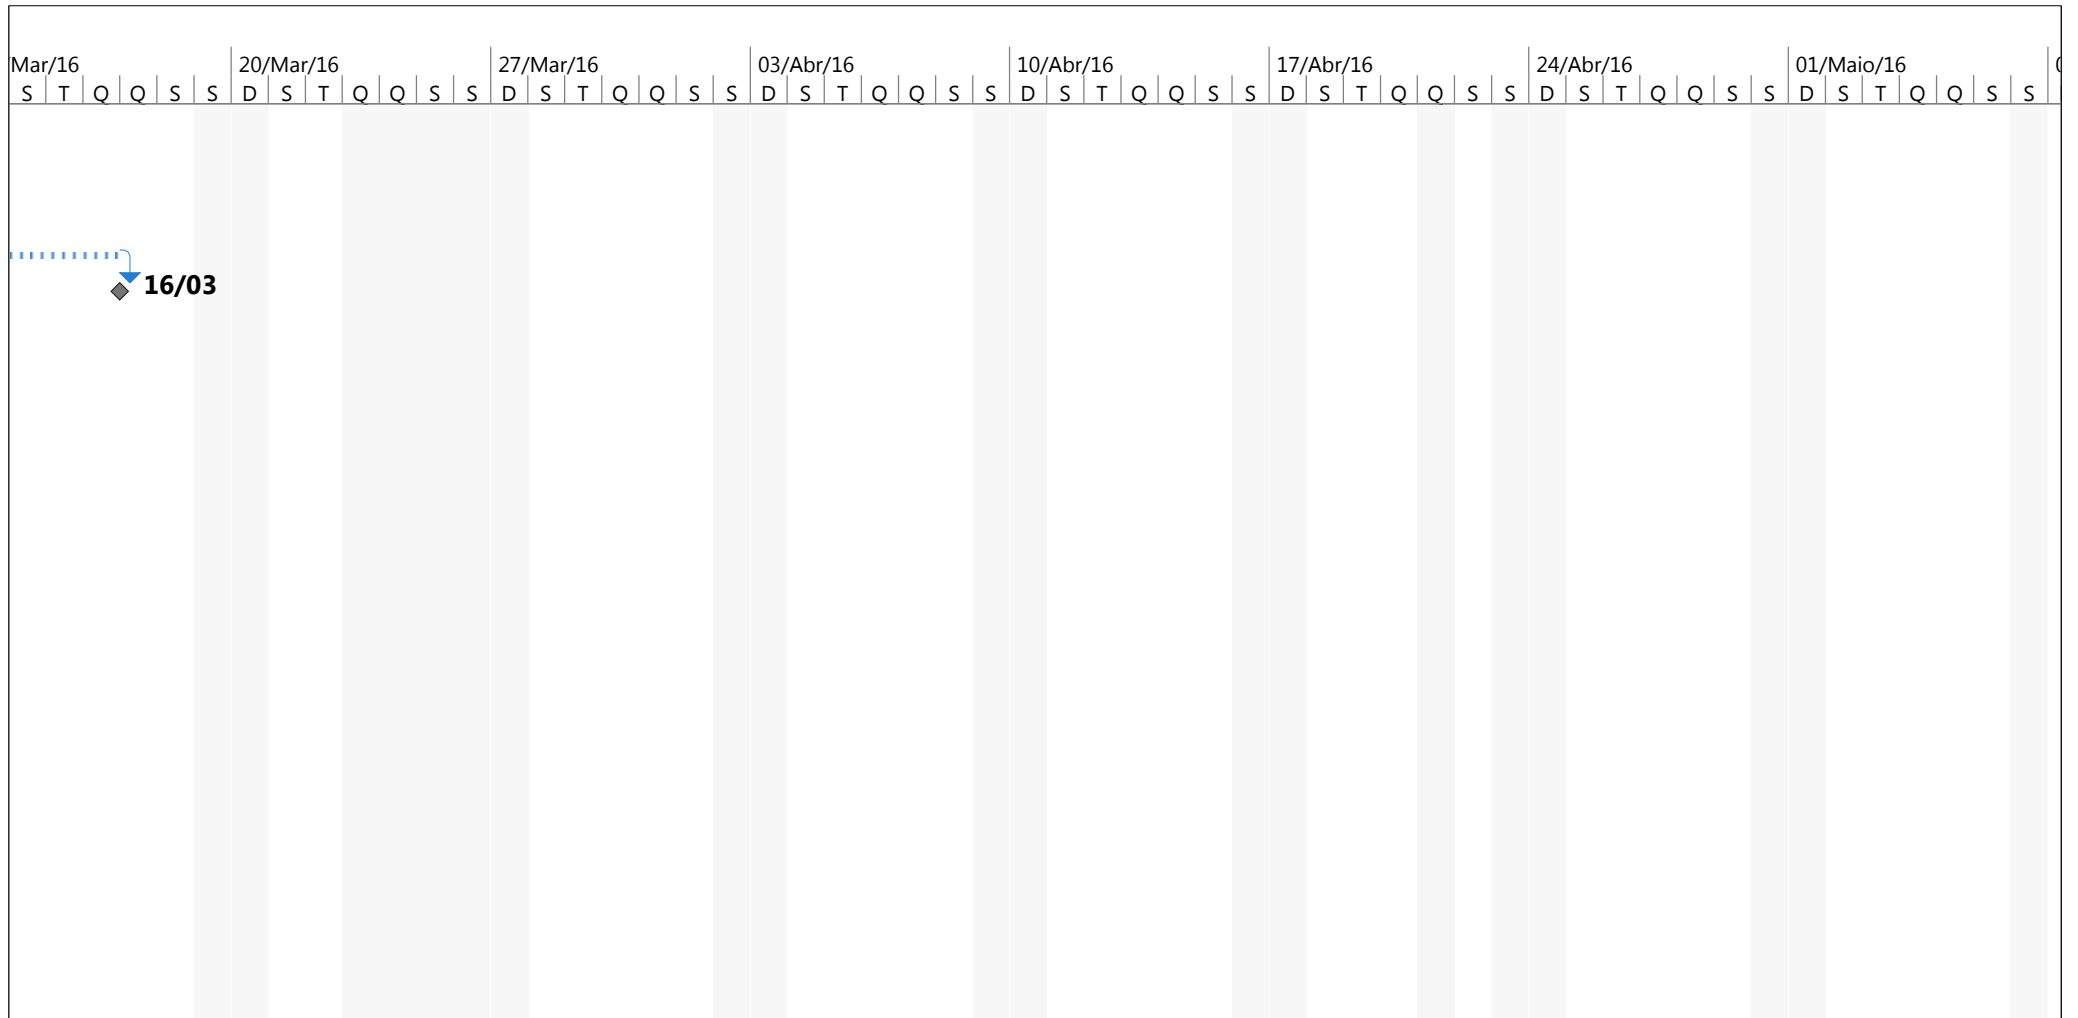

Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

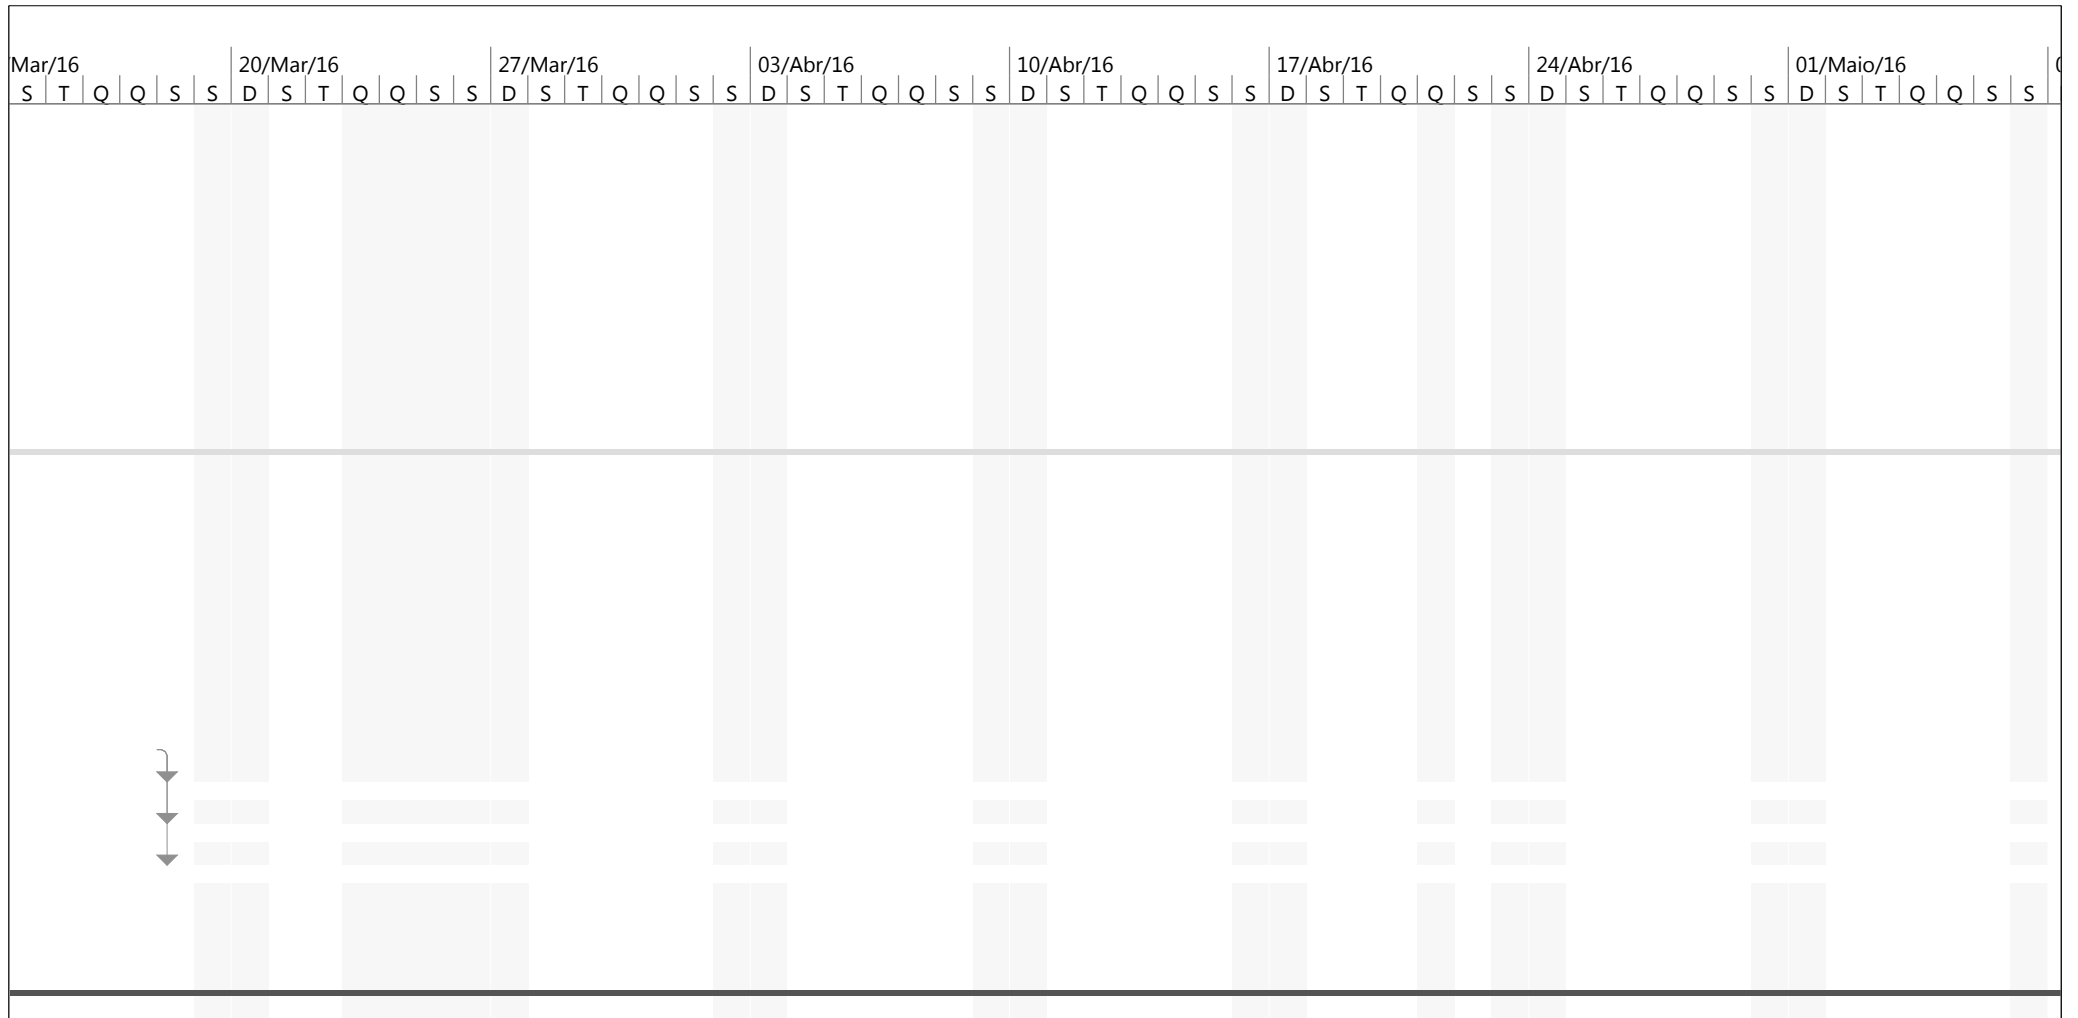


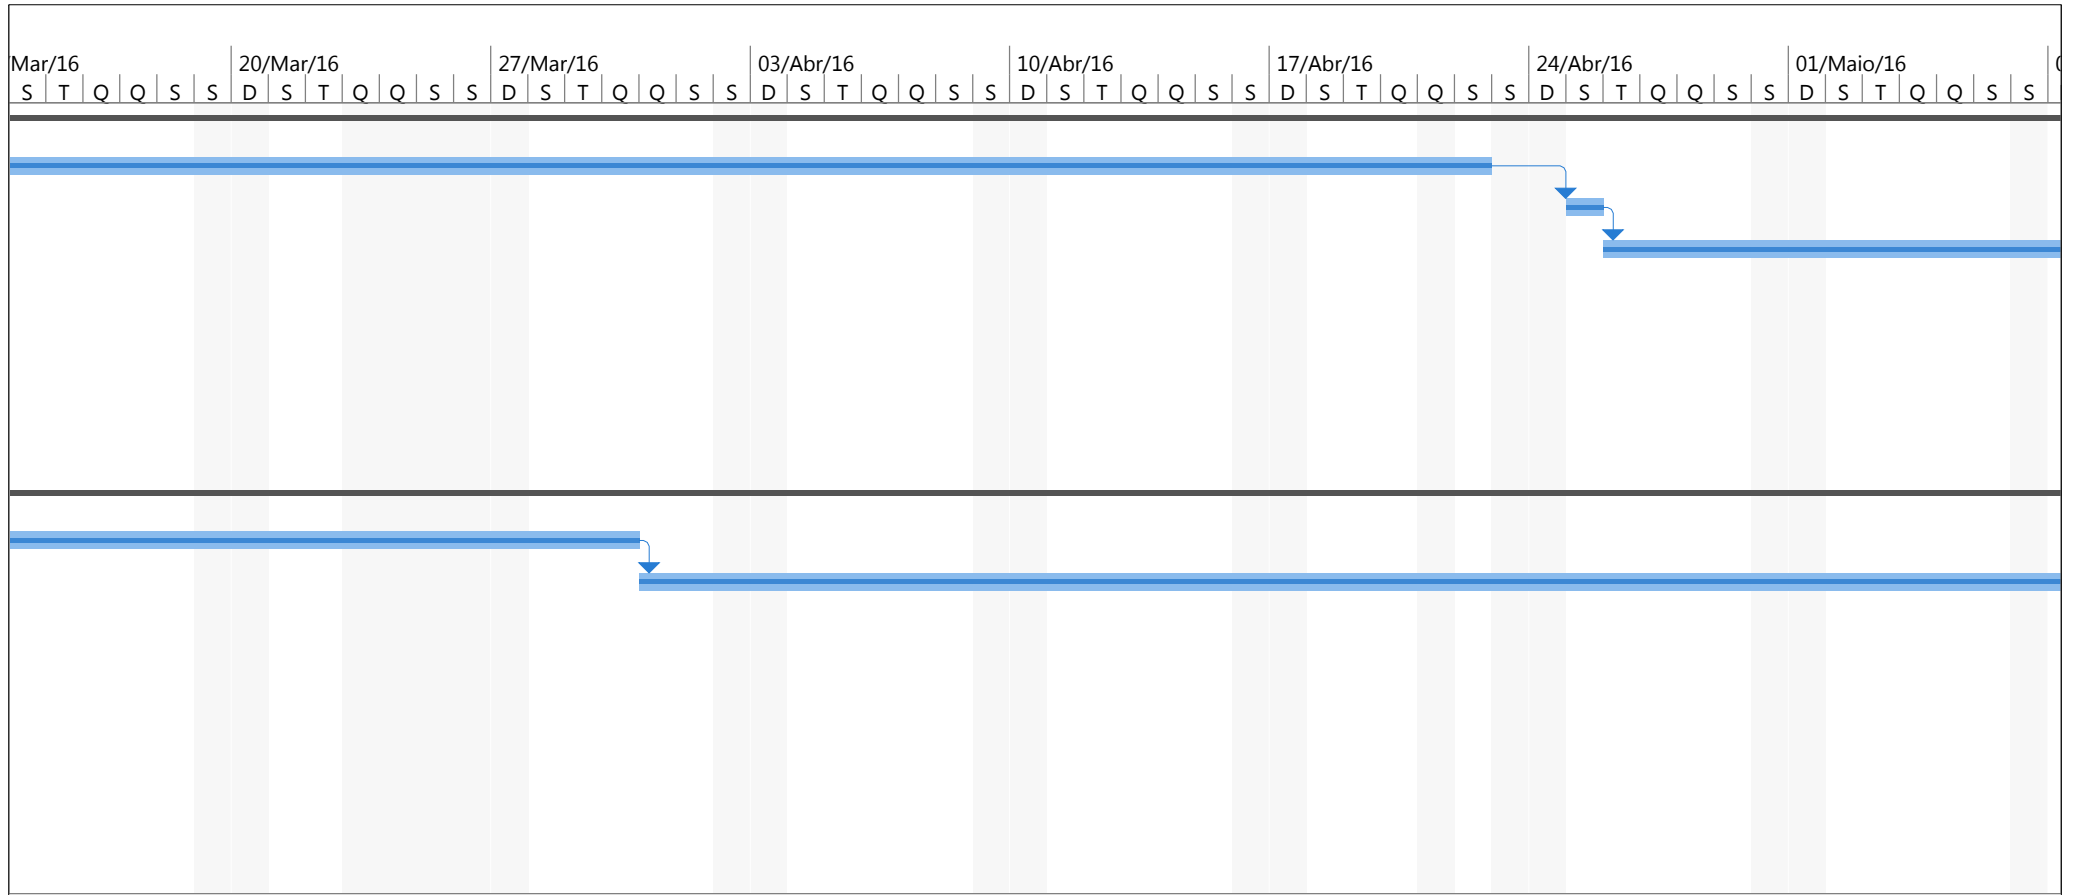

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


08/Maio/16 | 15/Maio/16 | 22/Maio/16 | 29/Maio/16 | 05/Jun/16 | 12/Jun/16 | 19/Jun/16 | 26/Jun/16
D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S

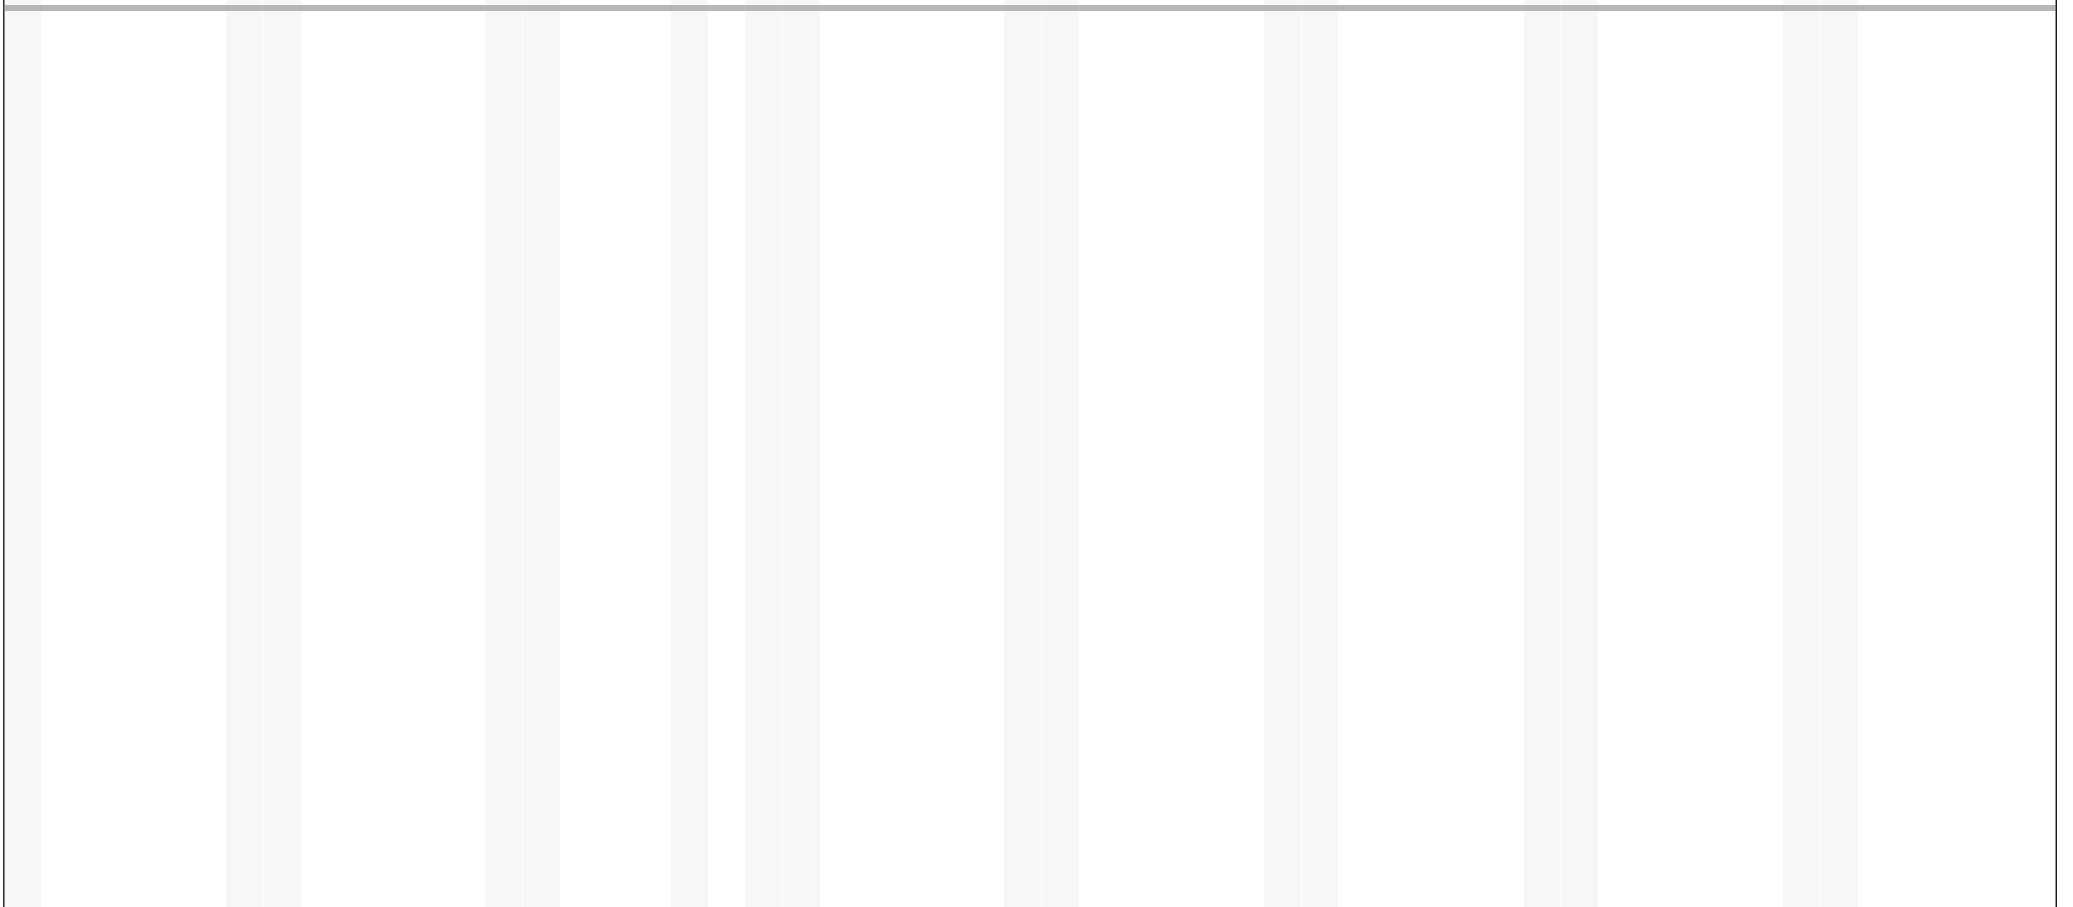

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


08/Maio/16 | 15/Maio/16 | 22/Maio/16 | 29/Maio/16 | 05/Jun/16 | 12/Jun/16 | 19/Jun/16 | 26/Jun/16
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

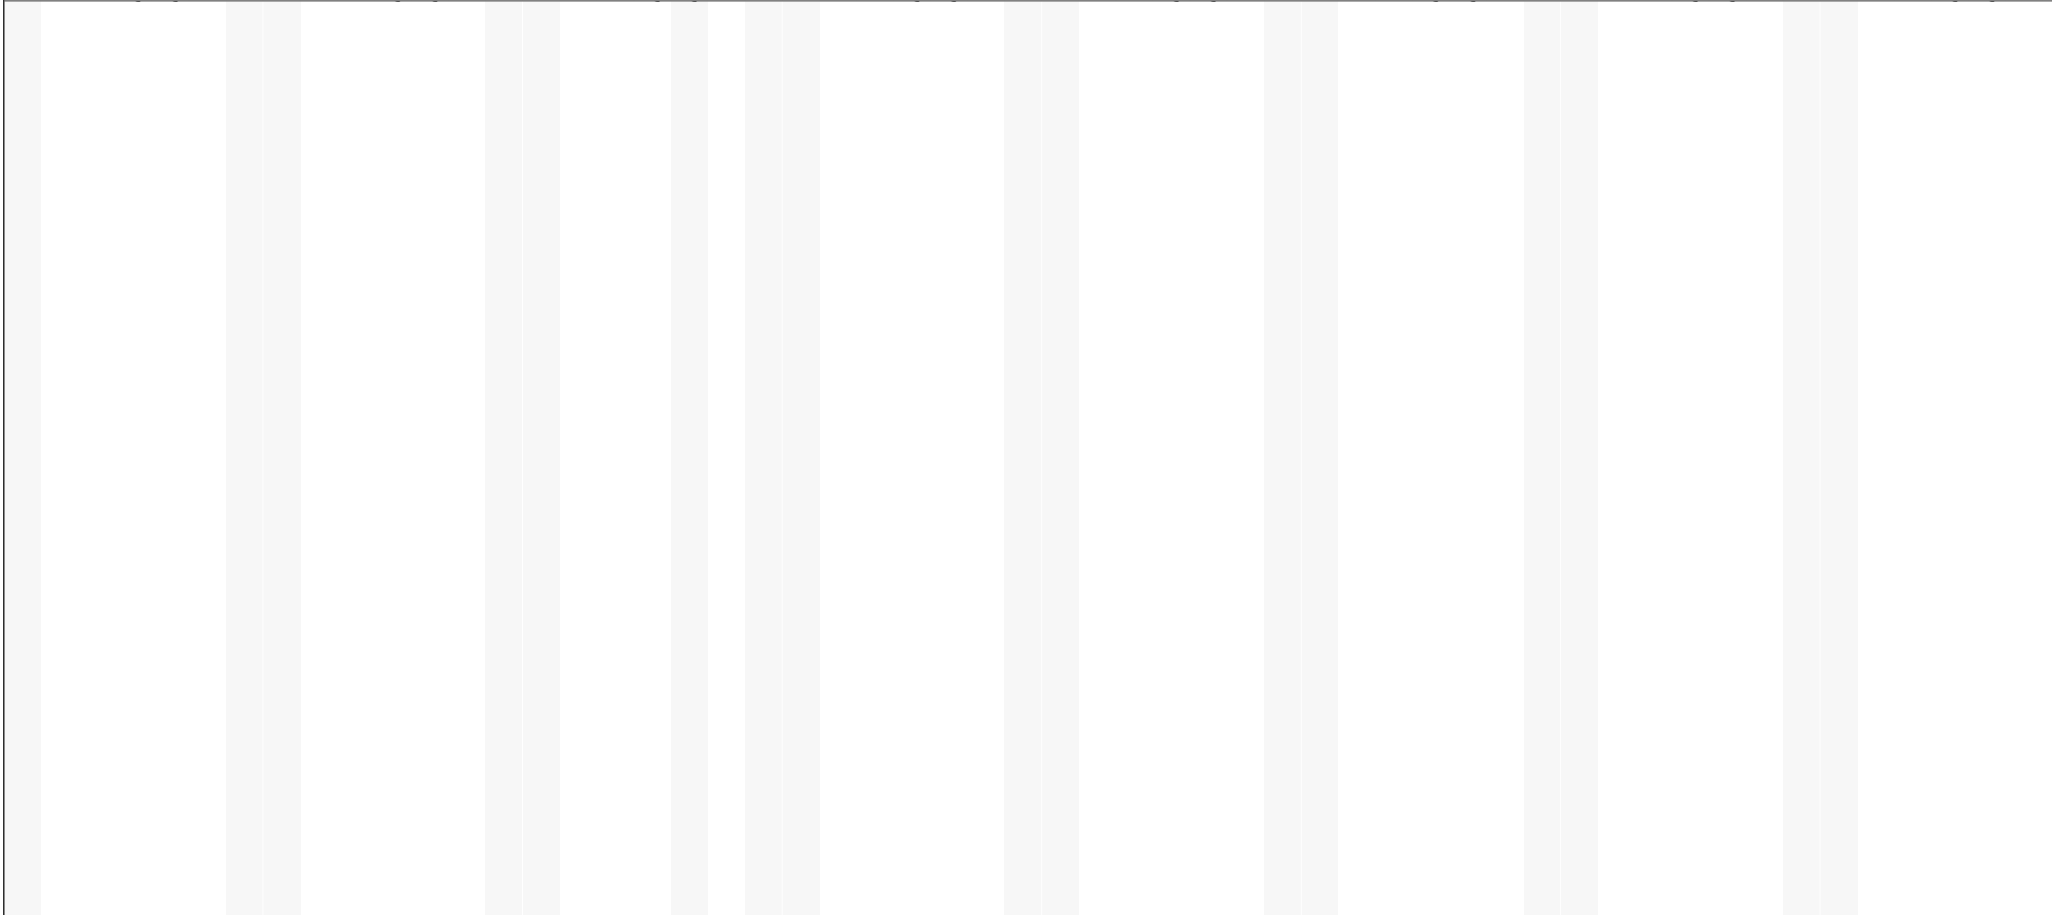

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

08/Maio/16 | 15/Maio/16 | 22/Maio/16 | 29/Maio/16 | 05/Jun/16 | 12/Jun/16 | 19/Jun/16 | 26/Jun/16
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S


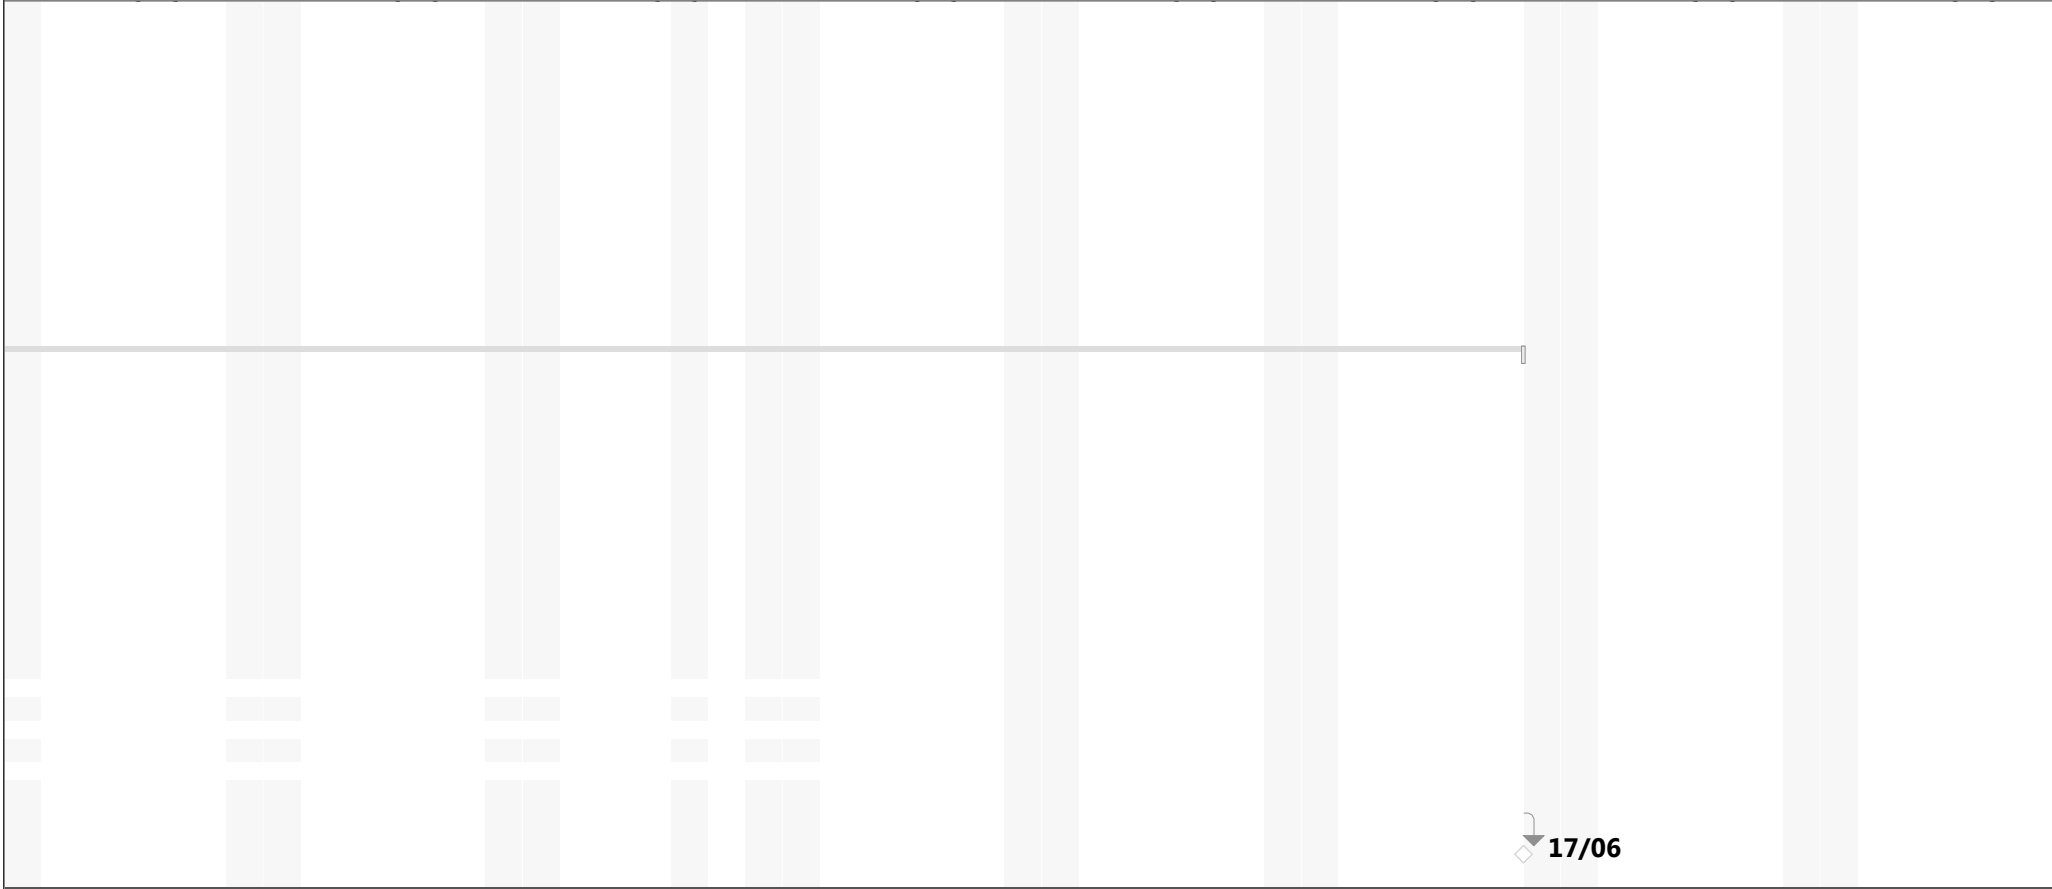


◇ 17/06

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

08/Maio/16 | 15/Maio/16 | 22/Maio/16 | 29/Maio/16 | 05/Jun/16 | 12/Jun/16 | 19/Jun/16 | 26/Jun/16
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

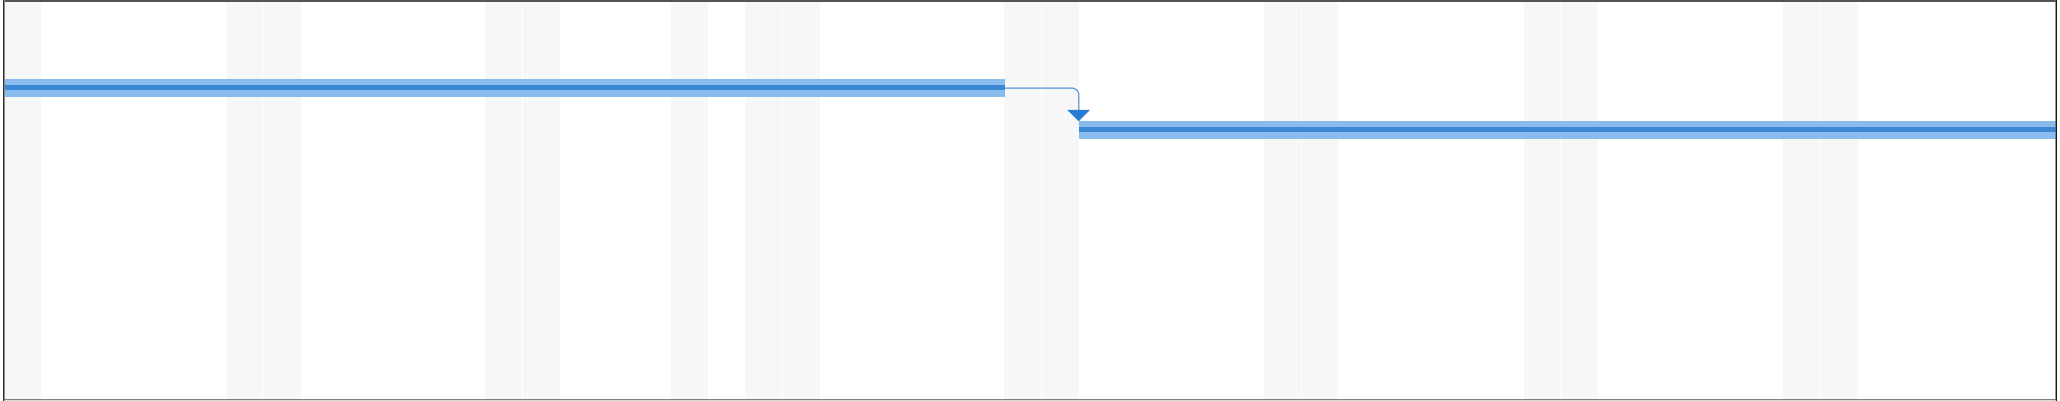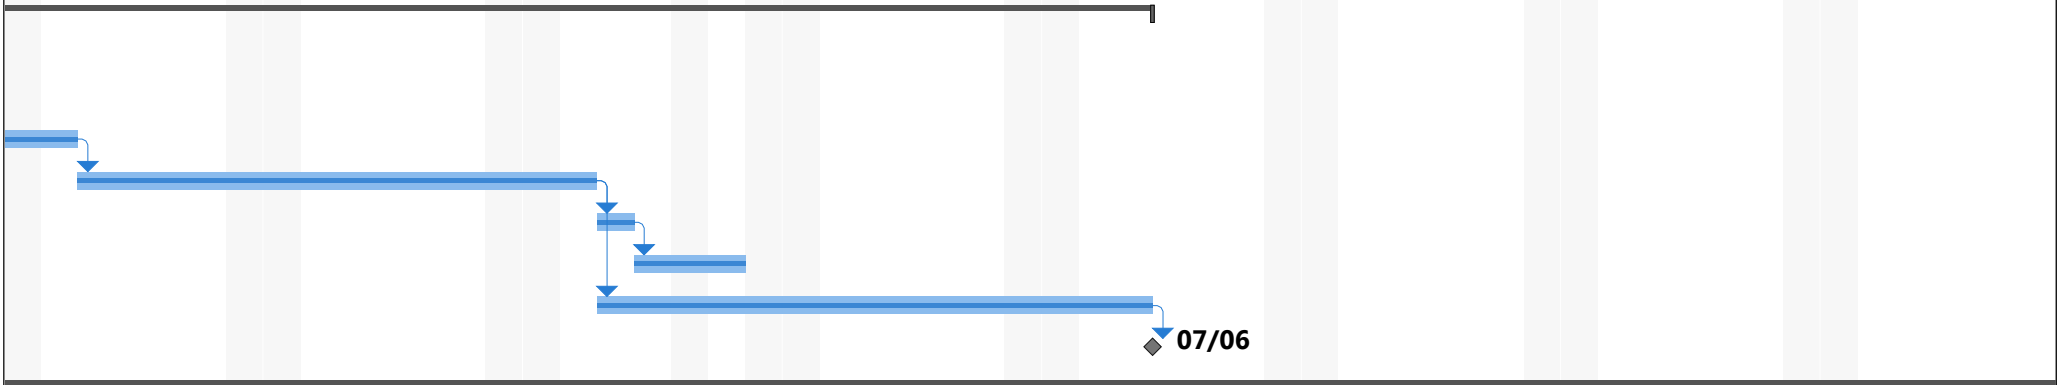

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


03/Jul/16 10/Jul/16 17/Jul/16 24/Jul/16 31/Jul/16 07/Ago/16 14/Ago/16 21/Ago/16

S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S




Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

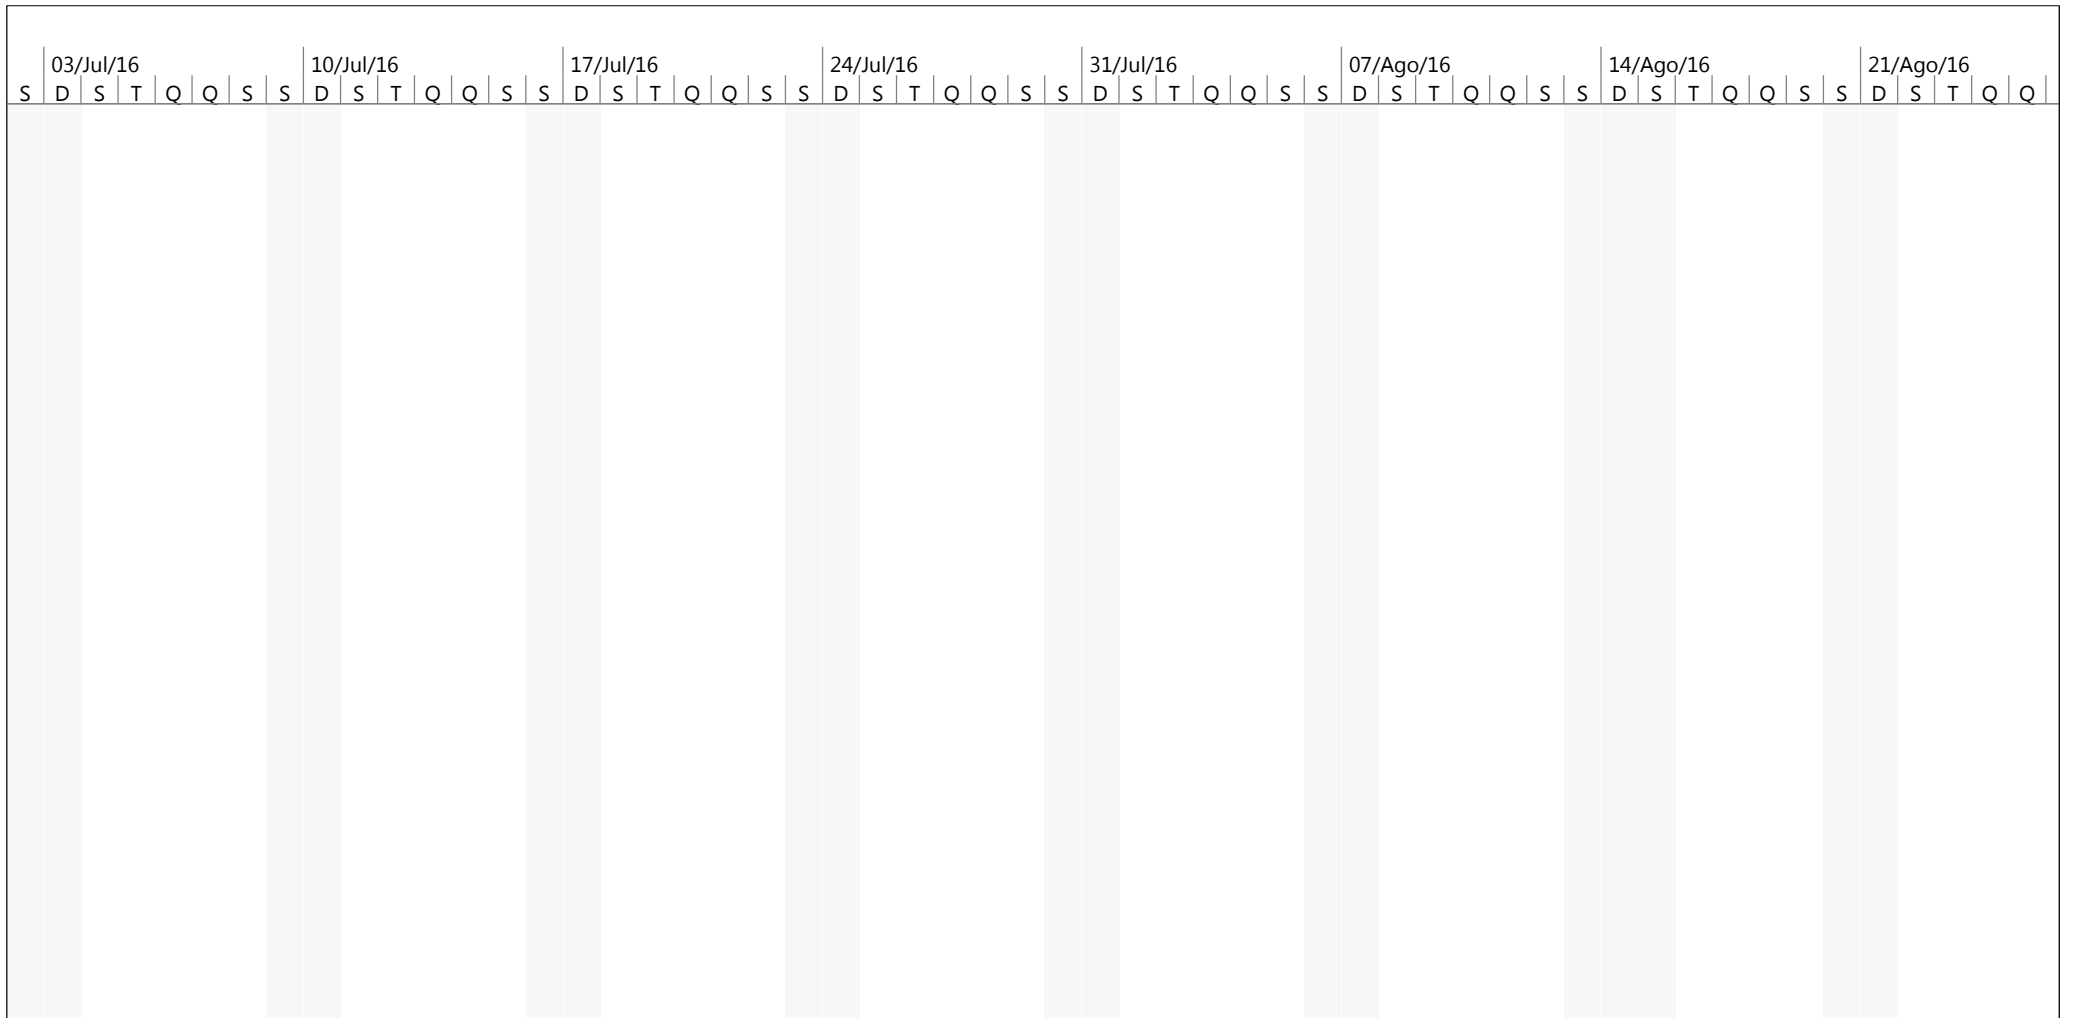


Projeto: AMBIENTE DA GENTE Data: Qui 11/05/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

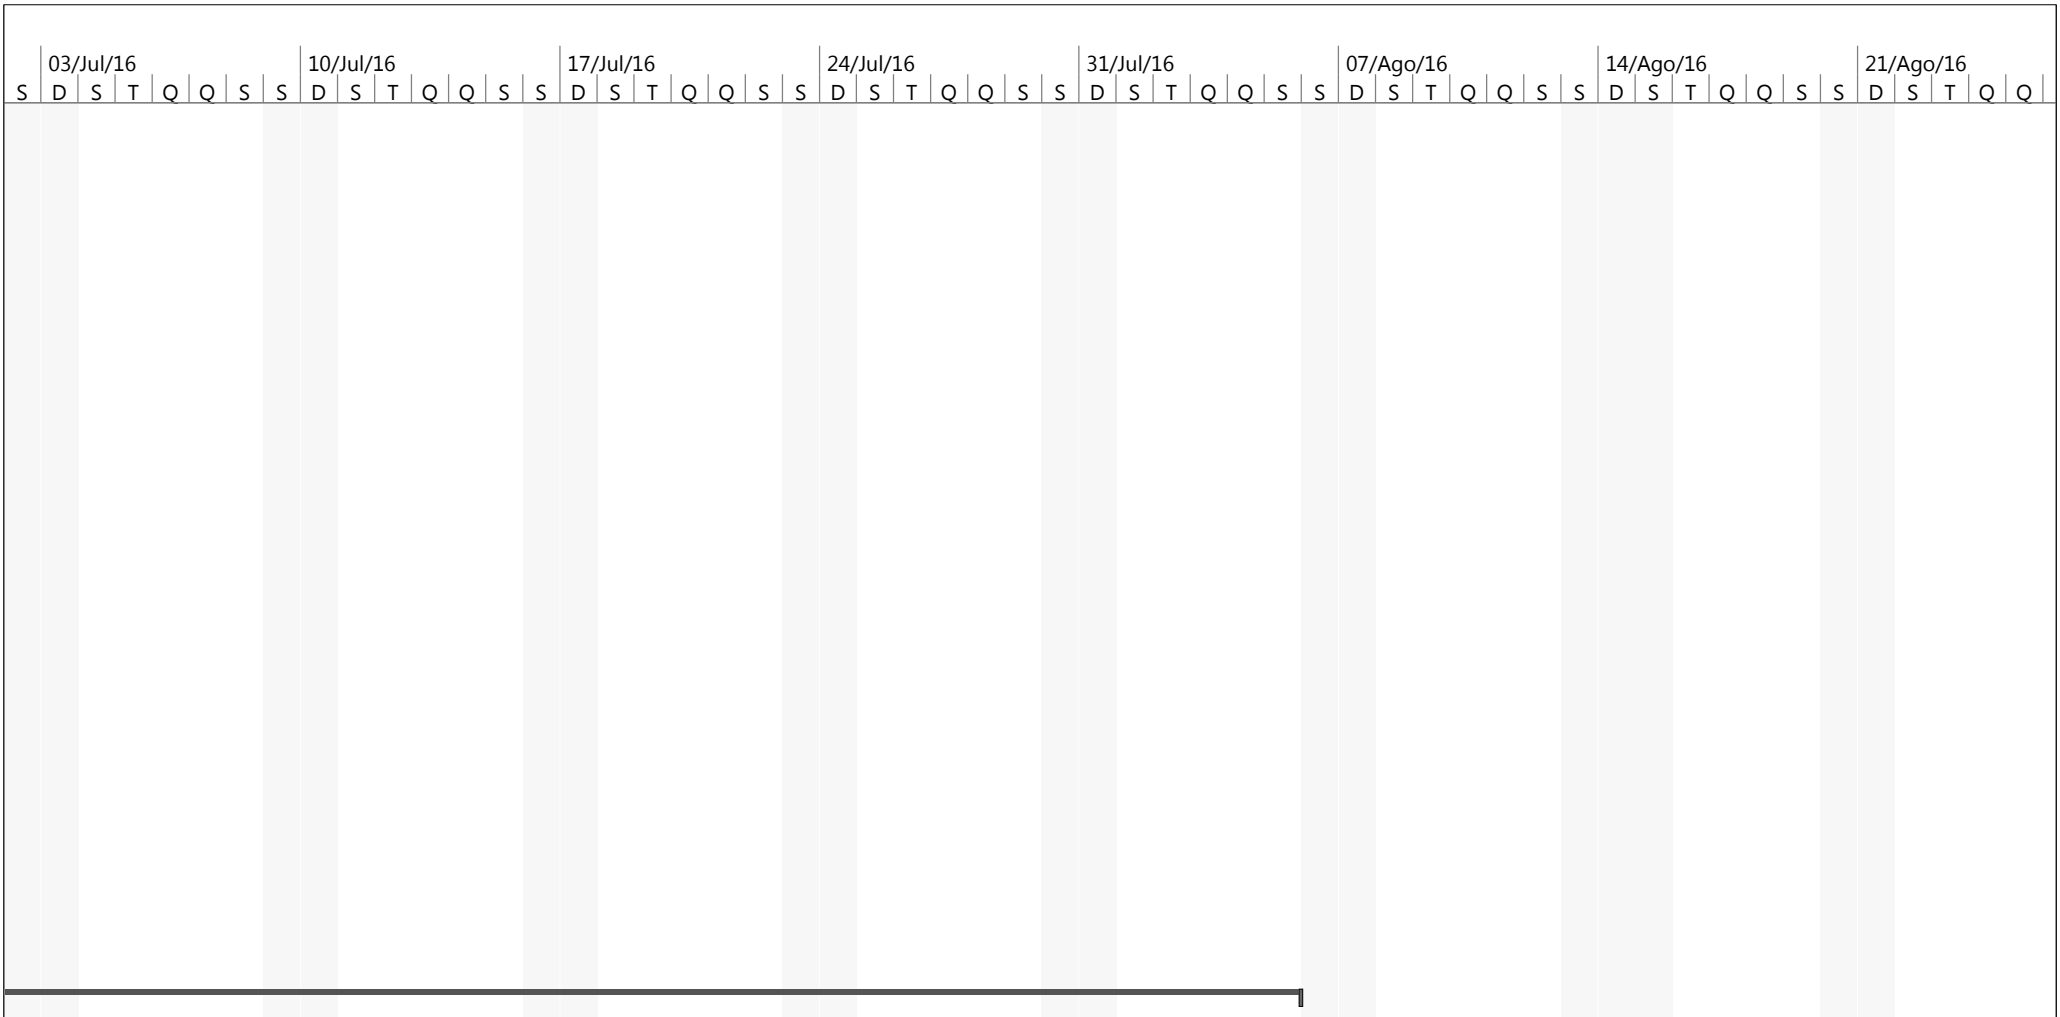


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

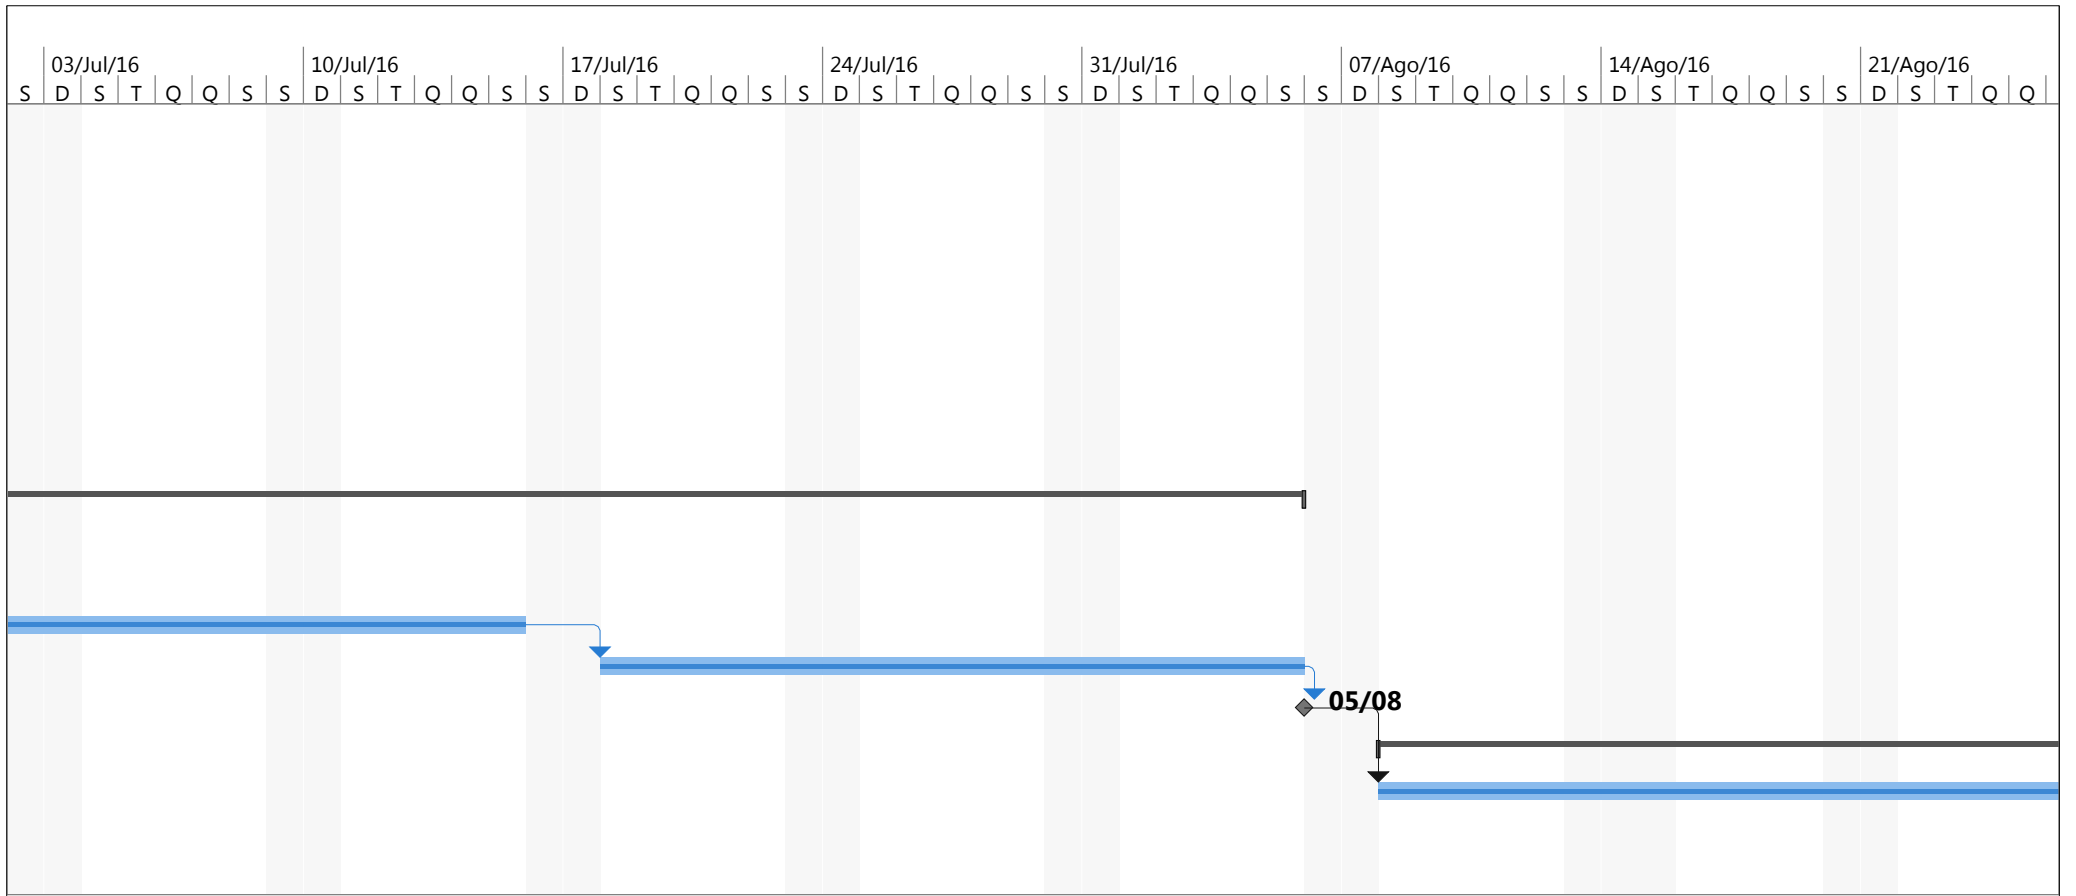


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

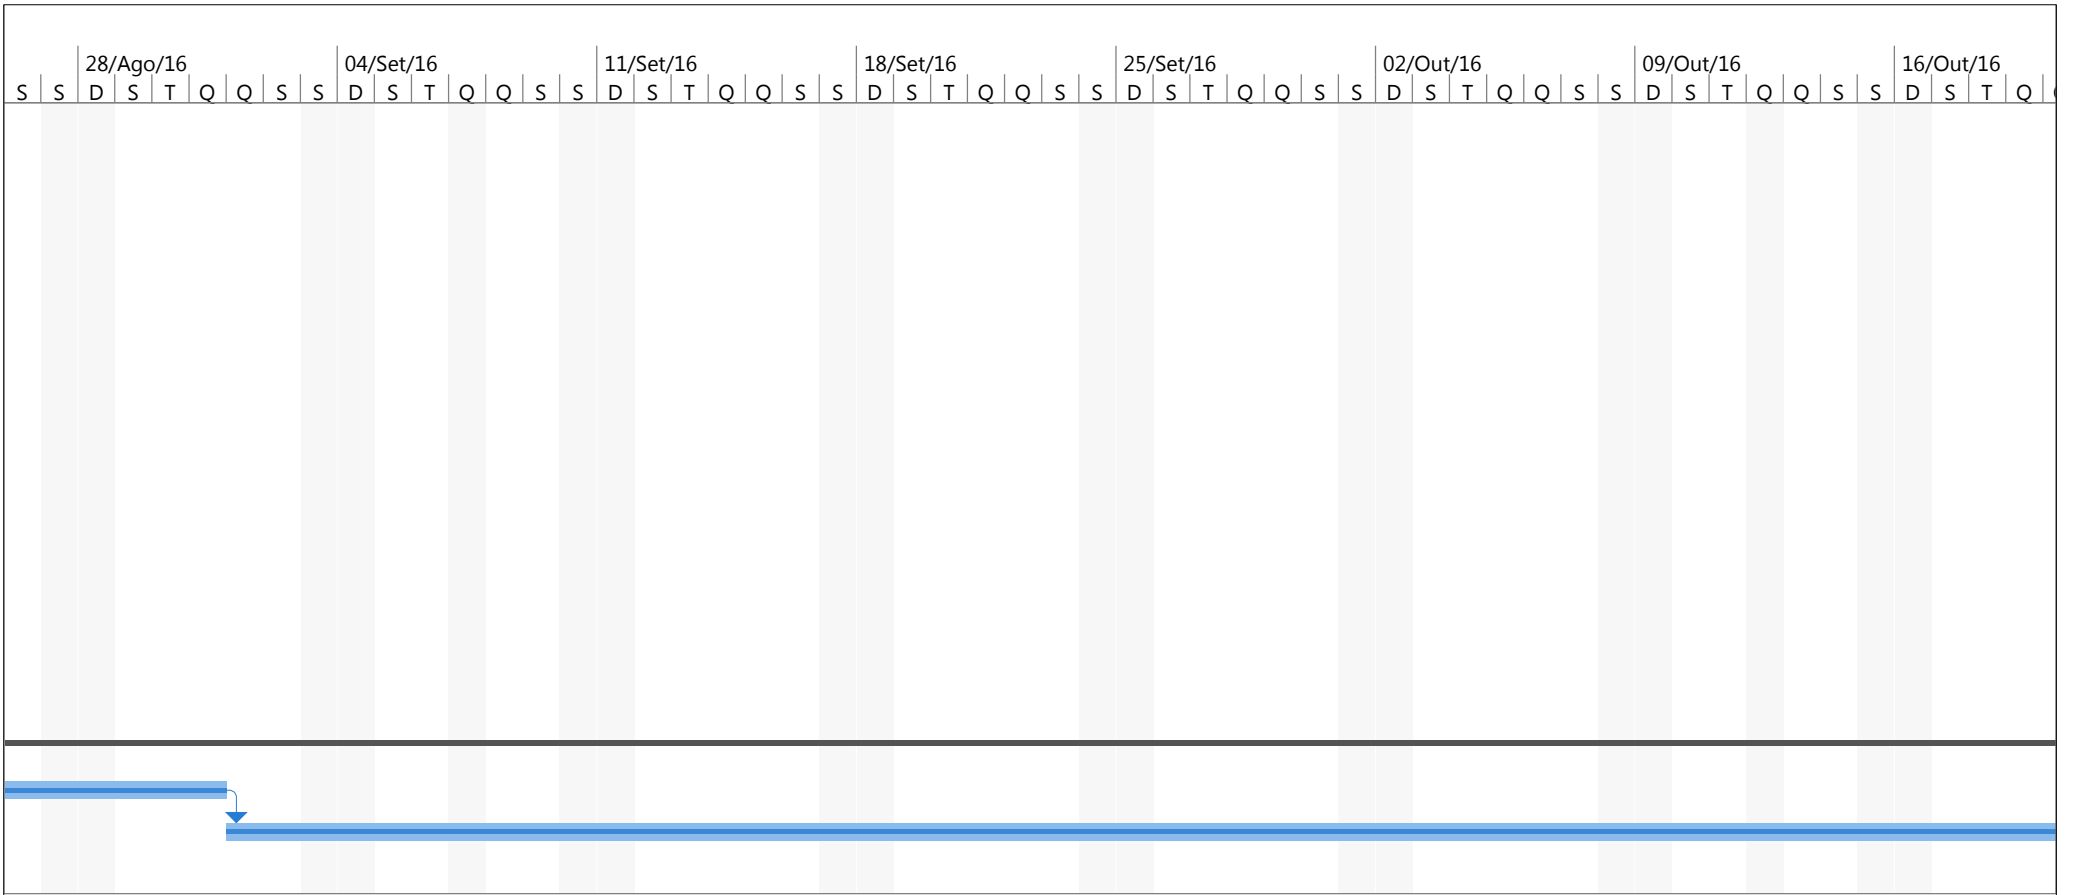


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

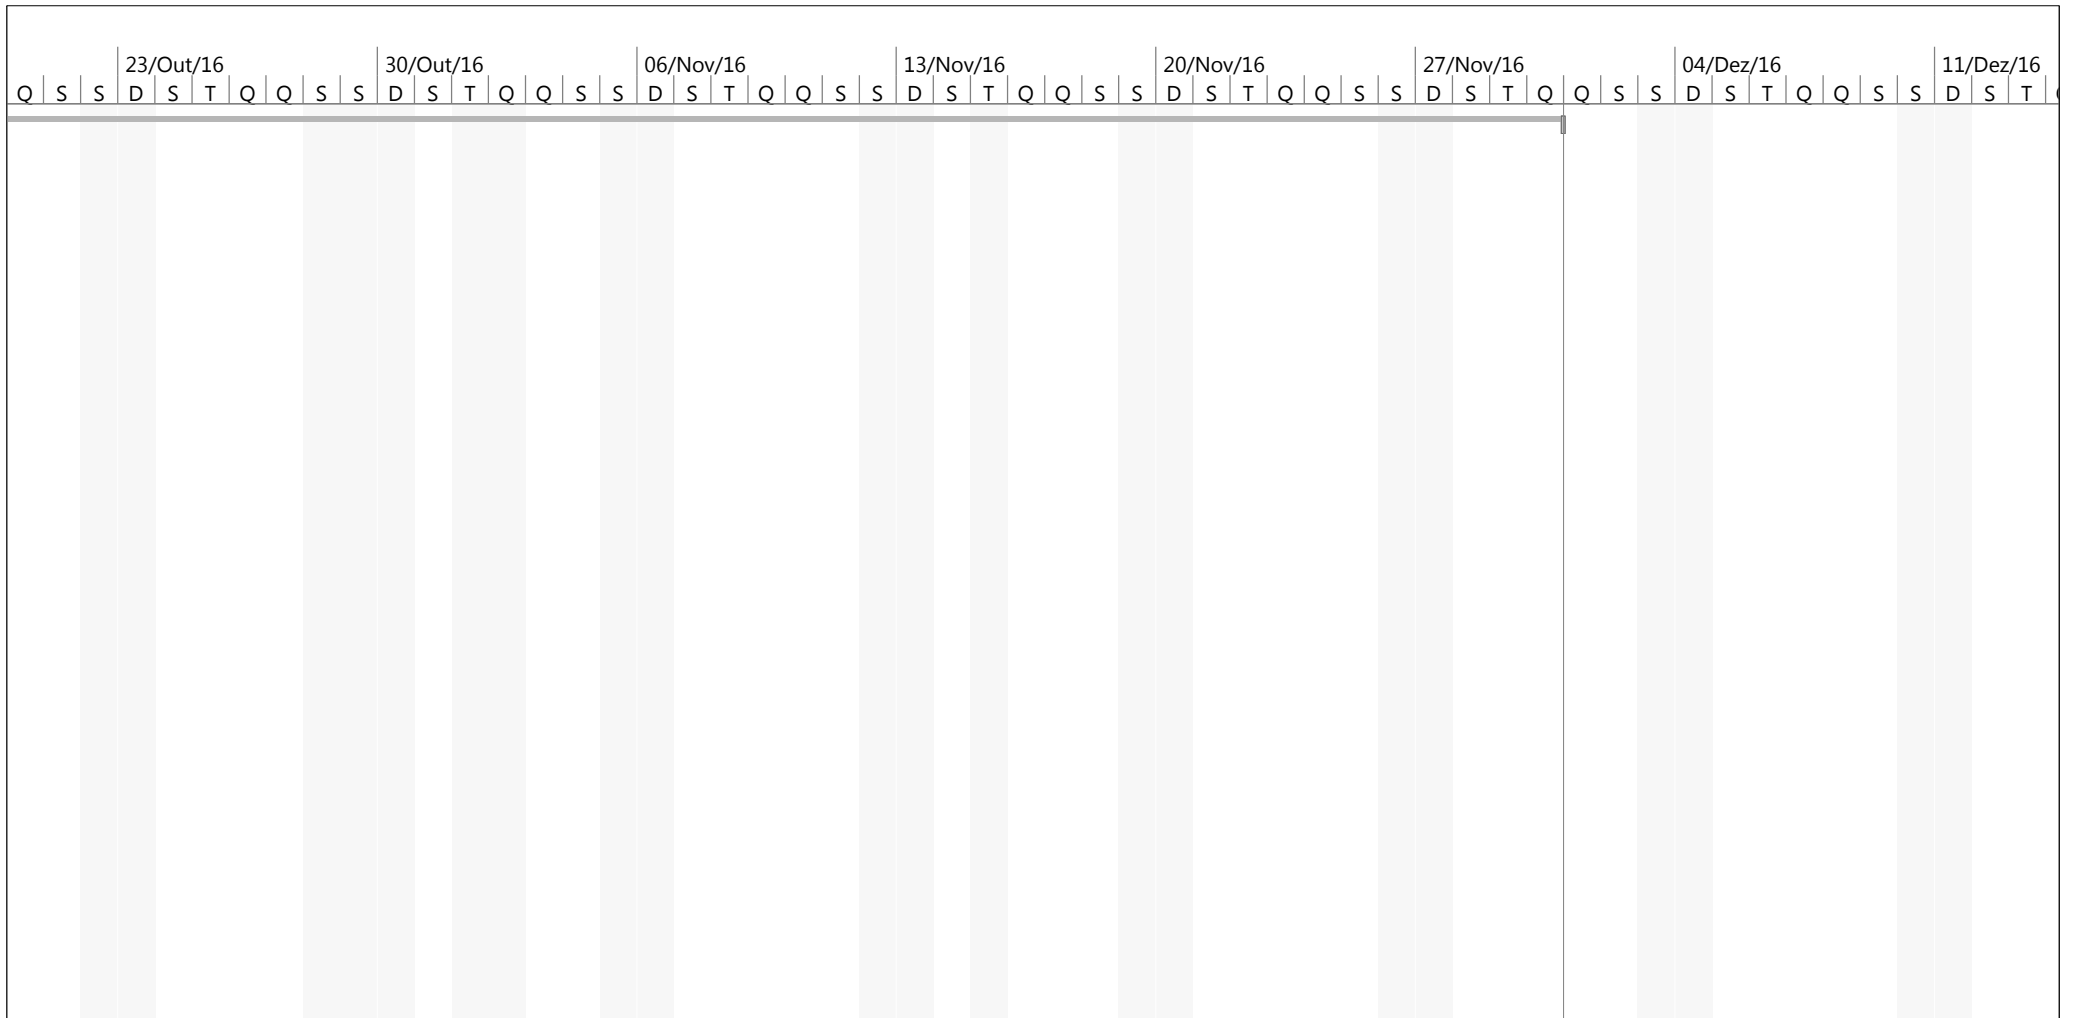


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

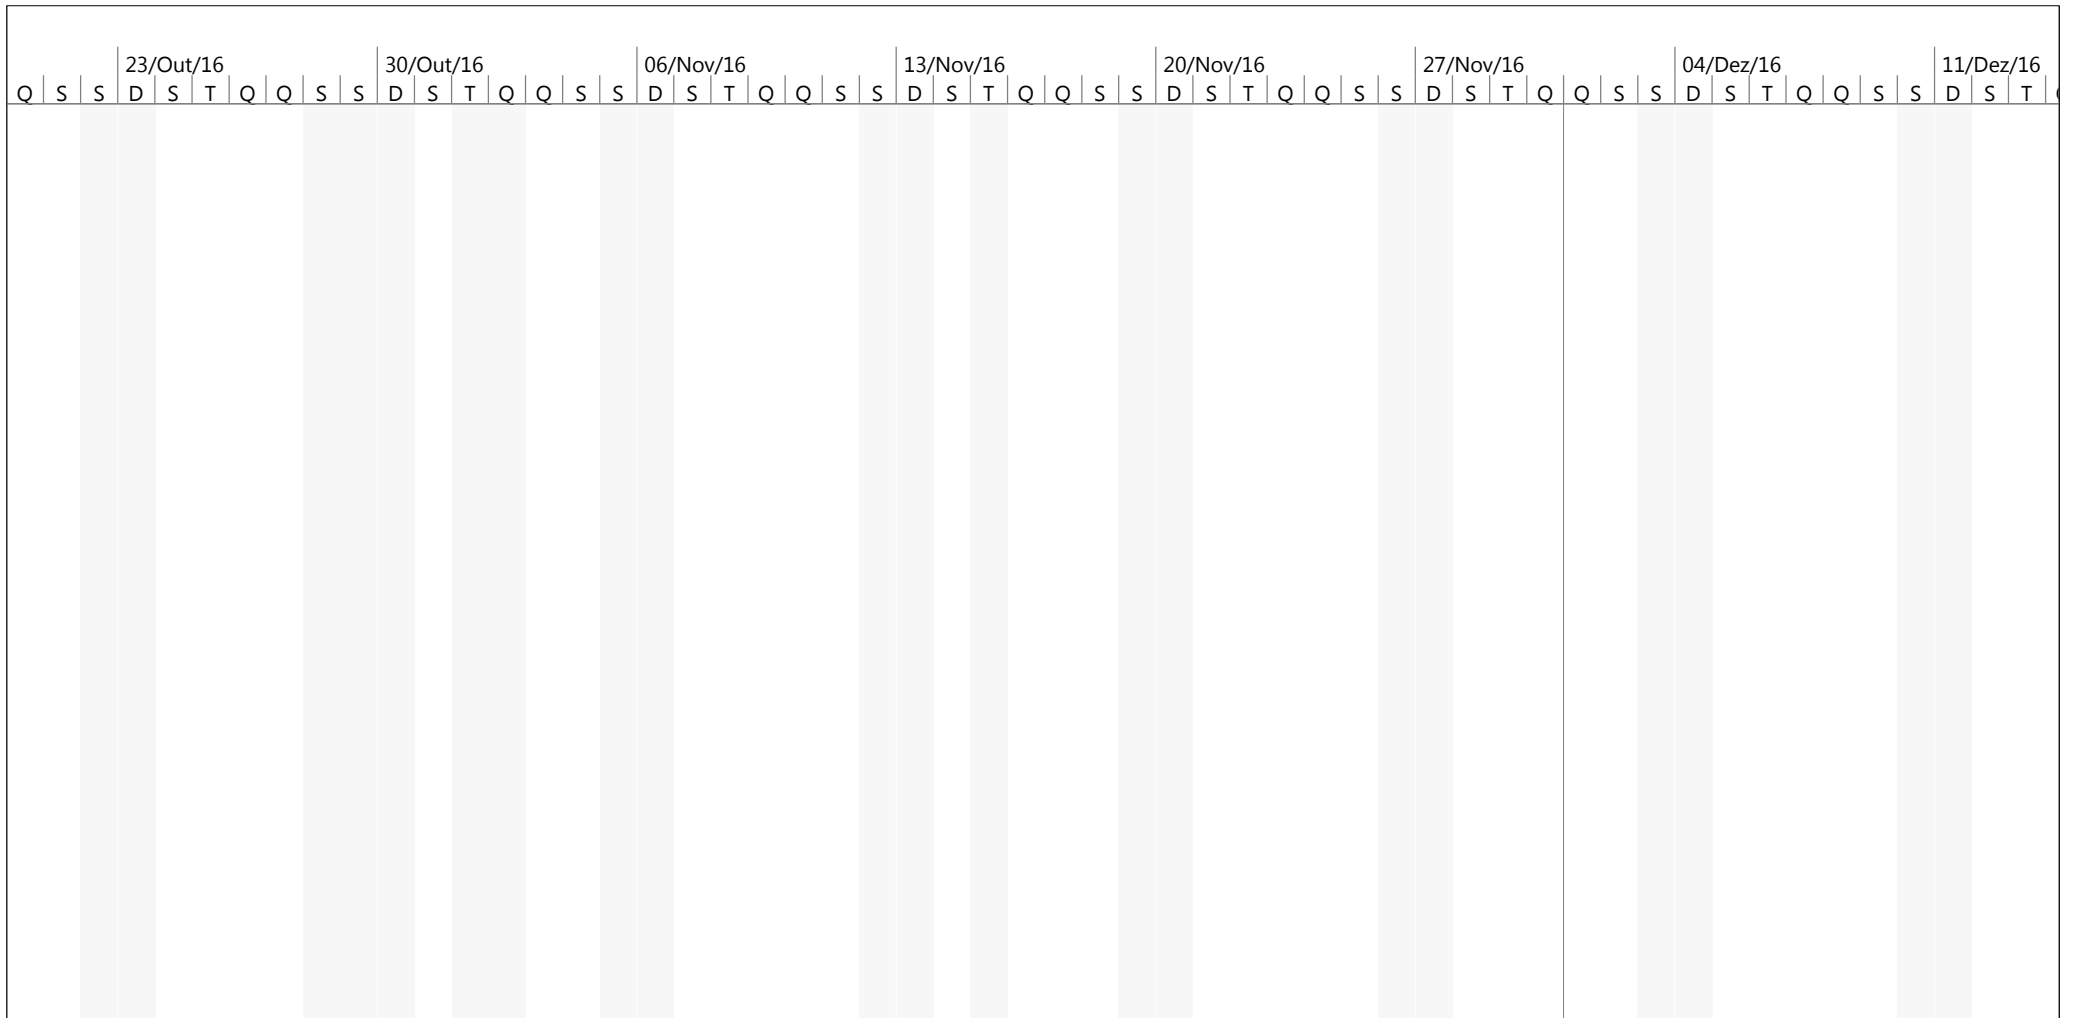


Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

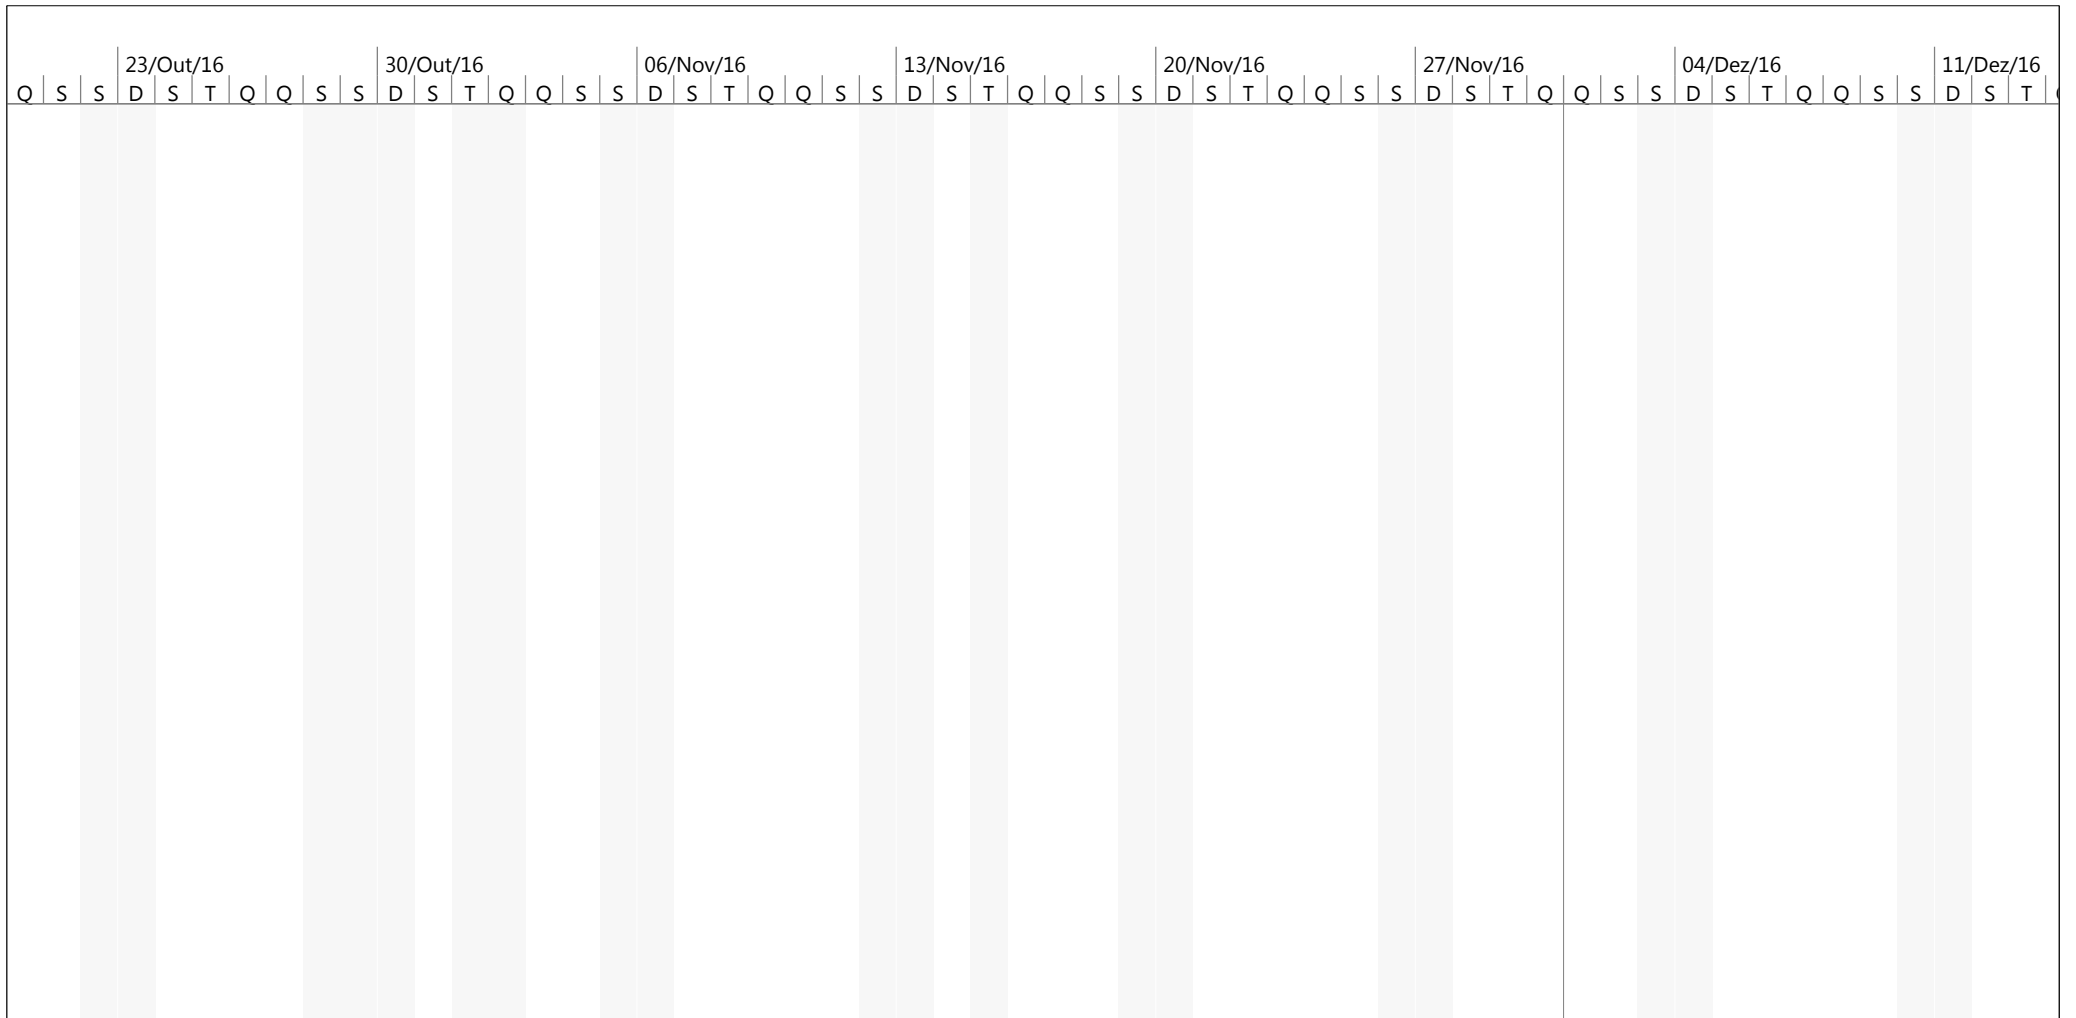

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
 Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

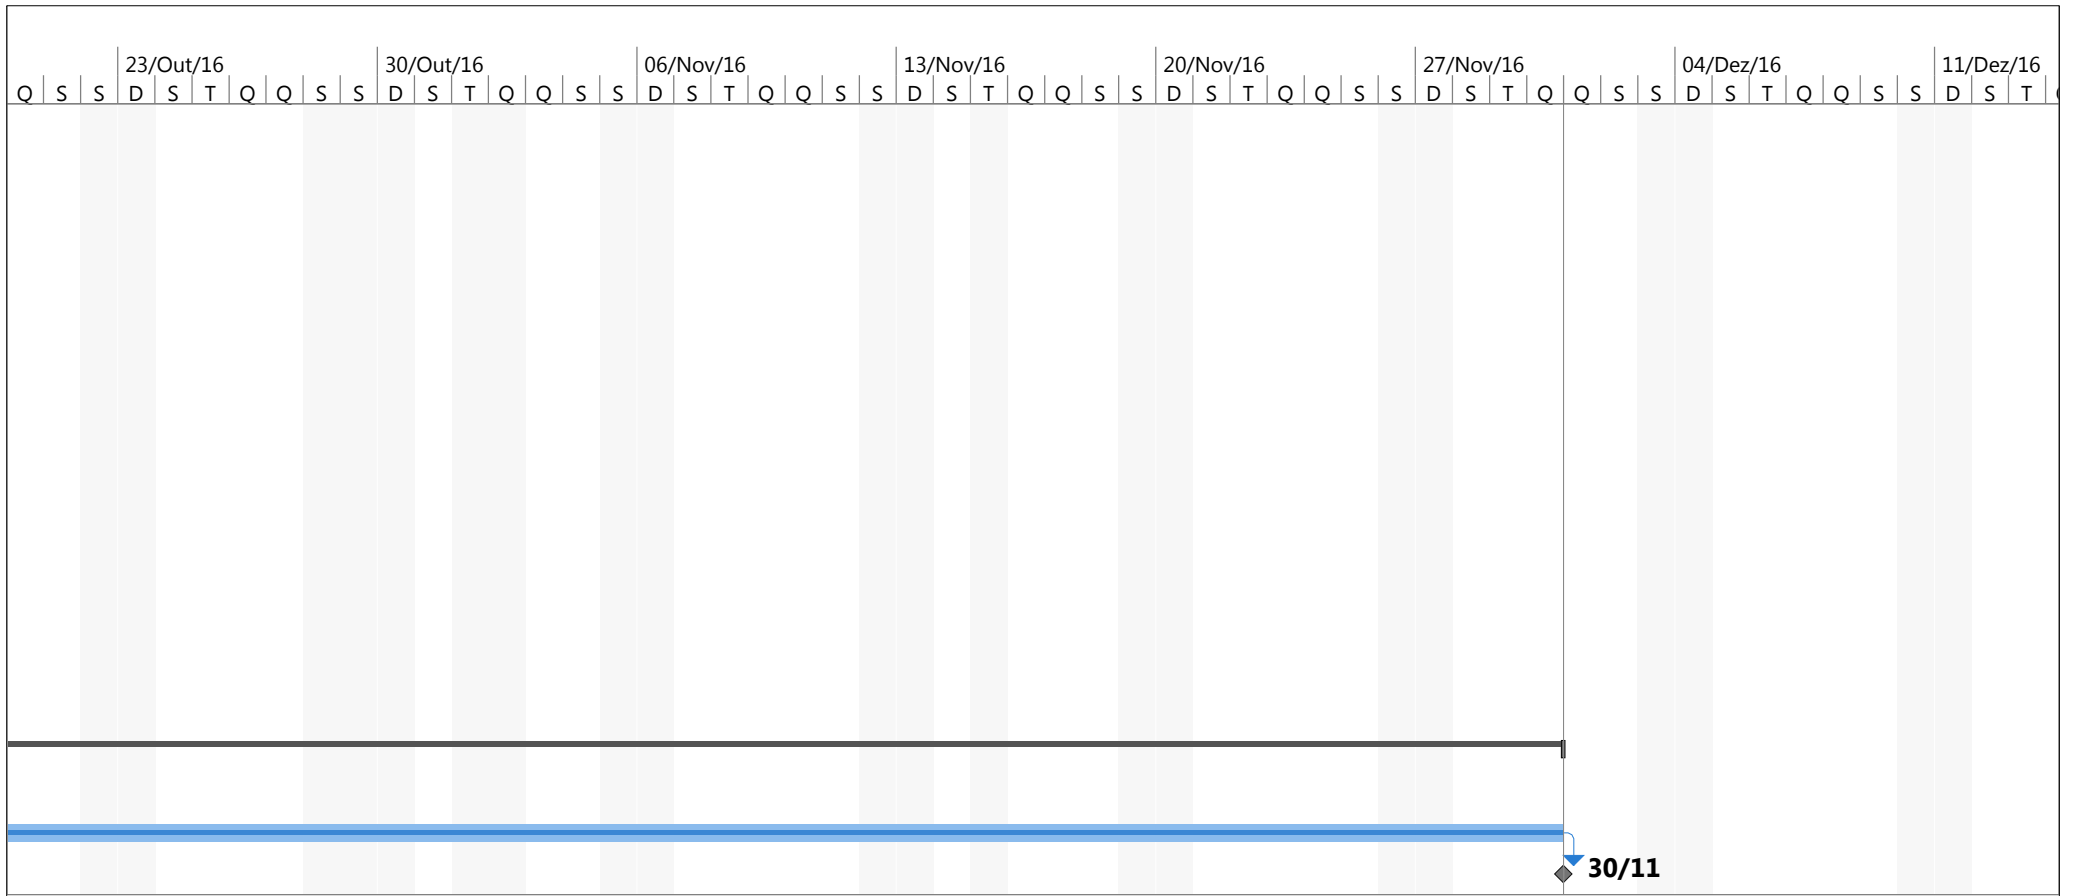

Projeto: AMBIENTE DA GENTE
Data: Qui 11/05/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
