

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
0			0	<b>OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO</b>		32%	575 dias	Qua 01/07/15	Ter 28/11/17
1			1	<b>Elaboração do Manual Básico de Contratações</b>		100%	115 dias	Qua 01/07/15	Sex 11/12/15
2			1.1	Apresentar Manual Básico de Contratações às unidades do		100%	114 dias	Qua 01/07/15	Qui 10/12/15
3			1.2	Divulgar Manual Básico de Contratações na Intranet		100%	1 dia	Sex 11/12/15	Sex 11/12/15
4			1.3	<b>MANUAL BÁSICO DE CONTRATAÇÕES ELABORADO</b>		100%	0 dias	Sex 11/12/15	Sex 11/12/15
5			2	<b>Mapeamento do Processo de Aquisição</b>		37%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
6			2.1	<b>Desenhar fluxos do processo por modalidade de licitação</b>		64%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
7			2.1.1	<b>Pregão</b>		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
8			2.1.1.1	Eletrônico		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
9			2.1.1.2	Presencial		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
10			2.1.2	Concorrência		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
11			2.1.3	Tomada de Preços		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
12			2.1.4	Convite		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
13			2.1.5	Concurso		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
14			2.1.6	Leilão		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
15			2.2	<b>Desenhar fluxos do processo para contratação direta</b>		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
16			2.2.1	Dispensa de licitação		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
17			2.2.2	Inexigibilidade		90%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
18			2.3	<b>Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão por</b>		6%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
19			2.3.1	<b>Pregão</b>		20%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
20			2.3.1.1	Eletrônico		40%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
21			2.3.1.2	Presencial		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
22			2.3.2	Concorrência		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
23			2.3.3	Tomada de Preços		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
24			2.3.4	Convite		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
25			2.3.5	Concurso		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
26			2.3.6	Leilão		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
27			<b>2.4</b>	<b>Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão para</b>		<b>0%</b>	<b>72 dias</b>	<b>Ter 19/04/16</b>	<b>Sex 29/07/16</b>
28			2.4.1	Dispensa de licitação		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
29			2.4.2	Inexigibilidade		0%	72 dias	Ter 19/04/16	Sex 29/07/16
30			<b>2.5</b>	<b>PROCESSO MAPEADO</b>		<b>0%</b>	<b>0 dias</b>	<b>Sex 29/07/16</b>	<b>Sex 29/07/16</b>
31			<b>3</b>	<b>Elaboração de Manuais</b>		<b>28%</b>	<b>121 dias</b>	<b>Ter 05/04/16</b>	<b>Sex 23/09/16</b>
32			3.1	Desenvolver o Manual de Contratações-Fase interna e		30%	121 dias	Ter 05/04/16	Sex 23/09/16
33			3.2	Desenvolver o Manual do Pregoeiro;		40%	82 dias	Ter 05/04/16	Sex 29/07/16
34			3.3	Desenvolver o Manual do Gestor do Contrato;		20%	121 dias	Ter 05/04/16	Sex 23/09/16
35			3.4	Divulgar os manuais na INTRANET		0%	5 dias	Seg 26/09/16	Sex 30/09/16
36			<b>3.5</b>	<b>MANUAIS ELABORADOS E DIVULGADOS</b>		<b>0%</b>	<b>0 dias</b>	<b>Sex 30/09/16</b>	<b>Sex 30/09/16</b>
37			<b>4</b>	<b>Arcabouço legal - Elaboração e Publicação</b>		<b>45%</b>	<b>126 dias</b>	<b>Ter 05/04/16</b>	<b>Sex 30/09/16</b>
38			<b>4.1</b>	<b>Elaborar arcabouço legal</b>		<b>46%</b>	<b>121 dias</b>	<b>Ter 05/04/16</b>	<b>Sex 23/09/16</b>
39			4.1.1	Elaborar normativo "Pesquisa de Mercado"		70%	30 dias	Ter 05/04/16	Ter 17/05/16
40			4.1.2	Elaborar normativo "Designação de Pregoeiros"		100%	30 dias	Ter 05/04/16	Ter 17/05/16
41			4.1.3	Elaborar normativo "Designação Assessor Jurídico"		100%	30 dias	Ter 05/04/16	Ter 17/05/16
42			4.1.4	Elaborar normativo "Designação Gestor e Fiscal do		100%	30 dias	Ter 05/04/16	Ter 17/05/16
43			4.1.5	Atualizar a IN 7/2013		0%	121 dias	Ter 05/04/16	Sex 23/09/16




















Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
44			4.2	Publicar arcabouço legal		0%	5 dias	Seg 26/09/16	Sex 30/09/16
45			4.3	ARCABOUÇO LEGAL ELABORADO E PUBLICADO		0%	0 dias	Sex 30/09/16	Sex 30/09/16
46			5	<b>Elaboração, atualização e divulgação dos catálogos de</b>		0%	121 dias	Ter 05/04/16	Sex 23/09/16
47			5.1	Atualizar catálogo de especificação de materiais e bens		0%	126 dias	Ter 05/04/16	Sex 30/09/16
48			5.2	Elaborar catálogo de serviços		0%	126 dias	Ter 05/04/16	Sex 30/09/16
49			5.3	Divulgar catálogos de especificação		0%	5 dias	Seg 03/10/16	Sex 07/10/16
50			5.4	CATÁLOGOS ELABORADOS, ATUALIZADOS E DIVULGADOS		0%	0 dias	Sex 07/10/16	Sex 07/10/16
51			6	<b>Elaboração, publicação e divulgação da Política de Compras do</b>		1%	121 dias	Ter 05/04/16	Sex 23/09/16
52			6.1	Definir o Calendário de Compras		0%	45 dias	Seg 06/06/16	Sex 05/08/16
53			6.2	Definir metodologia de planejamento de compras		0%	30 dias	Seg 06/06/16	Sex 15/07/16
54			6.3	Preparar normativo		20%	5 dias	Seg 08/08/16	Sex 12/08/16
55			6.4	Publicar normativo		0%	5 dias	Seg 15/08/16	Sex 19/08/16
56			6.5	Divulgar normativo		0%	50 dias	Seg 22/08/16	Qua 02/11/16
57			6.6	POLÍTICA DE COMPRAS DIVULGADA		0%	0 dias	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16
58			7	<b>Capacitação dos servidores (gestores, fiscais e operadores do</b>		19%	187 dias	Sex 15/04/16	Seg 30/01/17
59			7.1	Solicitar aprovação da Escola Judicial		100%	35 dias	Sex 15/04/16	Seg 06/06/16
60			7.2	Aprovar calendário de turmas		0%	10 dias	Ter 07/06/16	Seg 20/06/16
61			7.3	Desenvolver ementas e conteúdo		10%	82 dias	Ter 21/06/16	Sex 14/10/16
62			7.4	Capacitar servidores		0%	39 dias	Seg 17/10/16	Seg 12/12/16
63			7.5	Promover nivelamento conceitual entre os atores envolvidos		0%	60 dias	Seg 17/10/16	Seg 30/01/17
64			7.6	SERVIDORES SENSIBILIZADOS E CAPACITADOS		0%	0 dias	Seg 30/01/17	Seg 30/01/17
65			8	REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DA FASE DE ESTRUTURAÇÃO DO		0%	0 dias	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
66			<b>10</b>	<b>Medição, Acompanhamento e Otimização</b>		<b>17%</b>	<b>393 dias</b>	<b>Ter 12/04/16</b>	<b>Ter 28/11/17</b>
67			9.1	Medição inicial / prévia		100%	30 dias	Ter 12/04/16	Ter 24/05/16
68			9.2	Medição intermediária 1		0%	30 dias	Seg 17/10/16	Ter 29/11/16
69			9.3	Medição intermediária 2		0%	30 dias	Sex 16/06/17	Qui 27/07/17
70			9.4	Otimizar processo de aquisição		0%	55 dias	Sex 28/07/17	Seg 16/10/17
71			9.5	Medição final		0%	30 dias	Ter 17/10/17	Ter 28/11/17
72			9.6	<b>PROCESSO DE AQUISIÇÃO OTIMIZADO</b>		<b>0%</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 28/11/17</b>	<b>Ter 28/11/17</b>

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo fixo	Jun/15	05/Jul/15					12/Jul/15					19/Jul/15					26/Jul/15					02/Ago/15					09					
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		R\$ 0,00																																
2		R\$ 0,00																																
3		R\$ 0,00																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		R\$ 0,00																																
		R\$ 0,00																																
		R\$ 0,00																																
		R\$ 0,00																																
		R\$ 0,00																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		R\$ 0,00																																
		R\$ 0,00																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		R\$ 0,00																																
		R\$ 0,00																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		<b>R\$ 0,00</b>																																
		R\$ 0,00																																
		R\$ 0,00																																

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO

Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo fixo	Jun/15		05/Jul/15				12/Jul/15				19/Jul/15				26/Jul/15				02/Ago/15				09				
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
		R\$ 0,00																											
		R\$ 0,00																											
		R\$ 0,00																											
		R\$ 0,00																											
		R\$ 0,00																											
		<b>R\$ 0,00</b>																											
		R\$ 0,00																											
		R\$ 0,00																											
27		R\$ 0,00																											
		<b>R\$ 0,00</b>																											
		R\$ 0,00																											
32II		R\$ 0,00																											
32II		R\$ 0,00																											
32;33;34		R\$ 0,00																											
35		R\$ 0,00																											
		<b>R\$ 0,00</b>																											
		<b>R\$ 0,00</b>																											
		R\$ 0,00																											
39II		R\$ 0,00																											
39II		R\$ 0,00																											
39II		R\$ 0,00																											
39II		R\$ 0,00																											

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo fixo	Jun/15		05/Jul/15				12/Jul/15				19/Jul/15				26/Jul/15				02/Ago/15				09				
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
38		R\$ 0,00																											
44		R\$ 0,00																											
		<b>R\$ 0,00</b>																											
		R\$ 0,00																											
47II		R\$ 0,00																											
47;48		R\$ 0,00																											
49		R\$ 0,00																											
		<b>R\$ 0,00</b>																											
		R\$ 0,00																											
52II		R\$ 0,00																											
52;53		R\$ 0,00																											
54		R\$ 0,00																											
55		R\$ 0,00																											
56		R\$ 0,00																											
		<b>R\$ 0,00</b>																											
		R\$ 0,00																											
59		R\$ 0,00																											
60		R\$ 0,00																											
61		R\$ 0,00																											
62II		R\$ 0,00																											
63		R\$ 0,00																											
30;36;45		R\$ 0,00																											

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo fixo	Calendar																																		
			Jun/15				05/Jul/15				12/Jul/15				19/Jul/15				26/Jul/15				02/Ago/15				09										
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
		<b>R\$ 0,00</b>																																			
		R\$ 0,00																																			
67		R\$ 0,00																																			
68		R\$ 0,00																																			
69		R\$ 0,00																																			
69		R\$ 0,00																																			
71		R\$ 0,00																																			

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




09/Ago/15 | 16/Ago/15 | 23/Ago/15 | 30/Ago/15 | 06/Set/15 | 13/Set/15 | 20/Set/15 | 27/Set/15 | 04/Oct/15

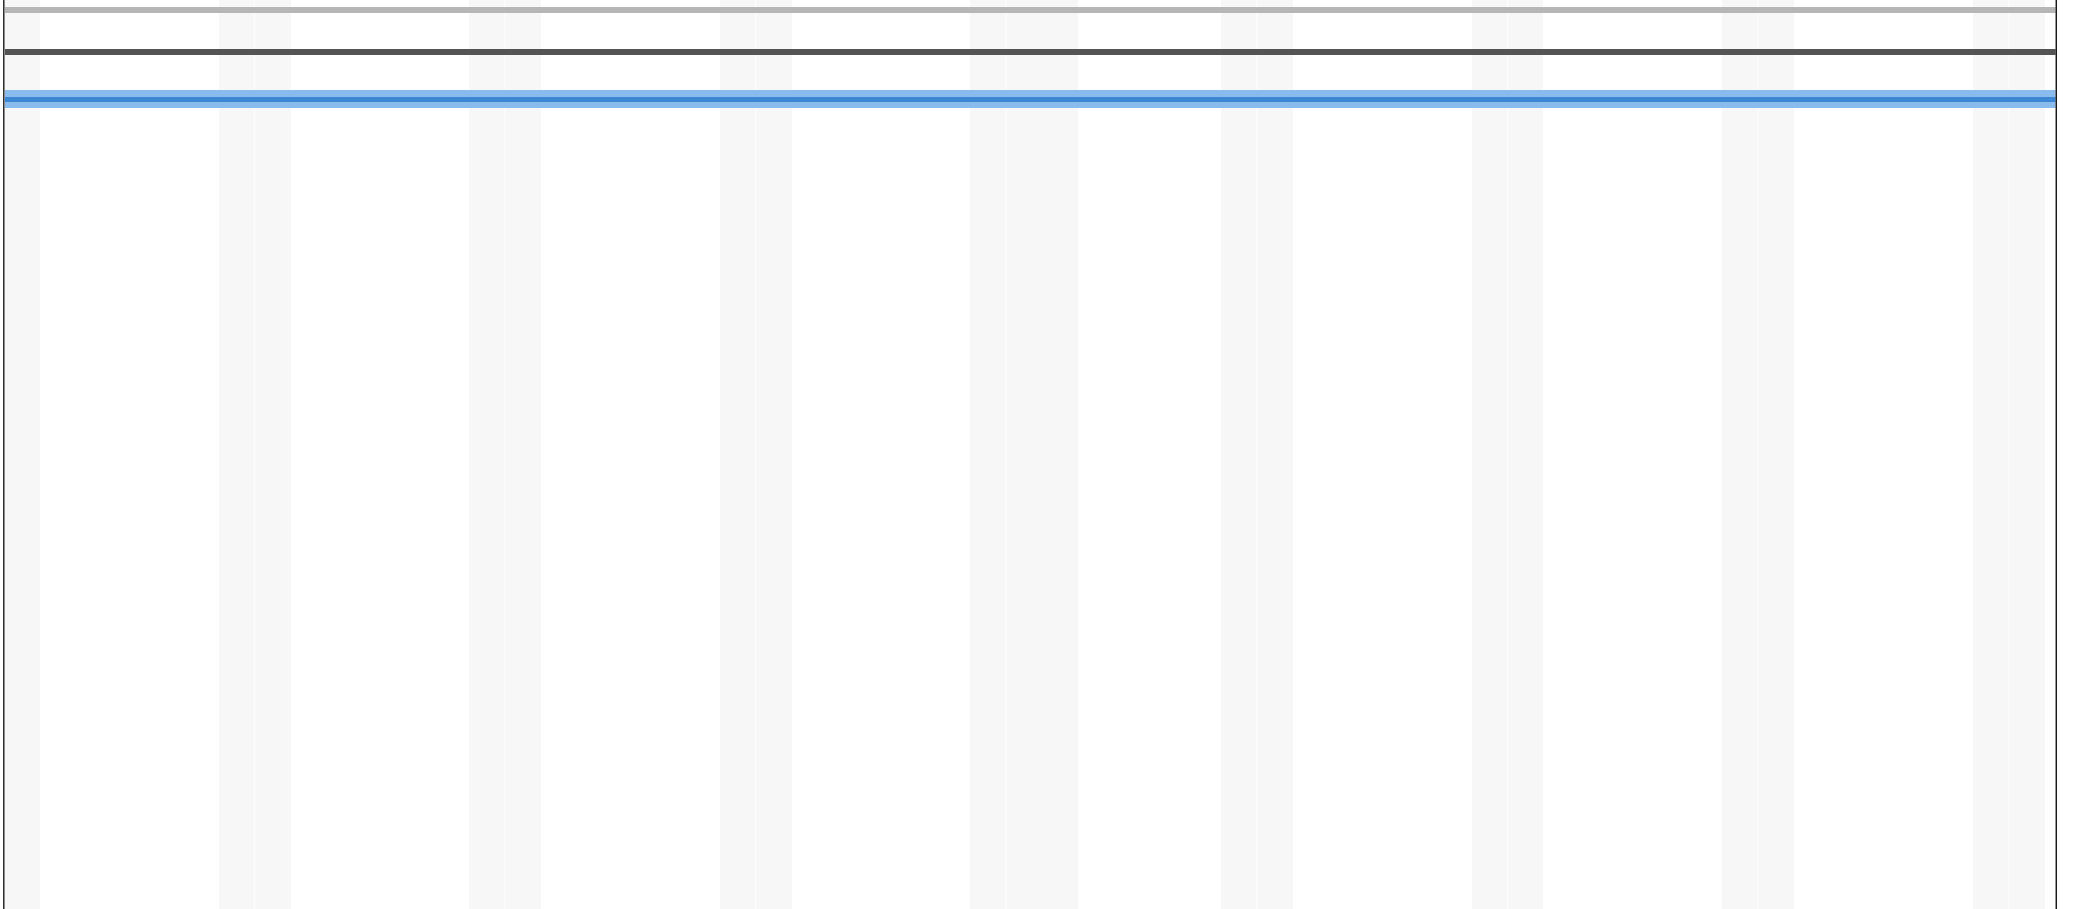

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

09/Ago/15 | 16/Ago/15 | 23/Ago/15 | 30/Ago/15 | 06/Set/15 | 13/Set/15 | 20/Set/15 | 27/Set/15 | 04/Oct/15

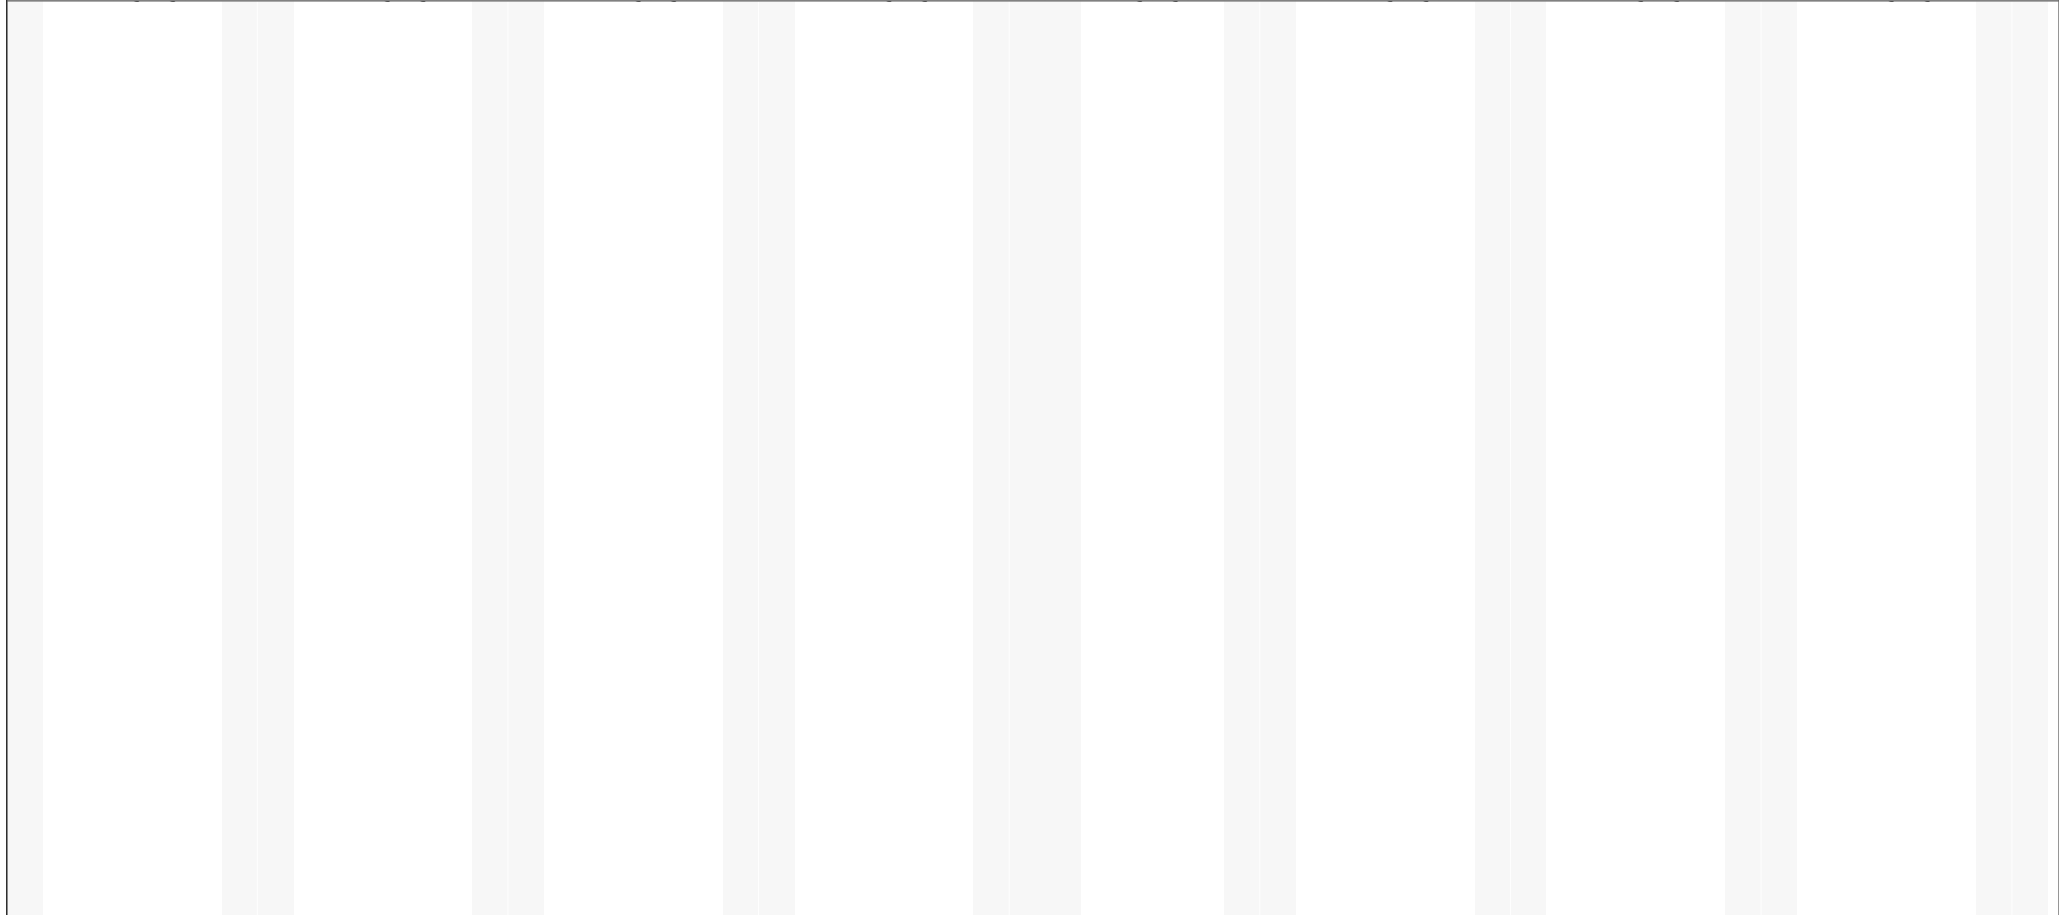


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


09/Ago/15 | 16/Ago/15 | 23/Ago/15 | 30/Ago/15 | 06/Set/15 | 13/Set/15 | 20/Set/15 | 27/Set/15 | 04/Oct/15

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

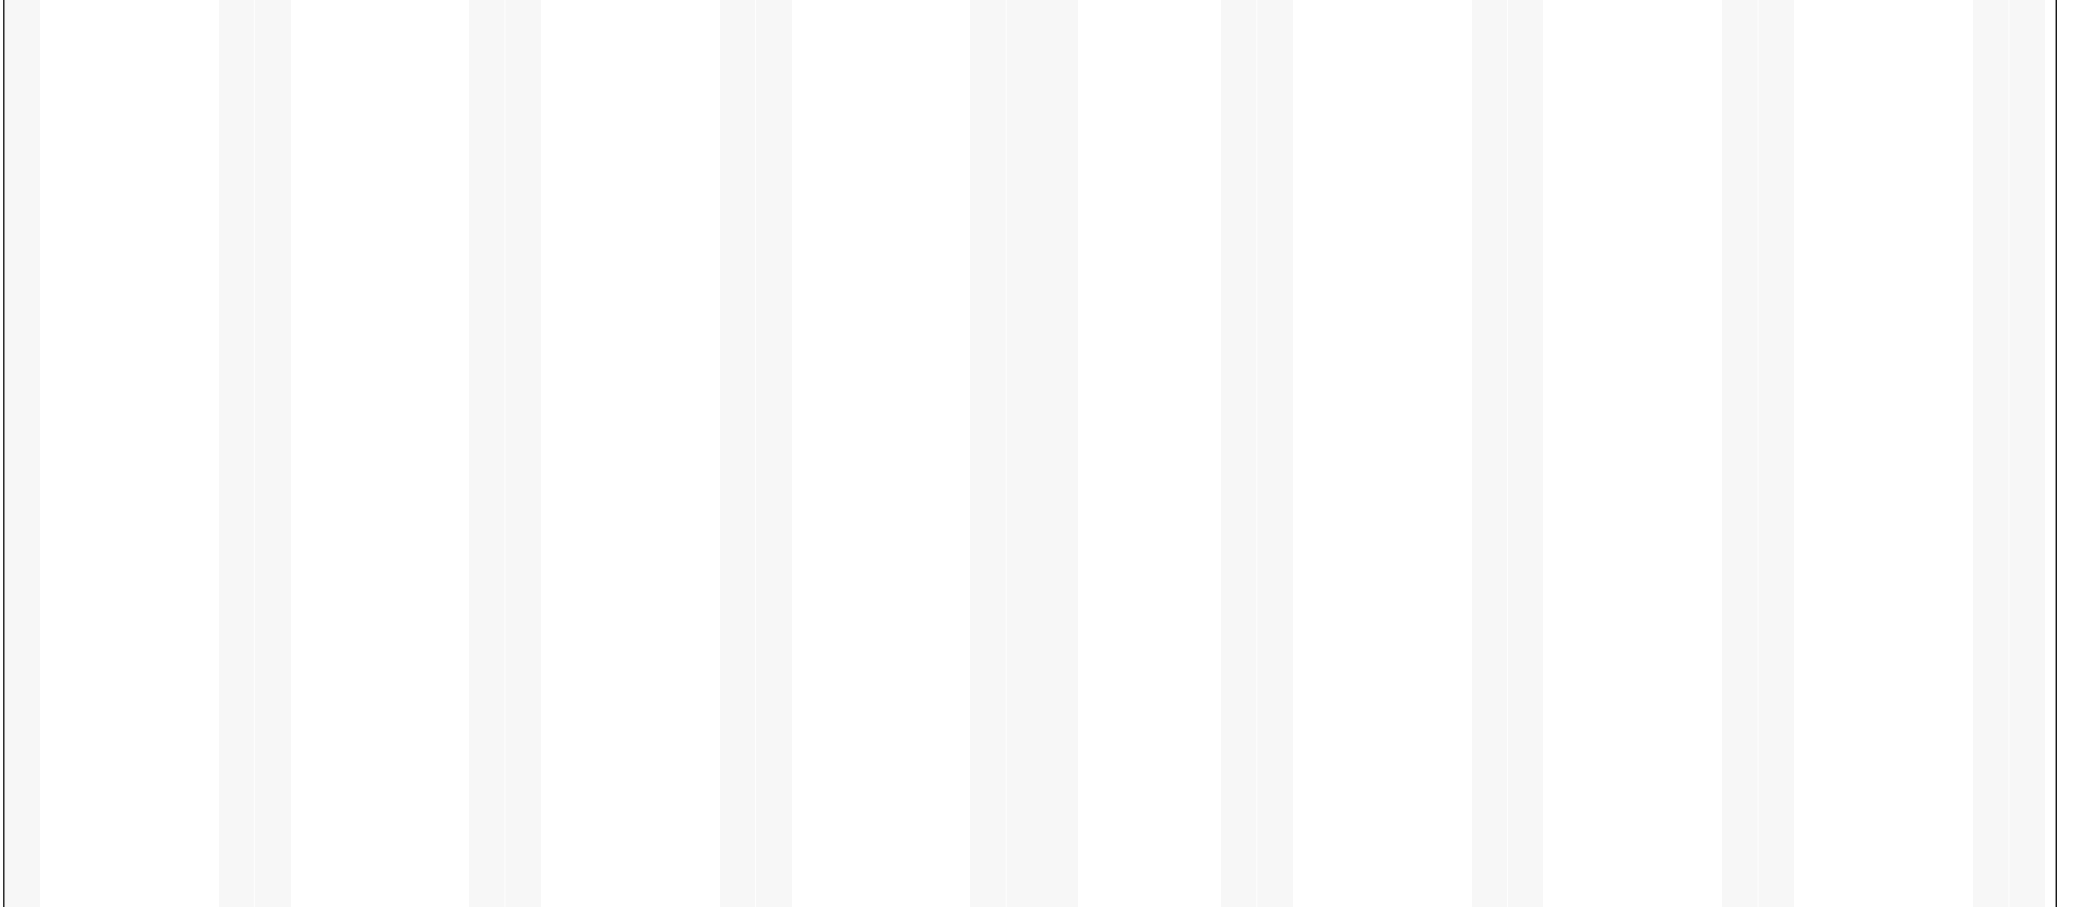

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Out/15 11/Out/15 18/Out/15 25/Out/15 01/Nov/15 08/Nov/15 15/Nov/15 22/Nov/15 29/Nov/15




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

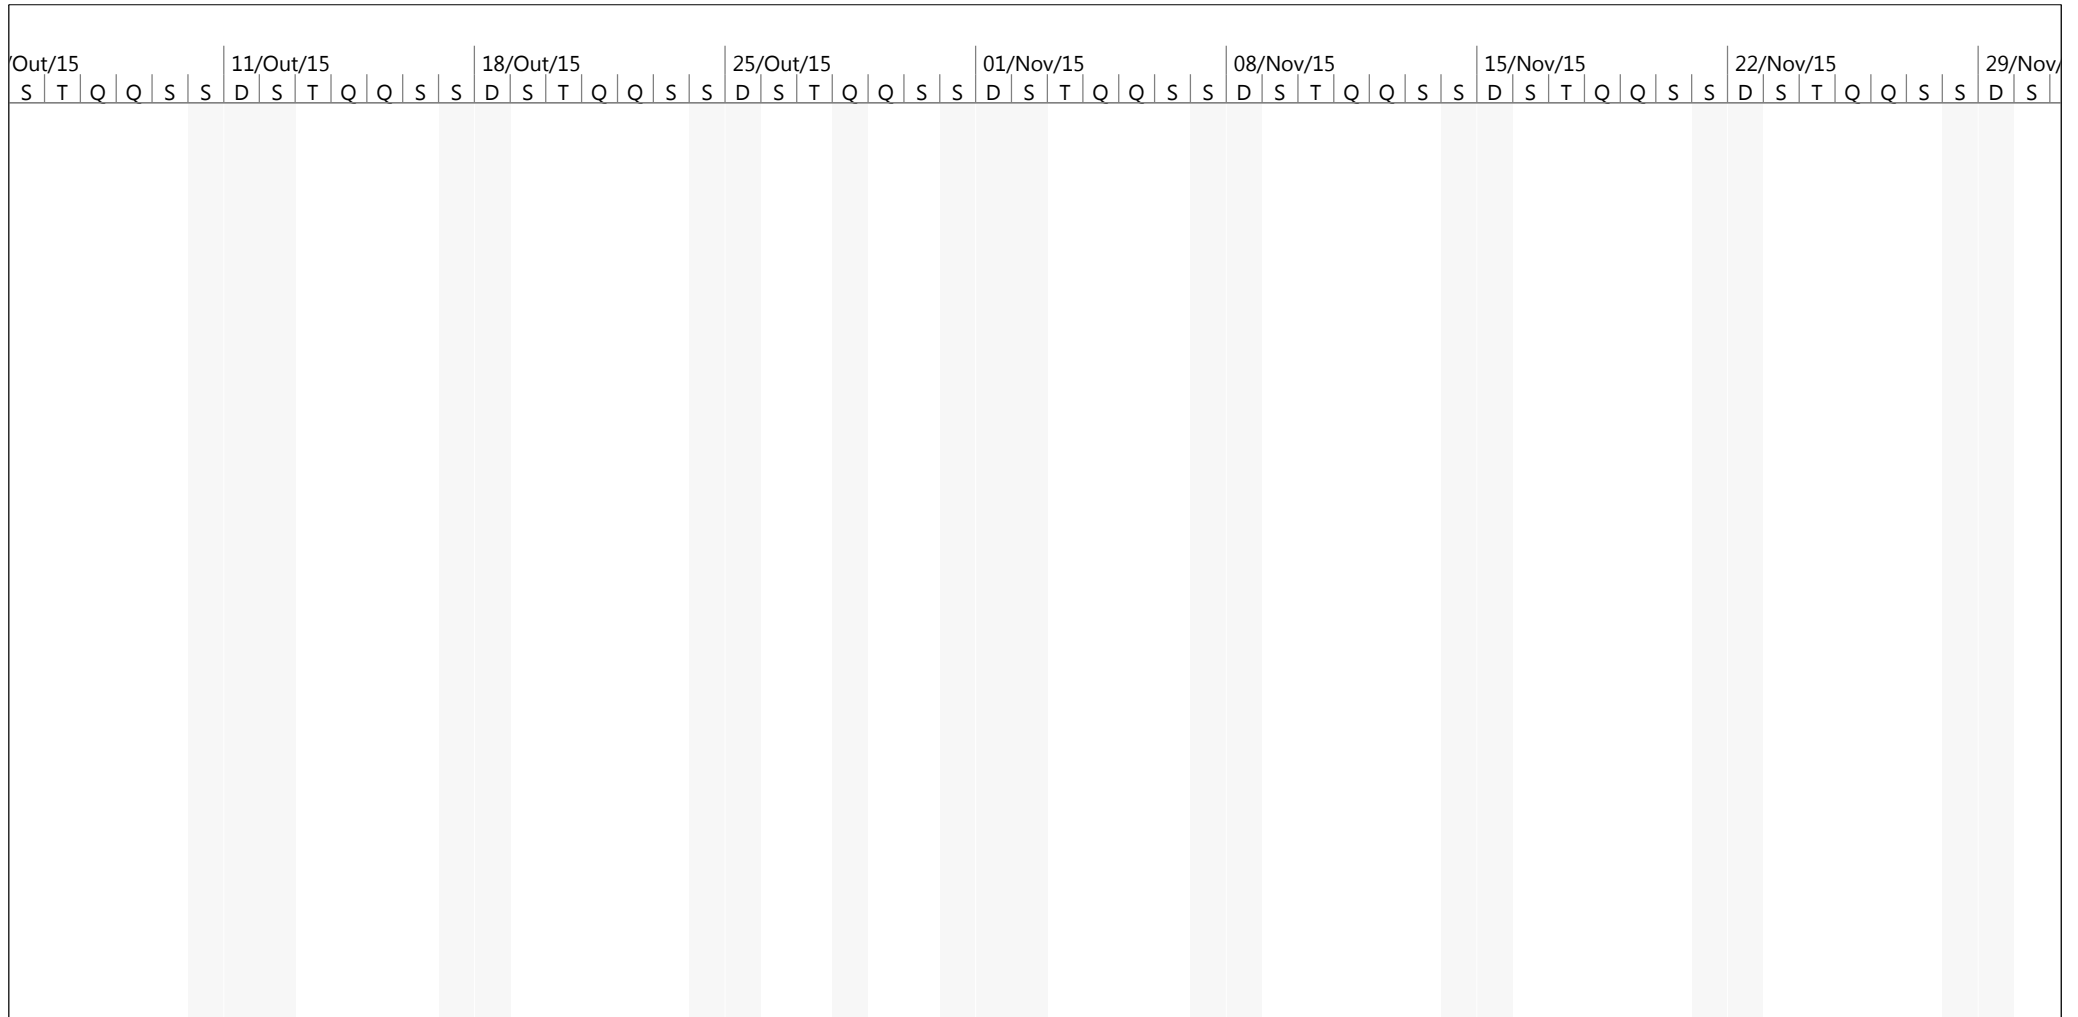

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

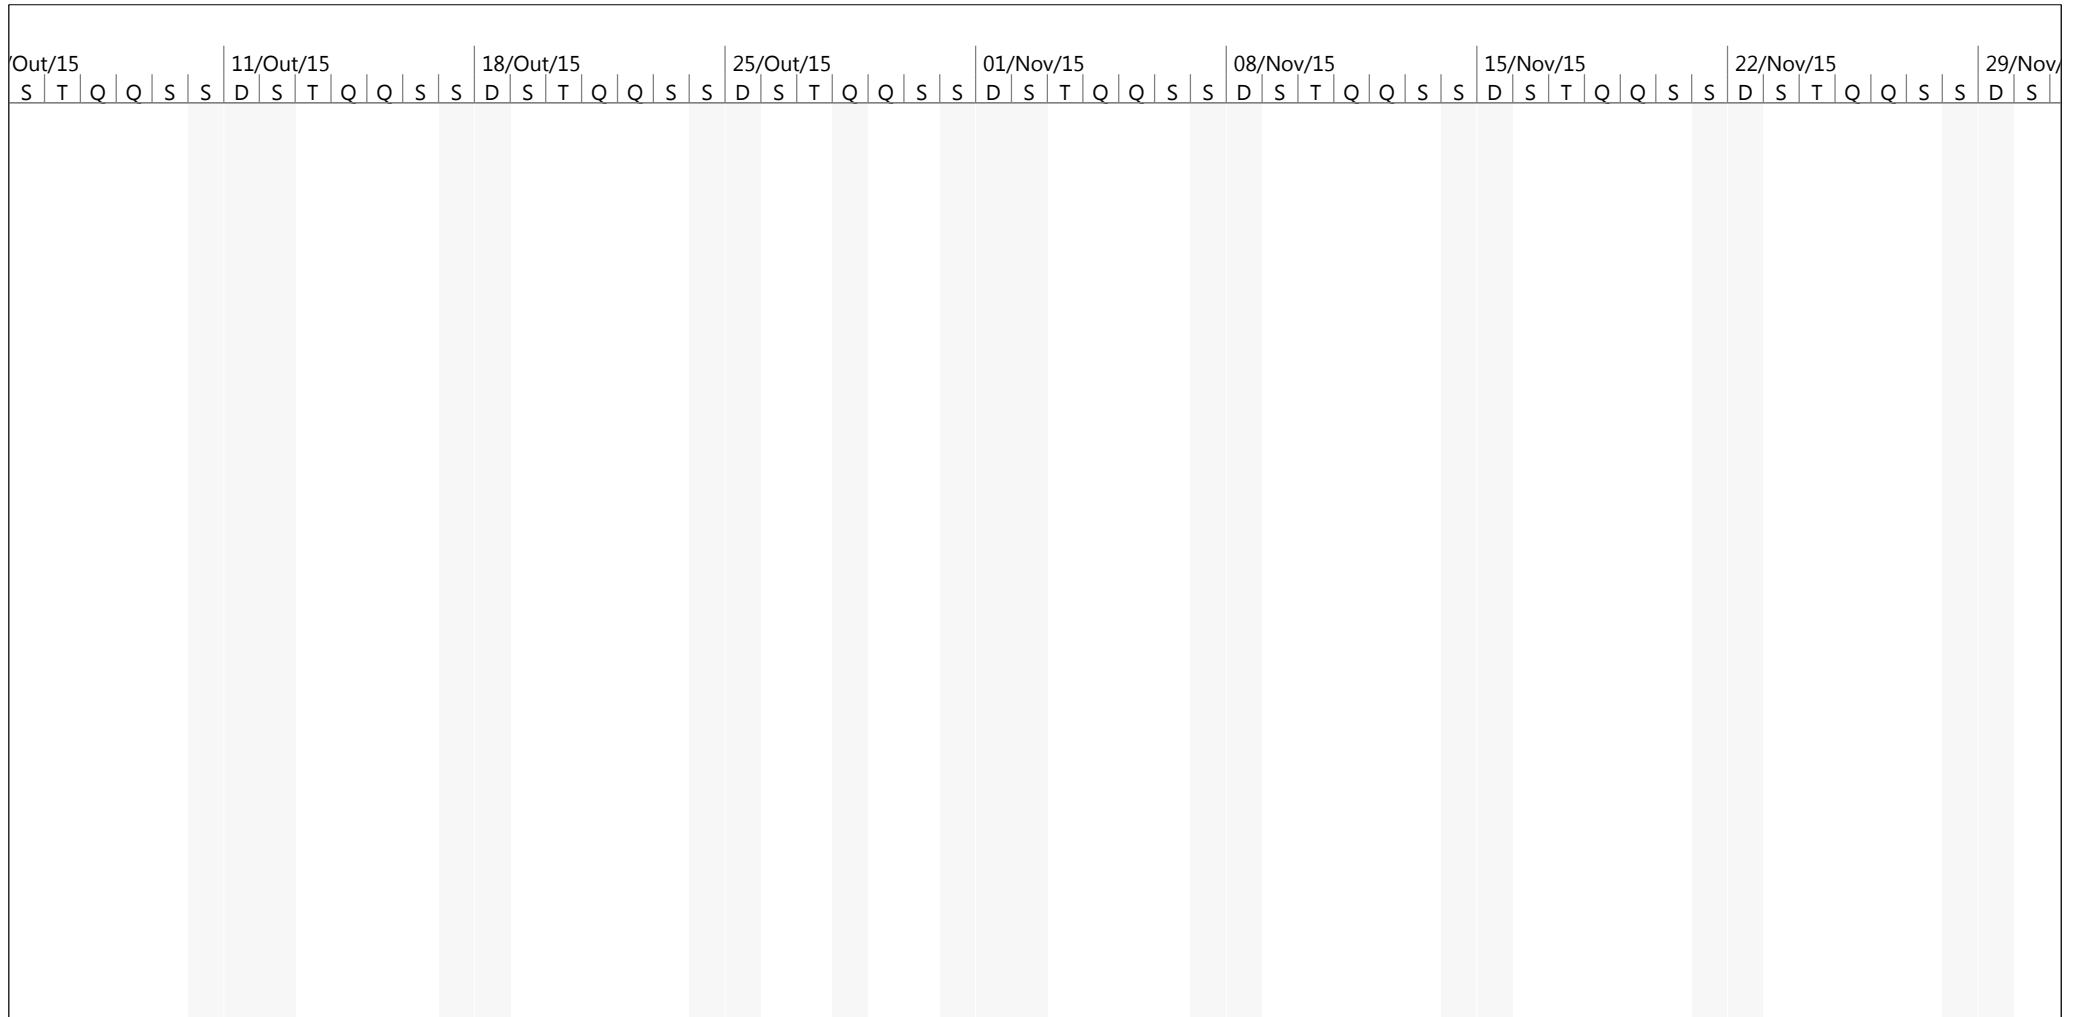


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



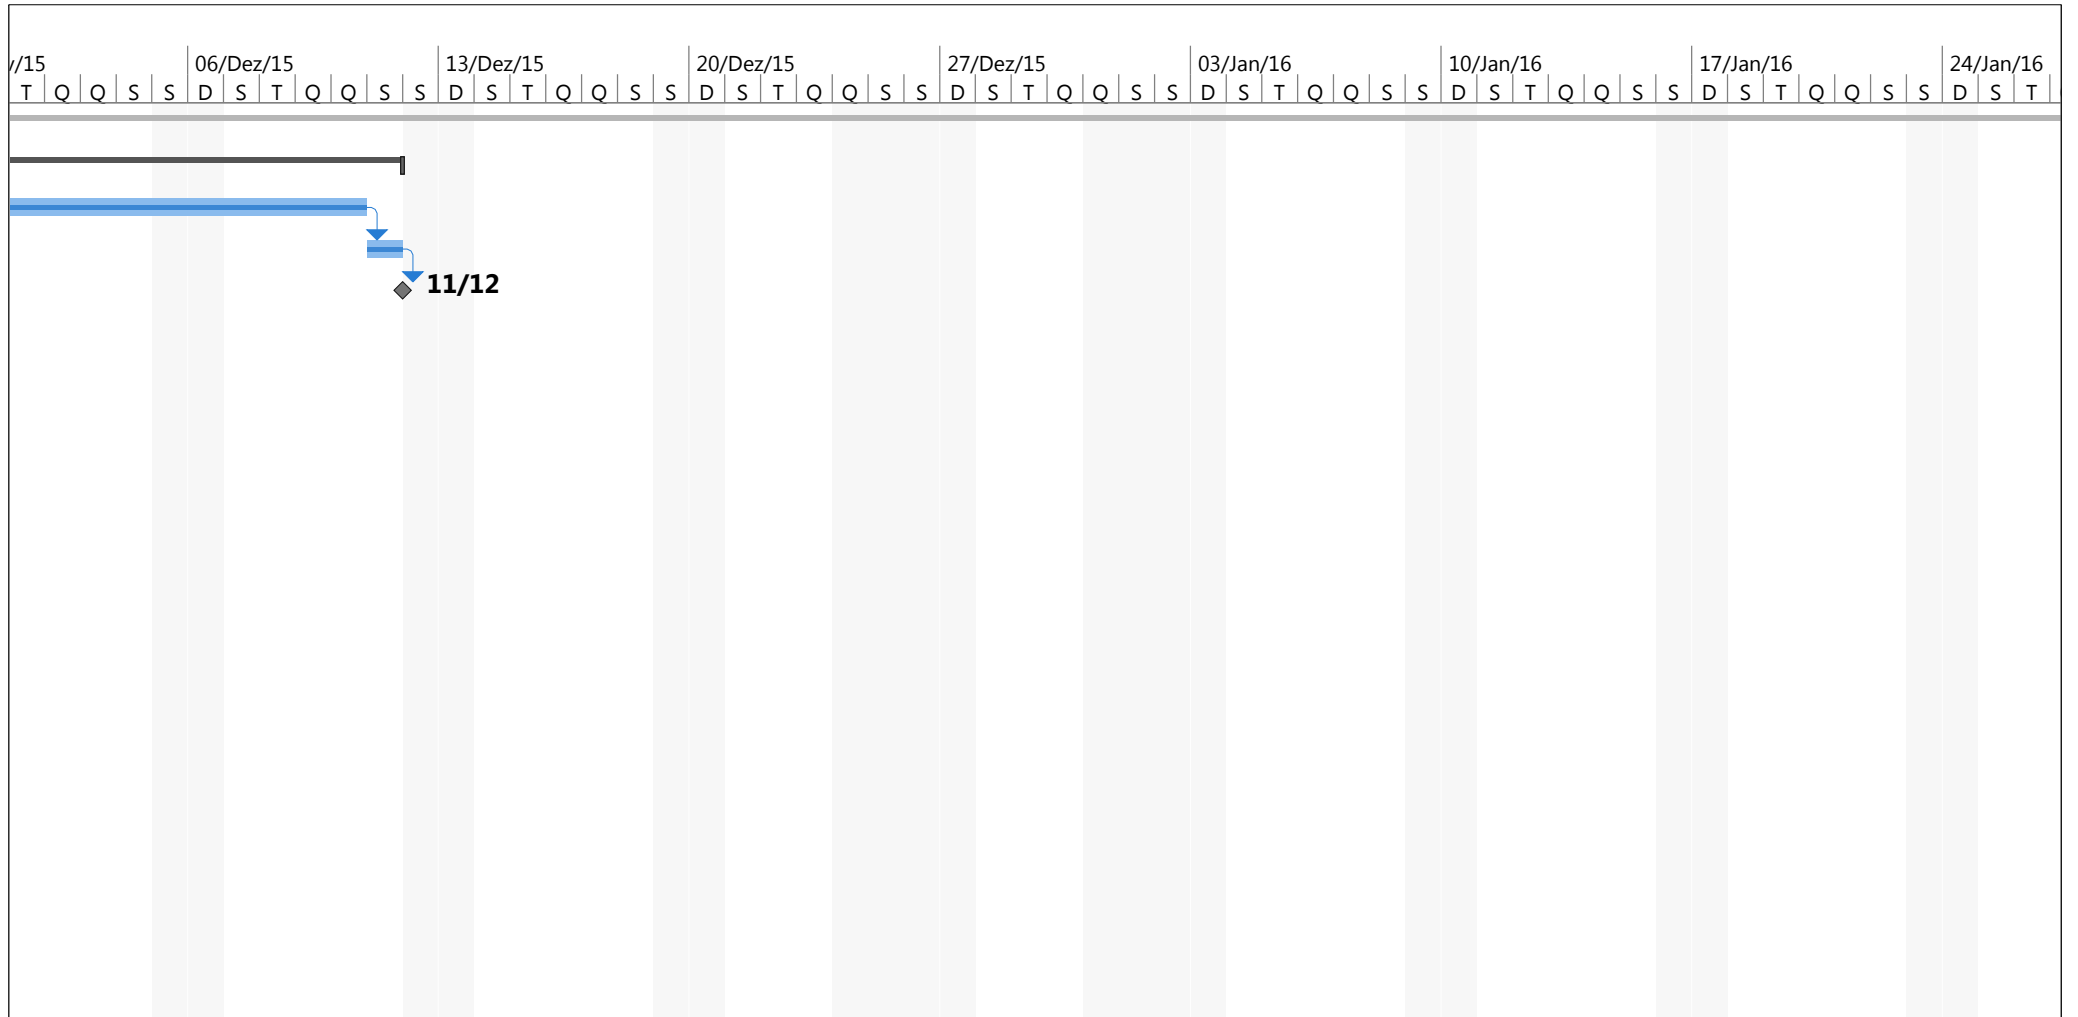


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

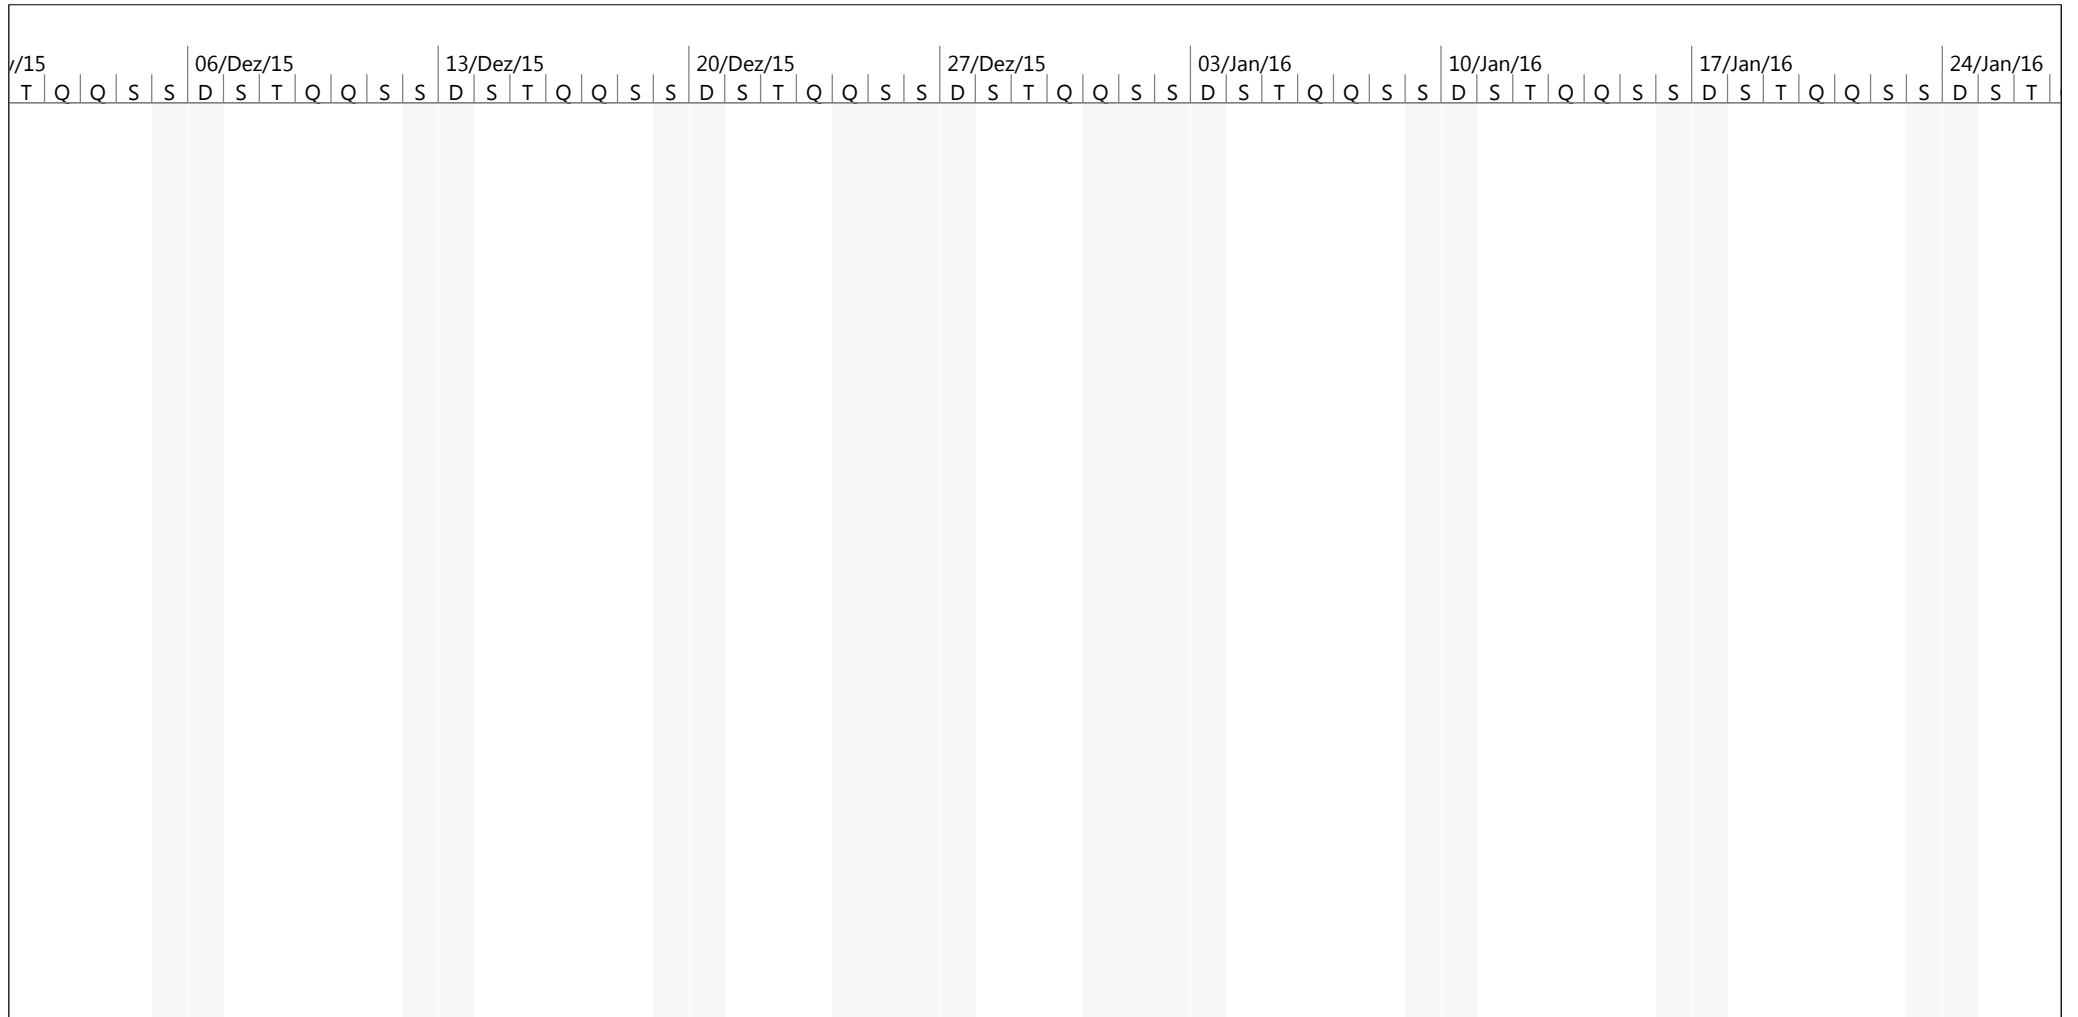



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

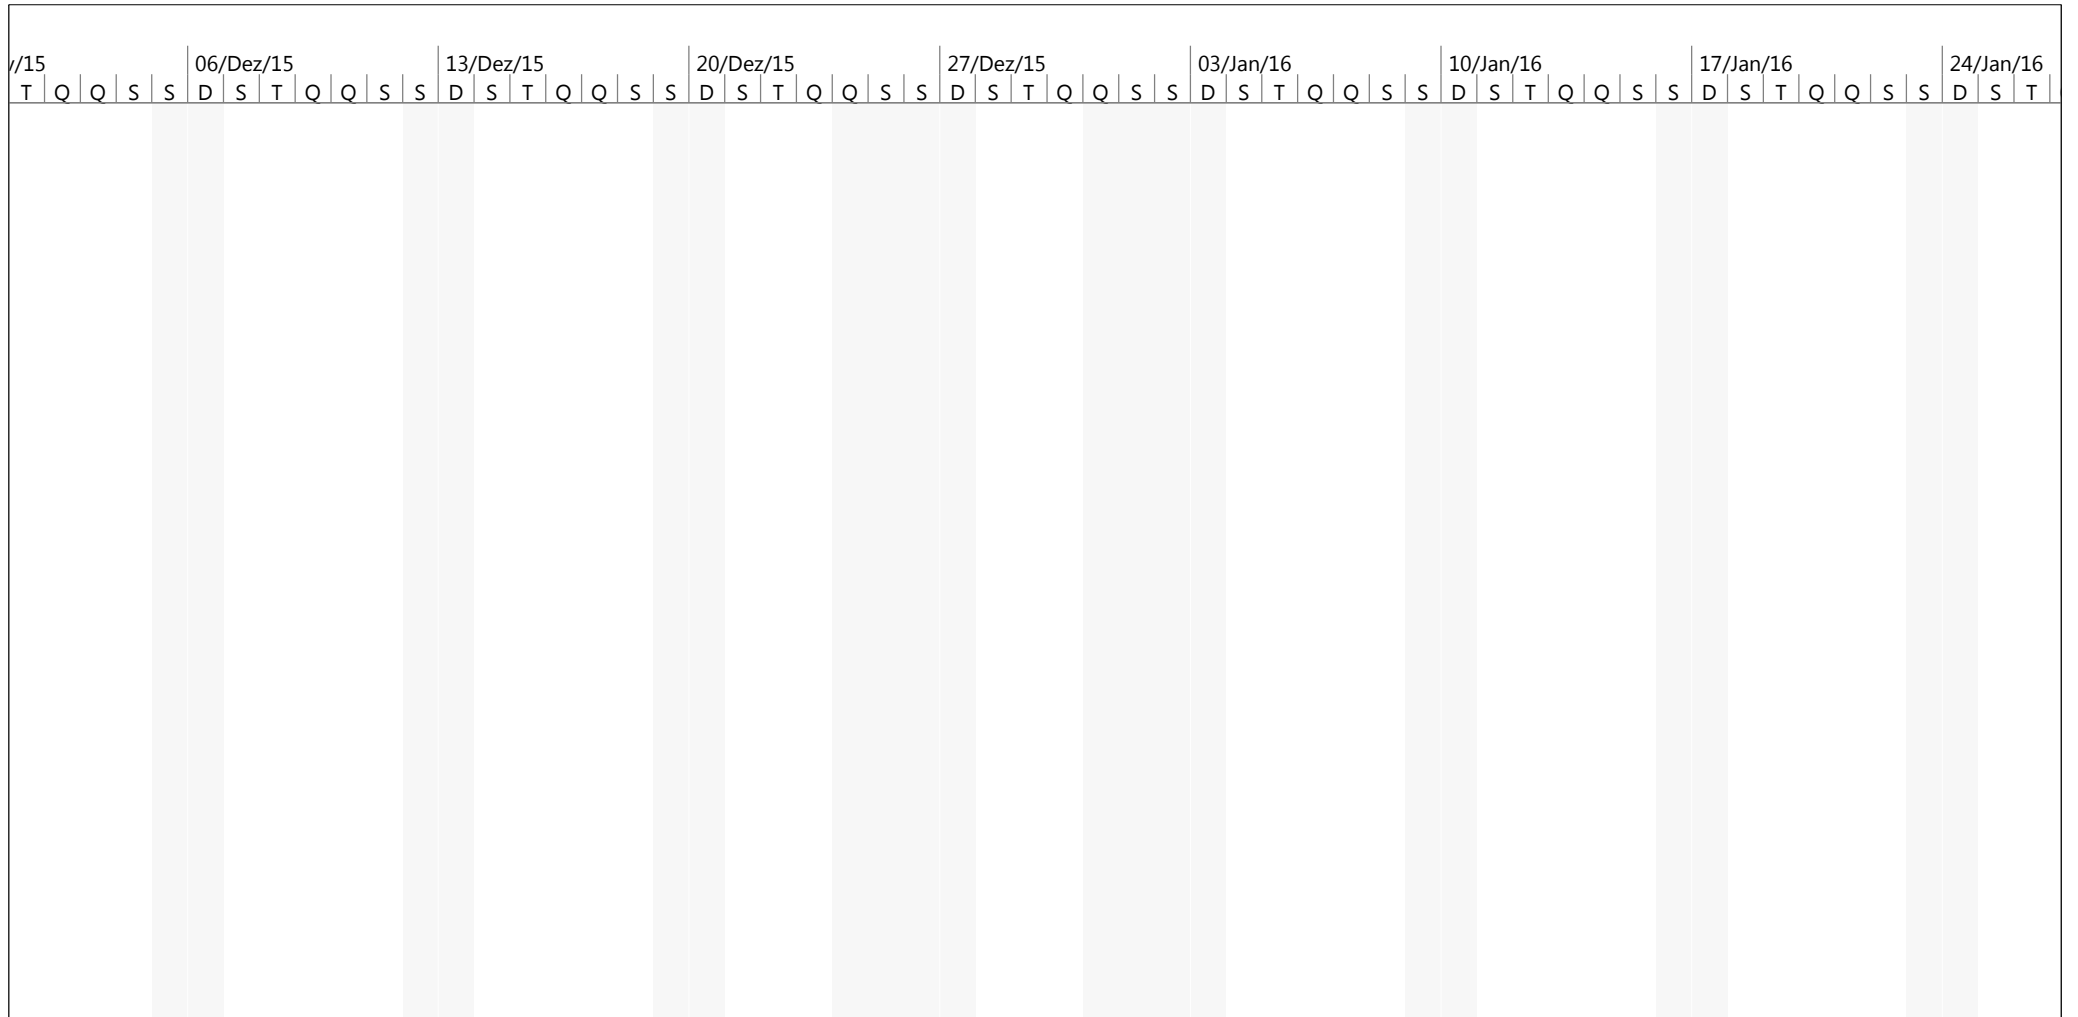

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			









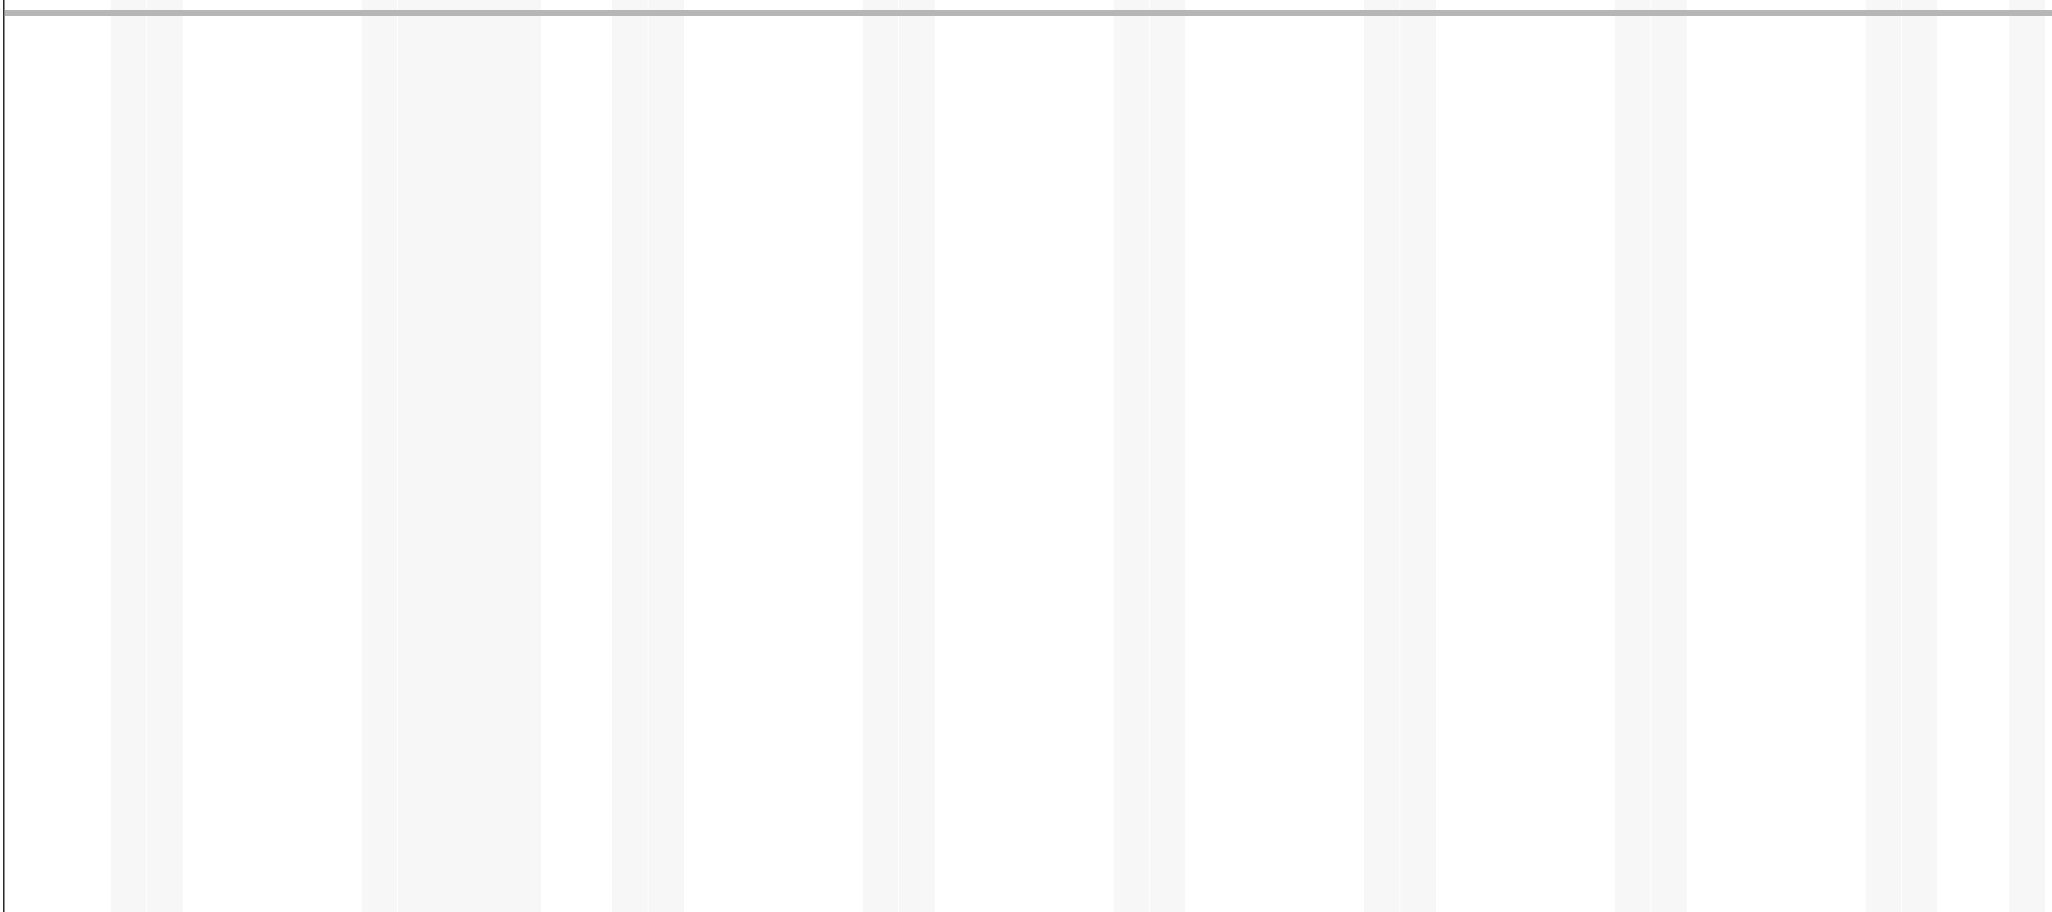











Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Q Q S S 31/Jan/16 D S T Q Q S S 07/Fev/16 D S T Q Q S S 14/Fev/16 D S T Q Q S S 21/Fev/16 D S T Q Q S S 28/Fev/16 D S T Q Q S S 06/Mar/16 D S T Q Q S S 13/Mar/16 D S T Q Q S S 20/Mar/16 D S T Q




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

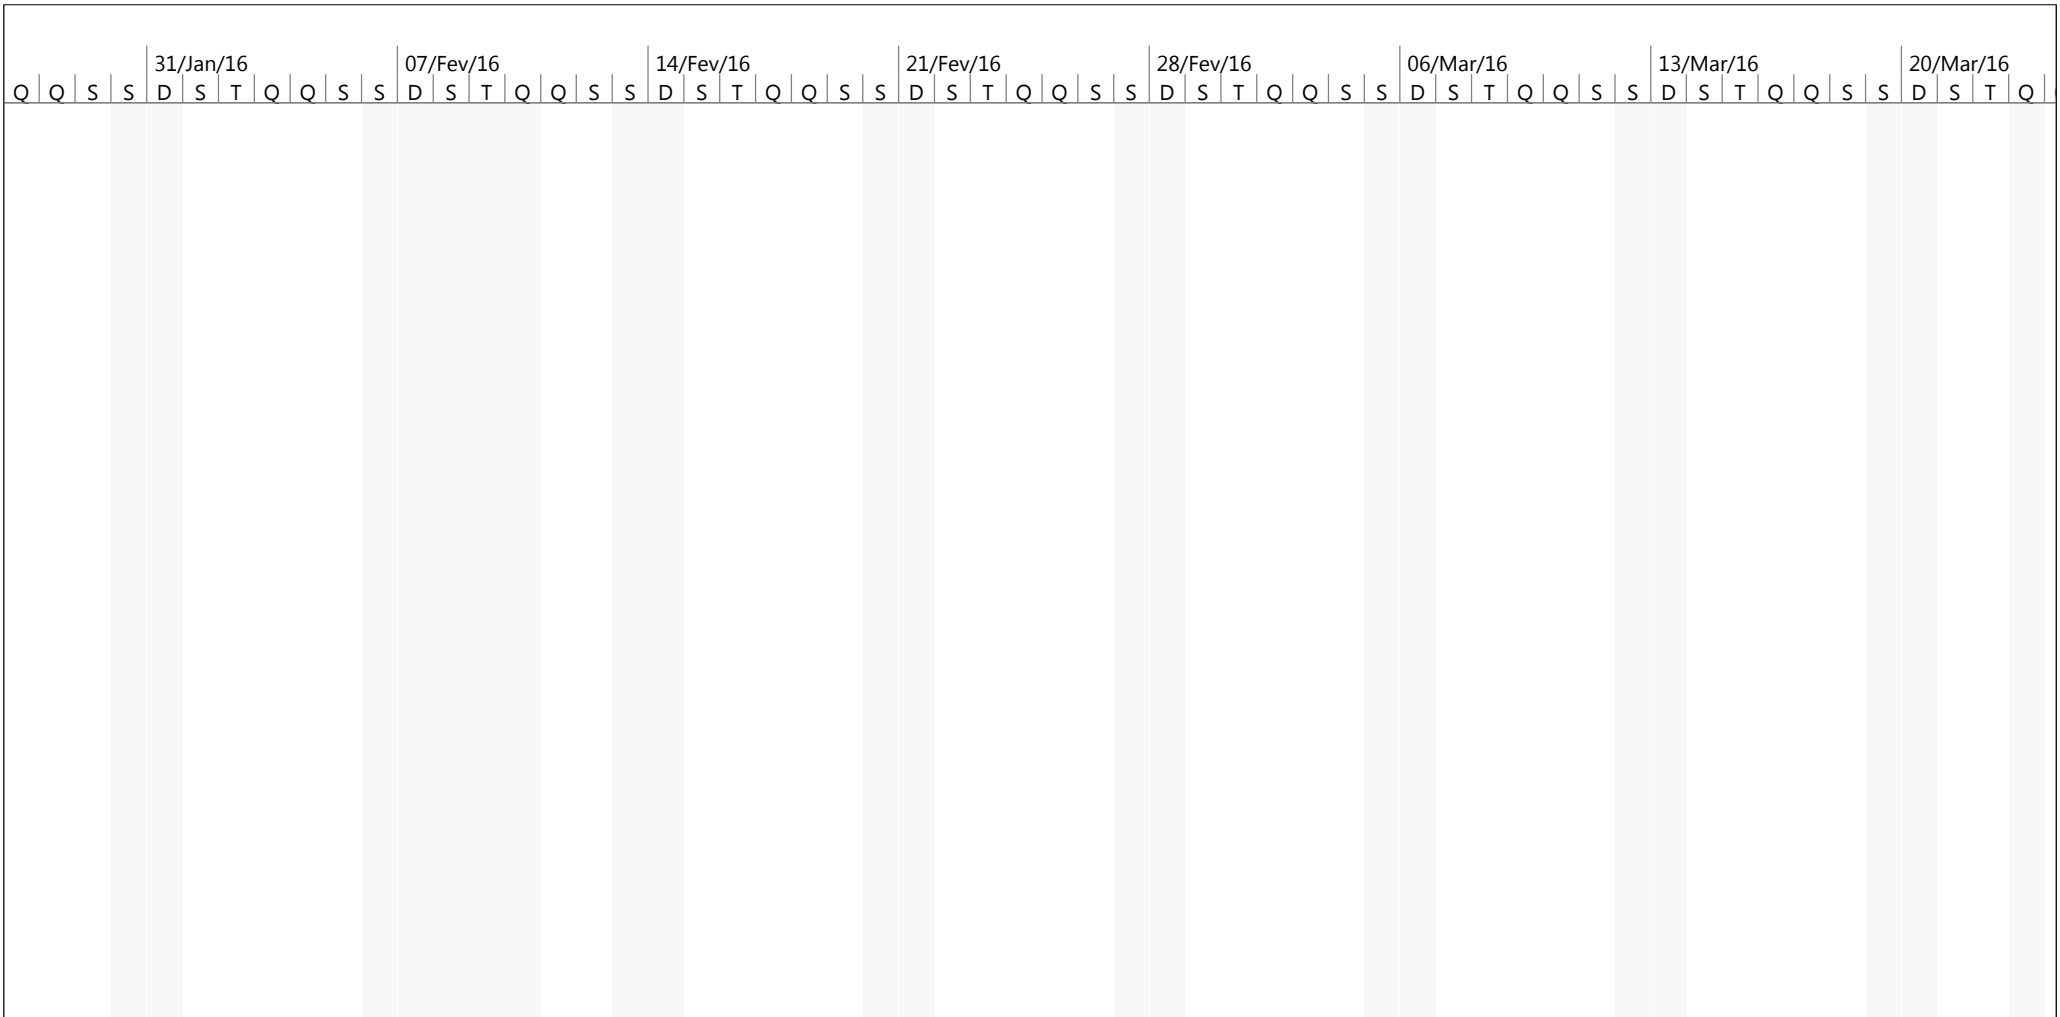



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



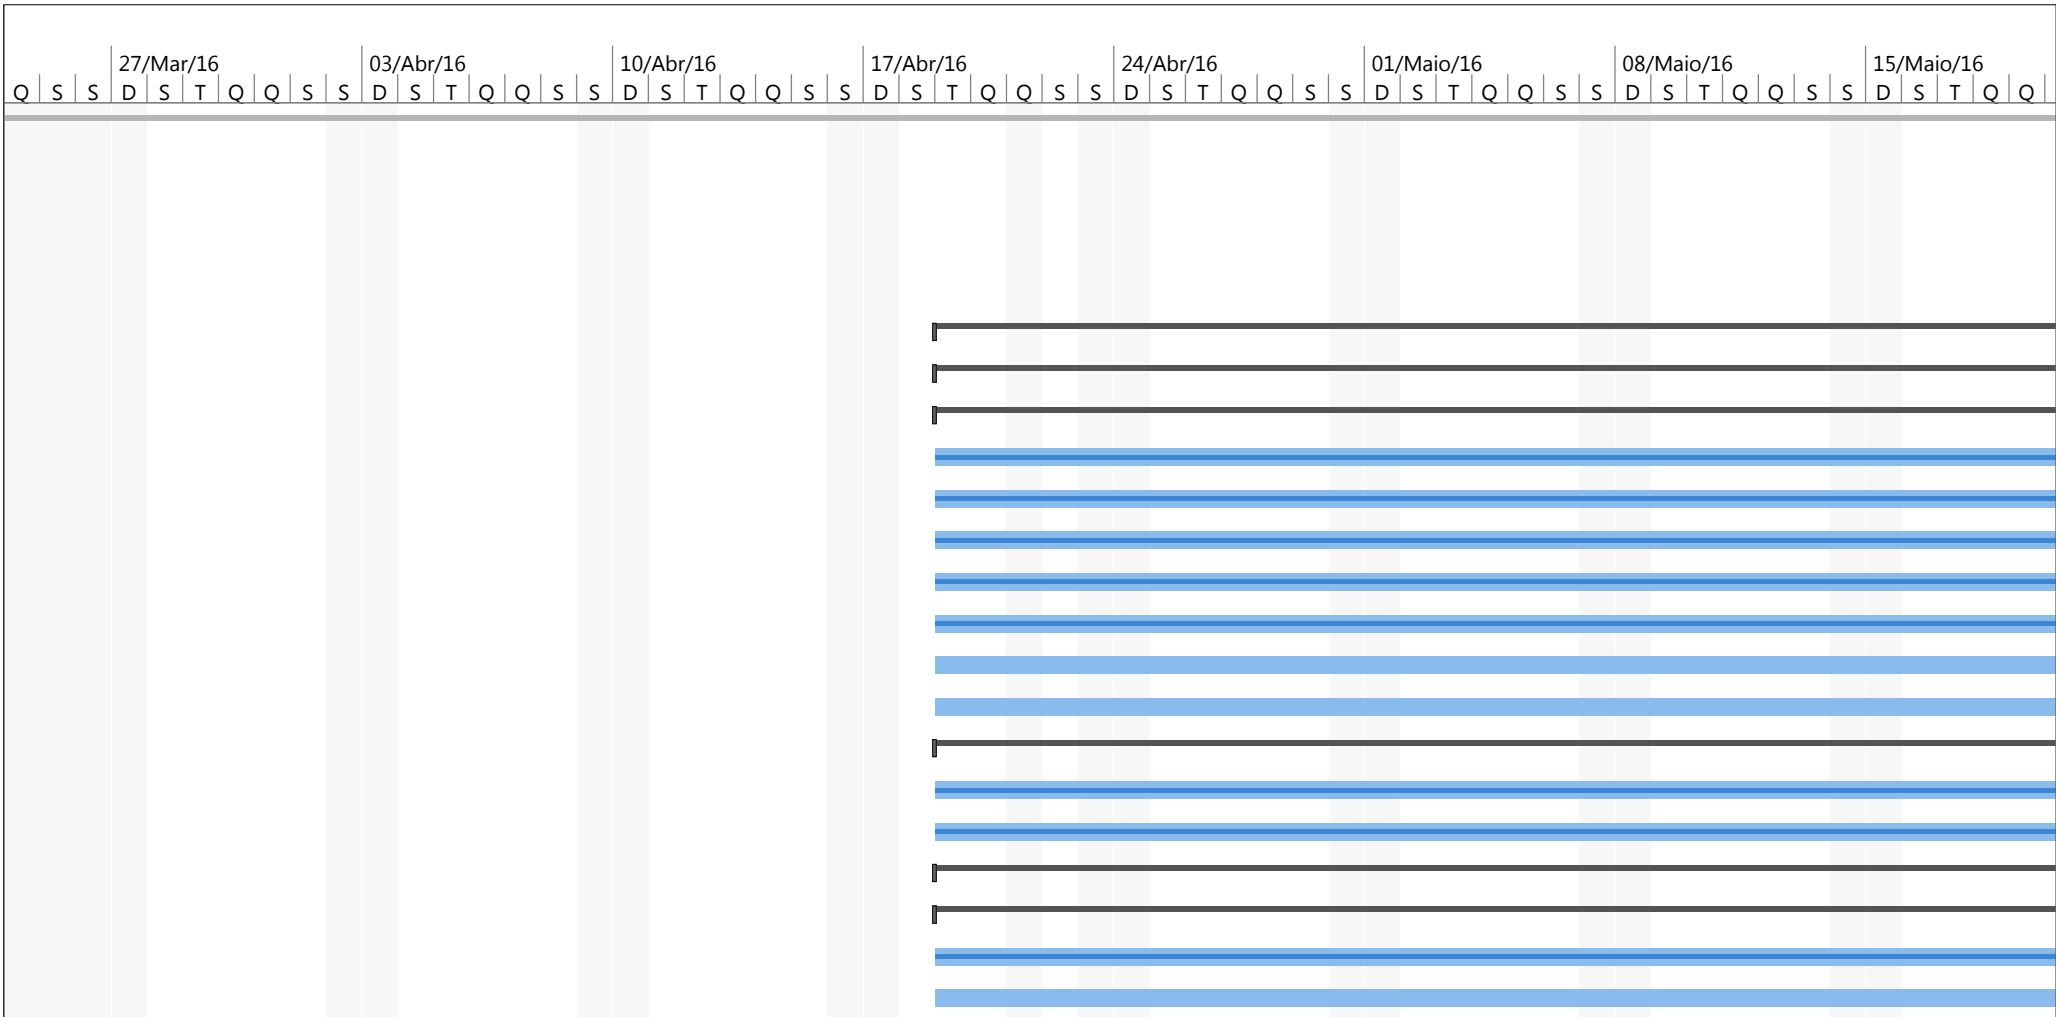


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

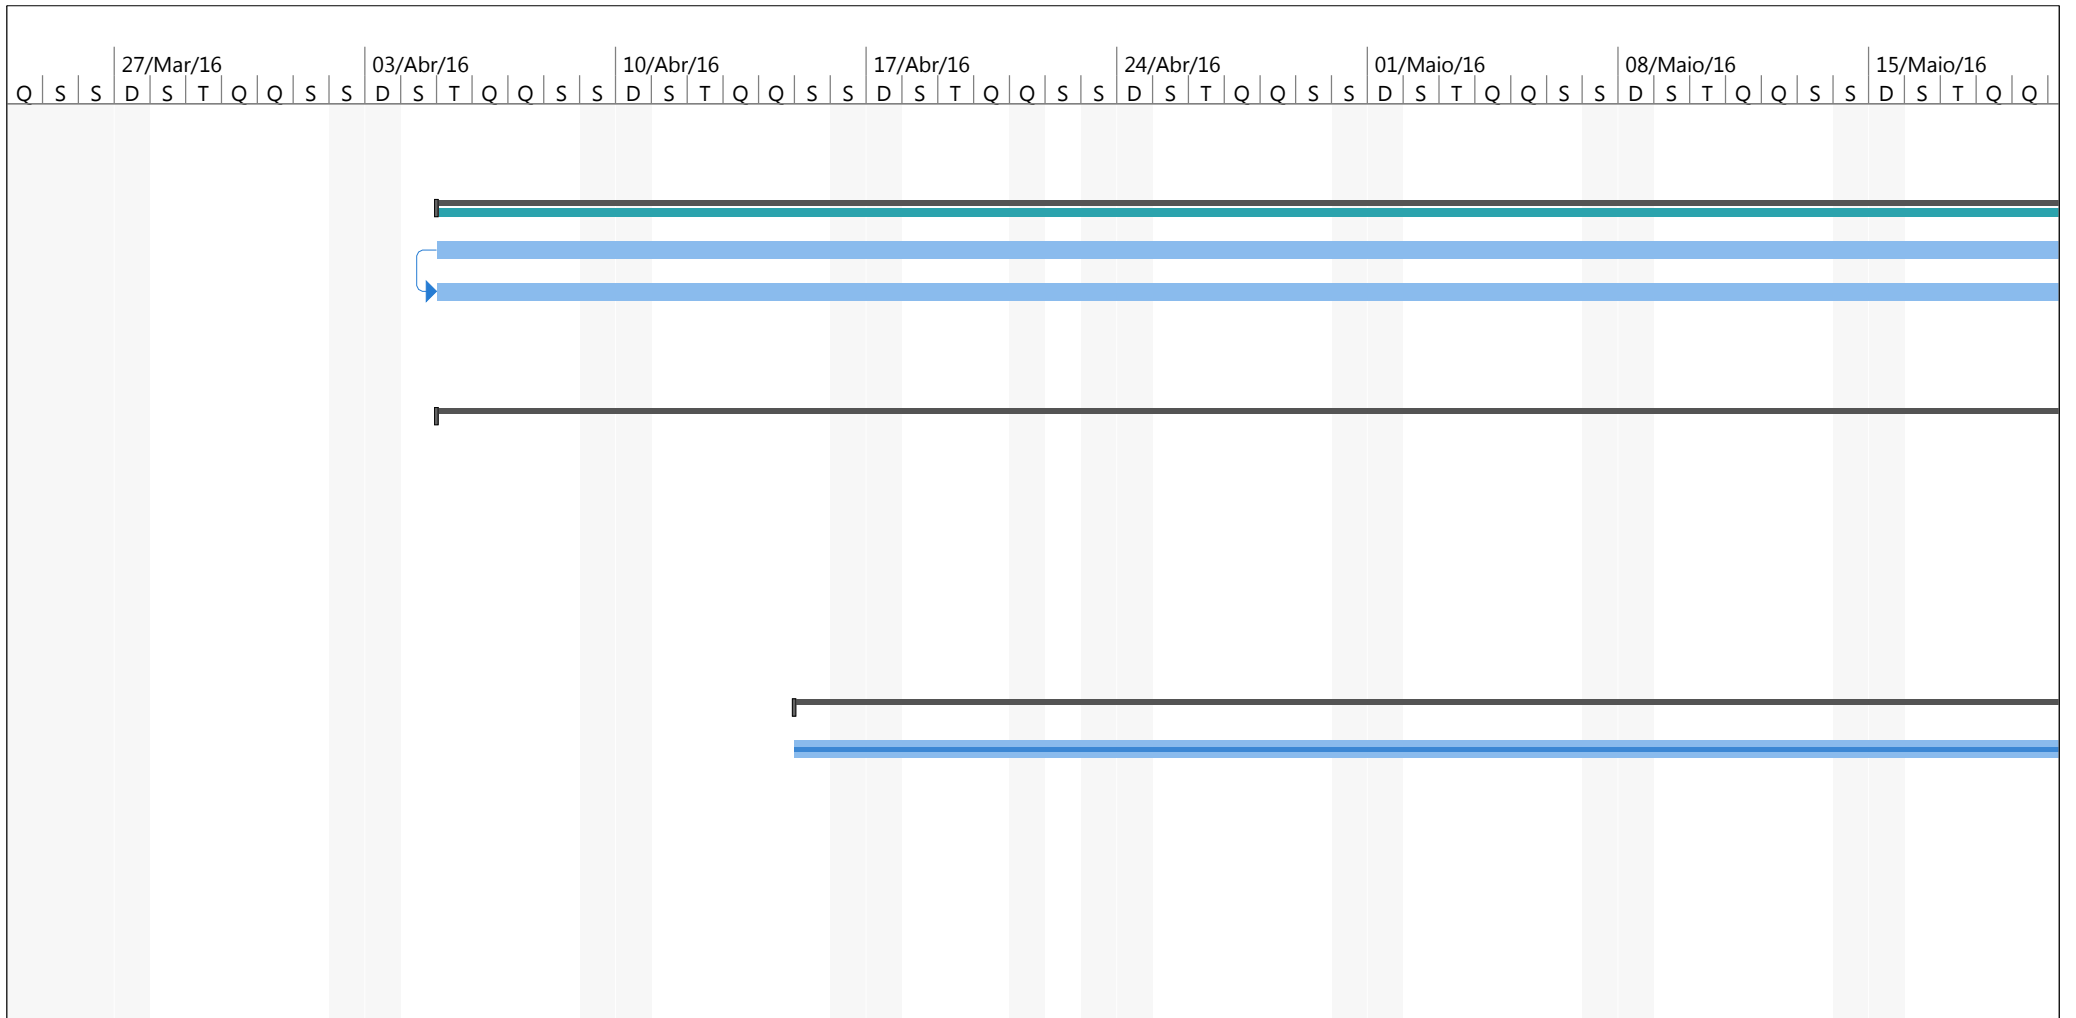


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

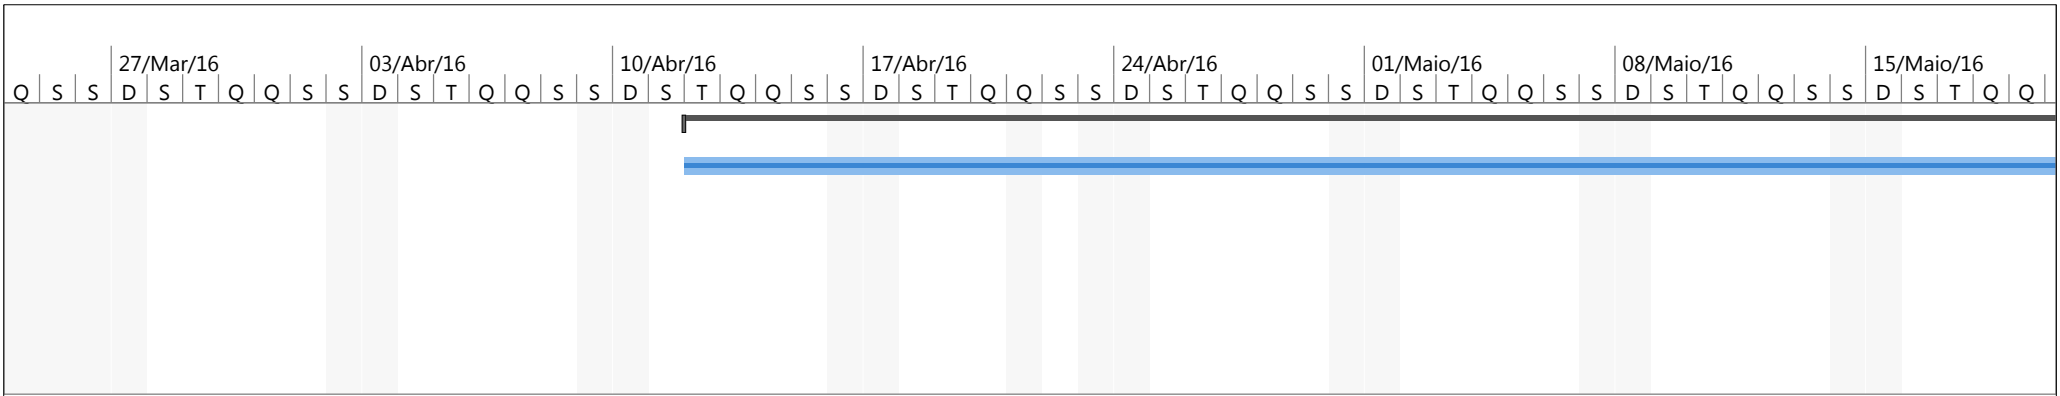


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

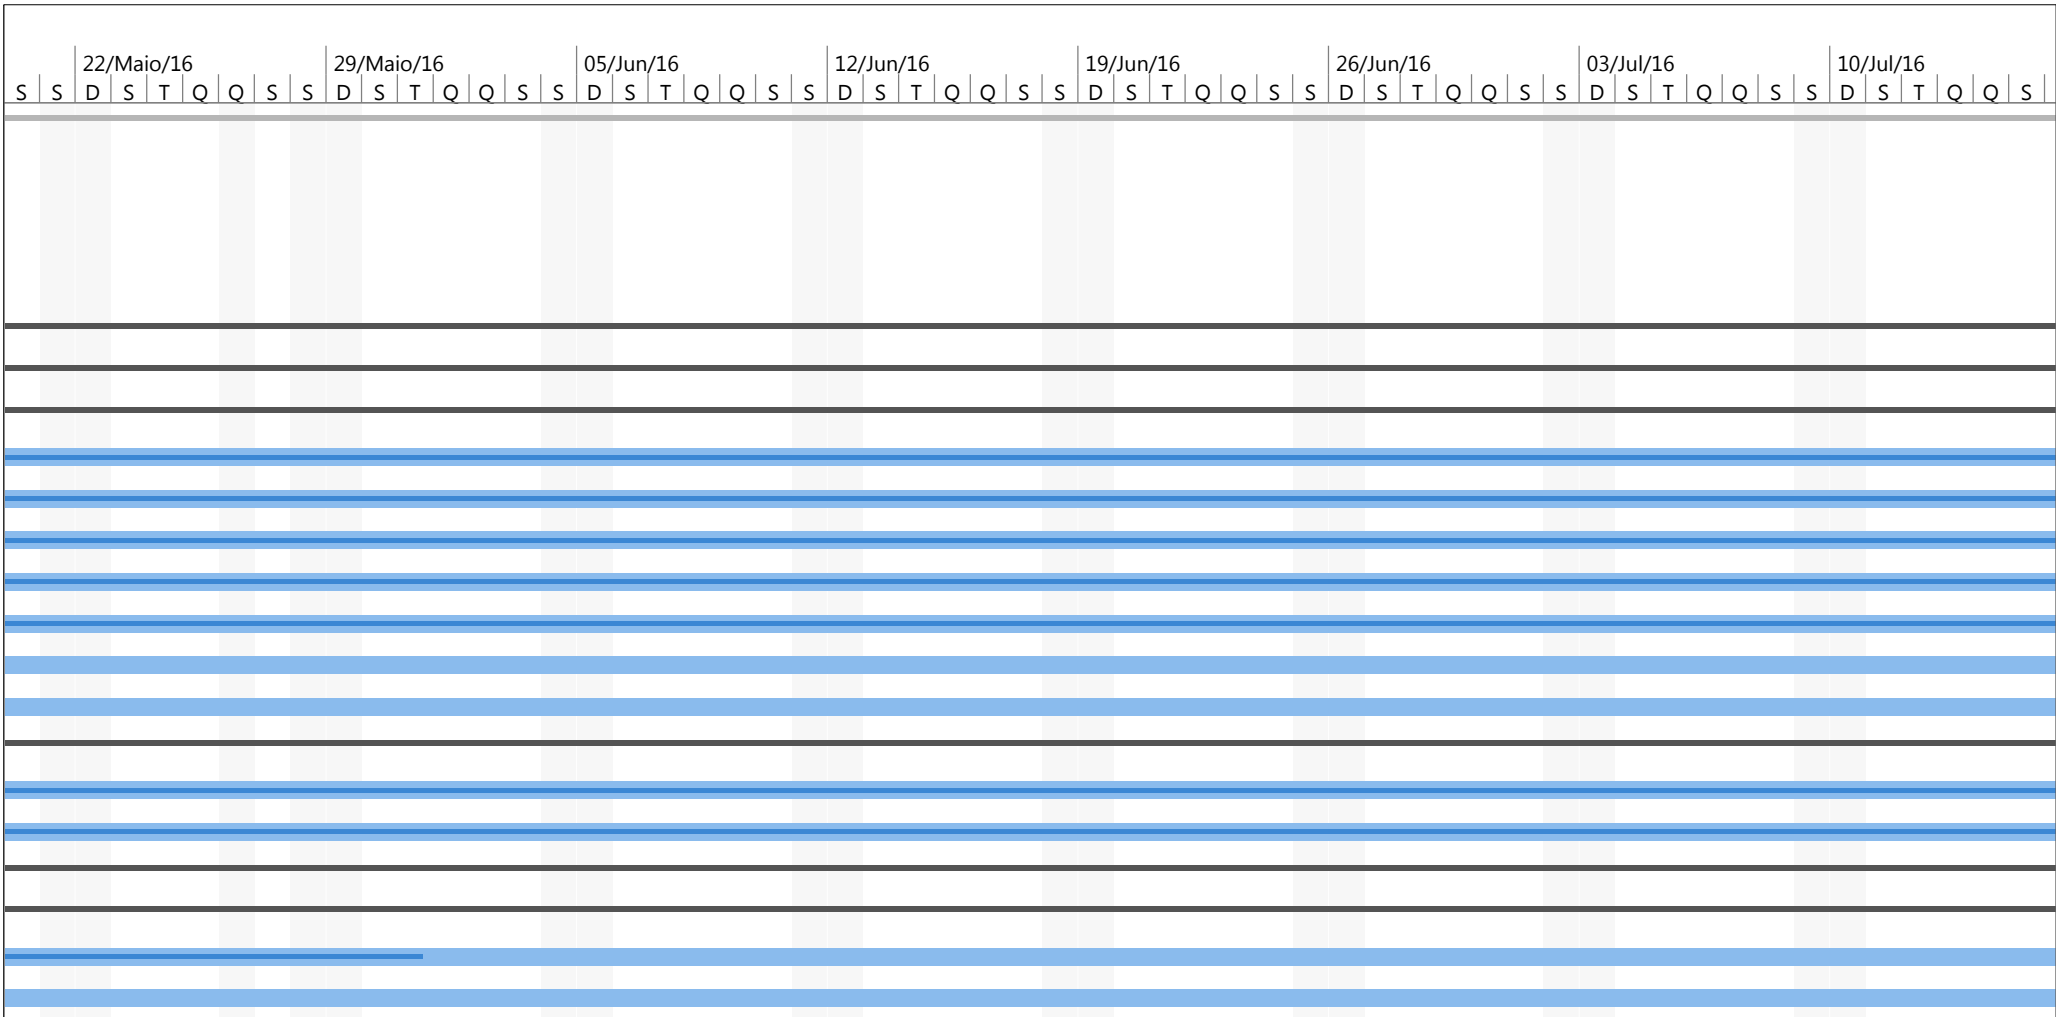


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

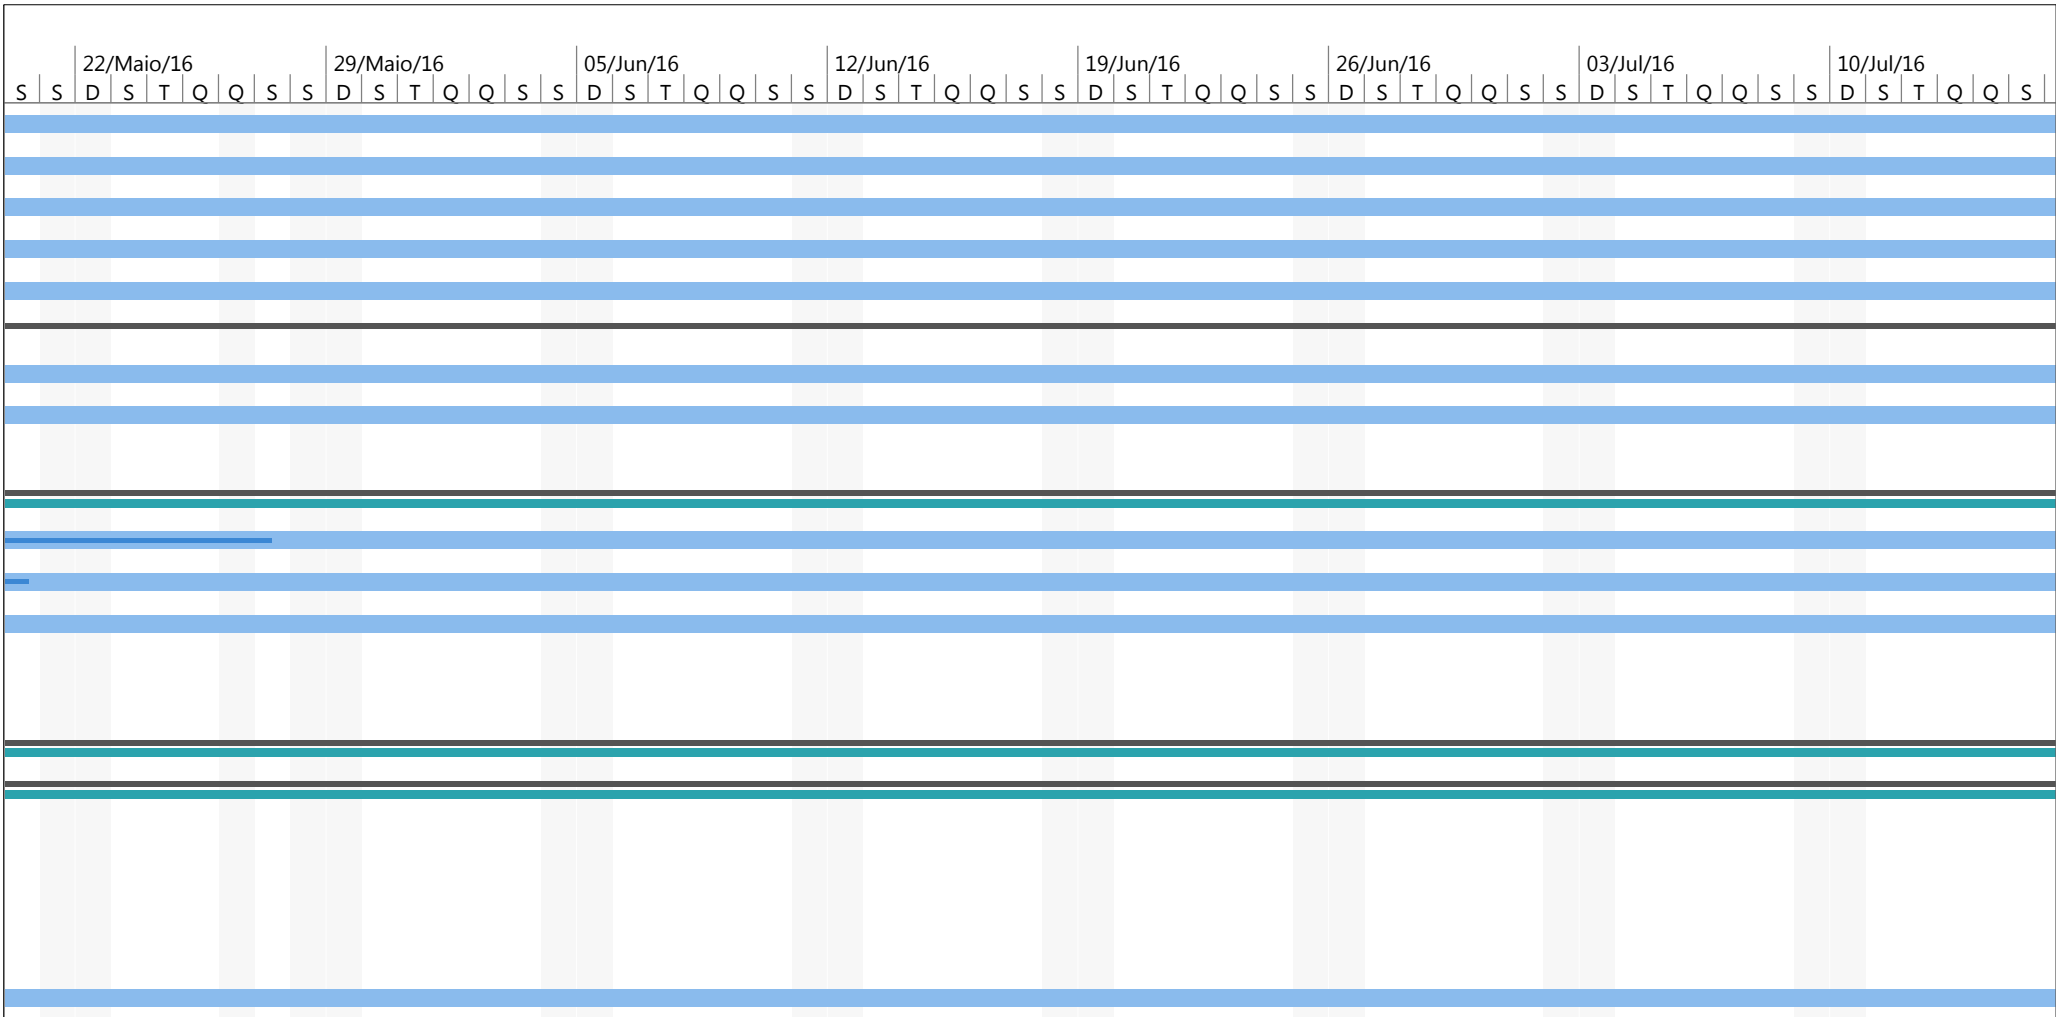



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

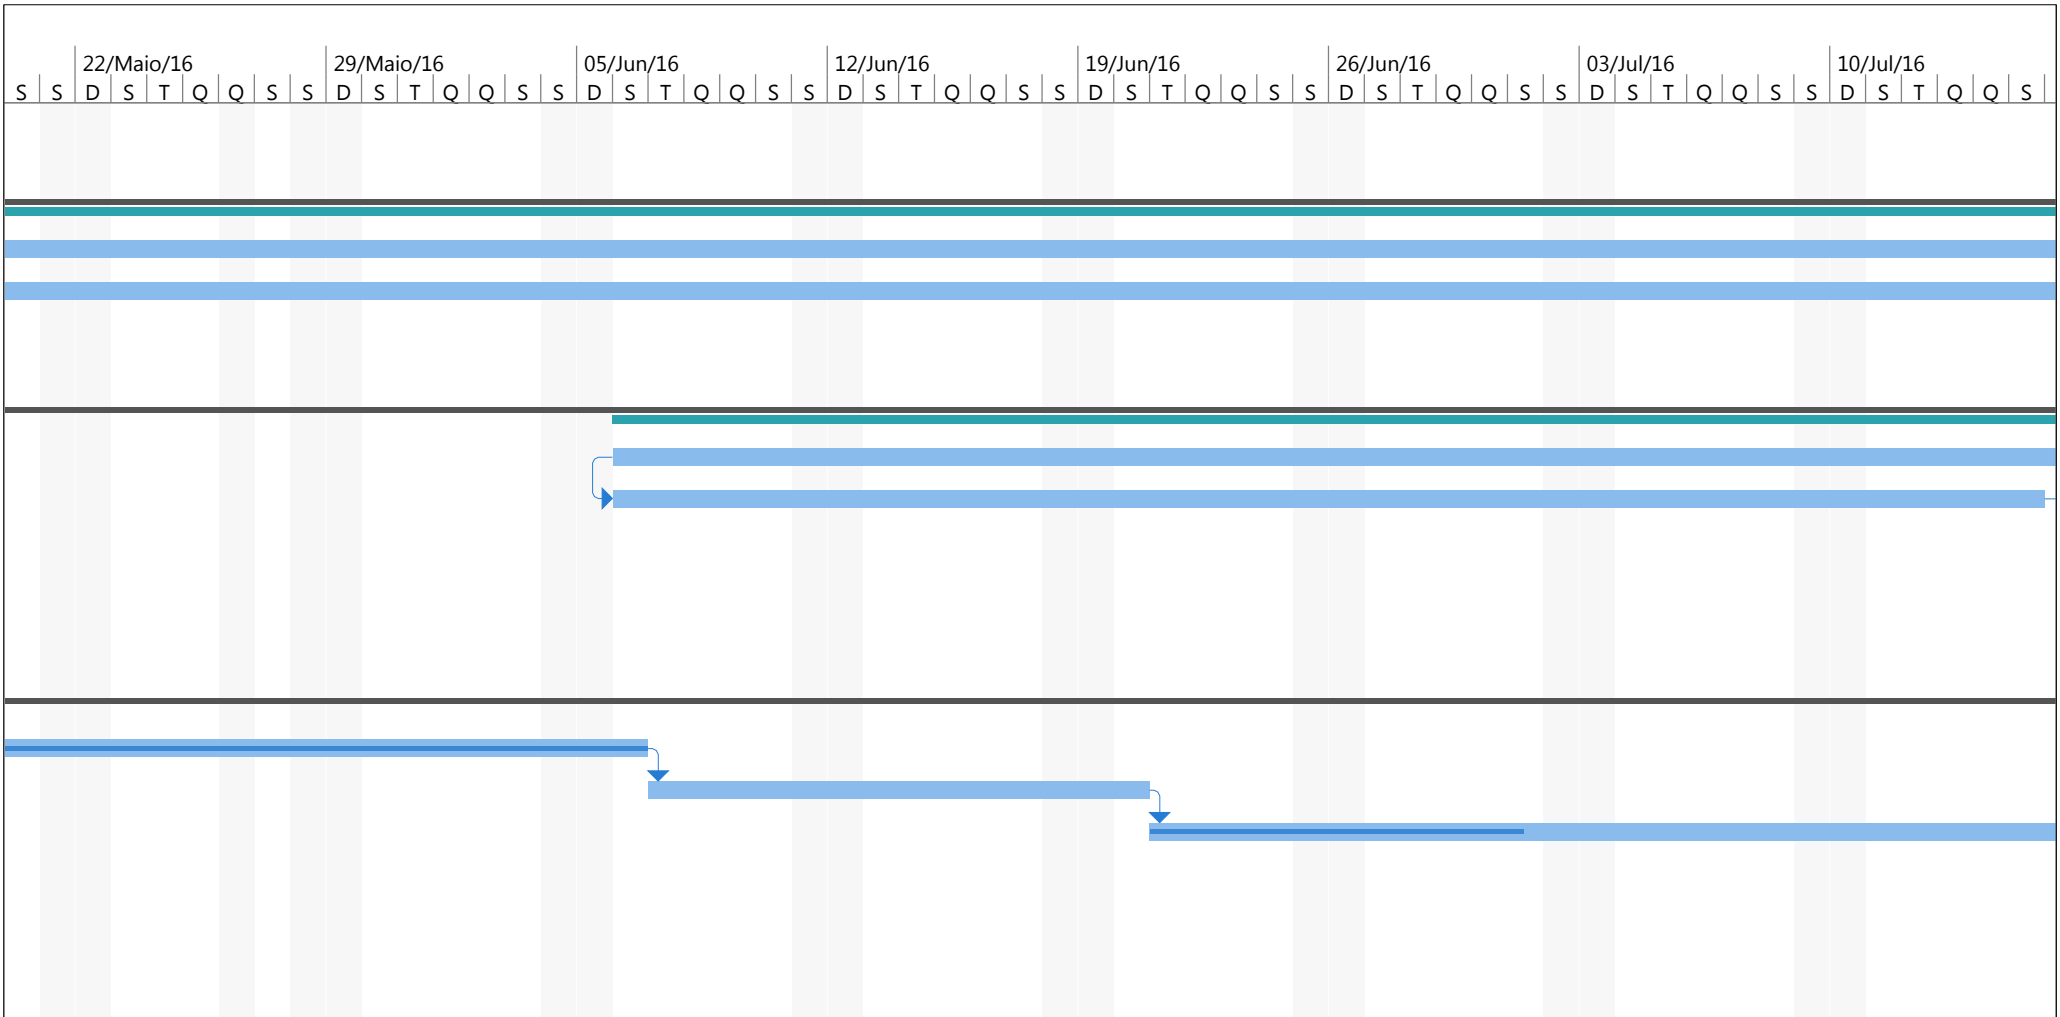

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



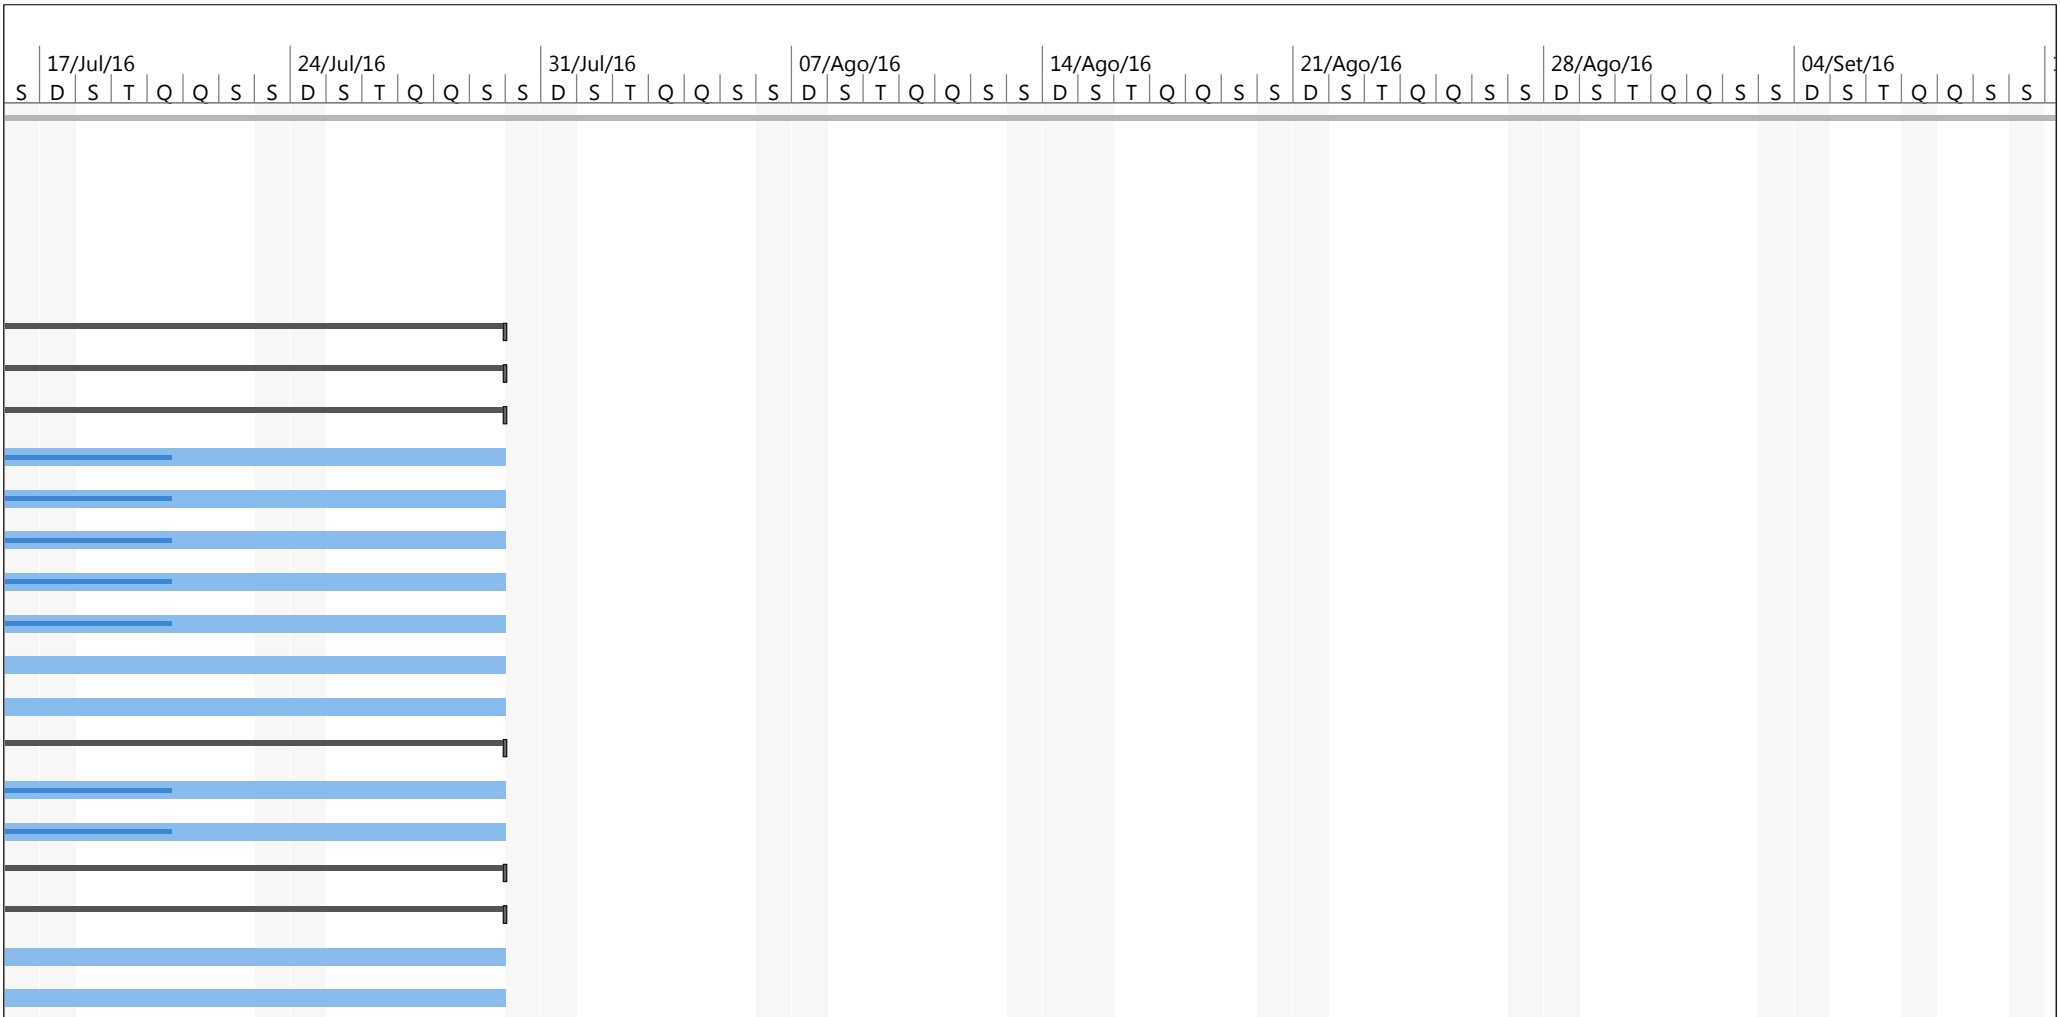


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

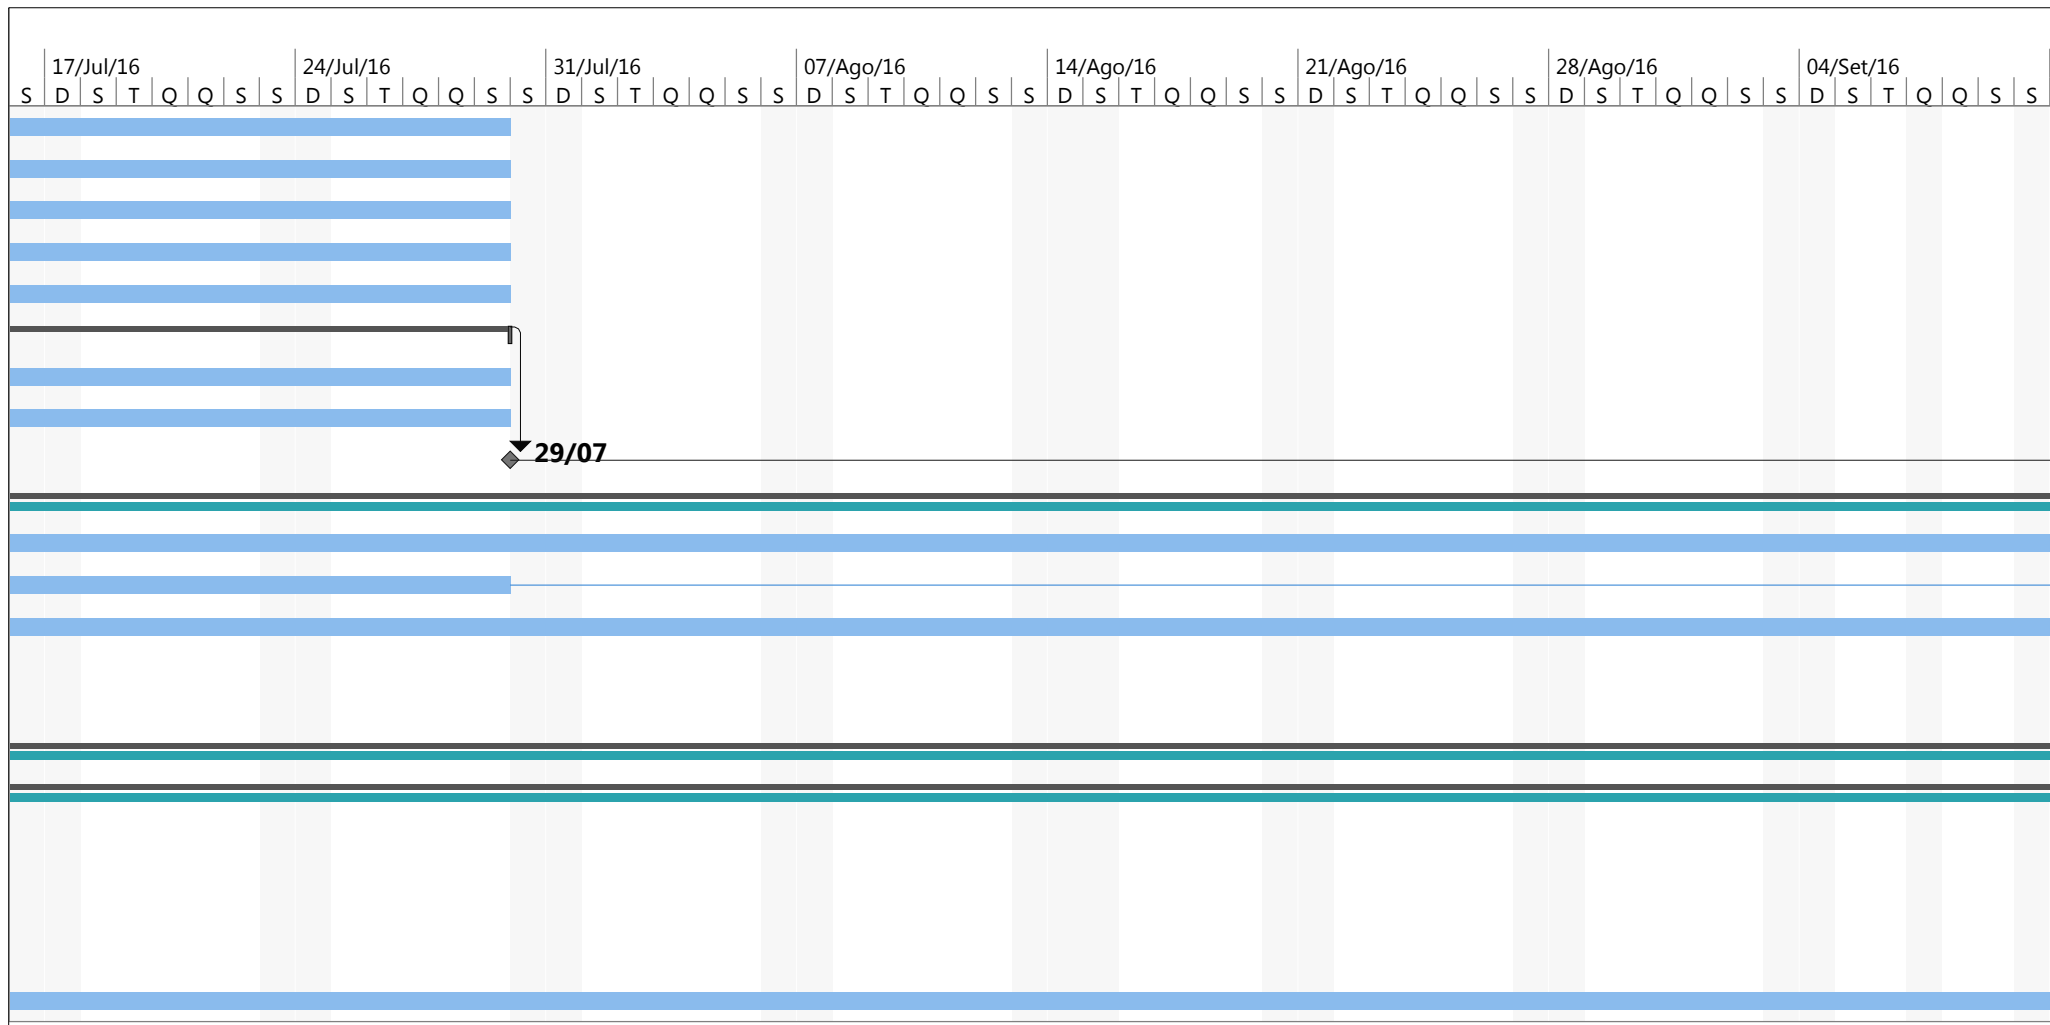


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

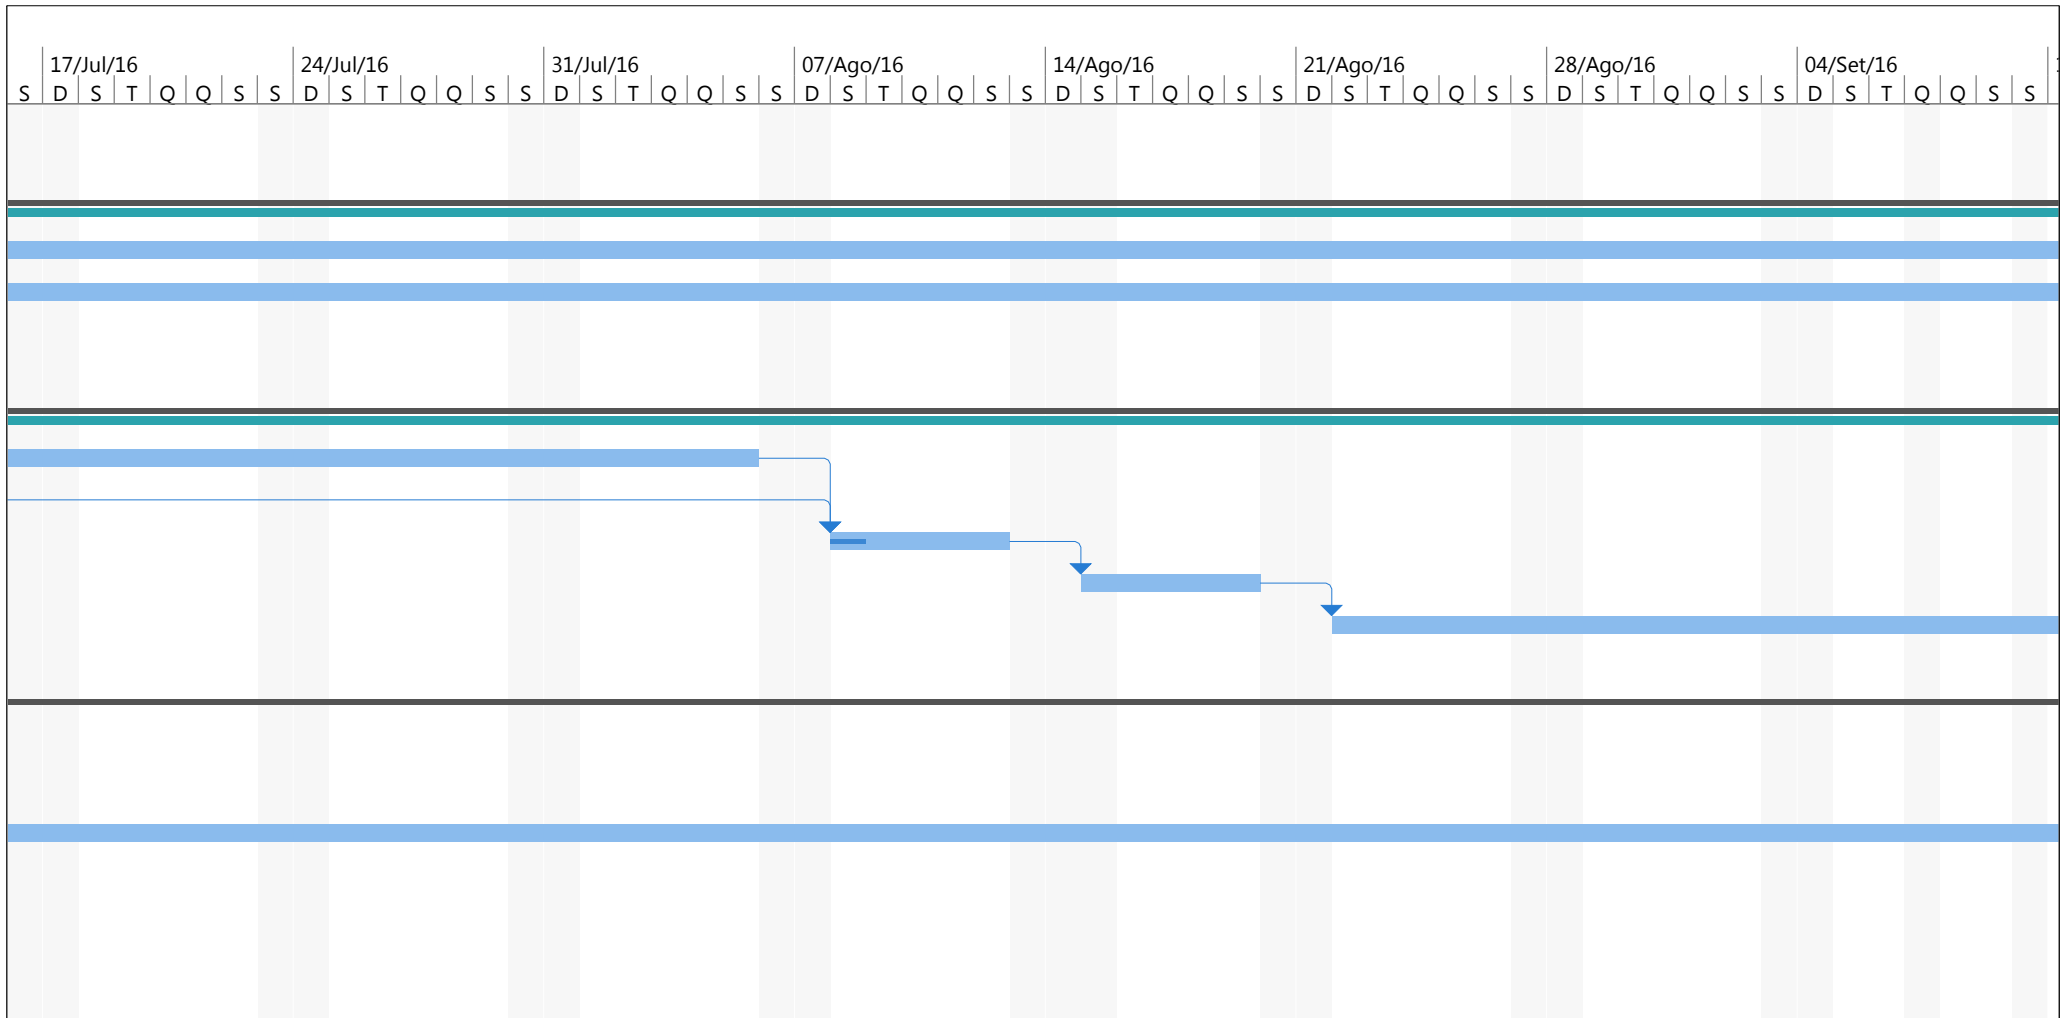

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

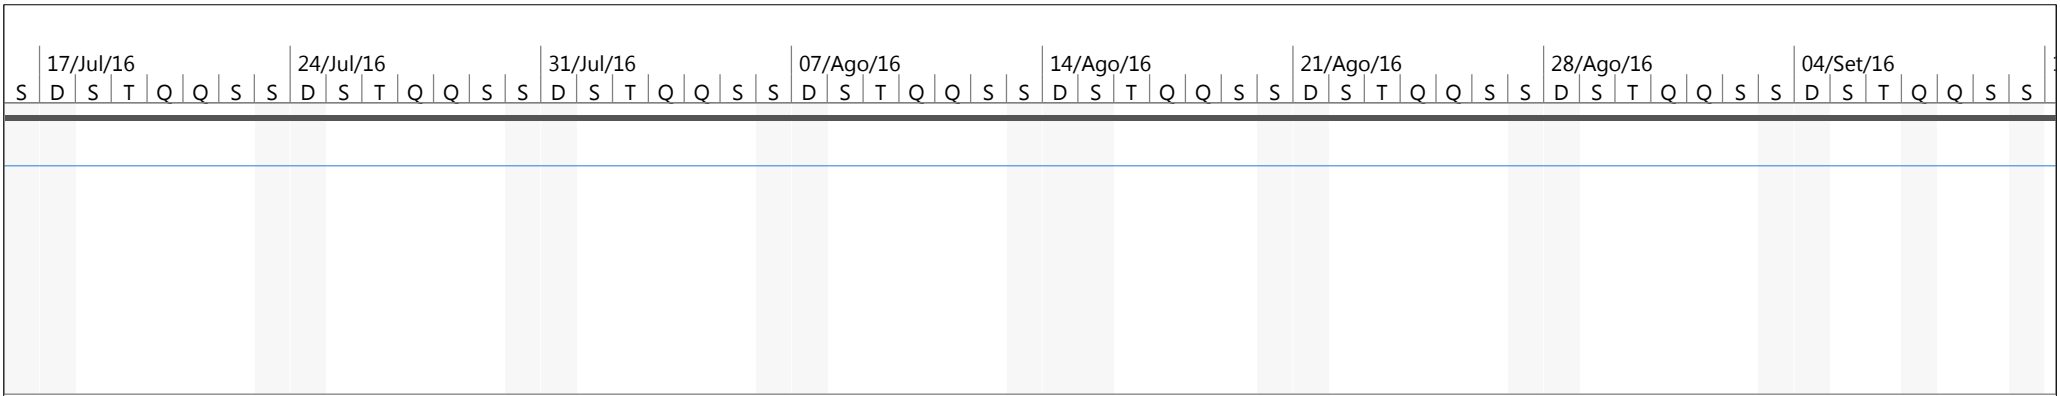







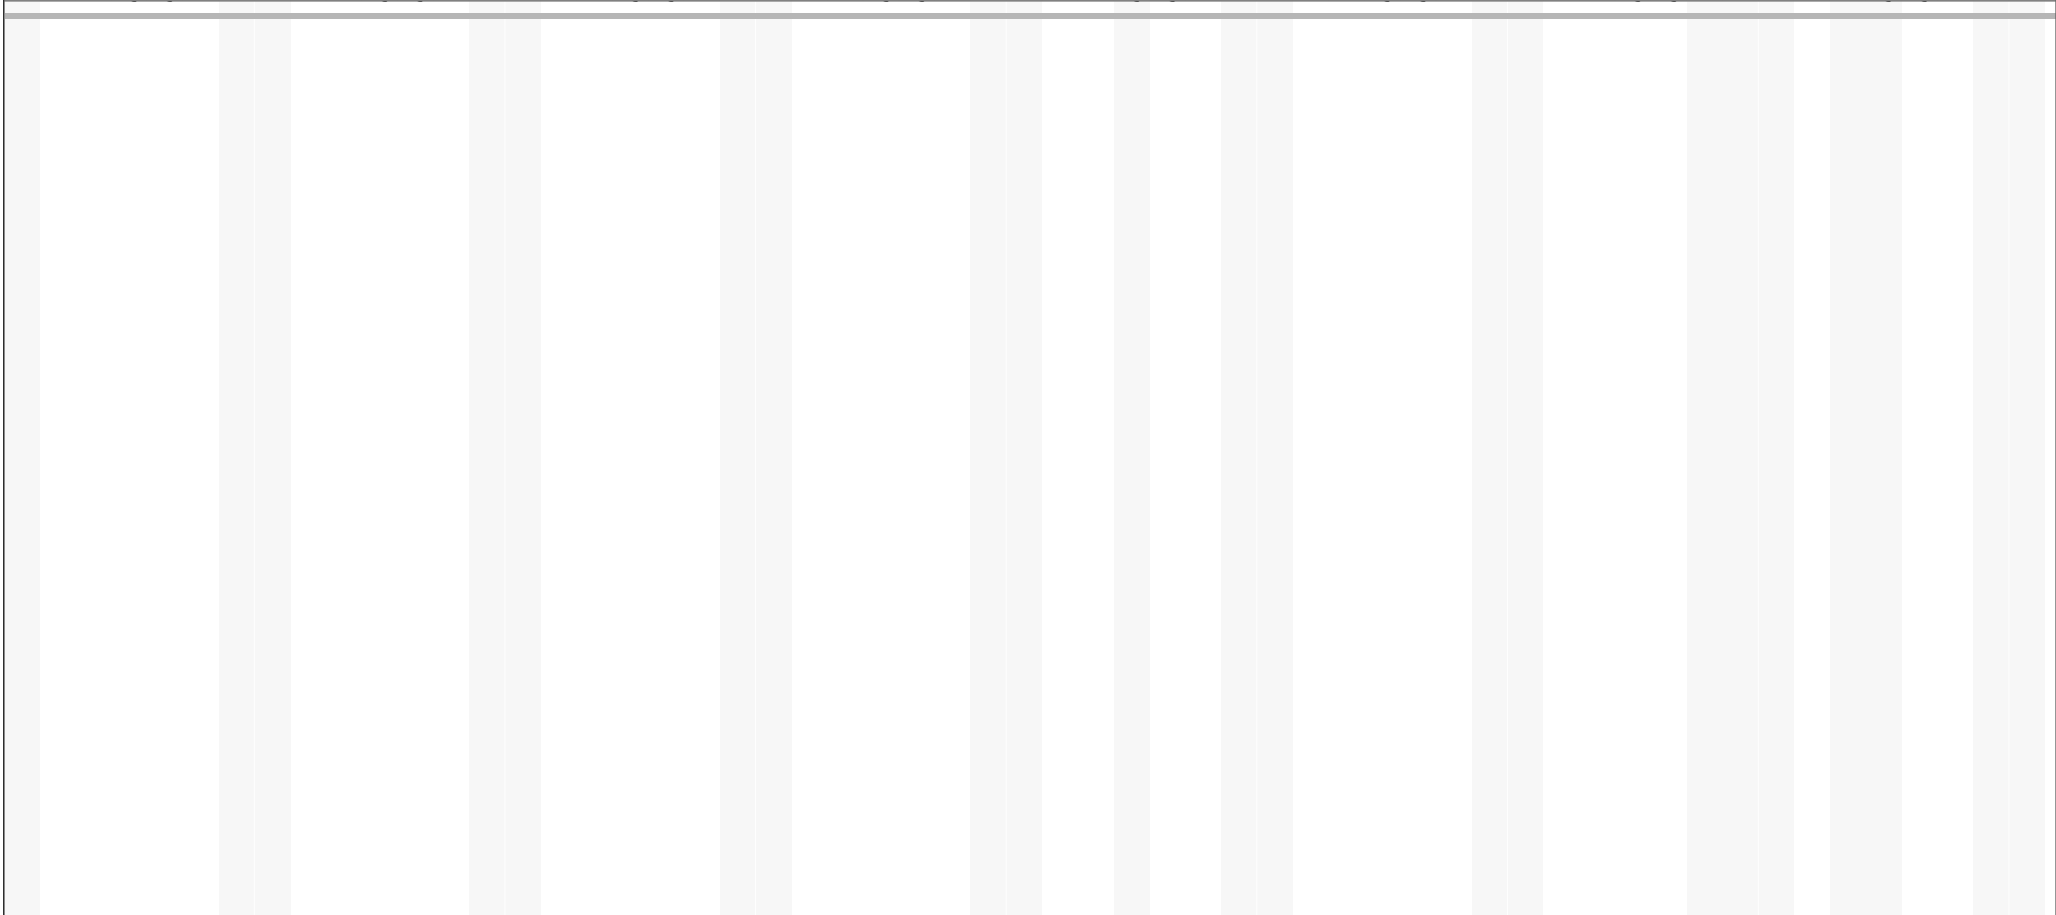











Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

11/Set/16 18/Set/16 25/Set/16 02/Out/16 09/Out/16 16/Out/16 23/Out/16 30/Out/16 06/Nov/16




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

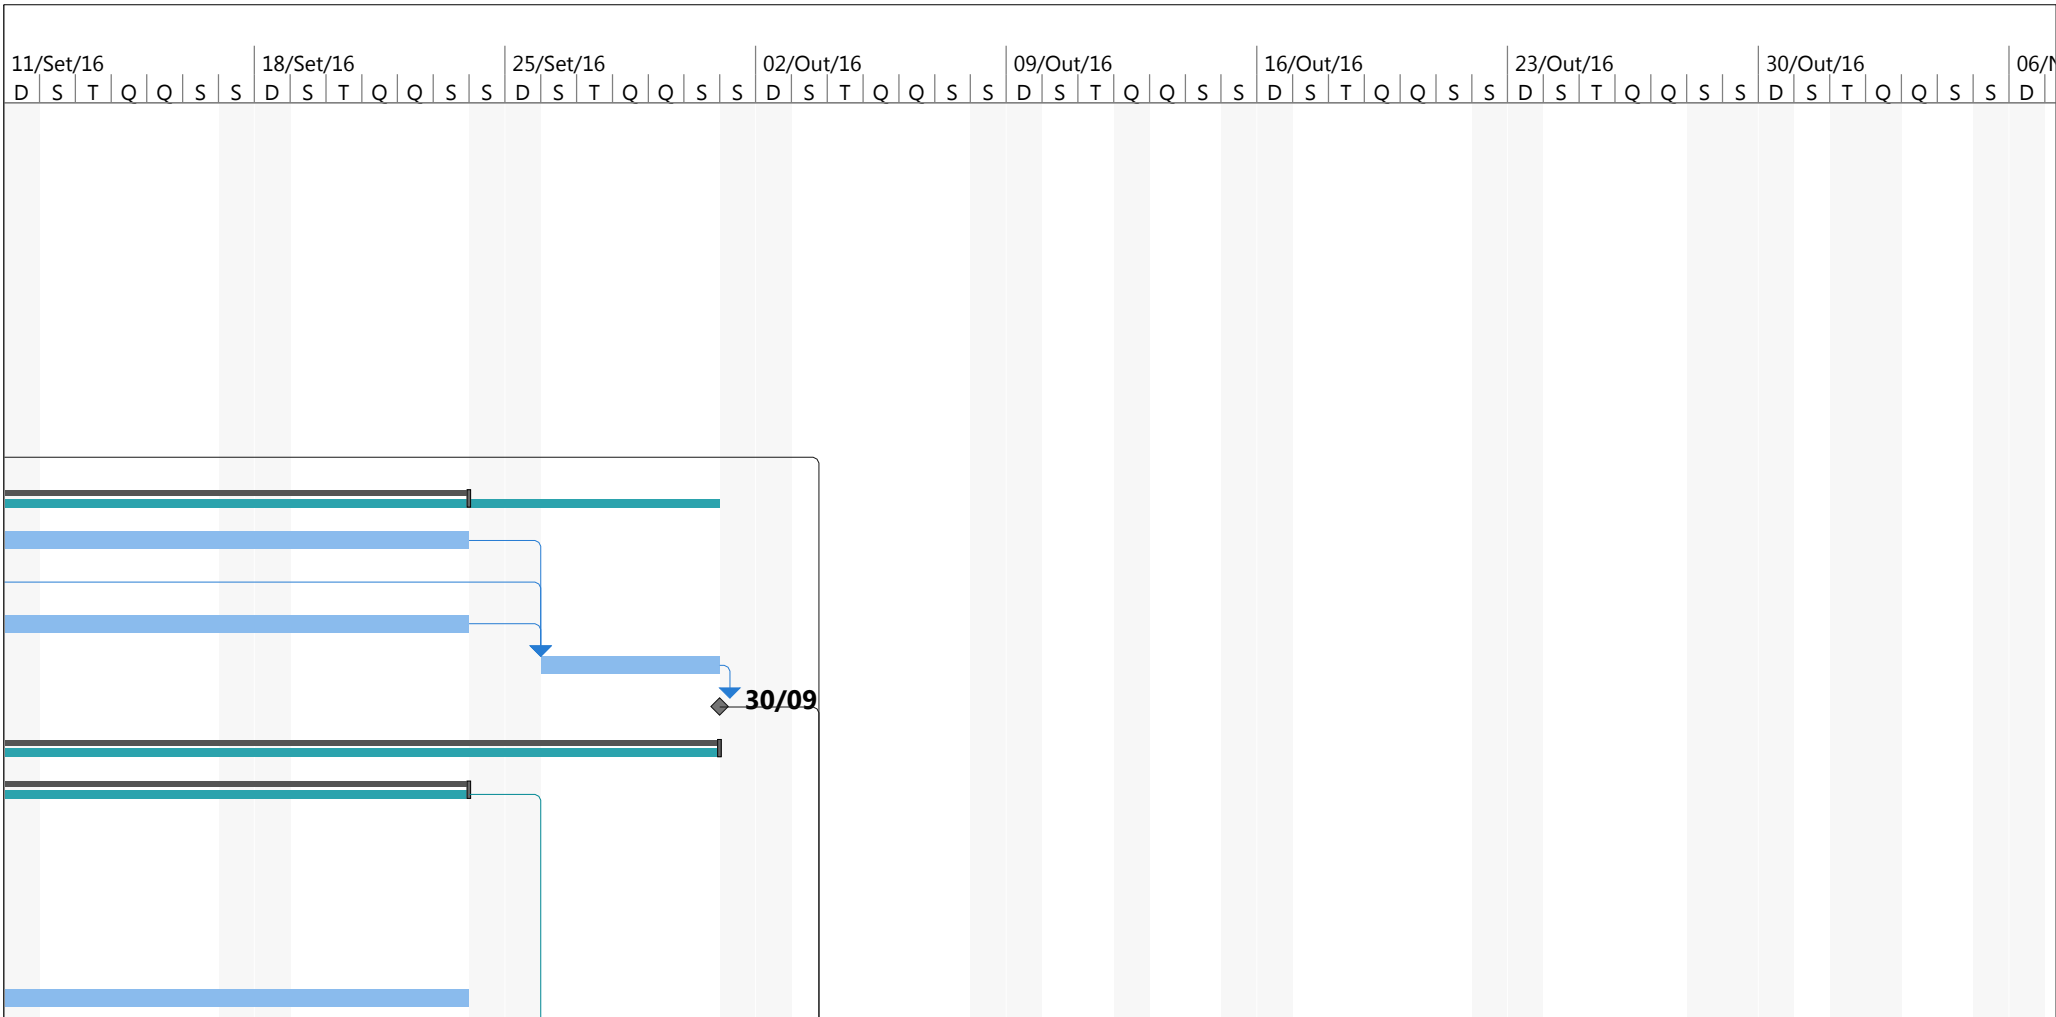

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

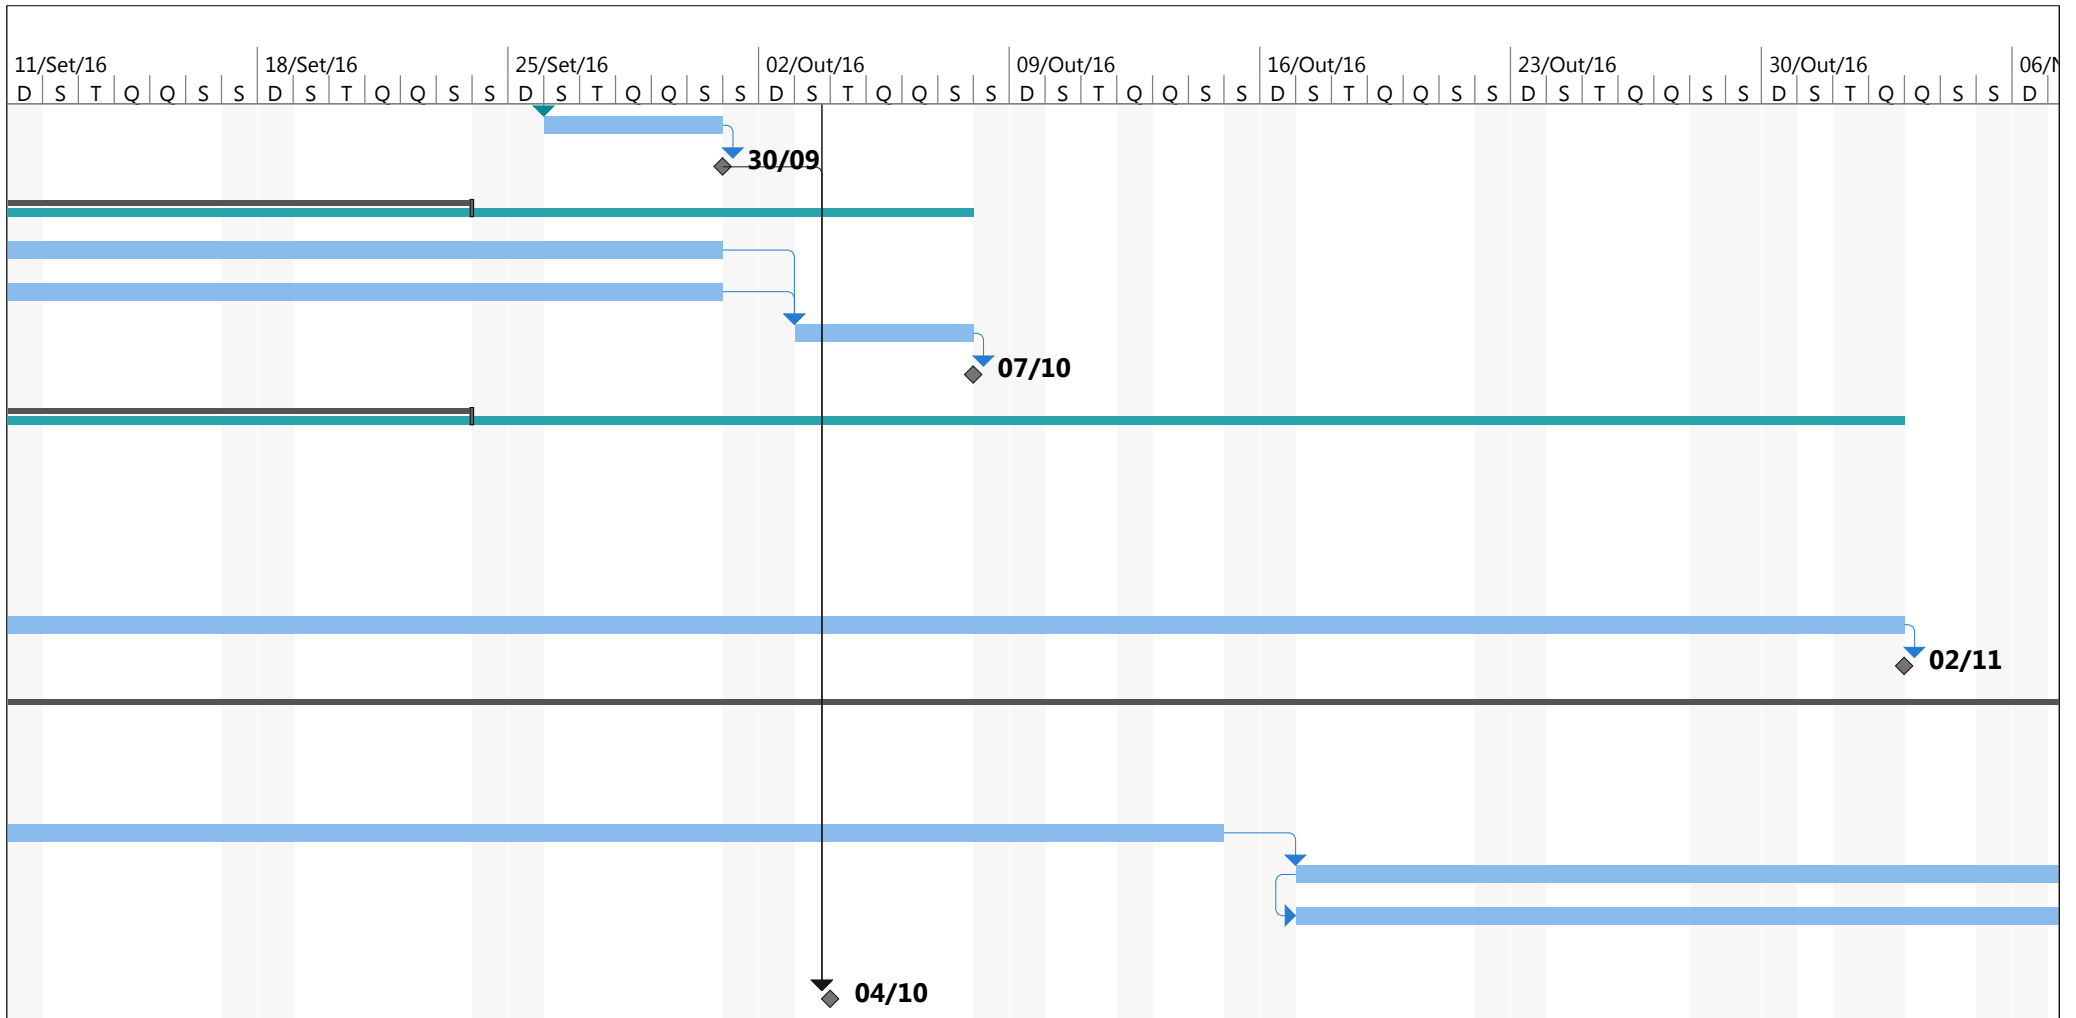


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

11/Set/16 18/Set/16 25/Set/16 02/Out/16 09/Out/16 16/Out/16 23/Out/16 30/Out/16 06/Nov/16

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

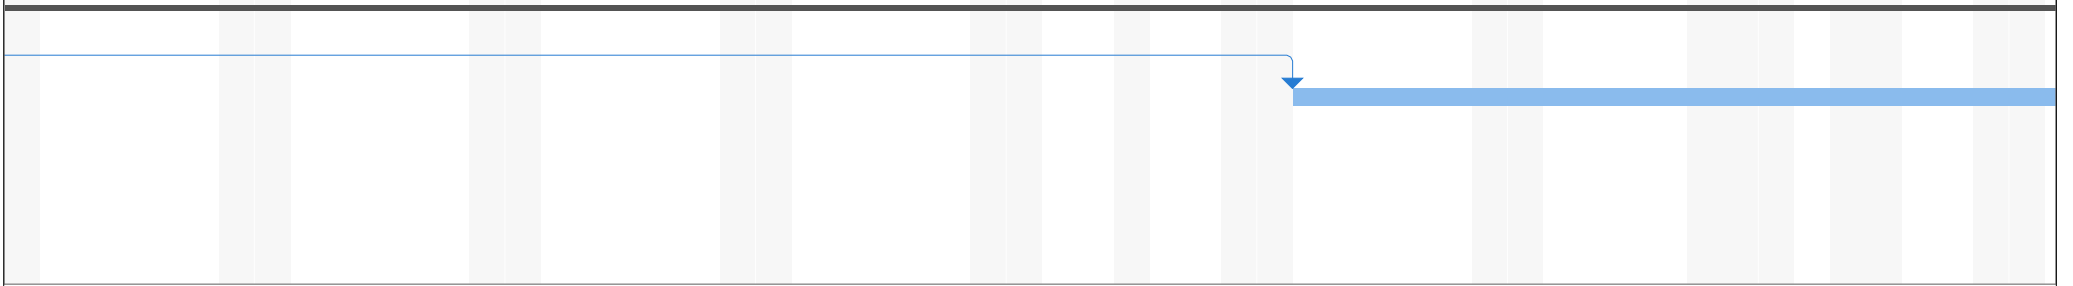


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Nov/16 13/Nov/16 20/Nov/16 27/Nov/16 04/Dez/16 11/Dez/16 18/Dez/16 25/Dez/16 01/Jan/17

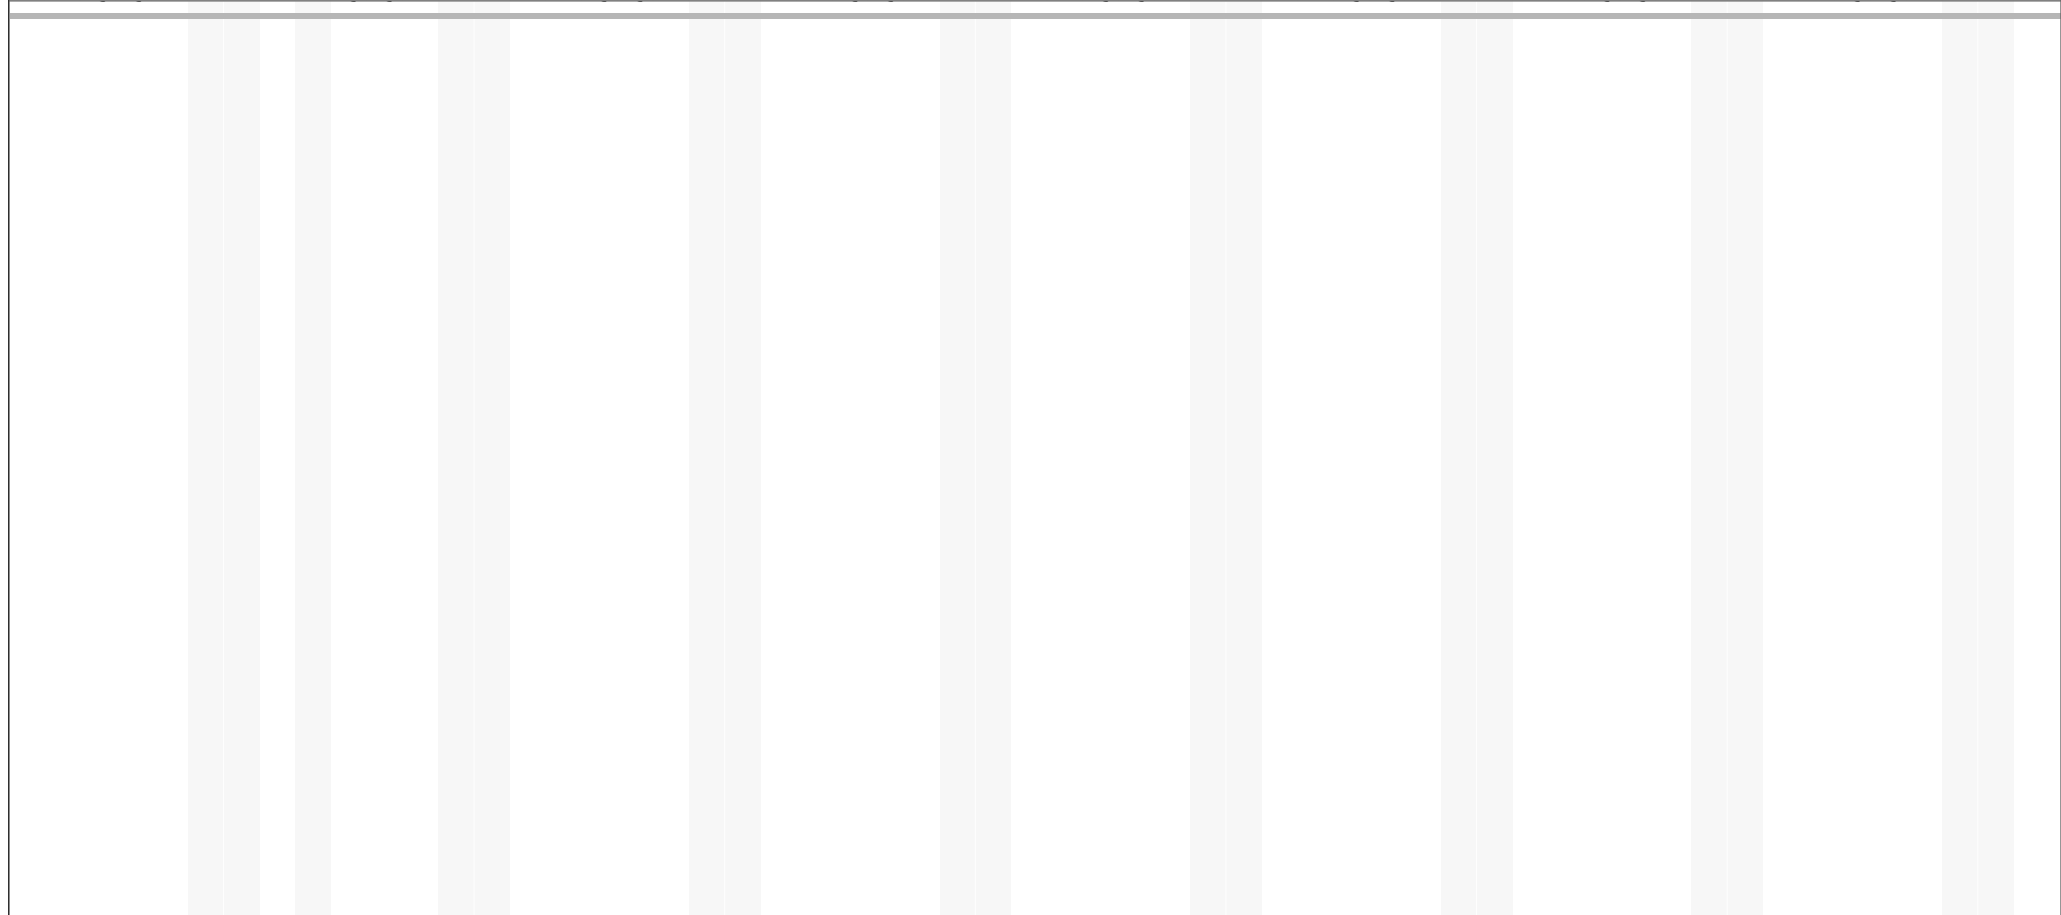


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

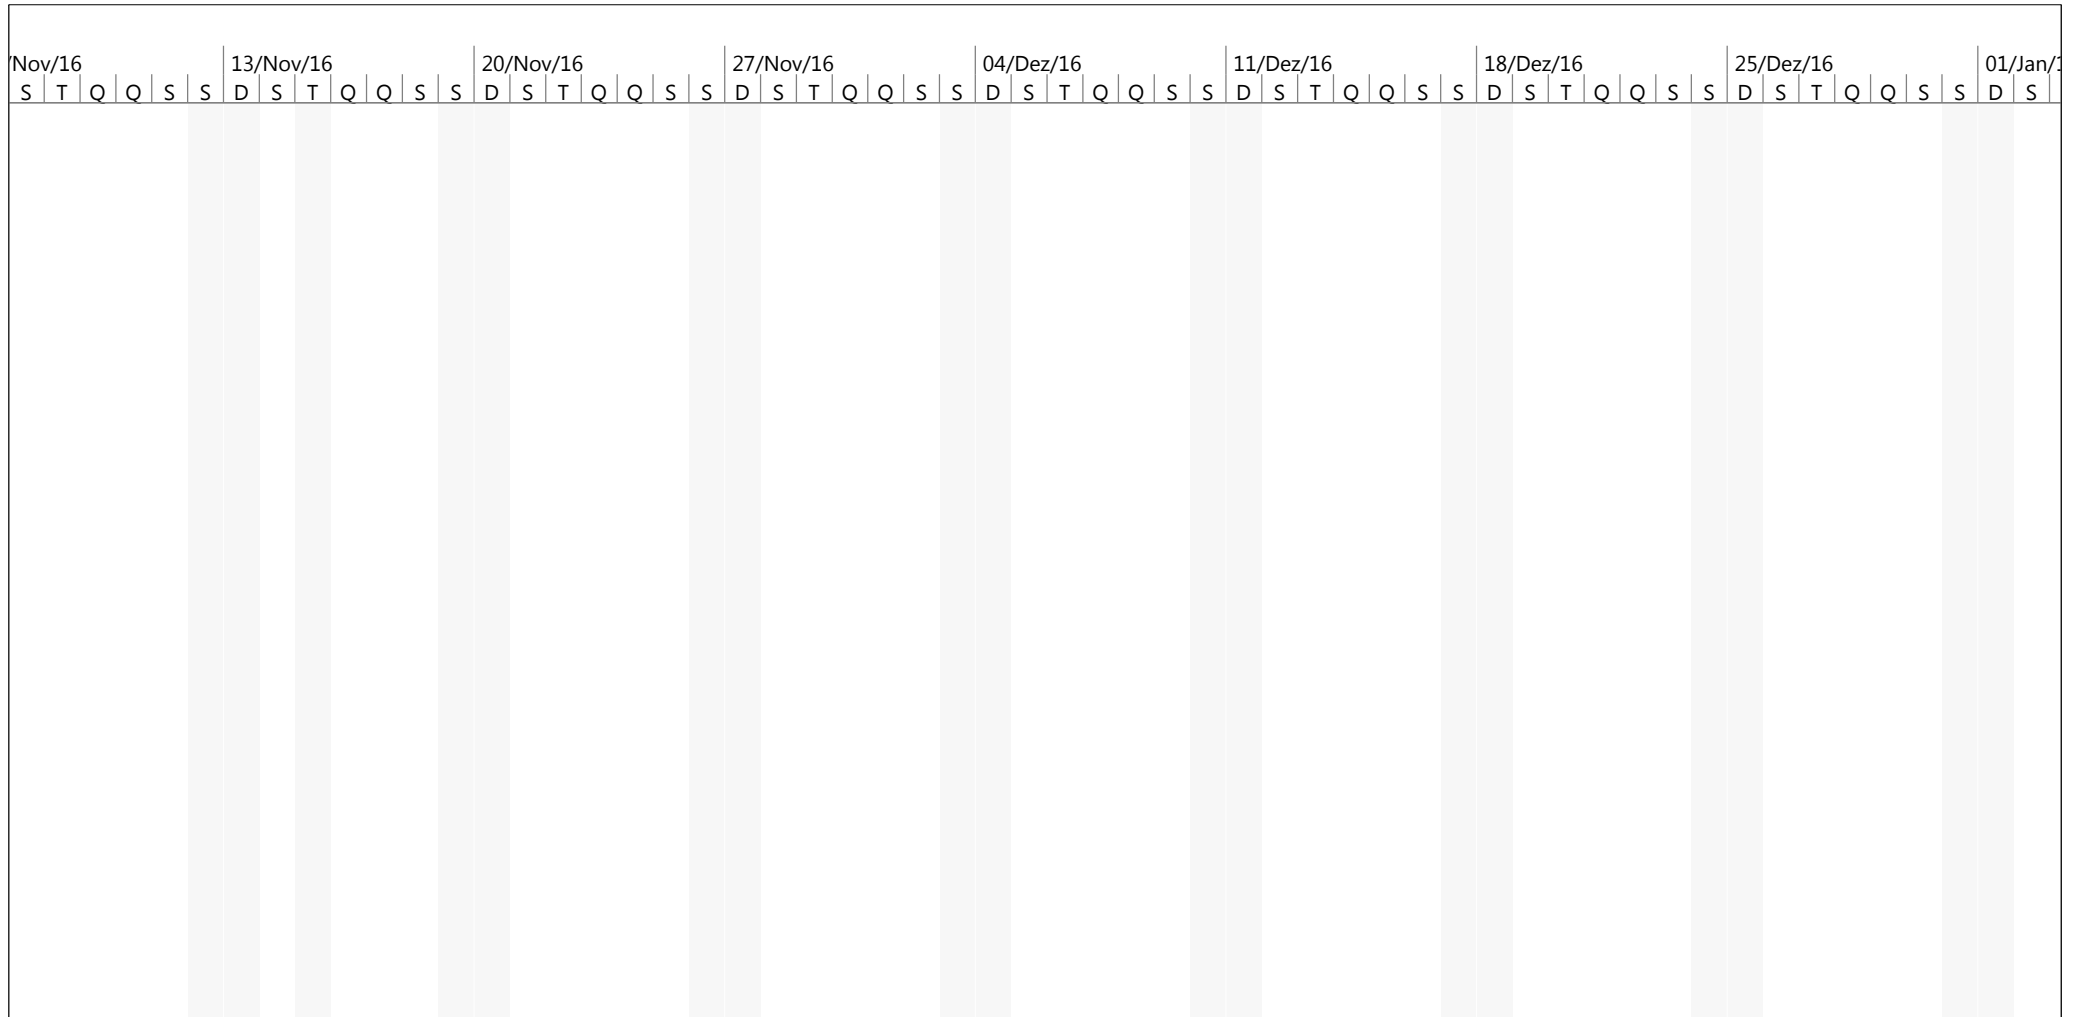


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

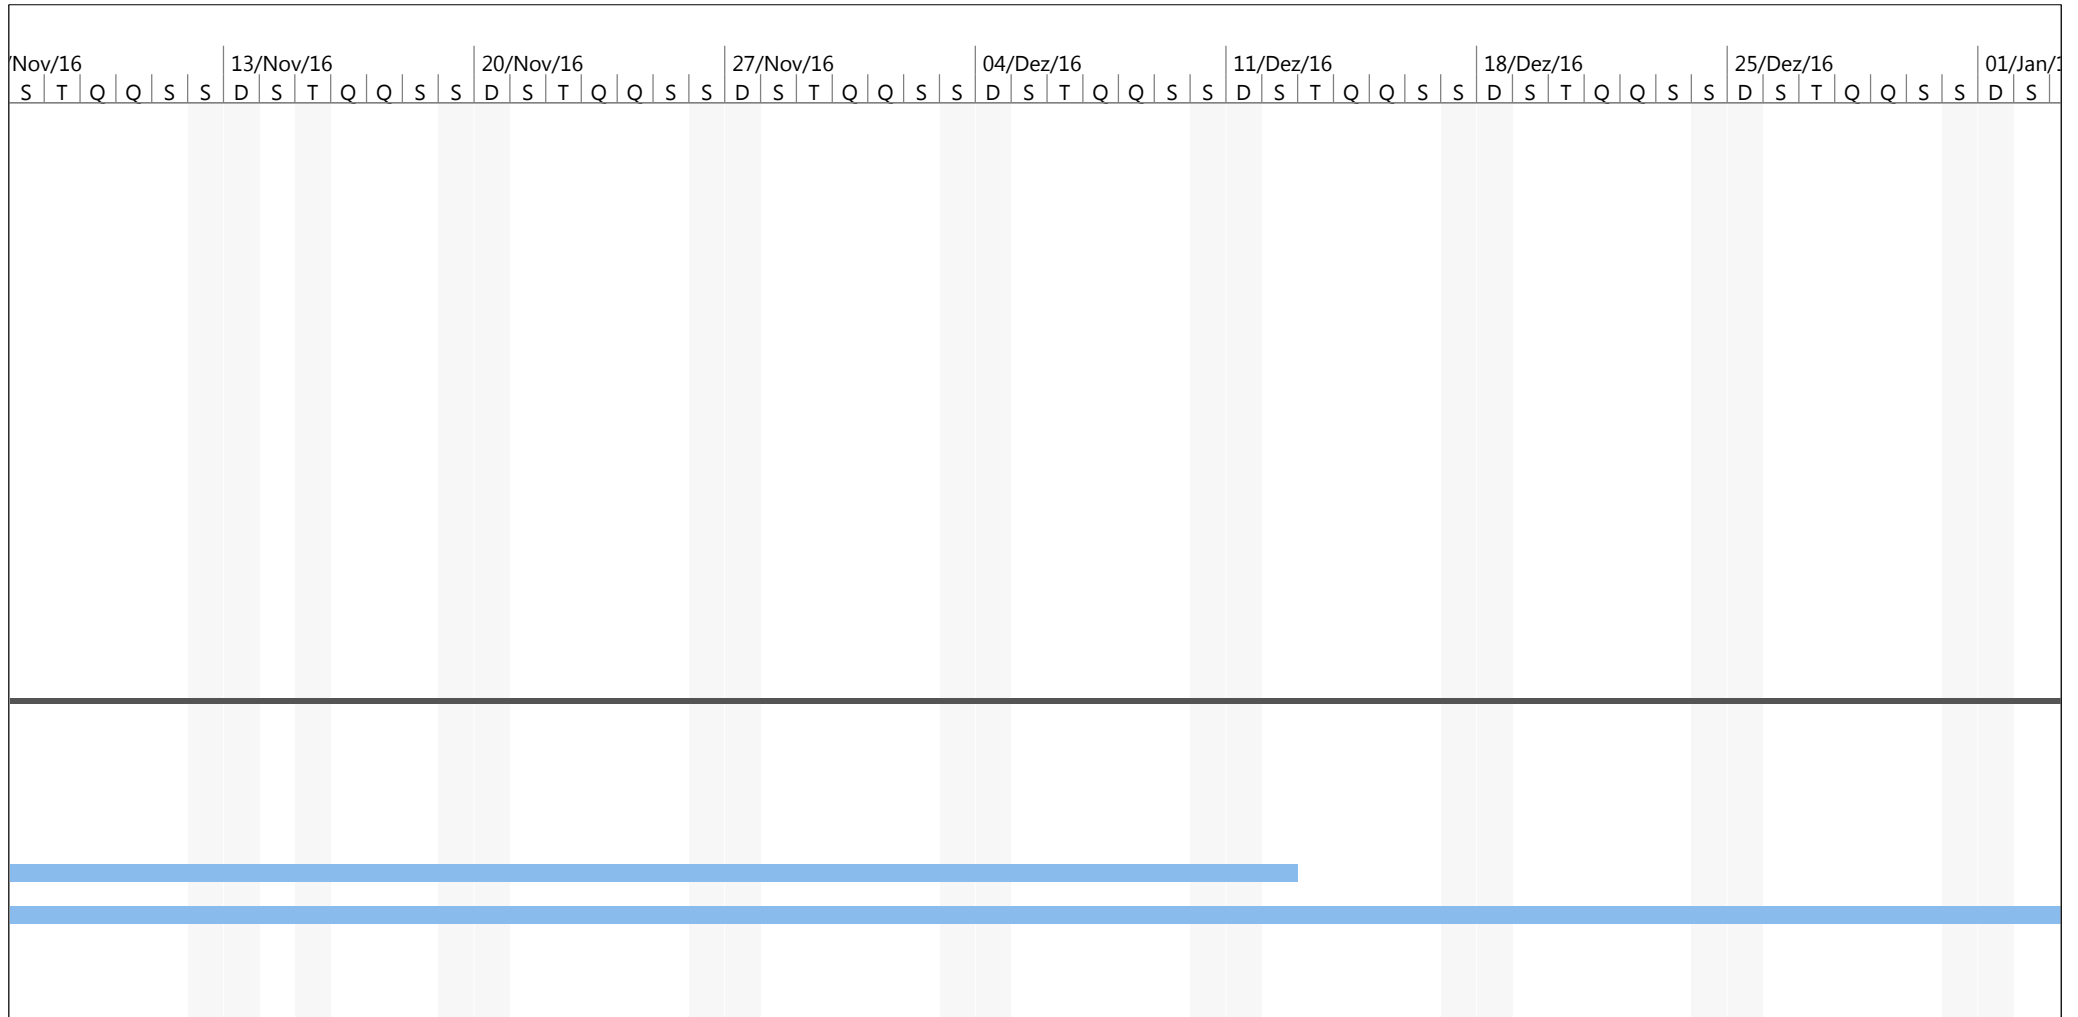

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

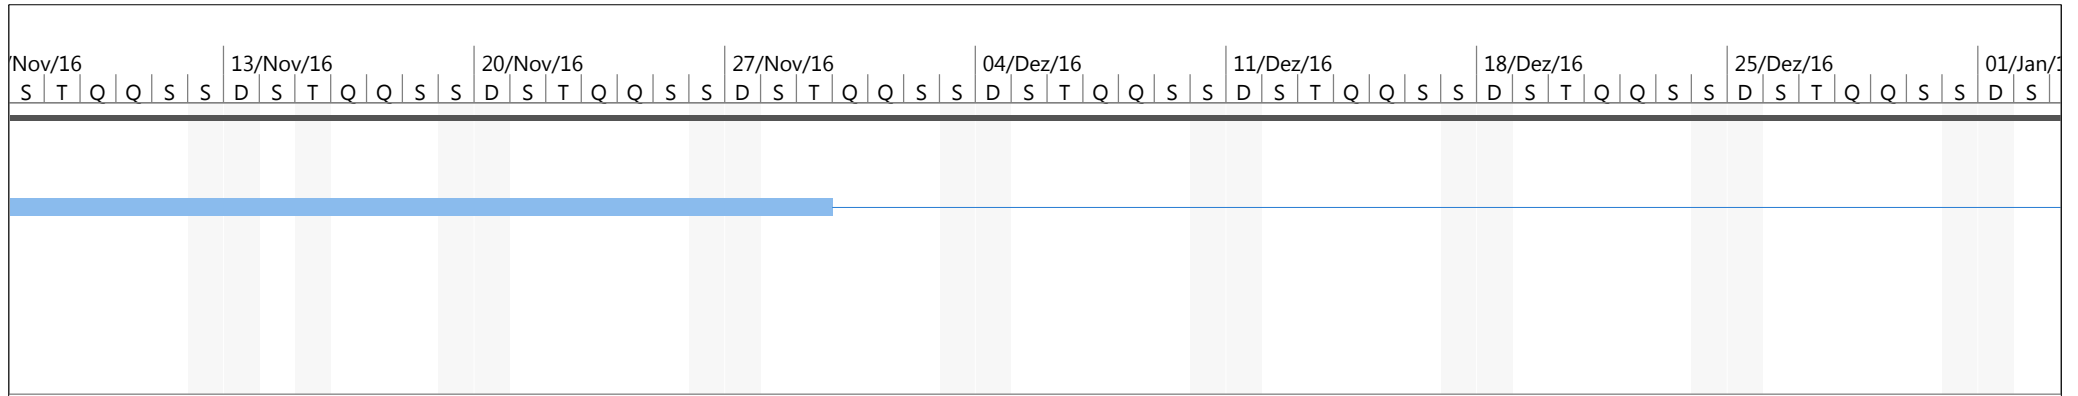

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

/17 | 08/Jan/17 | 15/Jan/17 | 22/Jan/17 | 29/Jan/17 | 05/Fev/17 | 12/Fev/17 | 19/Fev/17 | 26/Fev/17  
 T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

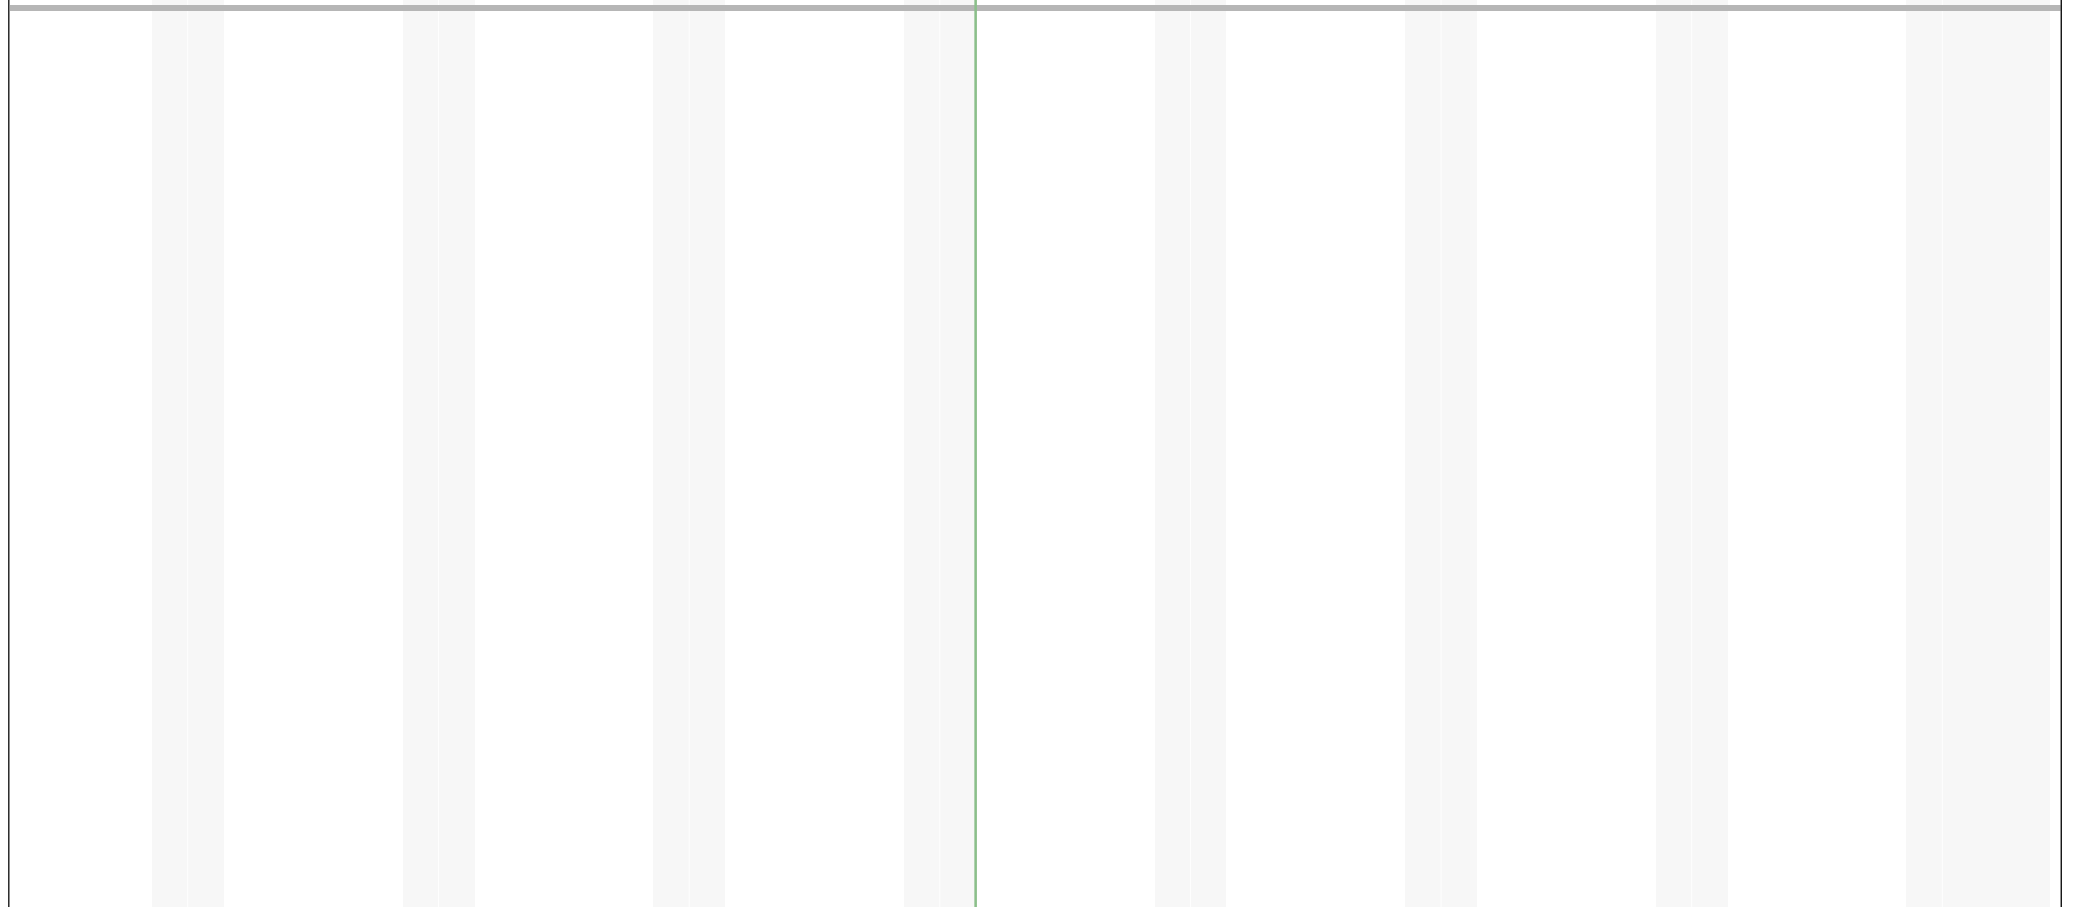


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

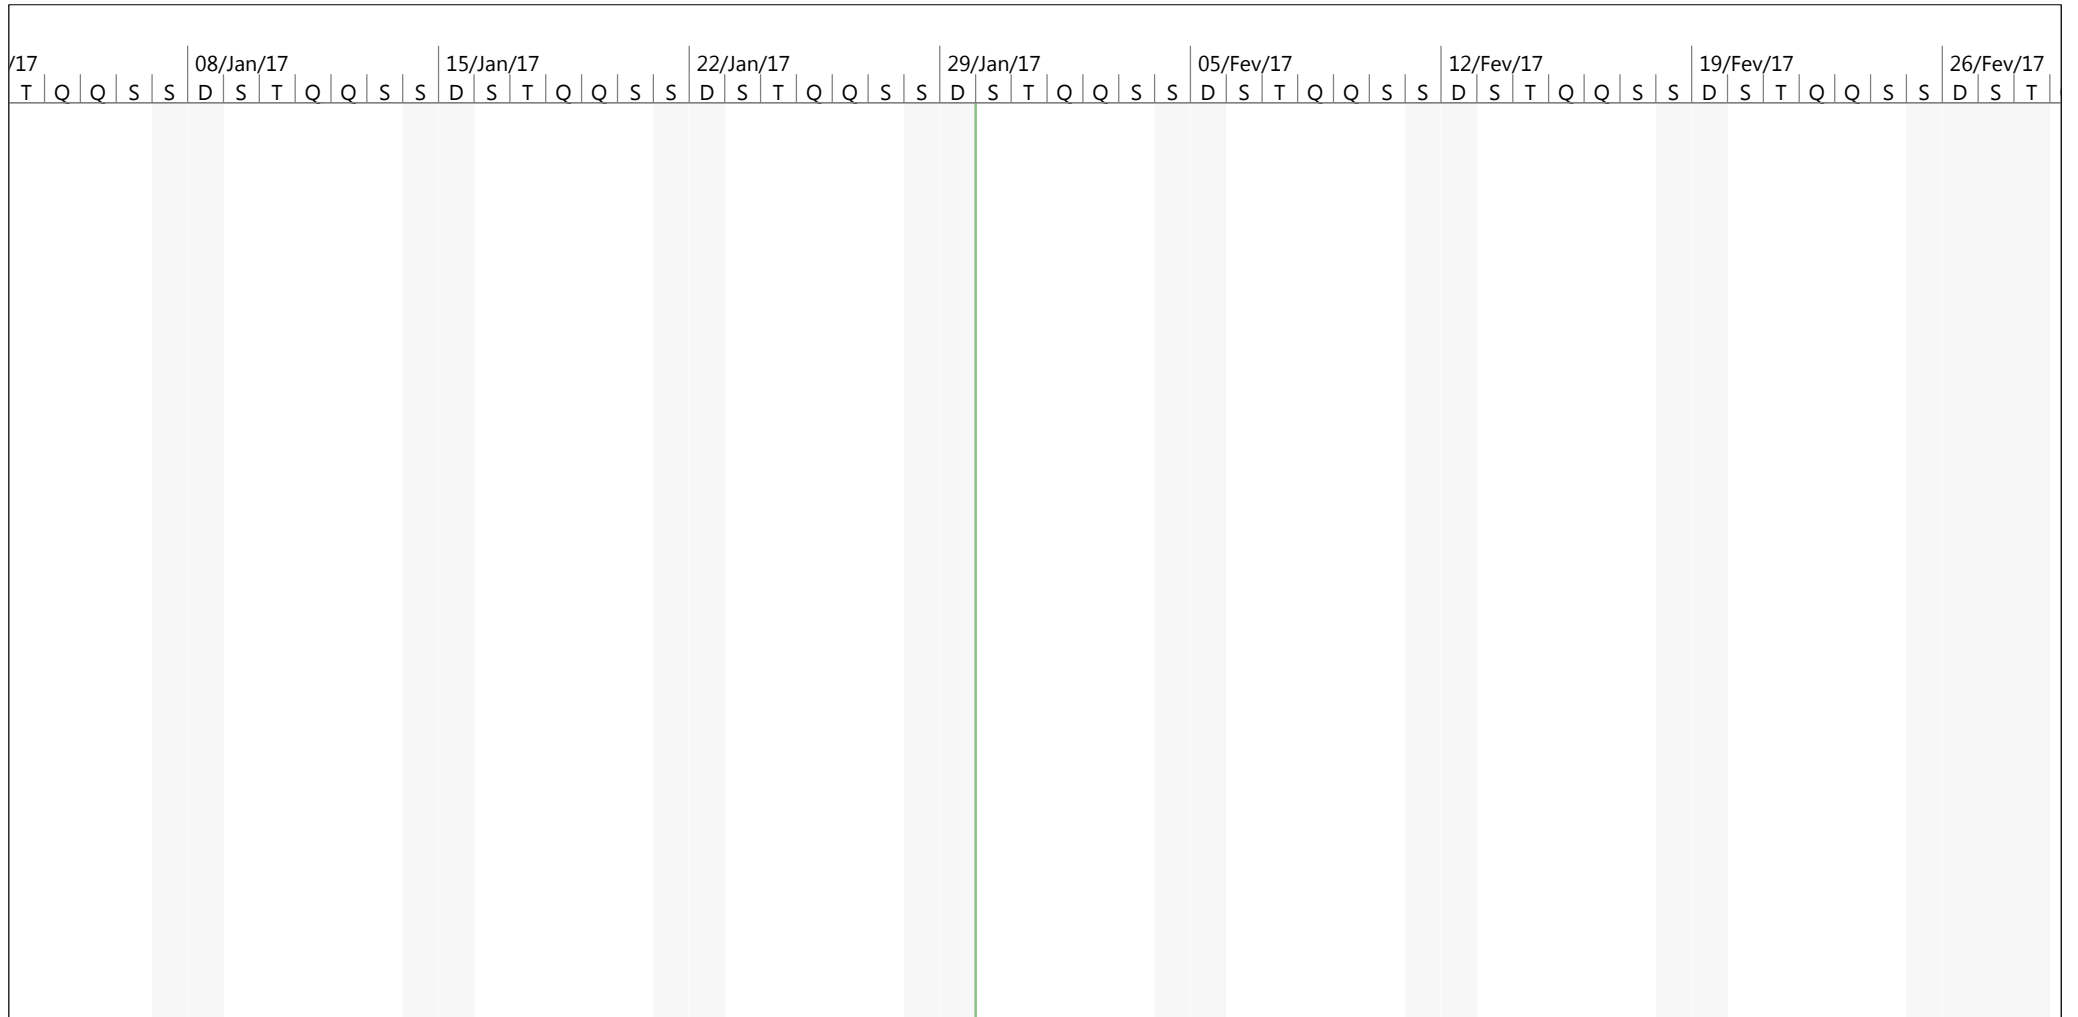

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

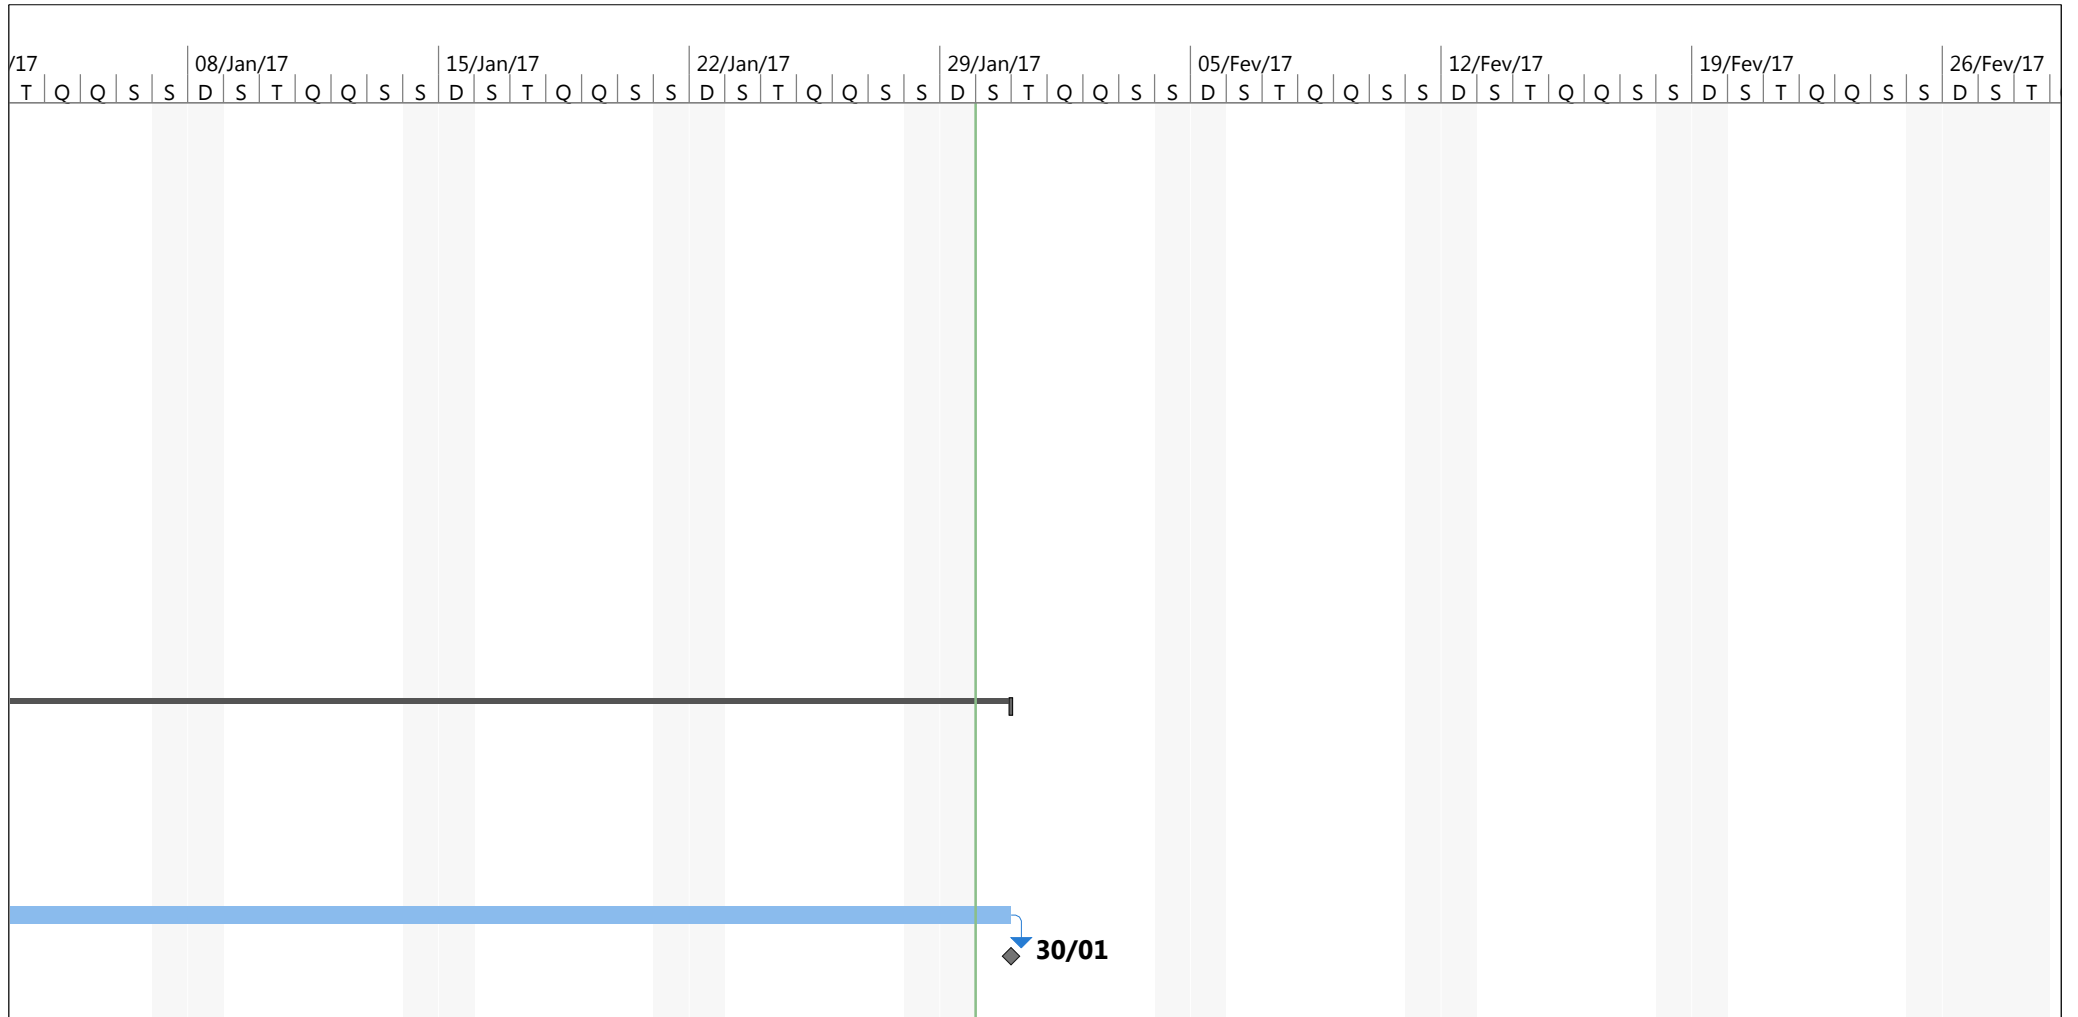


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



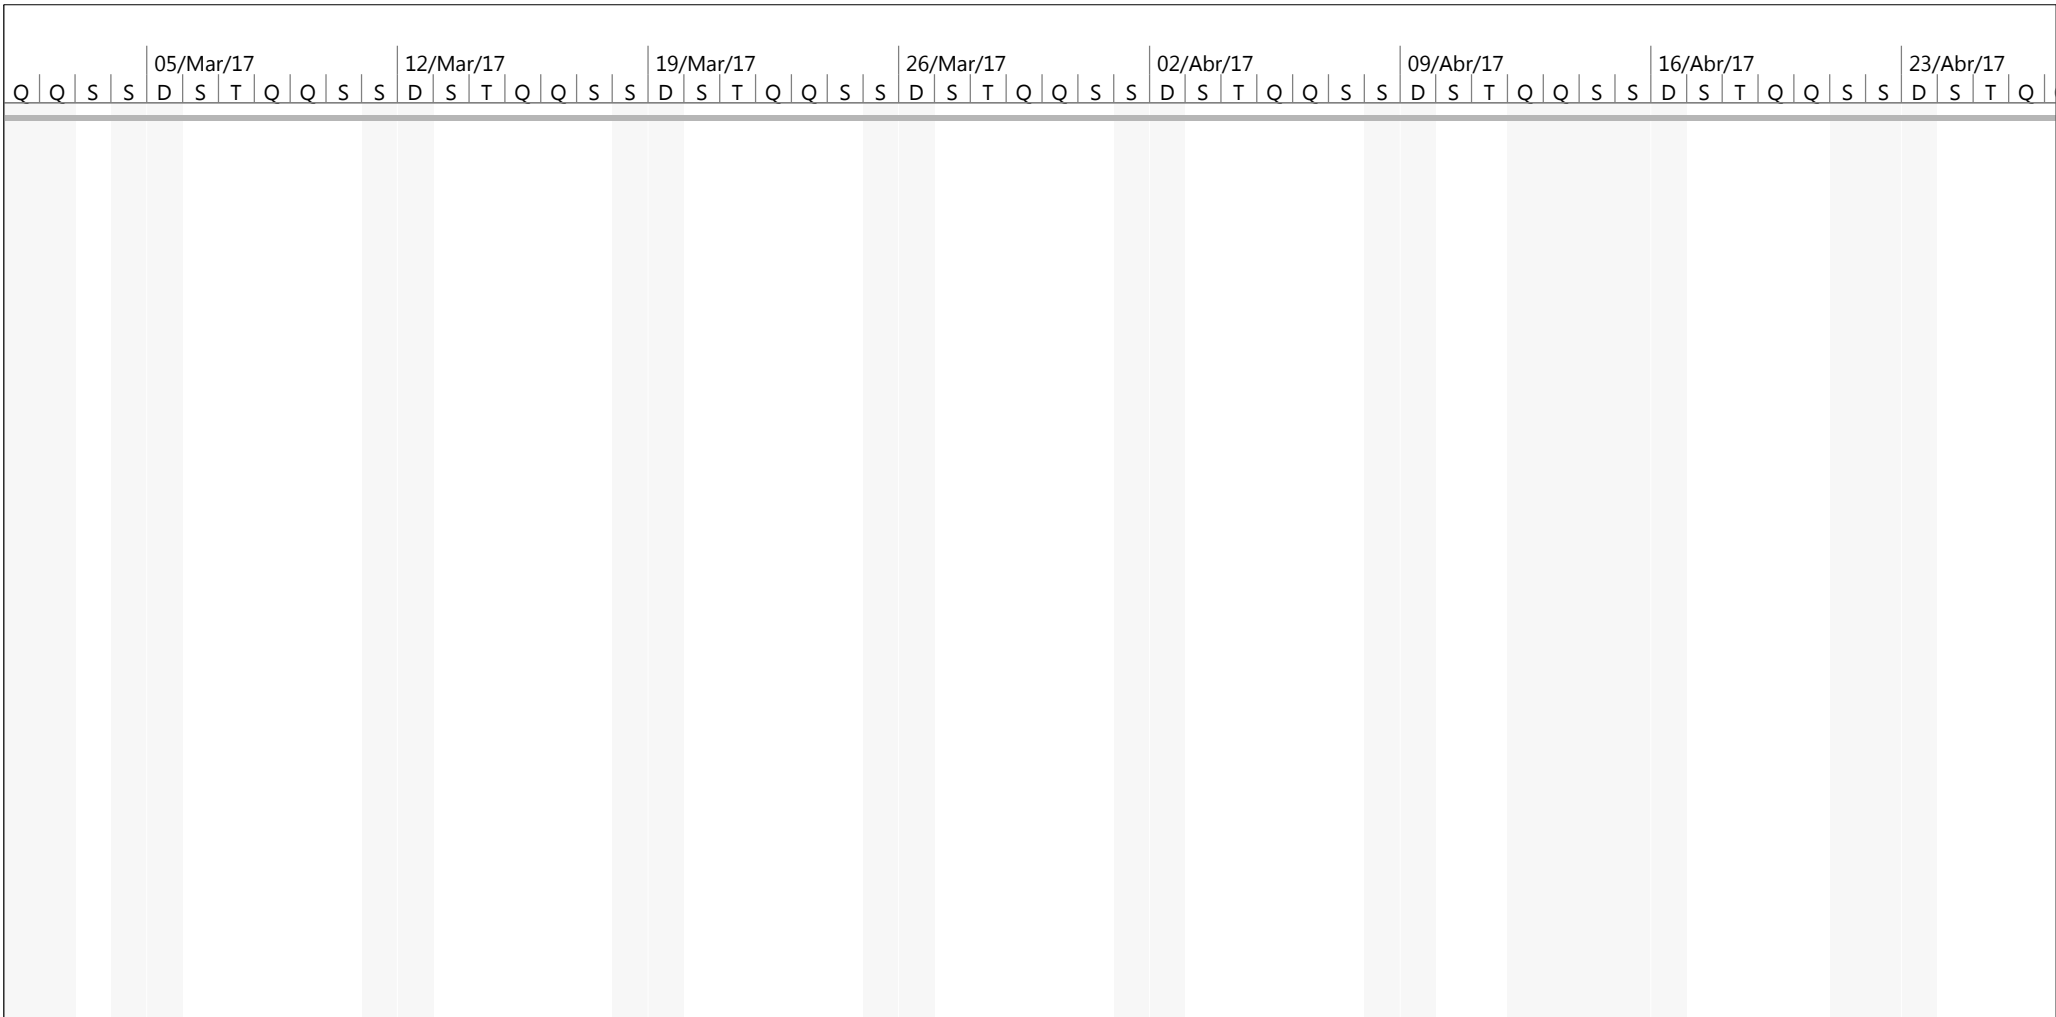


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

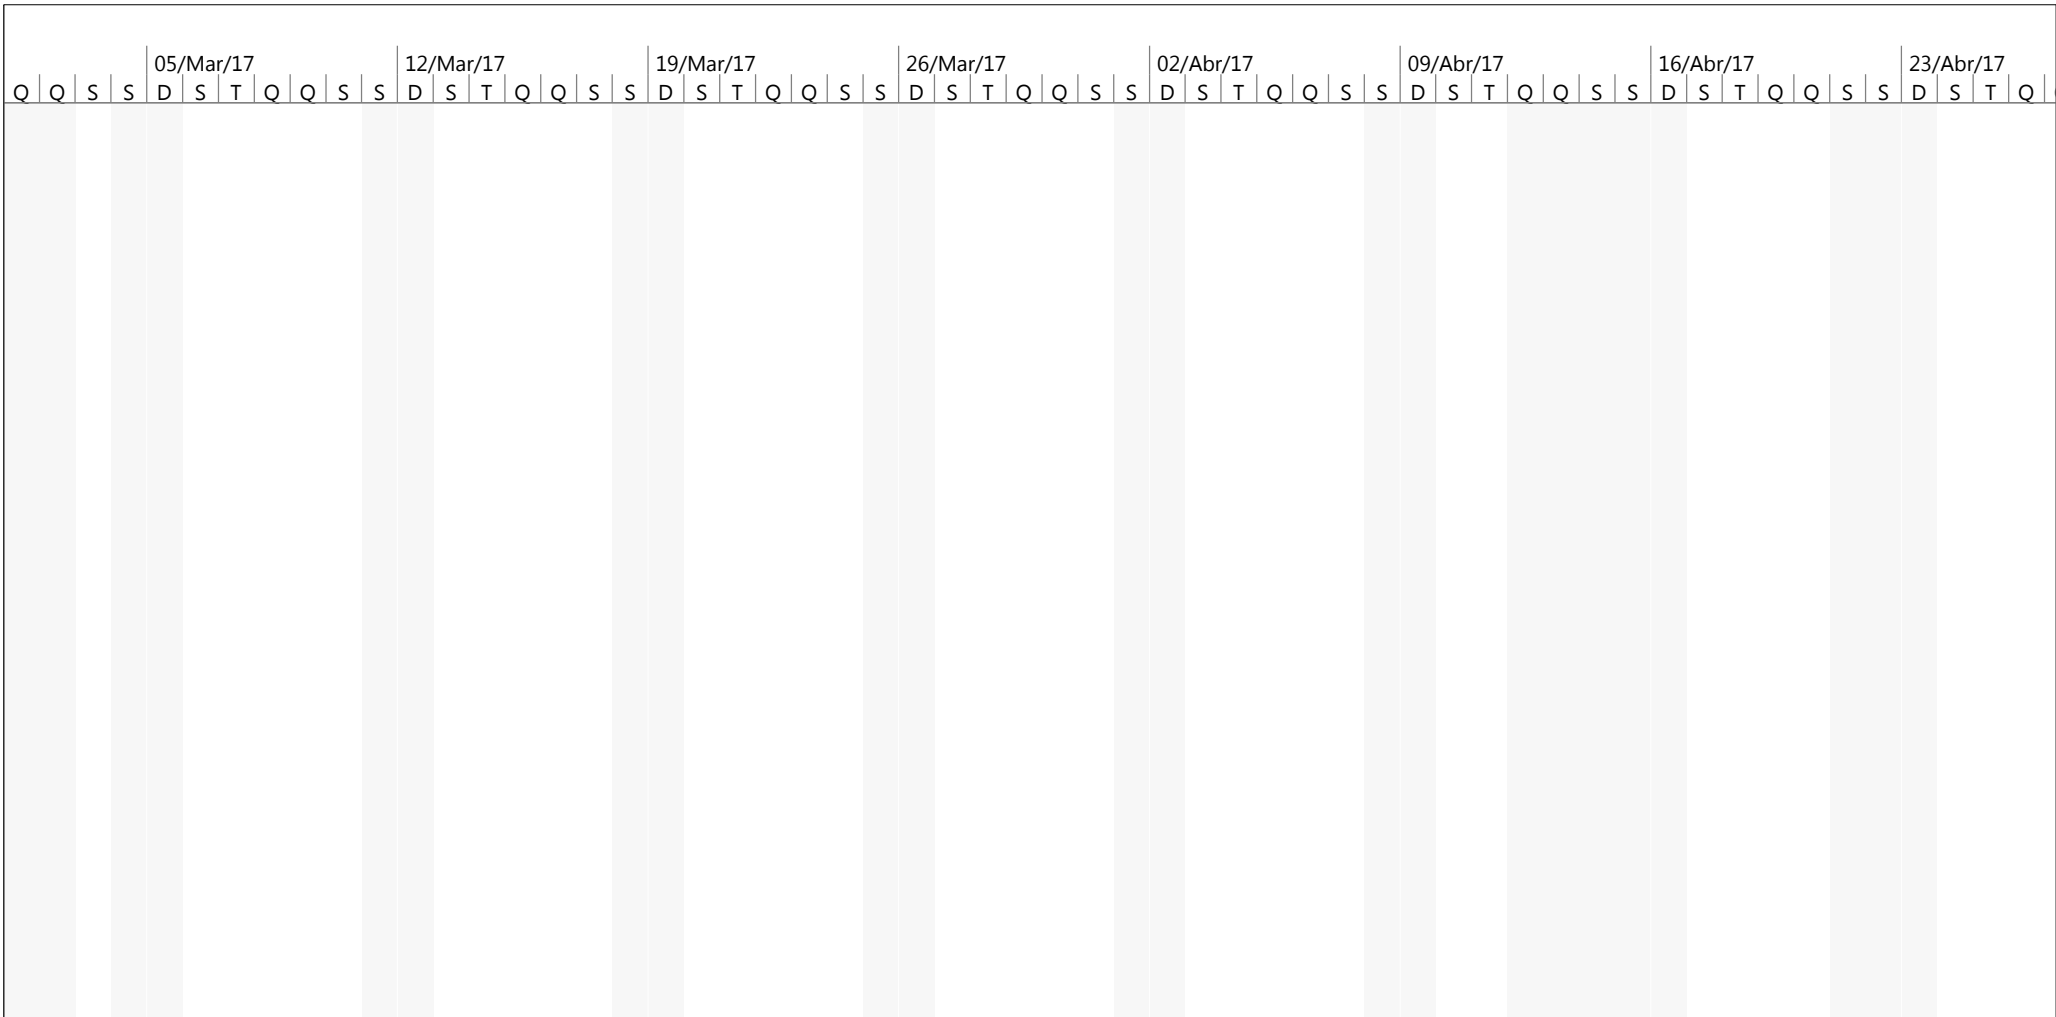

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

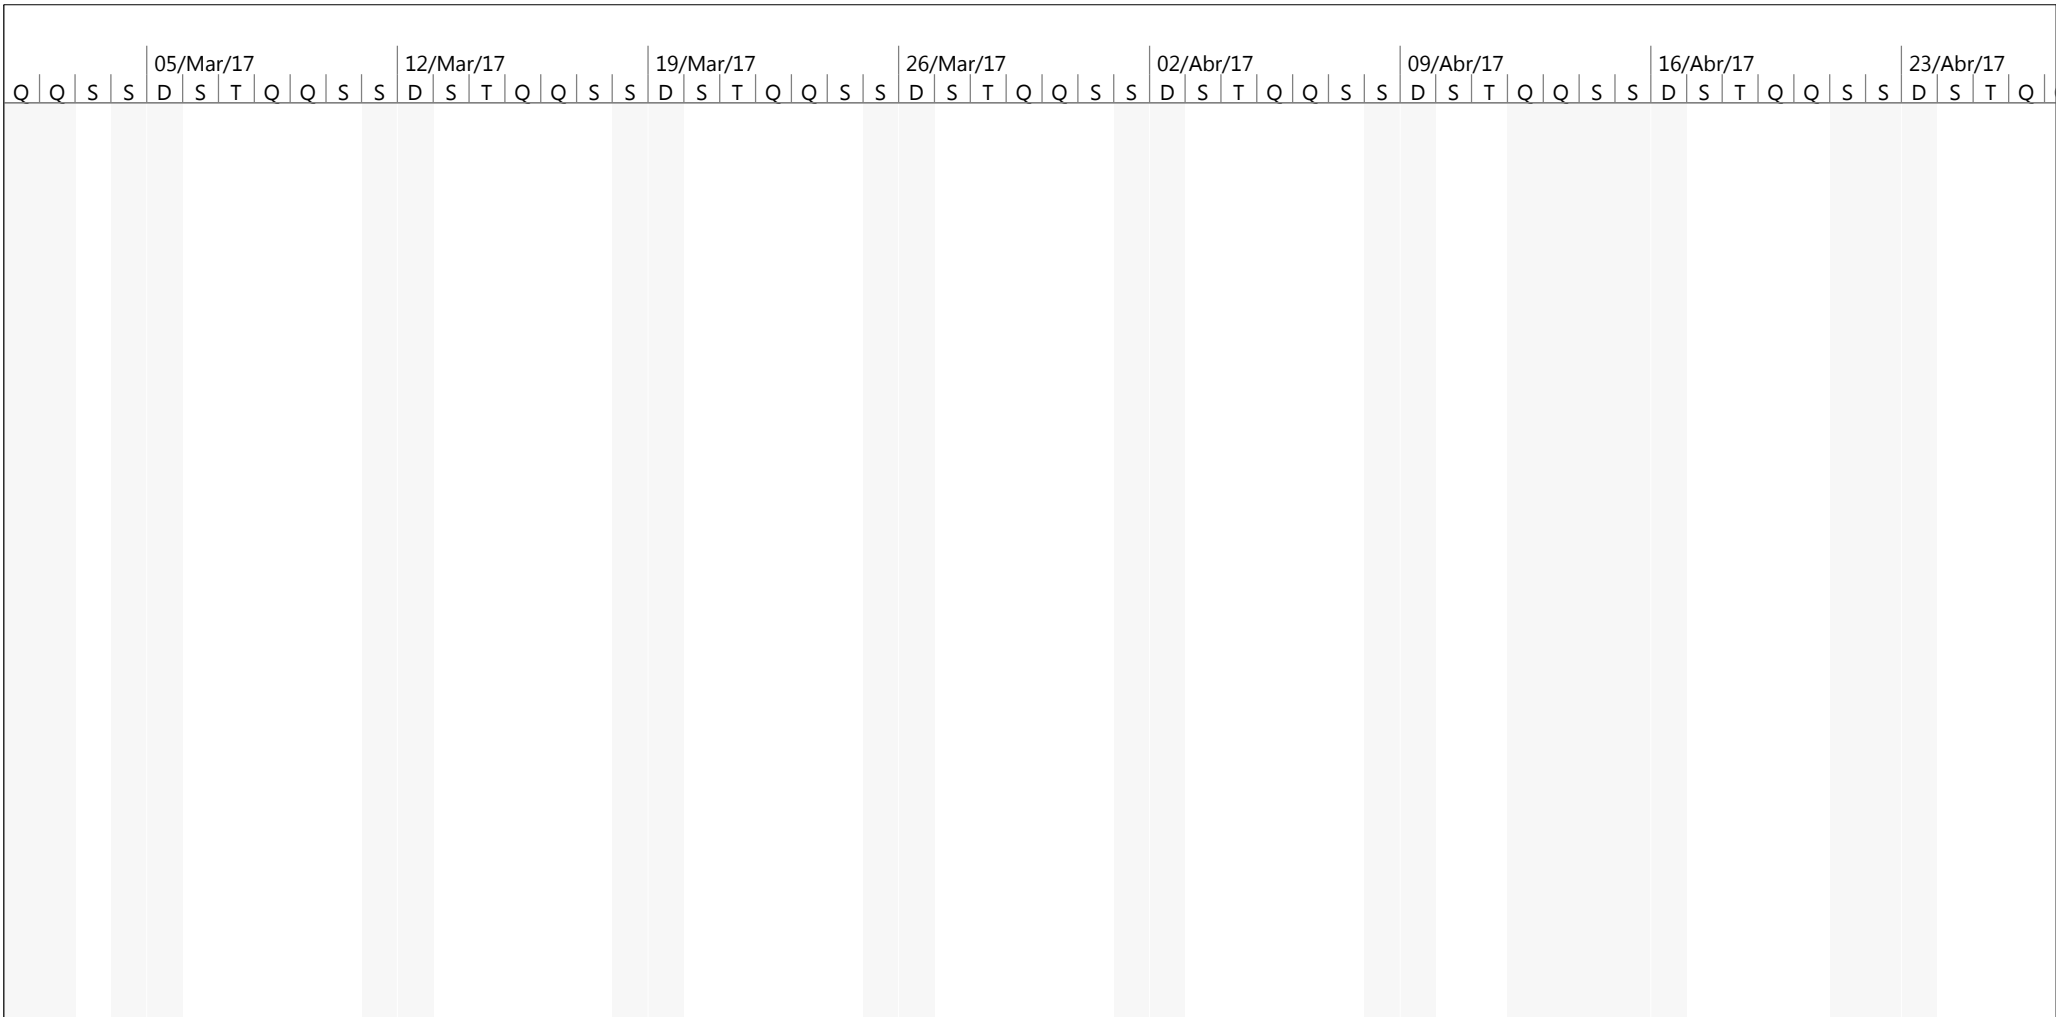



















Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Q Q S S 05/Mar/17 D S T Q Q S S 12/Mar/17 D S T Q Q S S 19/Mar/17 D S T Q Q S S 26/Mar/17 D S T Q Q S S 02/Abr/17 D S T Q Q S S 09/Abr/17 D S T Q Q S S 16/Abr/17 D S T Q Q S S 23/Abr/17 D S T Q




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

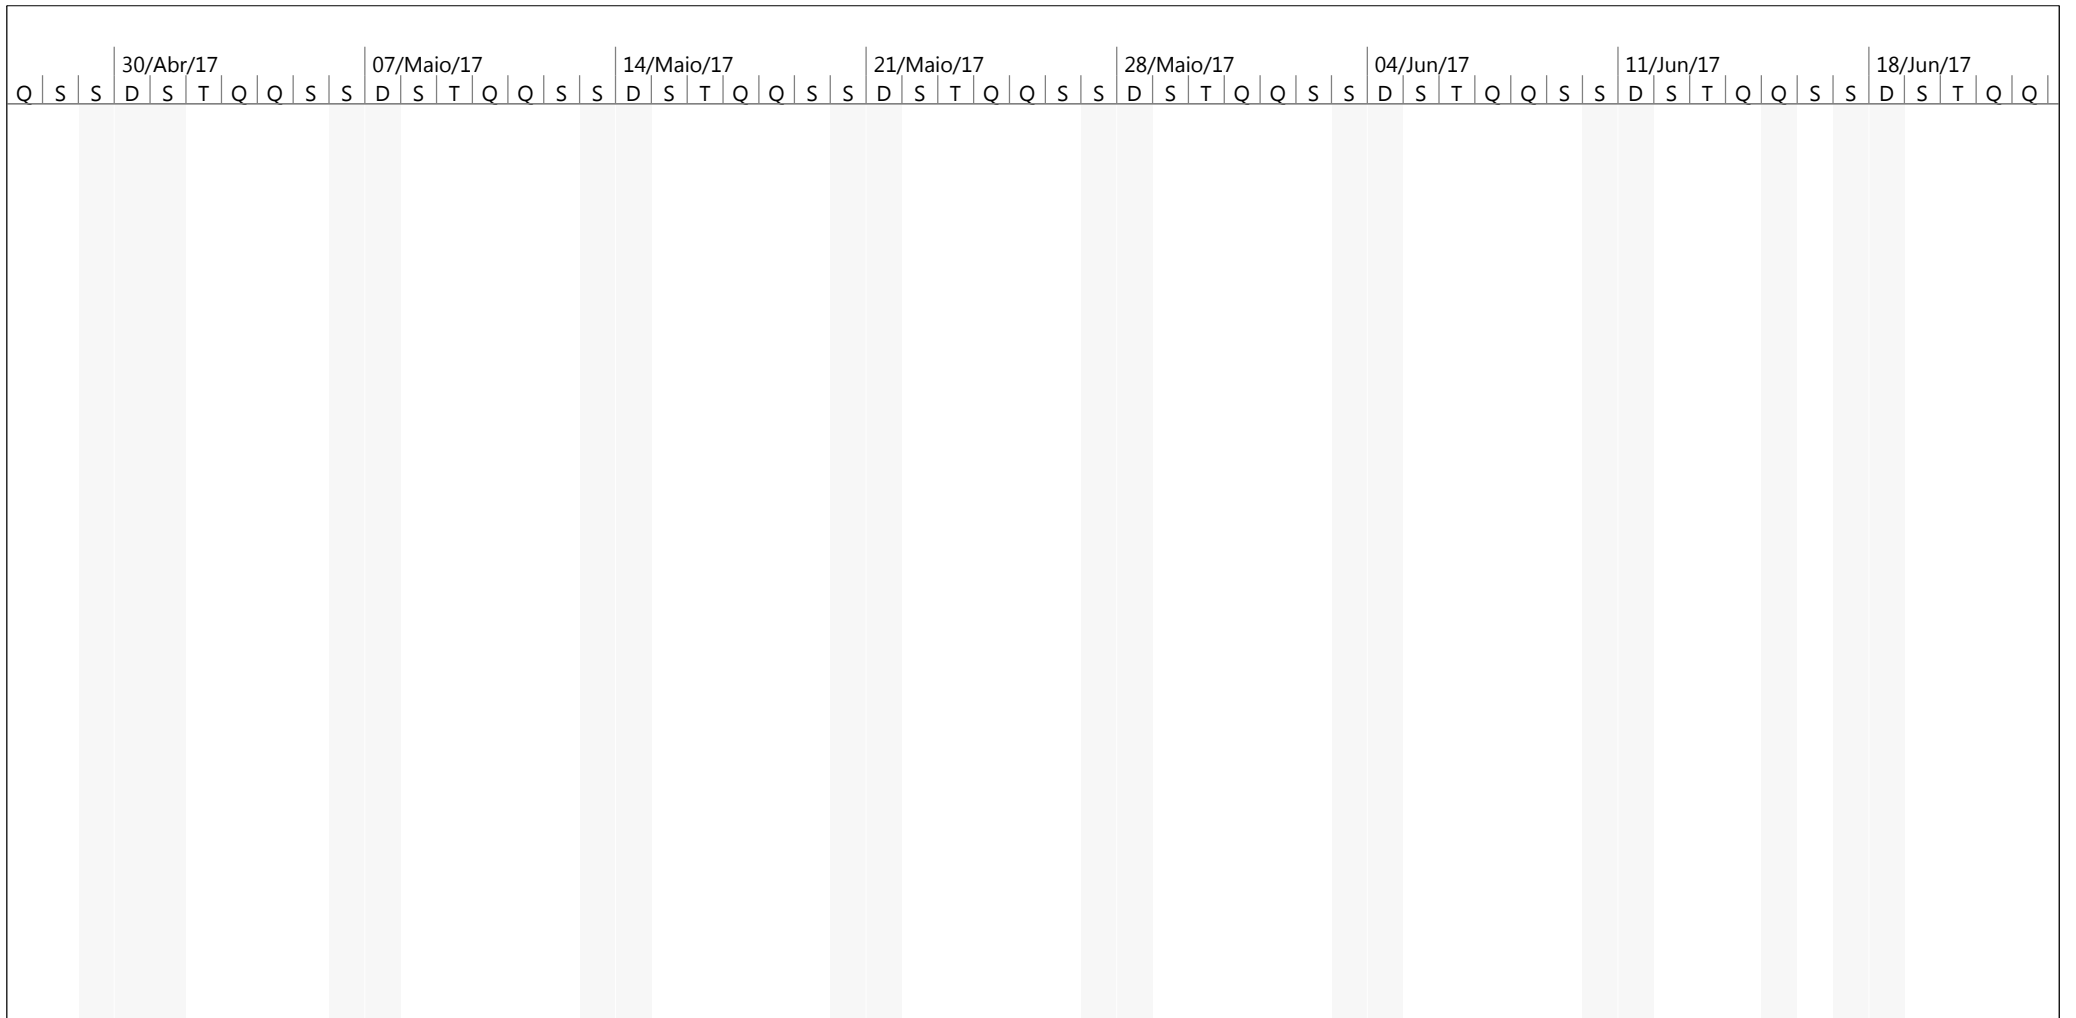

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


Q S S 30/Abr/17 D S T Q Q S S 07/Maio/17 D S T Q Q S S 14/Maio/17 D S T Q Q S S 21/Maio/17 D S T Q Q S S 28/Maio/17 D S T Q Q S S 04/Jun/17 D S T Q Q S S 11/Jun/17 D S T Q Q S S 18/Jun/17 D S T Q Q

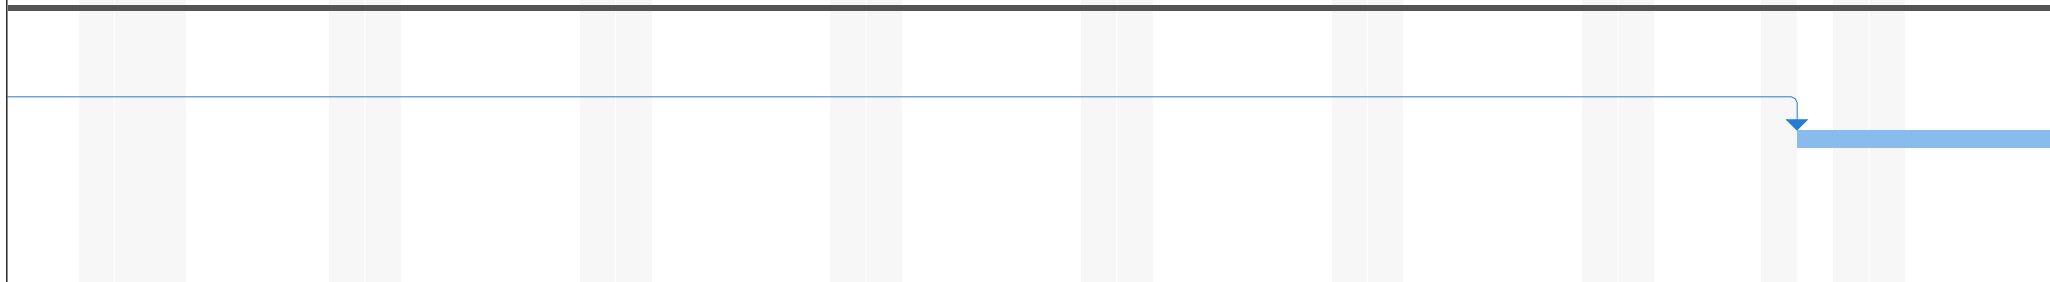

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			






Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

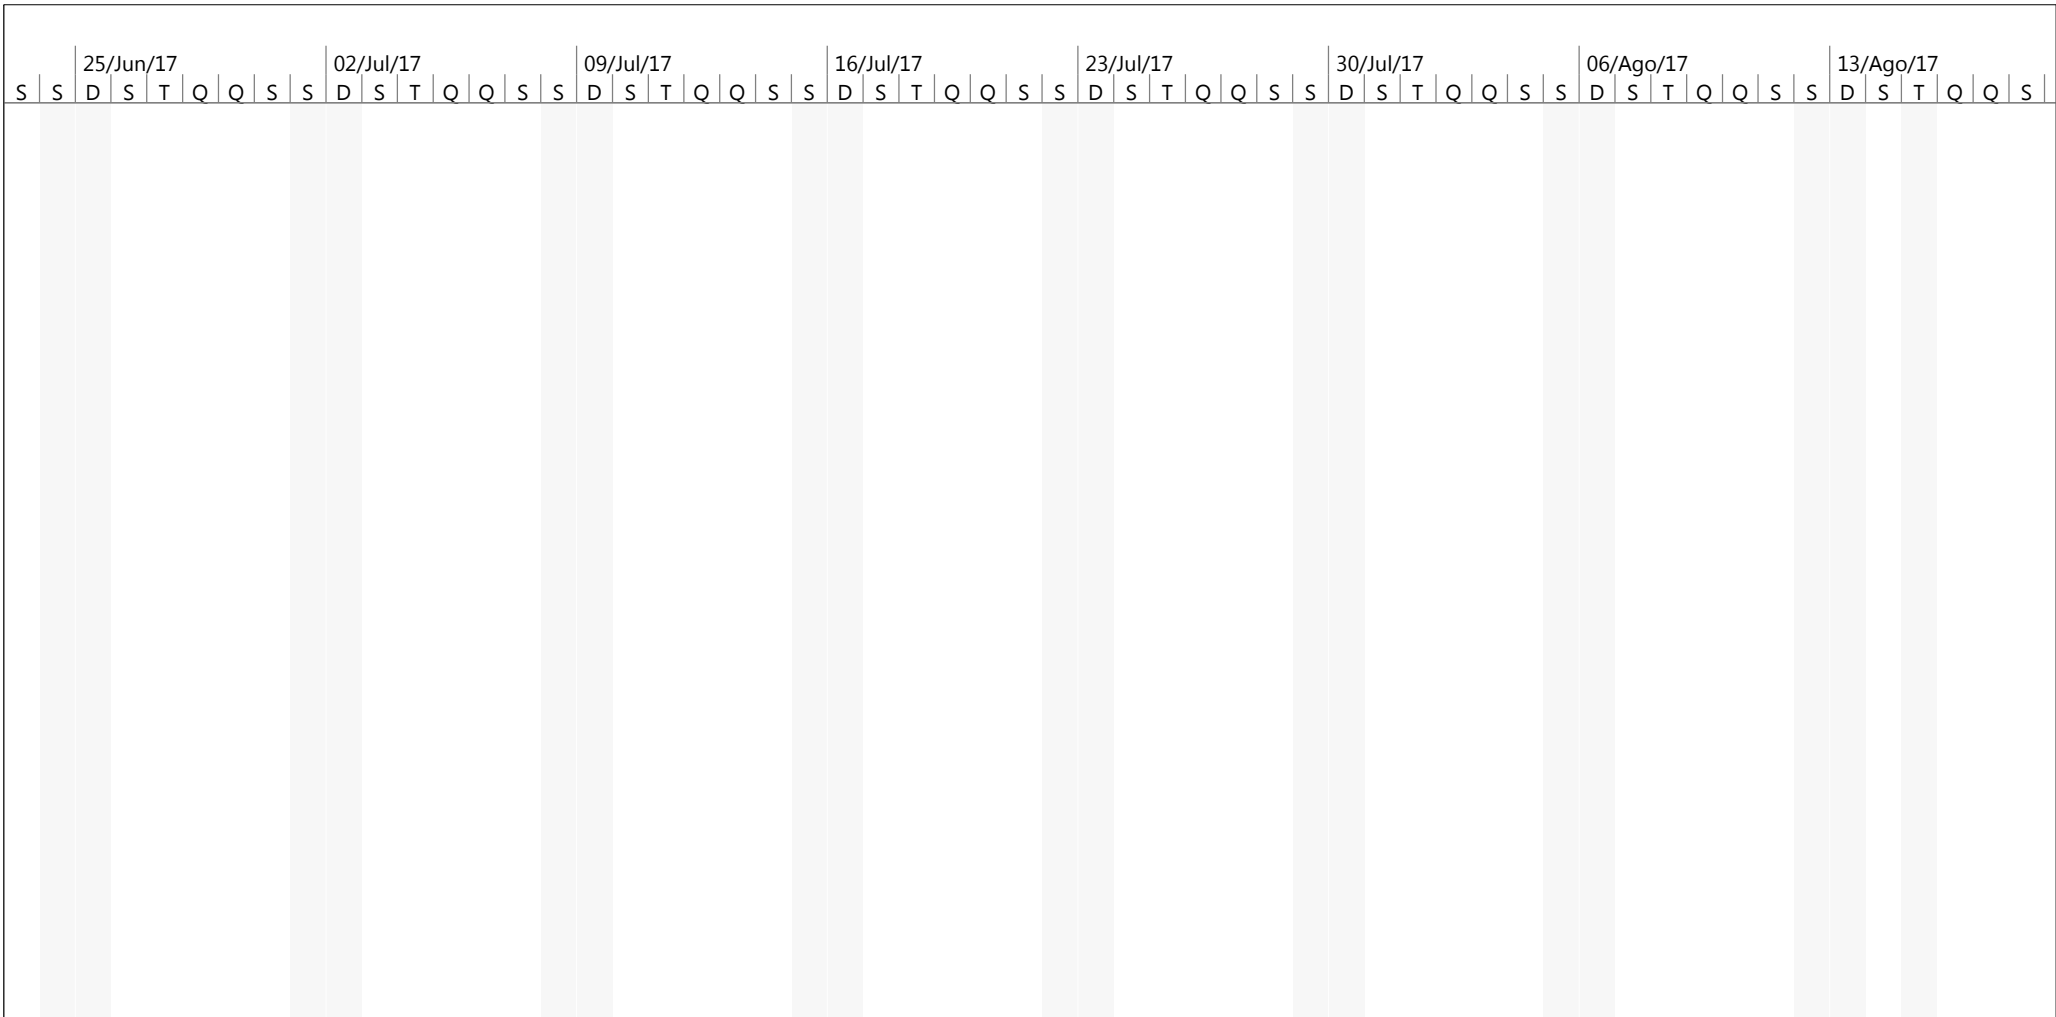


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

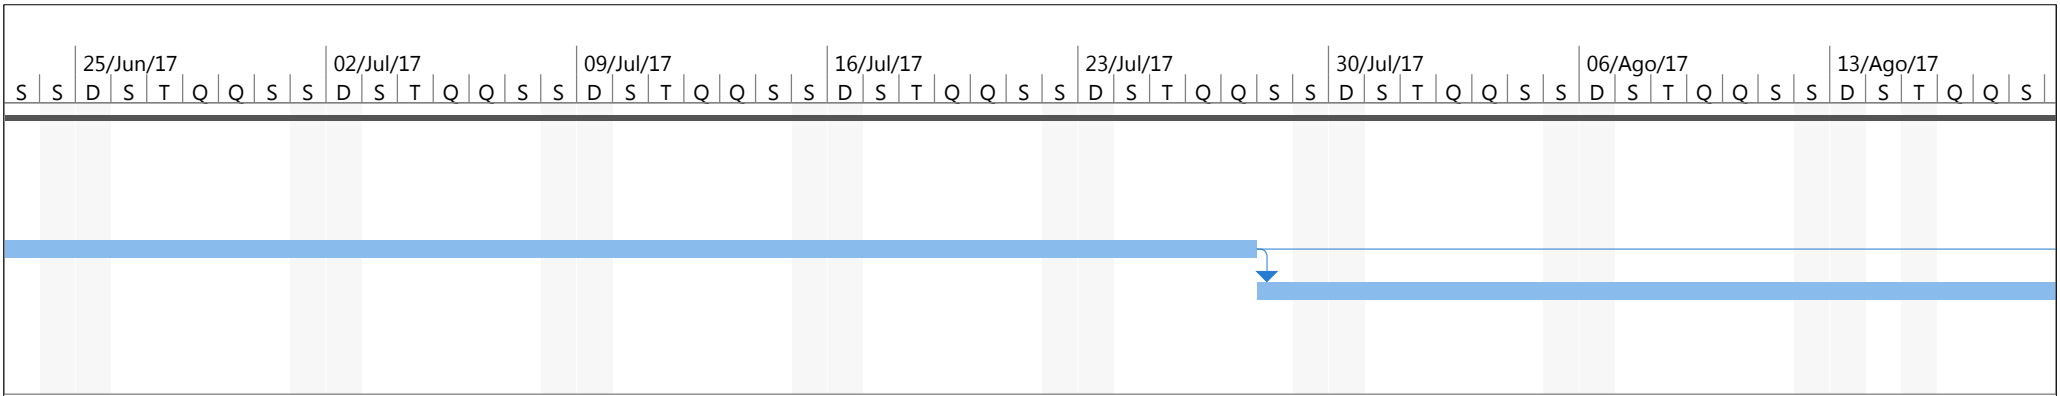


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

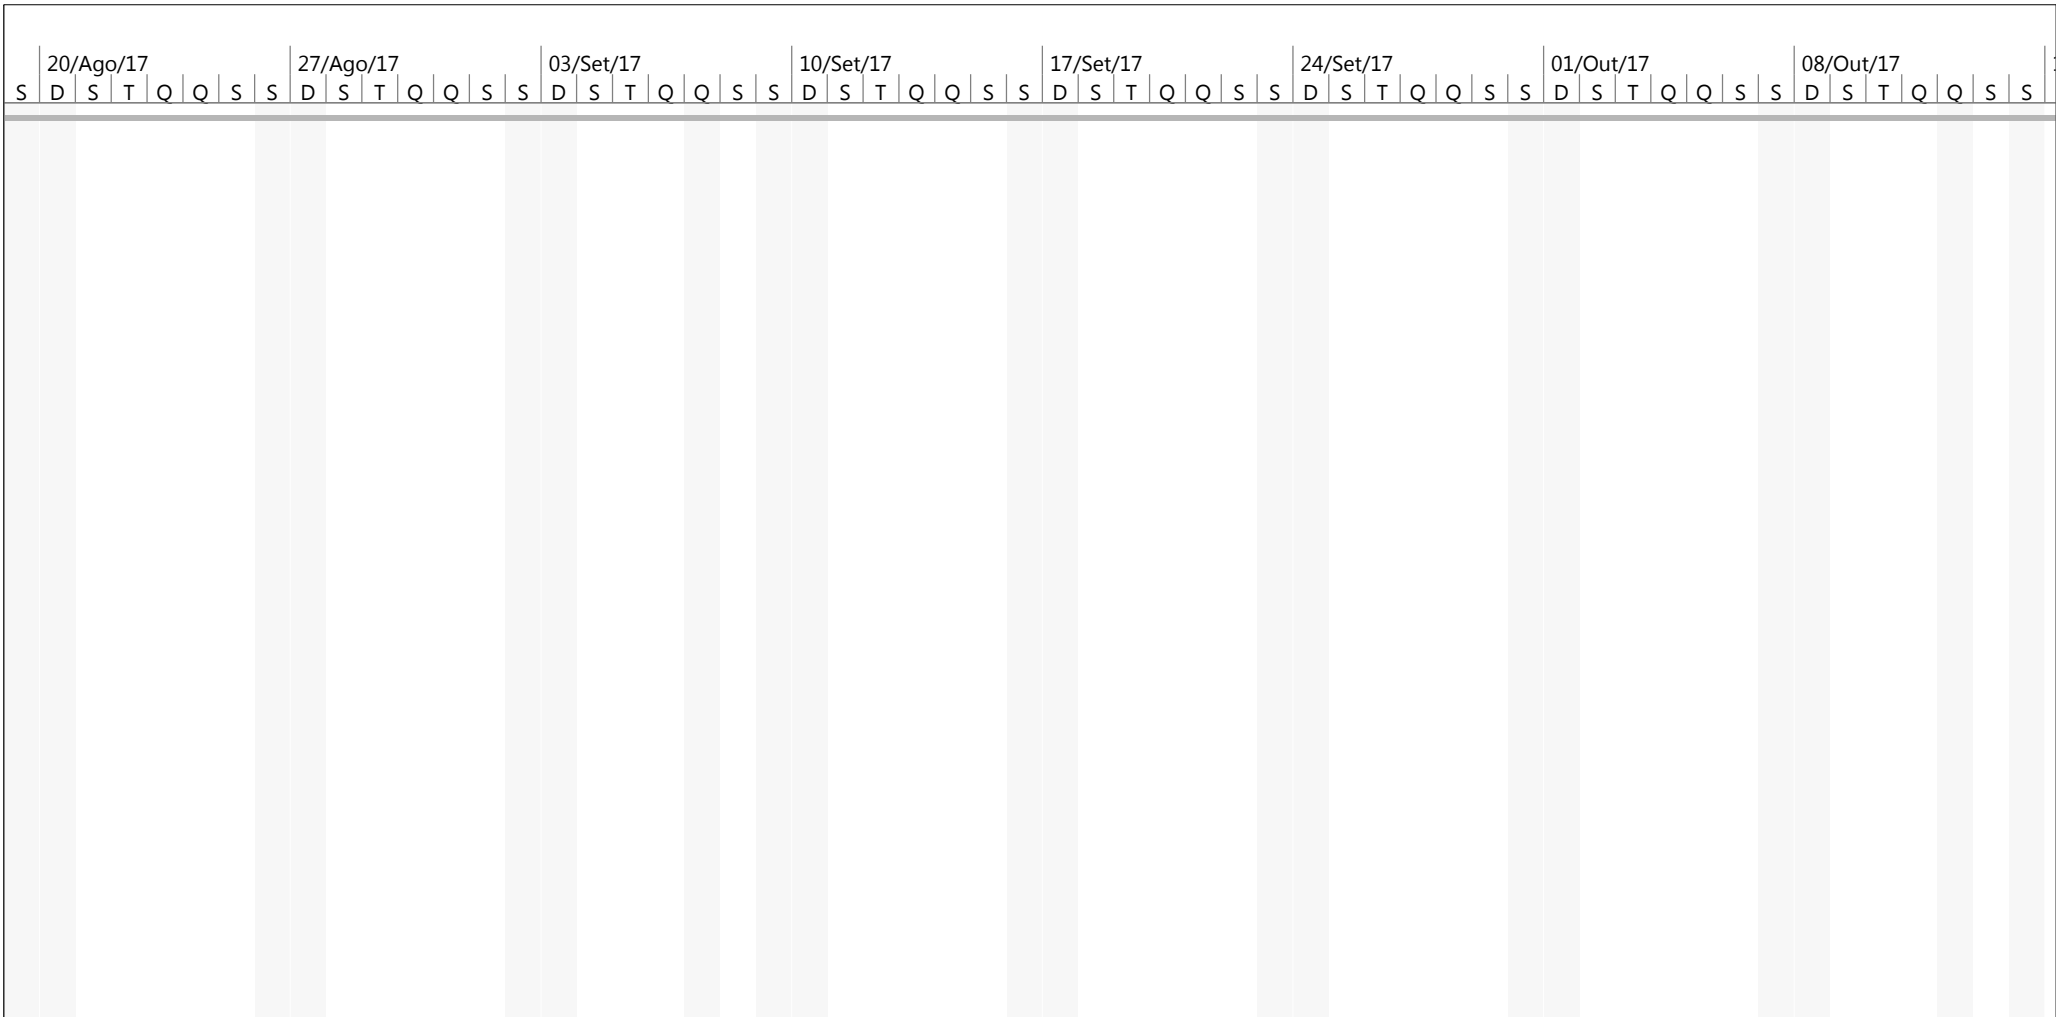


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

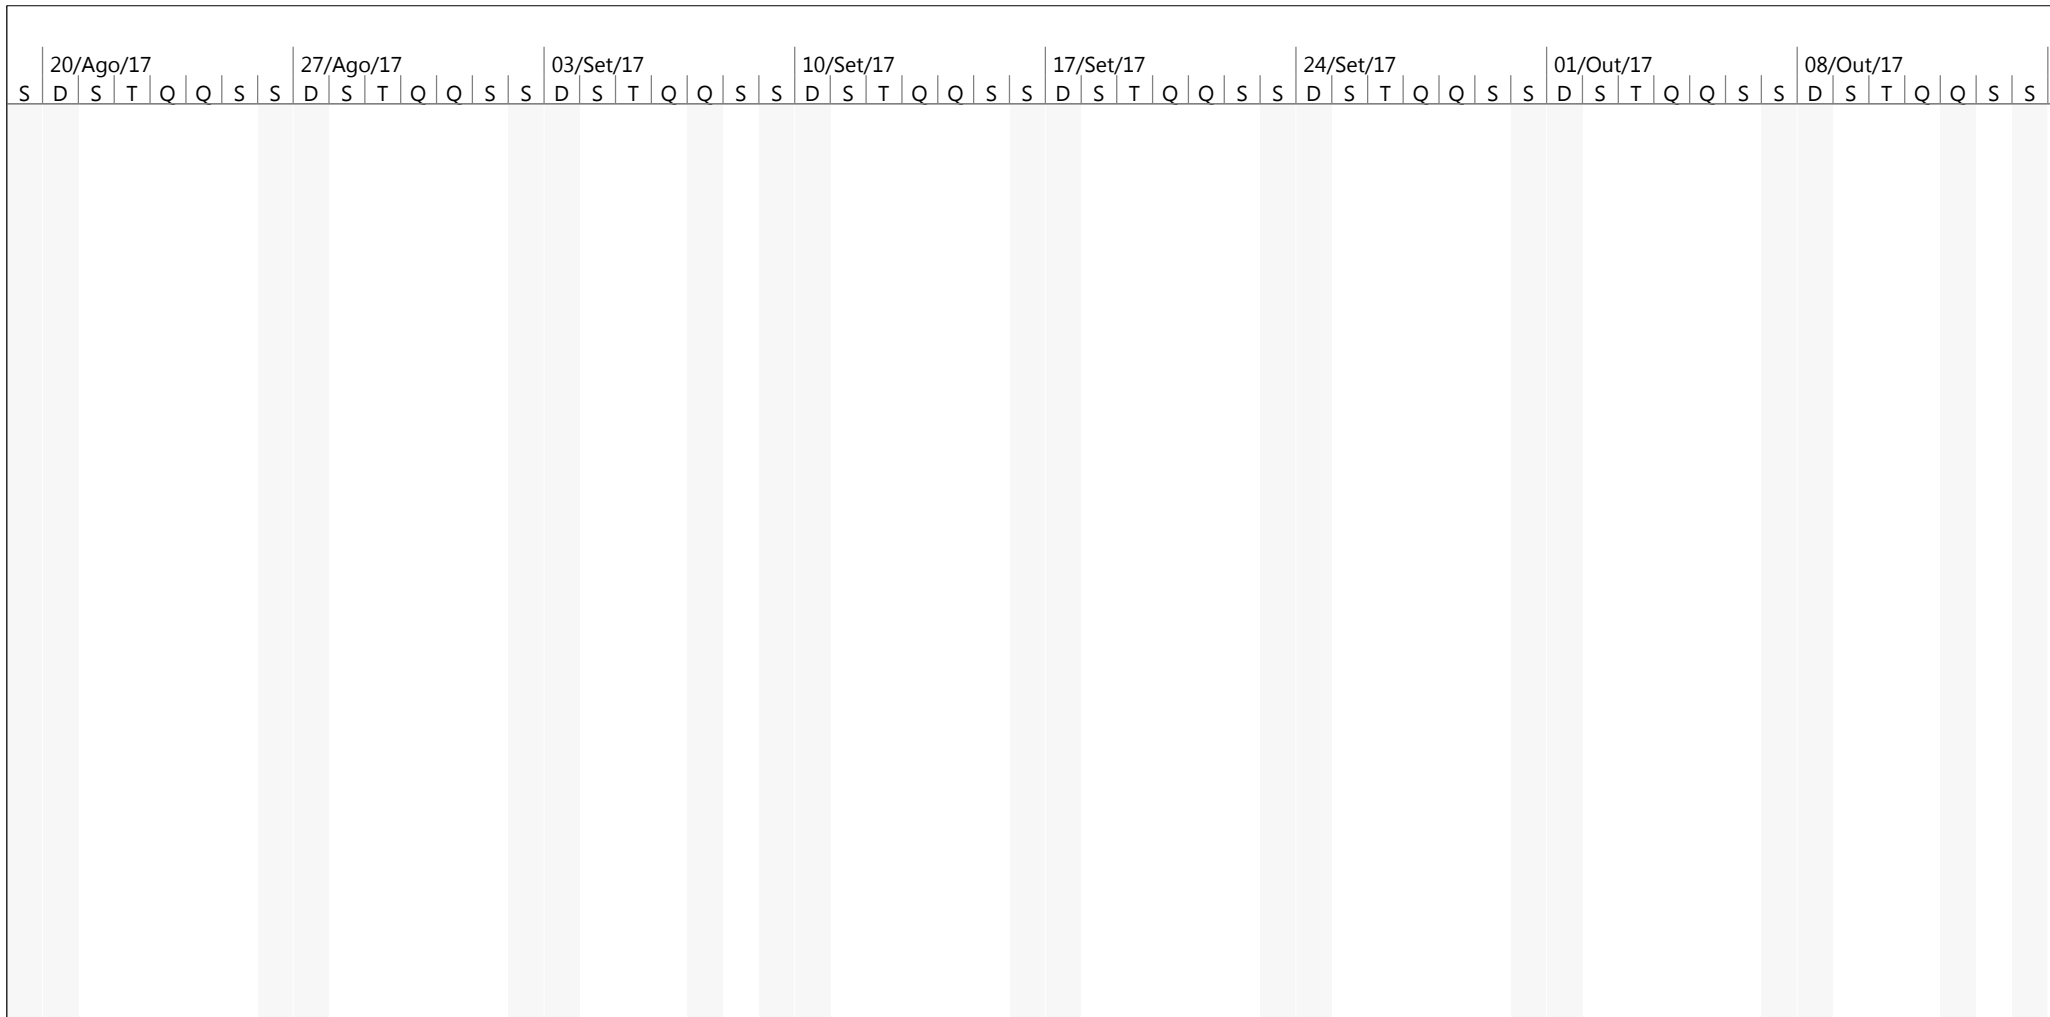

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

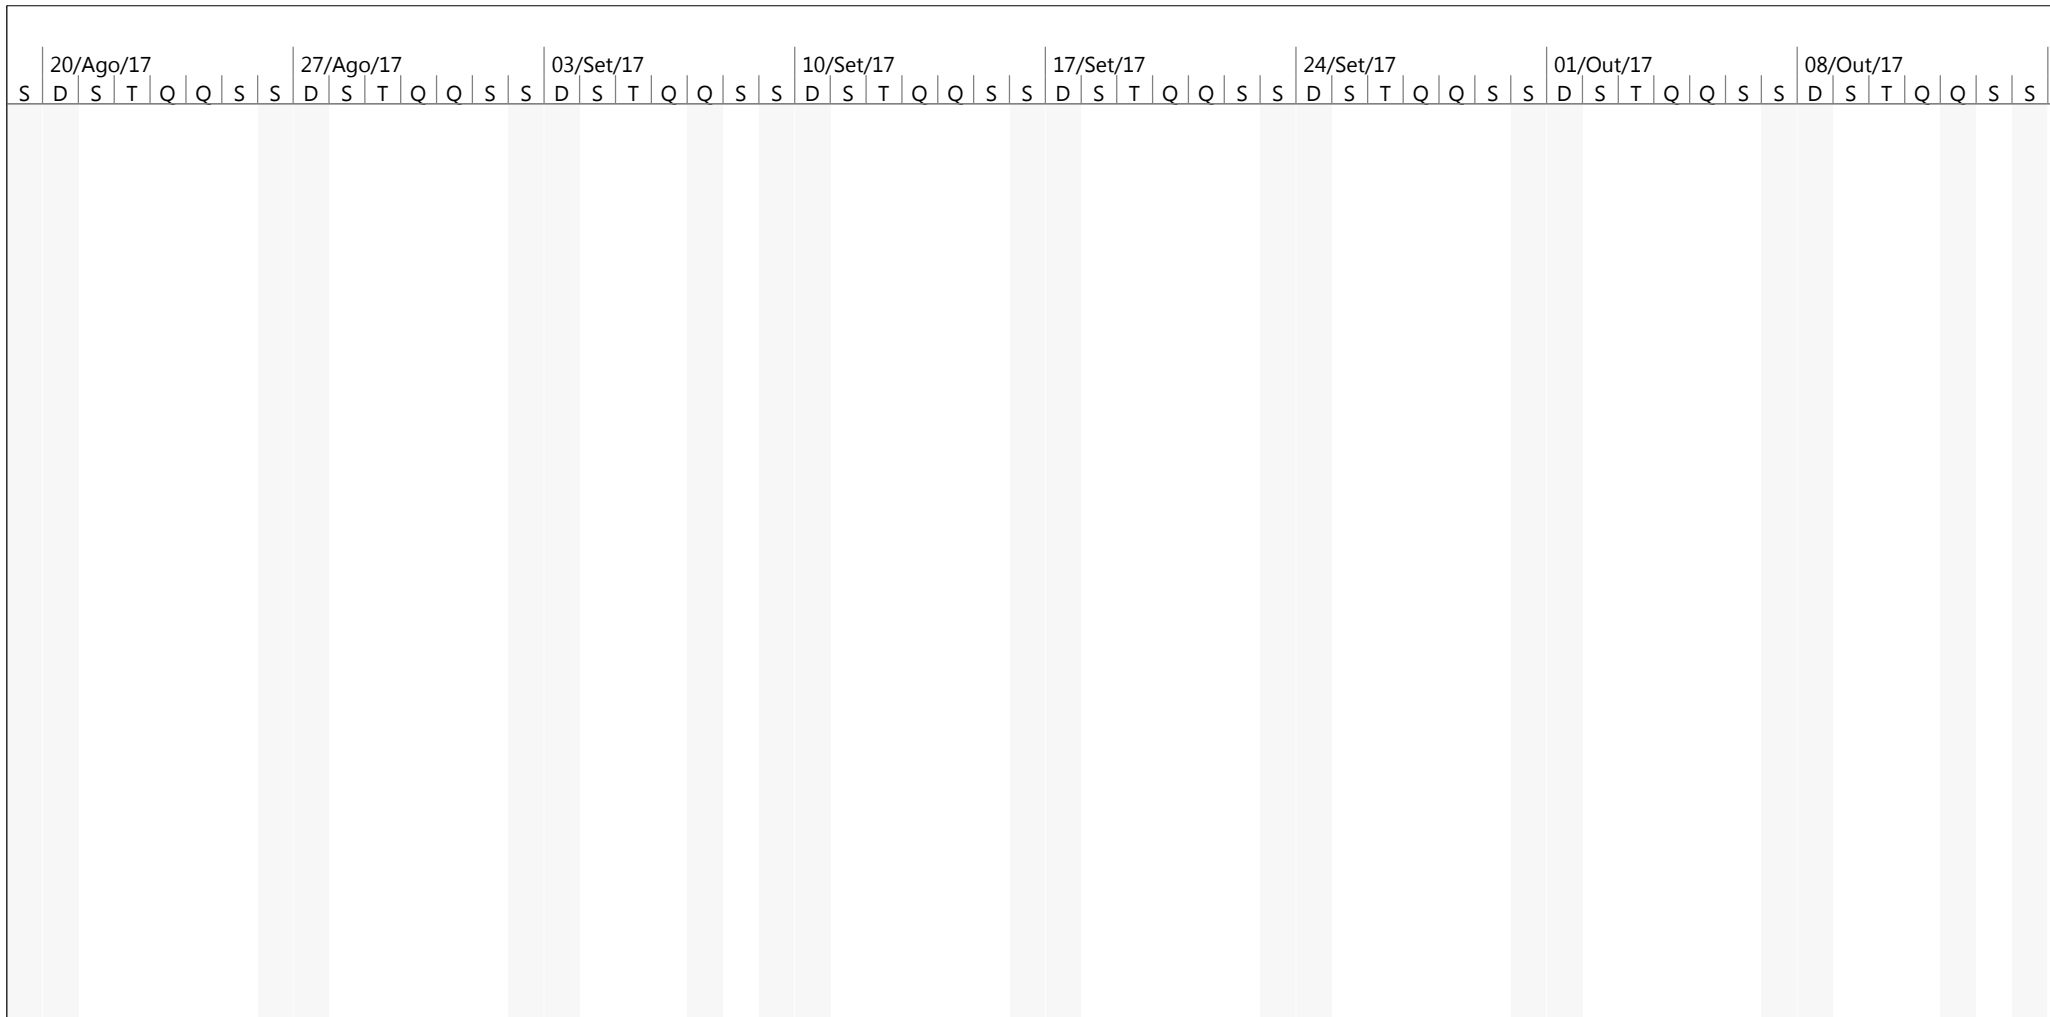


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17



















Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

20/Ago/17 27/Ago/17 03/Set/17 10/Set/17 17/Set/17 24/Set/17 01/Out/17 08/Out/17

S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



15/Out/17 22/Out/17 29/Out/17 05/Nov/17 12/Nov/17 19/Nov/17 26/Nov/17 03/Dez/17 10/D

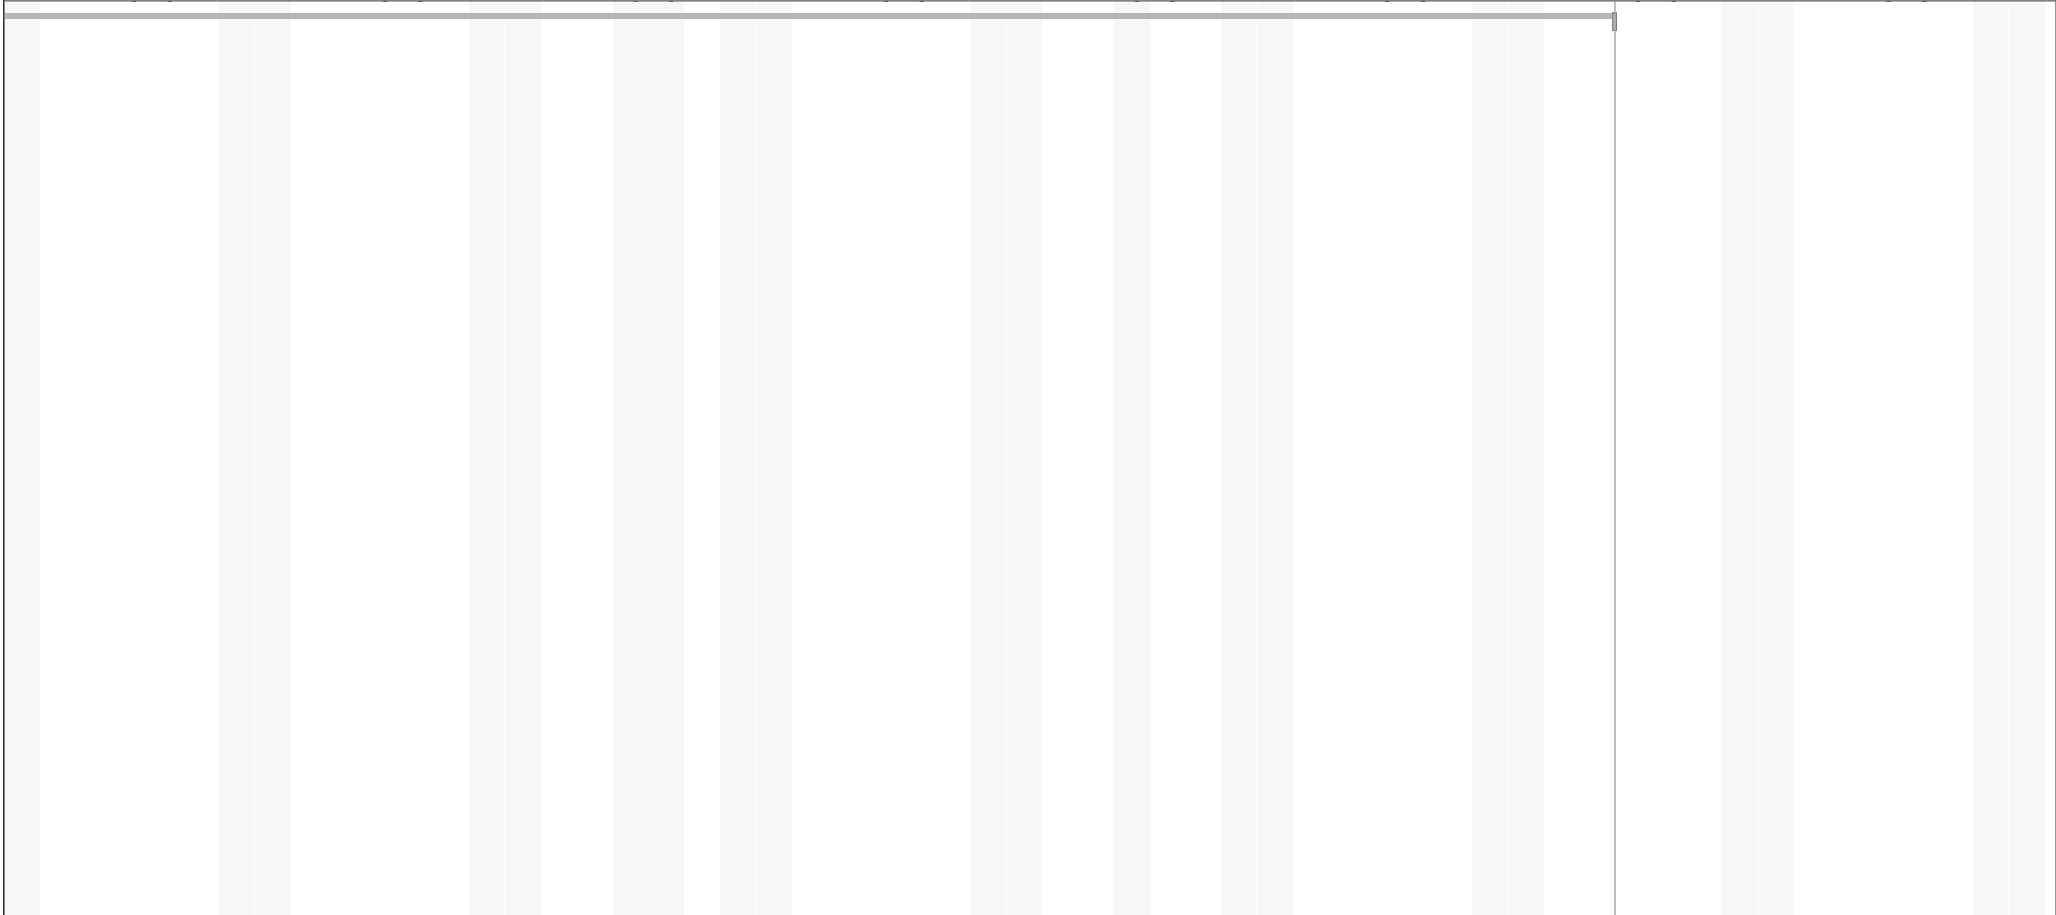


Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17







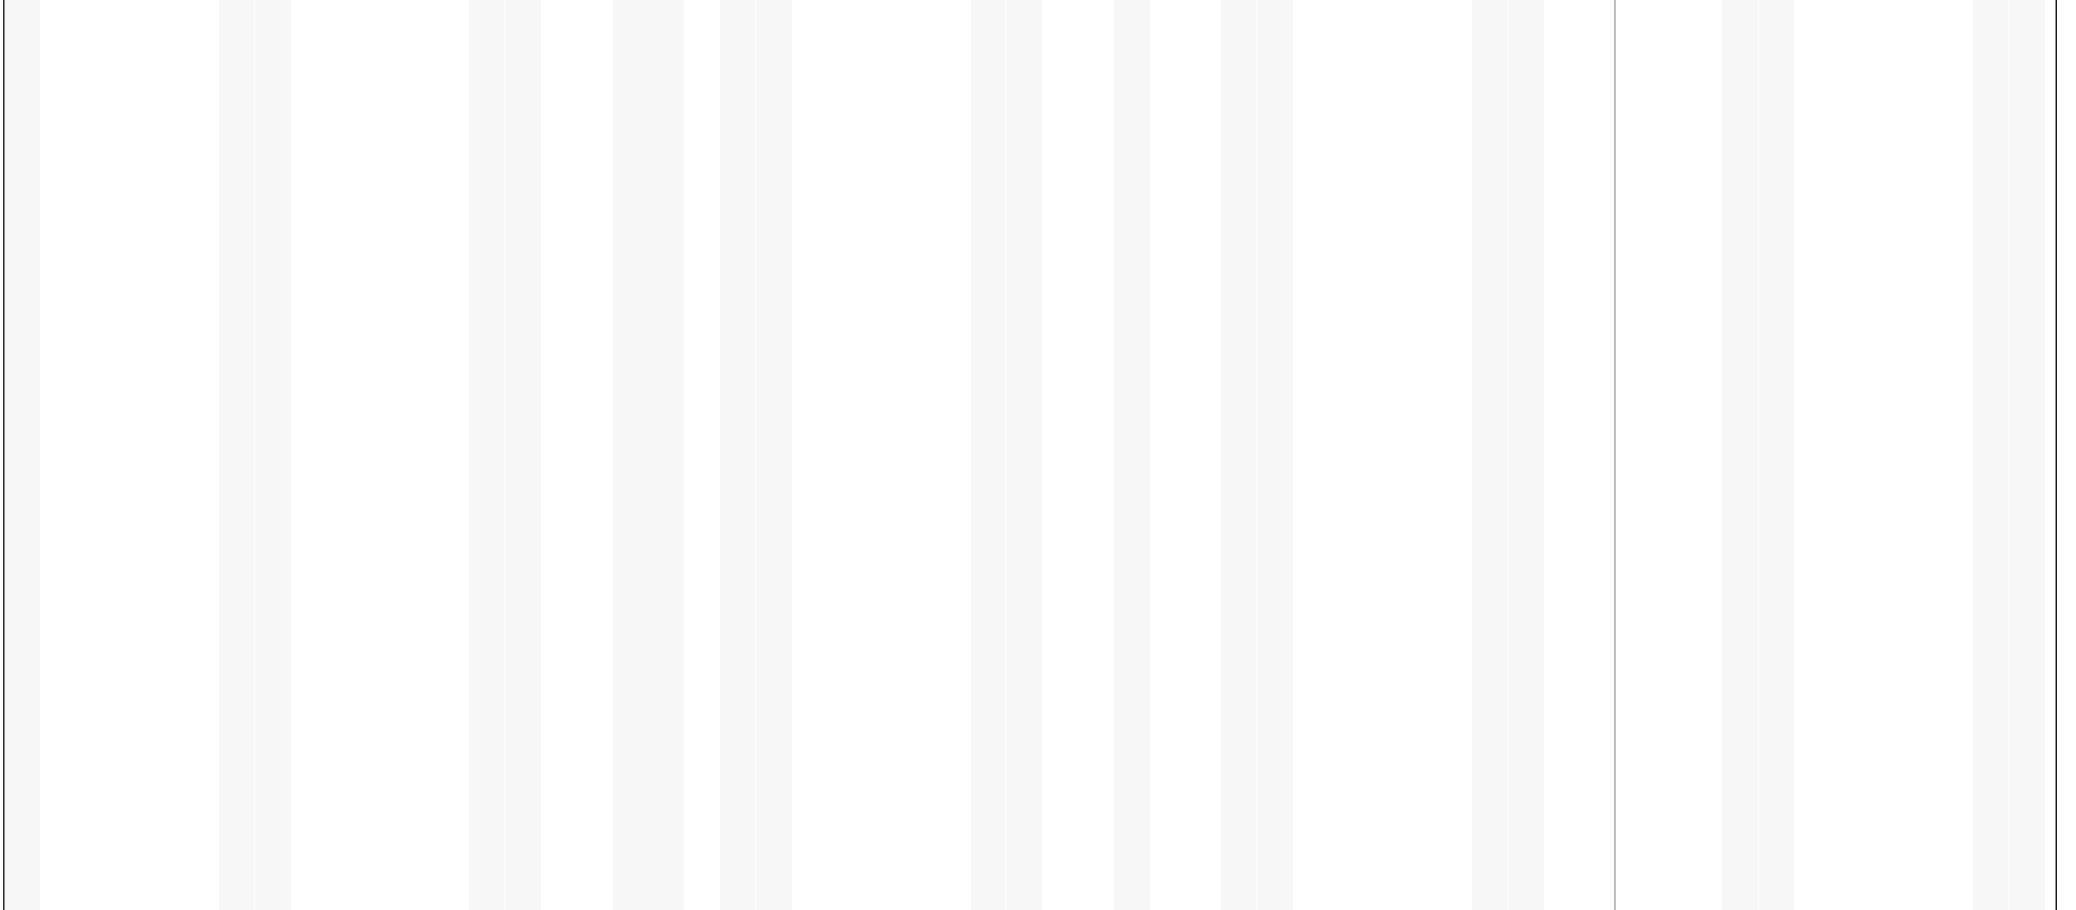











Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

15/Out/17 22/Out/17 29/Out/17 05/Nov/17 12/Nov/17 19/Nov/17 26/Nov/17 03/Dez/17 10/D

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S




Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17








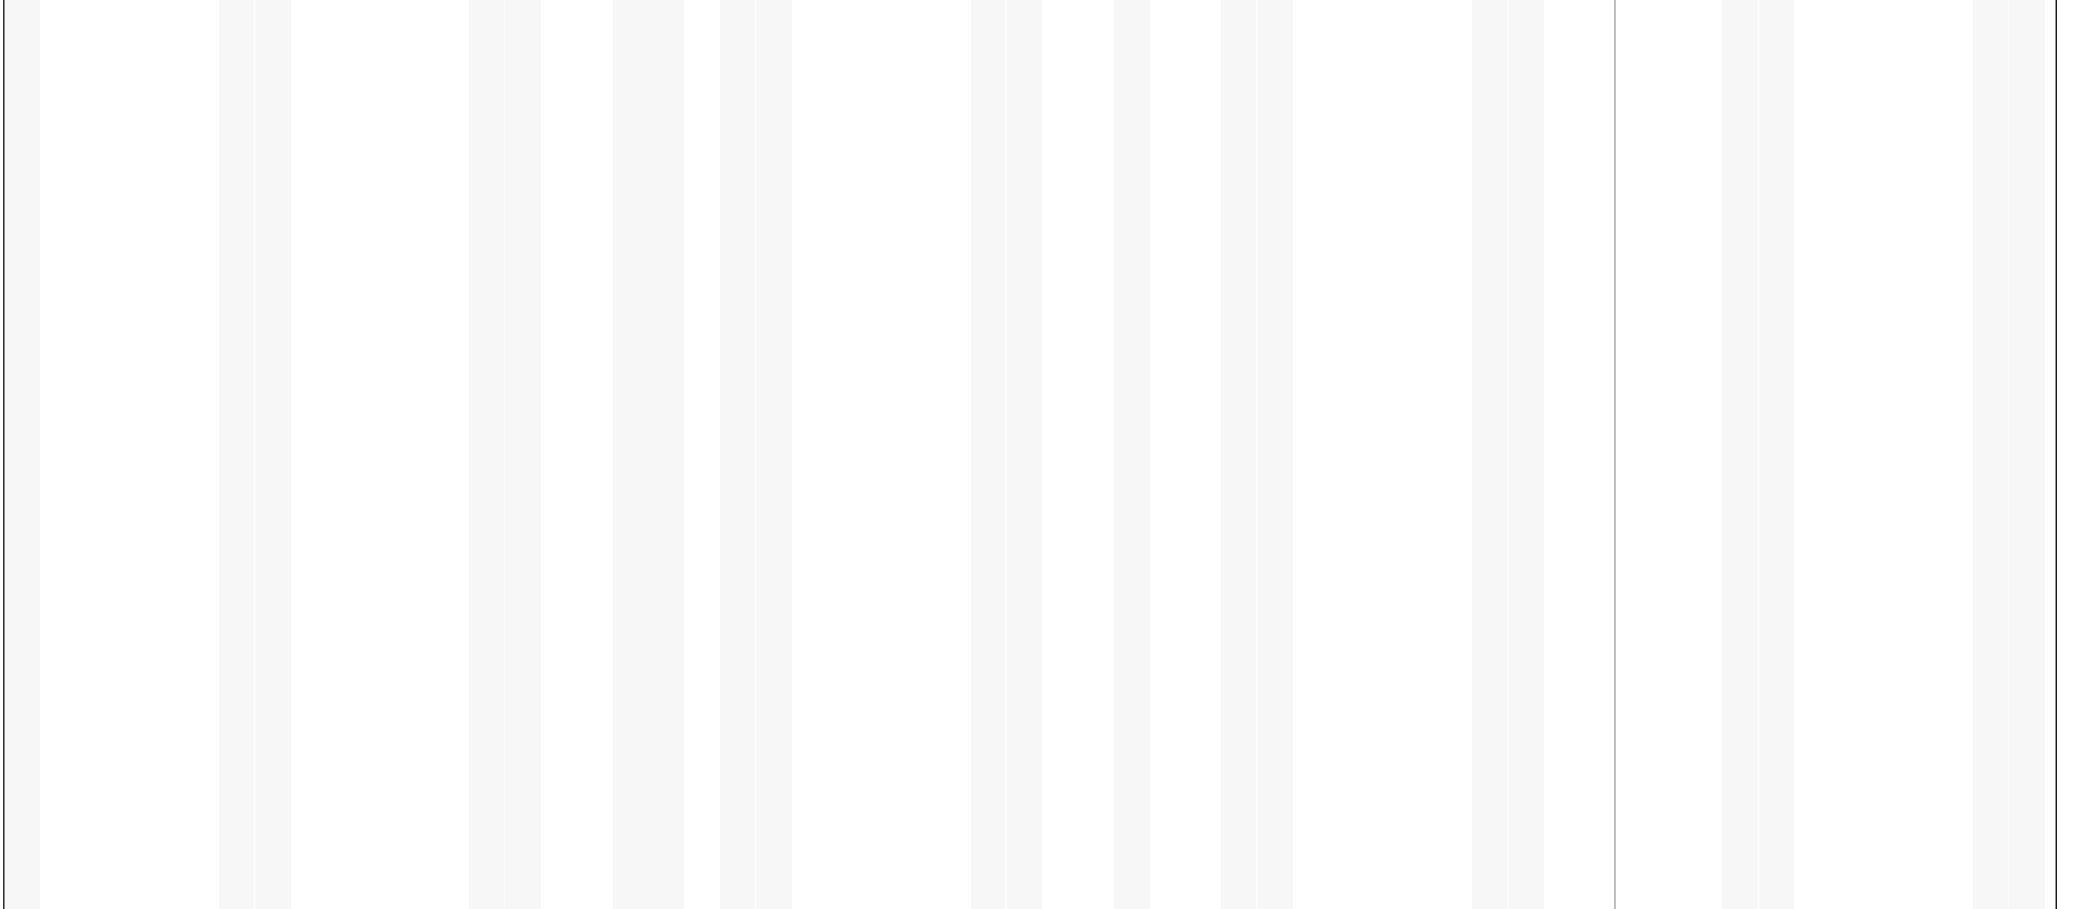










Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


15/Out/17 22/Out/17 29/Out/17 05/Nov/17 12/Nov/17 19/Nov/17 26/Nov/17 03/Dez/17 10/D

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S



Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

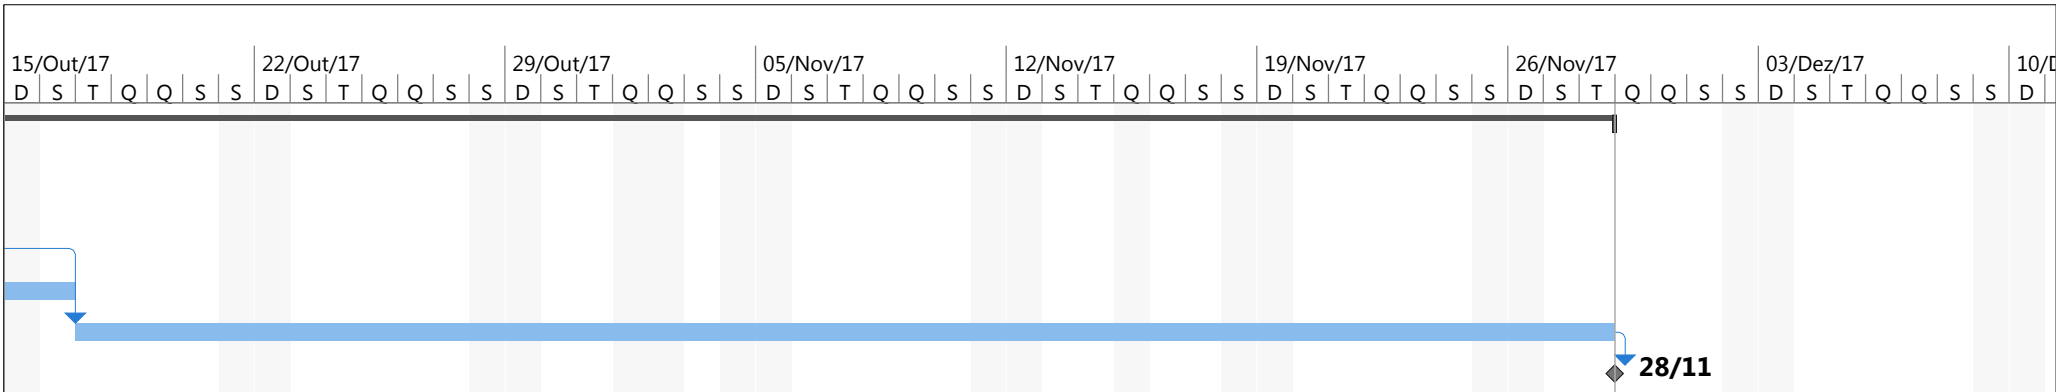

Projeto: OTIMIZAÇÃO DO PRO  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
