

# 1. Documento: 24909-2015-1

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 24909/2015

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Proposta de Projeto

**Assunto:** Planejamento estratégico - Metas

**Unidade Protocoladora:** DADM - Diretoria de Administracao

**Data de Entrada:** 01/09/2015

**Localização Atual:** EPRO - Escritorio de Projetos

**Cadastrado pelo usuário:** PATRICHR

**Data de Inclusão:** 03/09/2015 14:09

**Descrição:** Plano de Projeto Estratégico e Cronograma - complementa e-pad 23705/2015

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 24909-2015-1

**Nome:** Proj Mensageria.pdf

**Incluído Por:** Diretoria de Administracao

**Cadastrado pelo Usuário:** PATRICHR

**Data de Inclusão:** 01/09/2015 13:24

**Descrição:** Cronograma

## 1.3. Assinaturas no documento

| Assinador                | Tipo        | Data             |
|--------------------------|-------------|------------------|
| Patricia Helena dos Reis | Autenticado | 01/09/2015 13:24 |

---

**Documento Gerado em 03/09/2015 19:05:56**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

| Id |  | Linha de base definida? | EDT  | Nome da tarefa   | Situação  | % concluída | Duração  | Início       | Término      |
|----|---|-------------------------|------|--|---|-------------|----------|--------------|--------------|
| 0  |   | ✗                       | 0    | <b>MENSAGERIA</b>                                      |    | 24%         | 338 dias | Qua 17/12/14 | Qua 11/05/16 |
| 1  | ✓   | ✗                       | 1    | <b>Levantamento das atividades da Subsecretaria de</b> | ✓   | 100%        | 10 dias  | Qua 17/12/14 | Seg 05/01/15 |
| 2  | ✓   | ✗                       | 1.1  | Descrever as atividades da unidade com a               | ✓   | 100%        | 10 dias  | Qua 17/12/14 | Seg 05/01/15 |
| 3  | ✓   | ✗                       | 1.2  | Atividades descritas                                   | ✓   | 100%        | 0 dias   | Seg 05/01/15 | Seg 05/01/15 |
| 4  |   | ✗                       | 2    | <b>Análise do objeto da contratação</b>                |    | 40%         | 240 dias | Sex 09/01/15 | Seg 04/01/16 |
| 5  | ✓   | ✗                       | 2.1  | Reunir com Correios para discussão sobre a proposta    | ✓   | 100%        | 2 dias   | Sex 09/01/15 | Seg 12/01/15 |
| 6  | ✓   | ✗                       | 2.2  | Apresentar demandas do TRT3 via e-mail                 | ✓   | 100%        | 3 dias   | Ter 13/01/15 | Qui 15/01/15 |
| 7  | ✓   | ✗                       | 2.3  | Confecionar estatística de objetos postados            | ✓   | 100%        | 4 dias   | Sex 16/01/15 | Qua 21/01/15 |
| 8  | ✓   | ✗                       | 2.4  | Realizar levantamento na Subsecretaria de Expedição    | ✓   | 100%        | 11 dias  | Sex 27/02/15 | Sex 13/03/15 |
| 9  | ✓   | ✗                       | 2.5  | Apresentação do levantamento pelos Correios            | ✓   | 100%        | 1 dia    | Seg 13/04/15 | Seg 13/04/15 |
| 10 | ✓   | ✗                       | 2.6  | Definir quais os serviços serão incluídos na           | ✓   | 100%        | 7 dias   | Ter 14/04/15 | Qui 23/04/15 |
| 11 | ✓   | ✗                       | 2.7  | Apresentação de contra proposta pelos Correios do      | ✓   | 100%        | 52 dias  | Sex 24/04/15 | Qua 08/07/15 |
| 12 |   | ✗                       | 2.8  | Apresentar novo orçamento                              |    | 0%          | 90 dias  | Qui 09/07/15 | Ter 17/11/15 |
| 13 |   | ✗                       | 2.9  | Negociar preços dos serviços com base no orçamento     |    | 0%          | 30 dias  | Qua 18/11/15 | Seg 04/01/16 |
| 14 |   | ✗                       | 2.10 | Objeto definido  |    | 0%          | 0 dias   | Seg 04/01/16 | Seg 04/01/16 |
| 15 |   | ✗                       | 3    | <b>Contratação</b>                                     |    | 0%          | 45 dias  | Ter 05/01/16 | Qui 10/03/16 |
| 16 |  | ✗                       | 3.1  | Confecionar Proposição e Termo de Referência           |    | 0%          | 20 dias  | Ter 05/01/16 | Seg 01/02/16 |
| 17 |  | ✗                       | 3.2  | Confecionar proposta de normatização específica        |    | 0%          | 20 dias  | Ter 05/01/16 | Seg 01/02/16 |
| 18 |   | ✗                       | 3.3  | Sumeter a aprovação da Administração                   |    | 0%          | 15 dias  | Ter 02/02/16 | Qui 25/02/16 |
| 19 |   | ✗                       | 3.4  | Assinar contrato                                       |   | 0%          | 10 dias  | Sex 26/02/16 | Qui 10/03/16 |
| 20 |   | ✗                       | 3.5  | Contrato assinado                                      |  | 0%          | 0 dias   | Qui 10/03/16 | Qui 10/03/16 |
| 21 |   | ✗                       | 4    | <b>Implantação da Mensageria</b>                       |  | 0%          | 40 dias  | Sex 11/03/16 | Qua 11/05/16 |


Projeto: MENSAGERIA  
Data: Ter 01/09/15

|                   |   |                          |   |                  |   |
|-------------------|---|--------------------------|---|------------------|---|
| Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
| Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
| Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
| Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
| Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
| Tarefa Inativa    |   | Somente início           |  |                  |   |
| Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |   |

| Id |  | Linha de base definida?   | EDT | Nome da tarefa                                      | Situação  | % concluída | Duração | Início       | Término      |
|----|---|---|-----|---|---|-------------|---------|--------------|--------------|
| 22 |   |  | 4.1 | Adequar o fluxo de rotinas da Subsecretaria de      |  | 0%          | 20 dias | Sex 11/03/16 | Ter 12/04/16 |
| 23 |   |  | 4.2 | Negociar com as unidades envolvidas o novo fluxo    |  | 0%          | 10 dias | Qua 13/04/16 | Qua 27/04/16 |
| 24 |   |  | 4.3 | Instalação do Pontos de Coleta e da Central da      |  | 0%          | 30 dias | Sex 11/03/16 | Qua 27/04/16 |
| 25 |   |  | 4.4 | Instalação do sistema informaizado da Mensageria no |  | 0%          | 30 dias | Sex 11/03/16 | Qua 27/04/16 |
| 26 |   |  | 4.5 | Divulgar os novos procedimentos para todas as       |  | 0%          | 10 dias | Qui 28/04/16 | Qua 11/05/16 |
| 27 |   |  | 4.6 | <a href="#">Mensageria implantada</a>               |  | 0%          | 0 dias  | Qua 11/05/16 | Qua 11/05/16 |

Projeto: MENSAGERIA  
Data: Ter 01/09/15

|                   |   |                          |   |                  |   |
|-------------------|---|--------------------------|---|------------------|---|
| Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
| Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
| Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
| Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
| Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
| Tarefa Inativa    |   | Somente início           |  |                  |   |
| Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |   |

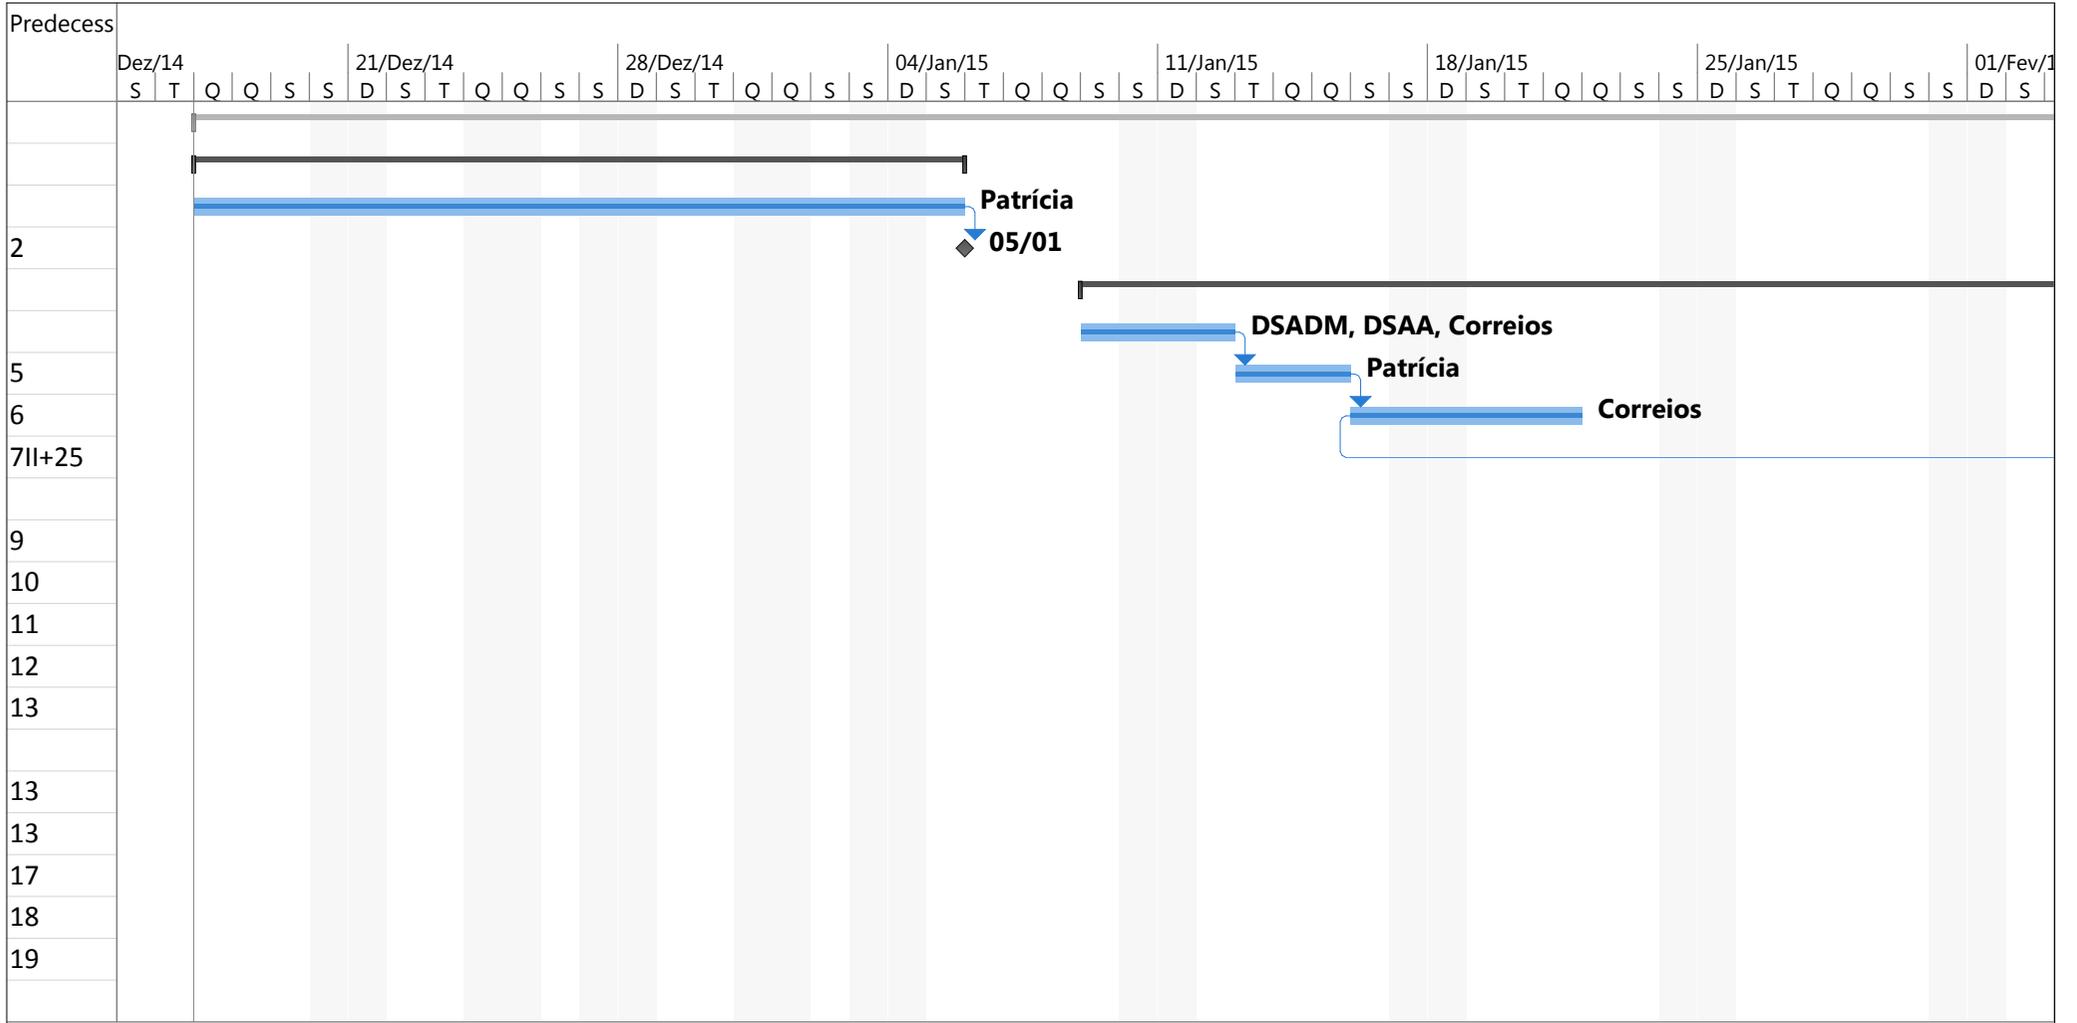


|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |


| Predecess | Dez/14 |   | 21/Dez/14 |   |   |   | 28/Dez/14 |   |   |   | 04/Jan/15 |   |   |   | 11/Jan/15 |   |   |   | 18/Jan/15 |   |   |   | 25/Jan/15 |   |   |   | 01/Fev/15 |   |   |
|-----------|--------|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|
|           | S      | T | Q         | Q | S | S | D         | S | T | Q | Q         | S | S | D | S         | T | Q | Q | S         | S | D | S | T         | Q | Q | S | S         | D | S |
| 19        |        |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |
| 22        |        |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |
| 19        |        |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |
| 19        |        |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |
| 25        |        |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |
| 26        |        |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |



|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |

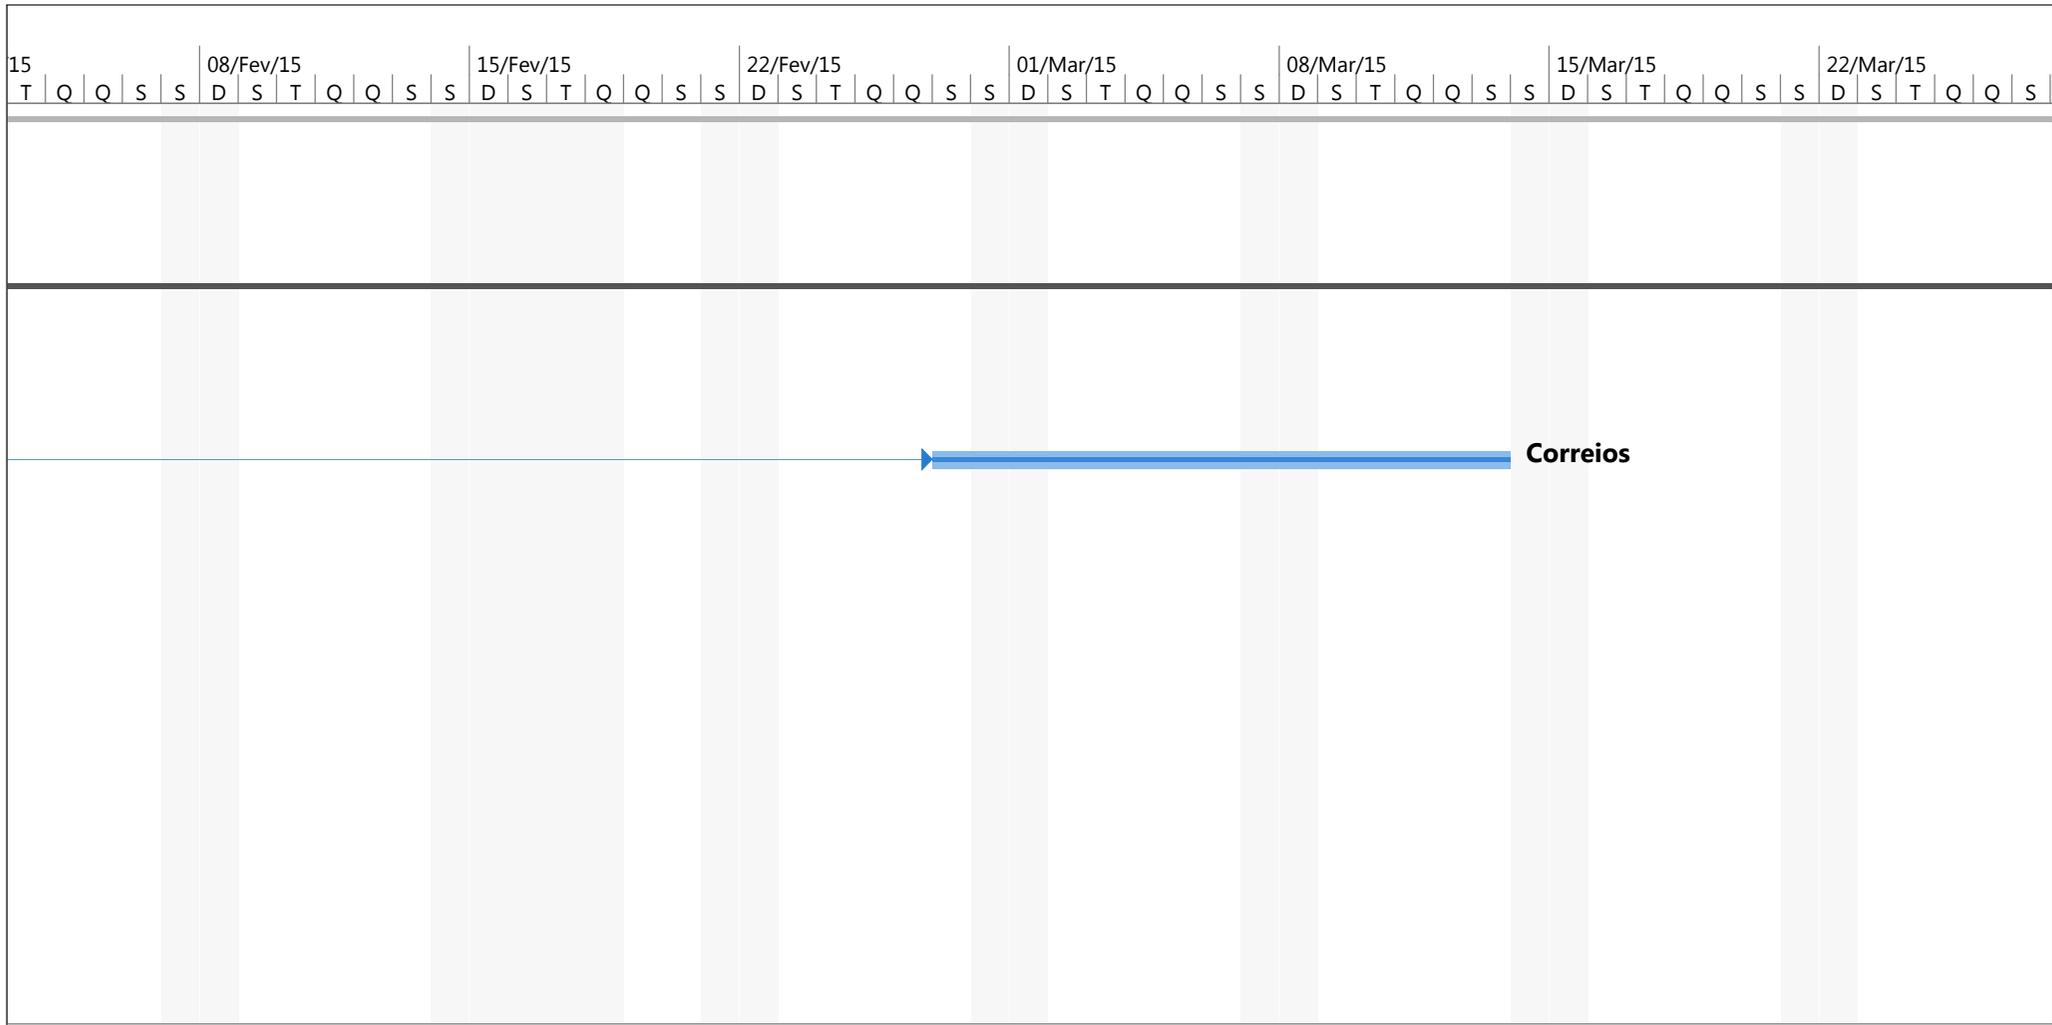


|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |




|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |


29/Mar/15 05/Abr/15 12/Abr/15 19/Abr/15 26/Abr/15 03/Maio/15 10/Maio/15 17/Maio/15  
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S





|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |




|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |

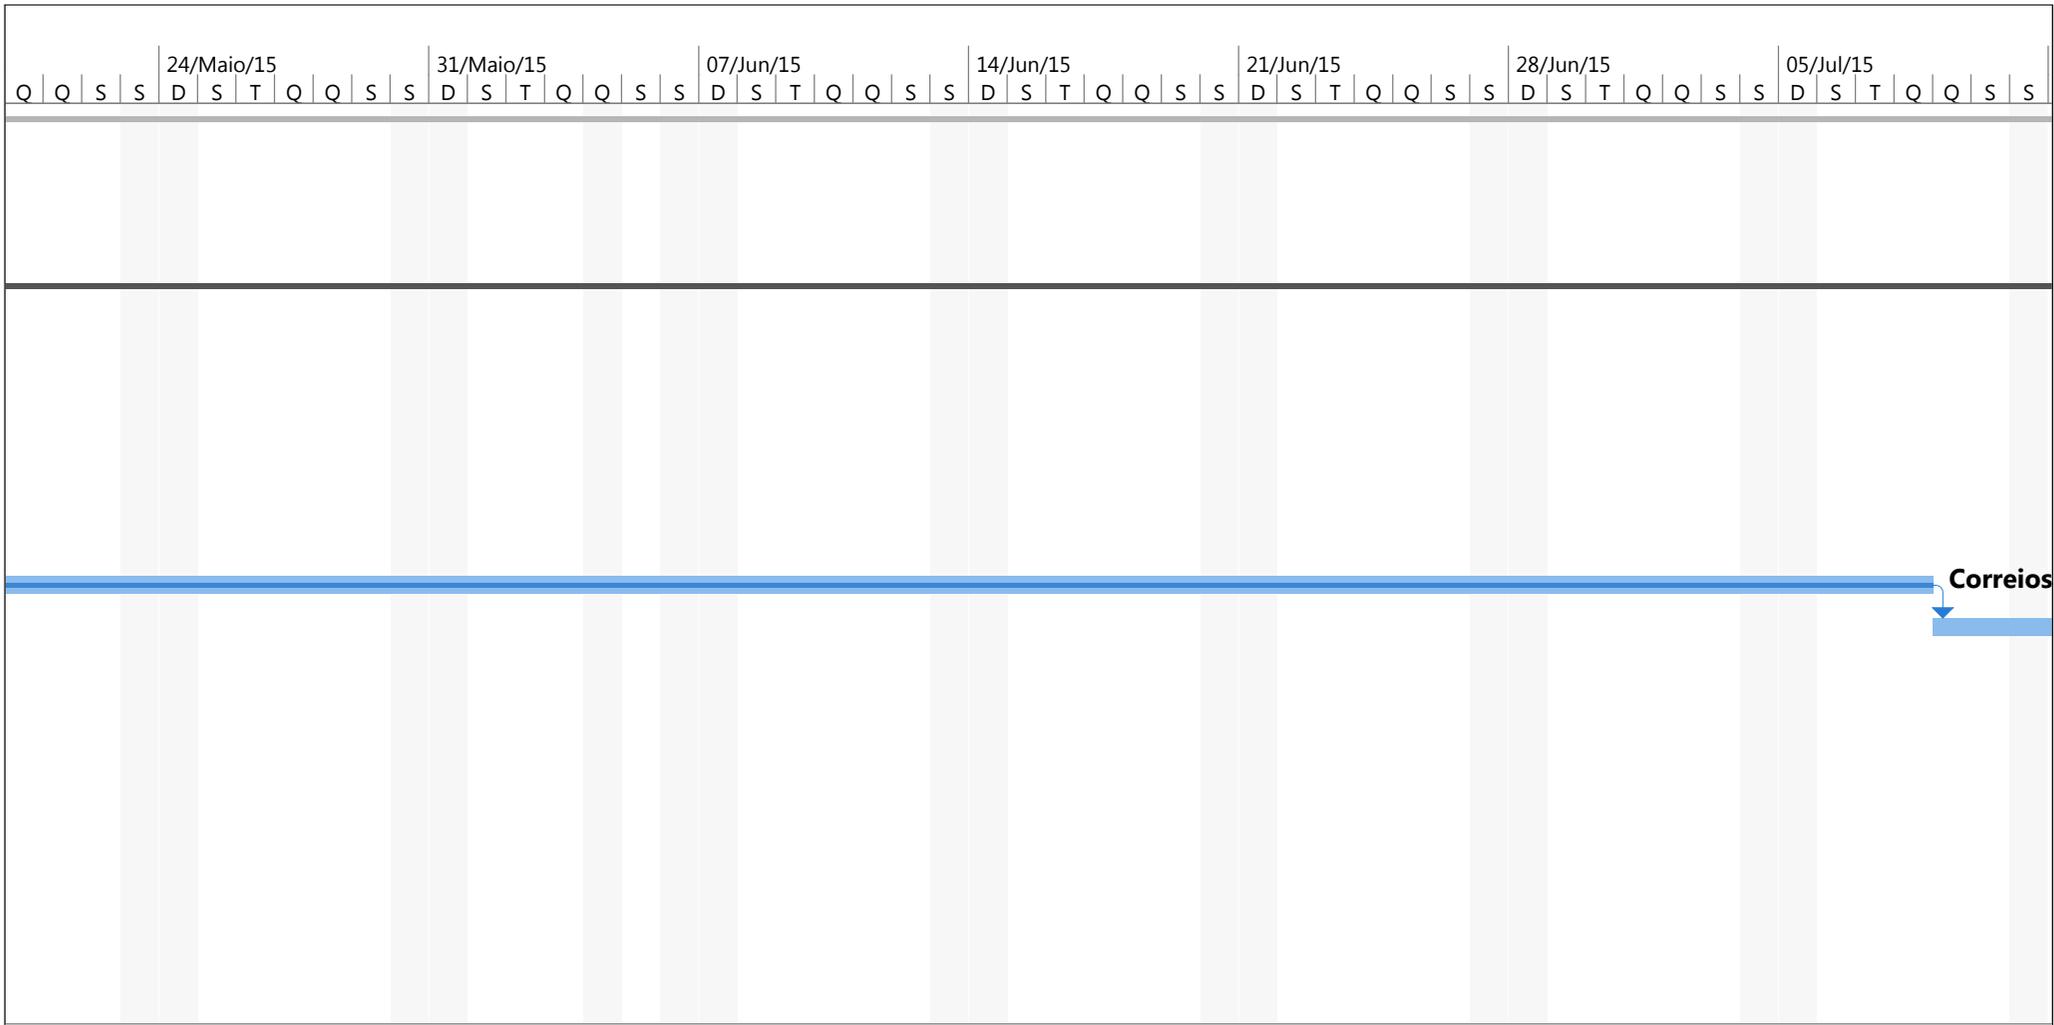

|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |





|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |

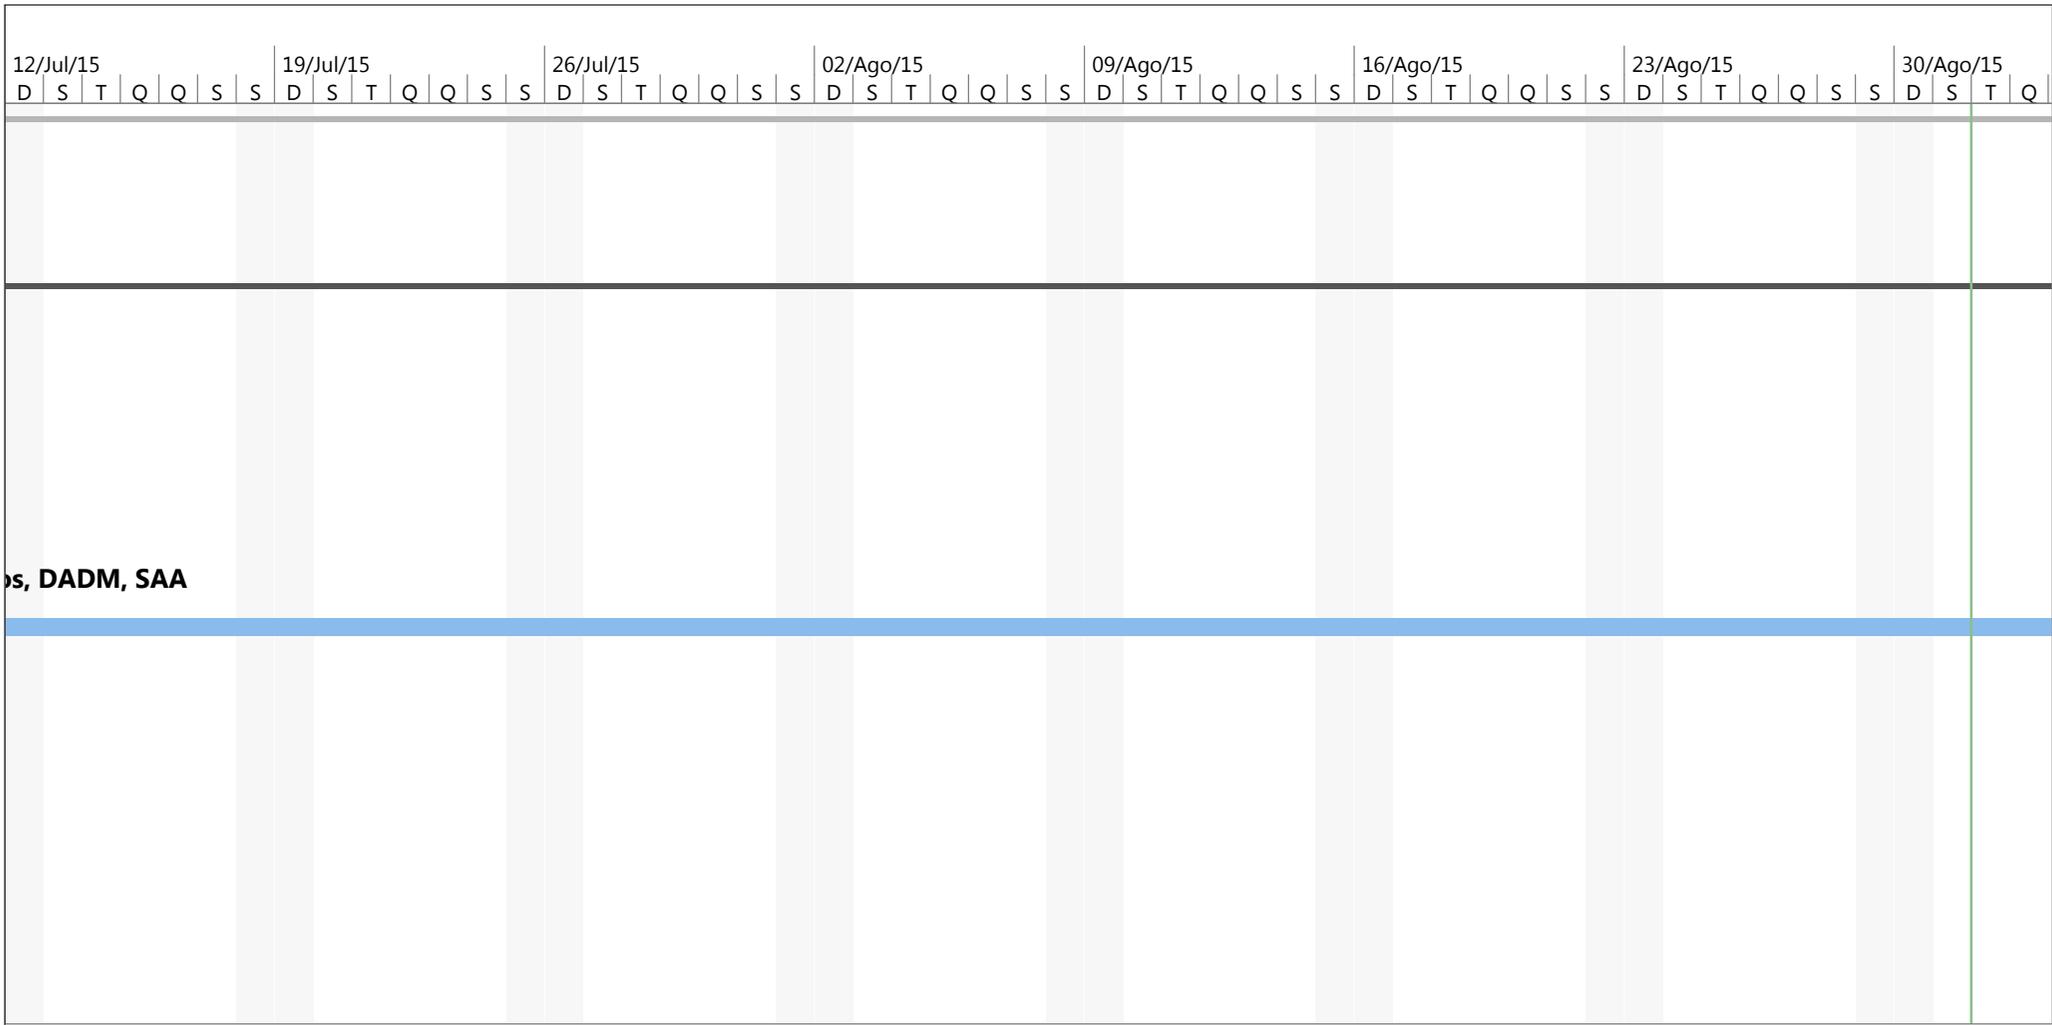


ps, DADM, SAA

|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |



|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |

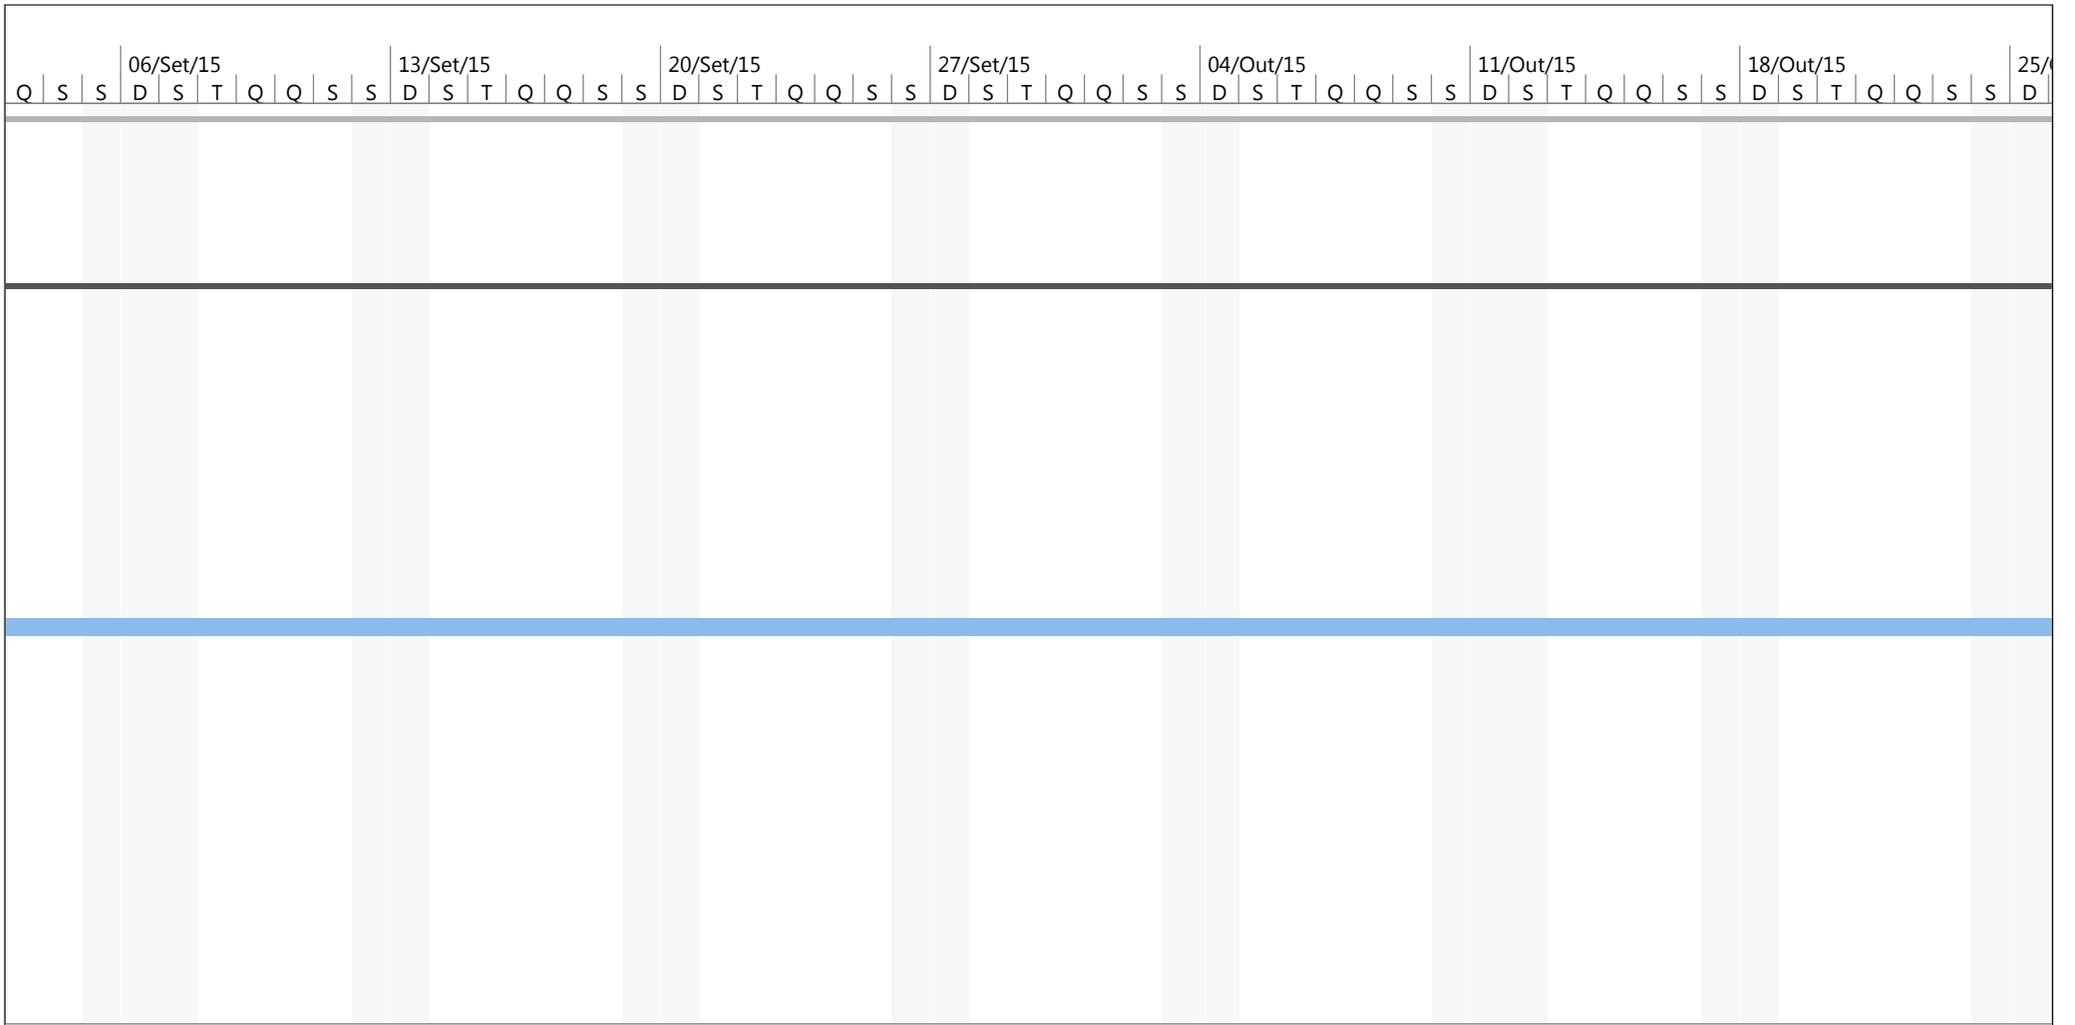


|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|   |                   |  |                          |  |                  |  |





Out/15                      01/Nov/15                      08/Nov/15                      15/Nov/15                      22/Nov/15                      29/Nov/15                      06/Dez/15                      13/Dez/15

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

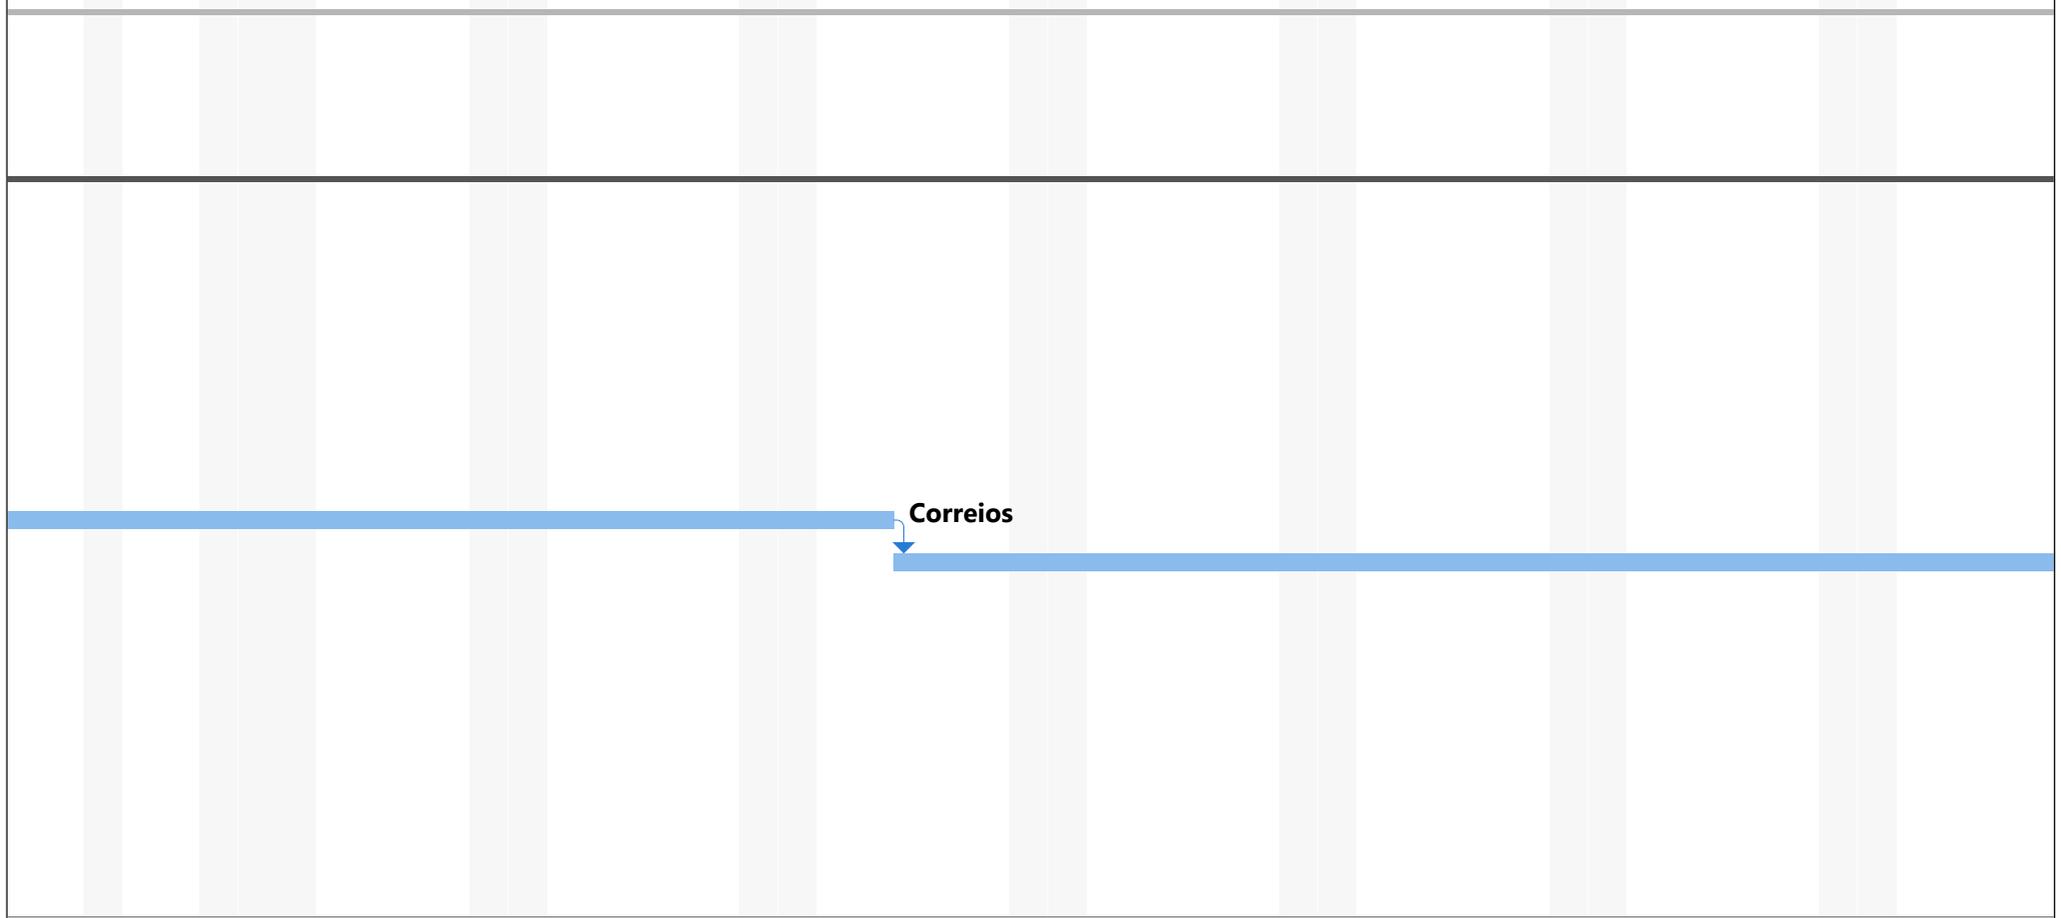


**Correios**


|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |



|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |

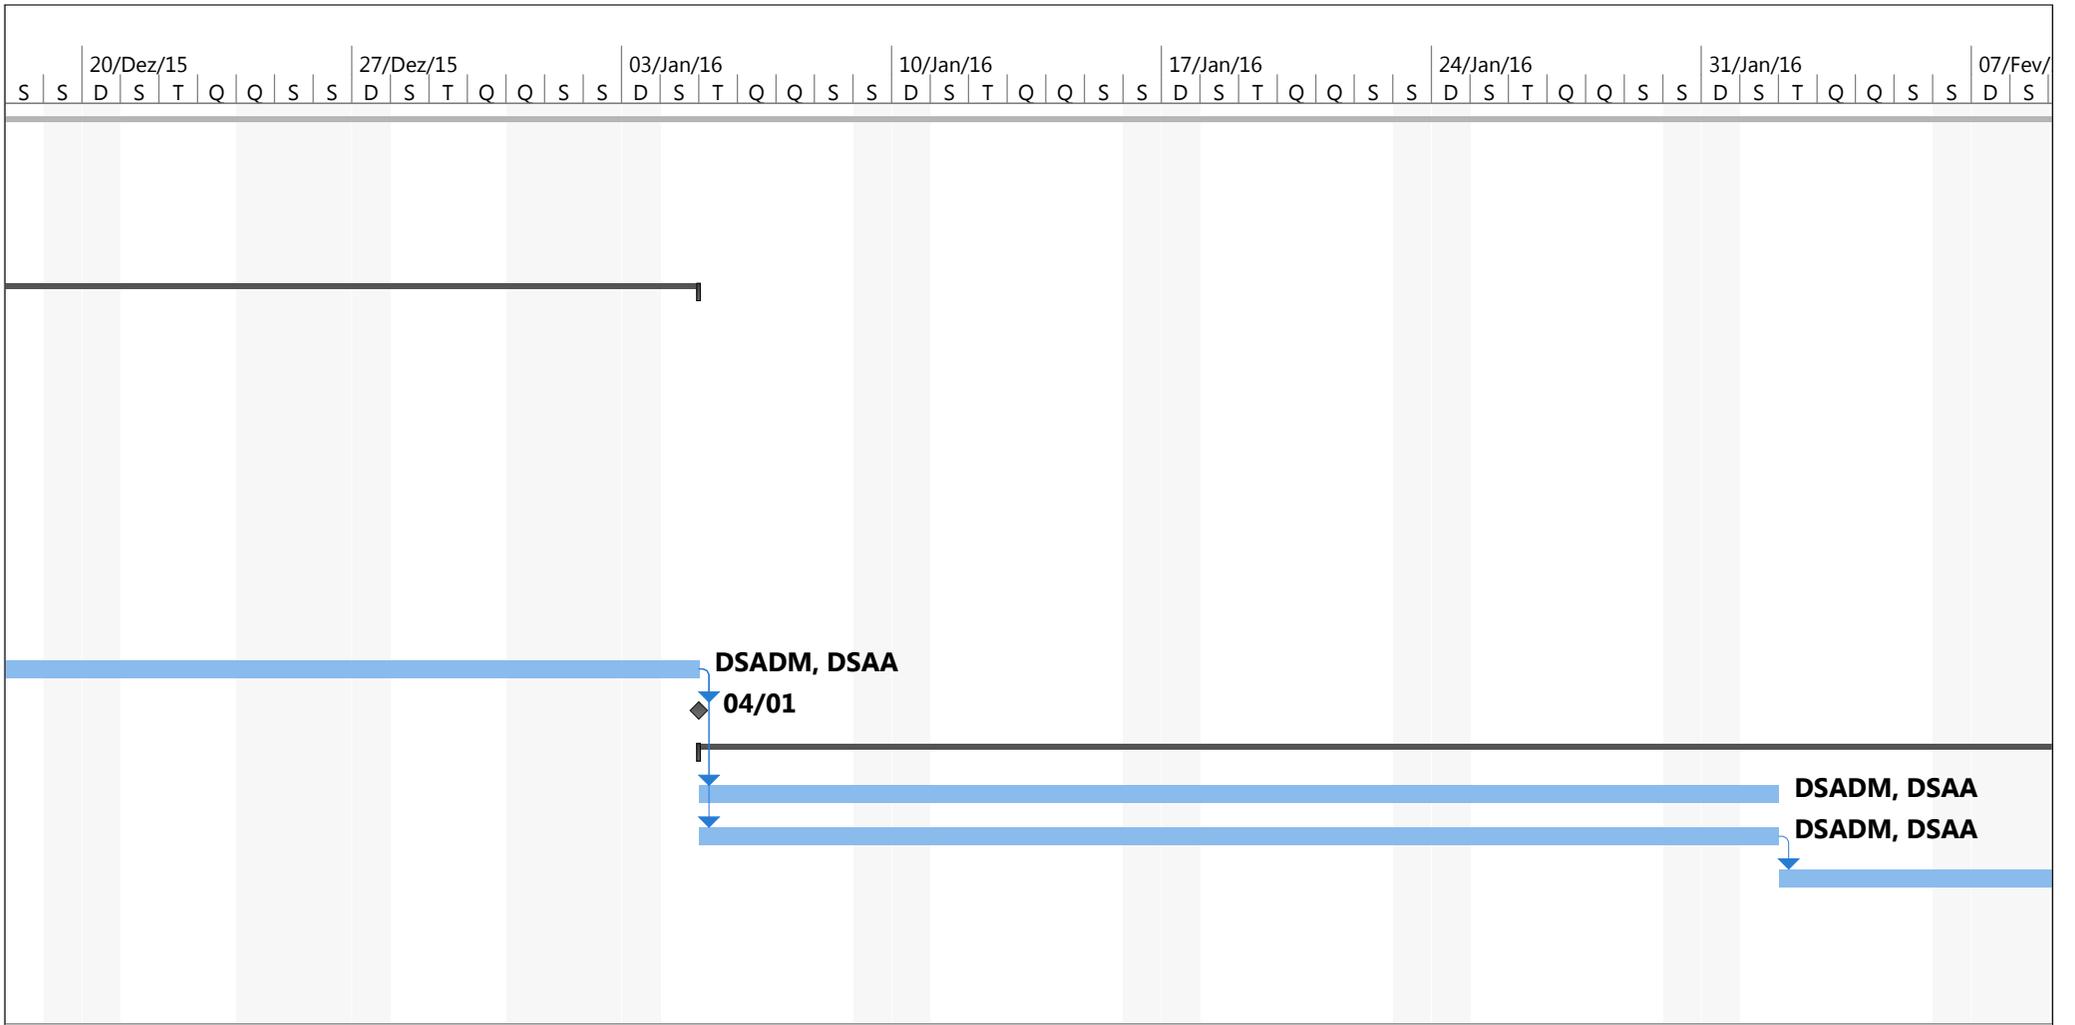


|   |                   |                 |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |                 | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |                 | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |                 | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |                 | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |                 | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |                 | Somente início           |  |                  |  |
| Marco Inativo                             |                   | Somente término |                          |  |                  |  |




|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |


16 | T | Q | Q | S | S | 14/Fev/16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 21/Fev/16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 28/Fev/16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 06/Mar/16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 13/Mar/16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 20/Mar/16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 27/Mar/16 | D | S | T | Q | Q | S | S

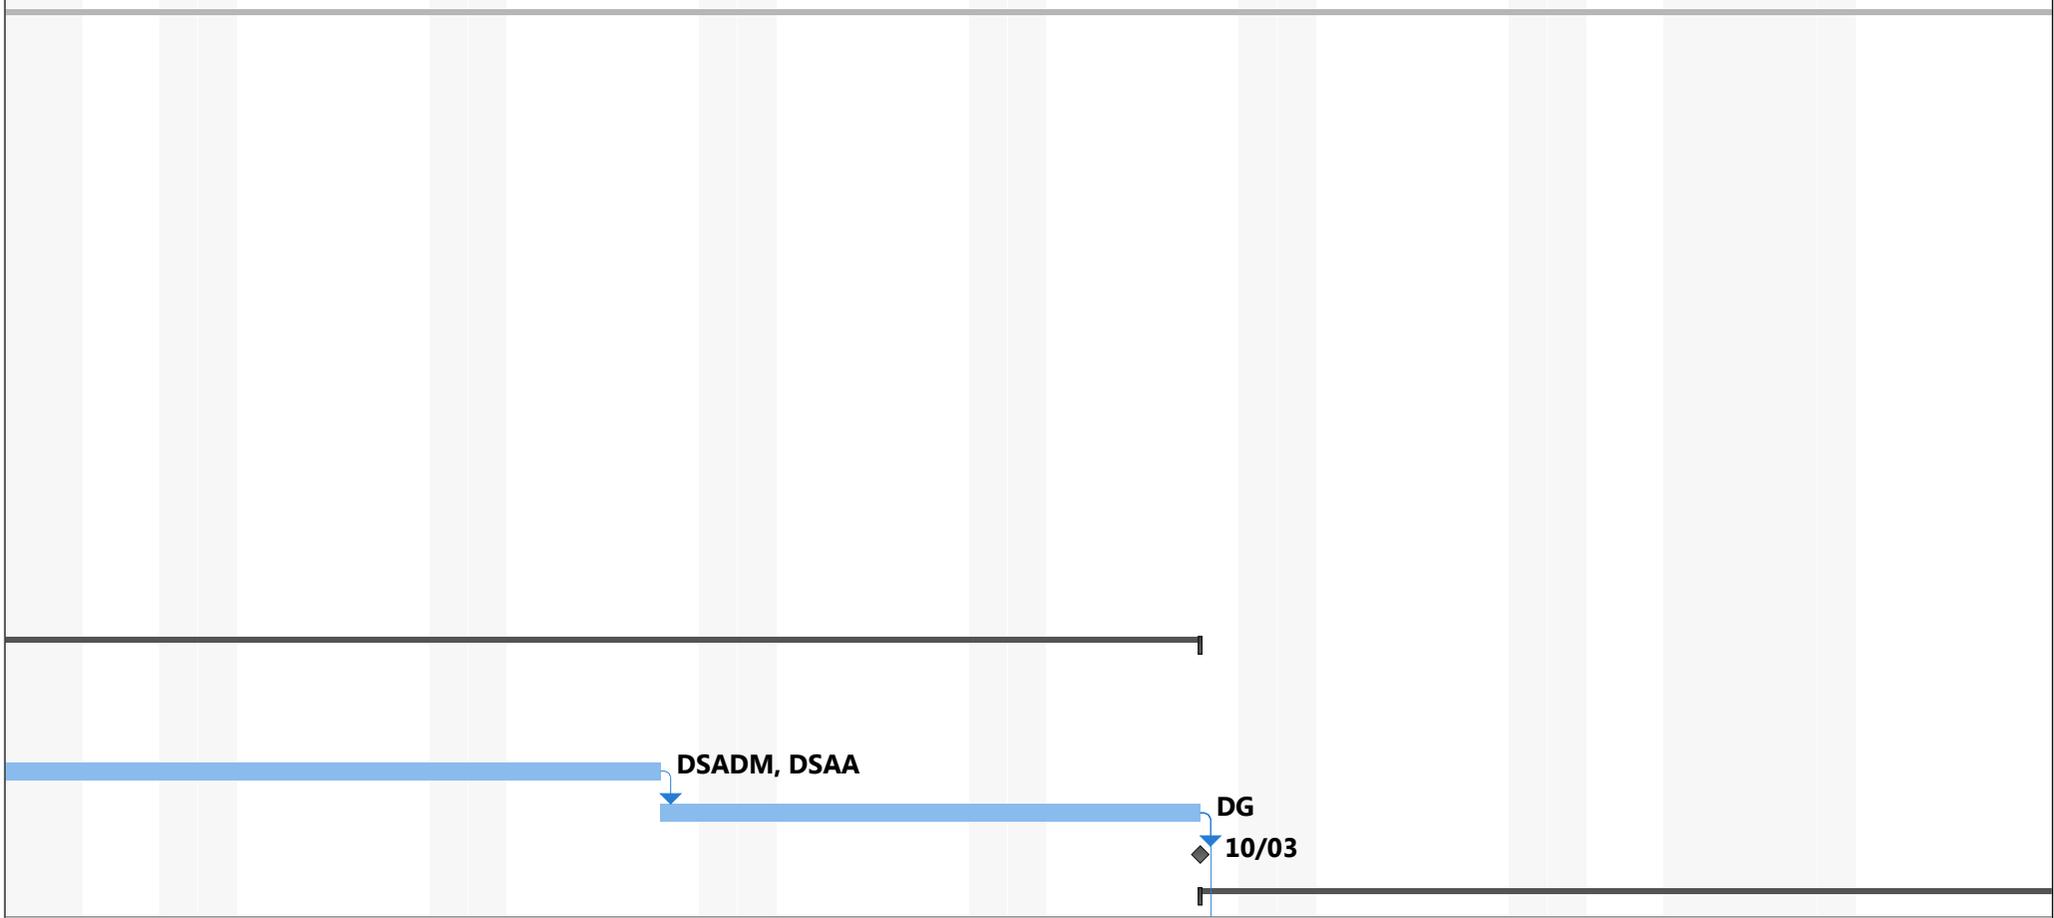


|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |

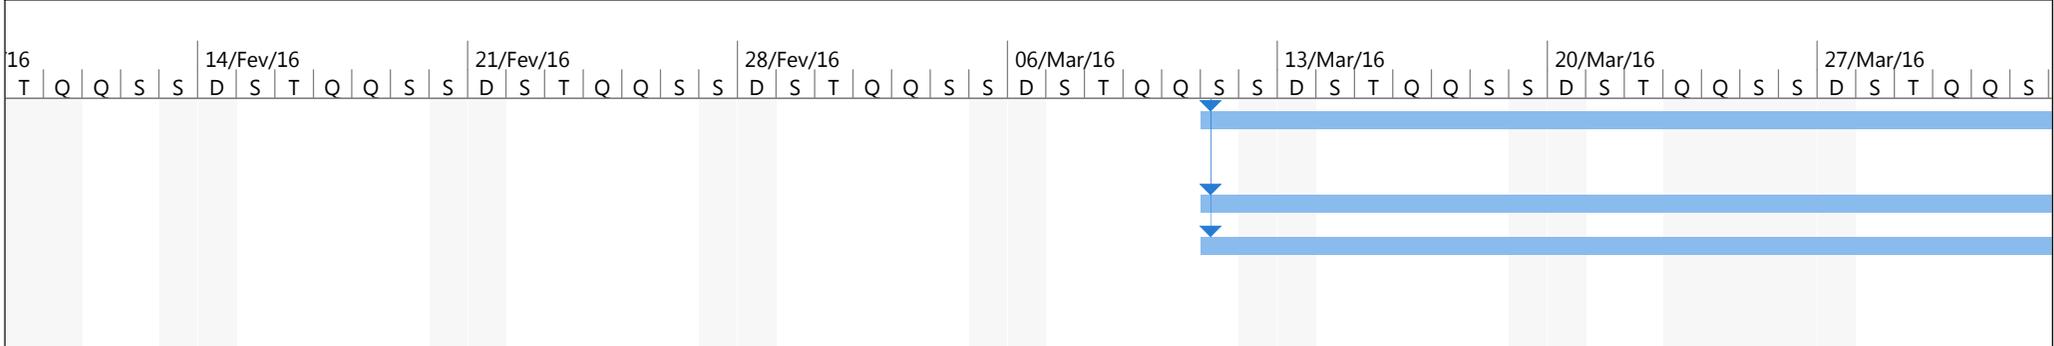

|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |

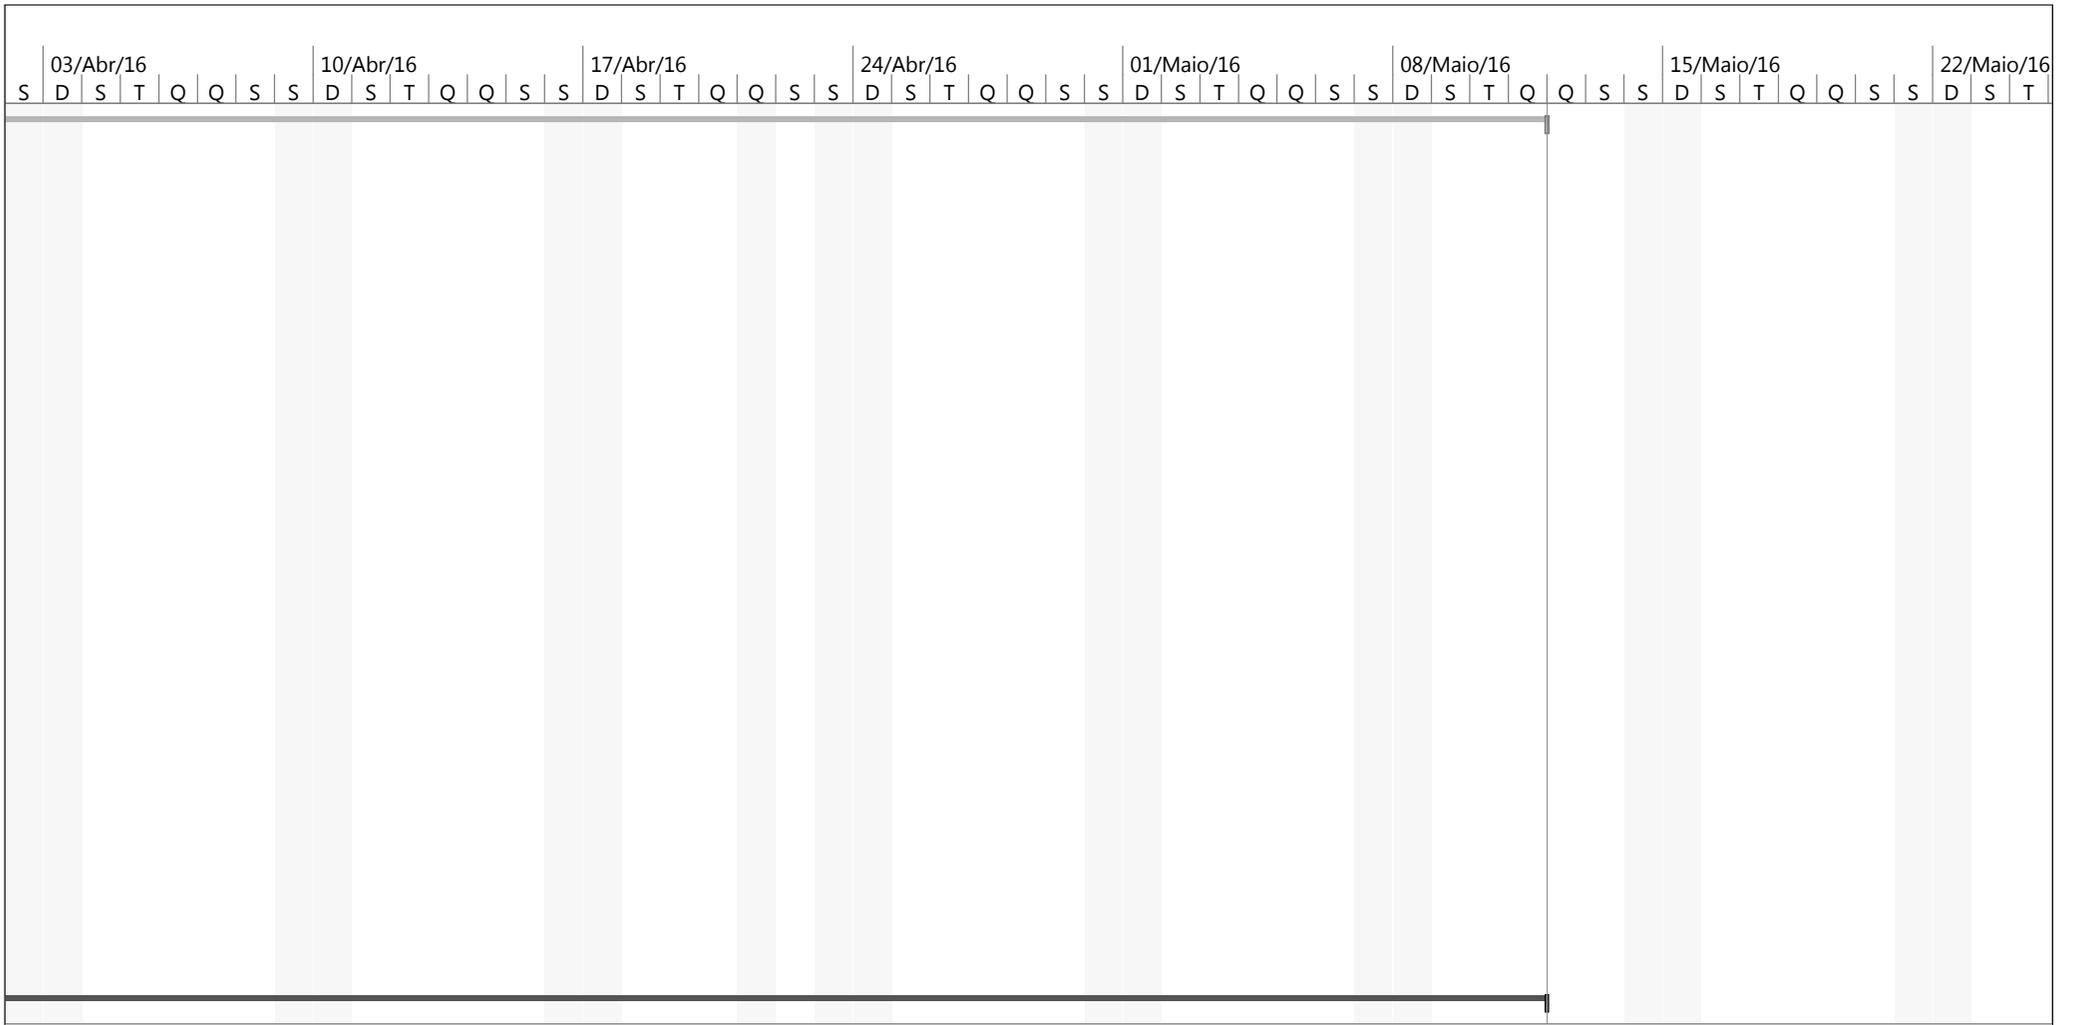

|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |

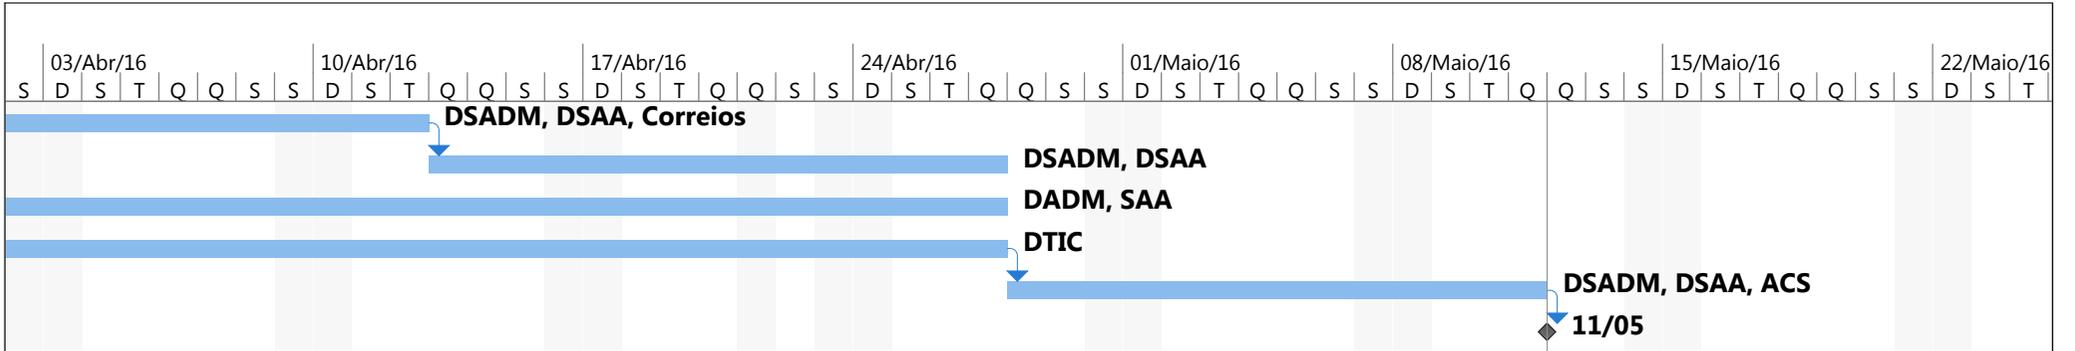

|   |                   |  |                          |  |                  |  |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Projeto: MENSAGERIA<br>Data: Ter 01/09/15 | Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
|   | Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
|   | Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
|   | Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
|   | Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
|   | Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
|   | Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |
