
































































Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
0			<b>0</b>	<b>SAÚDE EM MOVIMENTO</b>		<b>67%</b>	<b>280 dias?</b>	<b>Seg 15/06/15</b>	<b>Seg 01/08/16</b>
1			<b>1</b>	<b>Proposição</b>		<b>100%</b>	<b>32 dias</b>	<b>Seg 15/06/15</b>	<b>Ter 28/07/15</b>
2			1.1	Definir unidade para projeto piloto		100%	2 dias	Seg 15/06/15	Ter 16/06/15
3			1.2	Construir proposição e encaminhar à DG para		100%	15 dias	Qua 17/06/15	Ter 07/07/15
4			1.3	Aprovar proposição		100%	15 dias	Qua 08/07/15	Ter 28/07/15
5			<b>1.4</b>	<b>PROPOSIÇÃO APROVADA</b>		<b>100%</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 28/07/15</b>	<b>Ter 28/07/15</b>
6			<b>2</b>	<b>Licitação do projeto piloto</b>		<b>98%</b>	<b>166 dias?</b>	<b>Qua 29/07/15</b>	<b>Ter 05/04/16</b>
7			2.1	Definir as especificações do serviço de Ginástica		100%	5 dias	Qua 29/07/15	Ter 04/08/15
8			2.2	Levantar orçamentos no mercado		100%	5 dias	Qua 05/08/15	Ter 11/08/15
9			2.3	Construir Termo de Referência		100%	5 dias	Qua 12/08/15	Ter 18/08/15
10			2.4	Aprovar Termo de Referência		100%	75 dias	Qua 19/08/15	Seg 07/12/15
11			2.5	Produzir minuta de edital de licitação		100%	73 dias	Ter 08/12/15	Qui 31/03/16
12			2.6	Aprovar e publicar minuta de edital de licitação		0%	1 dia?	Sex 01/04/16	Sex 01/04/16
13			2.7	Realizar procedimento licitatório		0%	1 dia?	Seg 04/04/16	Seg 04/04/16
14			2.8	Homologar licitação		0%	1 dia?	Ter 05/04/16	Ter 05/04/16
15			<b>2.9</b>	<b>LICITAÇÃO HOMOLOGADA</b>		<b>0%</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 05/04/16</b>	<b>Ter 05/04/16</b>
16			<b>3</b>	<b>Implantação do piloto</b>		<b>0%</b>	<b>3 dias?</b>	<b>Qua 06/04/16</b>	<b>Sex 08/04/16</b>
17			3.1	Definir identidade visual e elaborar texto para ampla		0%	1 dia?	Qua 06/04/16	Qua 06/04/16
18			3.2	Definir cronograma de atividades com a empresa		0%	1 dia?	Qua 06/04/16	Qua 06/04/16
19			3.3	Lançar projeto		0%	1 dia?	Qui 07/04/16	Qui 07/04/16
20			3.4	Iniciar a aplicação da ginástica laboral		0%	1 dia?	Sex 08/04/16	Sex 08/04/16
21			<b>3.5</b>	<b>PILOTO IMPLANTADO</b>		<b>0%</b>	<b>0 dias</b>	<b>Sex 08/04/16</b>	<b>Sex 08/04/16</b>














































Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
22			<b>4</b>	<b>Acompanhamento do projeto piloto</b>		<b>0%</b>	<b>5 dias?</b>	<b>Seg 11/04/16</b>	<b>Sex 15/04/16</b>
23			4.1	Definir formulário de avaliação dos participantes		0%	1 dia?	Seg 11/04/16	Seg 11/04/16
24			4.2	Aplicar formulários de avaliação		0%	1 dia?	Ter 12/04/16	Ter 12/04/16
25			4.3	Gerenciar a avaliação e a reavaliação dos participantes		0%	1 dia?	Qua 13/04/16	Qua 13/04/16
26			4.4	Avaliar impacto		0%	1 dia?	Seg 11/04/16	Seg 11/04/16
27			<b>4.5</b>	<b>Reunir periodicamente com a empresa contratada</b>		<b>0%</b>	<b>4 dias?</b>	<b>Ter 12/04/16</b>	<b>Sex 15/04/16</b>
28			4.5.1	Reunião1		0%	1 dia?	Ter 12/04/16	Ter 12/04/16
29			4.5.2	Reunião 2		0%	1 dia?	Qua 13/04/16	Qua 13/04/16
30			4.5.3	Reunião 3		0%	1 dia?	Qui 14/04/16	Qui 14/04/16
31			4.5.4	Reunião 4		0%	1 dia?	Sex 15/04/16	Sex 15/04/16
32			<b>4.6</b>	<b>ACOMPANHAMENTO REALIZADO</b>		<b>0%</b>	<b>0 dias</b>	<b>Sex 15/04/16</b>	<b>Sex 15/04/16</b>
33			<b>5</b>	<b>Extensão do programa a todo o Regional</b>		<b>0%</b>	<b>3 dias?</b>	<b>Seg 18/04/16</b>	<b>Qua 20/04/16</b>
34			5.1	Construir proposição e encaminhar à DG para		0%	1 dia?	Seg 18/04/16	Seg 18/04/16
35			5.2	Aprovar proposição		0%	1 dia?	Ter 19/04/16	Ter 19/04/16
36			<b>5.3</b>	<b>PROPOSIÇÃO APROVADA</b>		<b>0%</b>	<b>1 dia?</b>	<b>Qua 20/04/16</b>	<b>Qua 20/04/16</b>
37			<b>6</b>	<b>Licitação da extensão do projeto</b>		<b>0%</b>	<b>63 dias?</b>	<b>Sex 22/04/16</b>	<b>Qua 20/07/16</b>
38			6.1	Definir as especificações do serviço de Ginástica		0%	5 dias	Sex 22/04/16	Qui 28/04/16
39			6.2	Levantar orçamentos no mercado		0%	5 dias	Sex 29/04/16	Qui 05/05/16
40			6.3	Construir Termo de Referência		0%	5 dias	Sex 06/05/16	Qui 12/05/16
41			6.4	Aprovar Termo de Referência		0%	30 dias	Sex 13/05/16	Sex 24/06/16
42			6.5	Produzir minuta de edital de licitação		0%	15 dias	Seg 27/06/16	Sex 15/07/16
43			6.6	Aprovar e publicar minuta de edital de licitação		0%	1 dia?	Seg 18/07/16	Seg 18/07/16

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
44			6.7	Realizar procedimento licitatório		0%	1 dia?	Ter 19/07/16	Ter 19/07/16
45			6.8	Homologar licitação		0%	1 dia?	Qua 20/07/16	Qua 20/07/16
46			6.9	LICITAÇÃO HOMOLOGADA		0%	0 dias	Qua 20/07/16	Qua 20/07/16
47			7	<b>Implantação da extensão do projeto</b>		0%	2 dias?	<b>Qui 21/07/16</b>	<b>Sex 22/07/16</b>
48			7.1	Definir cronograma de atividades com a empresa		0%	1 dia?	Qui 21/07/16	Qui 21/07/16
49			7.2	Lançar projeto		0%	1 dia?	Qui 21/07/16	Qui 21/07/16
50			7.3	Iniciar a aplicação da ginástica laboral		0%	1 dia?	Sex 22/07/16	Sex 22/07/16
51			7.4	EXTENSÃO IMPLANTADA		0%	0 dias	Sex 22/07/16	Sex 22/07/16
52			8	<b>Acompanhamento da extensão do projeto</b>		0%	4 dias?	<b>Seg 25/07/16</b>	<b>Qui 28/07/16</b>
53			8.1	Aplicar formulários de avaliação		0%	1 dia?	Seg 25/07/16	Seg 25/07/16
54			8.2	Gerenciar a avaliação e a reavaliação dos participantes		0%	1 dia?	Ter 26/07/16	Ter 26/07/16
55			8.3	Avaliar impacto		0%	1 dia?	Qua 27/07/16	Qua 27/07/16
56			8.4	<b>Reunir periodicamente com a empresa contratada</b>		0%	4 dias?	<b>Seg 25/07/16</b>	<b>Qui 28/07/16</b>
57			8.4.1	Reunião1		0%	1 dia?	Seg 25/07/16	Seg 25/07/16
58			8.4.2	Reunião 2		0%	1 dia?	Ter 26/07/16	Ter 26/07/16
59			8.4.3	Reunião 3		0%	1 dia?	Qua 27/07/16	Qua 27/07/16
60			8.4.4	Reunião 4		0%	1 dia?	Qui 28/07/16	Qui 28/07/16
61			8.5	ACOMPANHAMENTO REALIZADO		0%	0 dias	Qui 28/07/16	Qui 28/07/16
62			9	<b>Avaliação do impacto do projeto</b>		0%	2 dias?	<b>Sex 29/07/16</b>	<b>Seg 01/08/16</b>
63			9.1	Aplicar questionário de satisfação		0%	1 dia?	Sex 29/07/16	Sex 29/07/16
64			9.2	Avaliar impacto no absentéismo		0%	1 dia?	Sex 29/07/16	Sex 29/07/16
65			9.3	AVALIAÇÃO DE IMPACTO CONCLUÍDA		0%	1 dia?	Seg 01/08/16	Seg 01/08/16



















Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			





















Predecessoras	Nomes dos recursos	01/Mar/15				08/Mar/15				15/Mar/15				22/Mar/15				29/Mar/15				05/Abr/15				12/Abr/15				
		D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
21																														
21																														
23																														
24																														
23																														
28																														
29																														
30																														
26;27																														
32																														
34																														
35																														
36																														
36																														
38																														
39																														
40																														
41																														
42																														


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Predecessoras	Nomes dos recursos	01/Mar/15		08/Mar/15		15/Mar/15		22/Mar/15		29/Mar/15		05/Abr/15		12/Abr/15																				
		D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
43																																		
44																																		
45																																		
46																																		
46																																		
49																																		
50																																		
51																																		
51																																		
53																																		
54																																		
57																																		
58																																		
59																																		
55;56																																		
61																																		
61																																		
63;64																																		


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

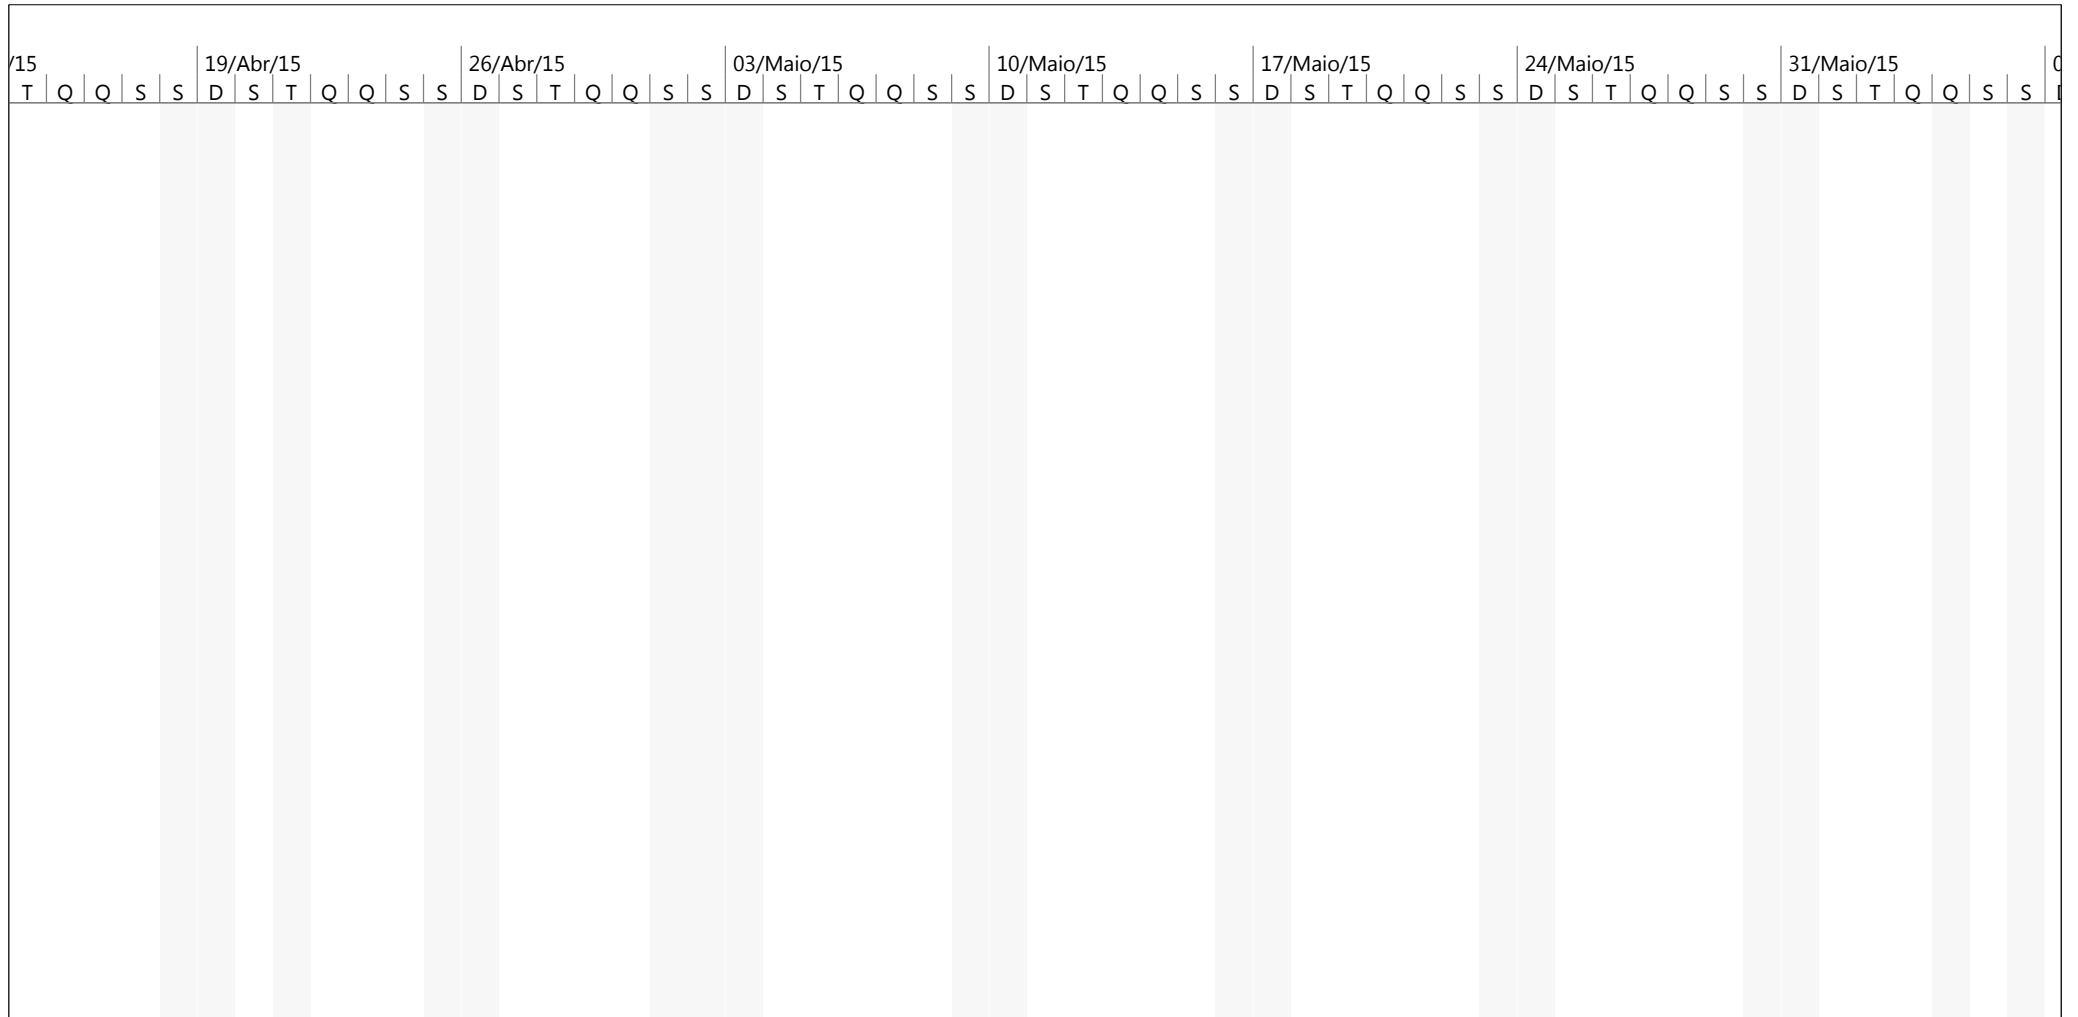

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			






Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


07/Jun/15 14/Jun/15 21/Jun/15 28/Jun/15 05/Jul/15 12/Jul/15 19/Jul/15 26/Jul/15

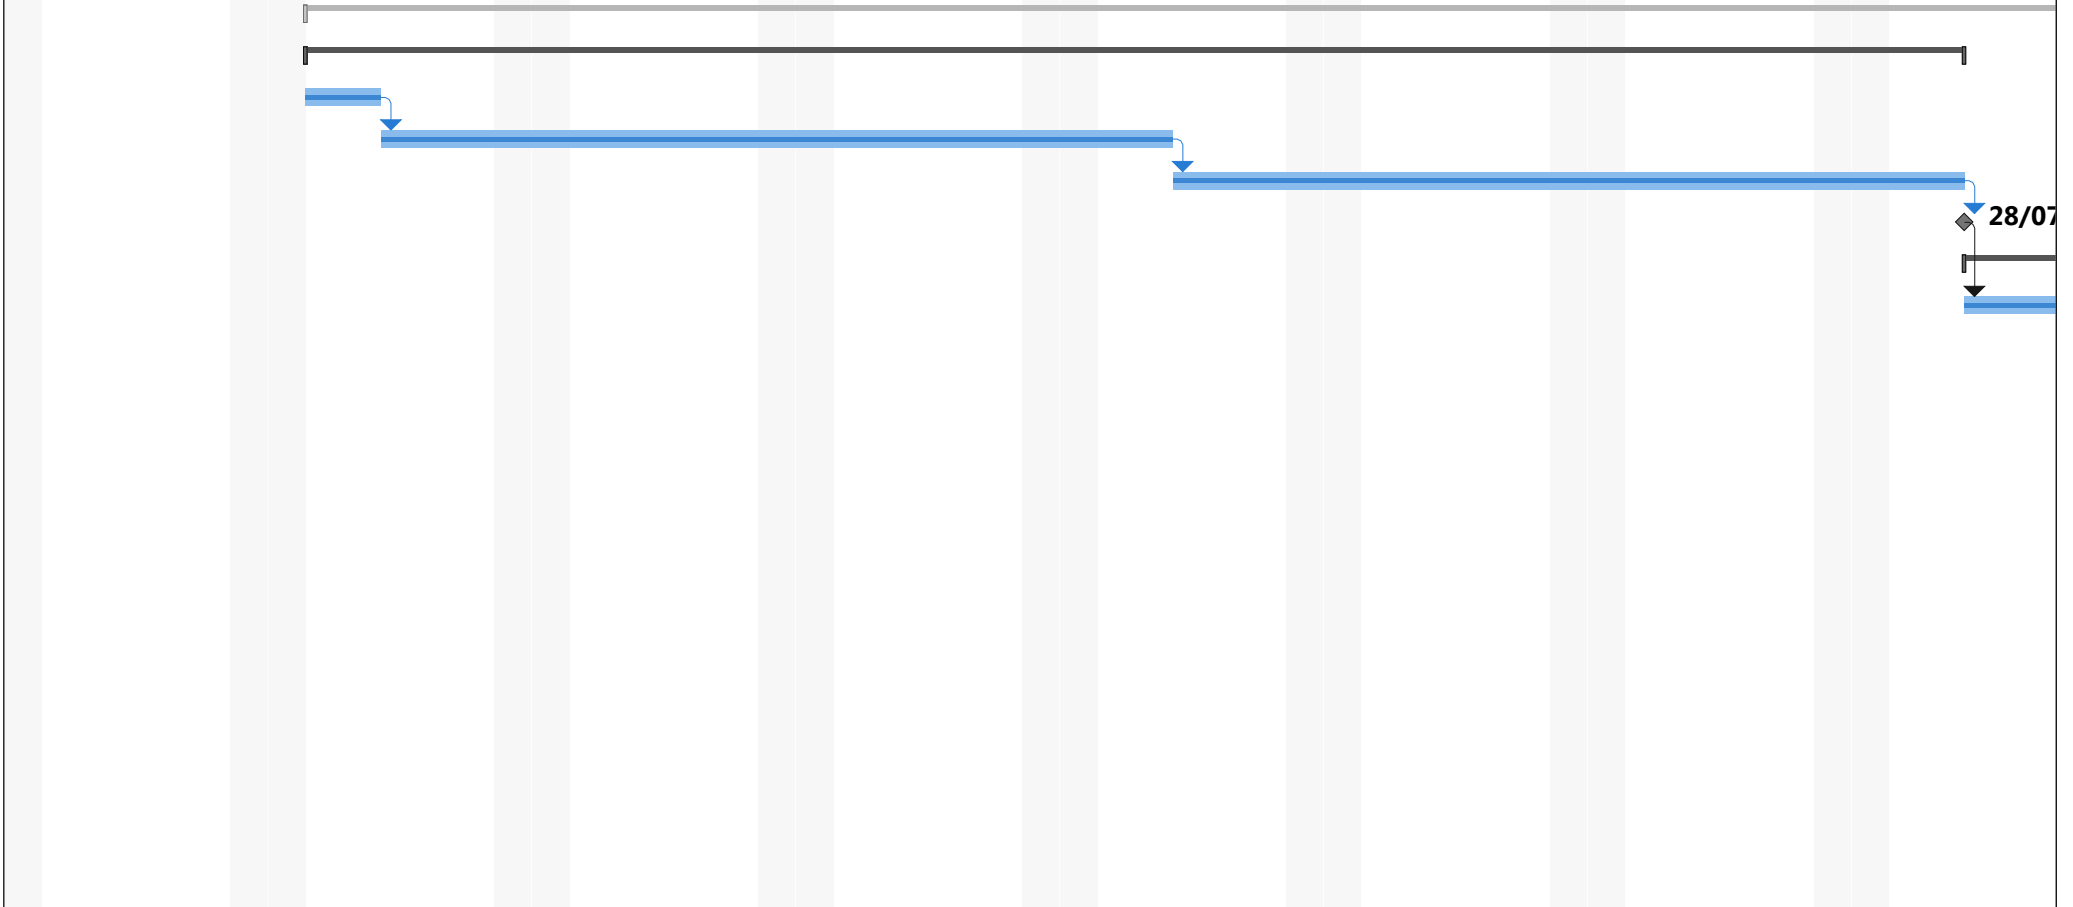







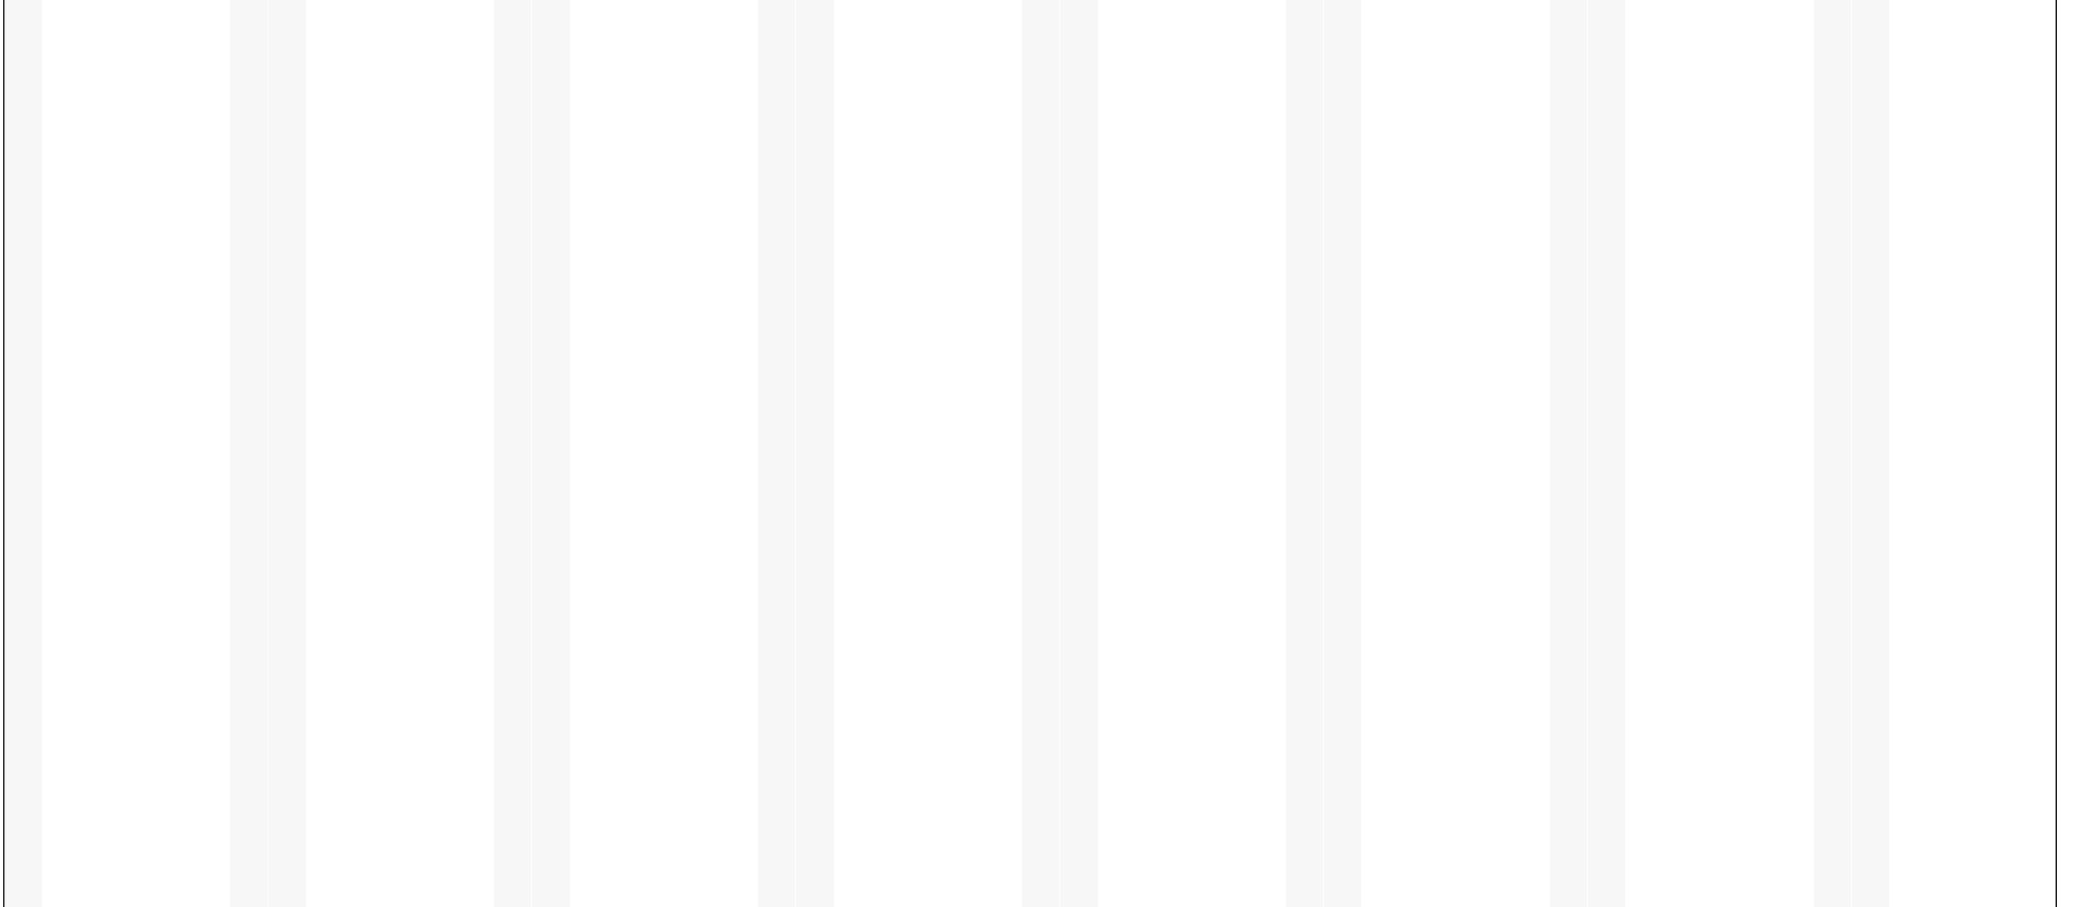











Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


07/Jun/15 14/Jun/15 21/Jun/15 28/Jun/15 05/Jul/15 12/Jul/15 19/Jul/15 26/Jul/15  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S



Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

07/Jun/15 14/Jun/15 21/Jun/15 28/Jun/15 05/Jul/15 12/Jul/15 19/Jul/15 26/Jul/15  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

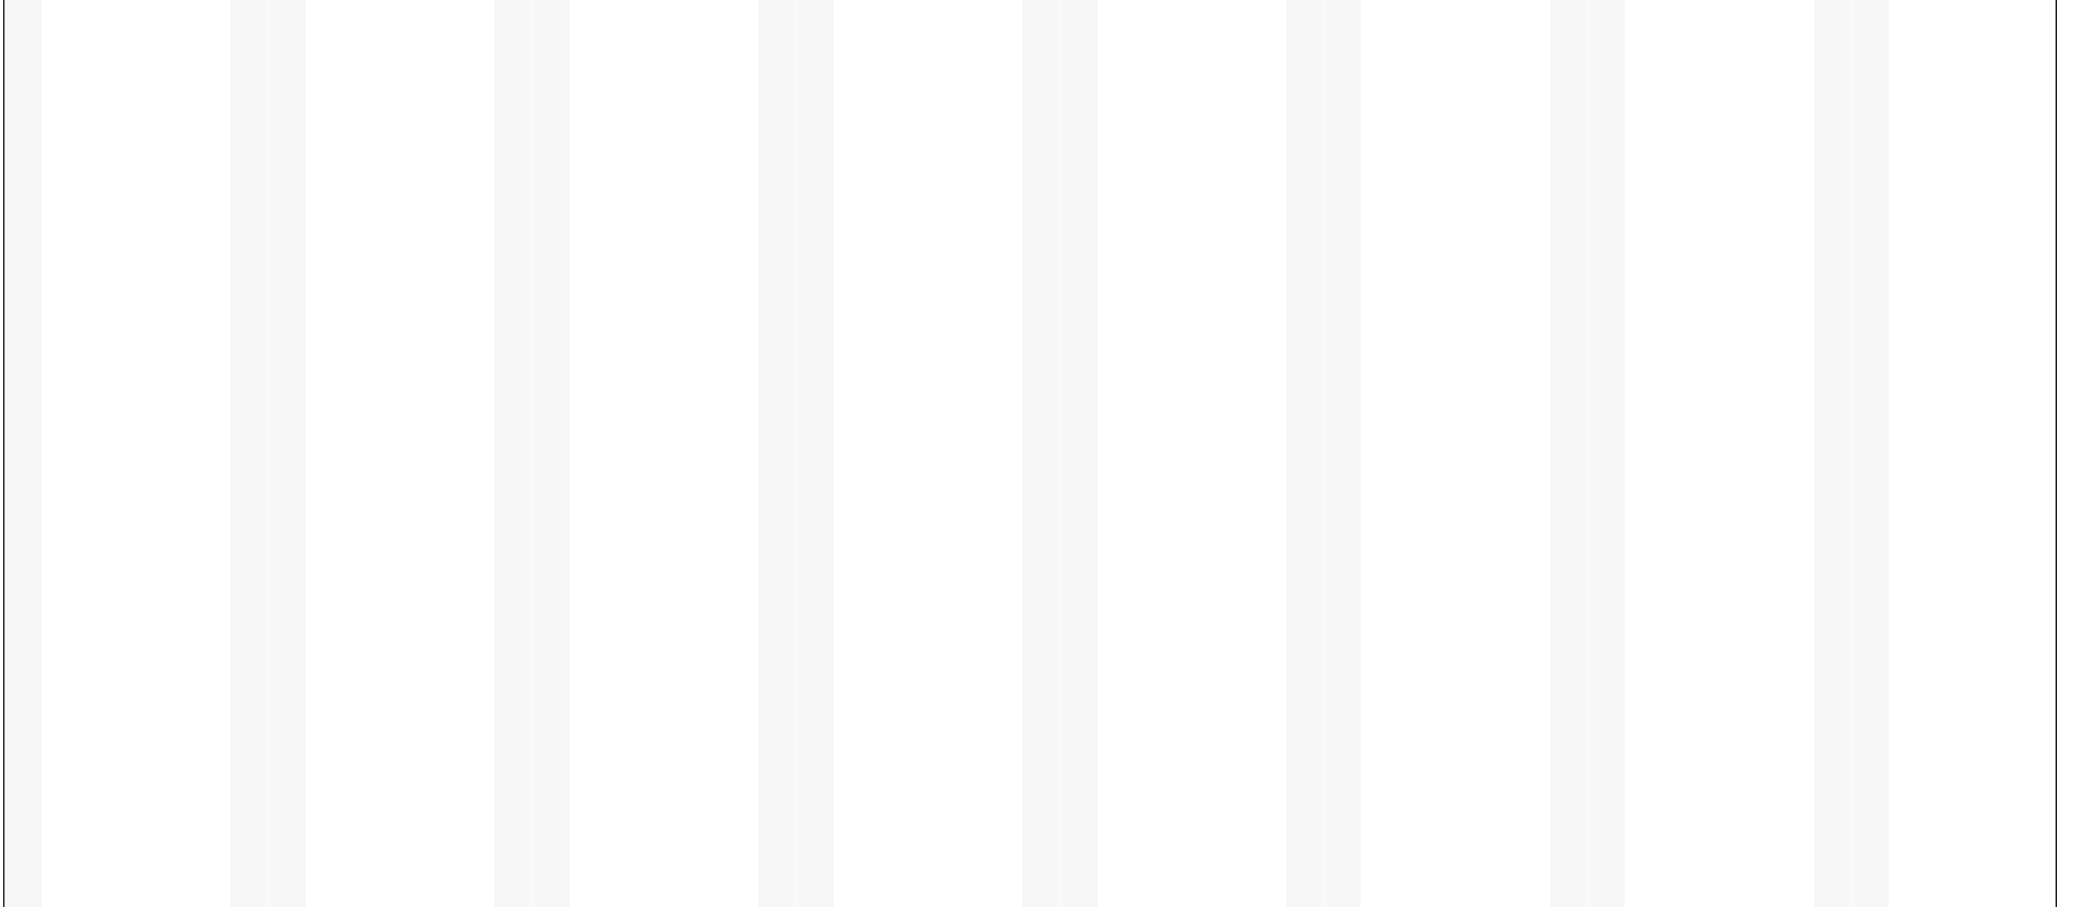

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

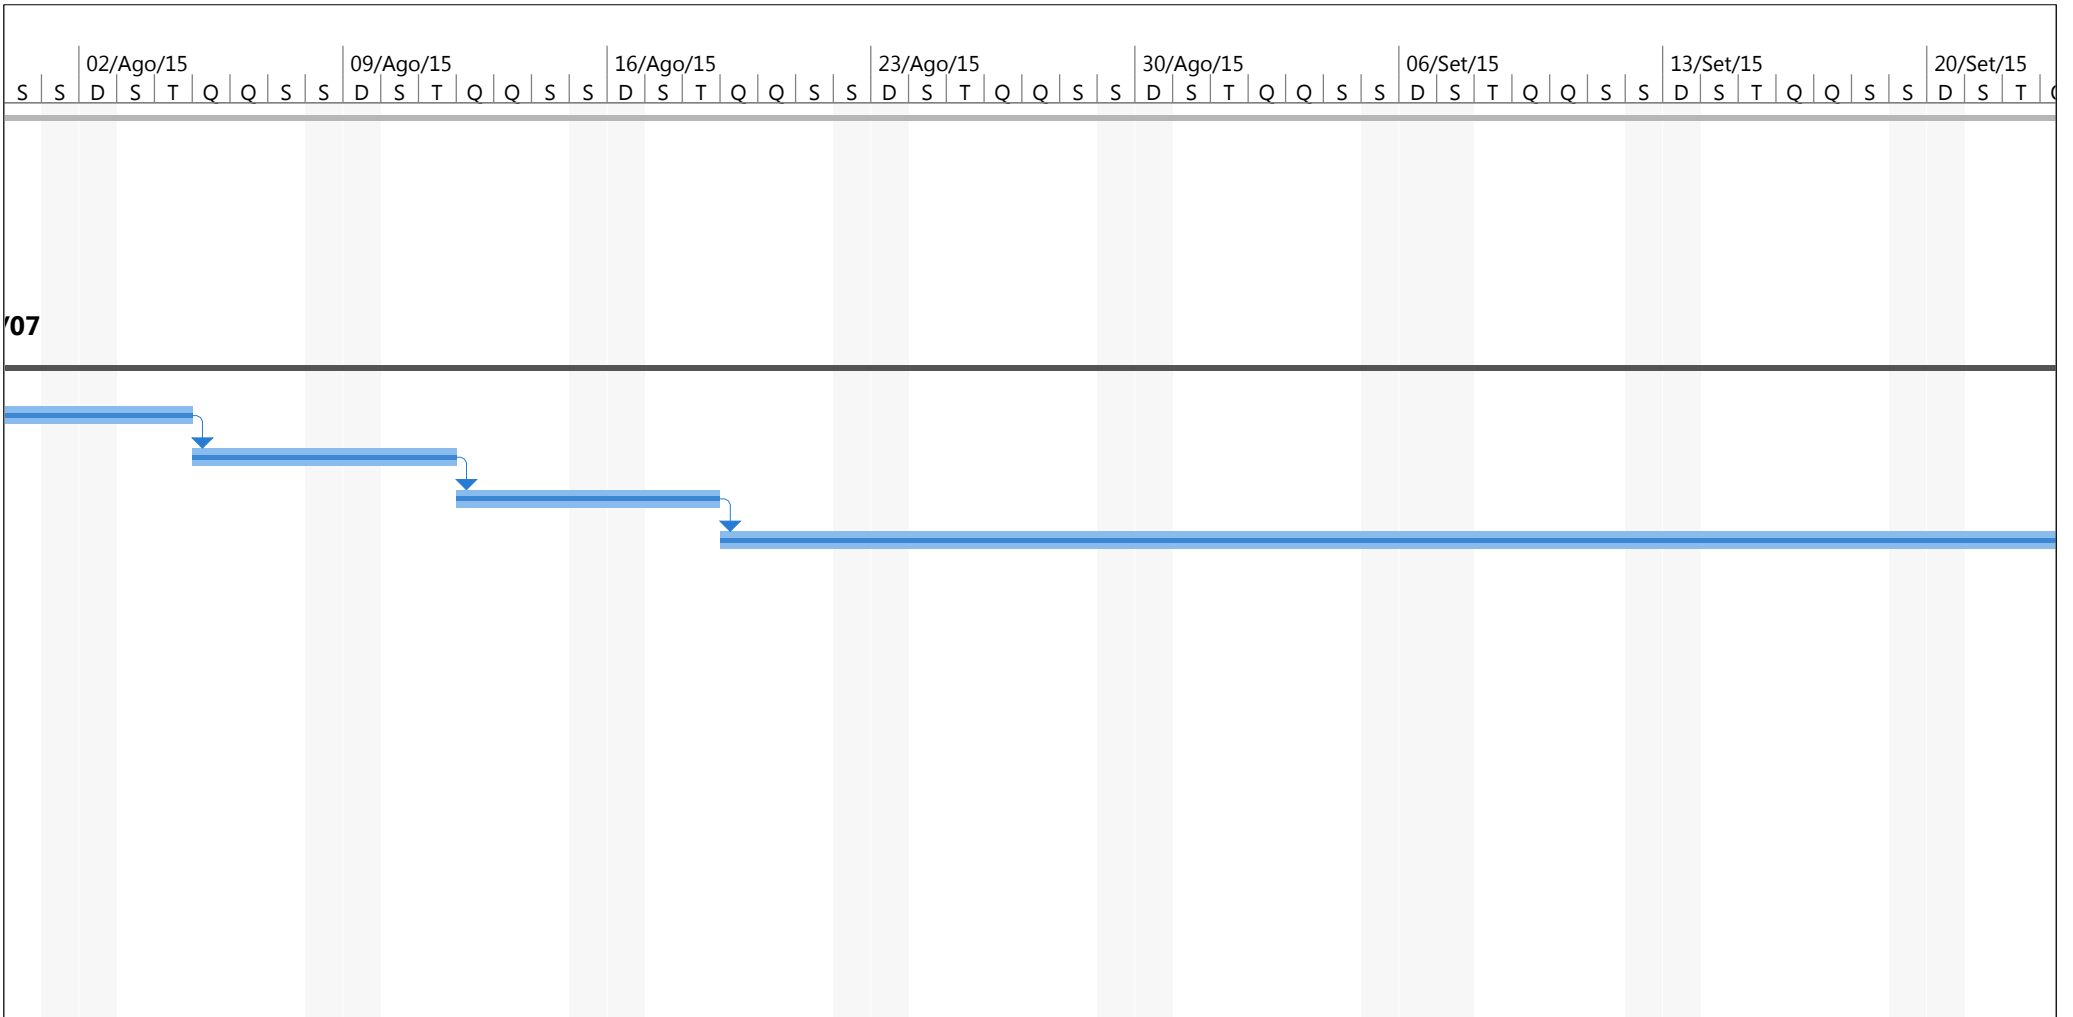

07

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

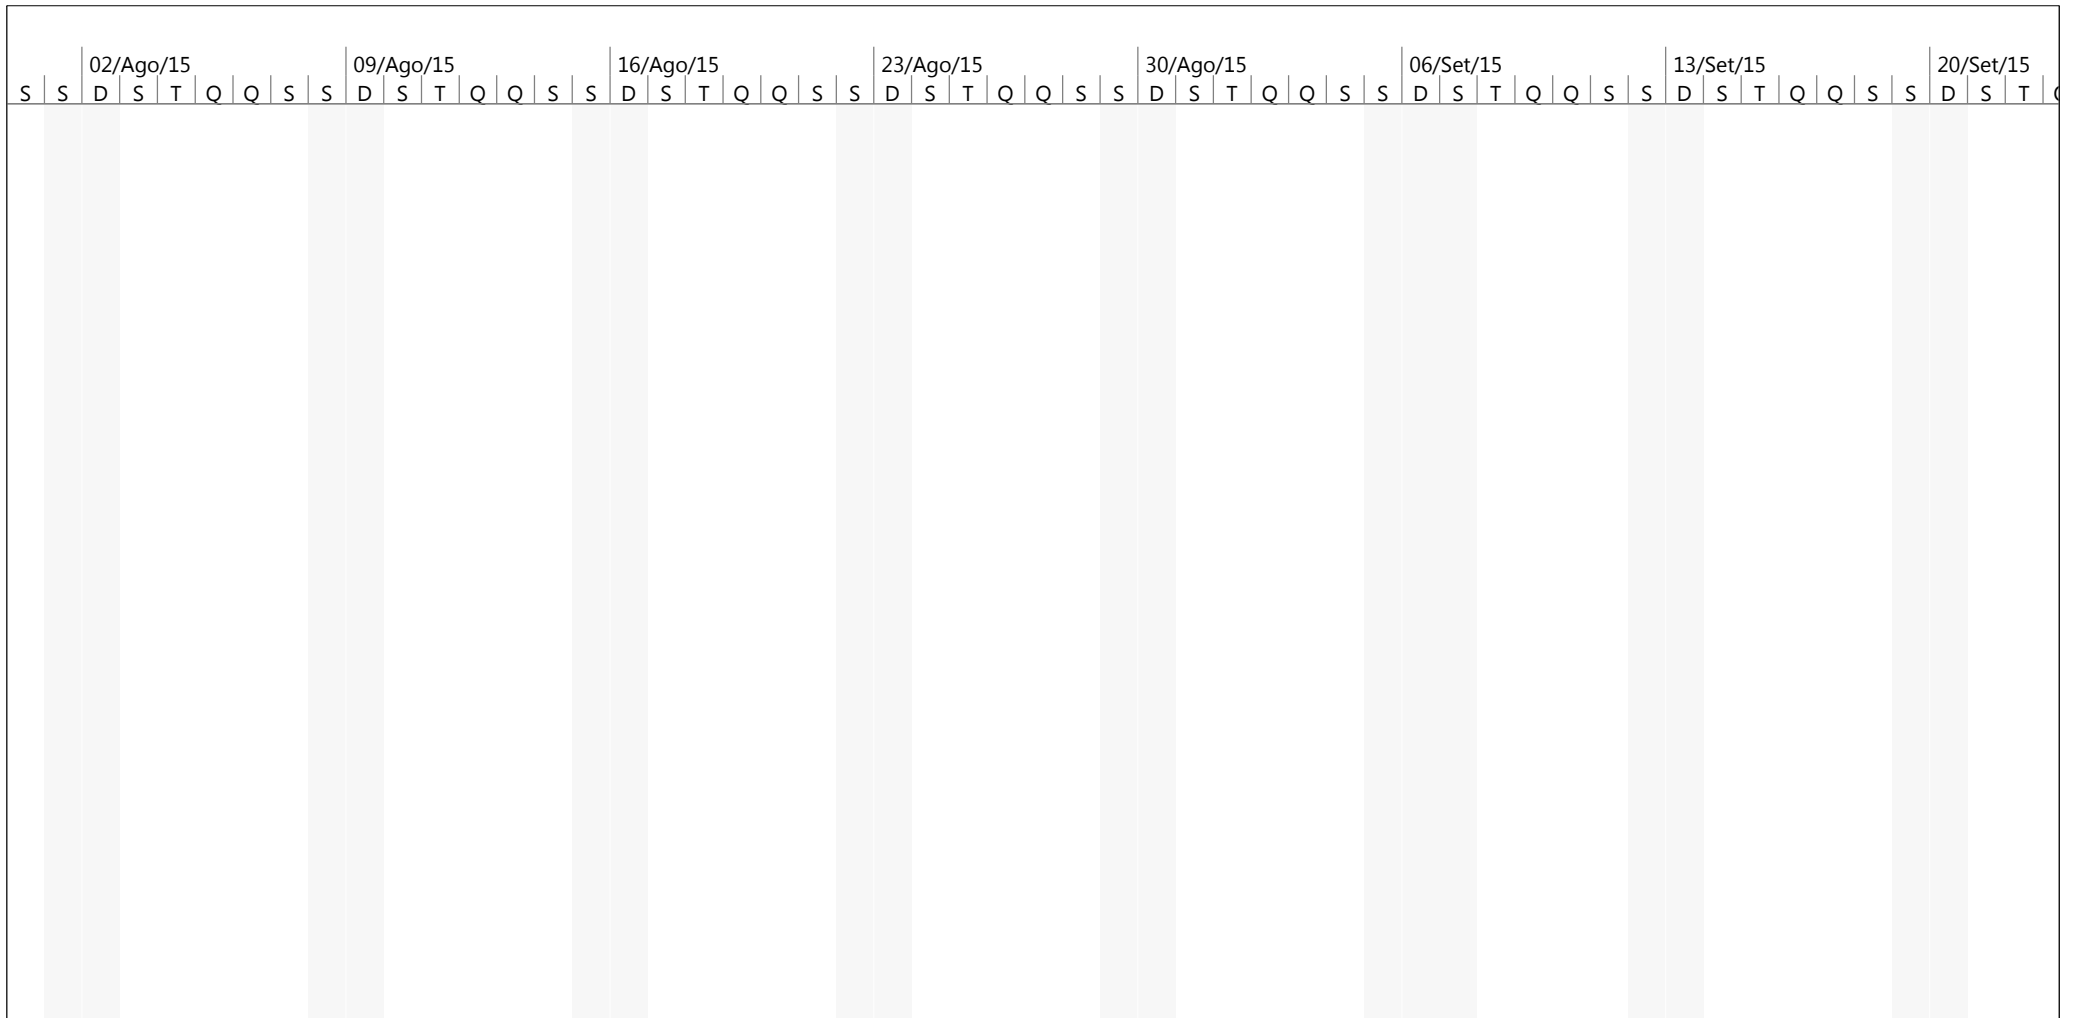


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			








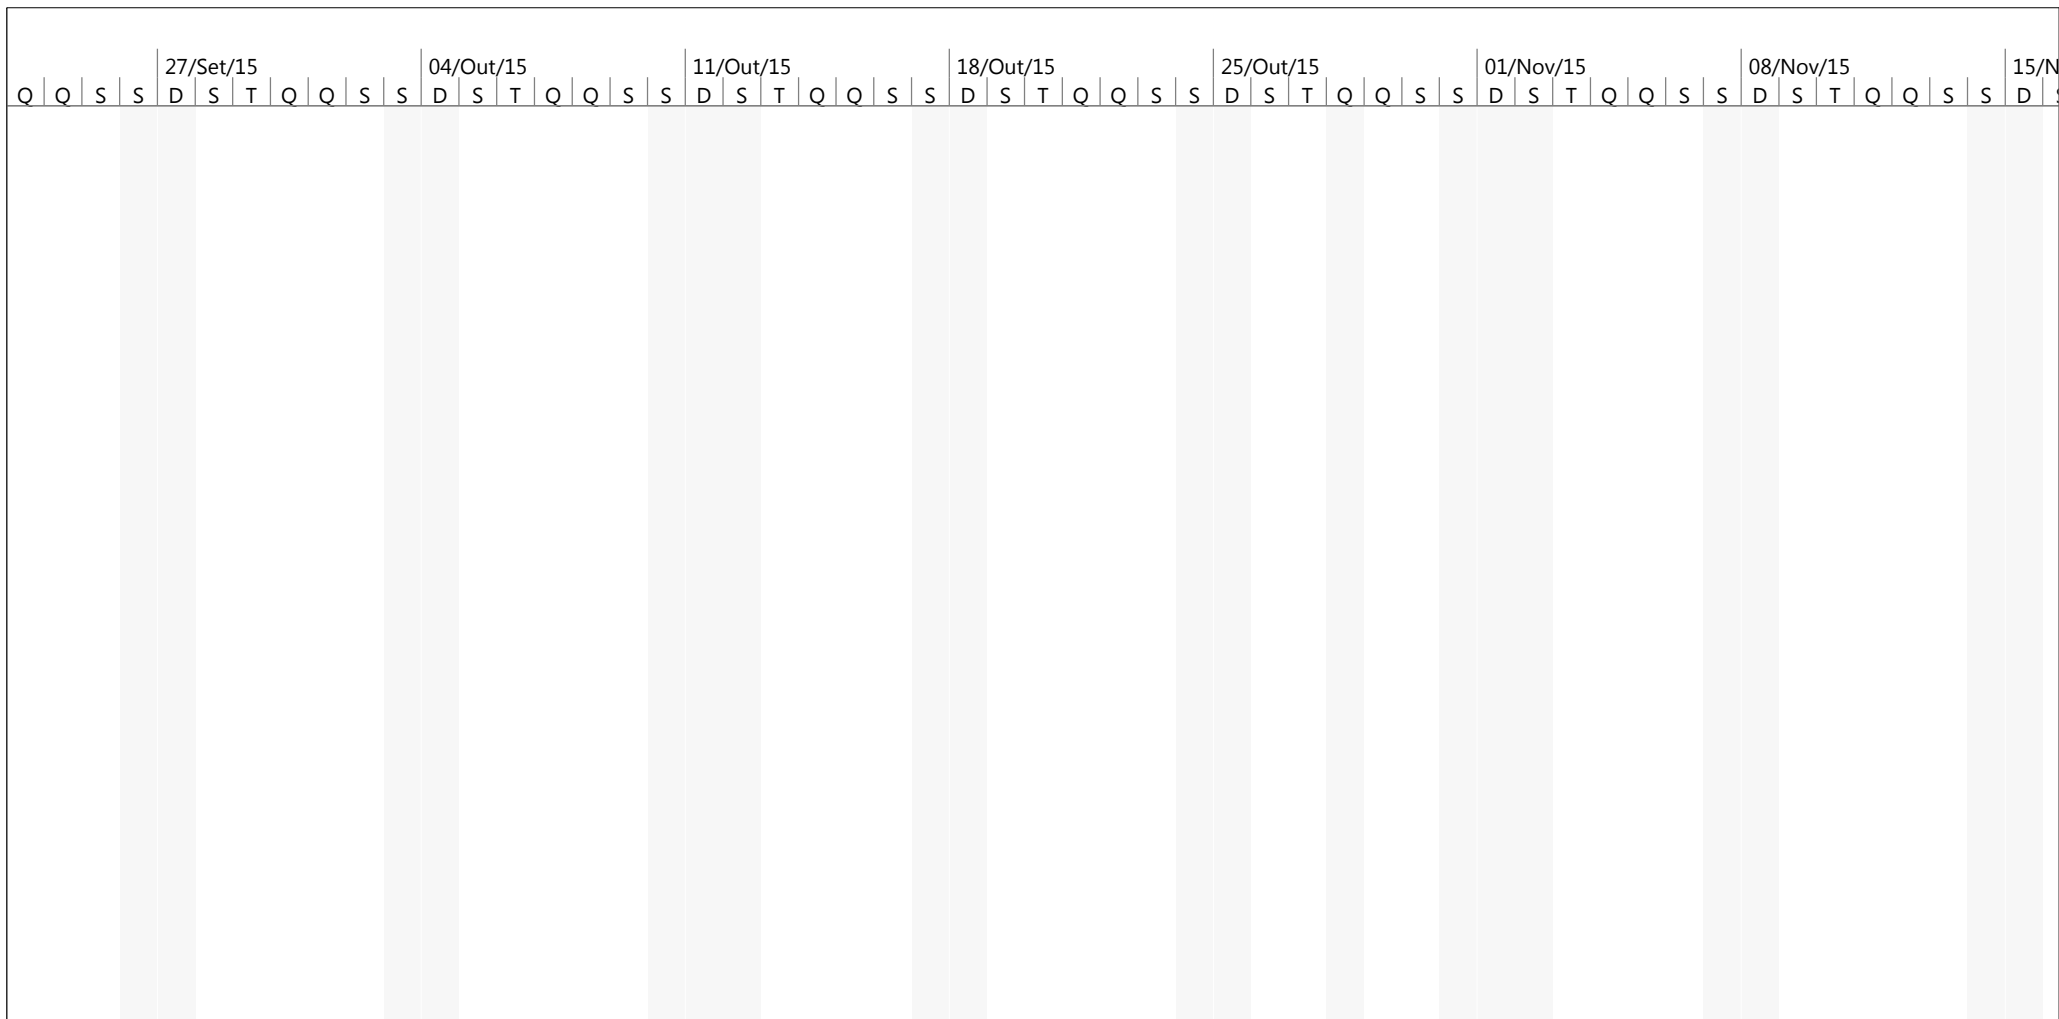


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

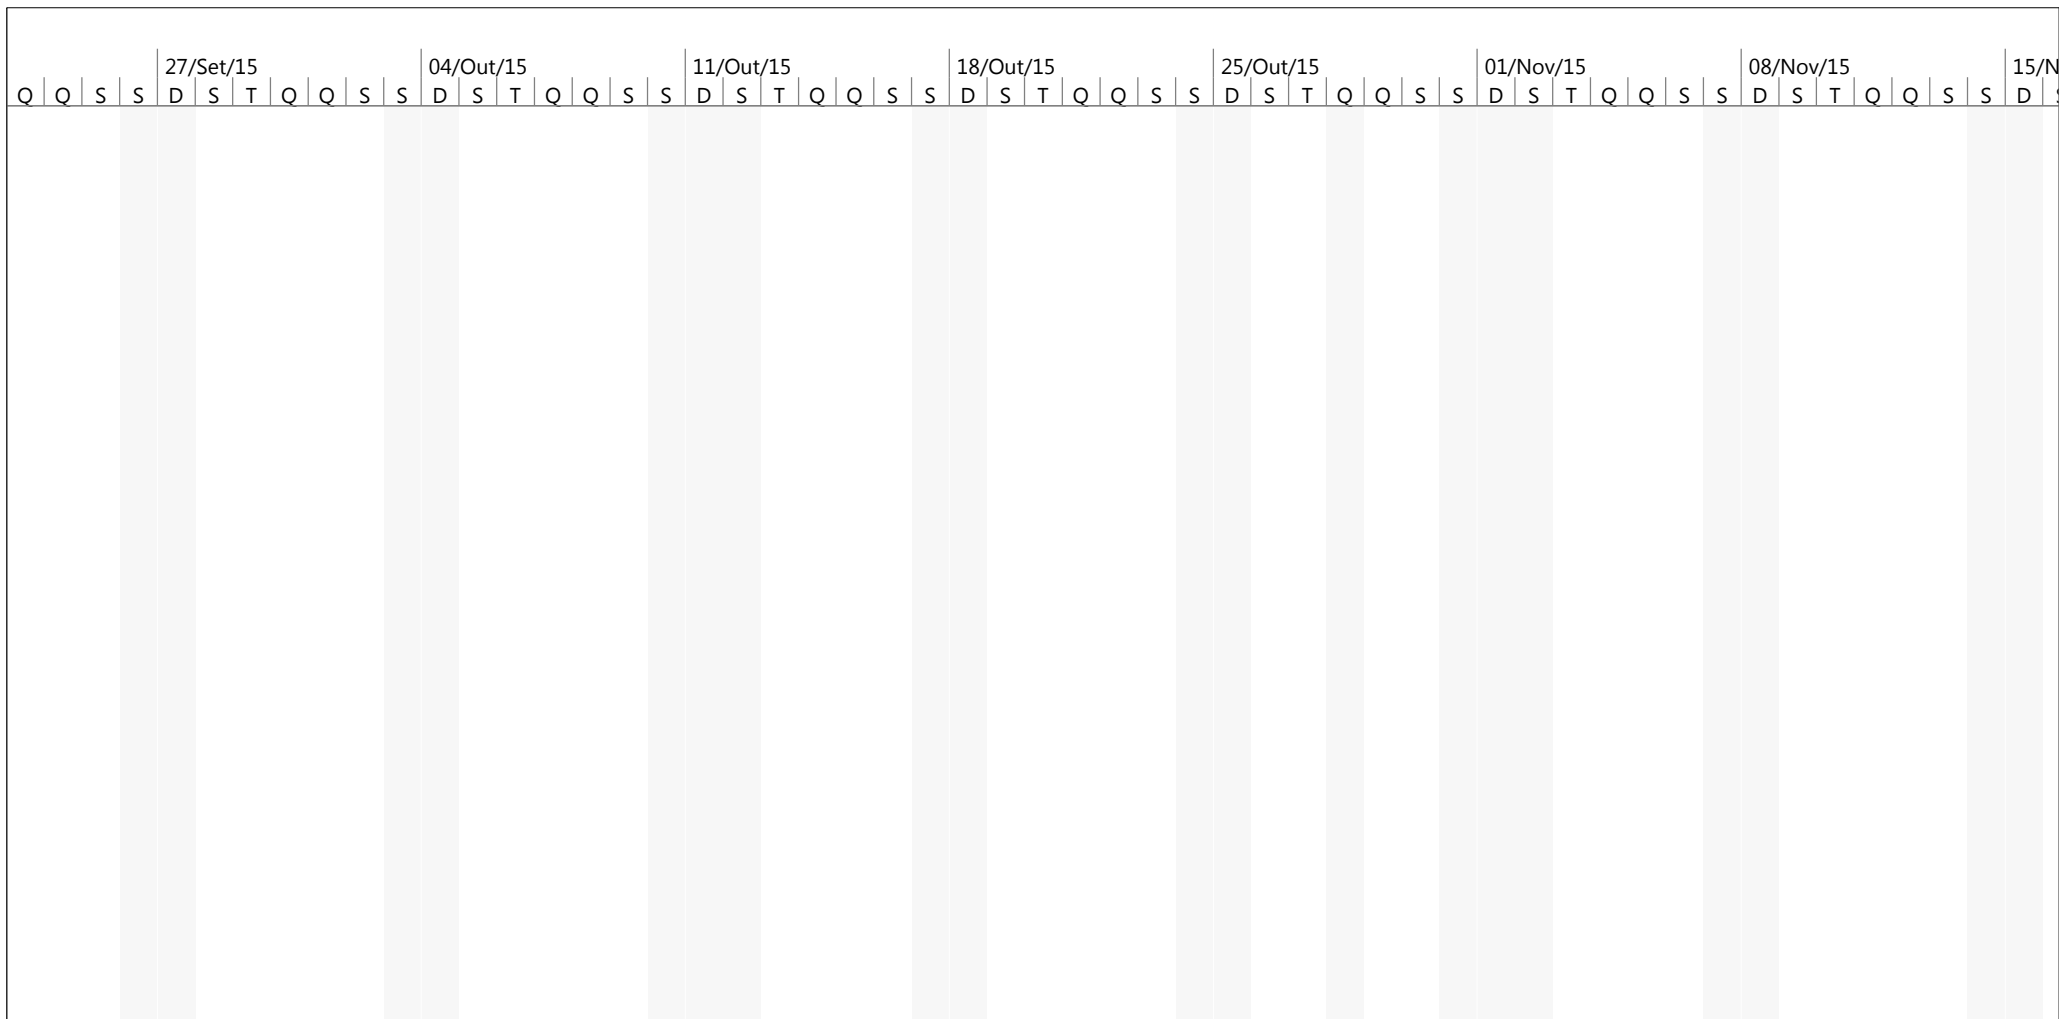

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Nov/15      22/Nov/15      29/Nov/15      06/Dez/15      13/Dez/15      20/Dez/15      27/Dez/15      03/Jan/16

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

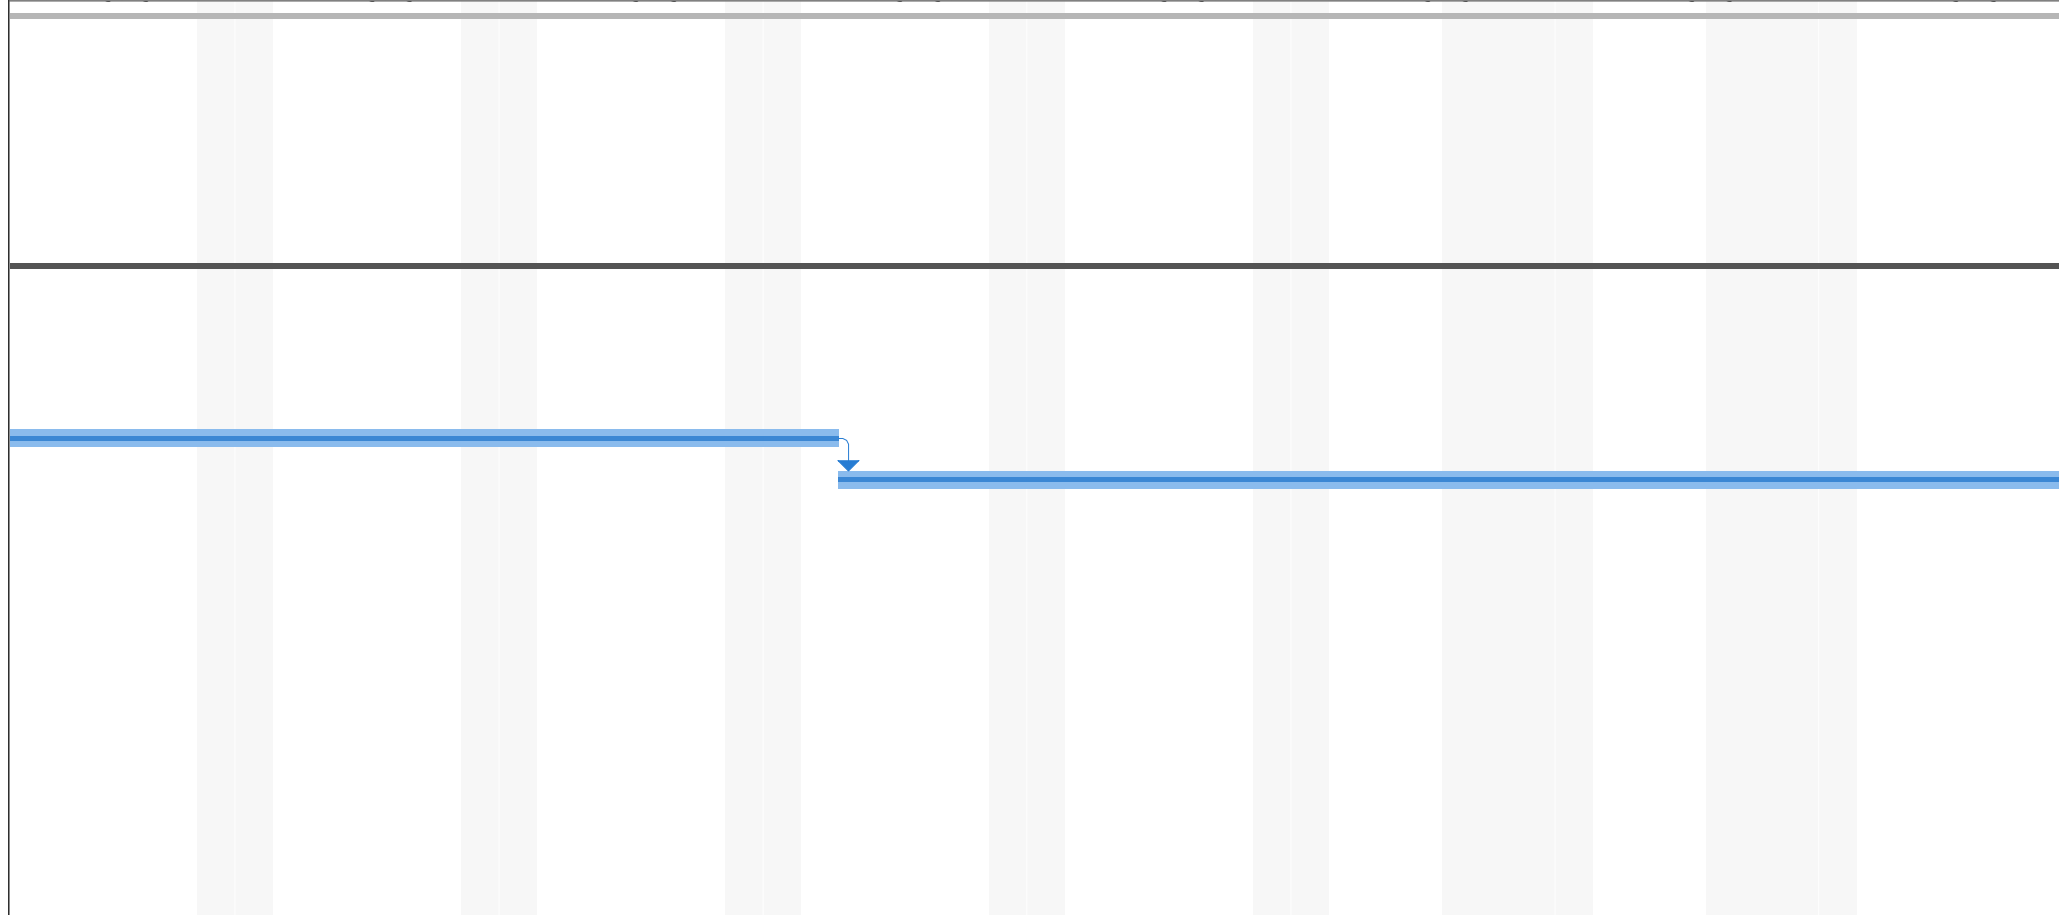


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Nov/15      22/Nov/15      29/Nov/15      06/Dez/15      13/Dez/15      20/Dez/15      27/Dez/15      03/Jan/16

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

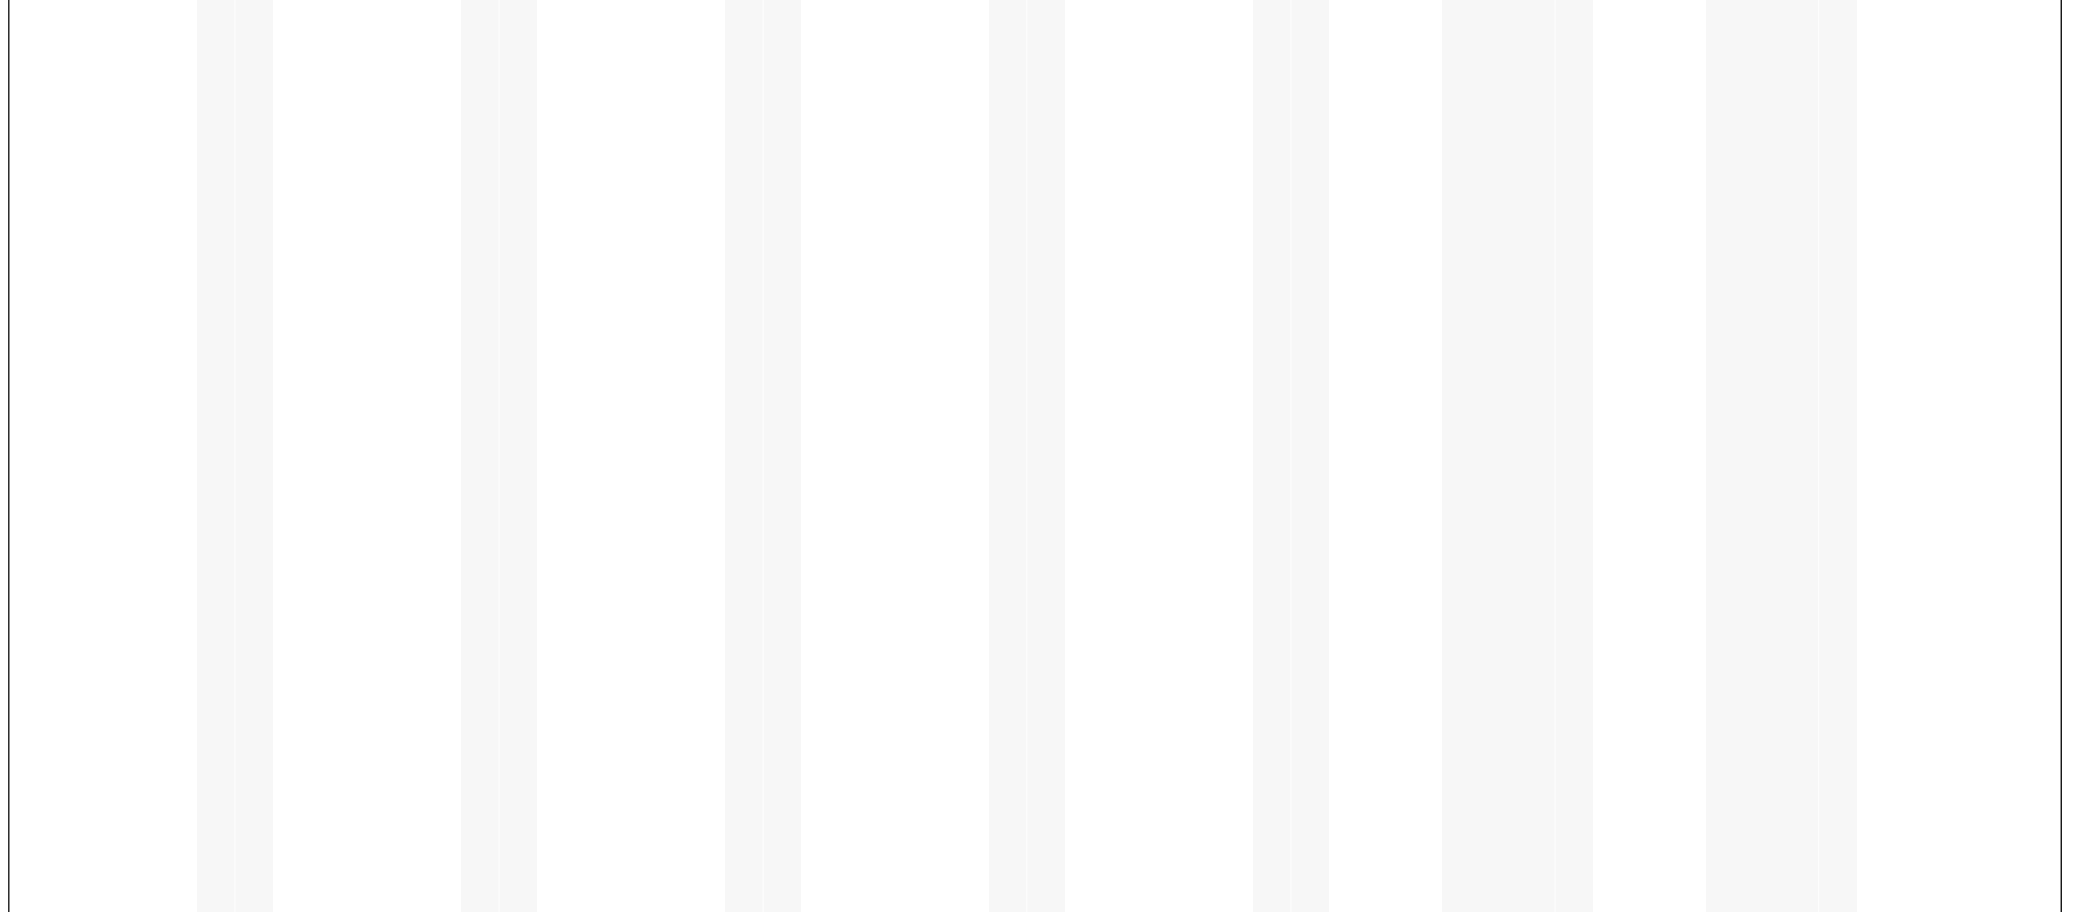


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Nov/15      22/Nov/15      29/Nov/15      06/Dez/15      13/Dez/15      20/Dez/15      27/Dez/15      03/Jan/16

S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S

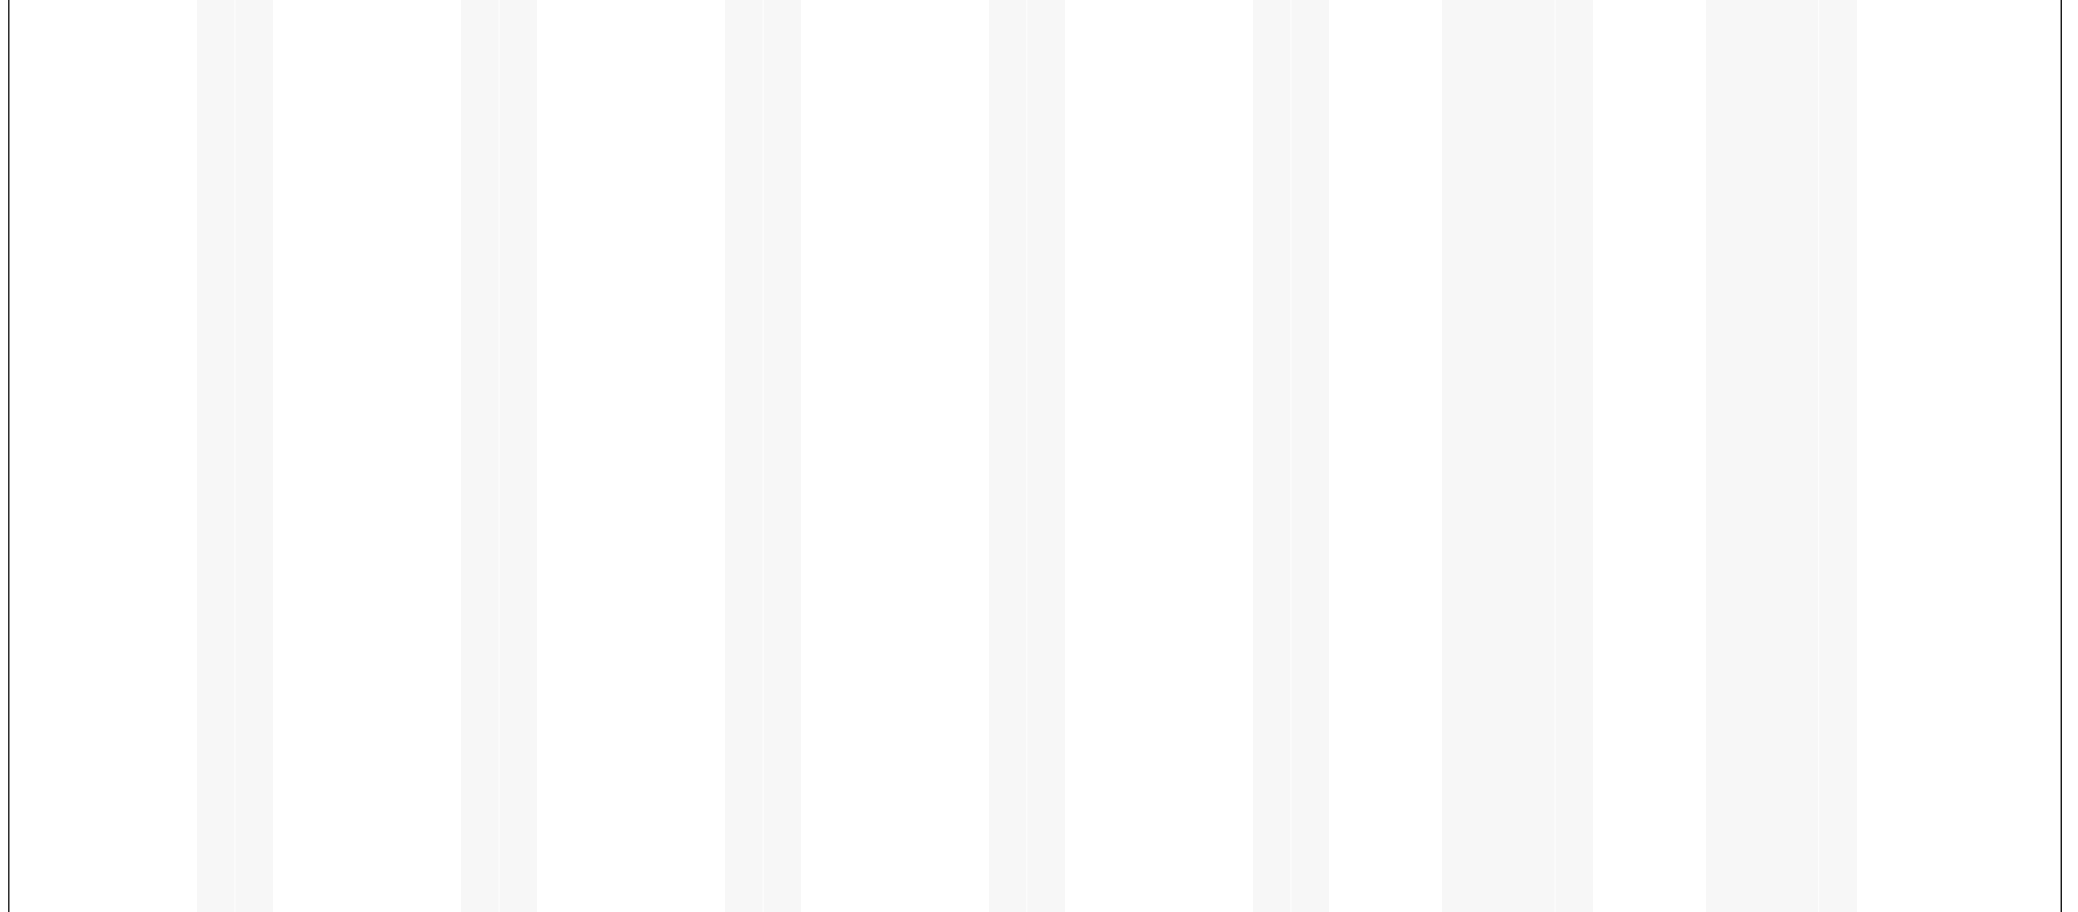


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

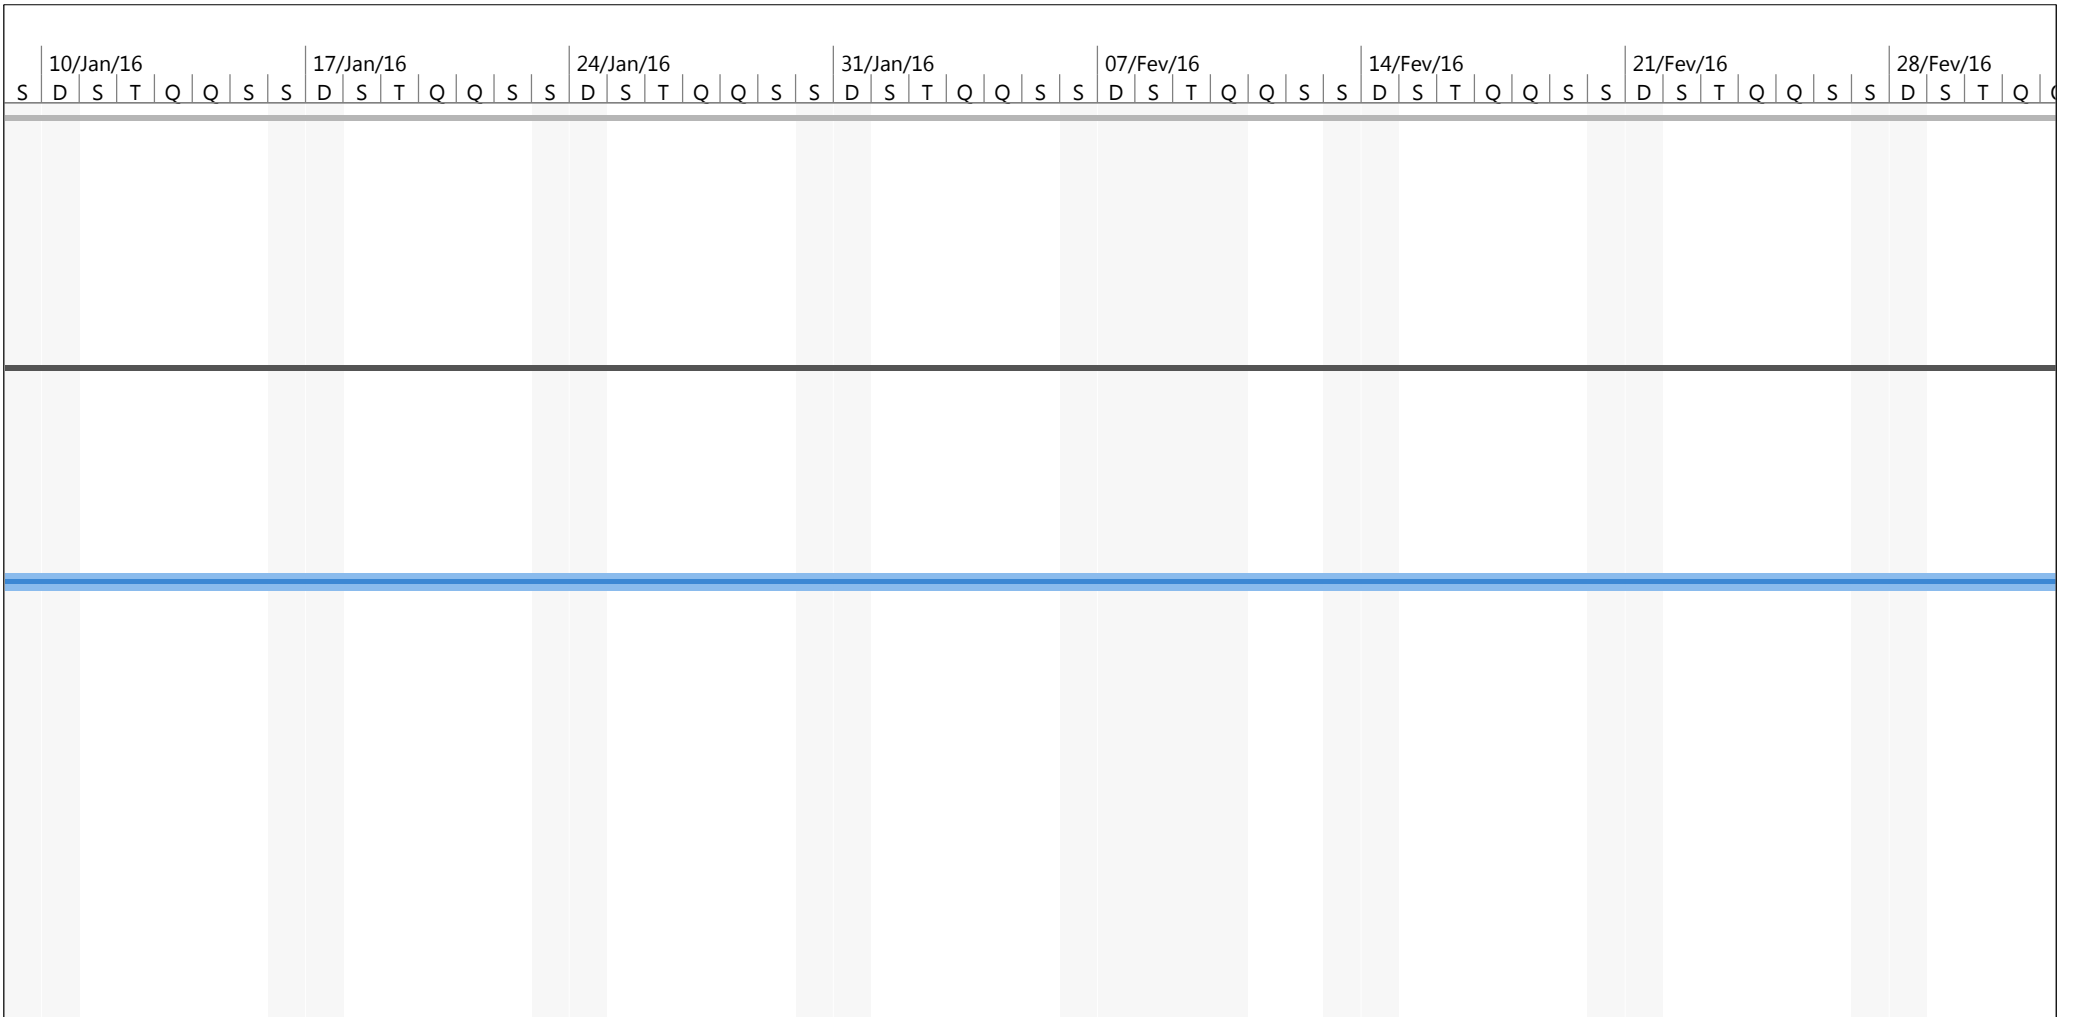


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

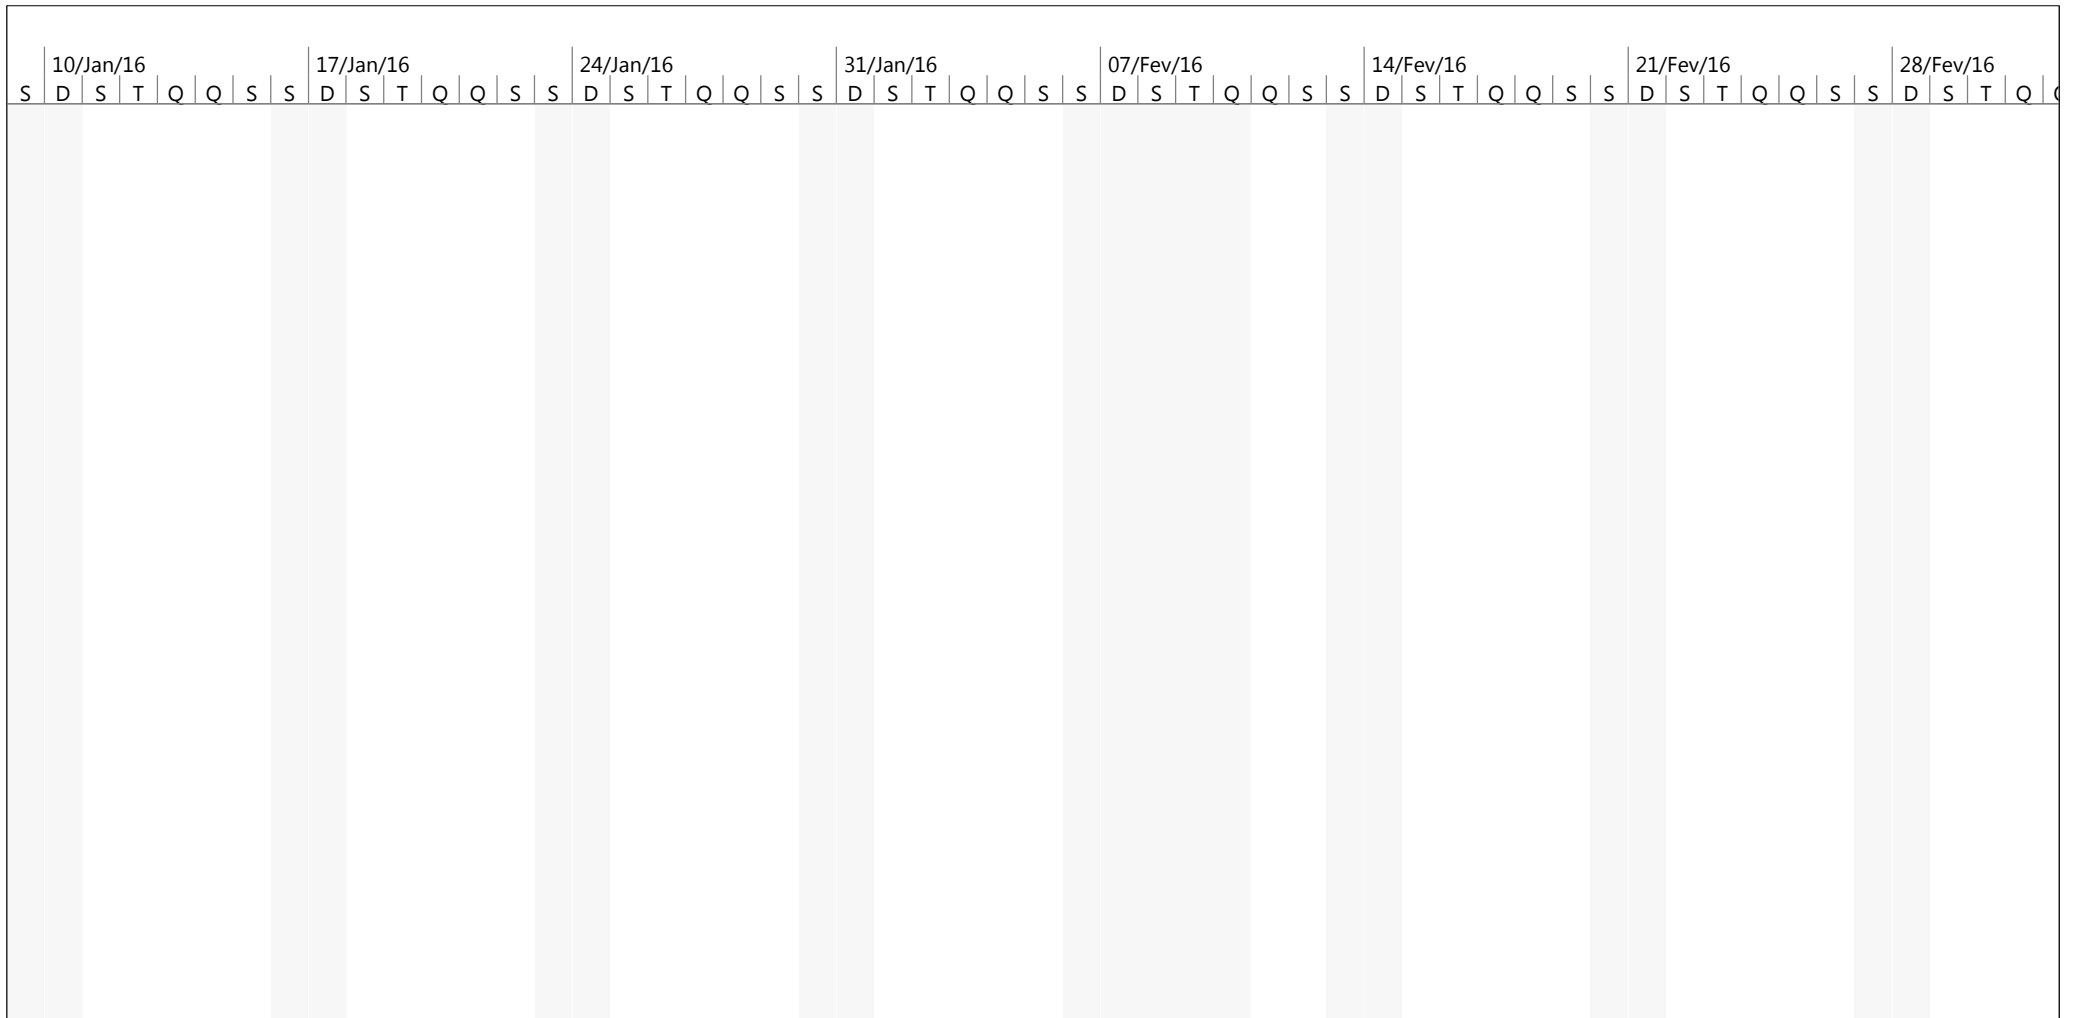

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

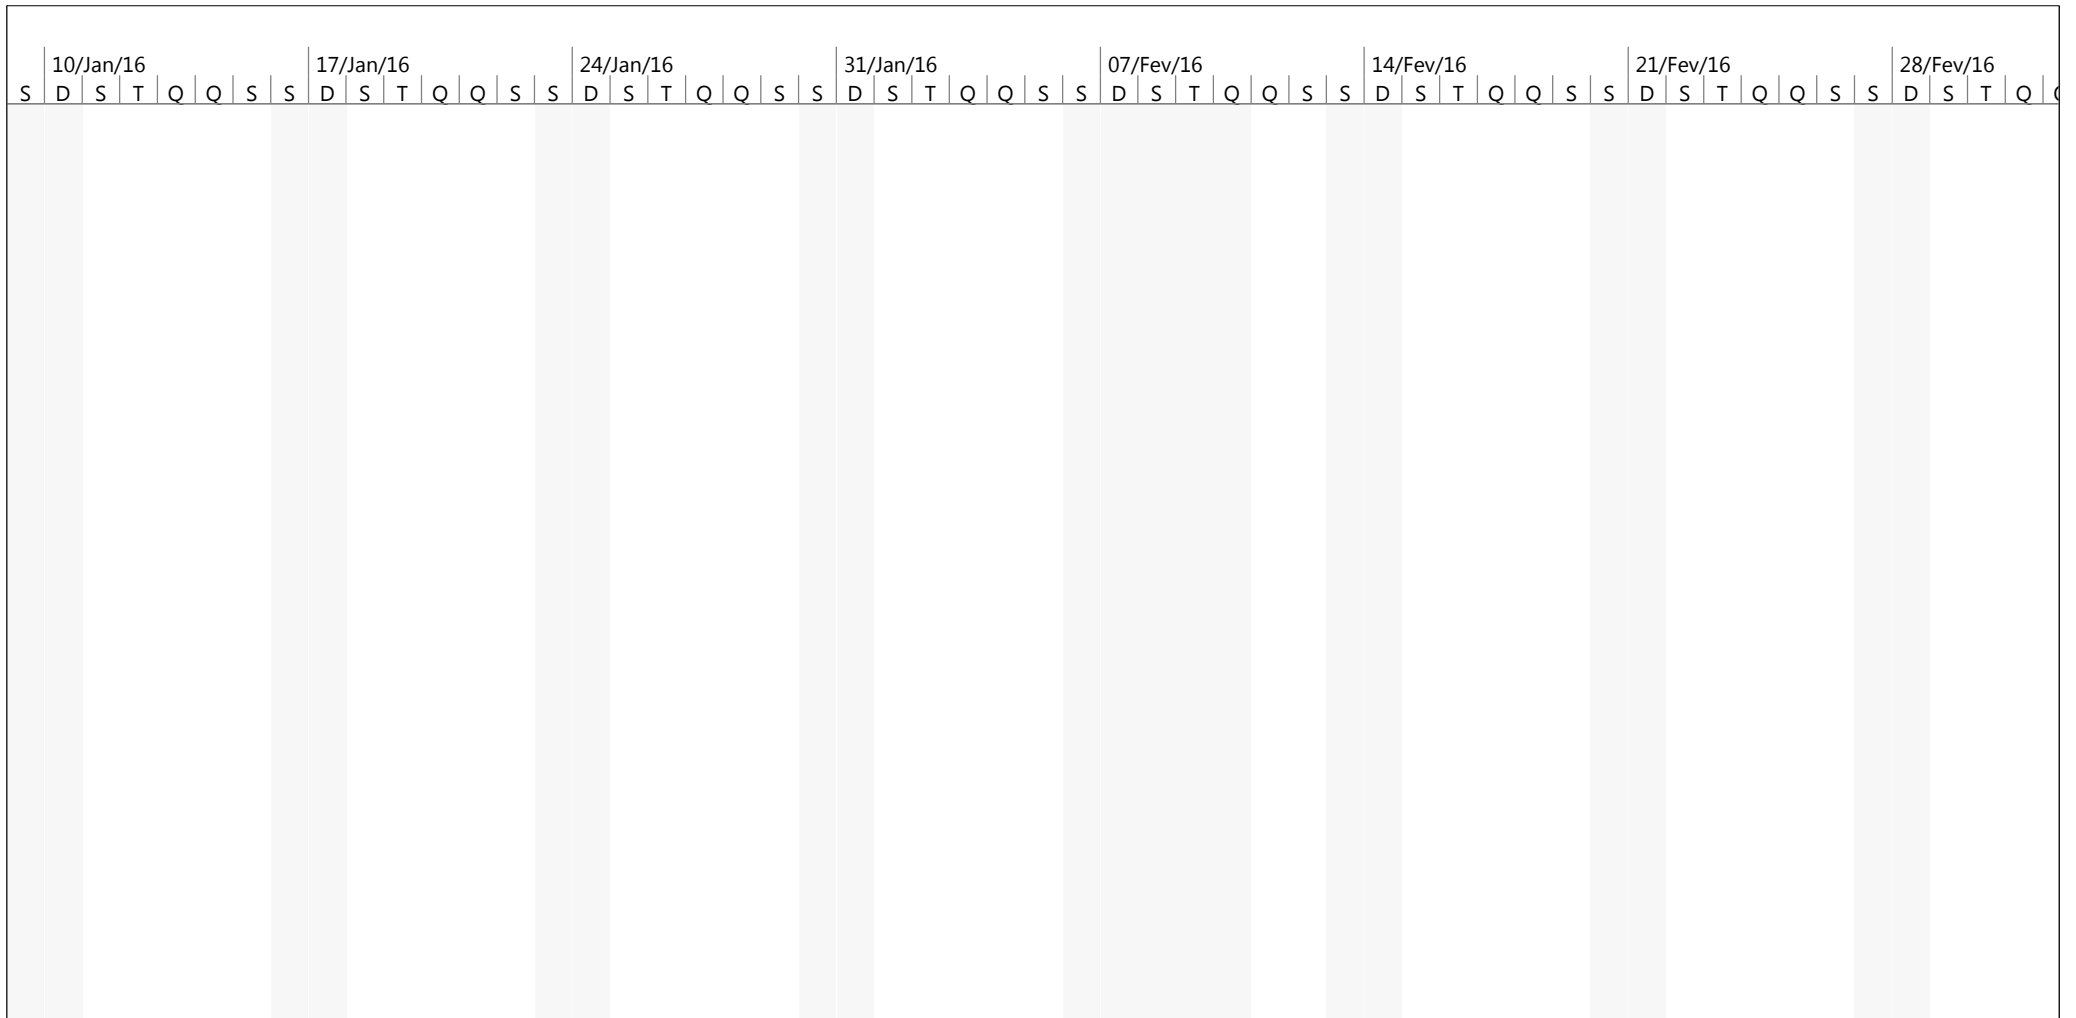

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



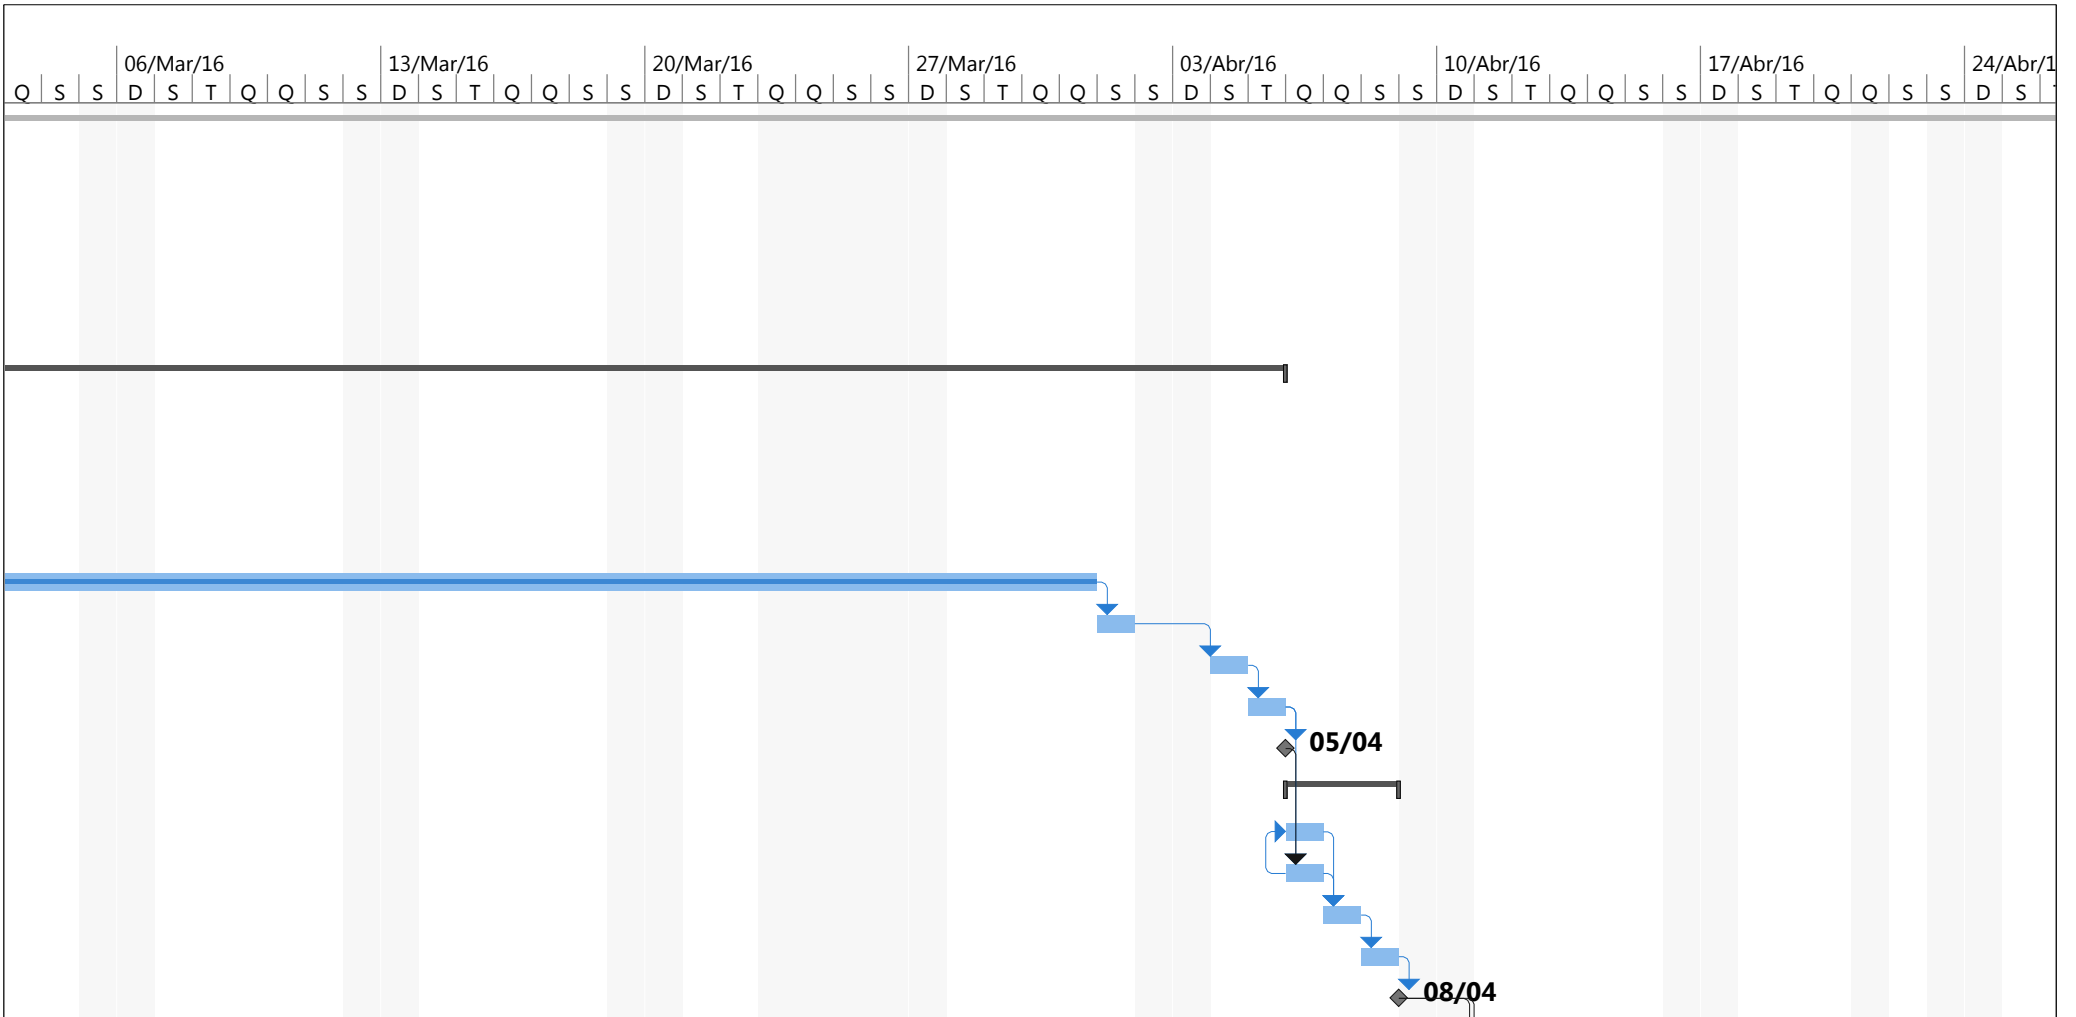


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

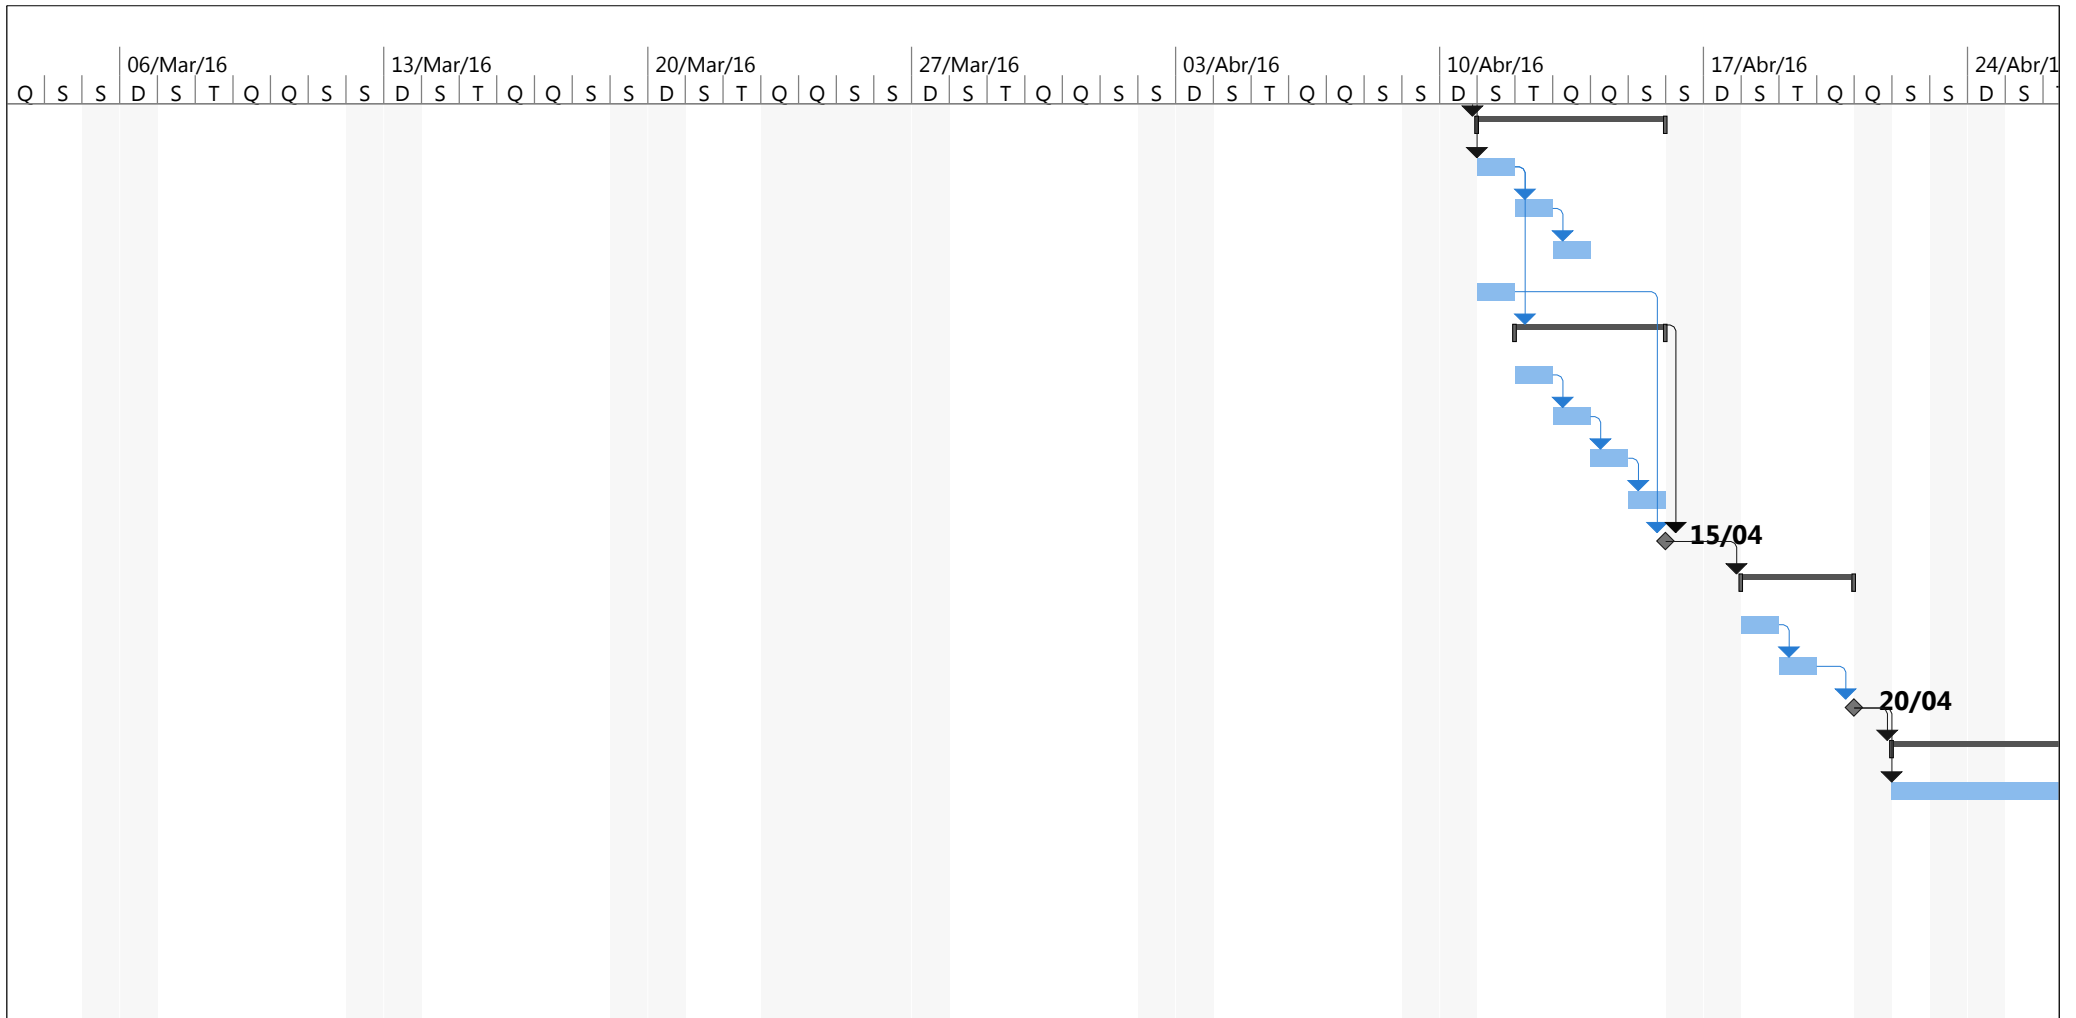

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

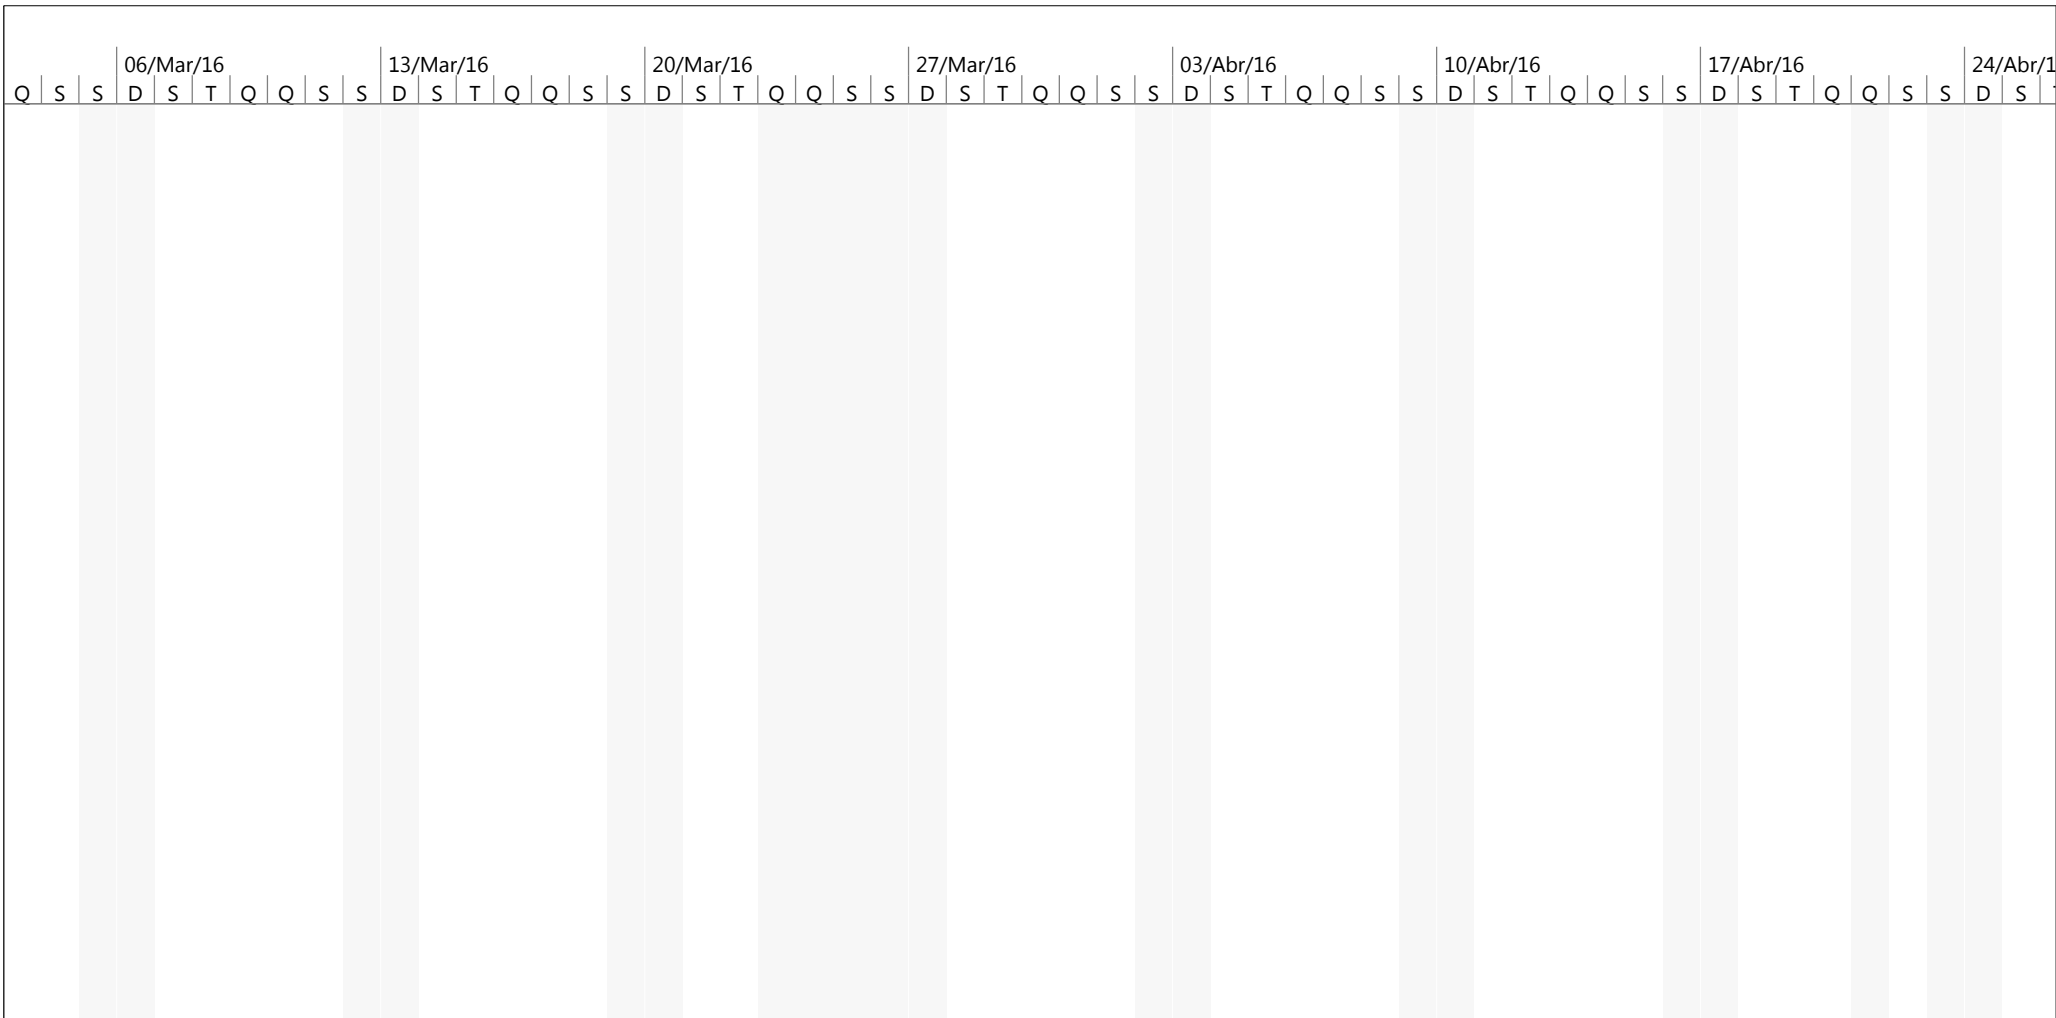


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


16 01/Maio/16 08/Maio/16 15/Maio/16 22/Maio/16 29/Maio/16 05/Jun/16 12/Jun/16 1

T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

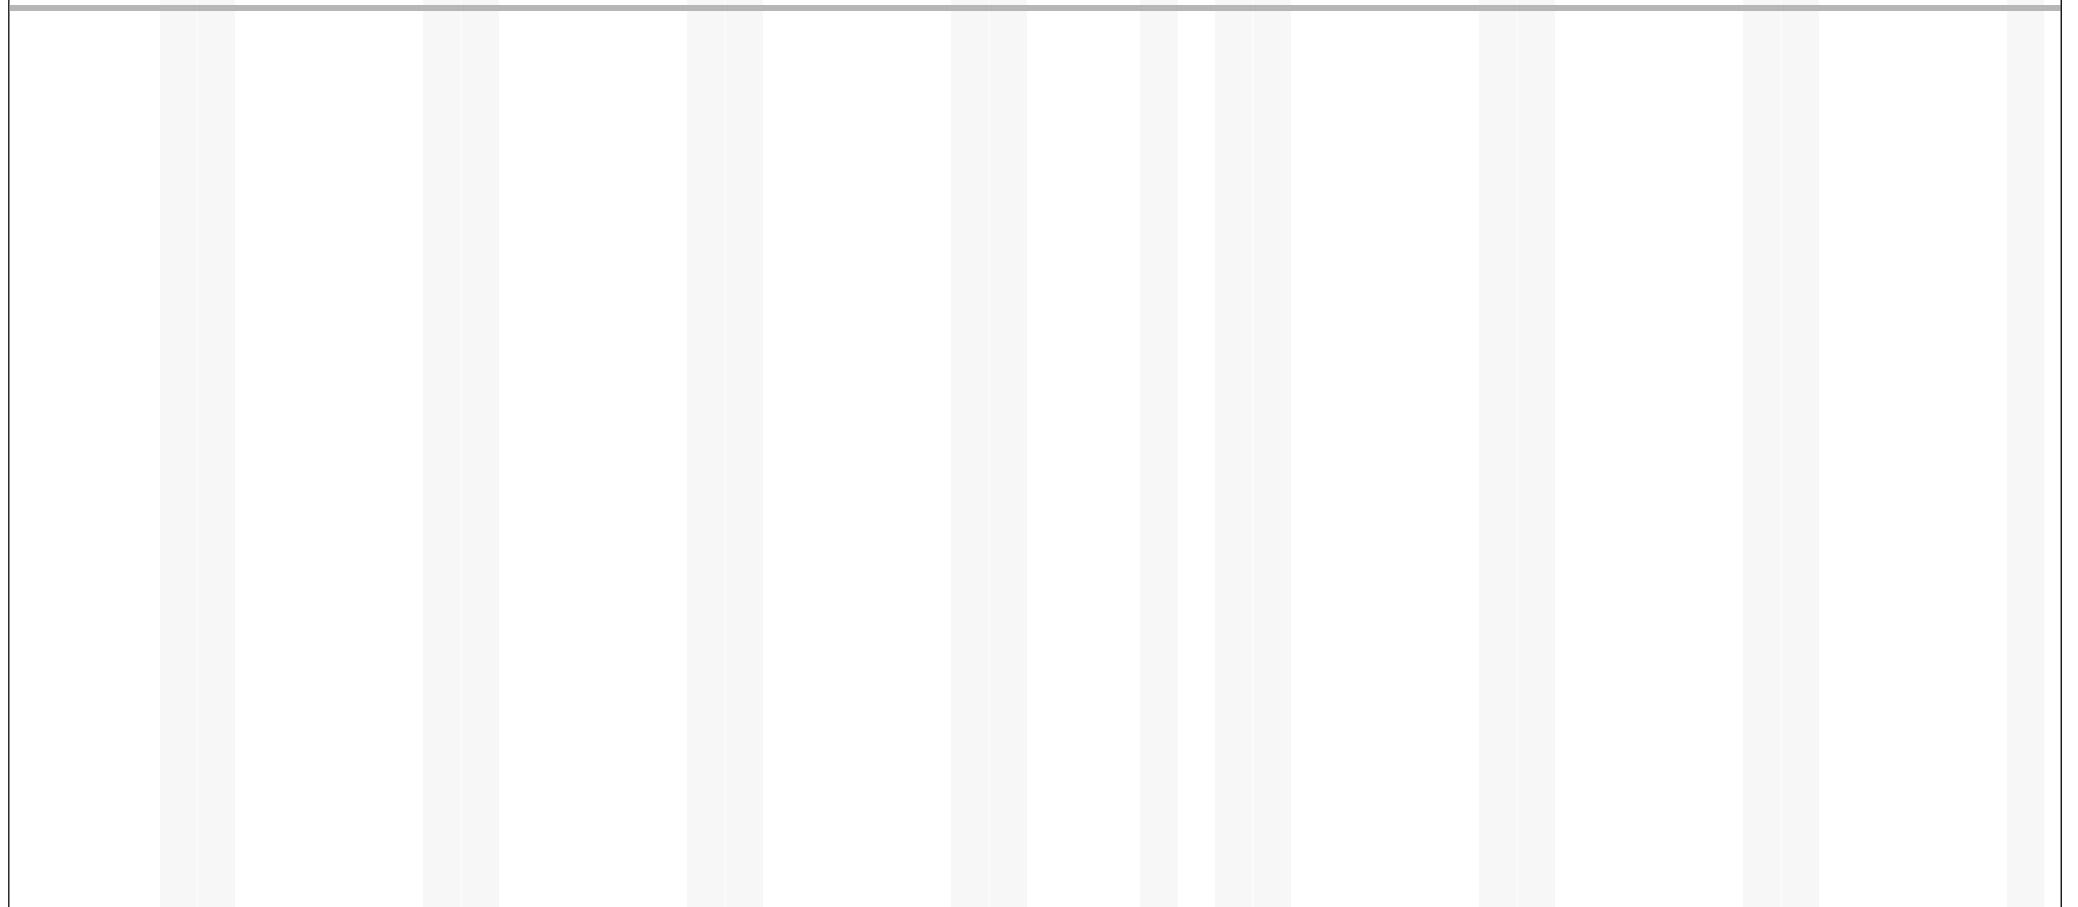


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

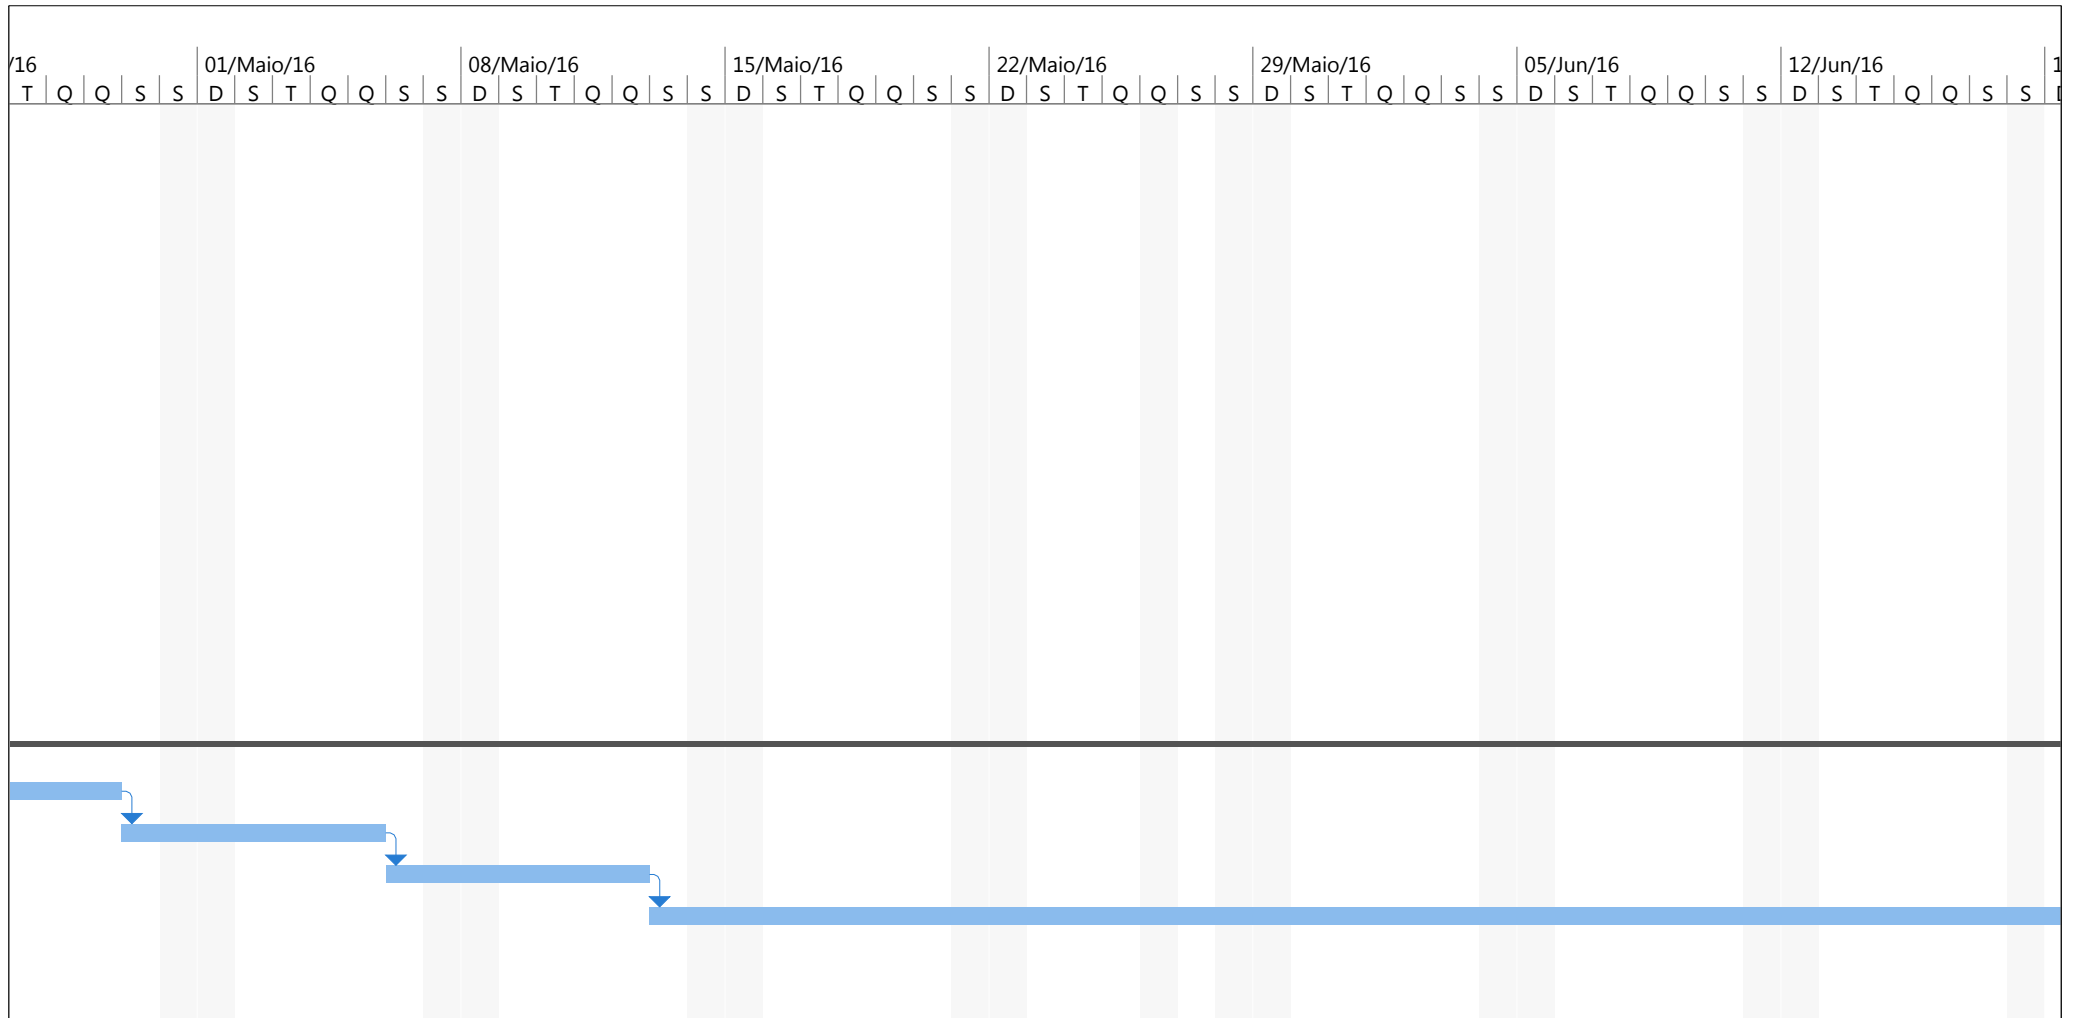


Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

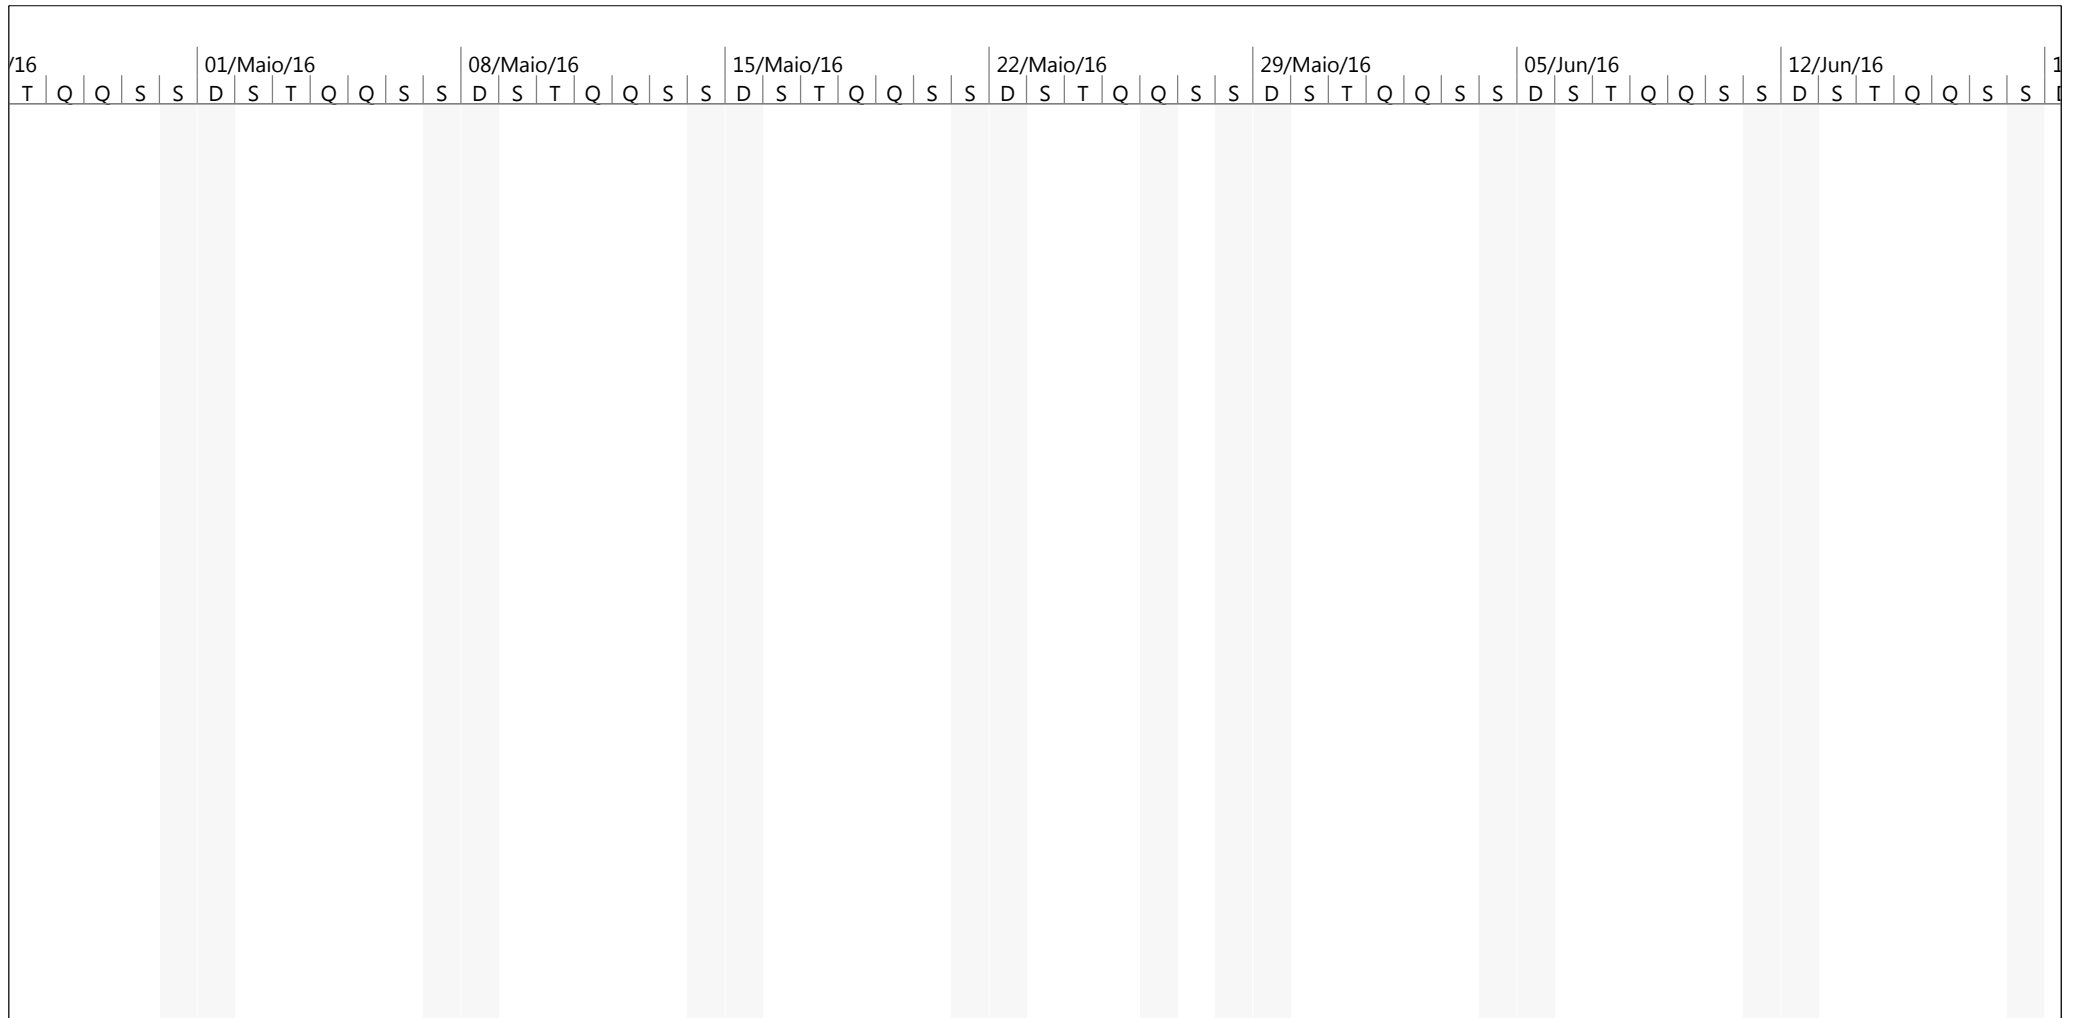

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

19/Jun/16 26/Jun/16 03/Jul/16 10/Jul/16 17/Jul/16 24/Jul/16 31/Jul/16 07/Ago/16  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

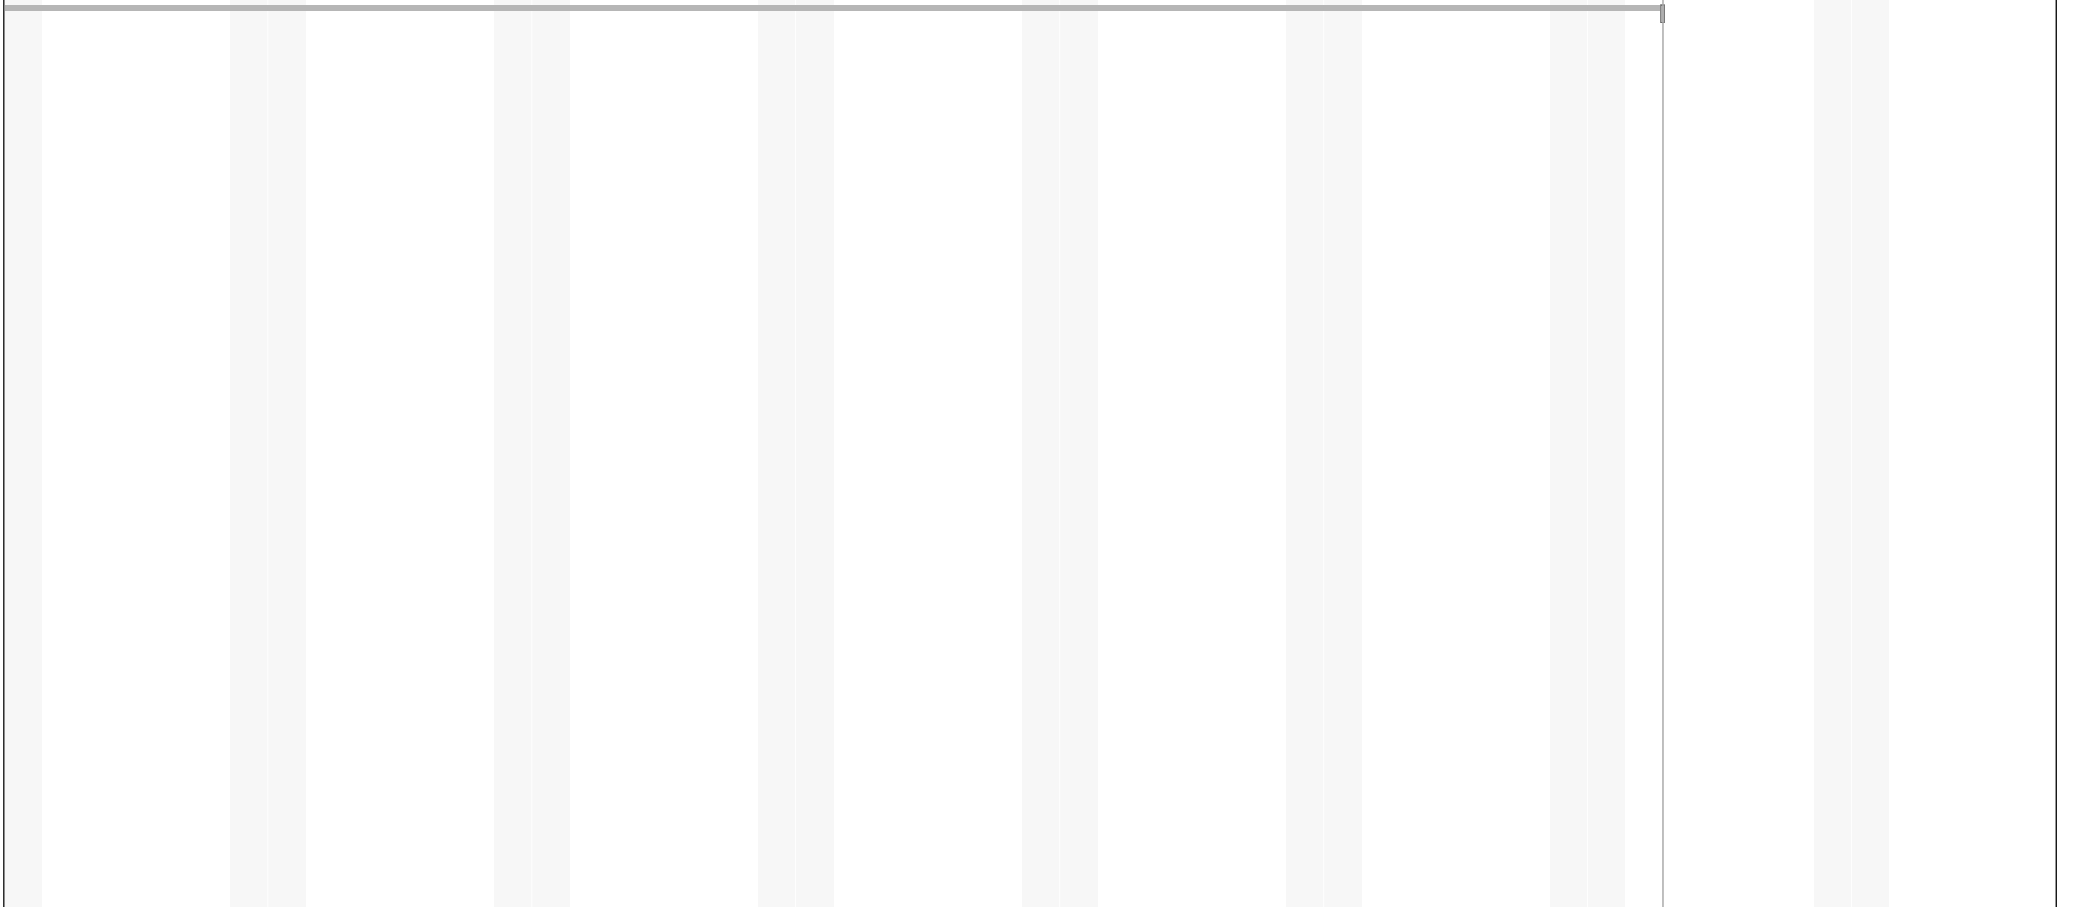

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

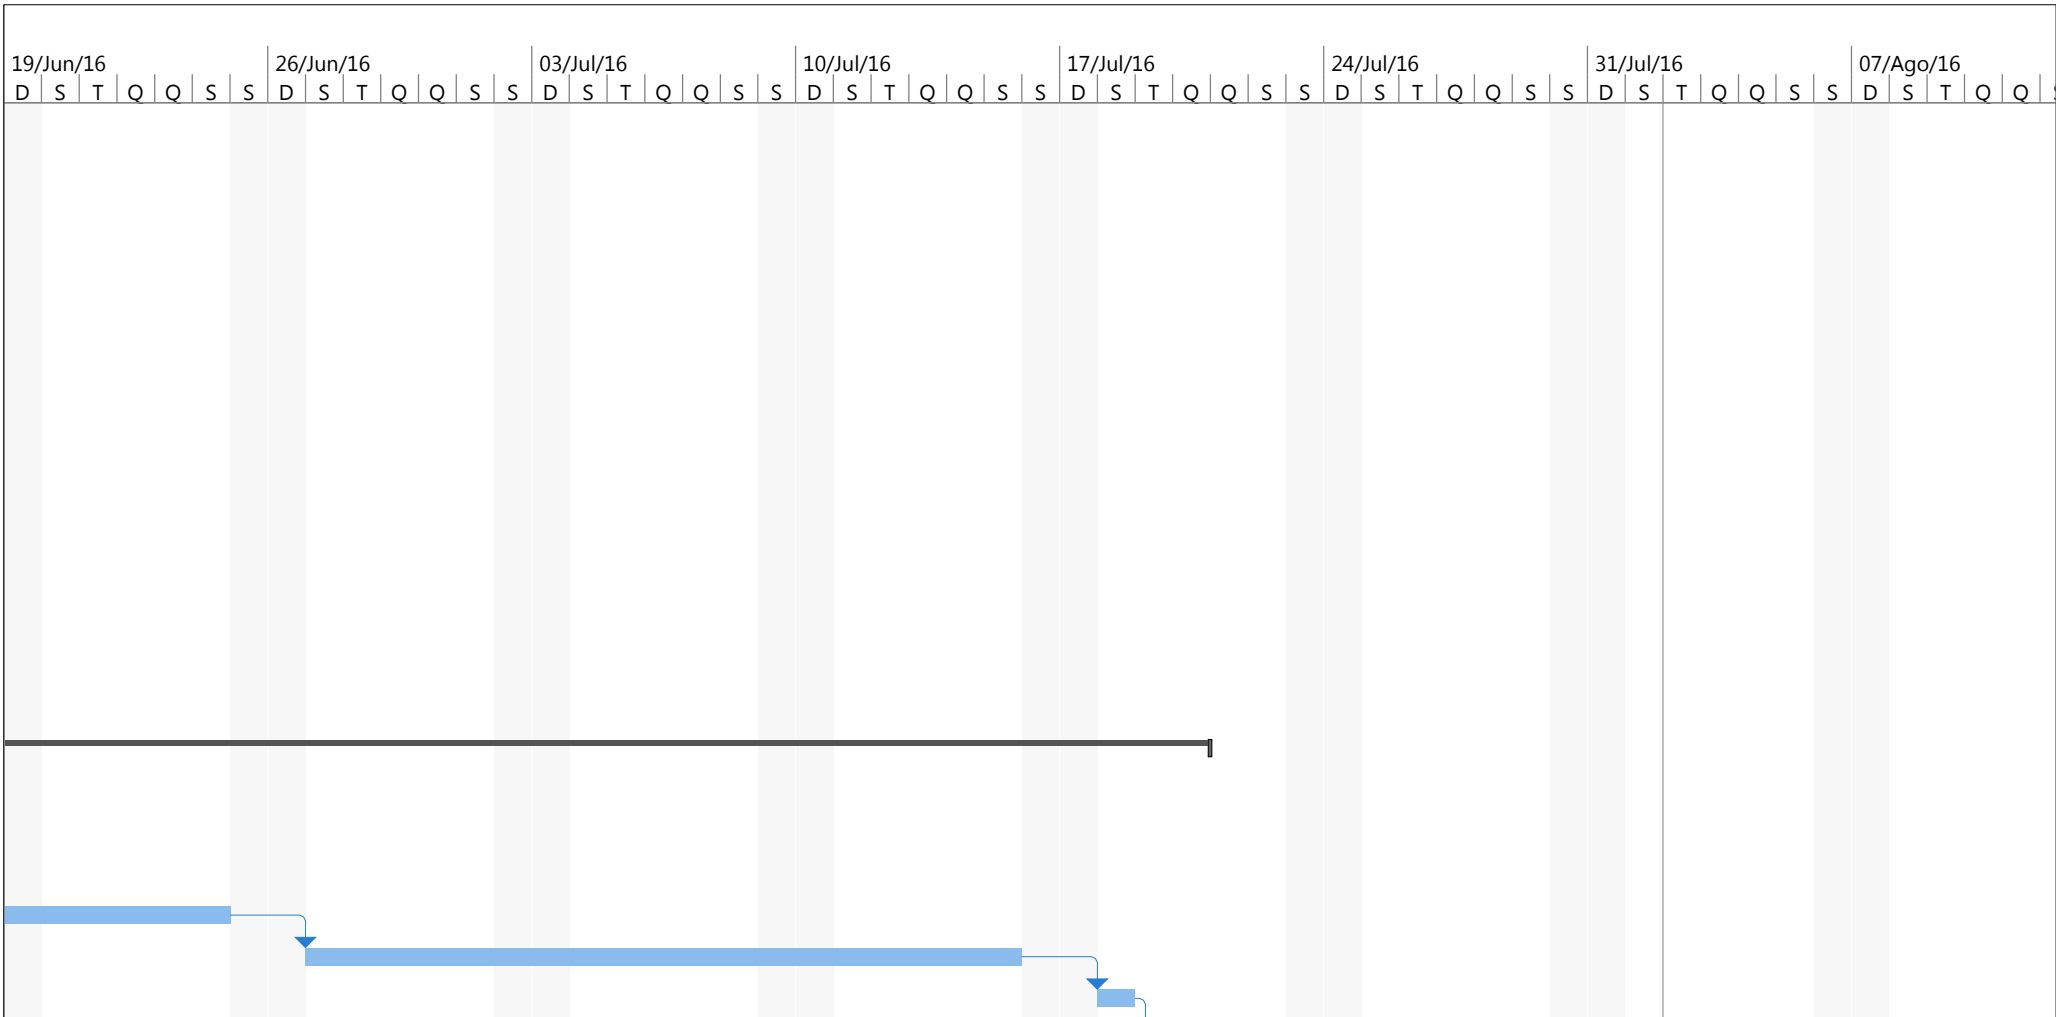

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



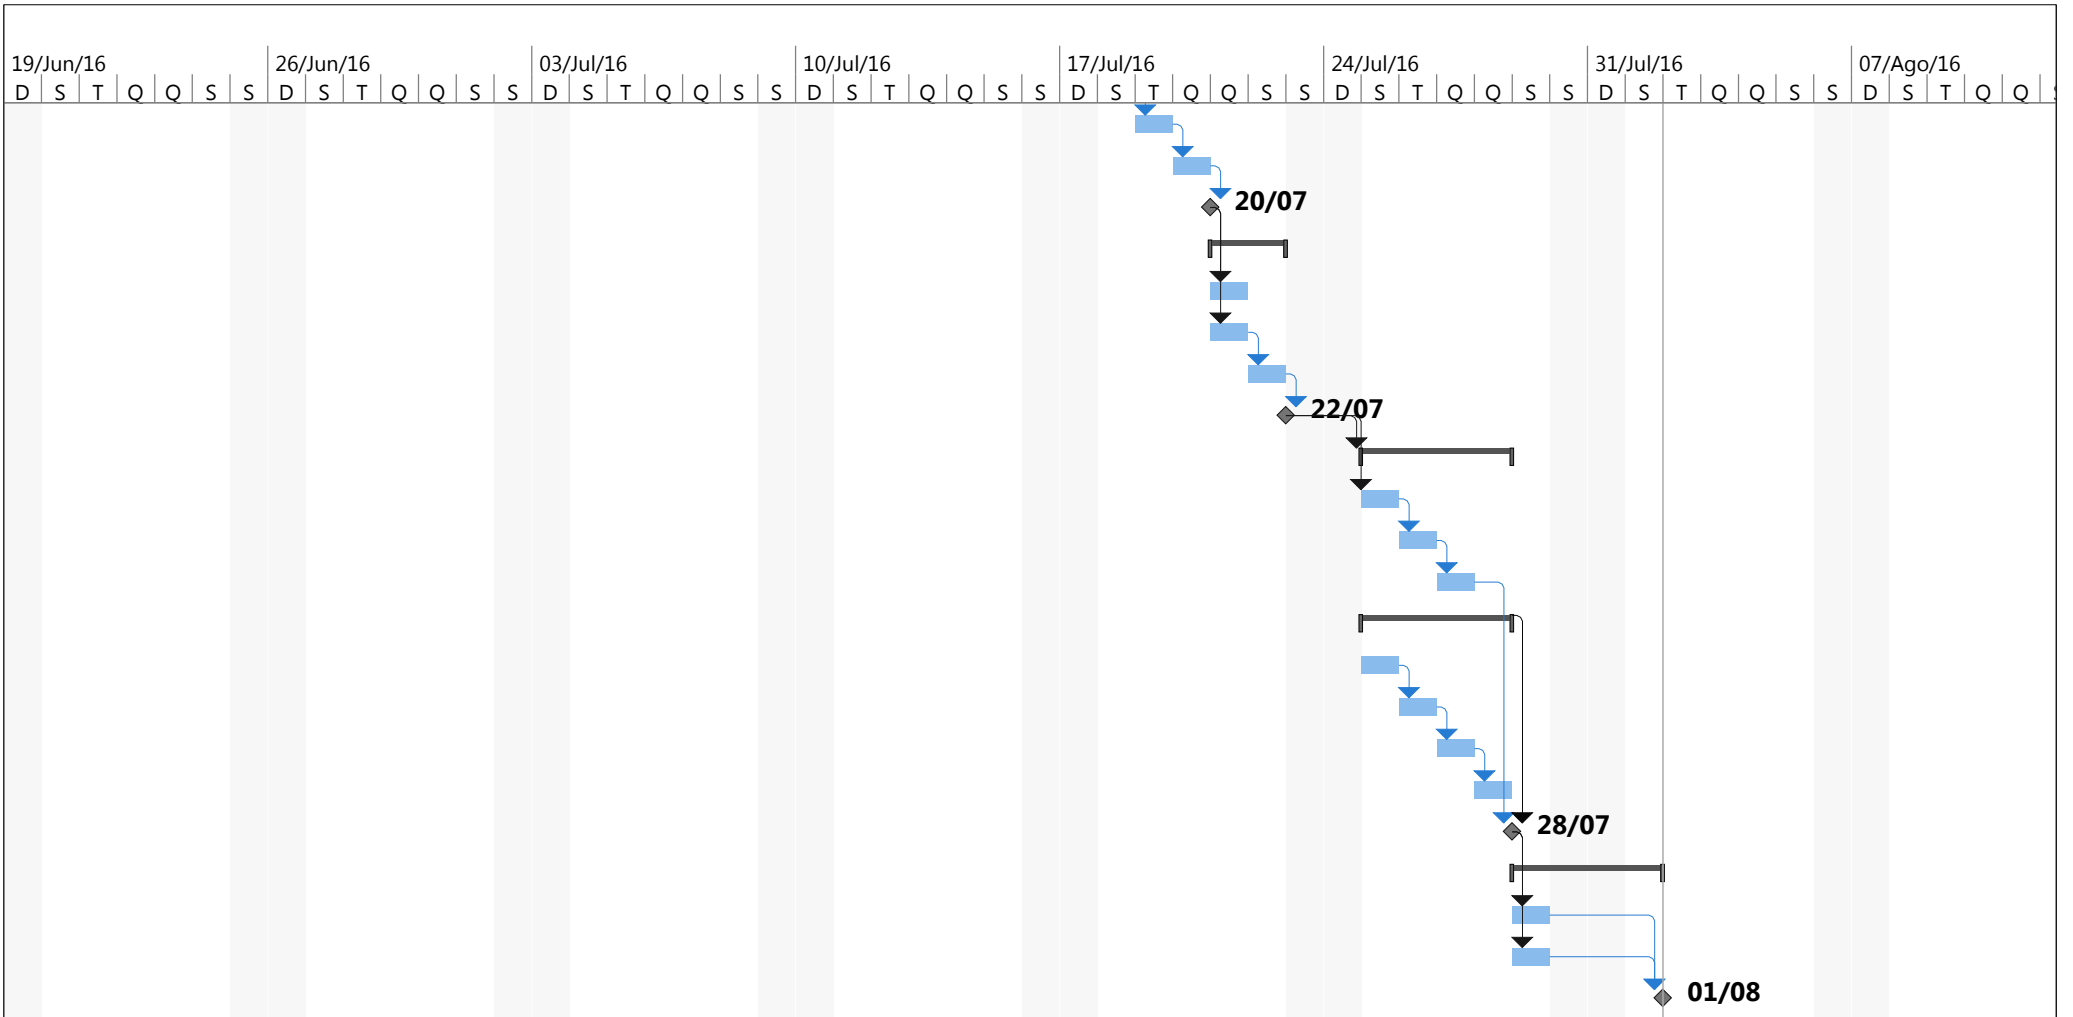

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
