




















Id		EDT	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
0		0	SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SCMP	83%	401 dias?	Sex 13/06/14	Qui 28/01/16
1		1	Internalização da solução de TI - SCMP TRT24	75%	219 dias?	Sex 13/06/14	Qua 06/05/15
2		1.1	Coordenador da DSCI informar qual TRT tem sistema de gestão	99%	26 dias	Sex 13/06/14	Seg 21/07/14
3	✓	1.1.1	Oficiar TRT24 do interesse em utilizar a Sistema de Controle de	100%	4 dias	Sex 13/06/14	Qua 18/06/14
4	✓	1.1.2	Reunir em Brasília para TRT24 apresentar SCMP	100%	22 dias	Sex 20/06/14	Seg 21/07/14
5	✓	1.2	Análise de viabilidade de adoção da solução de TI	100%	176 dias	Sex 13/06/14	Sex 27/02/15
6	✓	1.2.1	Composição da equipe de inserção ou adoção da solução de TI	100%	23 dias	Sex 23/01/15	Sex 27/02/15
7	✓	1.2.2	TRT24 apresentar as funcionalidades do sistema para TRT3	100%	3 dias	Ter 20/01/15	Qui 22/01/15
8	✓	1.2.3	Apresentação do sistema pelo TRT12 (Floripa)	100%	2 dias	Qui 05/03/15	Sex 06/03/15
9	✓	1.2.4	Análise de viabilidade de adoção do SCMP concluída	100%	0 dias	Sex 20/03/15	Sex 20/03/15
10	✓	1.3	Definição do cronograma de implementação junto ao regional	100%	42 dias	Seg 09/03/15	Ter 12/05/15
11	✓	1.3.1	Negociar cronograma	100%	42 dias	Seg 09/03/15	Ter 12/05/15
12	✓	1.3.2	Cronograma de implementação negociado	100%	0 dias	Ter 12/05/15	Ter 12/05/15
13	✓	1.4	Instalação: preparação da infraestrutura necessária, instalação da	100%	31 dias	Qui 14/05/15	Sex 26/06/15
14	✓	1.4.1	Instalação SCMP	100%	31 dias	Qui 14/05/15	Sex 26/06/15
15	✓	1.4.1.1	Configuração de Ambiente e Instalação do serviço	100%	21 dias	Qui 14/05/15	Sex 12/06/15
16	✓	1.4.1.2	Criação banco de dados	100%	21 dias	Qui 14/05/15	Sex 12/06/15
17	✓	1.4.1.3	Carga Inicial dados (script recebido)	100%	5 dias	Seg 15/06/15	Sex 19/06/15
18	✓	1.4.1.4	Configuração acesso ao banco e perfil usuários	100%	10 dias	Seg 15/06/15	Sex 26/06/15
19	✓	1.4.2	Validação do ambiente da Instalação	100%	5 dias	Seg 22/06/15	Sex 26/06/15
20	✓	1.4.2.1	Verificações do banco de dados	100%	5 dias	Seg 22/06/15	Sex 26/06/15
21	✓	1.4.2.2	Validação do funcionamento do Sistema	100%	5 dias	Seg 22/06/15	Sex 26/06/15
22	✓	1.4.2.3	Validação da configuração do Sistema	100%	5 dias	Seg 22/06/15	Sex 26/06/15

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		EDT	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
23	✓	1.4.2.4	Validações de Infraestrutura	100%	5 dias	Seg 22/06/15	Sex 26/06/15
24	✓	1.4.2.5	Questões de Arquitetura	100%	5 dias	Seg 22/06/15	Sex 26/06/15
25	✓	1.4.2.6	Requisitos de Governança	100%	5 dias	Seg 22/06/15	Sex 26/06/15
26	✓	1.4.2.7	Validação do Modelo de Dados	100%	5 dias	Seg 22/06/15	Sex 26/06/15
27	✓	1.4.3	Instalação validada	100%	0 dias	Sex 26/06/15	Sex 26/06/15
28		1.5	Migração dos dados	61%	401 dias?	Sex 13/06/14	Qui 28/01/16
29	✓	1.5.1	Criação do ambiente de homologação	100%	5 dias	Seg 27/07/15	Sex 31/07/15
30		1.5.2	Etapa 1 – Cadastros Básicos	53%	141 dias	Seg 06/07/15	Qui 28/01/16
31	✓	1.5.2.1	Levantamento Requisitos	100%	20 dias	Seg 06/07/15	Sex 31/07/15
32	✓	1.5.2.2	Definição Regras Conversão	100%	20 dias	Seg 06/07/15	Sex 31/07/15
33	✓	1.5.2.3	Desenvolvimento Rotina (ETL)	100%	20 dias	Seg 03/08/15	Sex 28/08/15
34	✓	1.5.2.4	Reunião entre os membros da equipe de TI e de negócio para	100%	1 dia	Qua 21/10/15	Qua 21/10/15
35	📅	1.5.2.5	Acompanhamento das atividades na Seção de Almoxarifado	0%	30 dias	Seg 09/11/15	Sex 18/12/15
36	📅	1.5.2.6	Homologação	0%	25 dias	Seg 21/12/15	Qui 28/01/16
37		1.5.3	Etapa 2.0 – Registro Entradas (Material de consumo)	99%	116 dias	Seg 06/07/15	Sex 18/12/15
38	✓	1.5.3.1	Levantamento Requisitos	100%	20 dias	Seg 06/07/15	Sex 31/07/15
39	✓	1.5.3.2	Definição Regras Conversão	100%	20 dias	Seg 06/07/15	Sex 31/07/15
40	✓	1.5.3.3	Desenvolvimento Rotina (ETL)	100%	20 dias	Seg 03/08/15	Sex 28/08/15
41	✓	1.5.3.4	Reunião entre os membros da equipe de TI e de negócio para	100%	1 dia	Qua 21/10/15	Qua 21/10/15
42	✓	1.5.3.5	Acompanhamento das atividades na Seção de Almoxarifado	100%	30 dias	Seg 09/11/15	Sex 18/12/15
43	📅	1.5.3.6	Homologação	0%	1 dia	Sex 18/12/15	Sex 18/12/15
44		1.5.4	Etapa 2.1 – Registro Entradas (Material Permanente)	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
45		1.5.4.1	Levantamento Requisitos	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id	EDT	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
46	1.5.4.2	Definição Regras Conversão	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
47	1.5.4.3	Desenvolvimento Rotina (ETL)	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
48	1.5.4.4	Reunião entre os membros da equipe de TI e de negócio para	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
49	1.5.4.5	Acompanhamento das atividades na Seção de Bens Patrimoniais	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
50	1.5.4.6	Homologação	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
51	1.5.5	Etapa 3 – Movimentação Material Permanente e Termos de Baixa	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
52	1.5.5.1	Levantamento Requisitos	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
53	1.5.5.2	Definição Regras Conversão	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
54	1.5.5.3	Desenvolvimento Rotina (ETL)	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
55	1.5.5.4	Reunião entre os membros da equipe de TI e de negócio para	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
56	1.5.5.5	Acompanhamento das atividades na Seção de Bens Patrimoniais	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
57	1.5.5.6	Homologação	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
58	1.5.6	Etapa 4 – Depreciação/Amortização e Fechamento contábil	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
59	1.5.6.1	Levantamento Requisitos	0%	15 dias	Sex 13/06/14	Sex 04/07/14
60	1.5.6.2	Definição Regras Conversão	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
61	1.5.6.3	Desenvolvimento Rotina (ETL)	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
62	1.5.6.4	Reunião entre os membros da equipe de TI e de negócio para	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
63	1.5.6.5	Acompanhamento das atividades na Seção de Bens Patrimoniais	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
64	1.5.6.6	Homologação	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
65	1.5.7	Etapa 5.0 – Validação dos Relatórios (Material de Consumo)	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
66	1.5.7.1	Levantamento Requisitos	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
67	1.5.7.2	Definição Regras Conversão	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
68	1.5.7.3	Desenvolvimento Rotina (ETL)	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14




















Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















Id		EDT	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
69		1.5.7.4	Reunião entre os membros da equipe de TI e de negócio para	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
70		1.5.7.5	Acompanhamento das atividades na Seção de Almoxarifado	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
71		1.5.7.6	Homologação	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
72		1.5.8	Etapa 5.1 – Validação dos Relatórios (Material Permanente)	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
73		1.5.8.1	Levantamento Requisitos	0%	1 dia?	Sex 04/07/14	Sex 04/07/14
74		1.5.8.2	Definição Regras Conversão	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
75		1.5.8.3	Desenvolvimento Rotina (ETL)	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
76		1.5.8.4	Reunião entre os membros da equipe de TI e de negócio para	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
77		1.5.8.5	Acompanhamento das atividades na Seção de Bens Patrimoniais	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
78		1.5.8.6	Homologação	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
79		1.5.9	Migração dos dados realizada	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
80		1.6	Capacitação da equipe do TRT3 (área de negócio e área de TI),	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
81		1.6.1	Confeccionar proposição de diárias	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
82		1.6.2	Reservar sala de treinamento	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
83		1.6.3	Capacitar	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
84		1.6.4	Equipes de negócios e TI capacitadas	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
85		1.7	Implantação	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
86		1.7.1	Homologar usuários	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
87		1.7.2	Descrever as novas rotinas, alinhando com as atividades da equipe	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
88		1.7.3	Elaborar requisitos de ampliação da funcionalidades para	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
89		1.7.4	Colocar em produção do SCMP	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
90		1.7.5	Implantação concluída	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
91		1.8	Divulgação e treinamento dos usuários de todas as unidades do	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14












Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















Id		EDT	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
92		1.8.1	Construir tutorial	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
93		1.8.2	Treinar Central de atendimento	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
94		1.8.3	Divulgação da Central e orientações gerais	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
95		1.8.4	Divulgação realizada e usuários externos treinados	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
96		2	Gestão do Projeto	98%	341 dias	Sex 13/06/14	Qui 29/10/15
97		2.1	Construção do Termo de Abertura do Projeto - TAP	100%	109 dias	Seg 09/03/15	Sex 14/08/15
98		2.1.1	Levantar o requisitos	100%	20 dias	Seg 09/03/15	Qua 08/04/15
99		2.1.2	Definir o escopo	100%	20 dias	Seg 09/03/15	Qua 08/04/15
100		2.1.3	Compor equipe do projeto	100%	20 dias	Seg 09/03/15	Qua 08/04/15
101		2.1.4	Escrever o TAP	100%	8 dias	Qui 09/04/15	Seg 20/04/15
102		2.1.5	Submeter a minuta do TAP para a equipe do projeto	100%	28 dias	Qua 22/04/15	Seg 01/06/15
103		2.1.6	Reunir para fechar escopo	100%	1 dia	Ter 02/06/15	Ter 02/06/15
104		2.1.7	Adequar a minuta do TAP	100%	2 dias	Sex 03/07/15	Seg 06/07/15
105		2.1.8	Submeter a minuta do TAP para a equipe do projeto	100%	25 dias	Ter 07/07/15	Seg 10/08/15
106		2.1.9	Encaminhar o TAP para Secretaria de Gestão Estratégica	100%	1 dia	Sex 14/08/15	Sex 14/08/15
107		2.1.10	TAP construído	100%	0 dias	Sex 14/08/15	Sex 14/08/15
108		2.2	Construção do Plano de Projeto Estratégico - PPE	100%	52 dias	Qua 03/06/15	Sex 14/08/15
109		2.2.1	Construir a Estrutura Analítica do Projeto - EAP	100%	23 dias	Qua 03/06/15	Seg 06/07/15
110		2.2.2	Construir o Cronograma	100%	23 dias	Qua 03/06/15	Seg 06/07/15
111		2.2.3	Escrever o PPE	100%	23 dias	Qua 03/06/15	Seg 06/07/15
112		2.2.4	Submeter a minuta do PPE para a equipe do projeto	100%	25 dias	Ter 07/07/15	Seg 10/08/15
113		2.2.5	Encaminhar o PPE para Secretaria de Gestão Estratégica	100%	1 dia	Sex 14/08/15	Sex 14/08/15
114		2.2.6	PPE construído	100%	0 dias	Sex 14/08/15	Sex 14/08/15


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Id		EDT	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
115		2.3	Acompanhamento da execução (após entrega da documentação)	50%	5 dias	Sex 13/06/14	Sex 20/06/14
116		2.3.1	Reunião 1 (Patrícia, Juliana, Silvano, Sângela, Paulo e Hítalo - ATA)	100%	1 dia	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
117		2.3.2	Reunião 2 (Patrícia e Hítalo em razão e-pad 26758/2015)	100%	1 dia	Qui 01/10/15	Qui 01/10/15
118		2.3.3	Reunião 3 (Patrícia, Cristiano e Sângela - pauta dia 21)	100%	1 dia	Ter 13/10/15	Ter 13/10/15
119		2.3.4	Reunião 4 (equipe do projeto)	100%	1 dia	Qua 21/10/15	Qua 21/10/15
120		2.3.5	Reunião 5 (acompanhamento EPRO)	100%	1 dia	Qui 29/10/15	Qui 29/10/15
121		2.3.6	Reunião 6	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
122		2.3.7	Reunião 7	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
123		2.3.8	Reunião 8	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
124		2.3.9	Reunião 9	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14
125		2.3.10	Reunião 10	0%	1 dia?	Sex 13/06/14	Sex 13/06/14

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

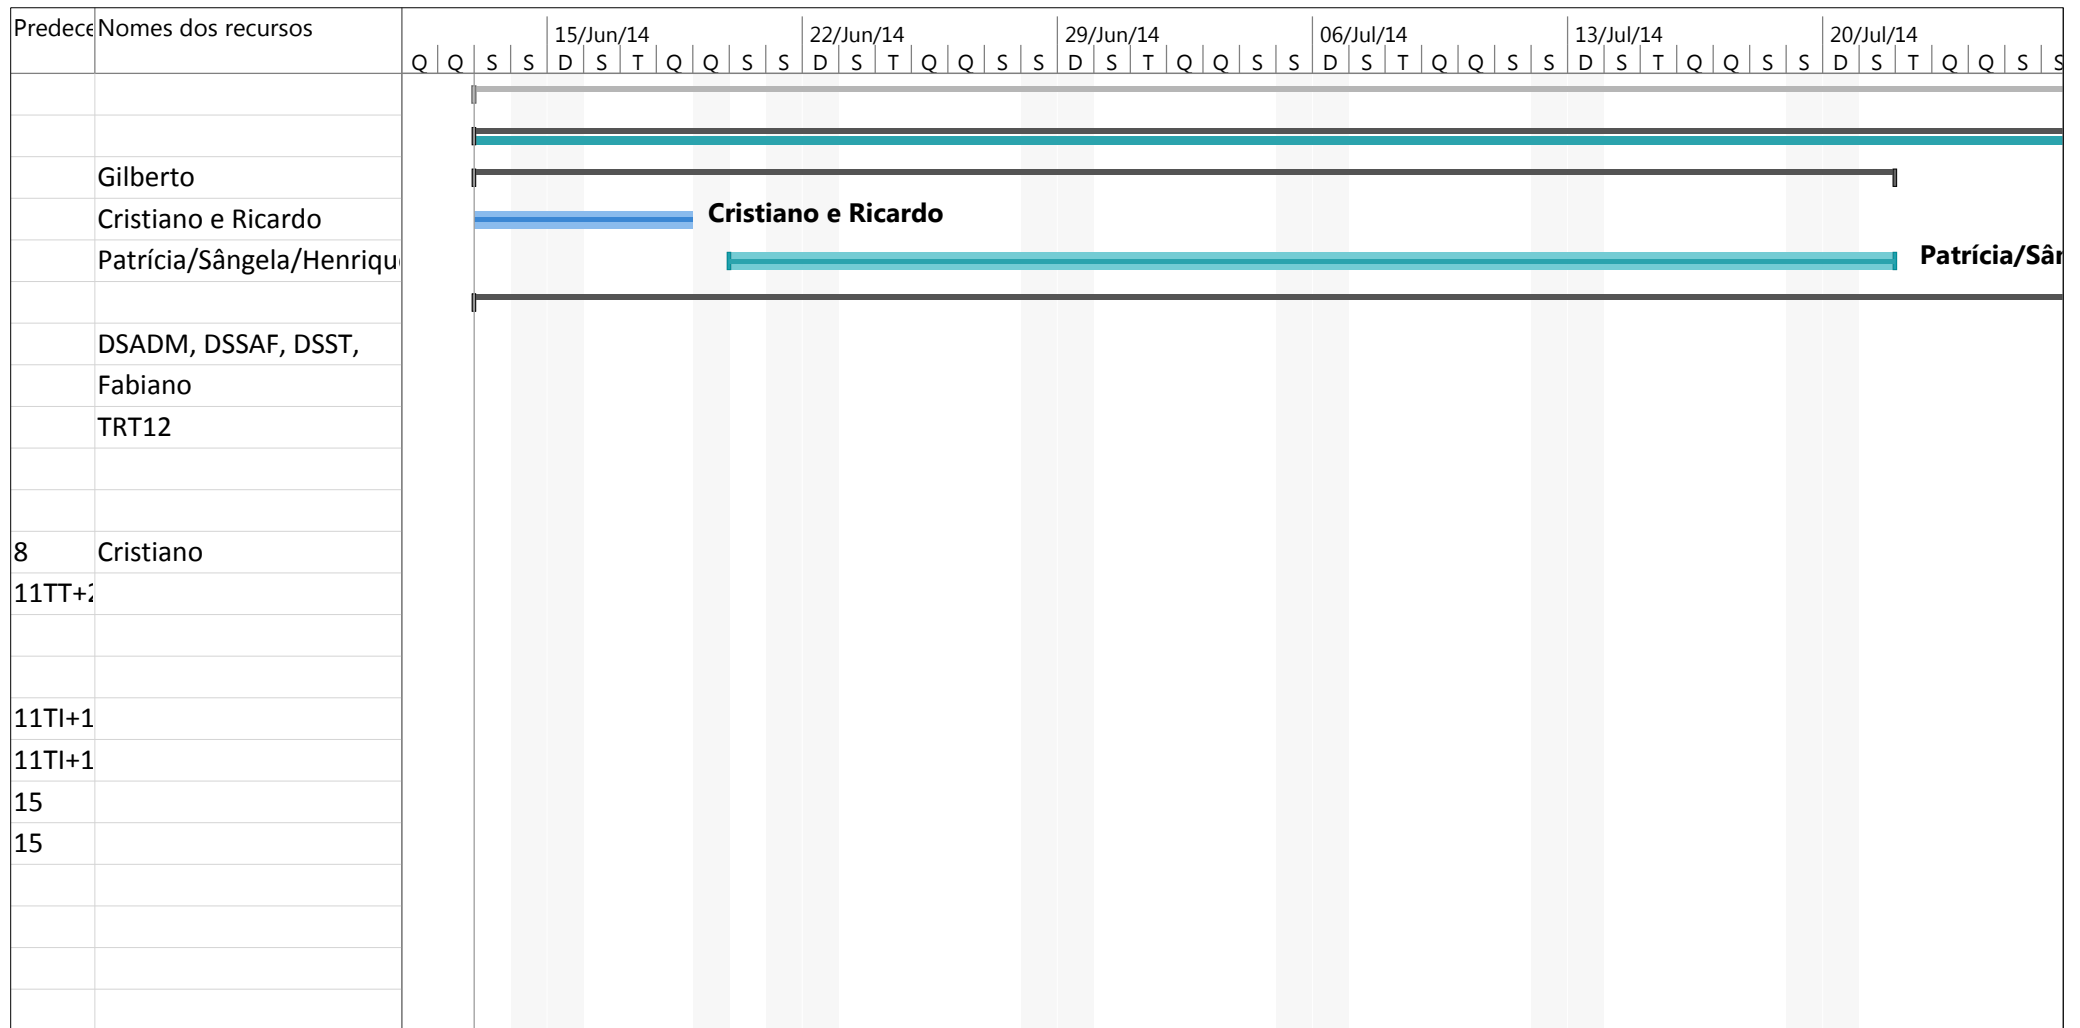


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa	[Barra azul]	Resumo Inativo	[Barra cinza]	Tarefas externas	[Barra cinza]
	Divisão	[Barra azul pontilhada]	Tarefa Manual	[Barra verde]	Marco externo	[Losango cinza]
	Marco	[Losango azul]	Somente duração	[Barra verde]	Data limite	[Seta verde]
	Resumo	[Barra cinza]	Acúmulo de Resumo Manual	[Barra verde]	Andamento	[Barra azul]
	Resumo do projeto	[Barra cinza]	Resumo Manual	[Barra cinza]	Progresso manual	[Barra verde]
	Tarefa Inativa		Somente início	[Canto azul]		
Marco Inativo	[Losango cinza]	Somente término	[Canto verde]			

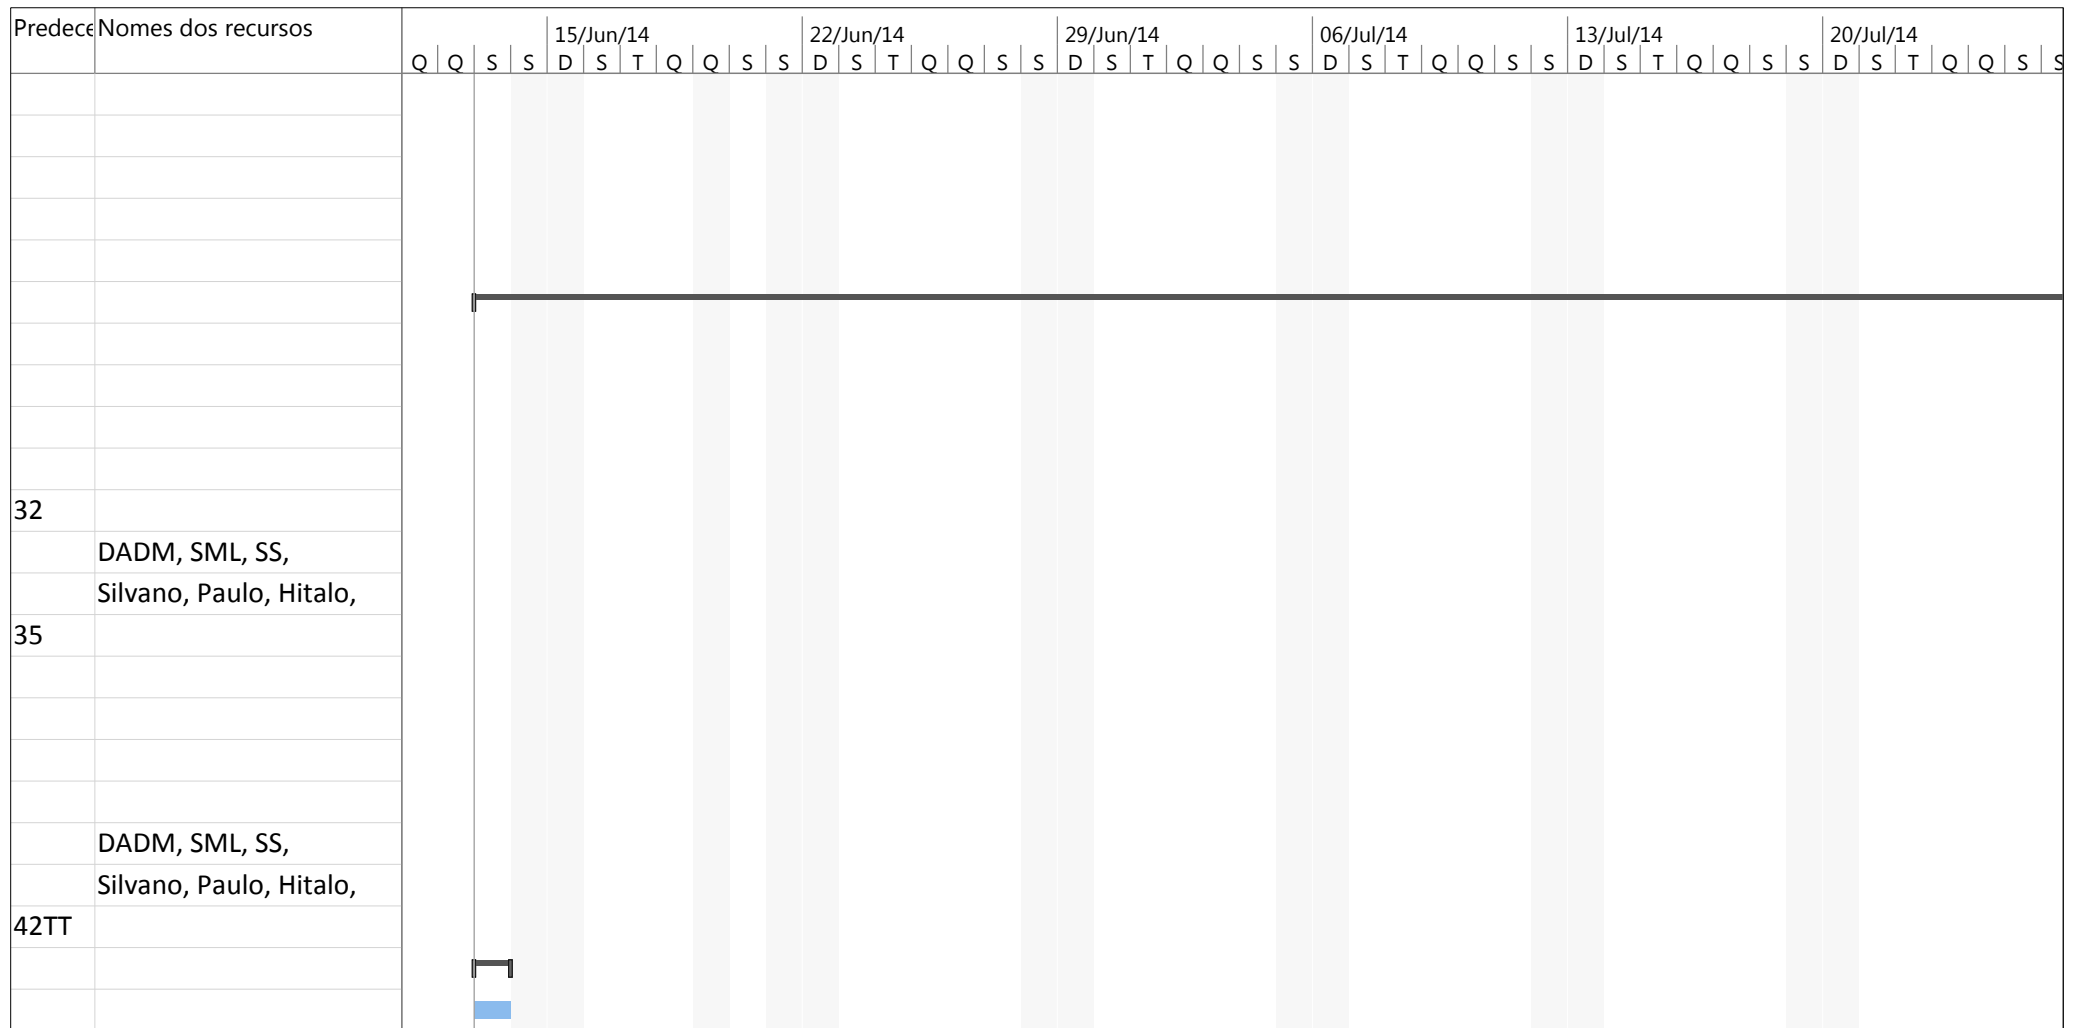


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

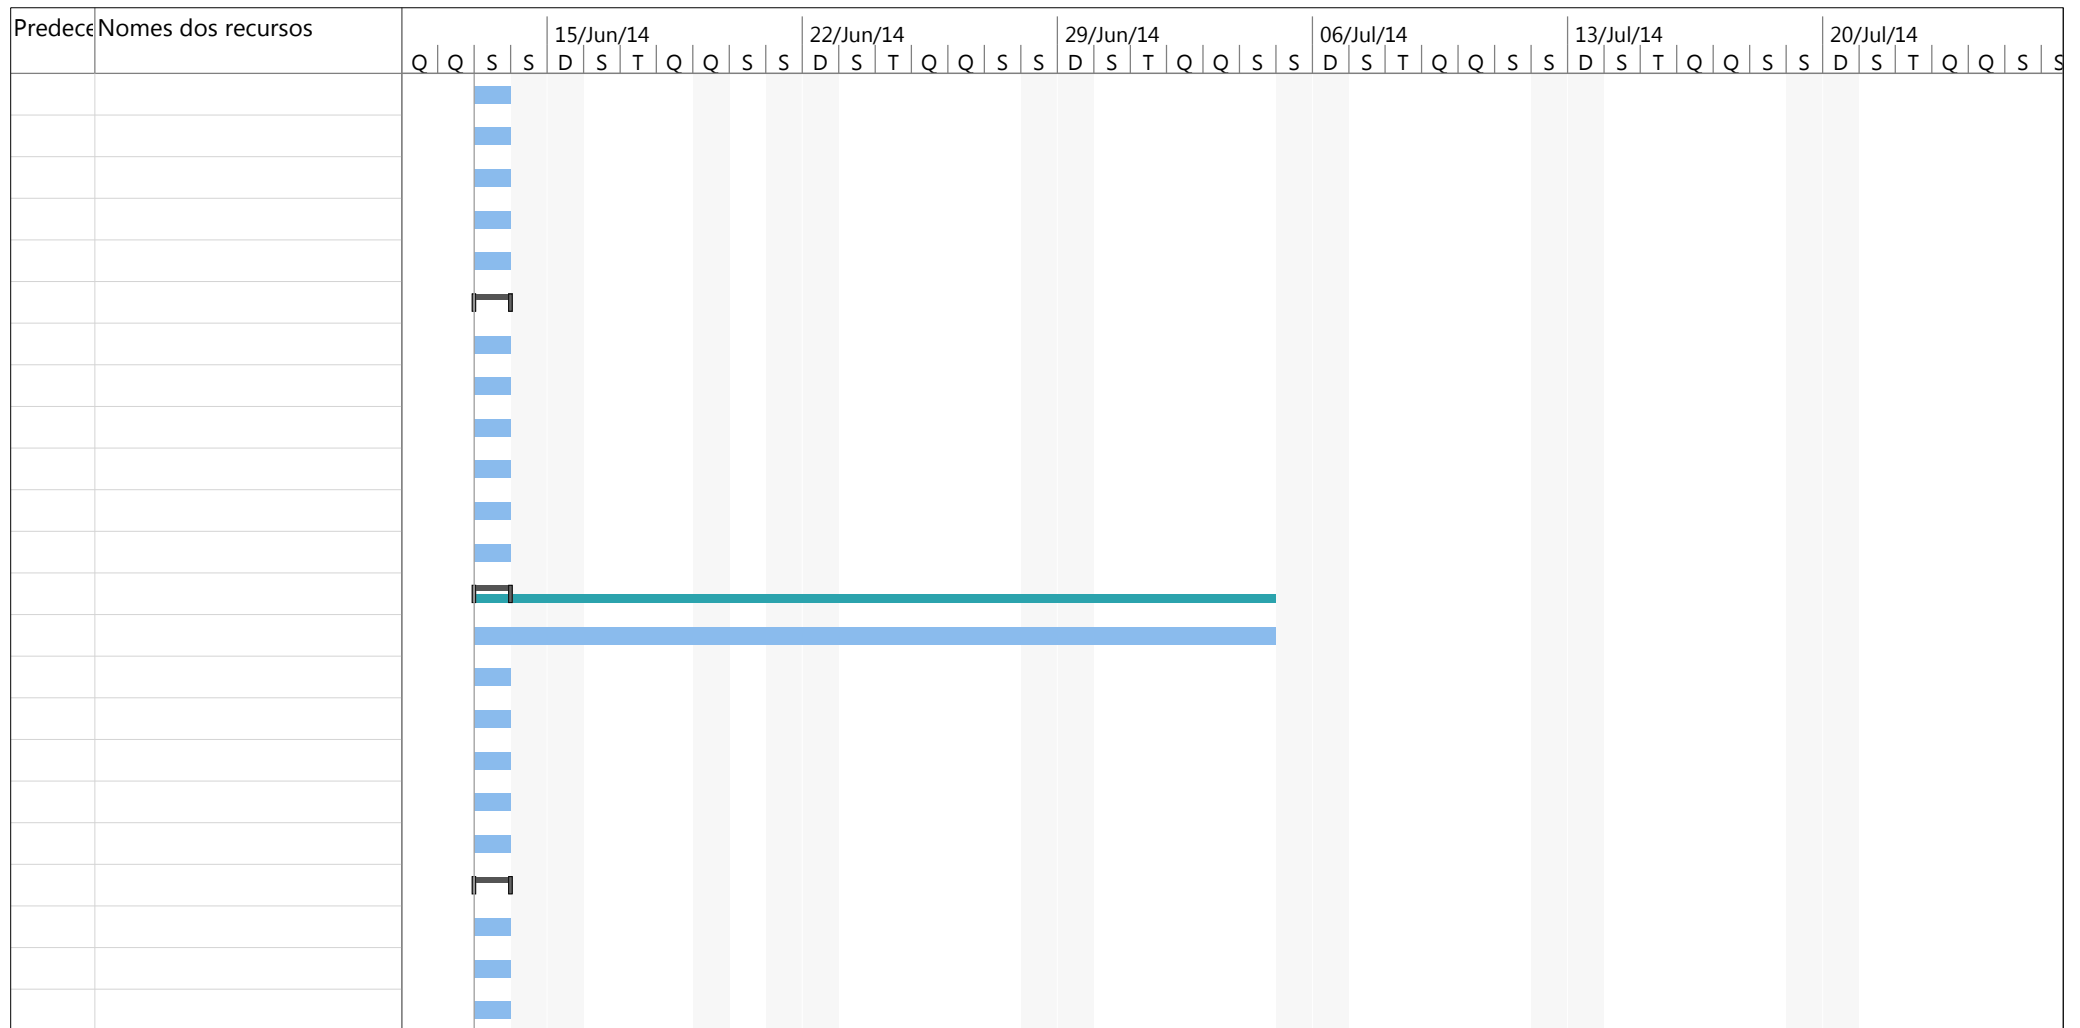


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

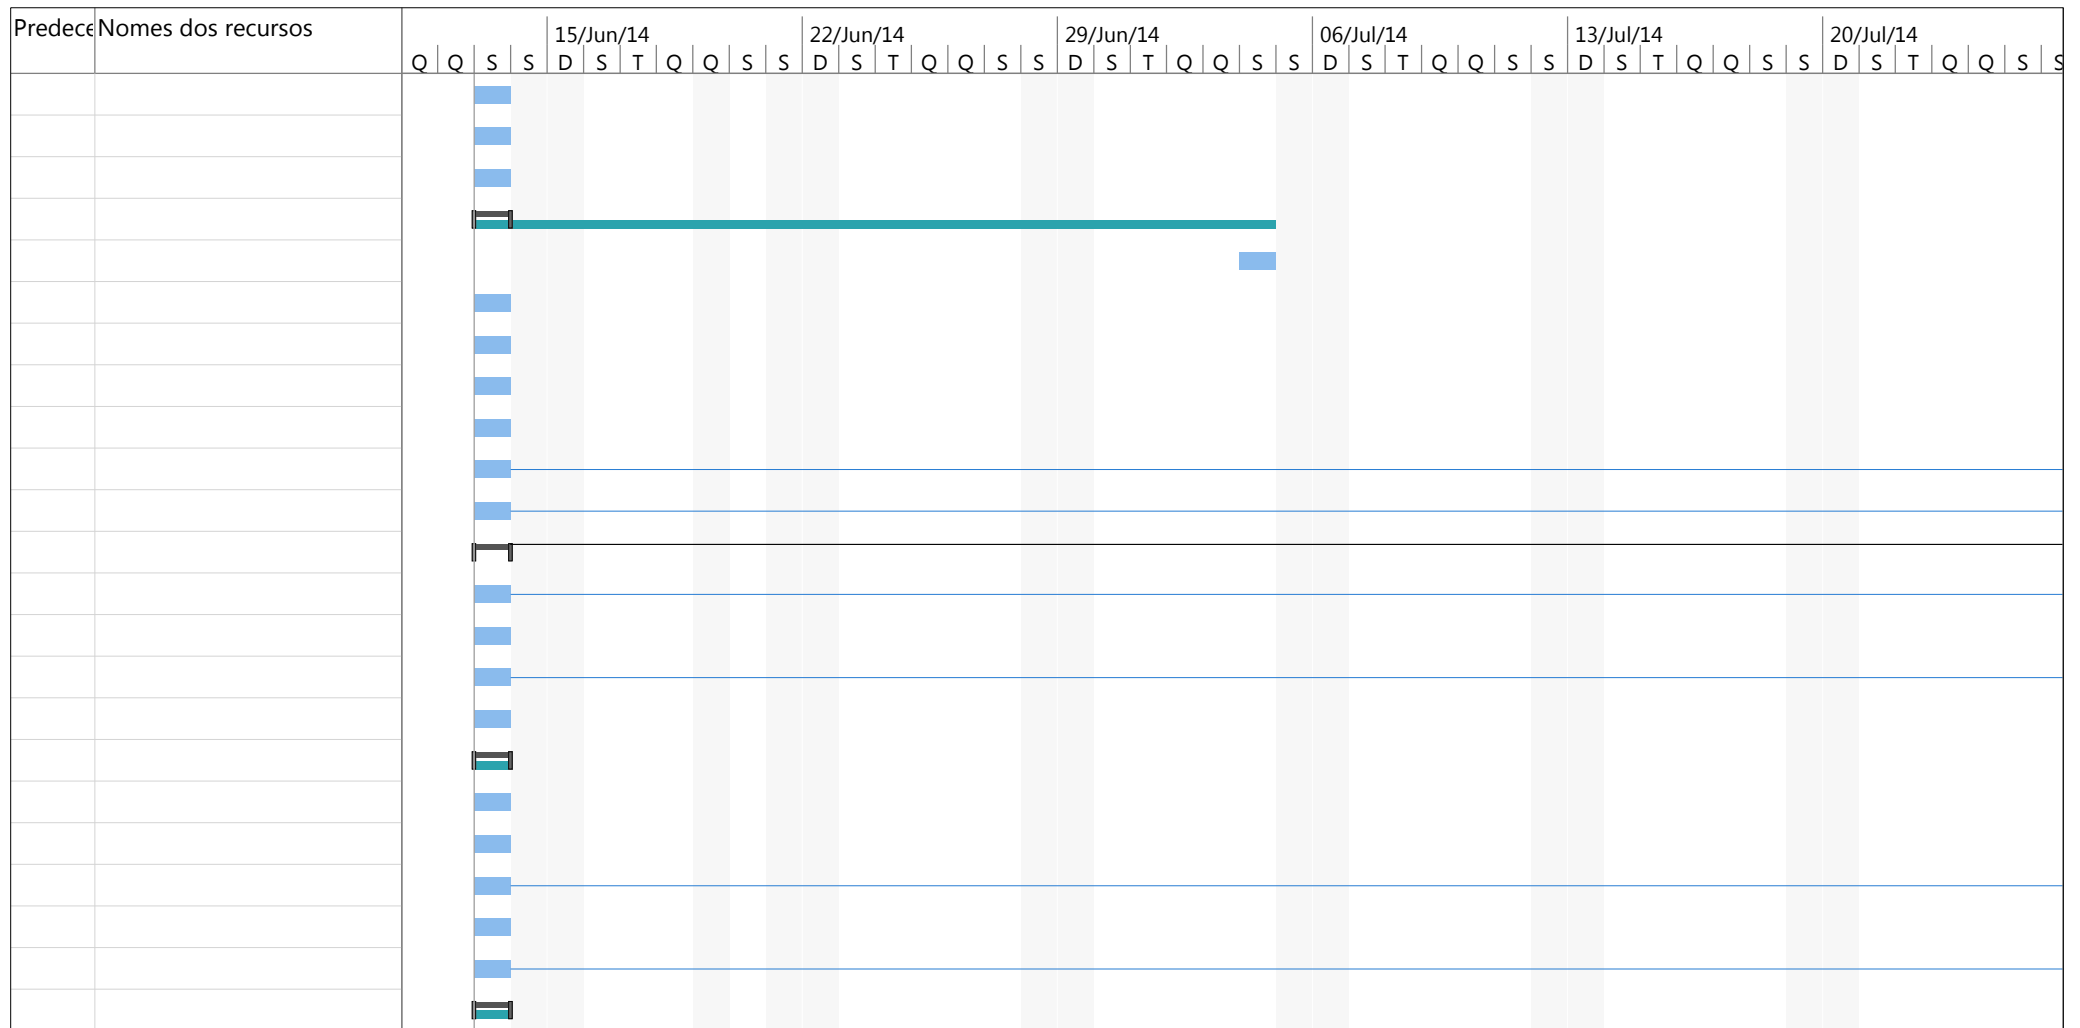

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

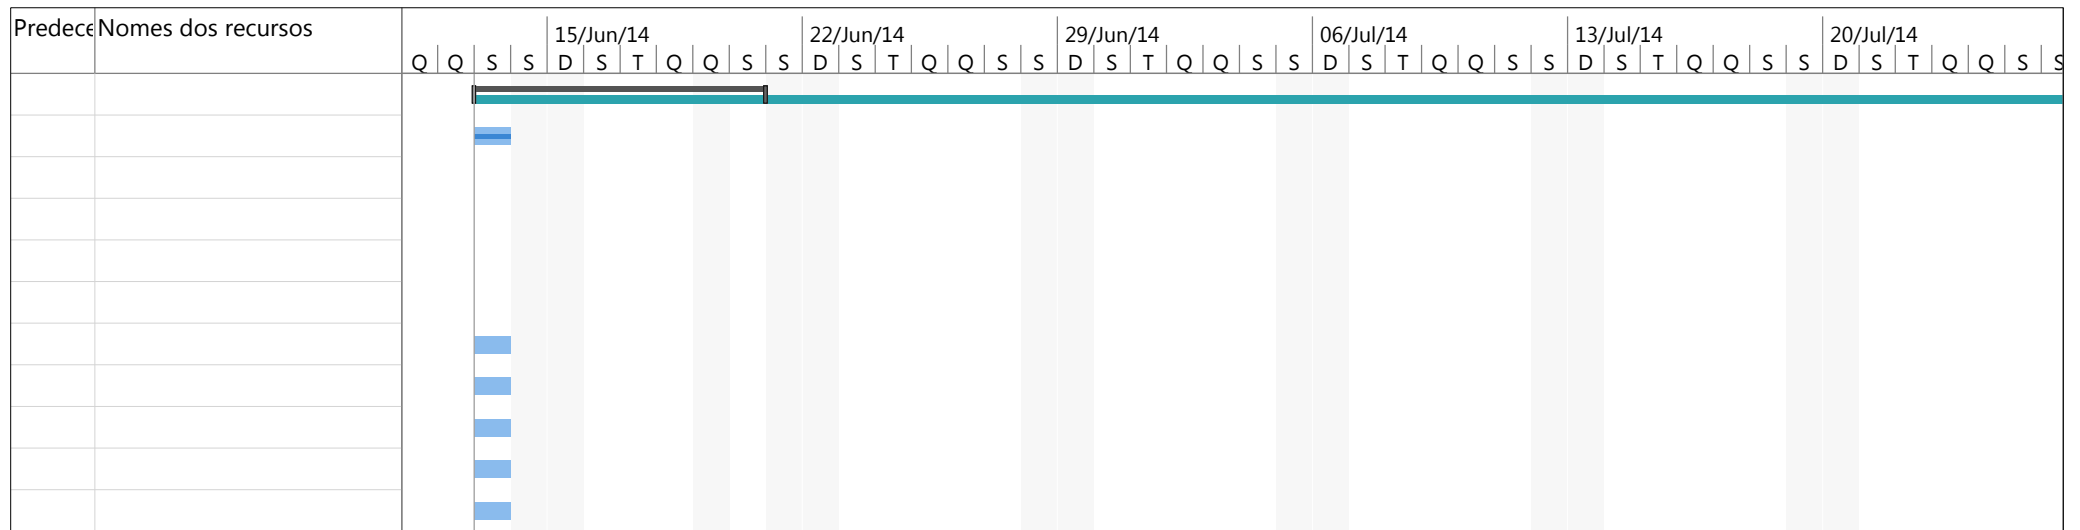


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Sângela/Henrique?Gilmar

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

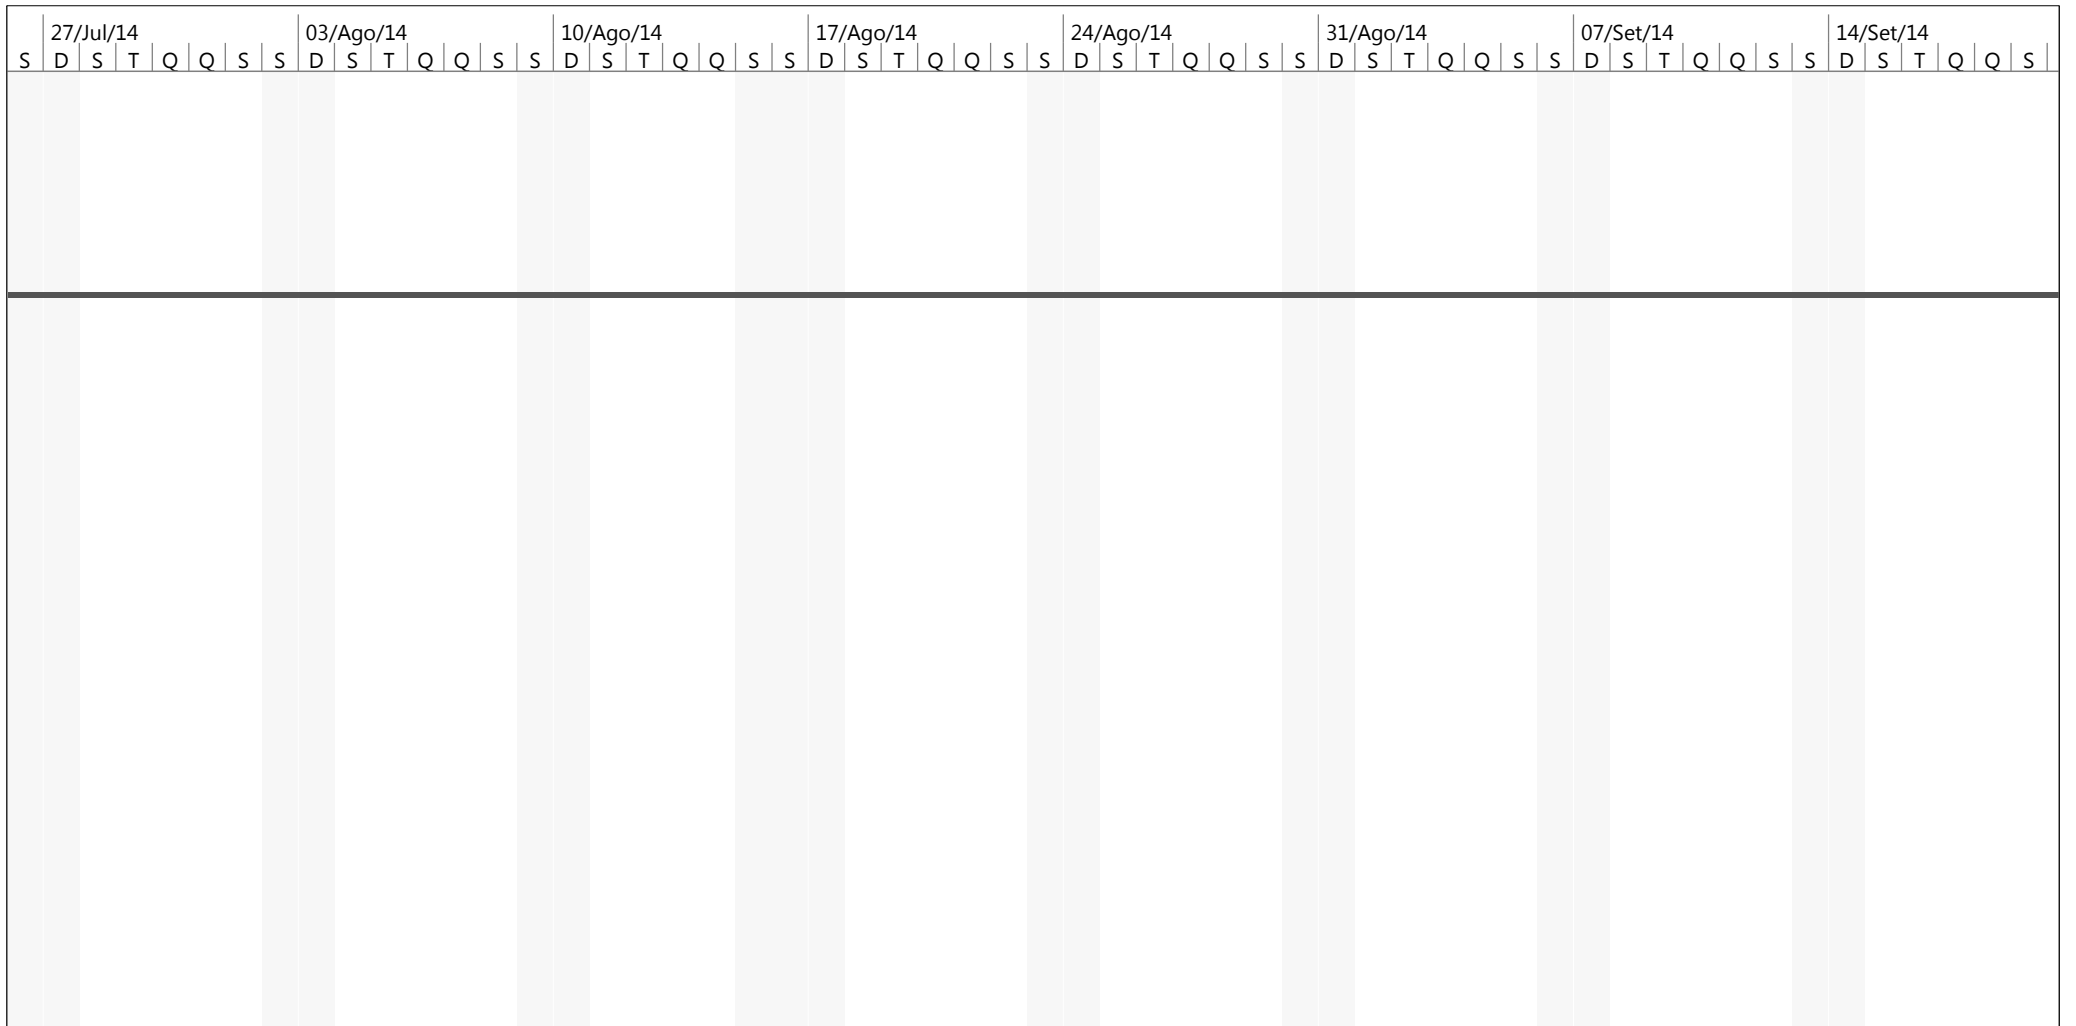


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				




Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

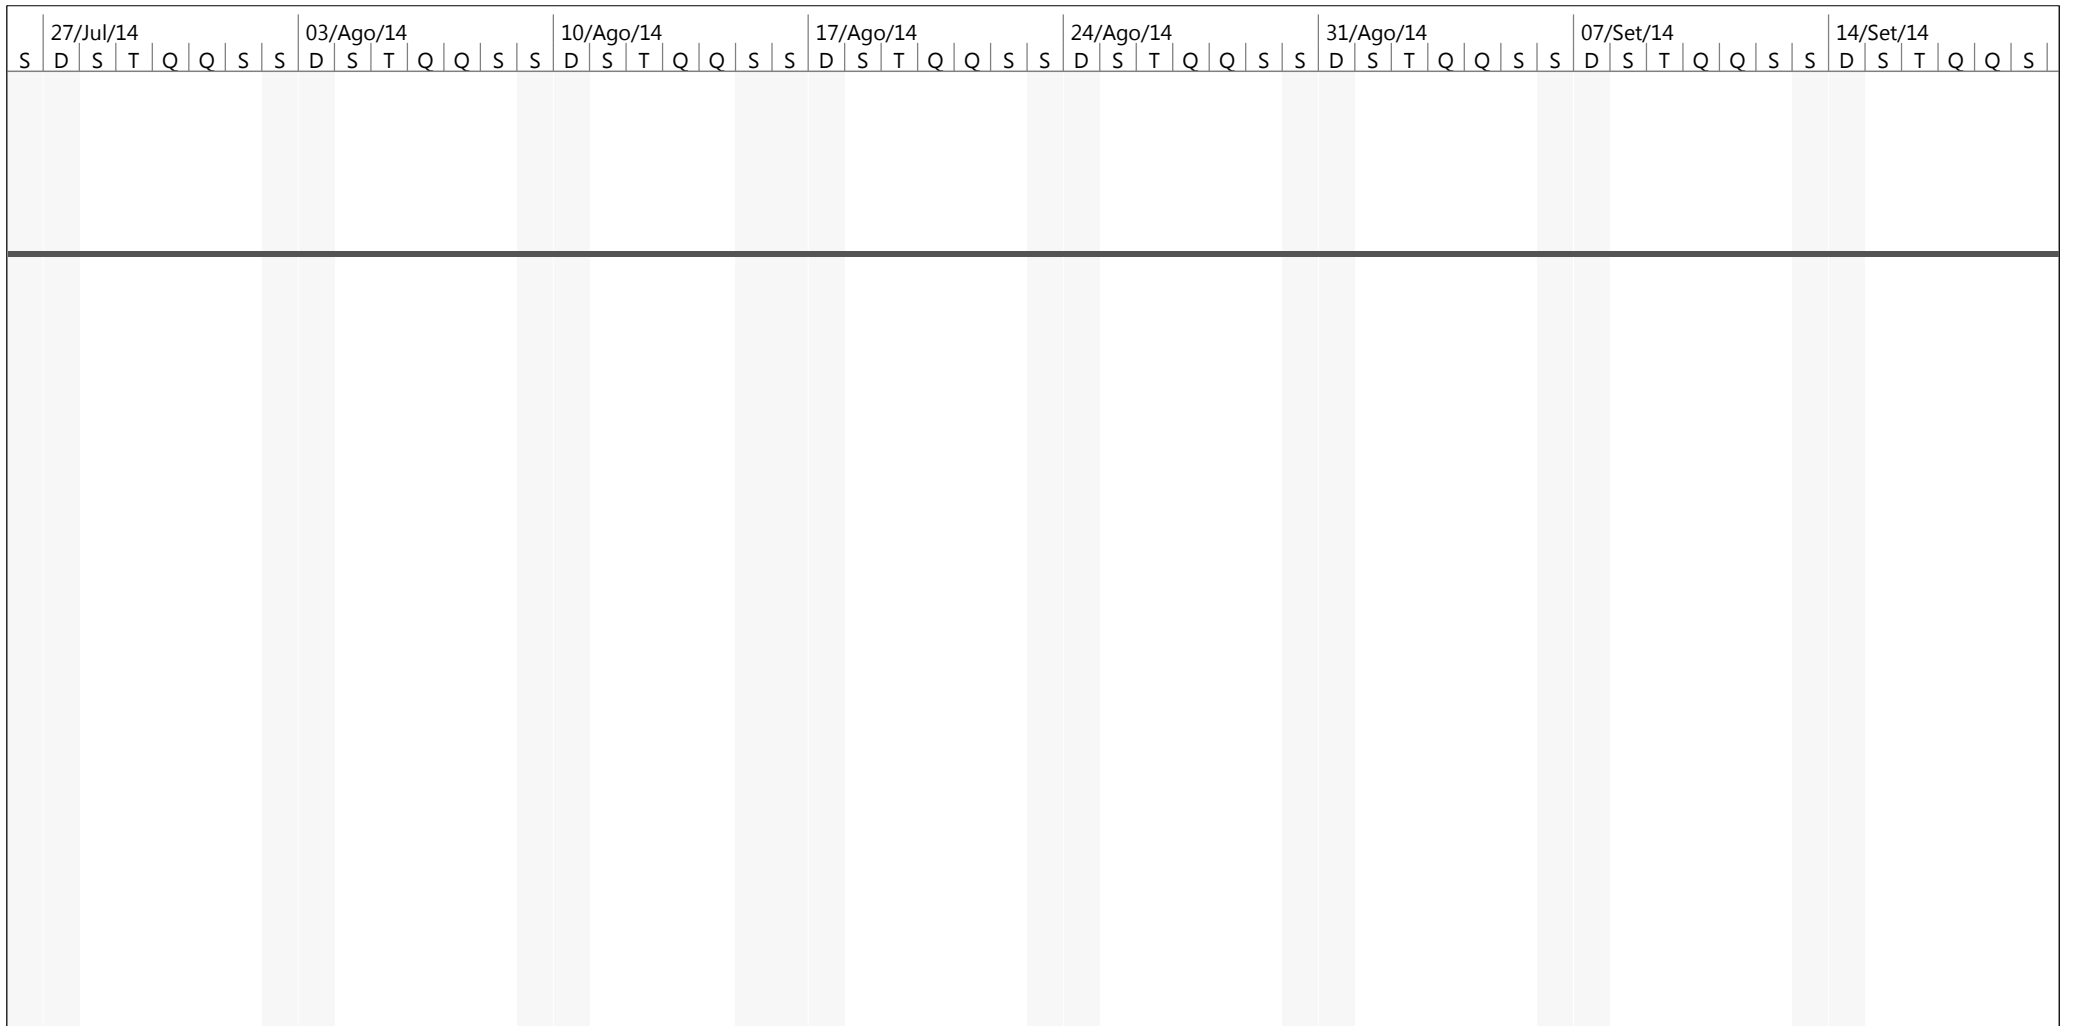

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17



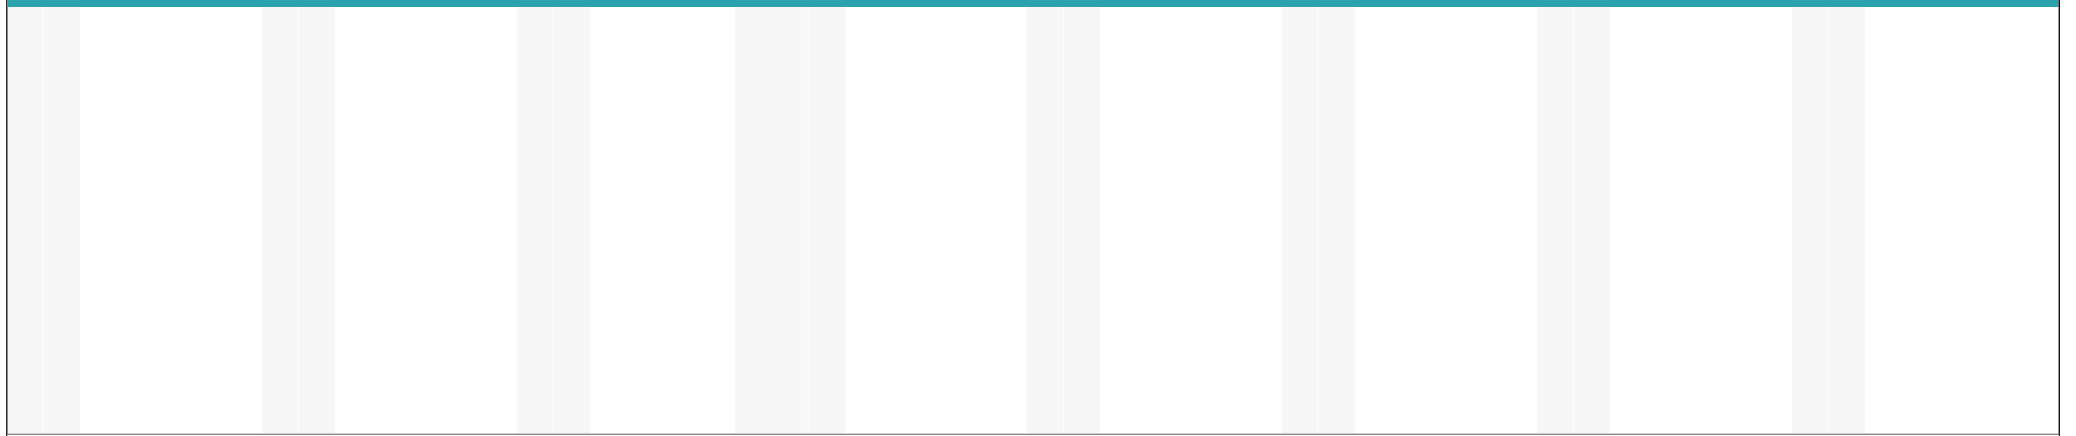















Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

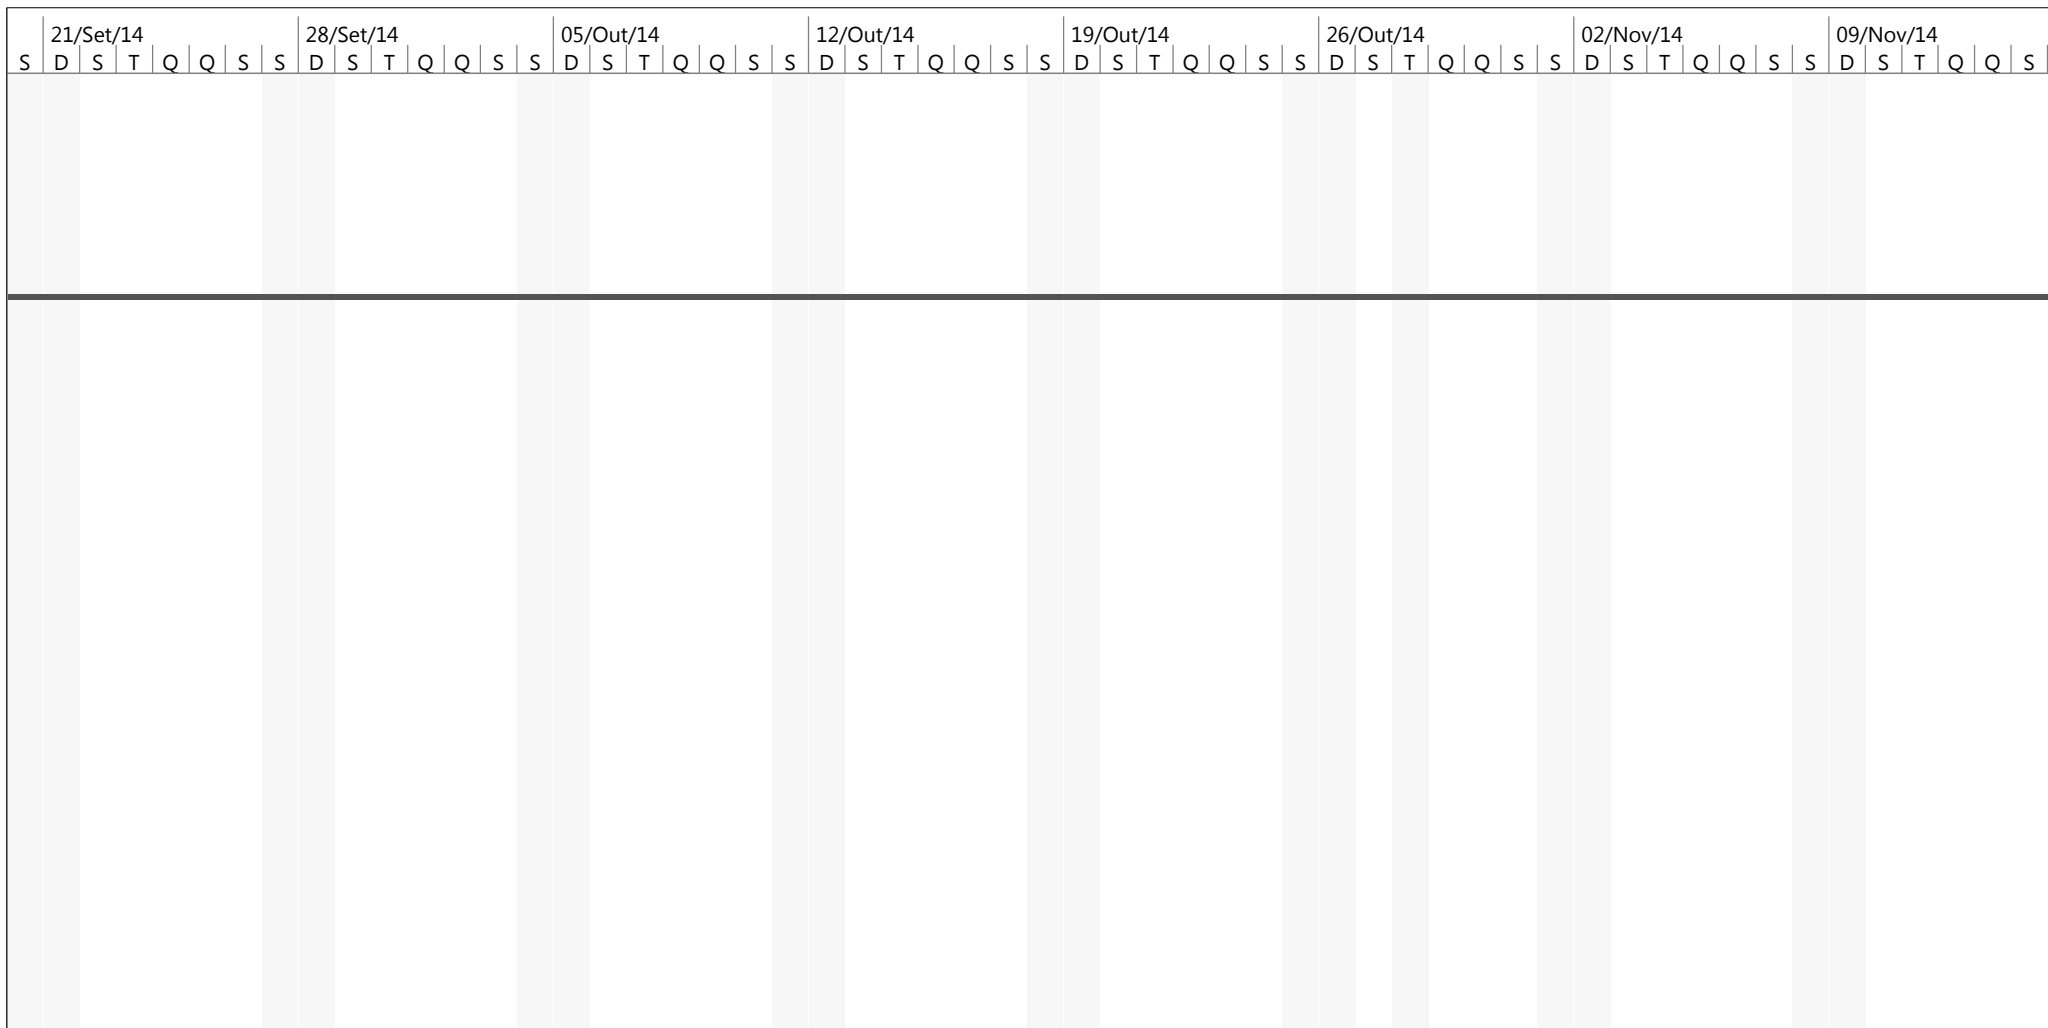


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

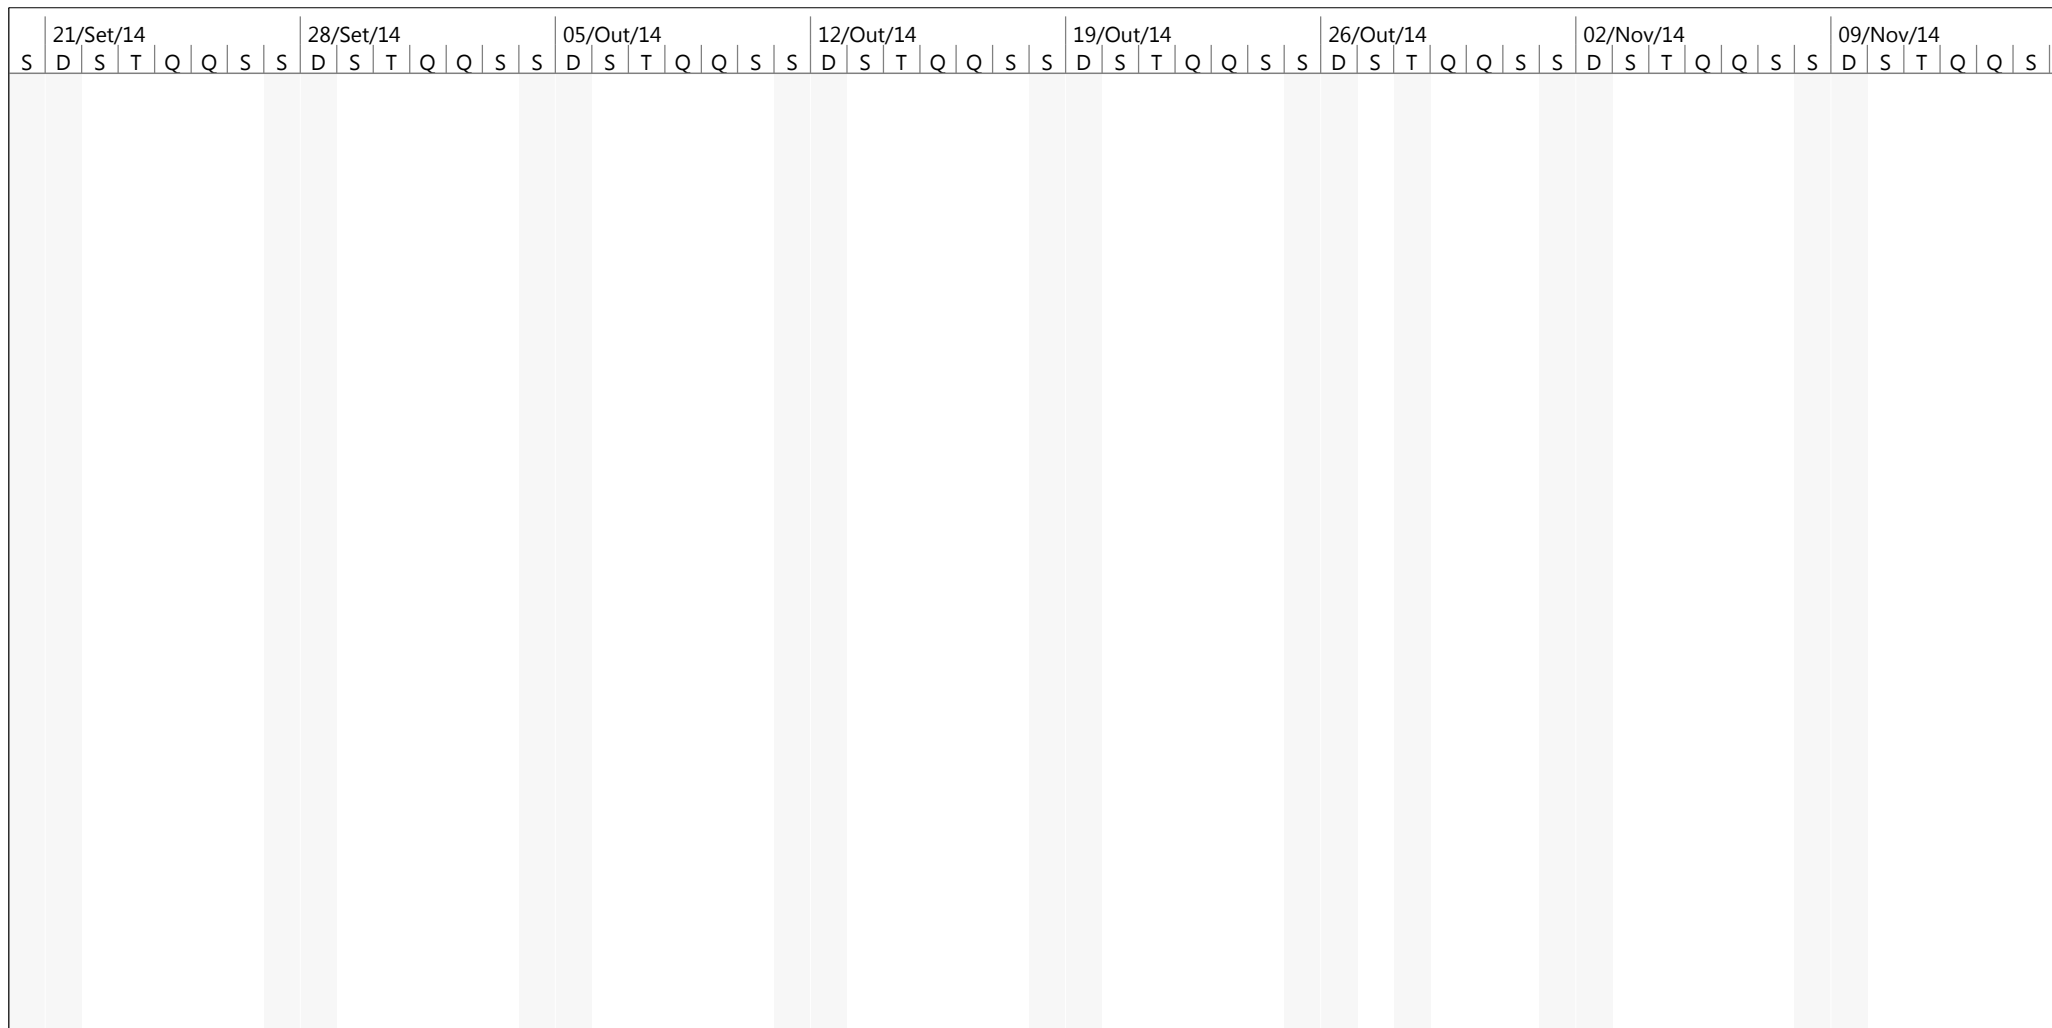


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

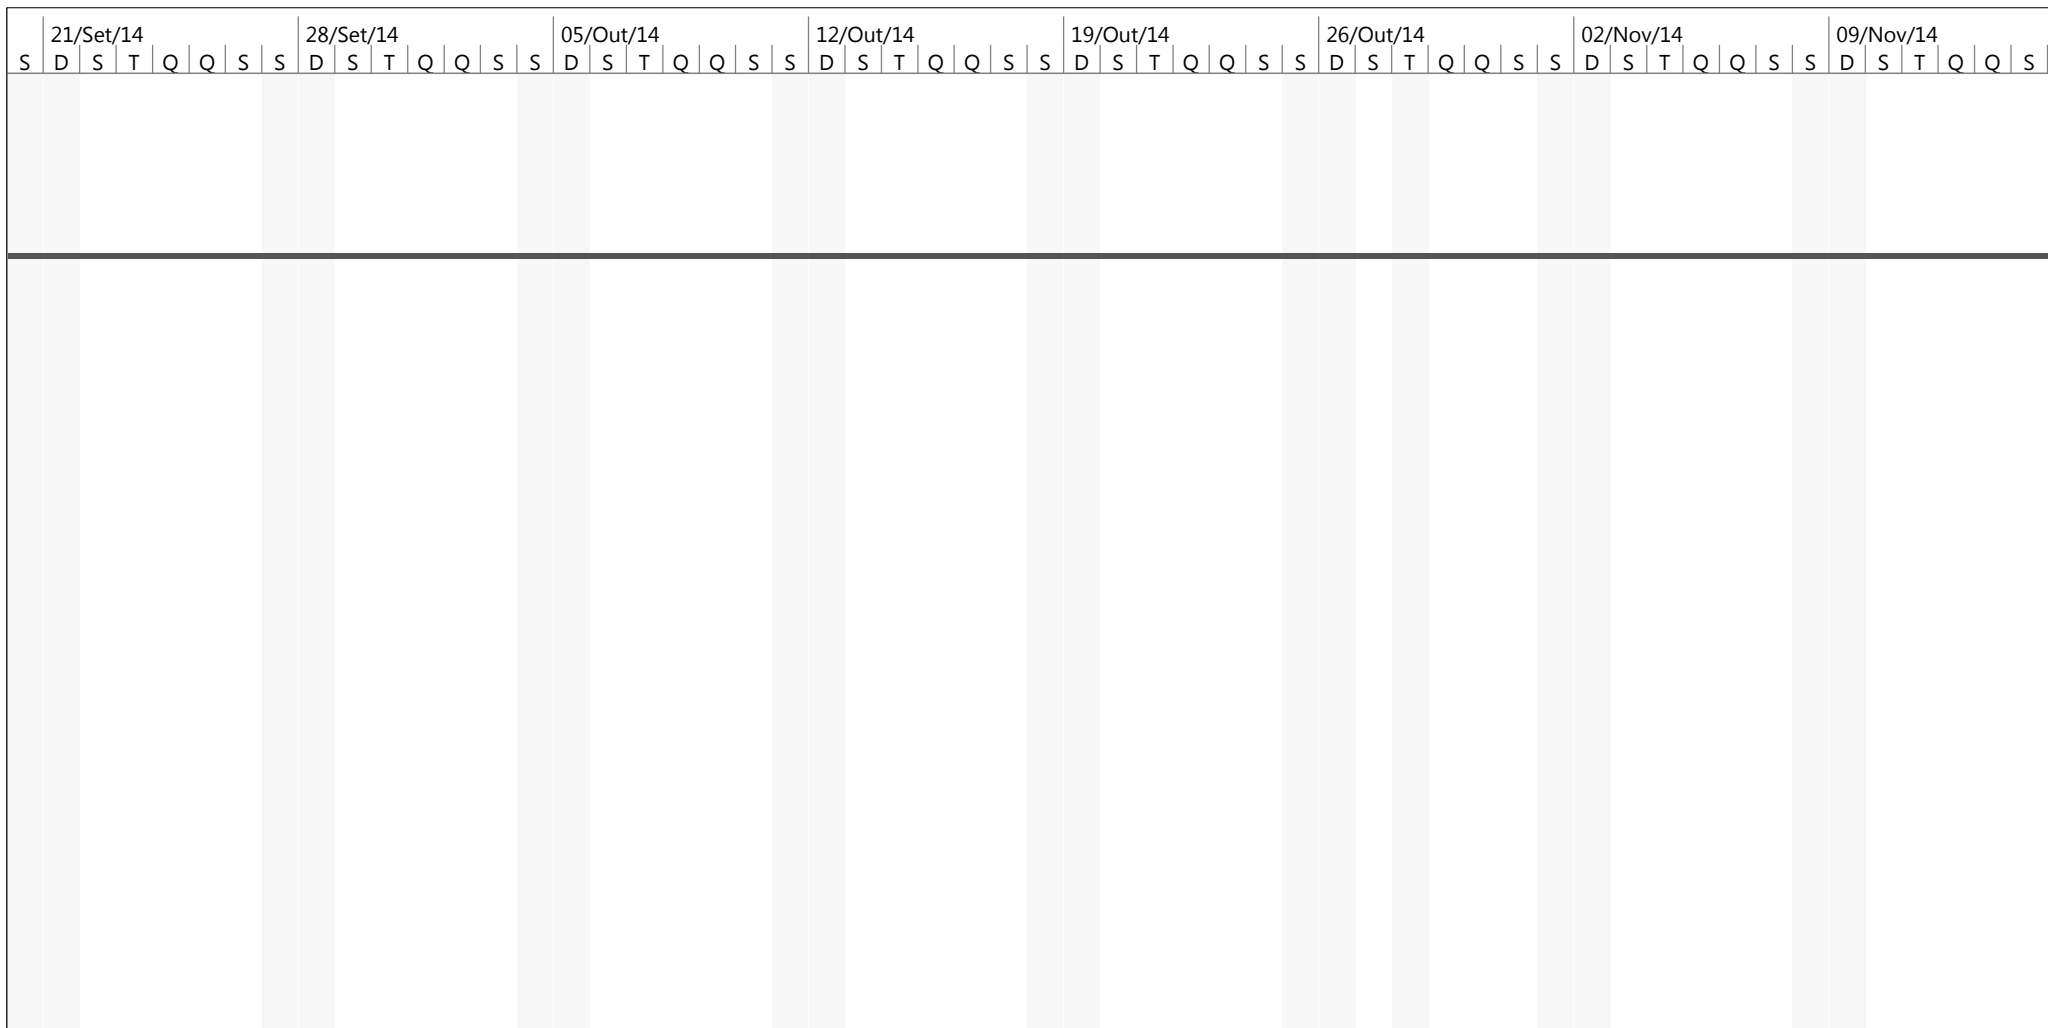


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

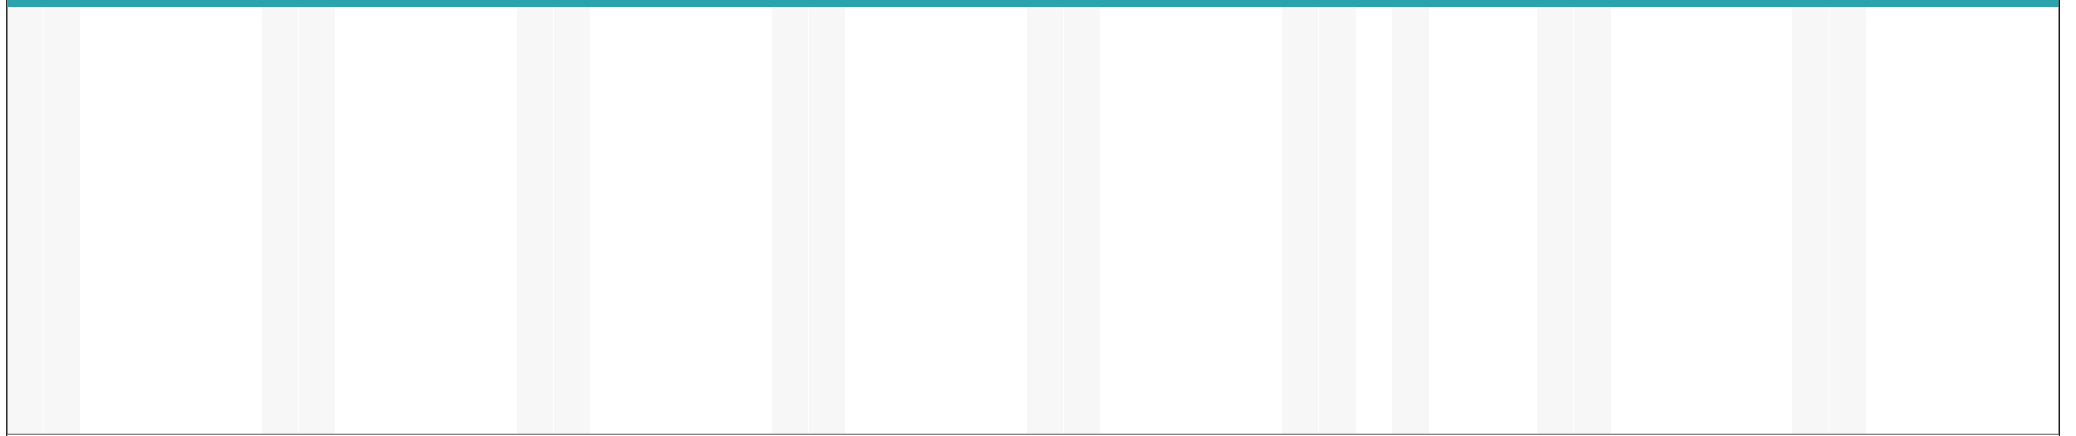


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

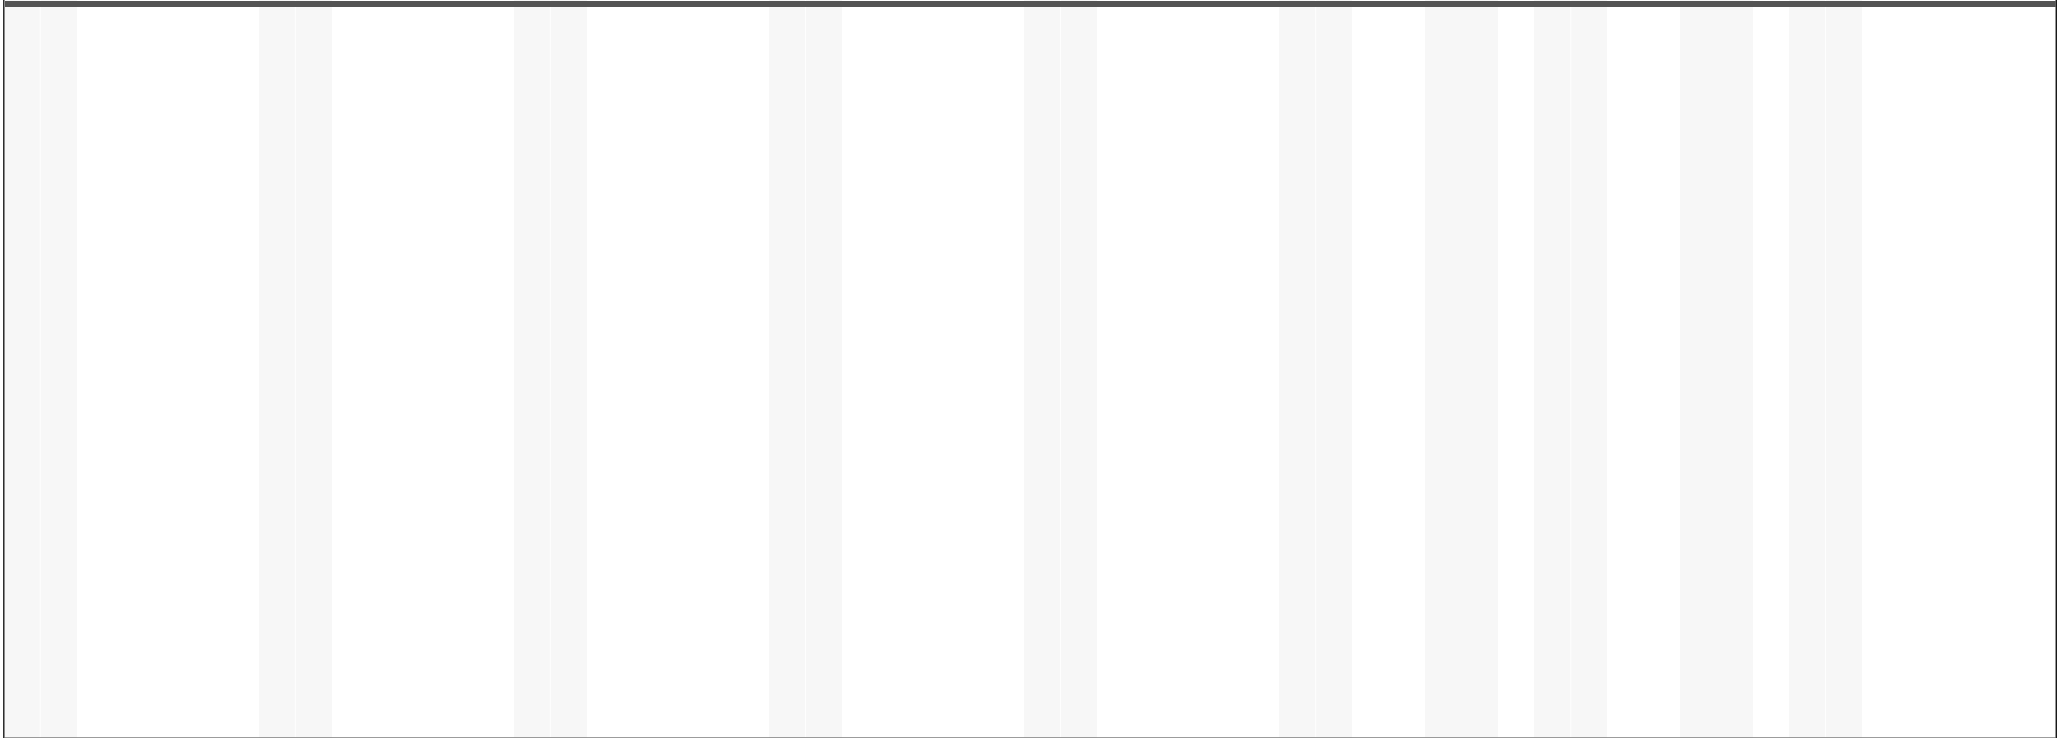


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

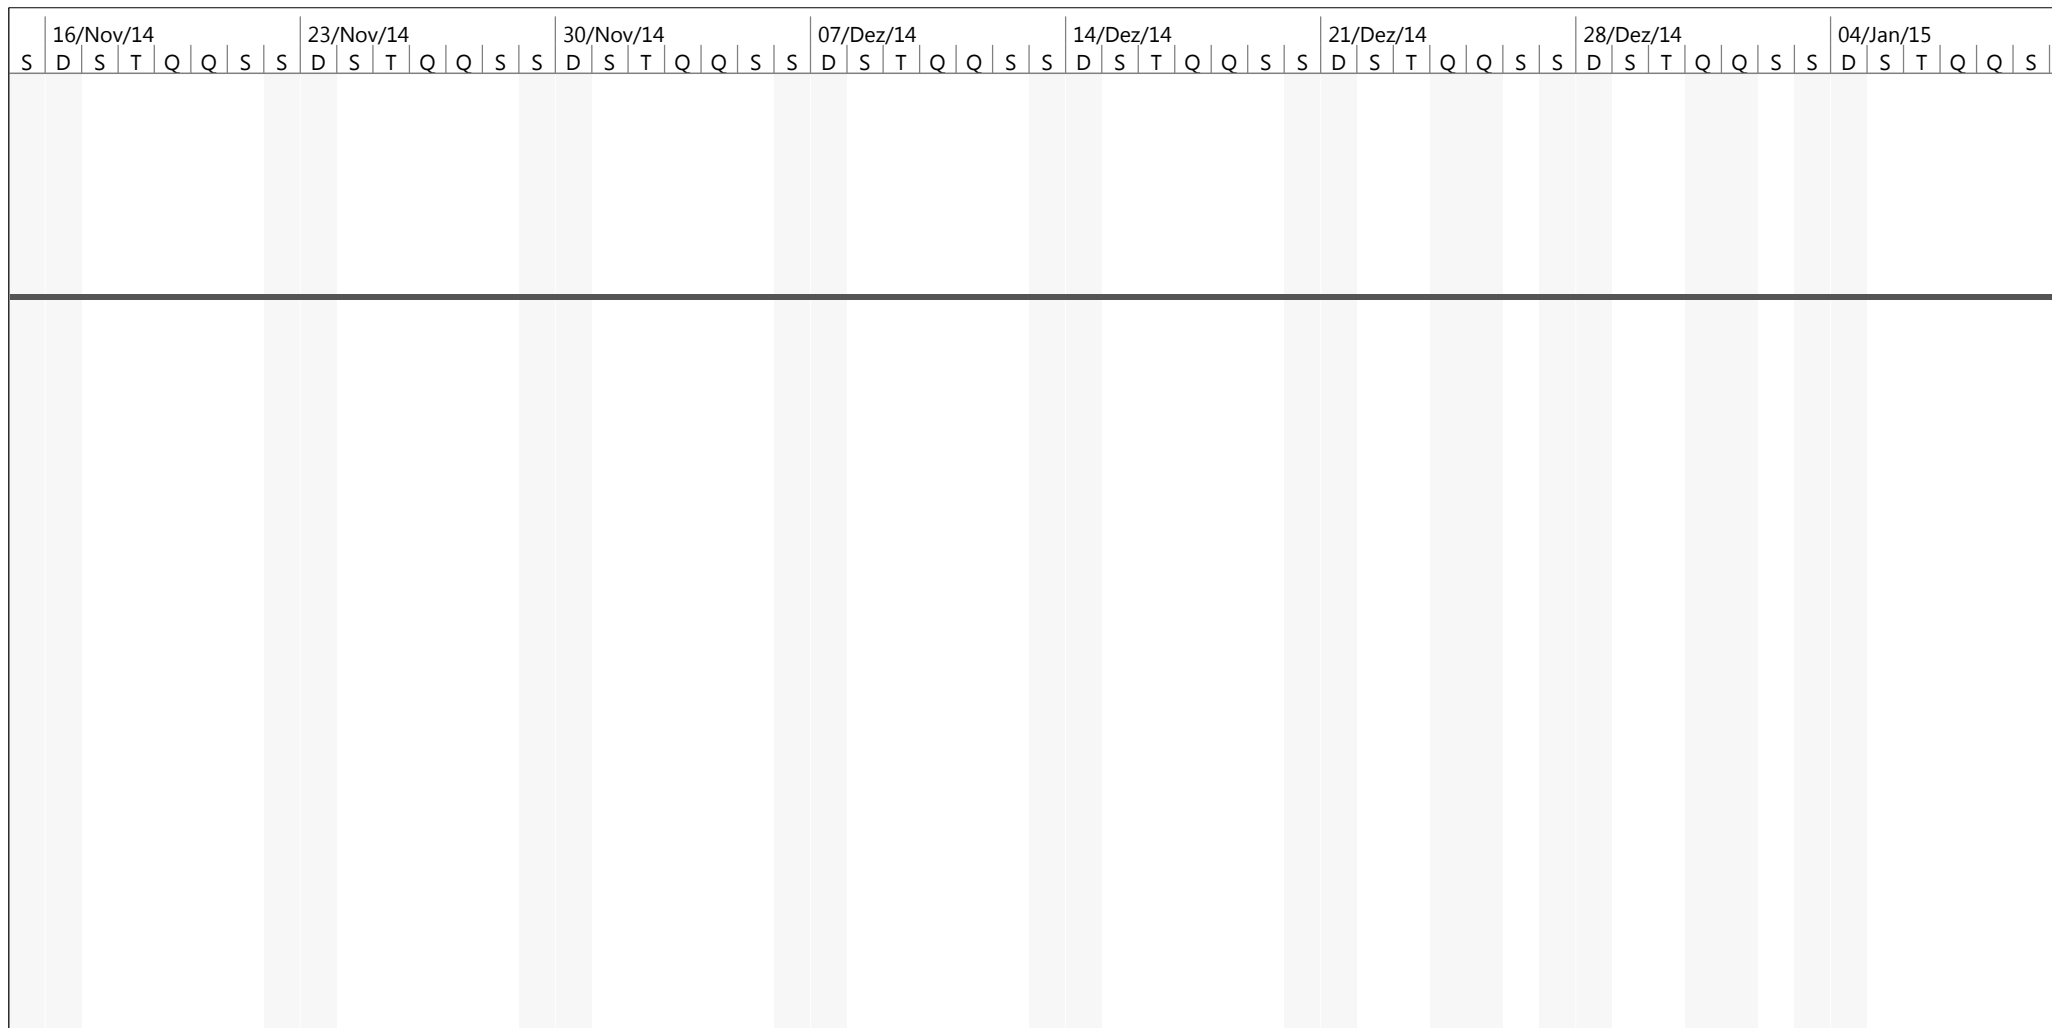


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

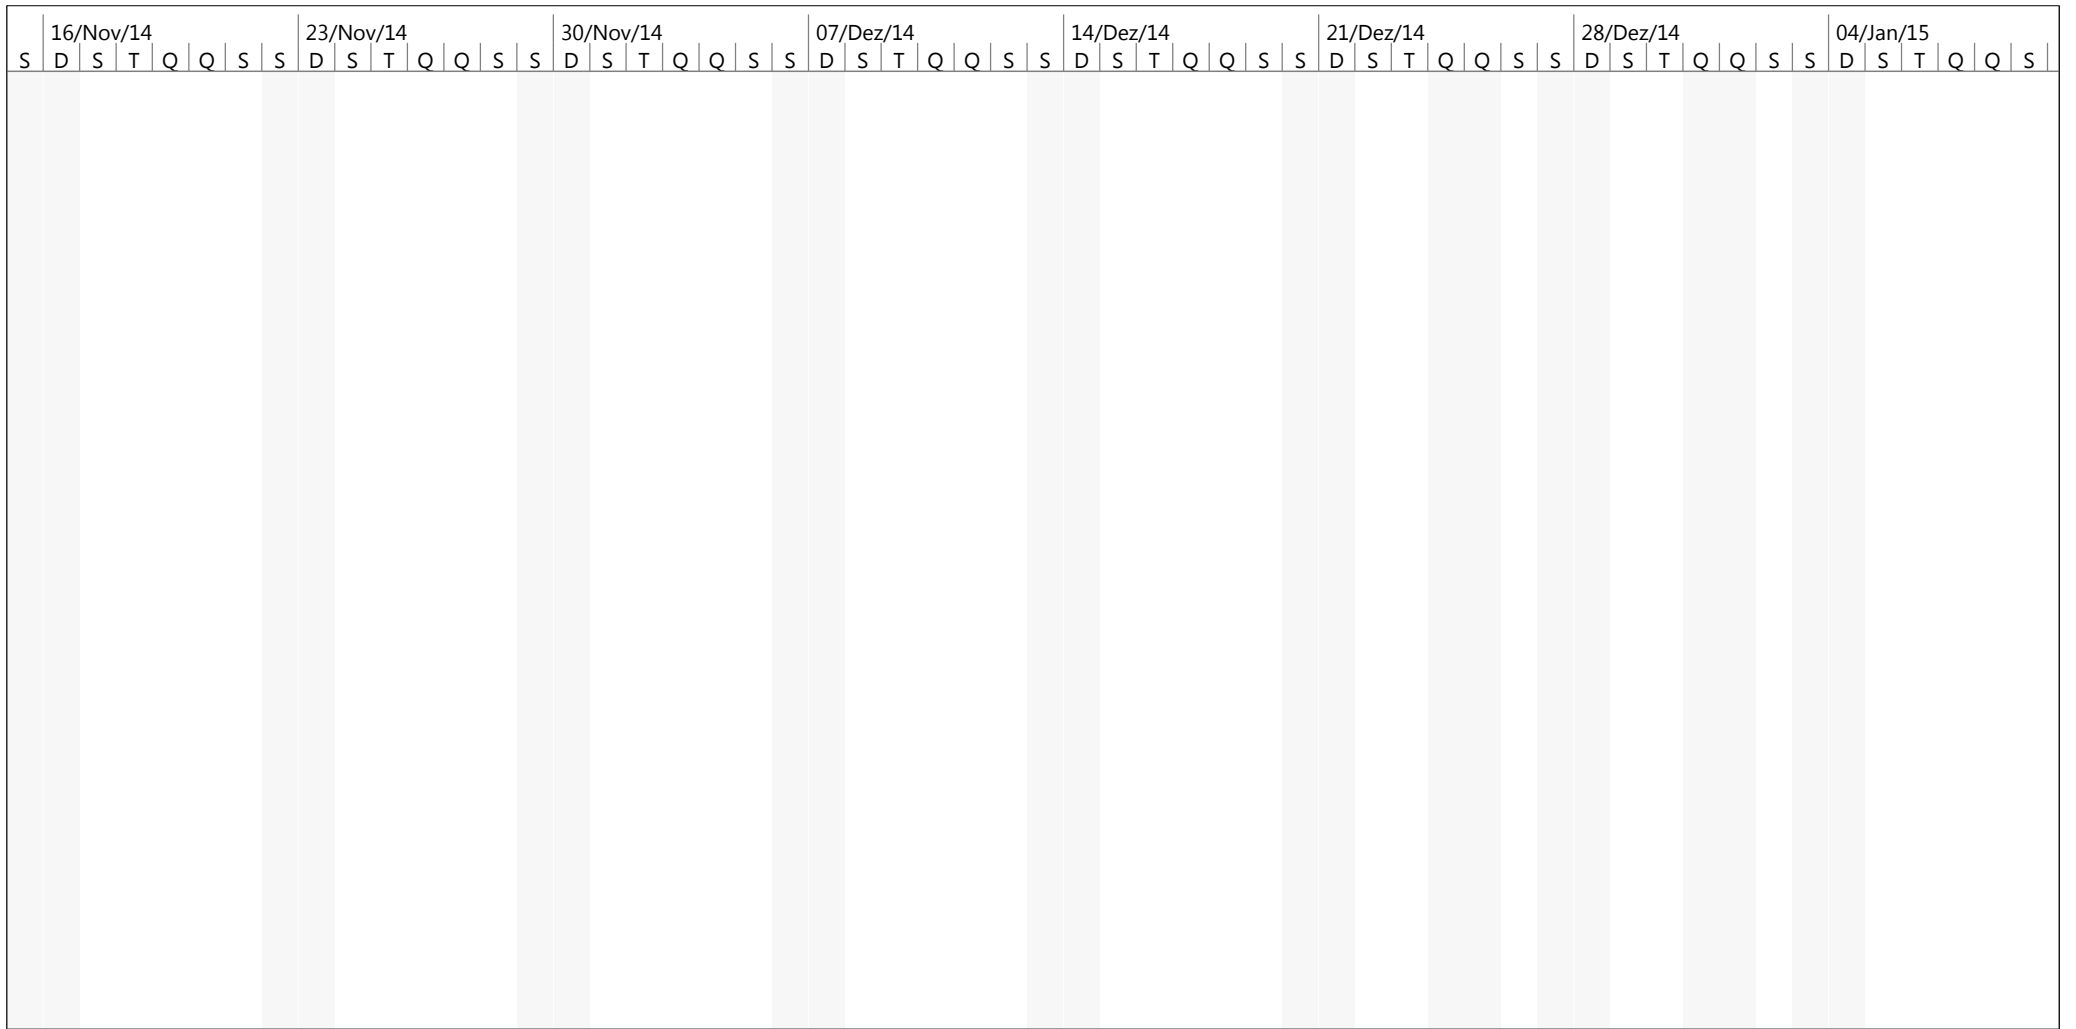


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

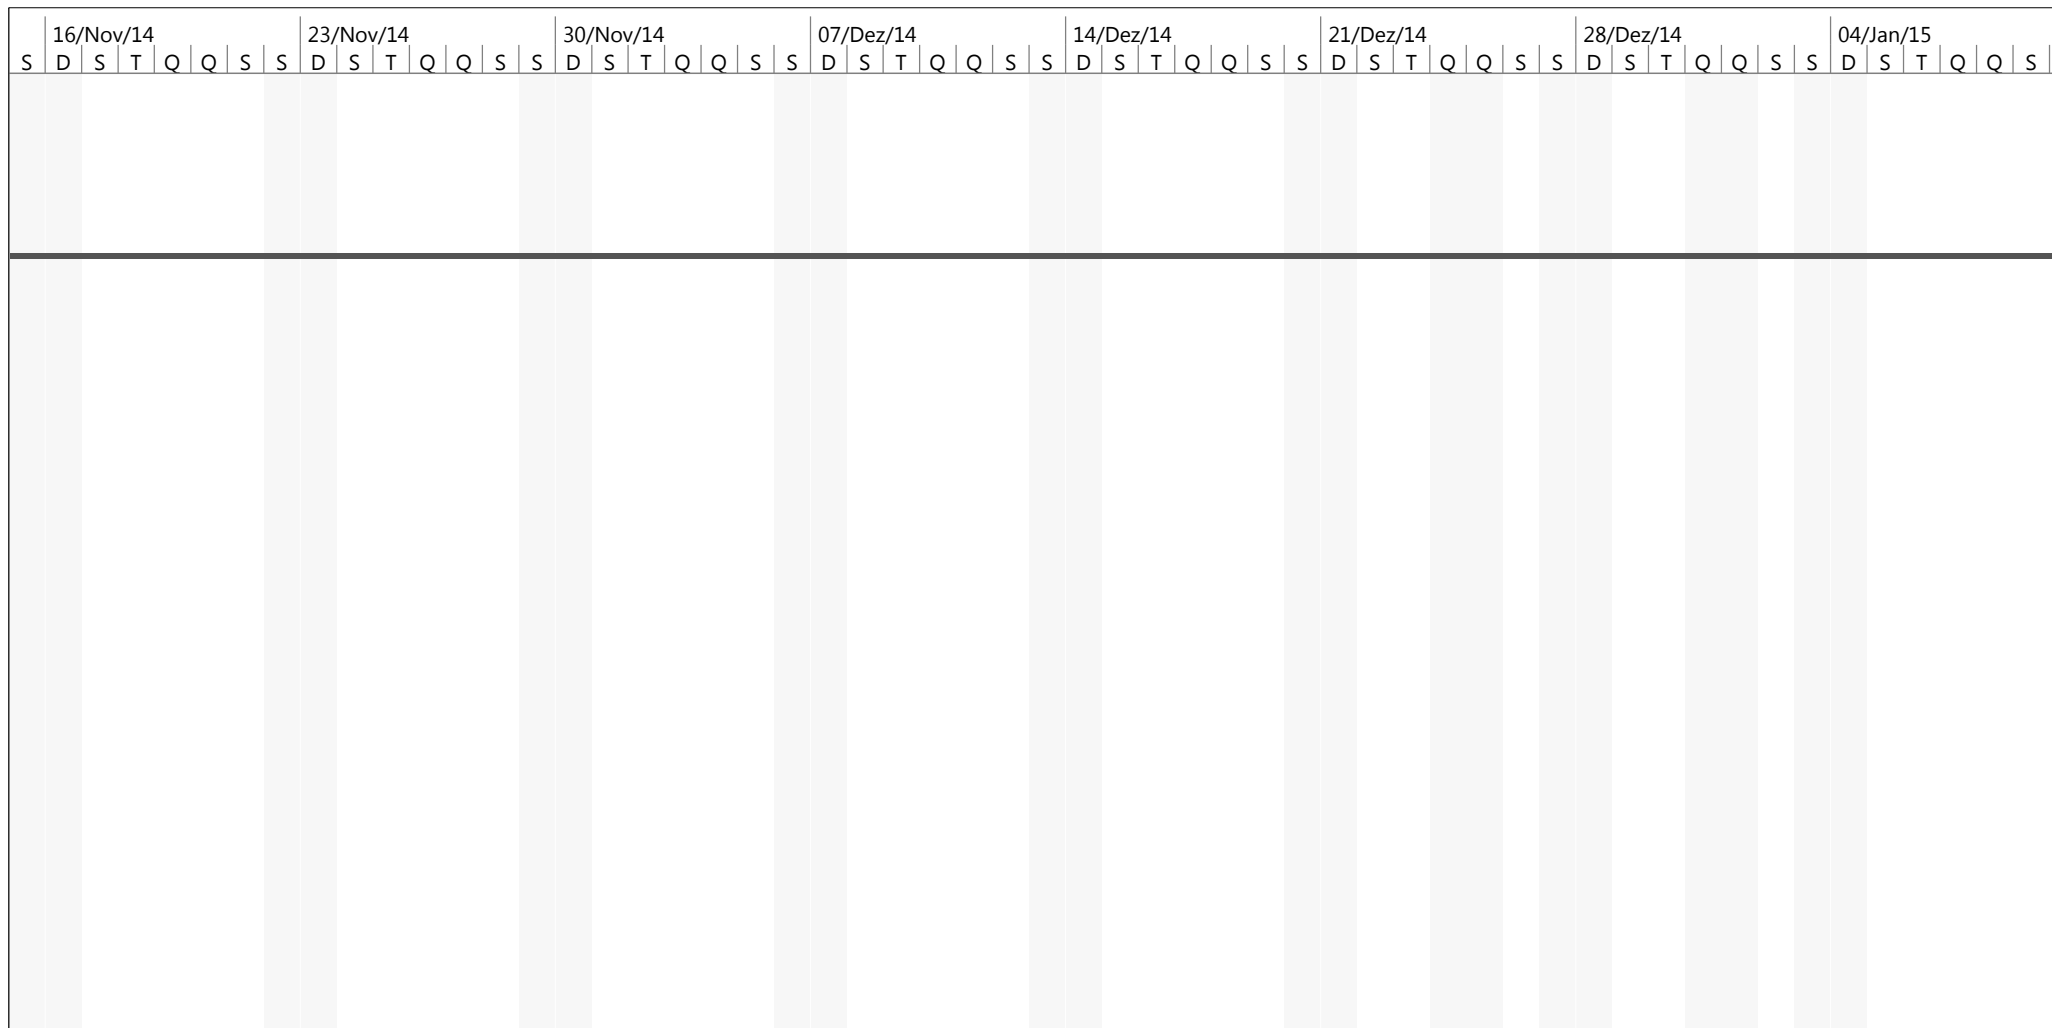


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

16/Nov/14 23/Nov/14 30/Nov/14 07/Dez/14 14/Dez/14 21/Dez/14 28/Dez/14 04/Jan/15
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

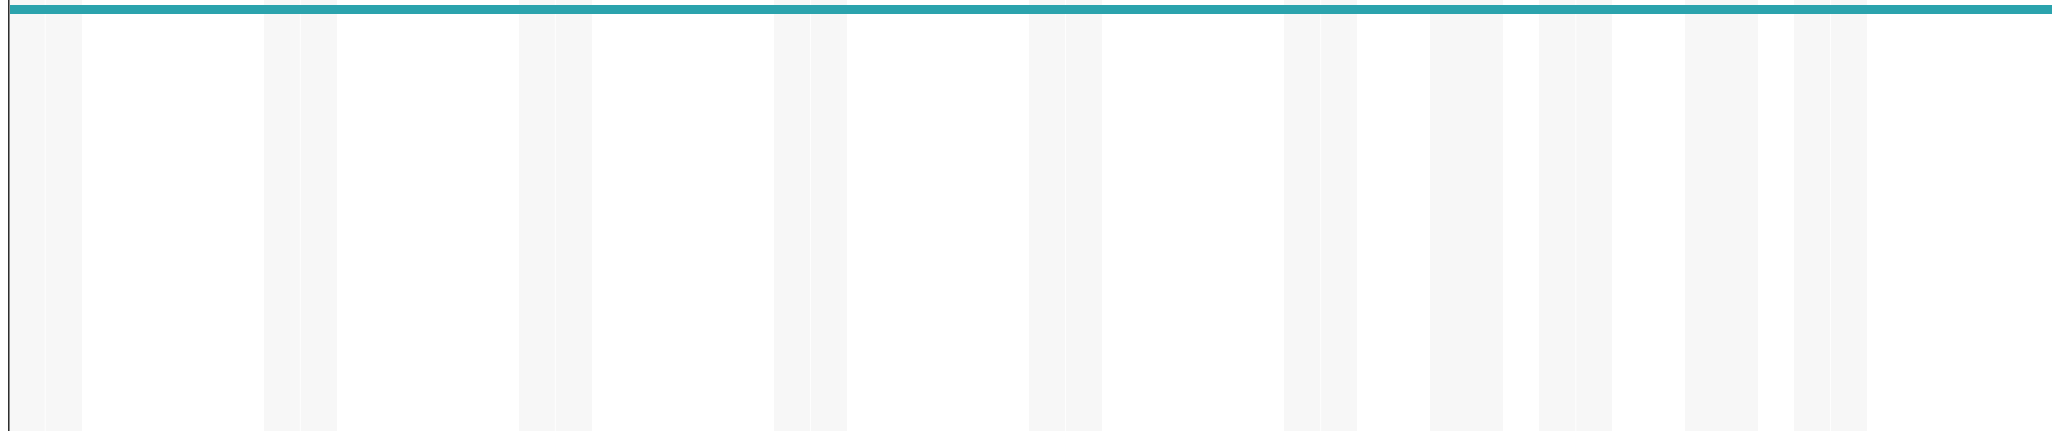


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

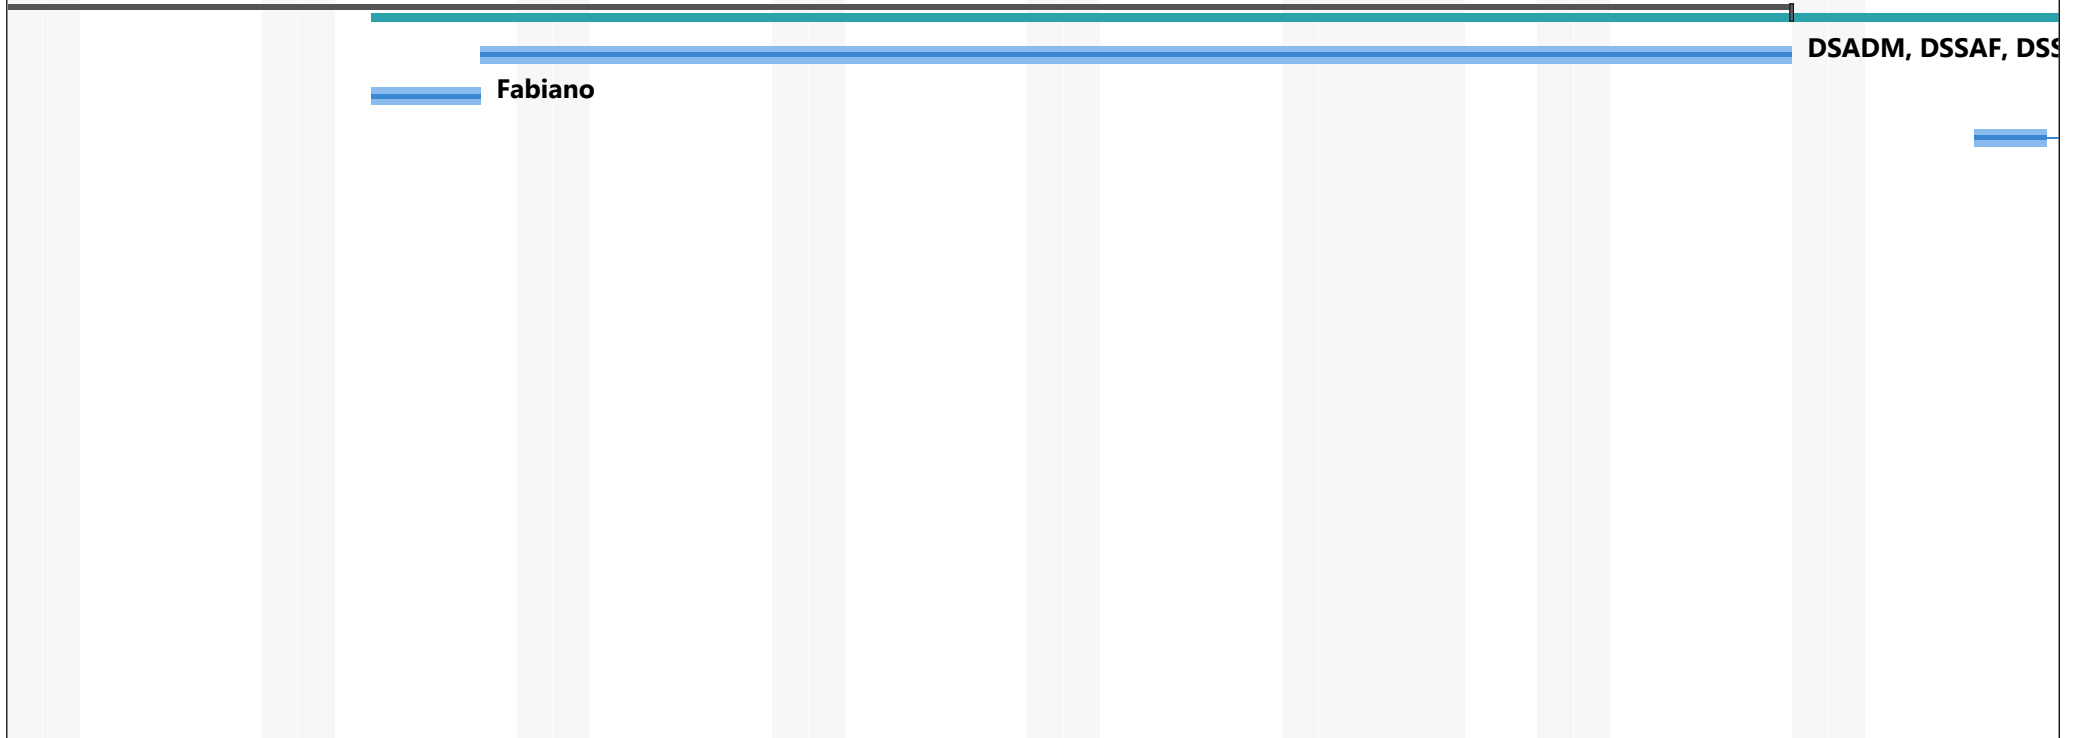


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

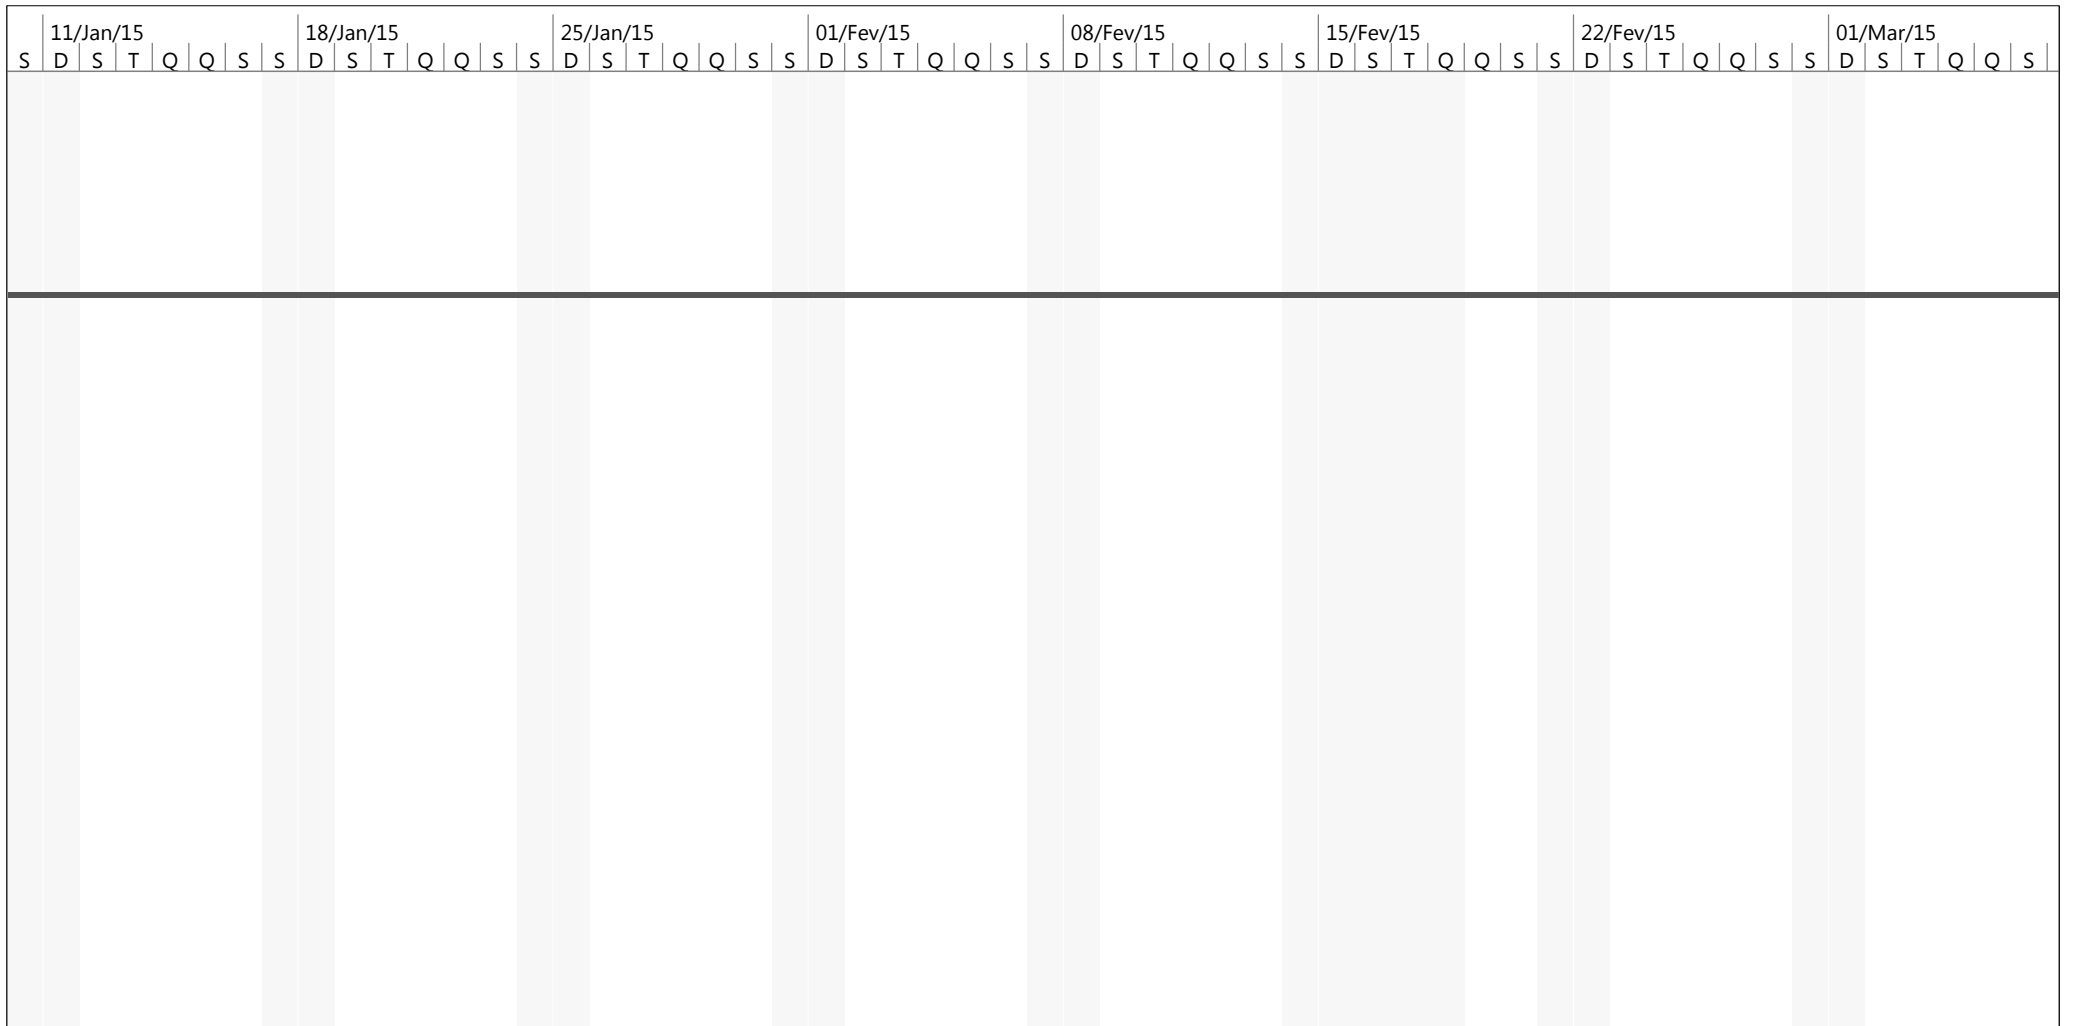


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

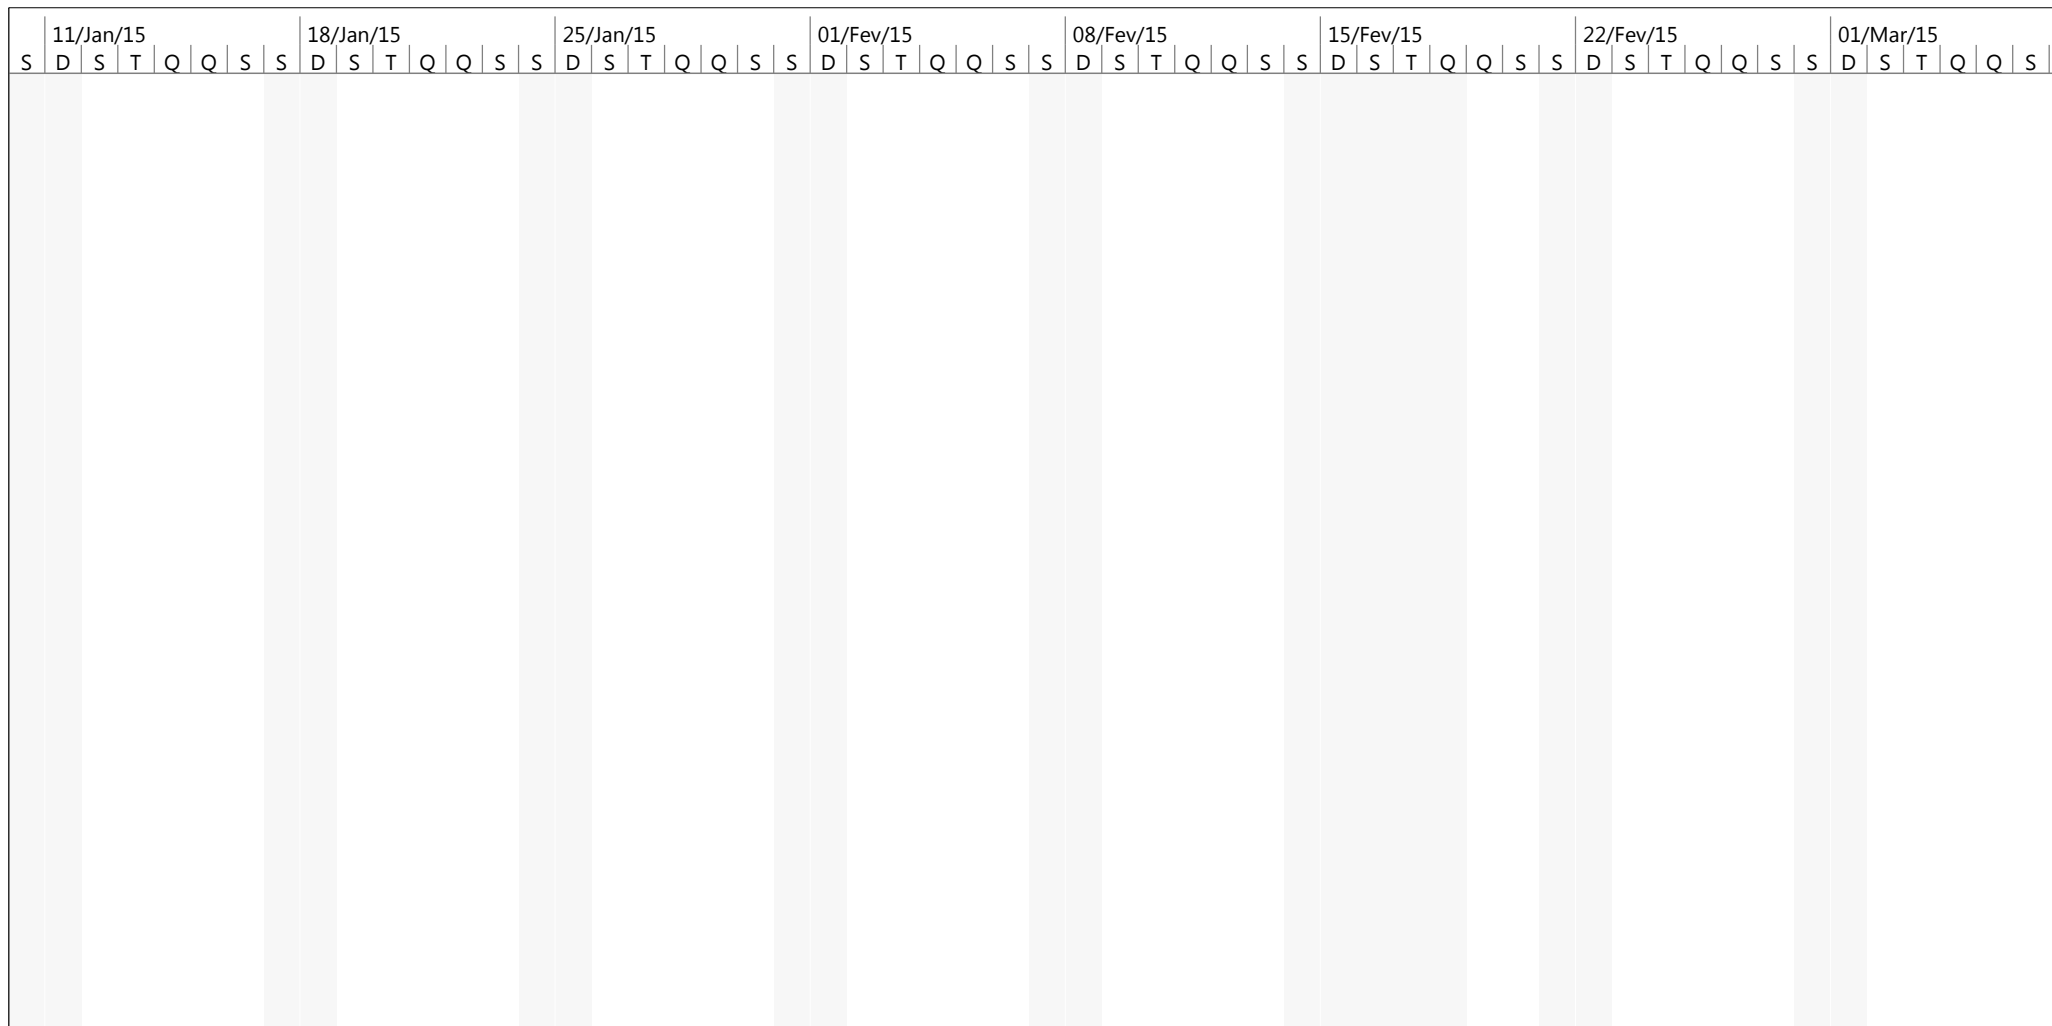

Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				





Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

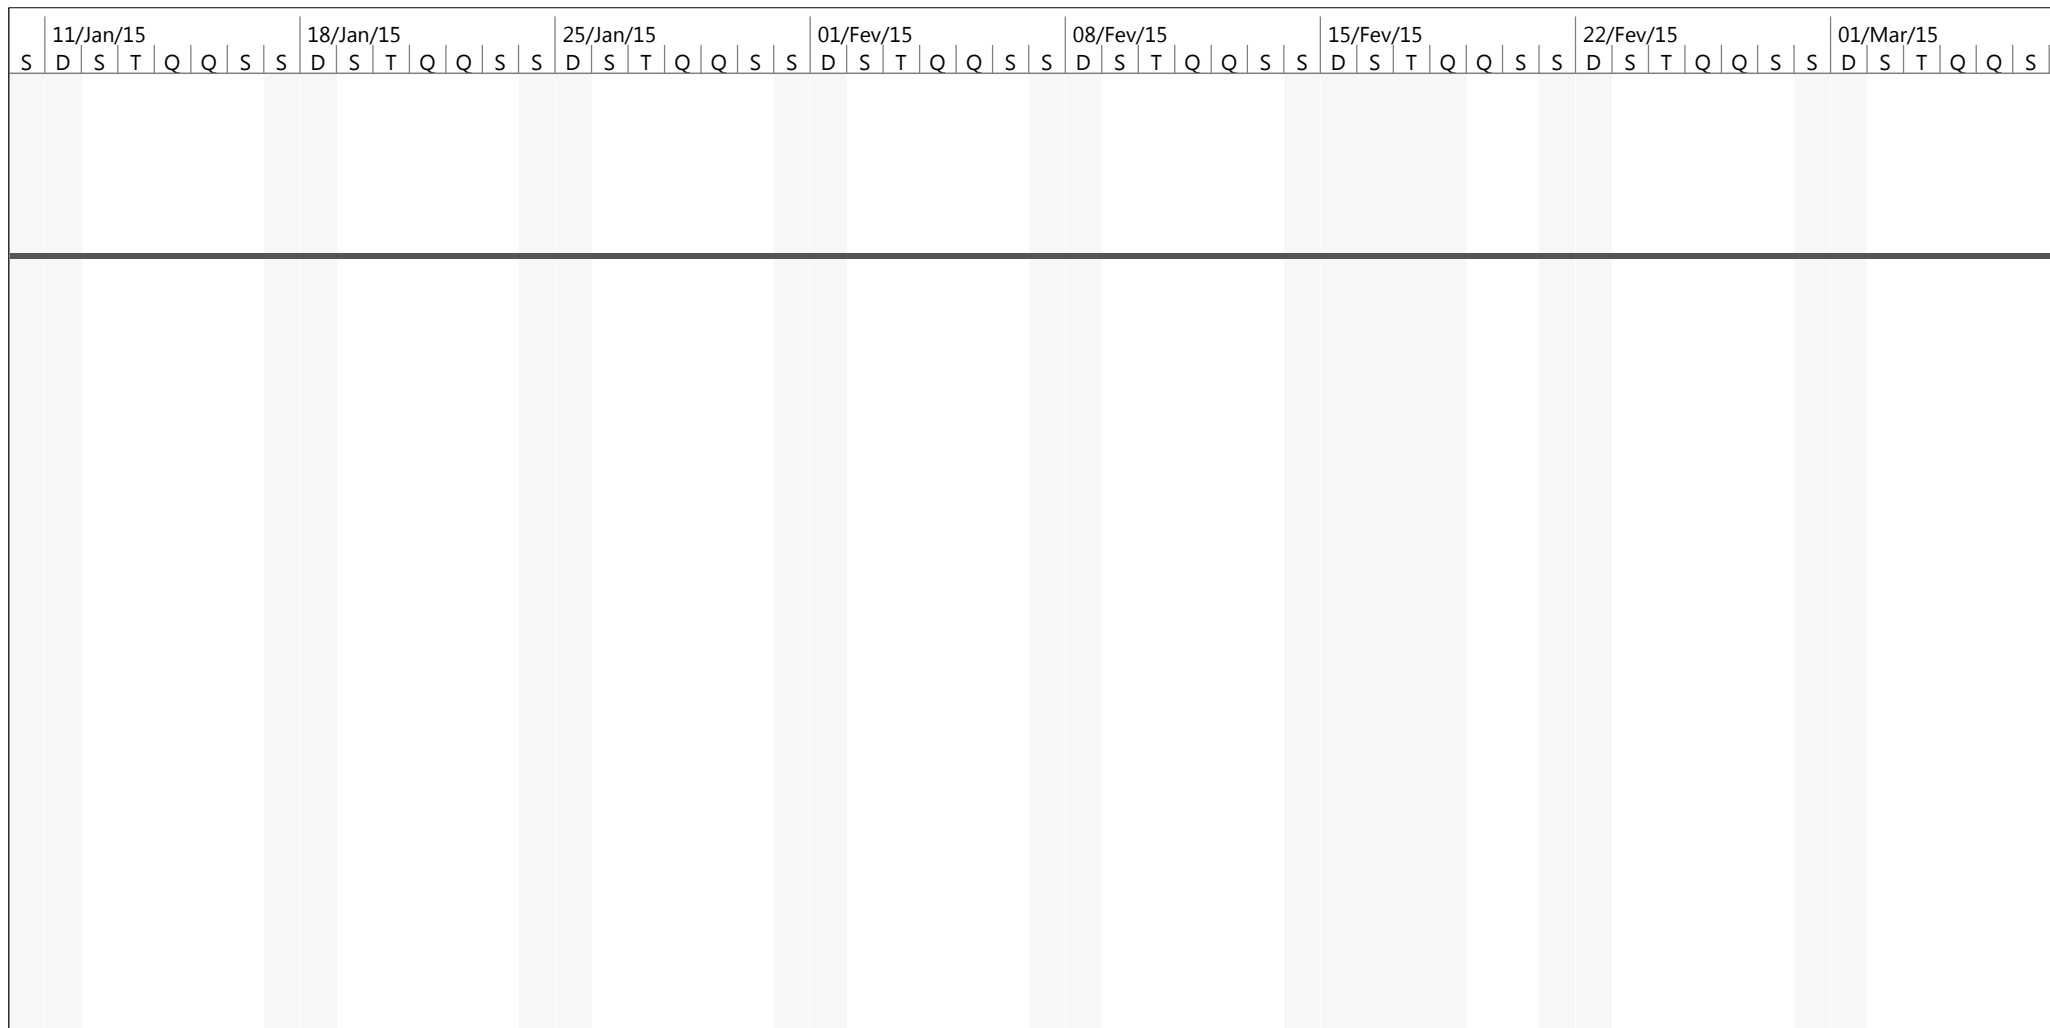

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

SST, DSML


TRT12

◆ 20/03


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	◆
	Marco	◆	Somente duração		Data limite	↓
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo	◇	Somente término				

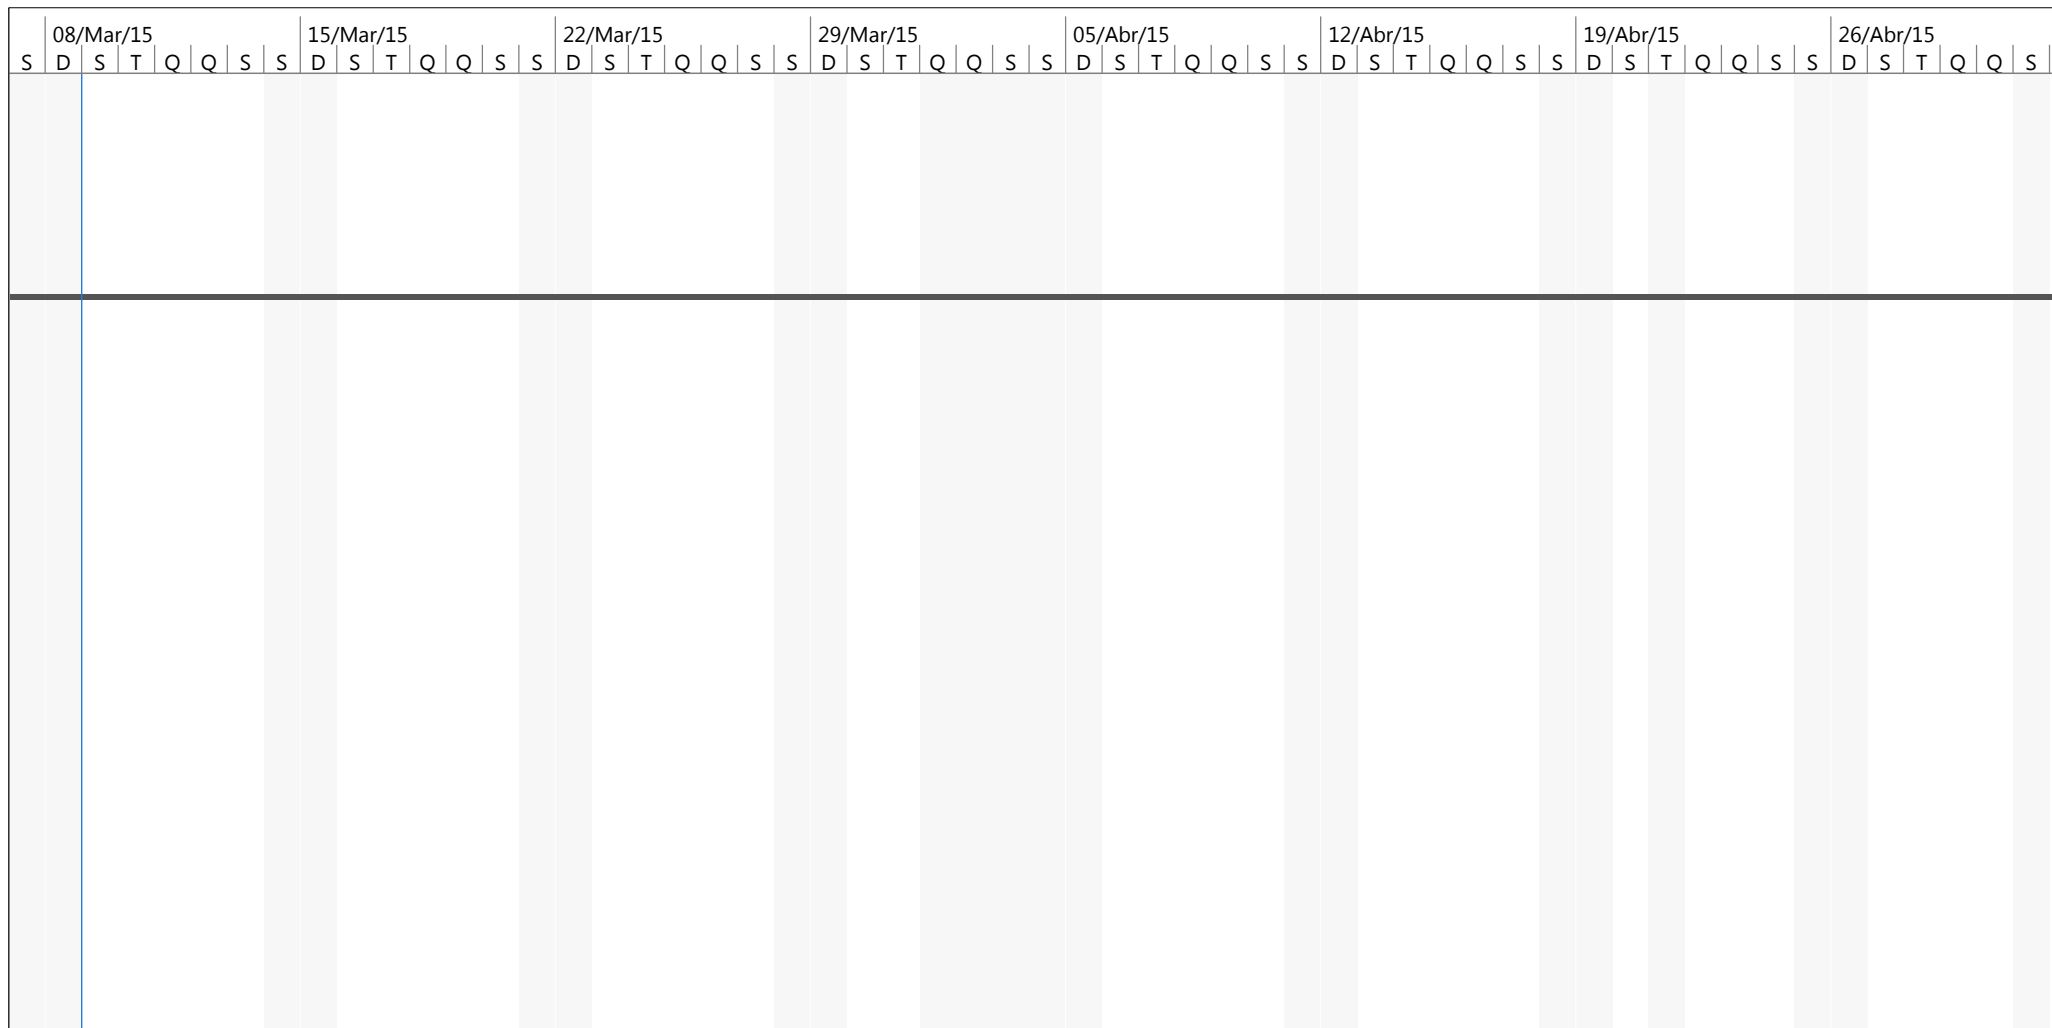

Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

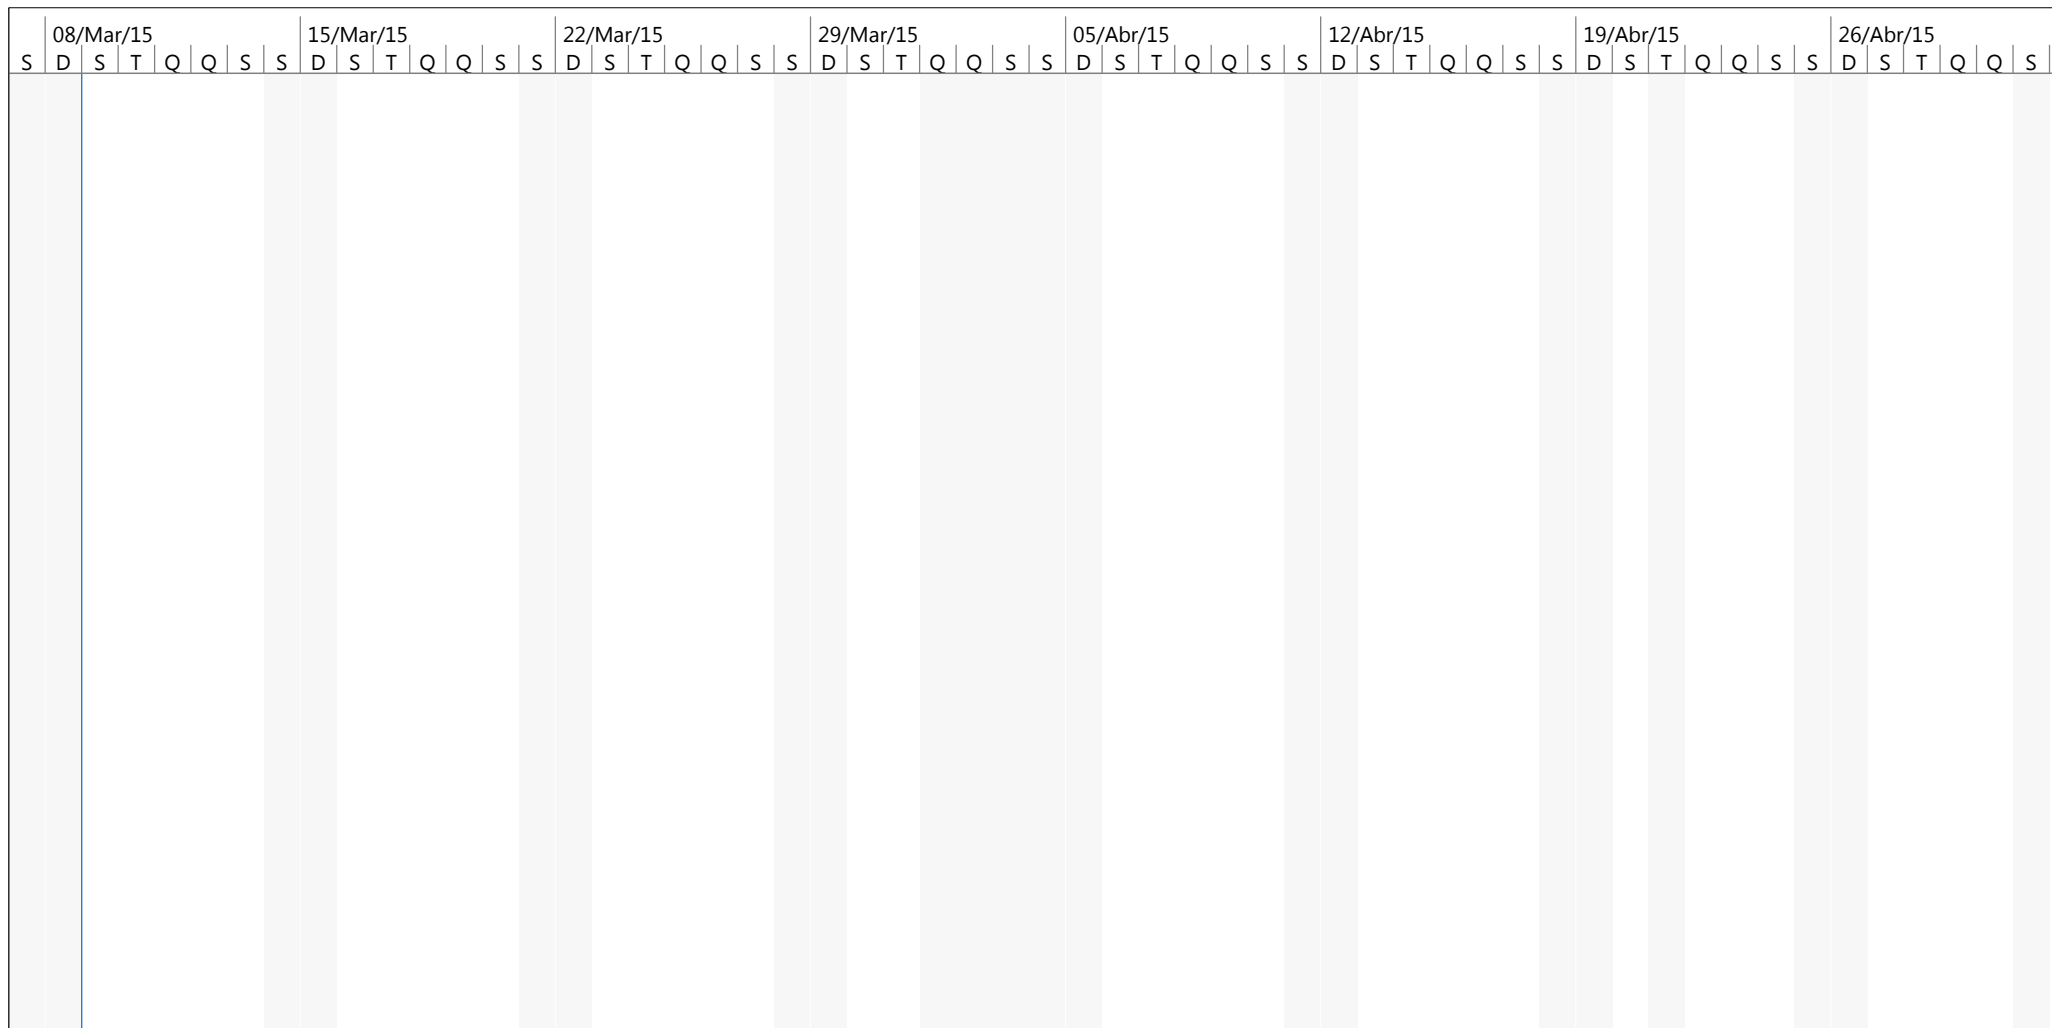


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				


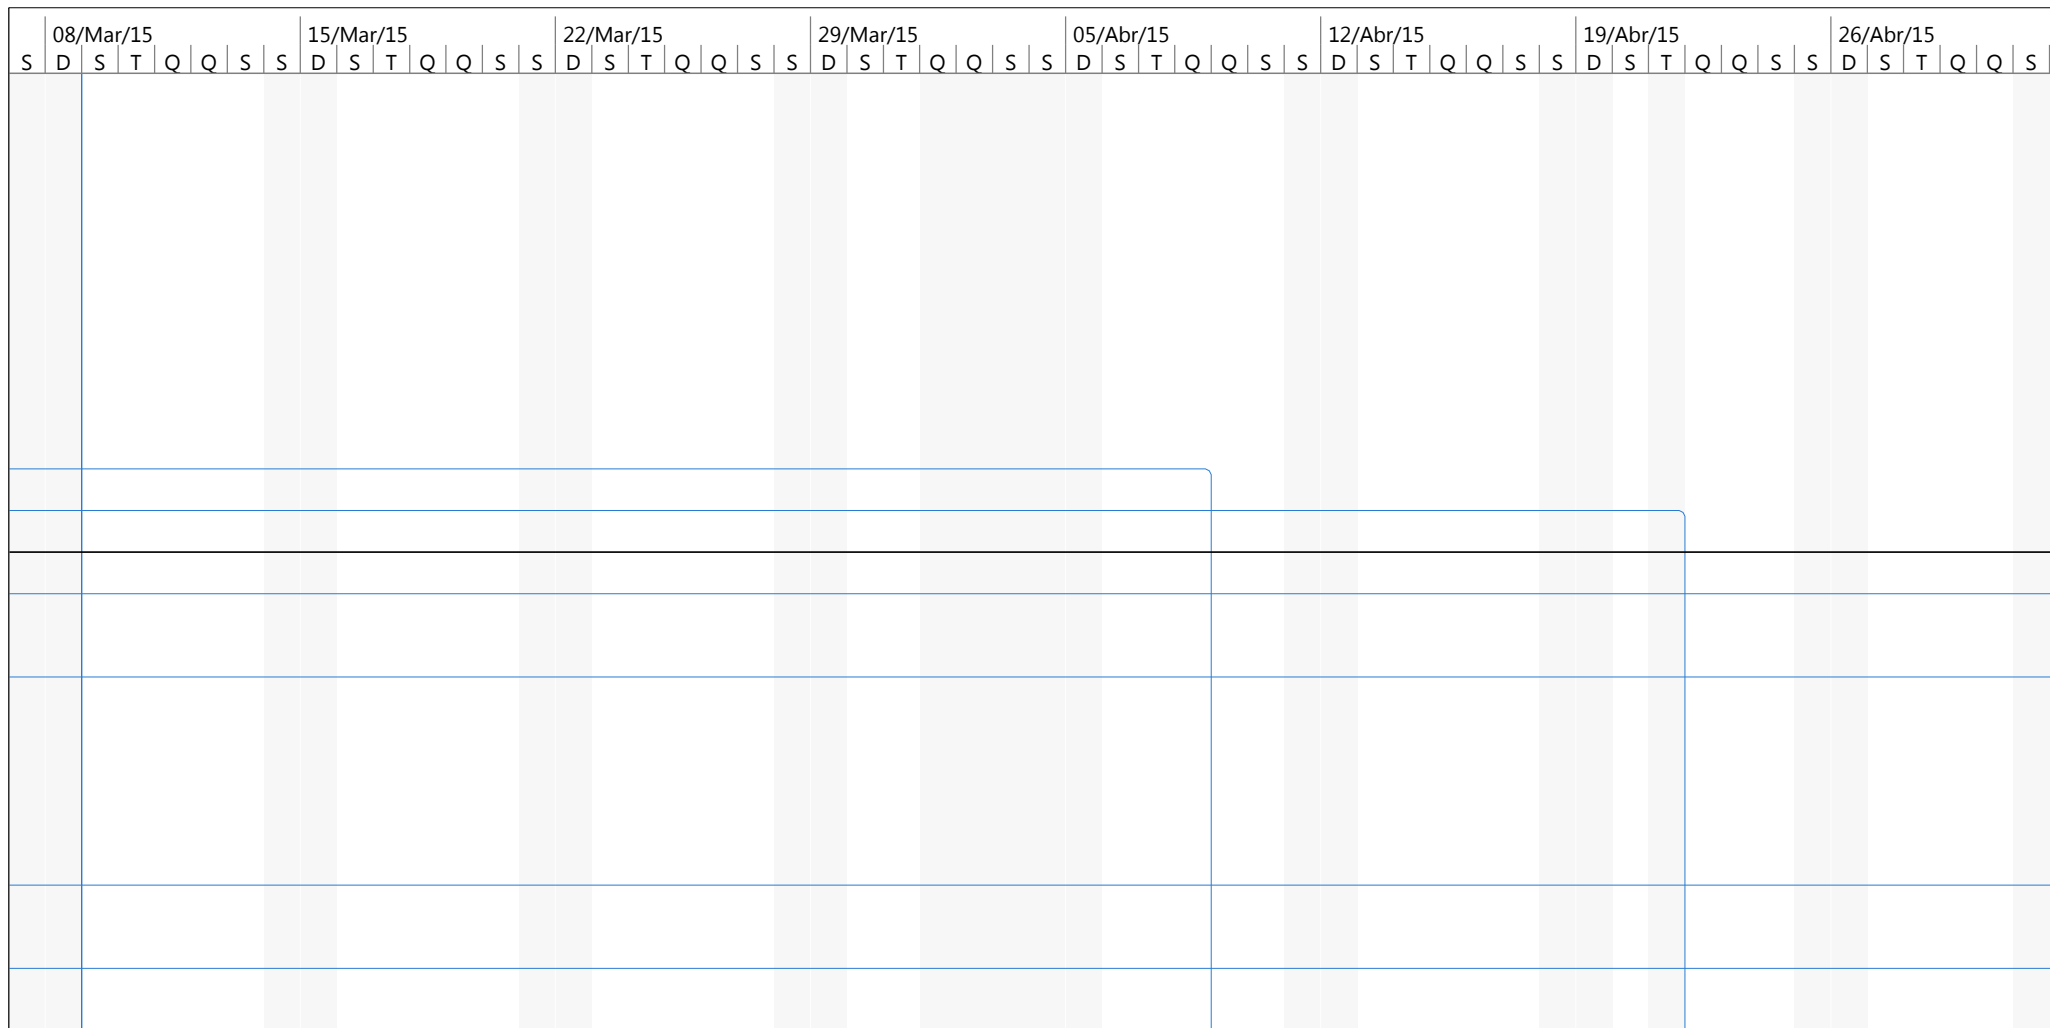


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

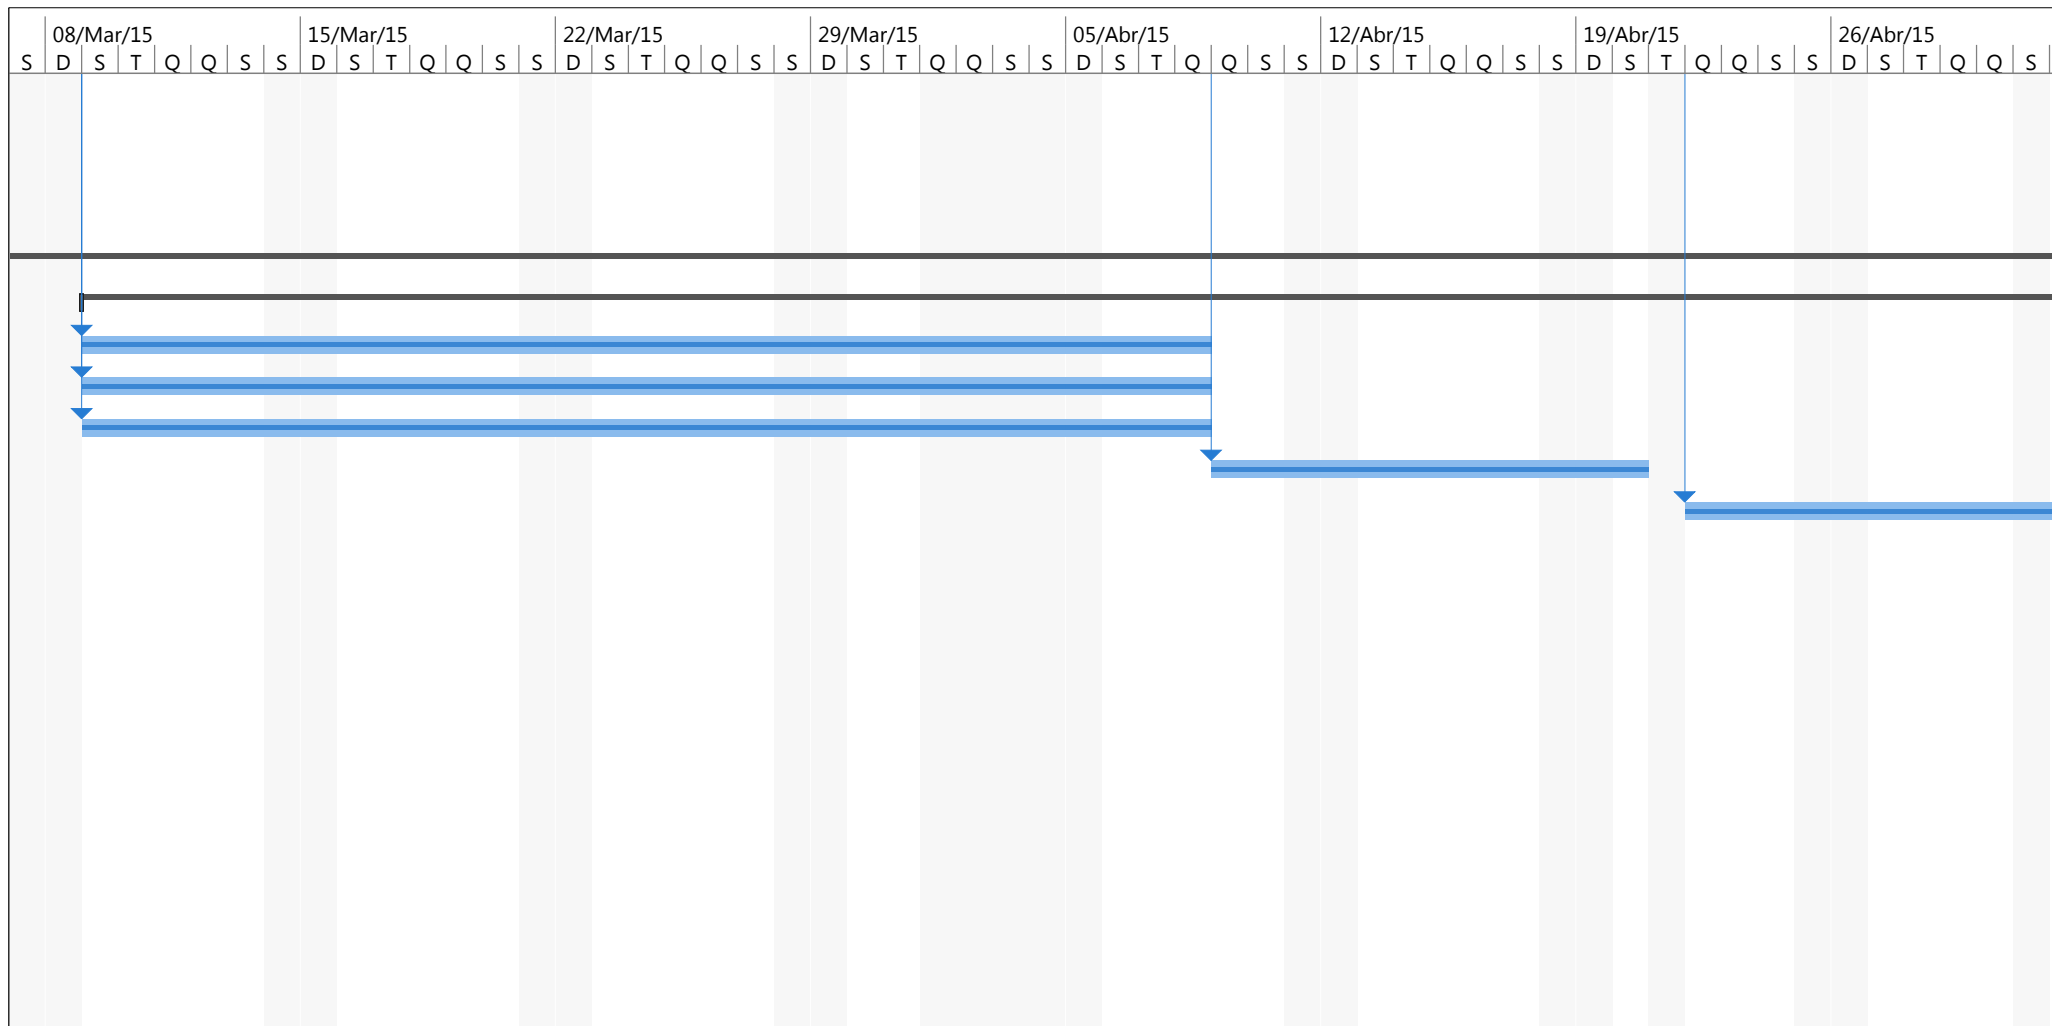


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				



Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

03/Maio/15 10/Maio/15 17/Maio/15 24/Maio/15 31/Maio/15 07/Jun/15 14/Jun/15 21/Jun/15
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

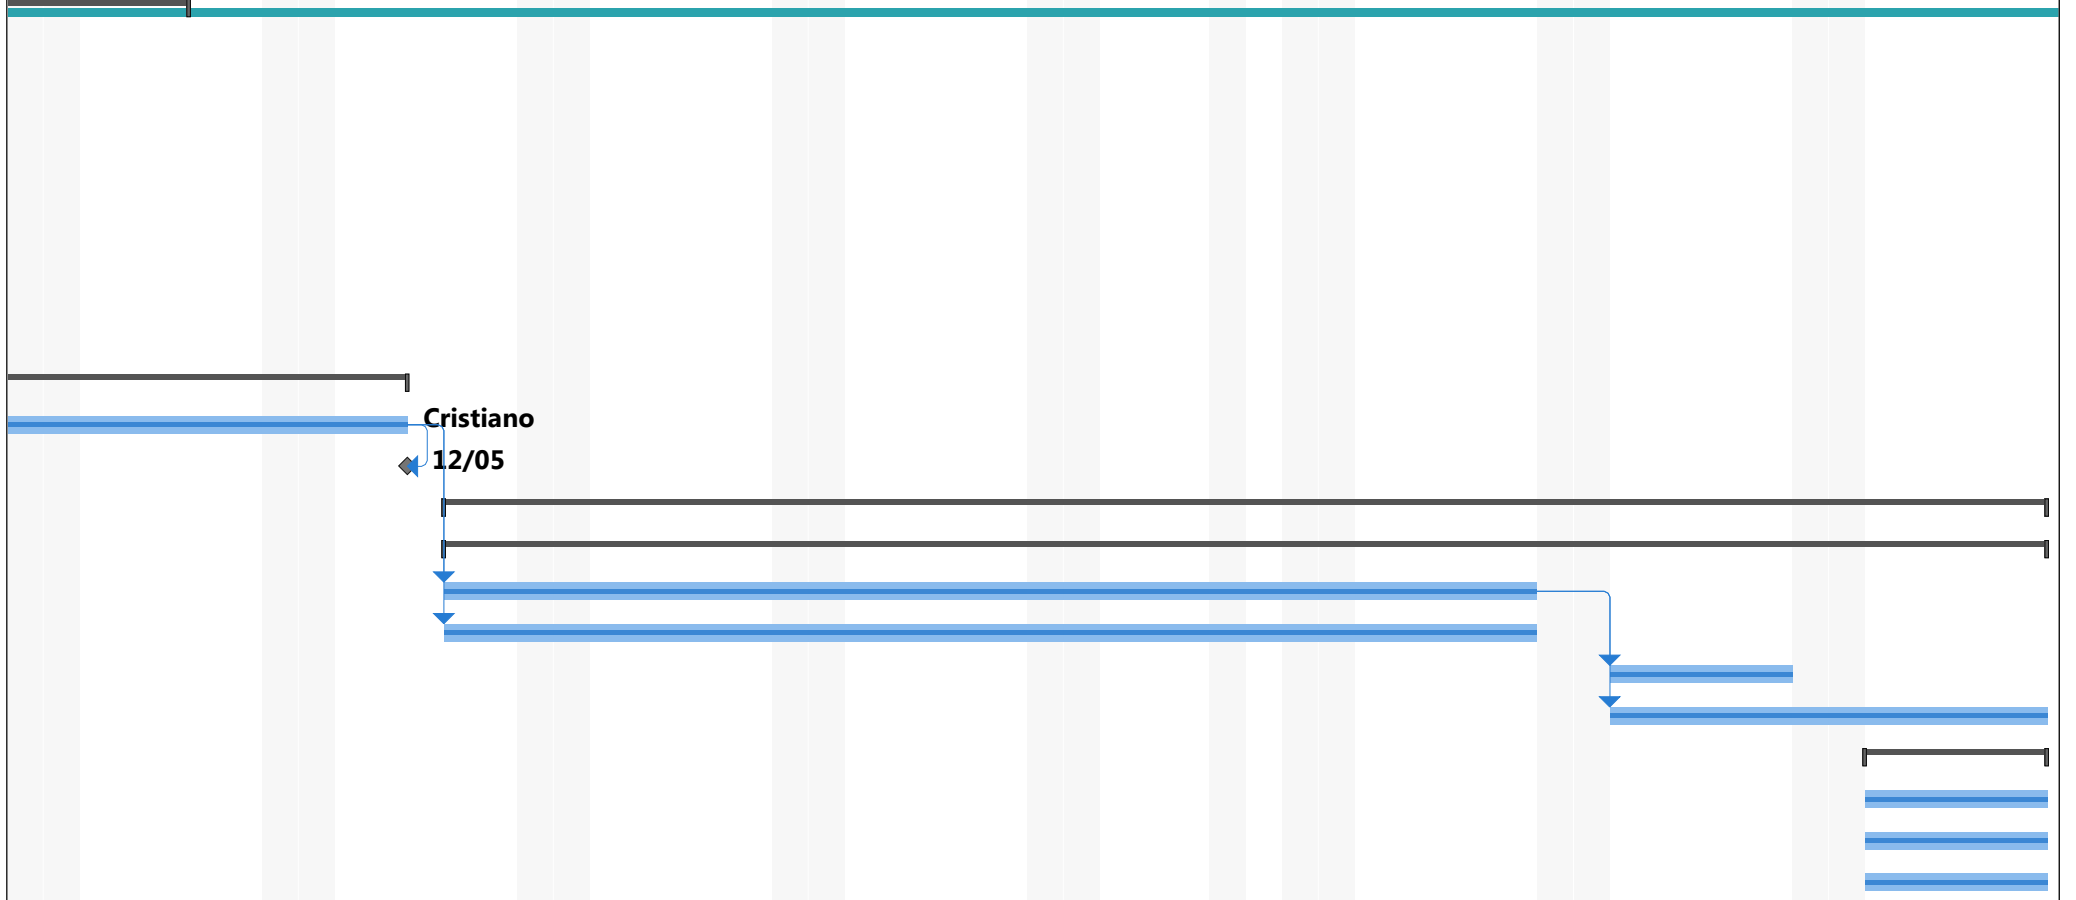


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

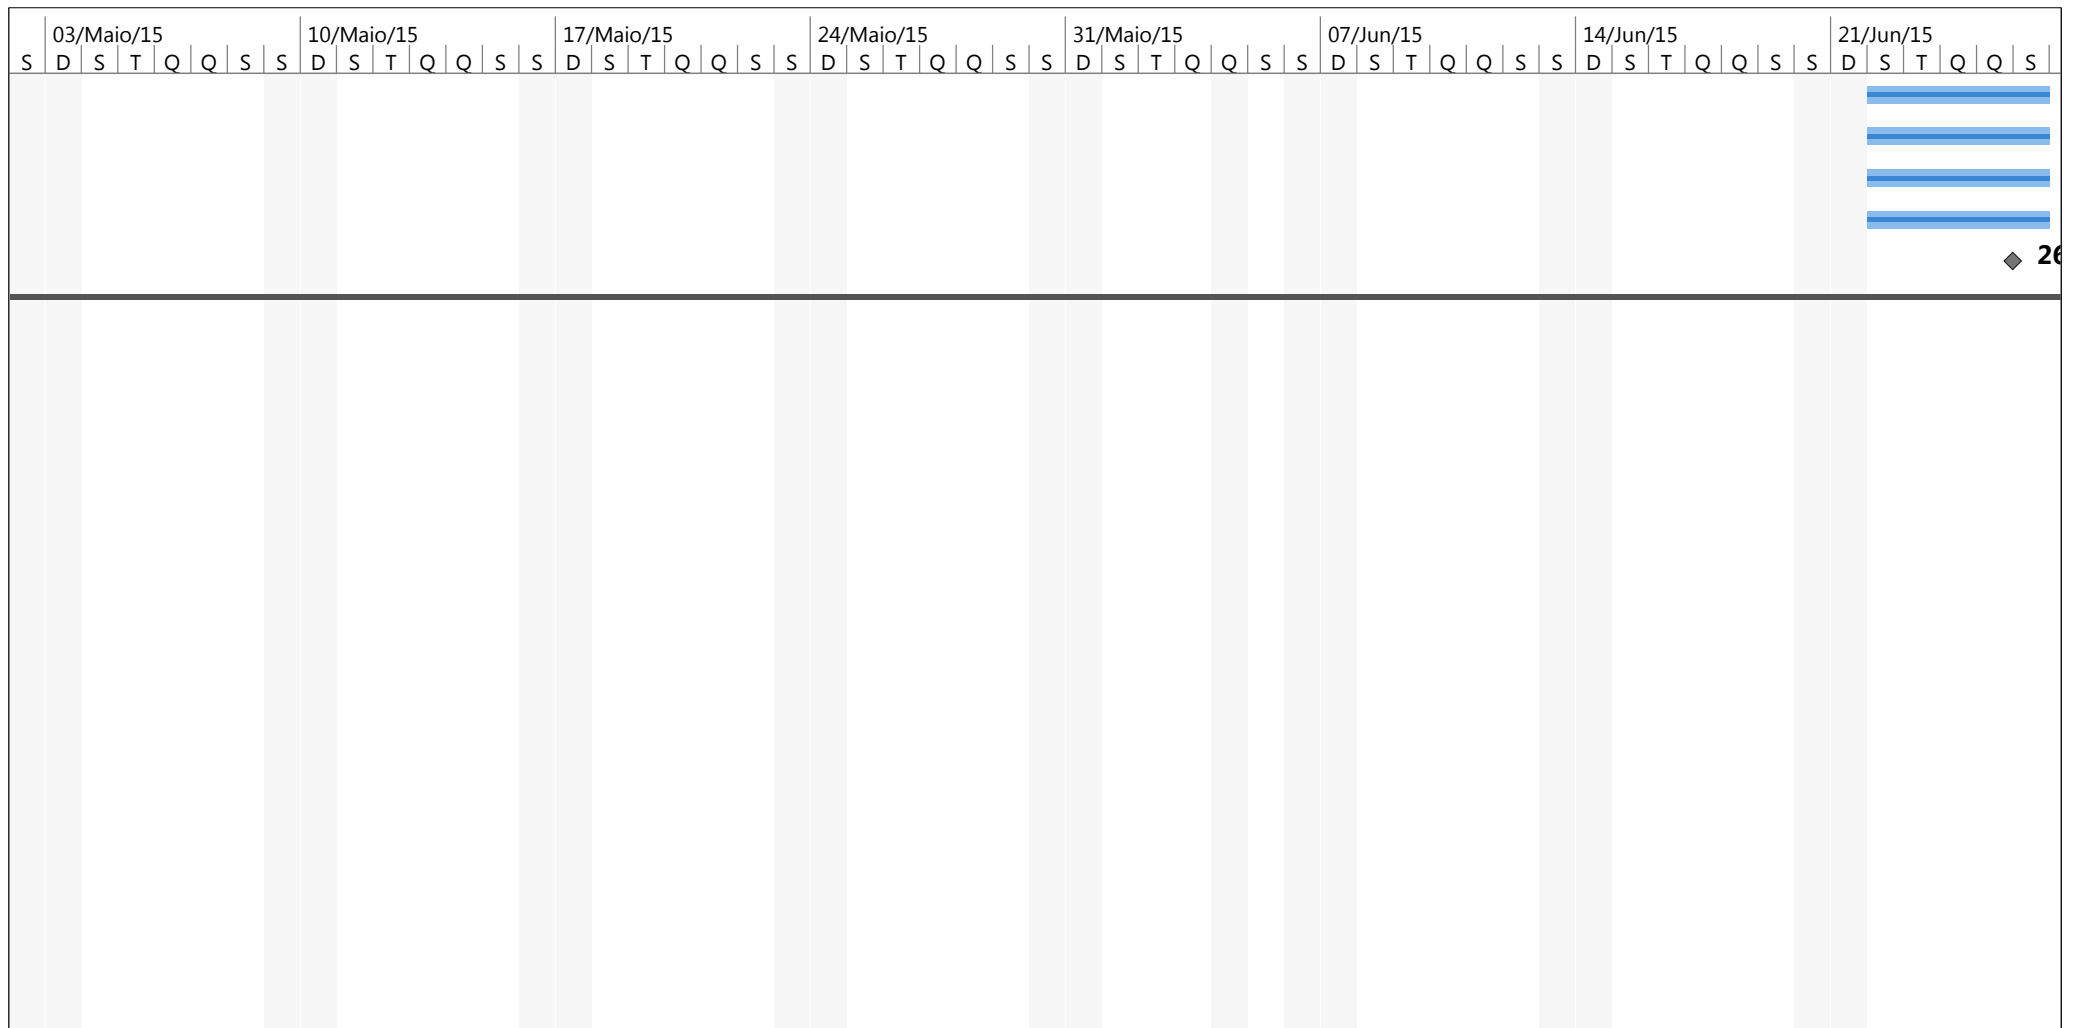


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

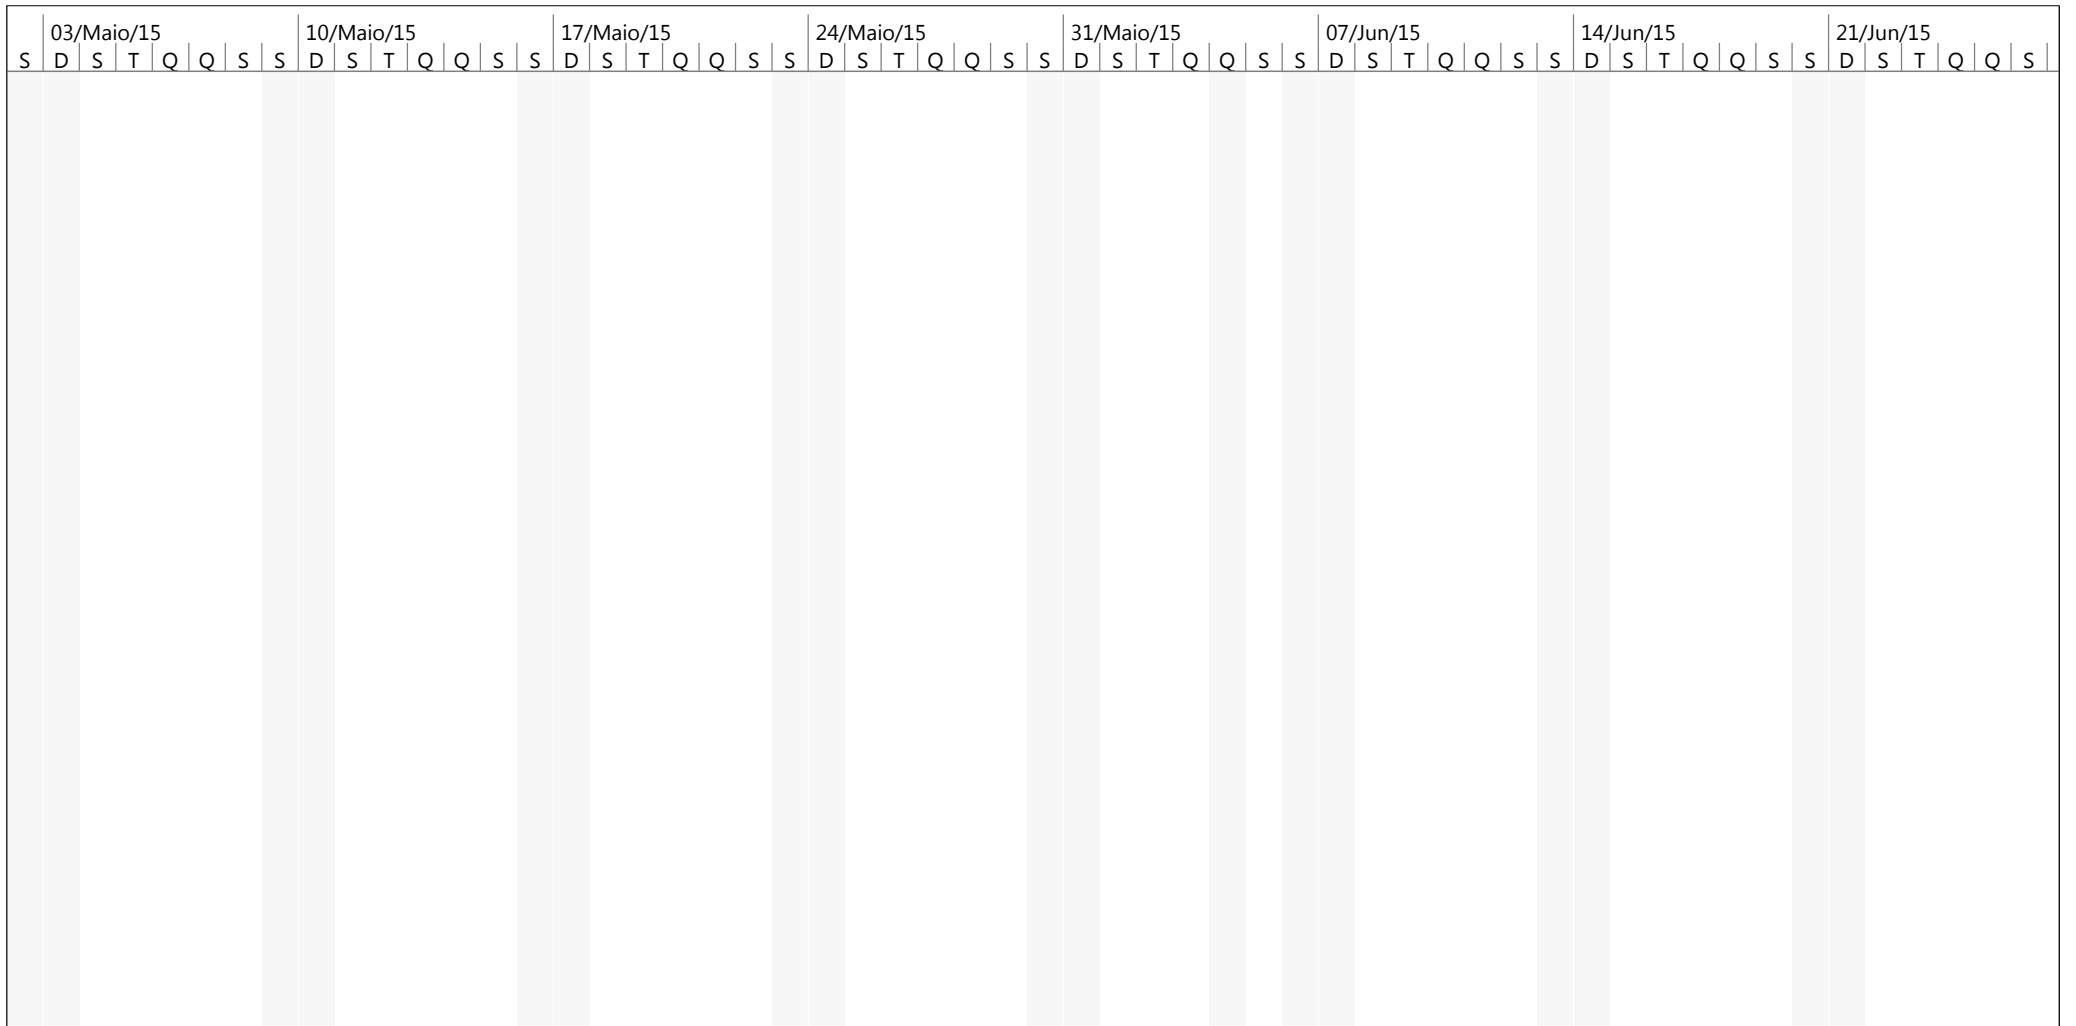


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			





Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

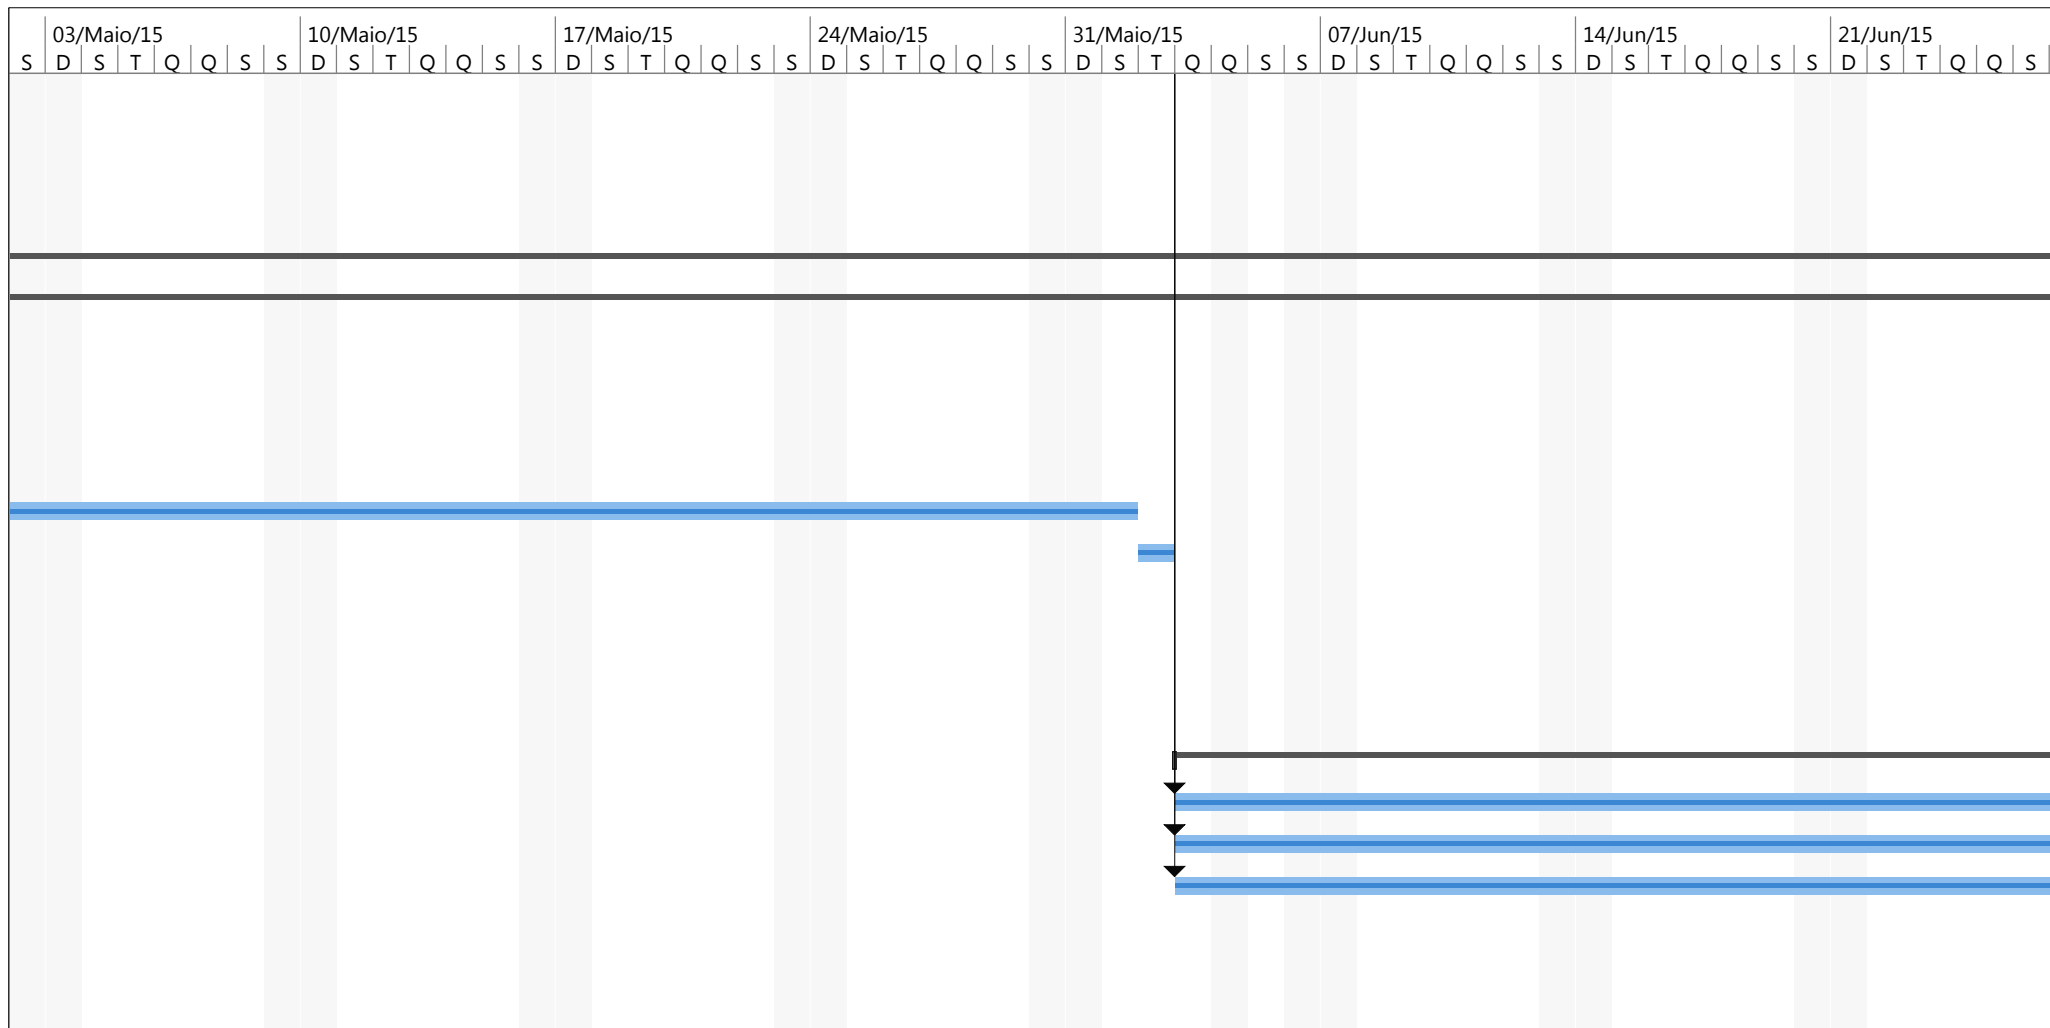


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

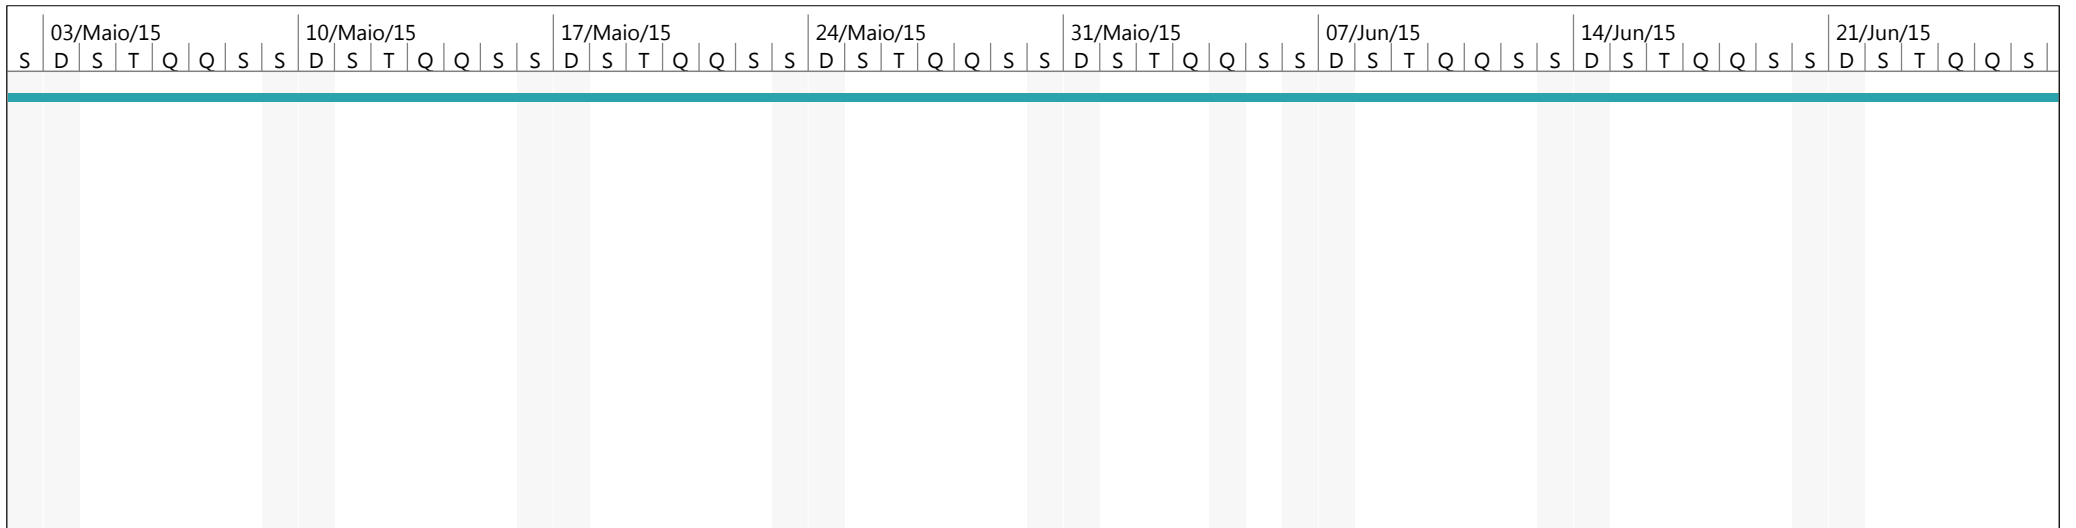

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

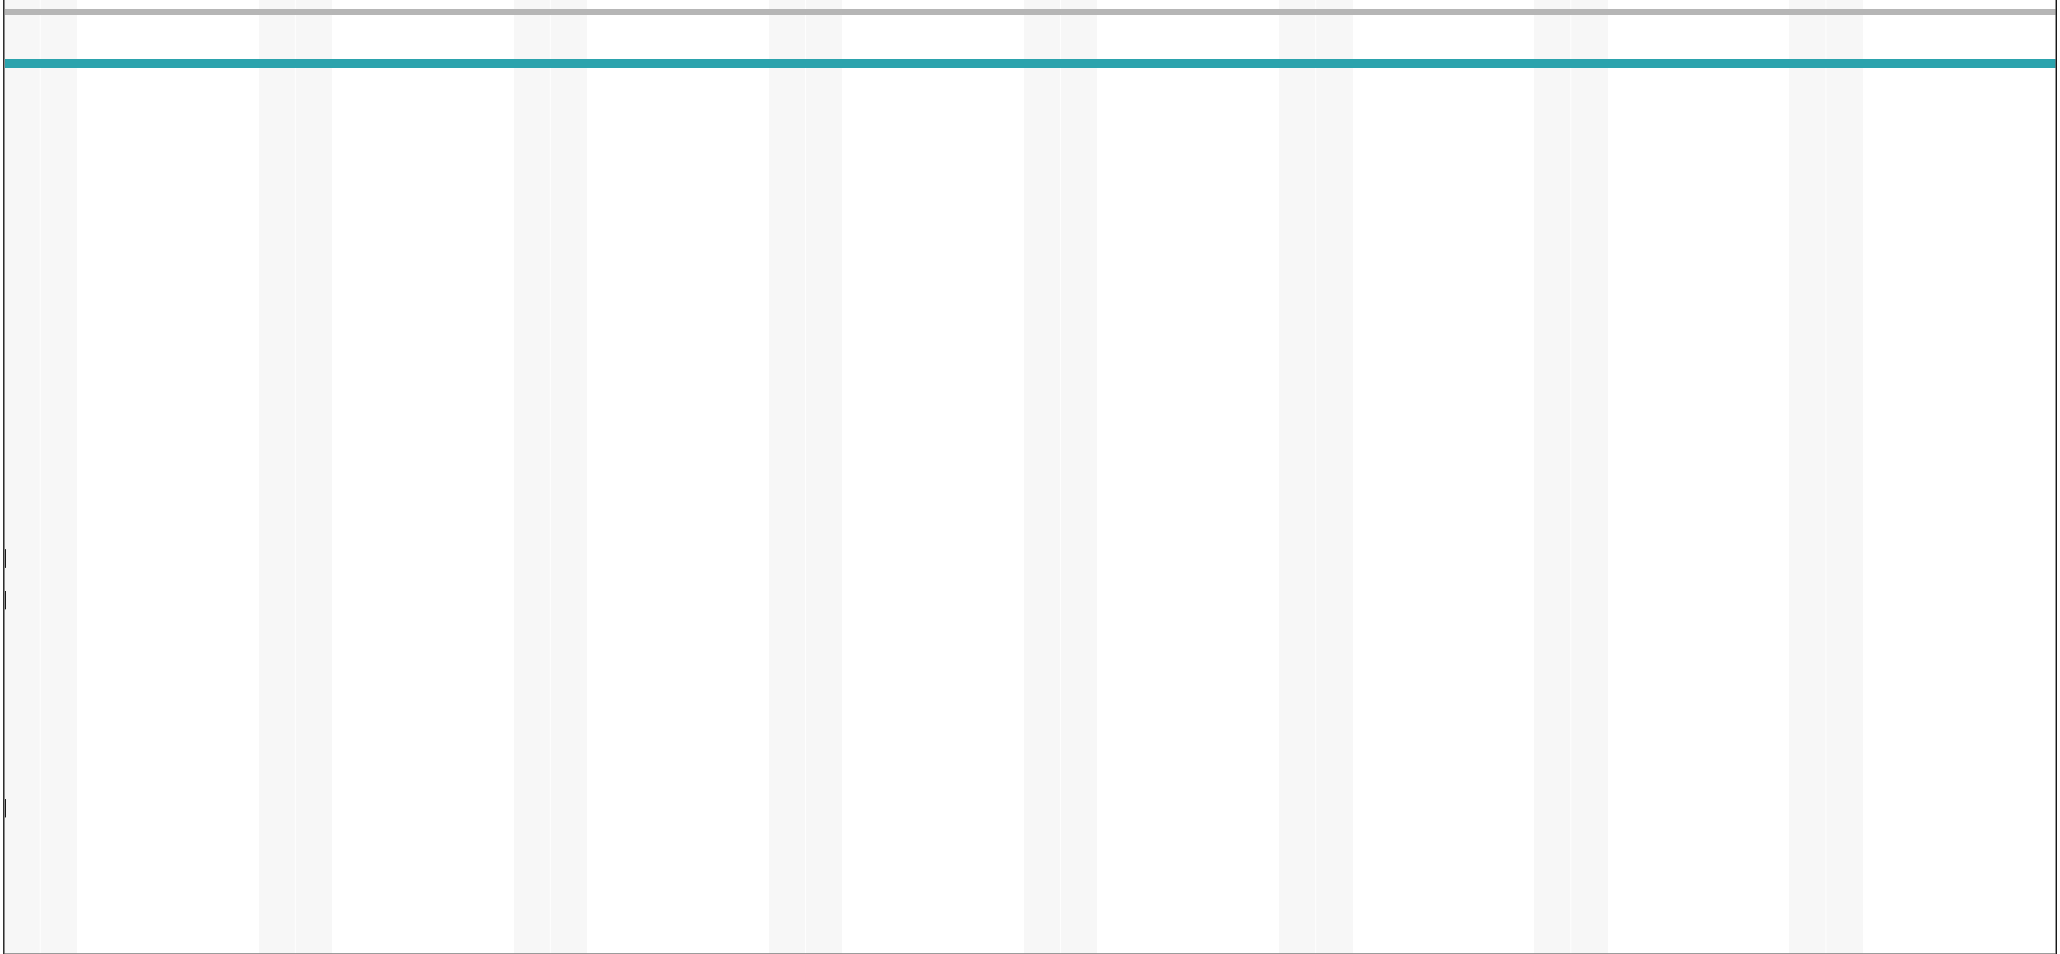

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

28/Jun/15 05/Jul/15 12/Jul/15 19/Jul/15 26/Jul/15 02/Ago/15 09/Ago/15 16/Ago/15


S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

26/06




Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

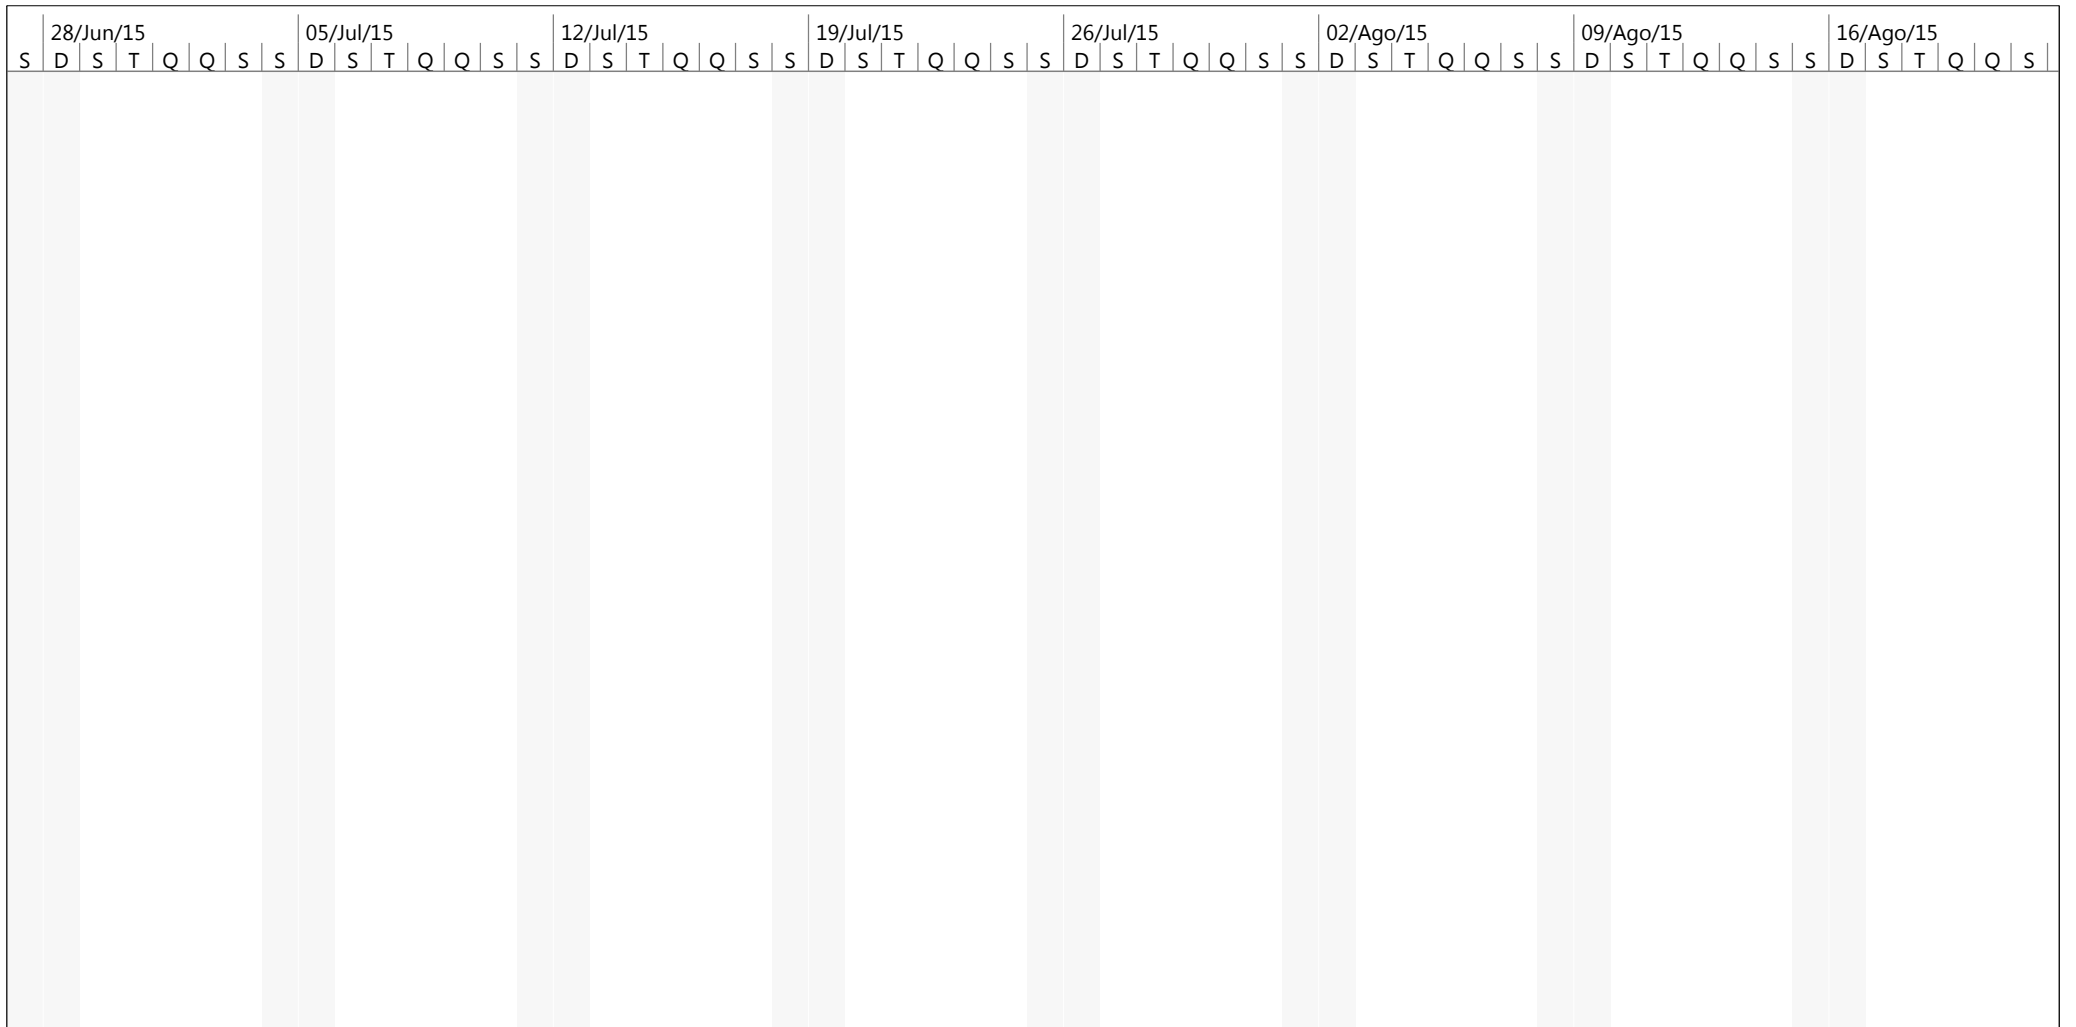

Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


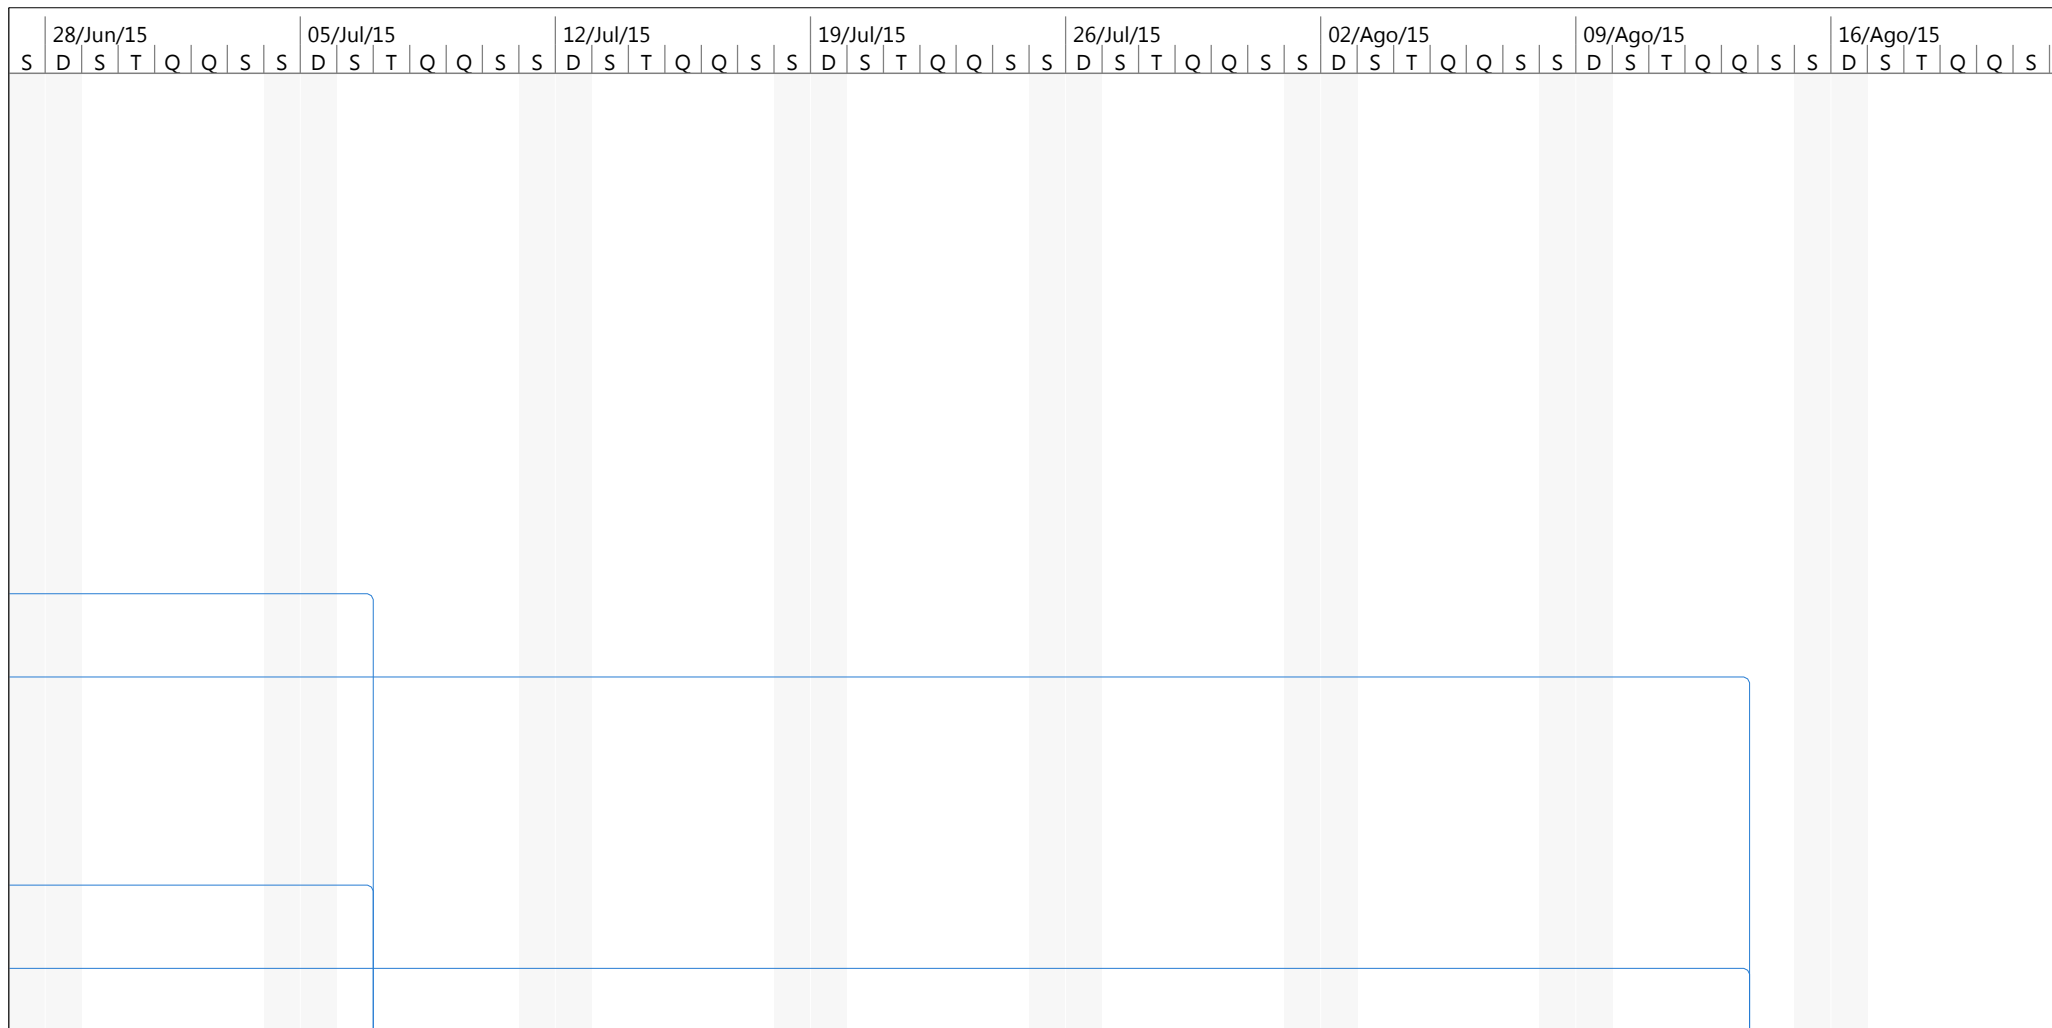


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

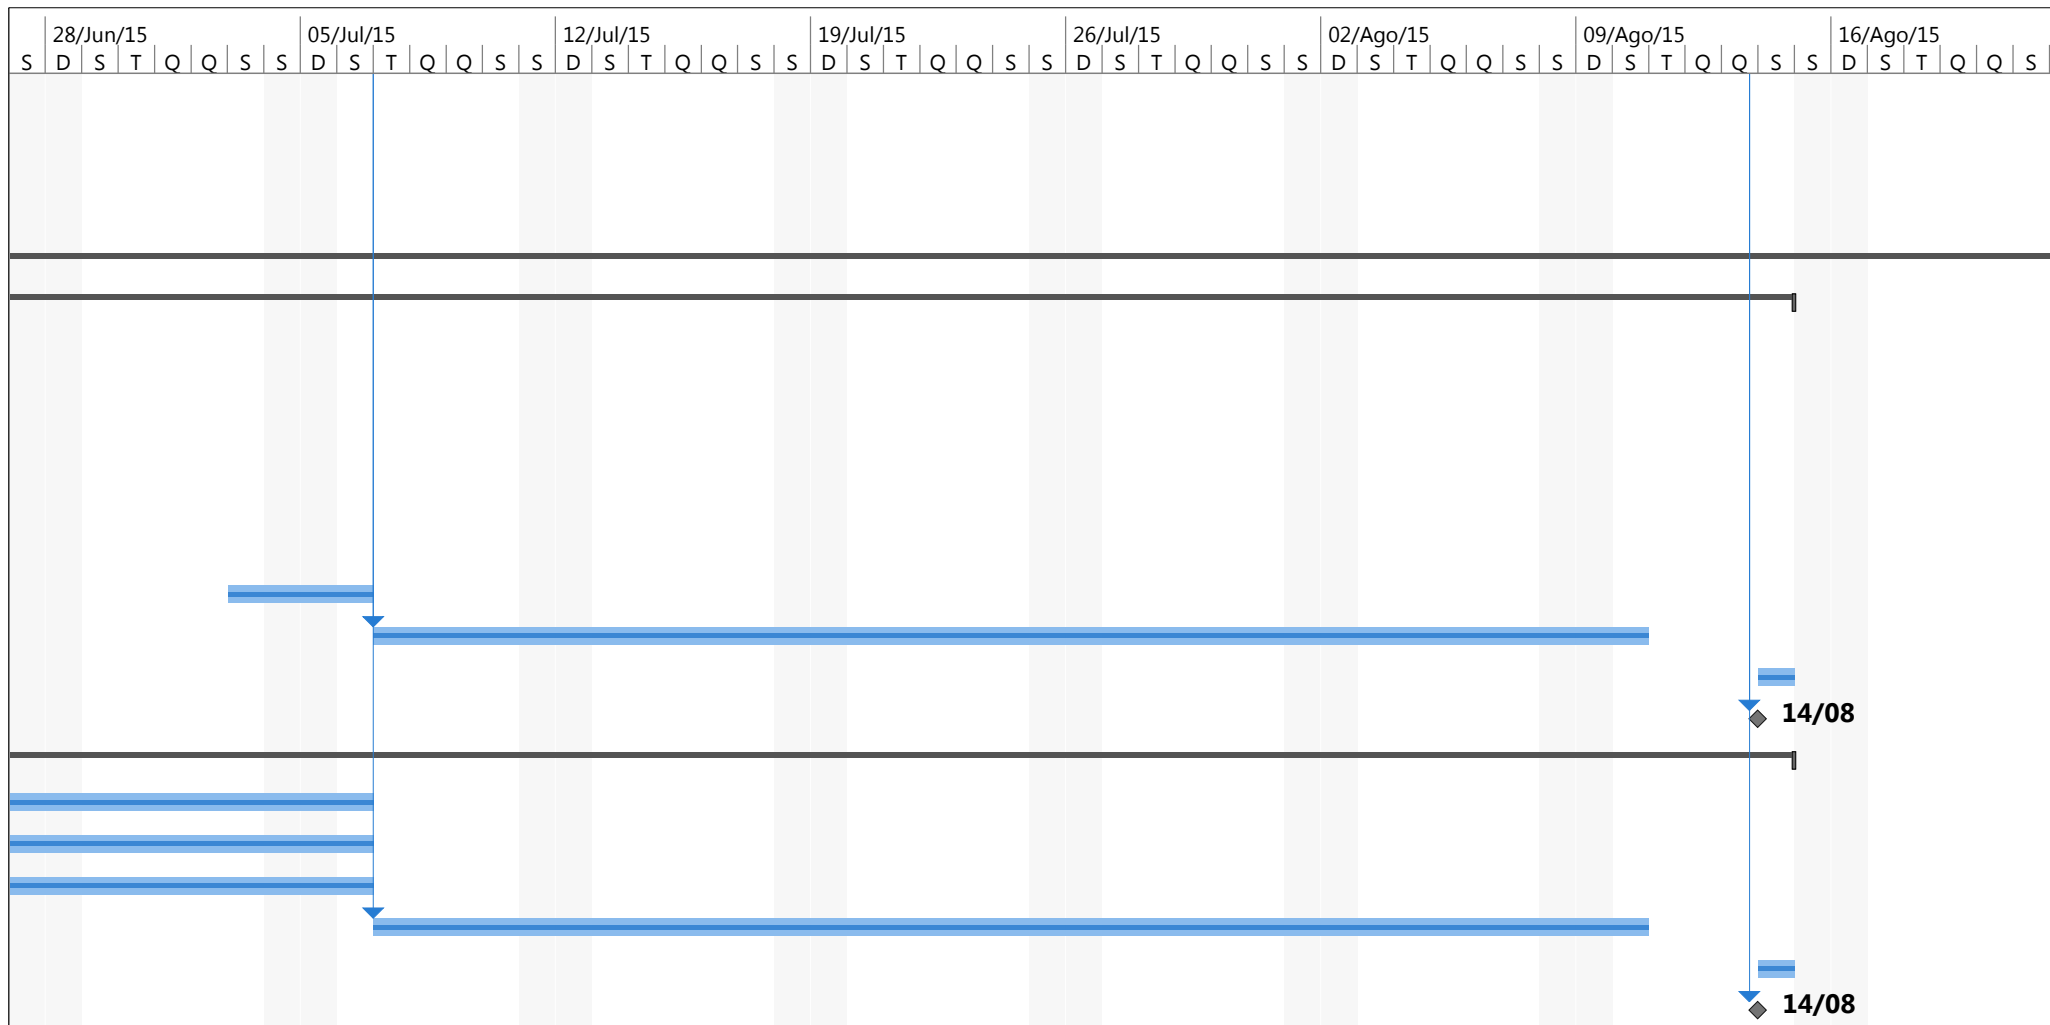


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

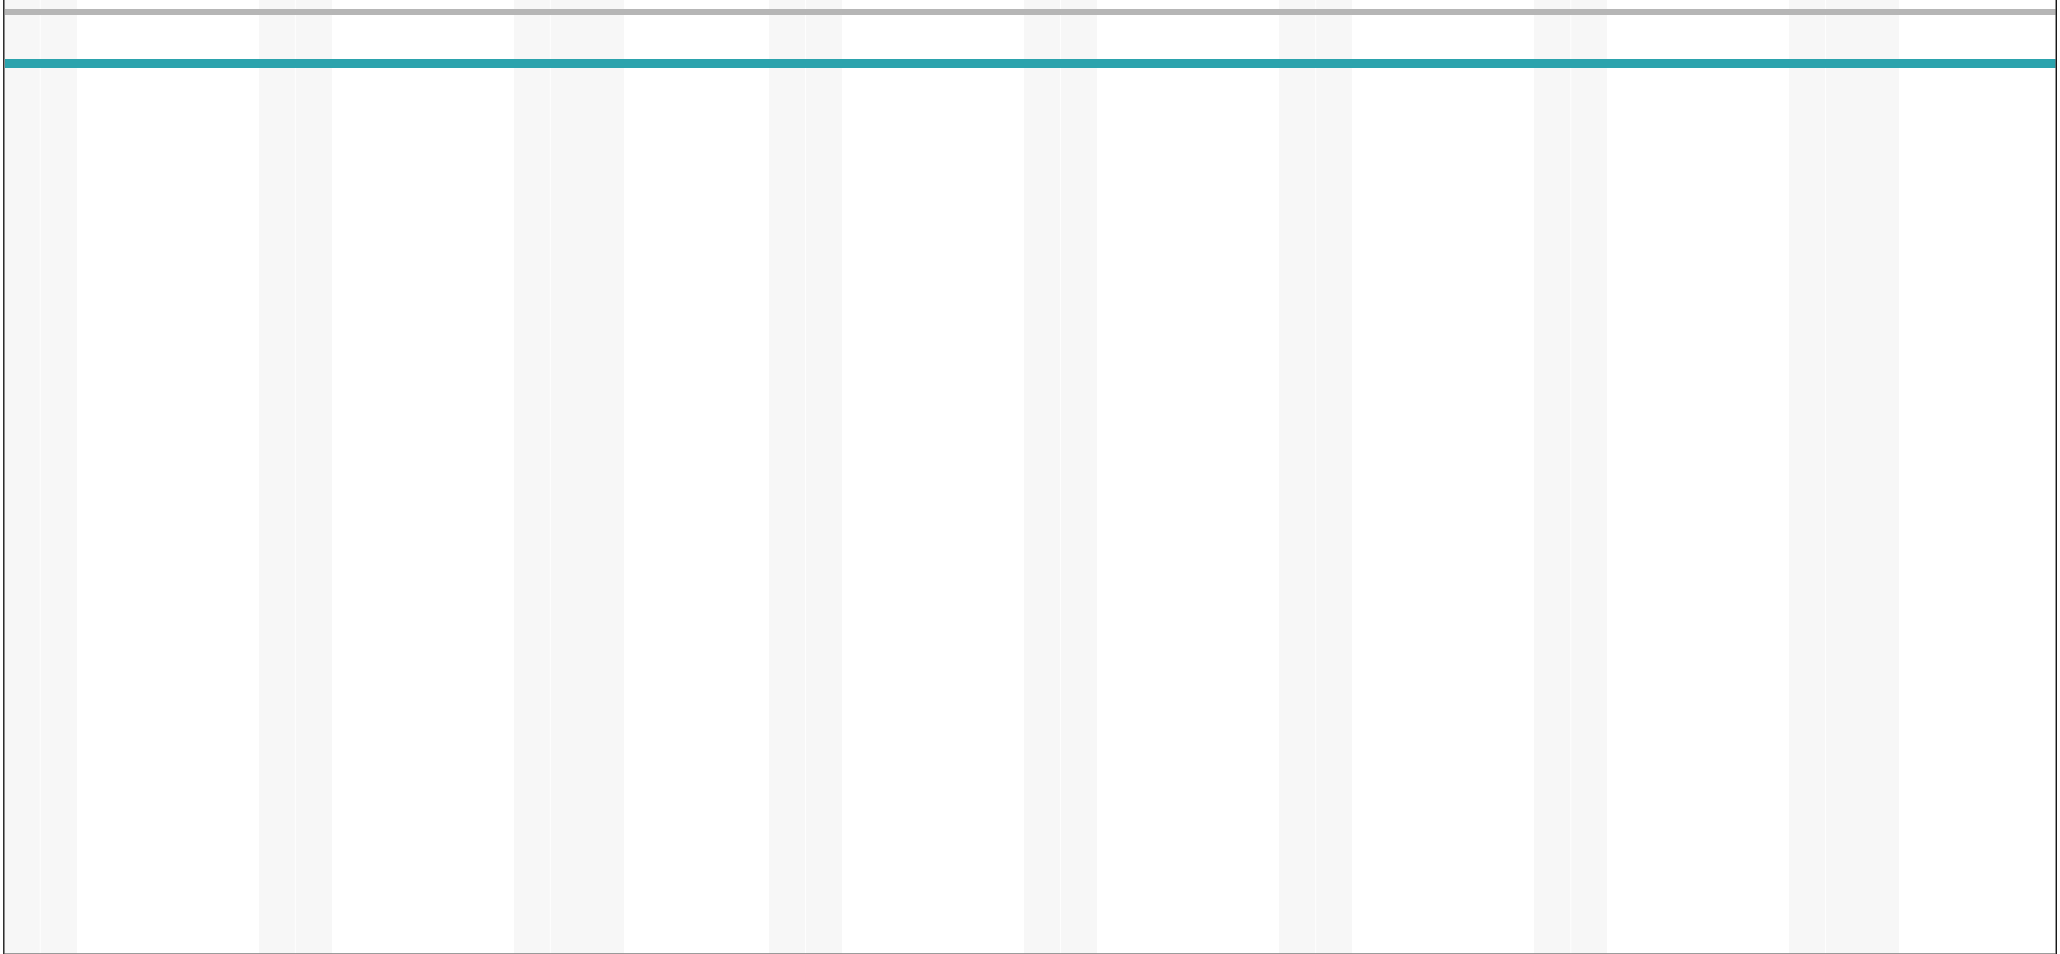


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

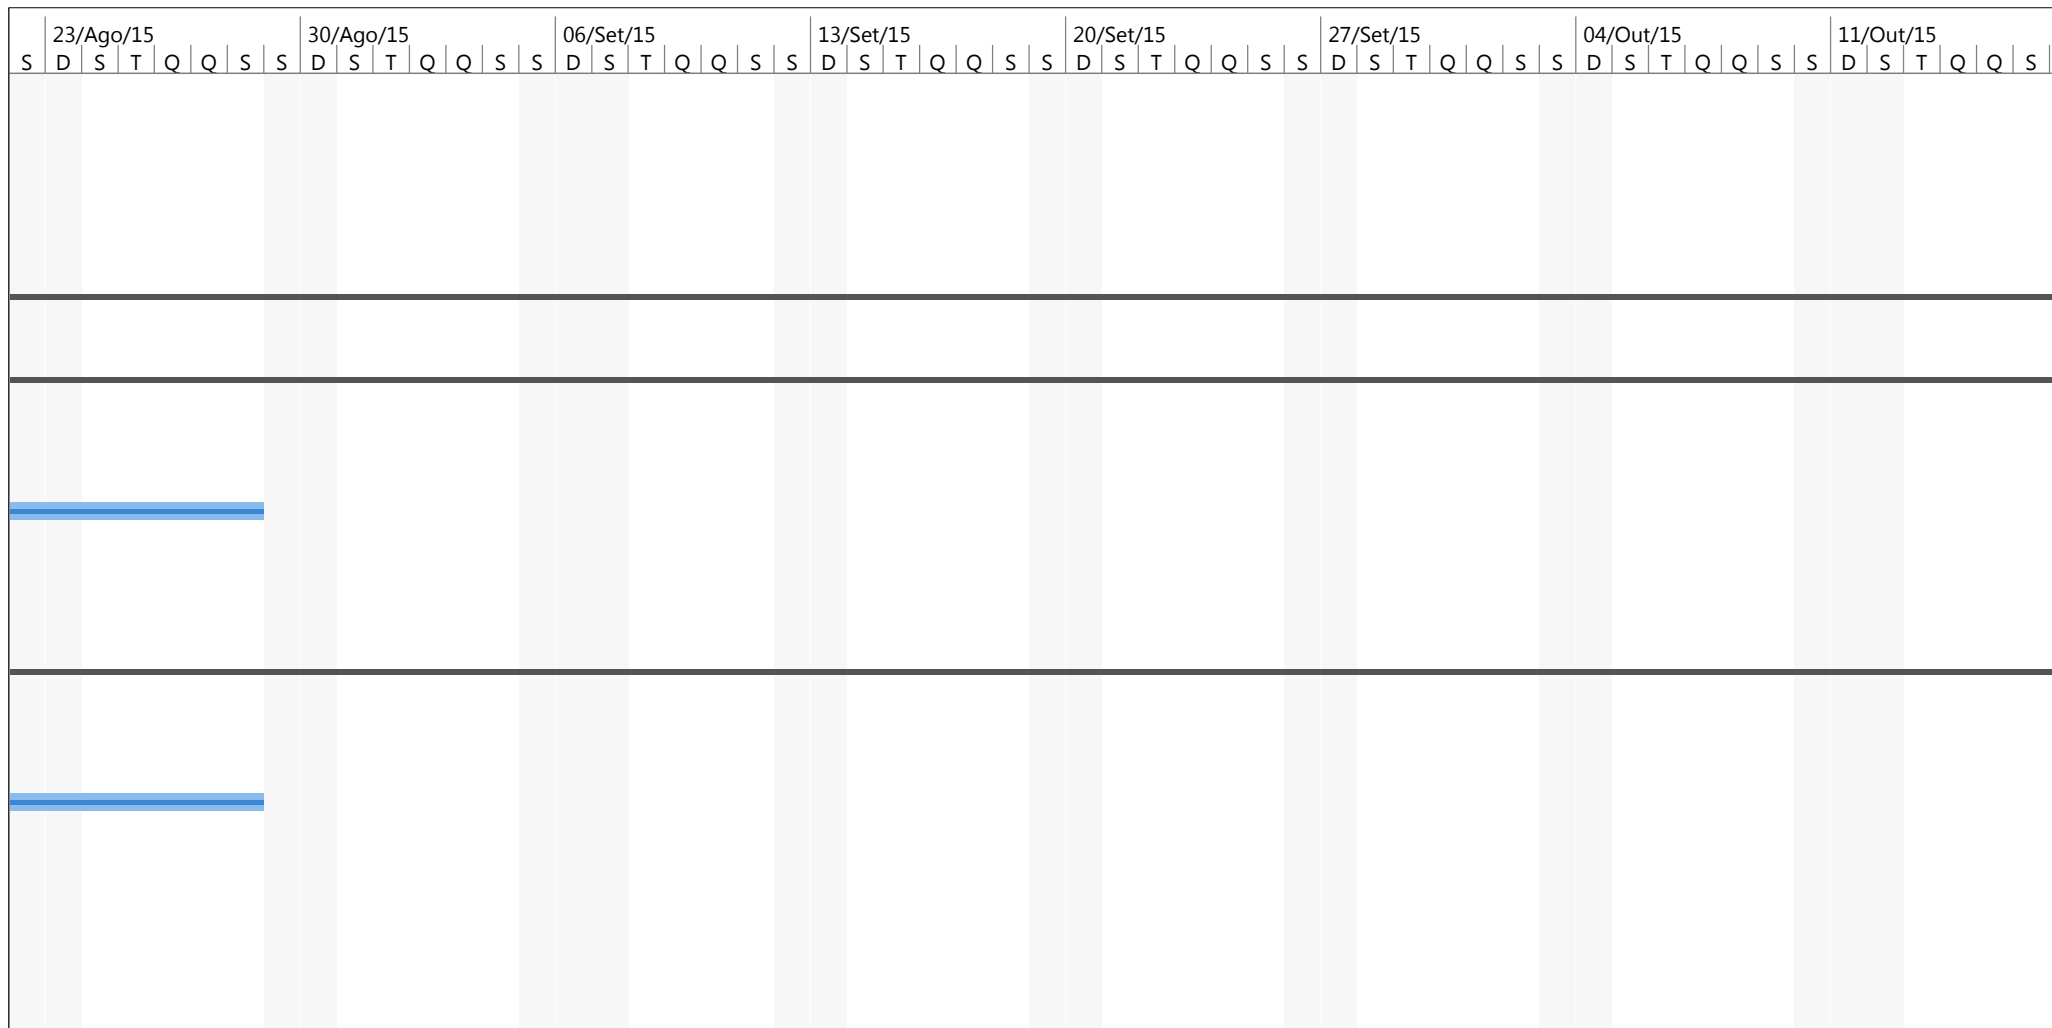

Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

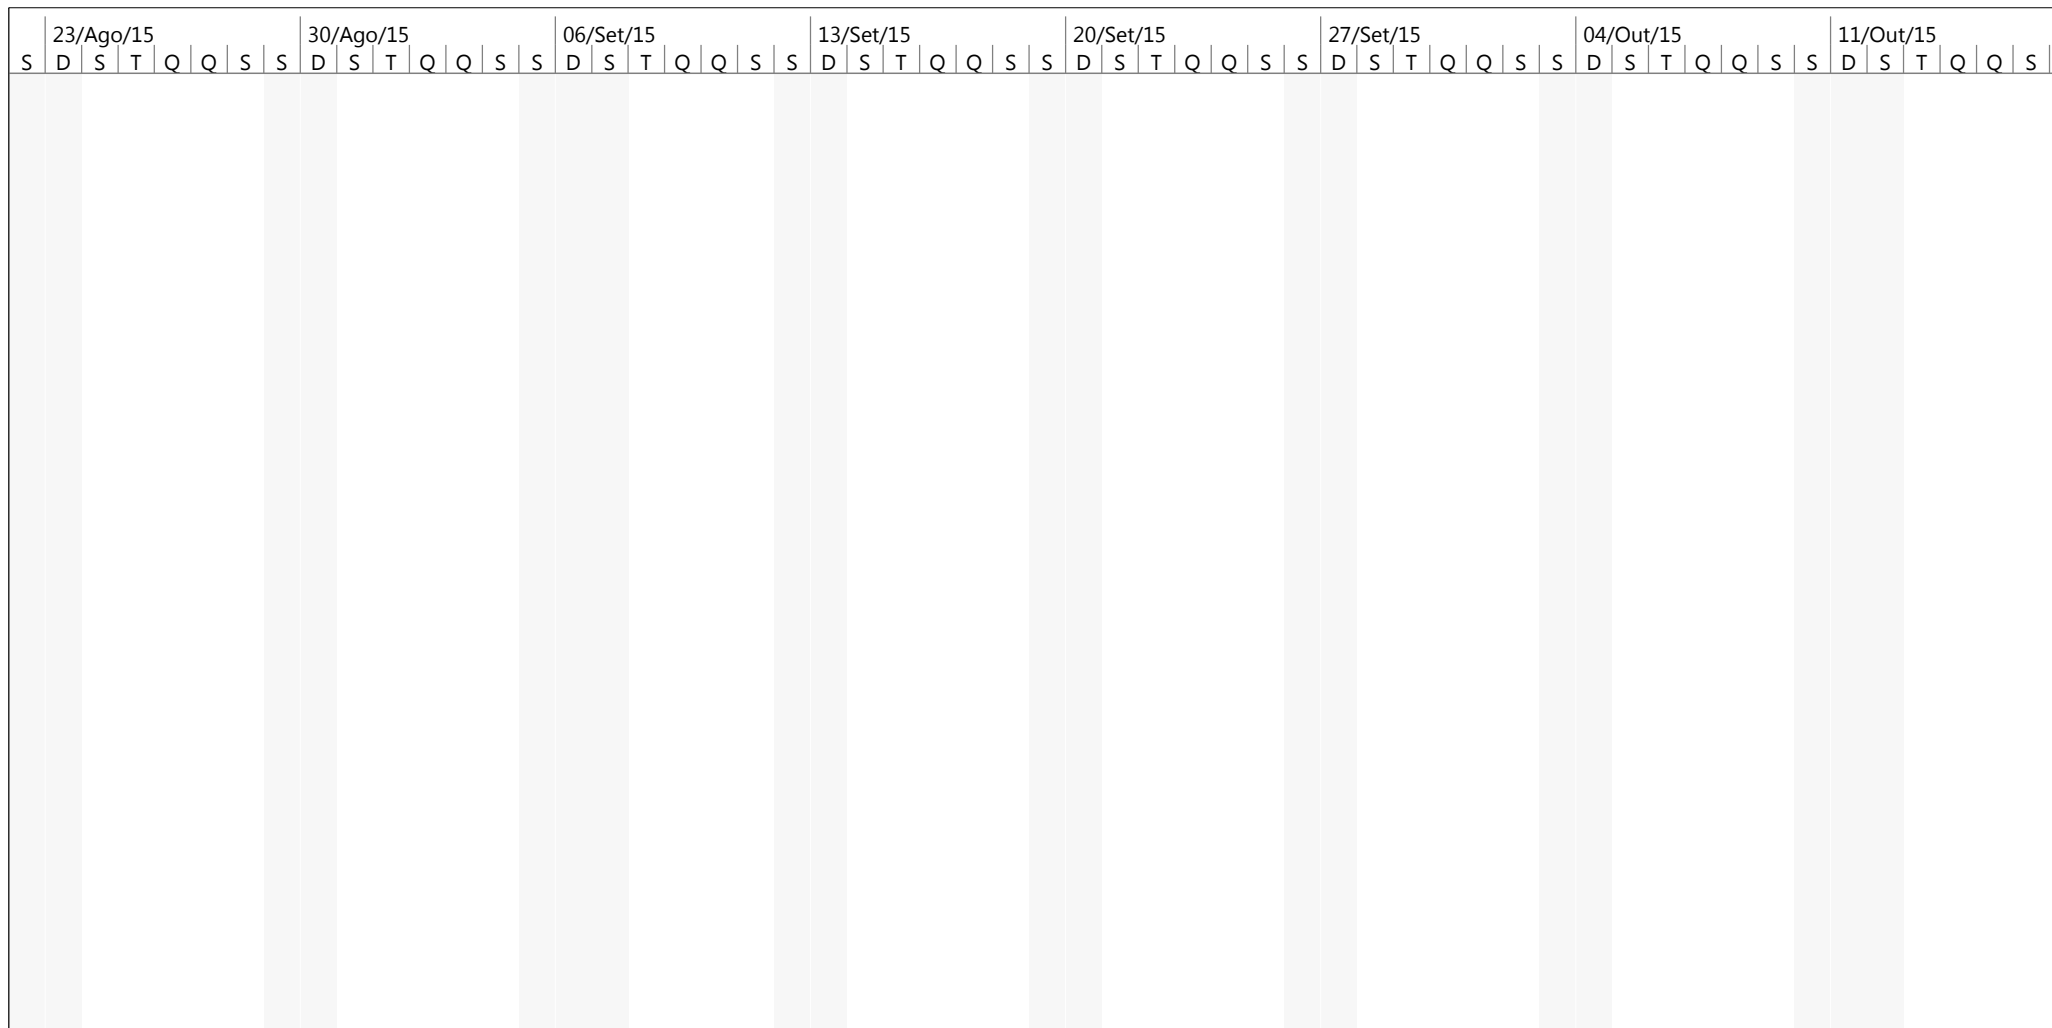


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

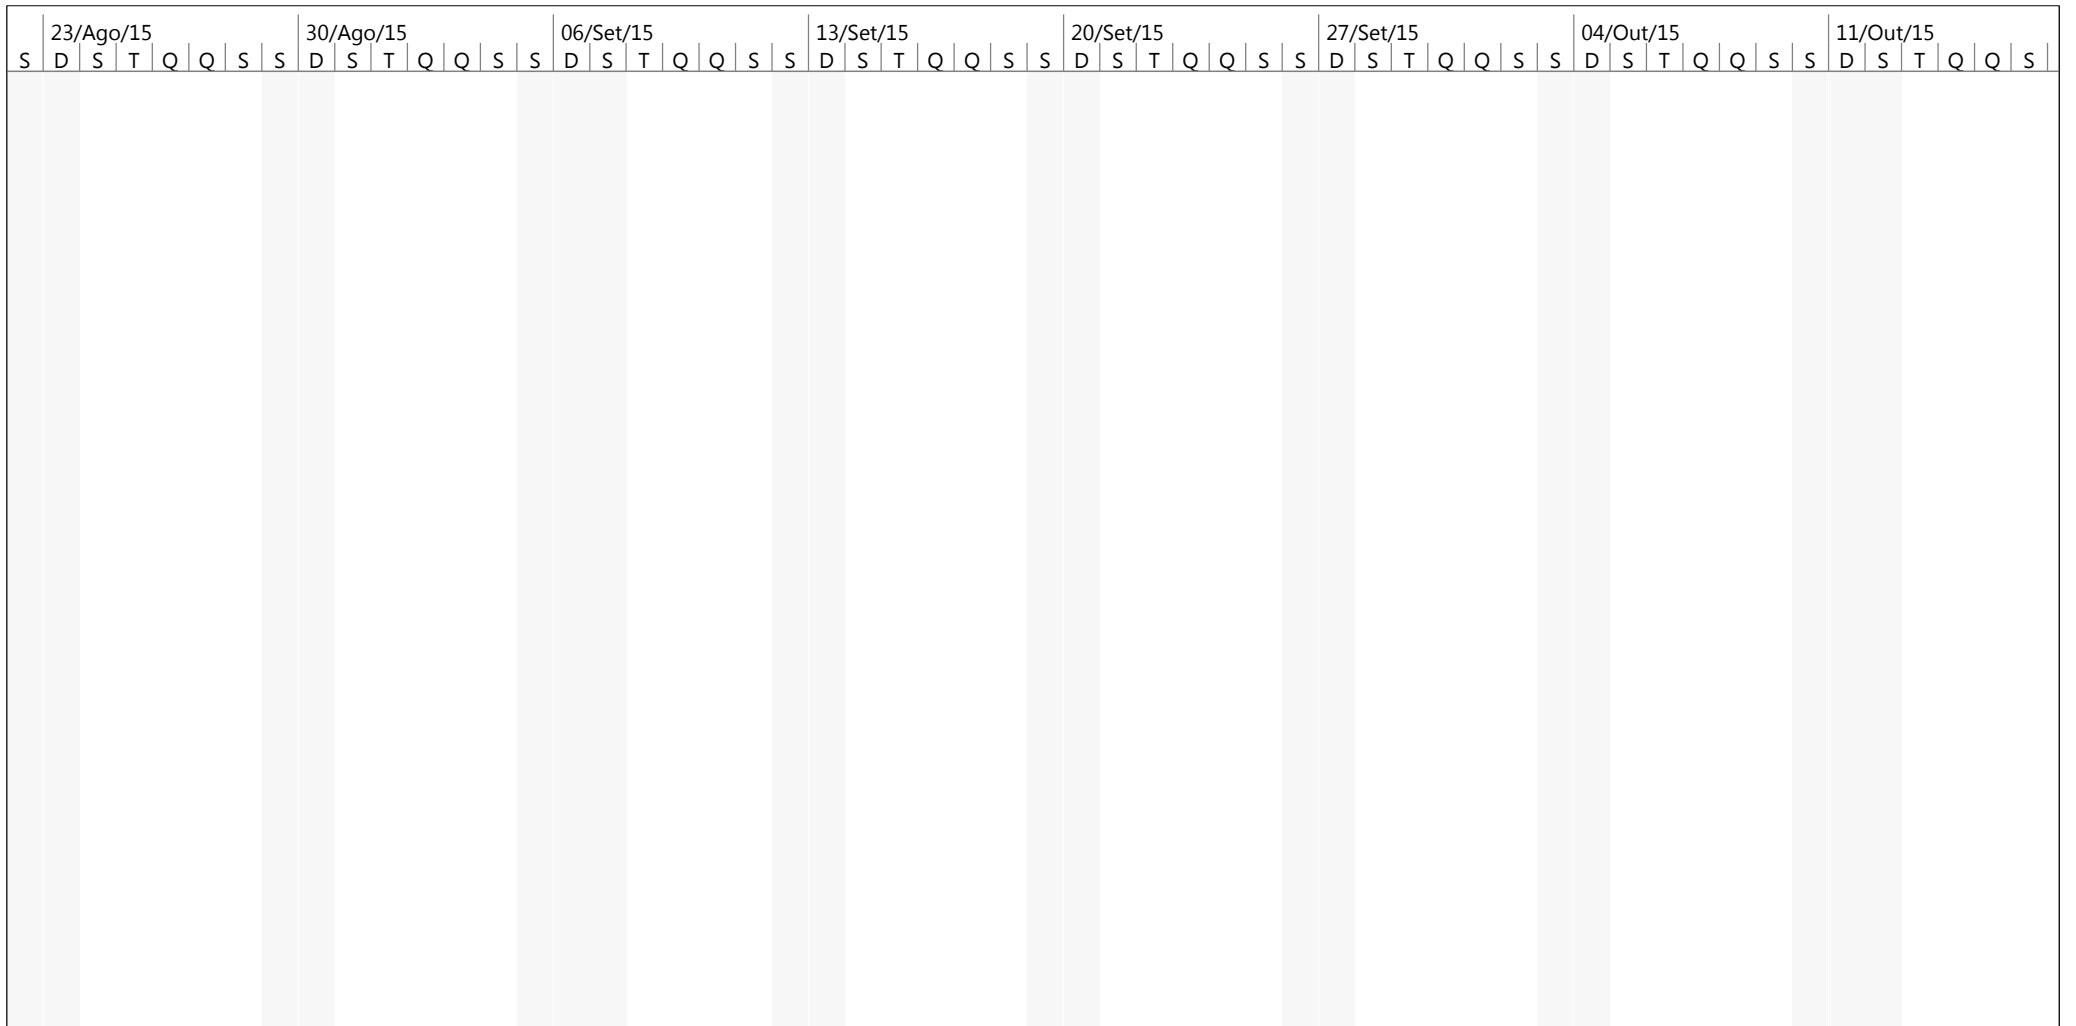



Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

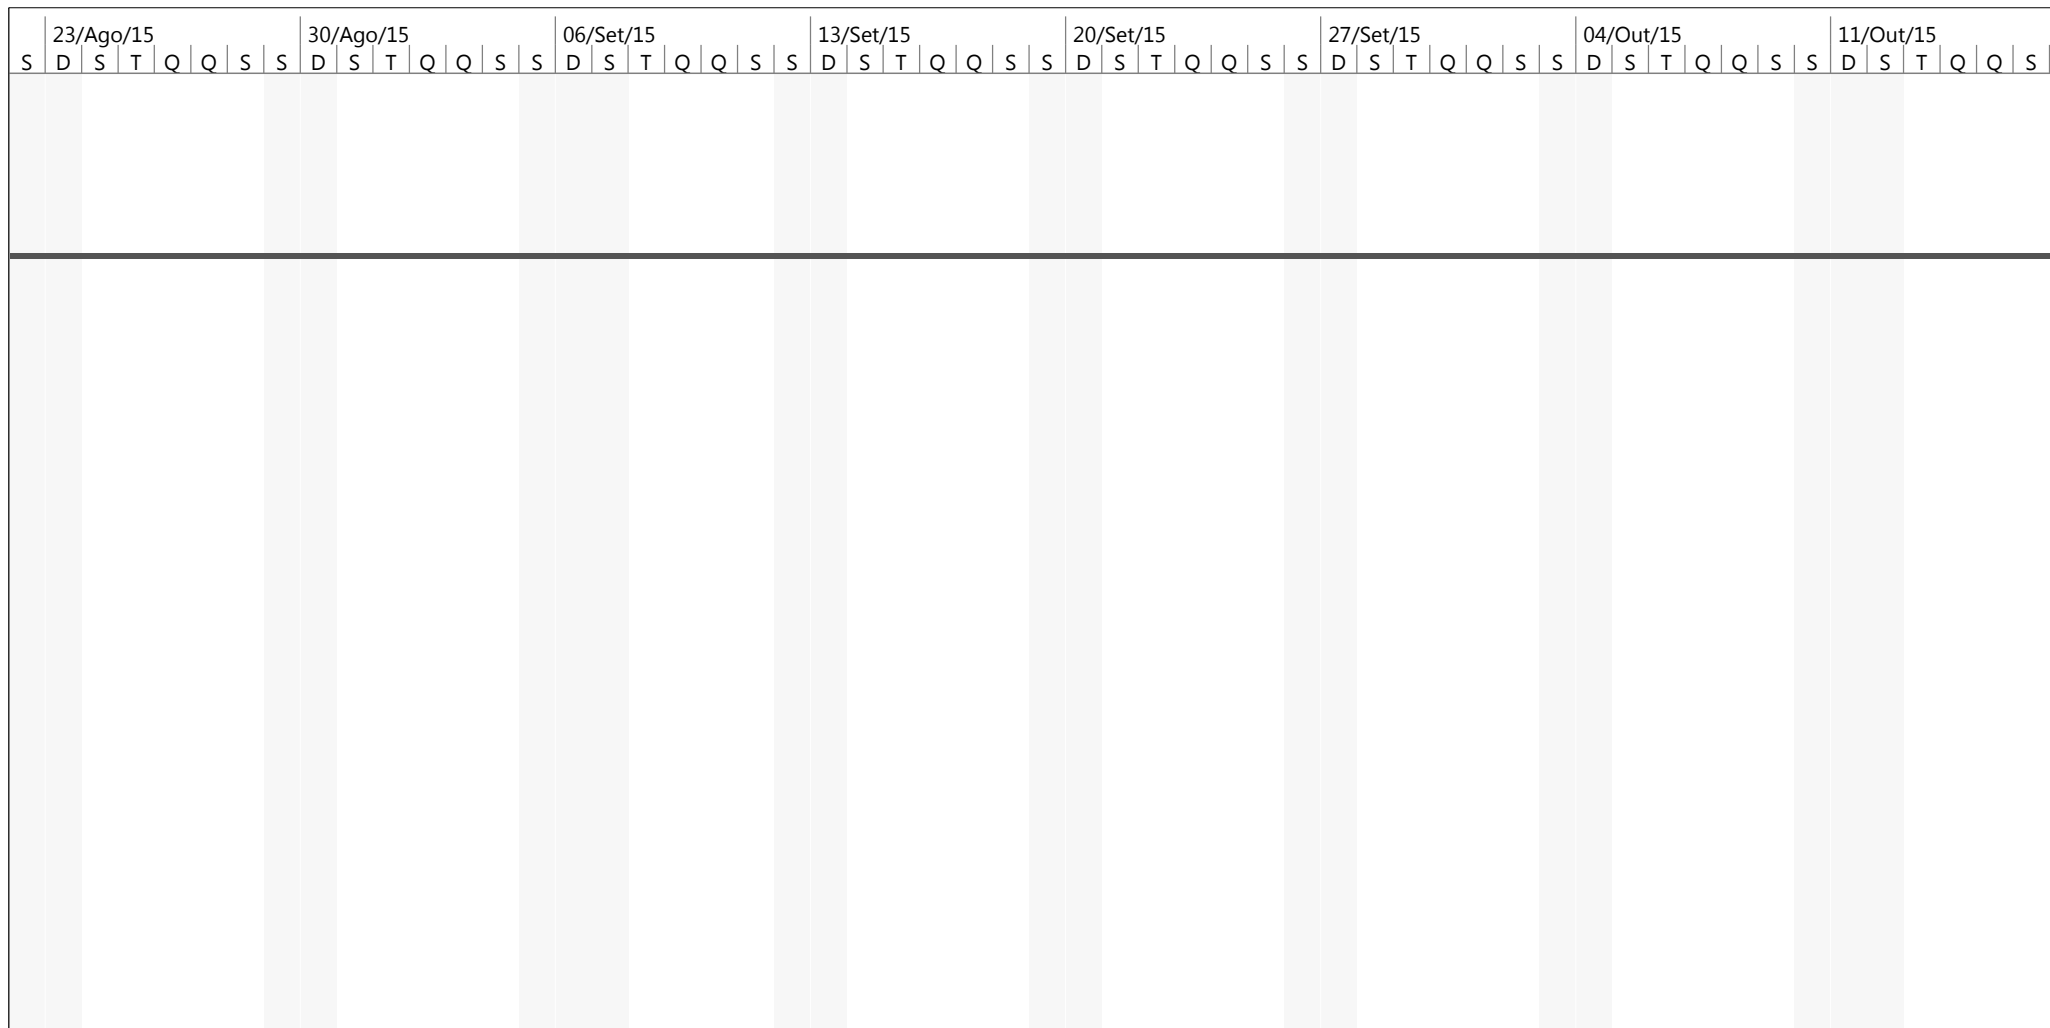


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

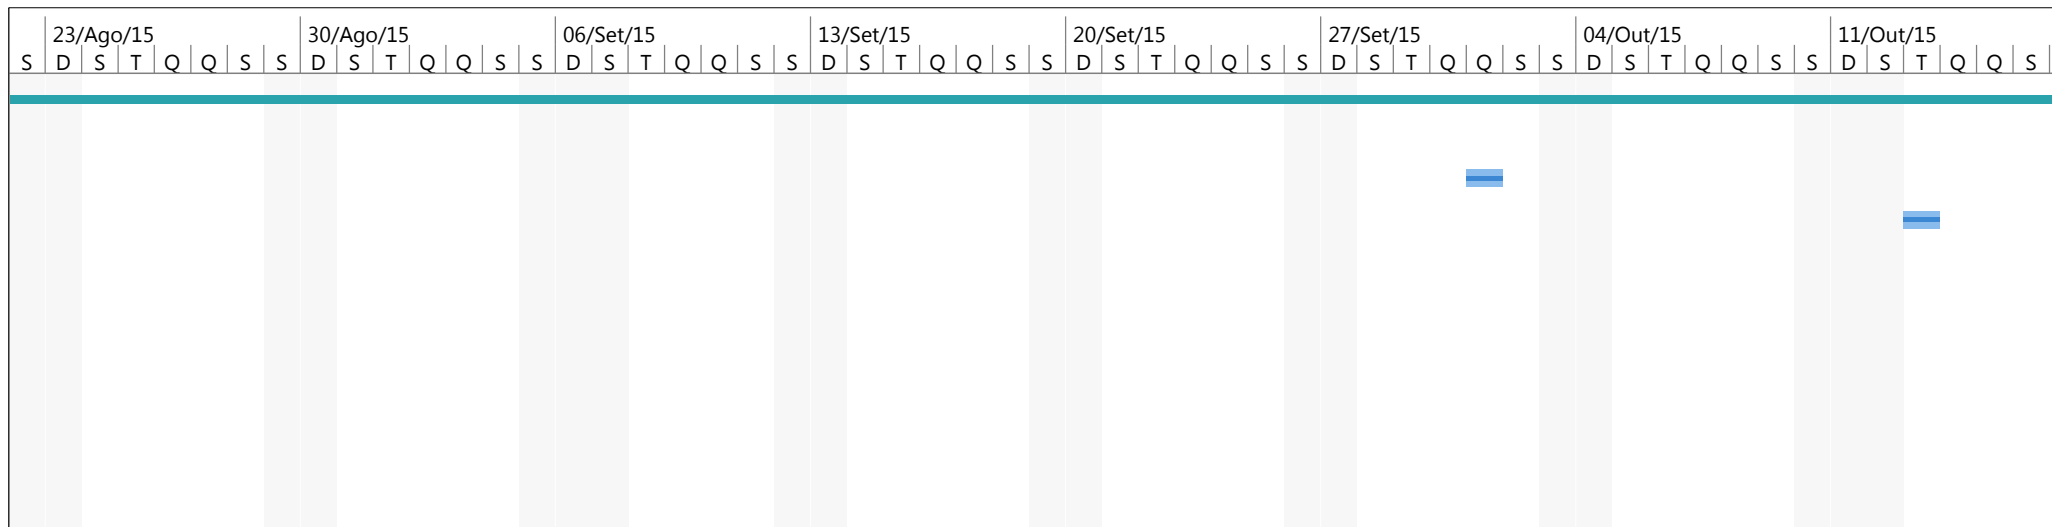


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

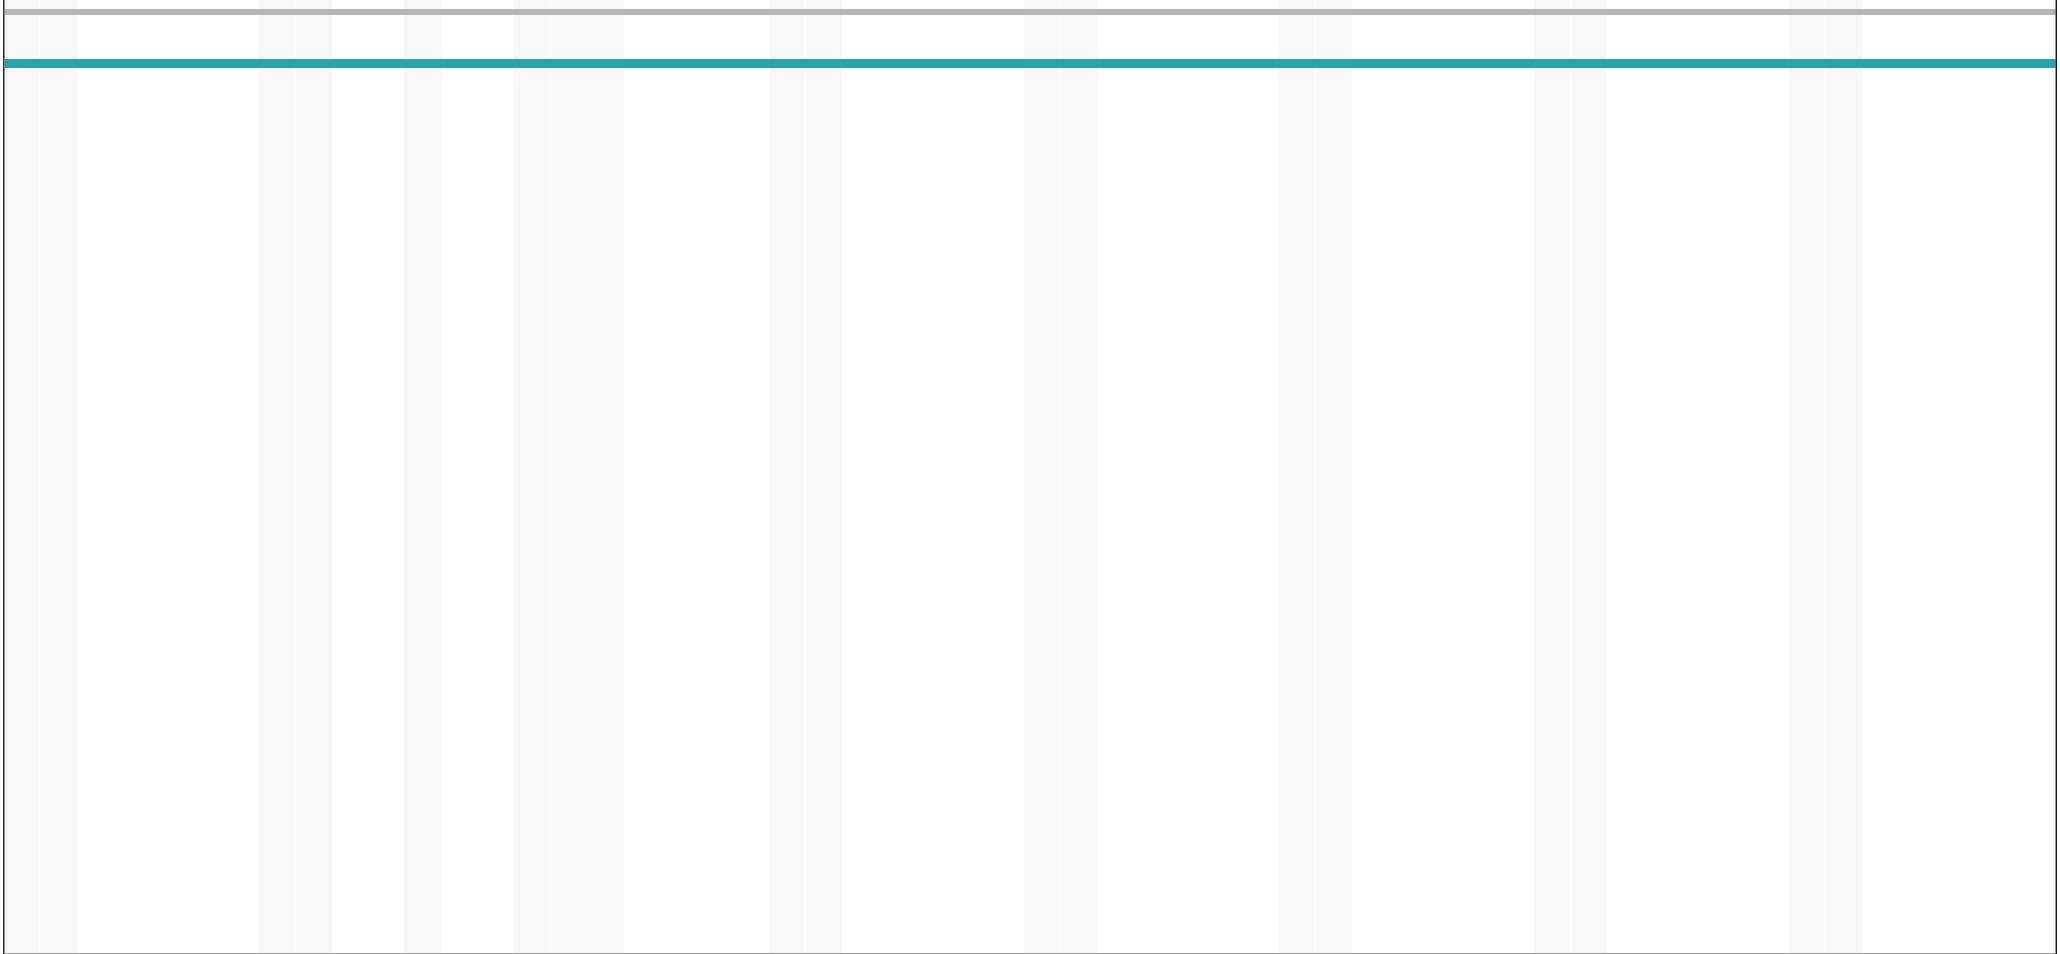


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

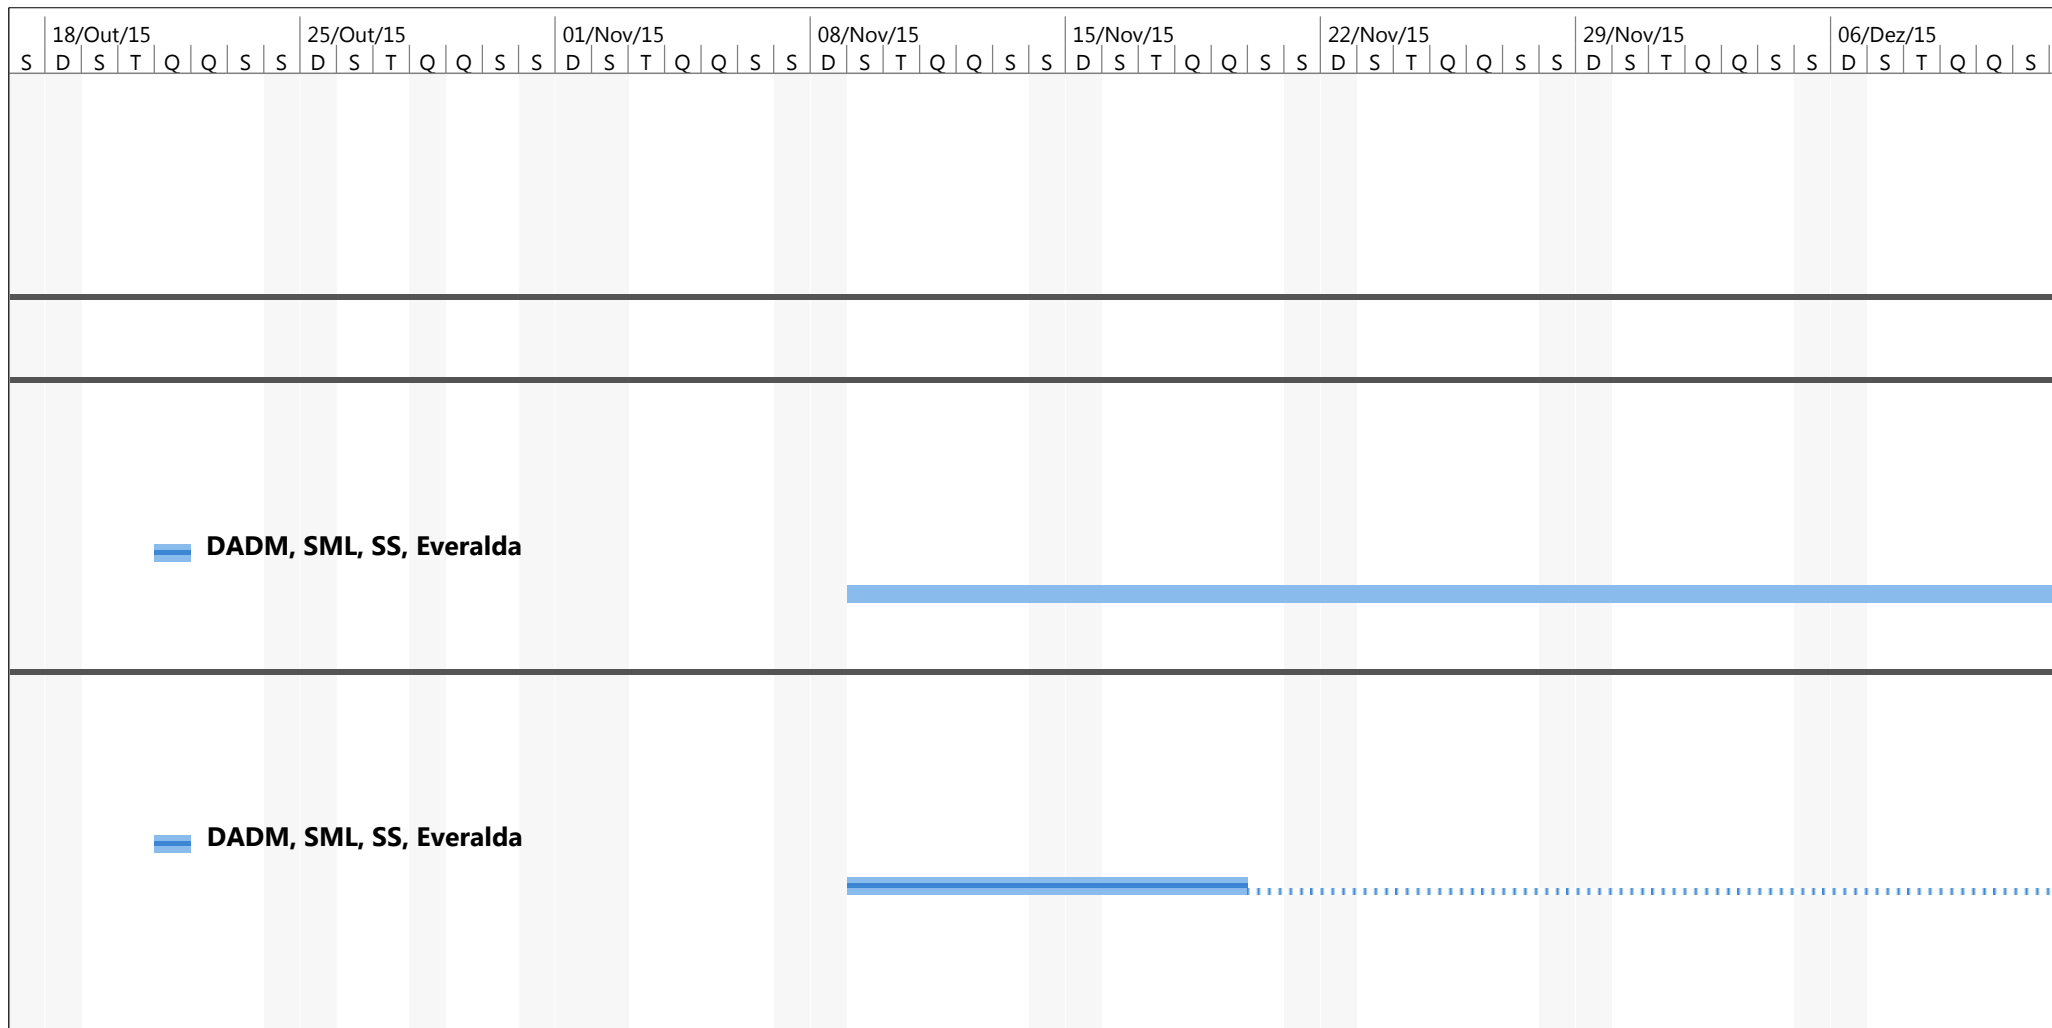


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

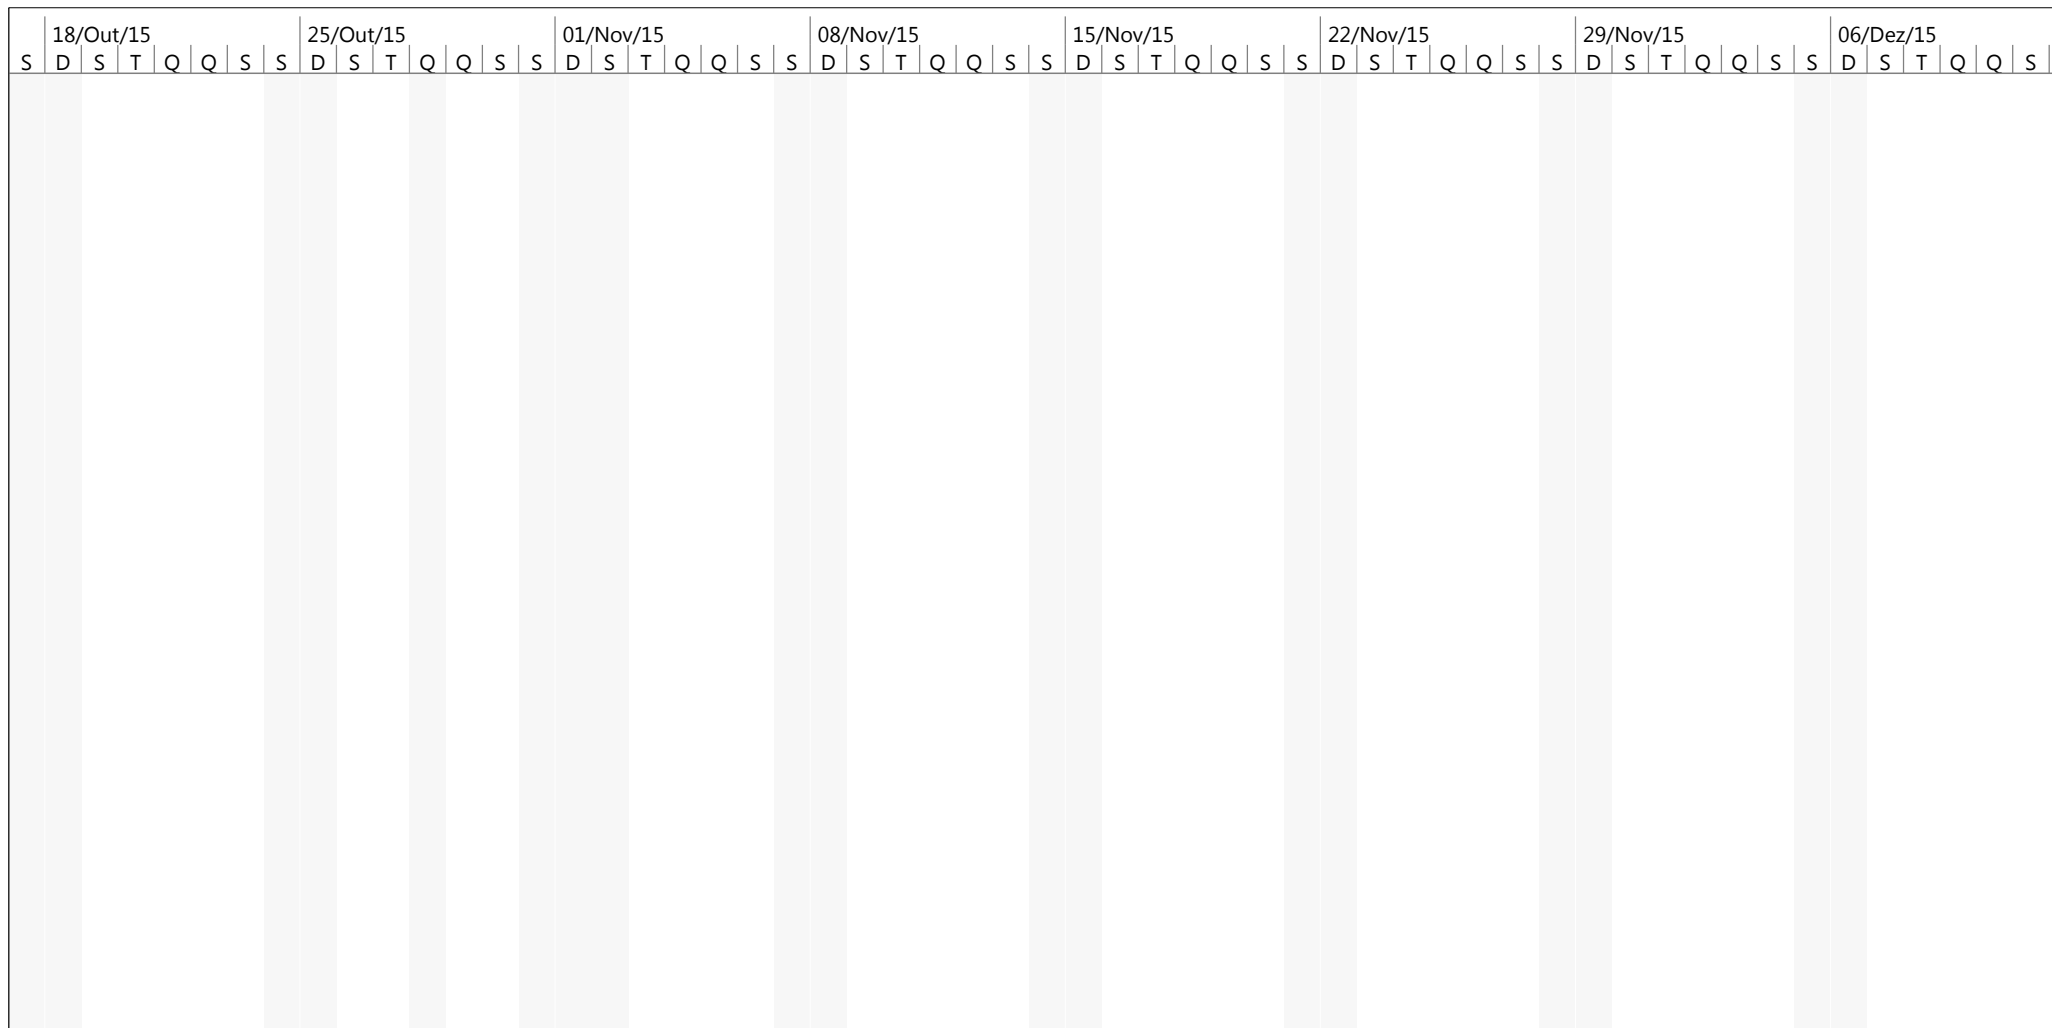


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


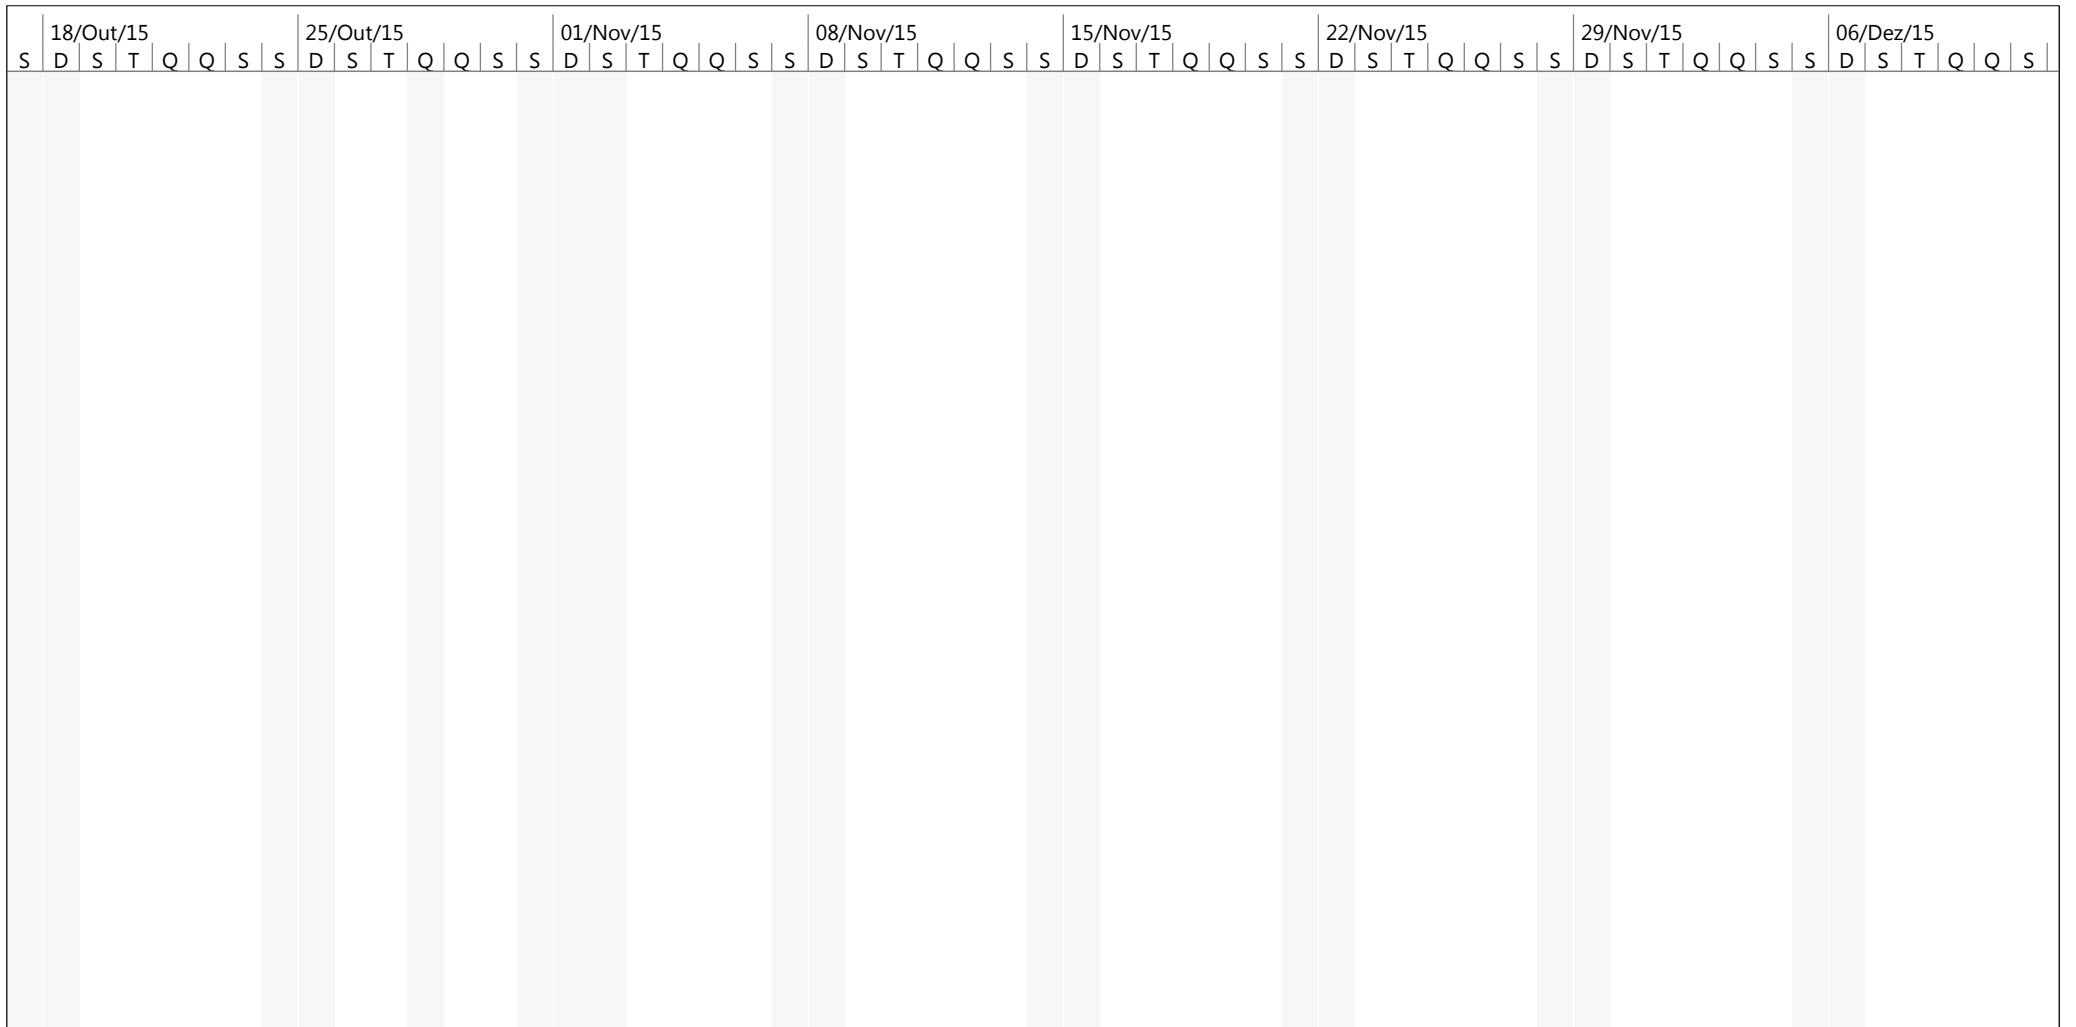


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

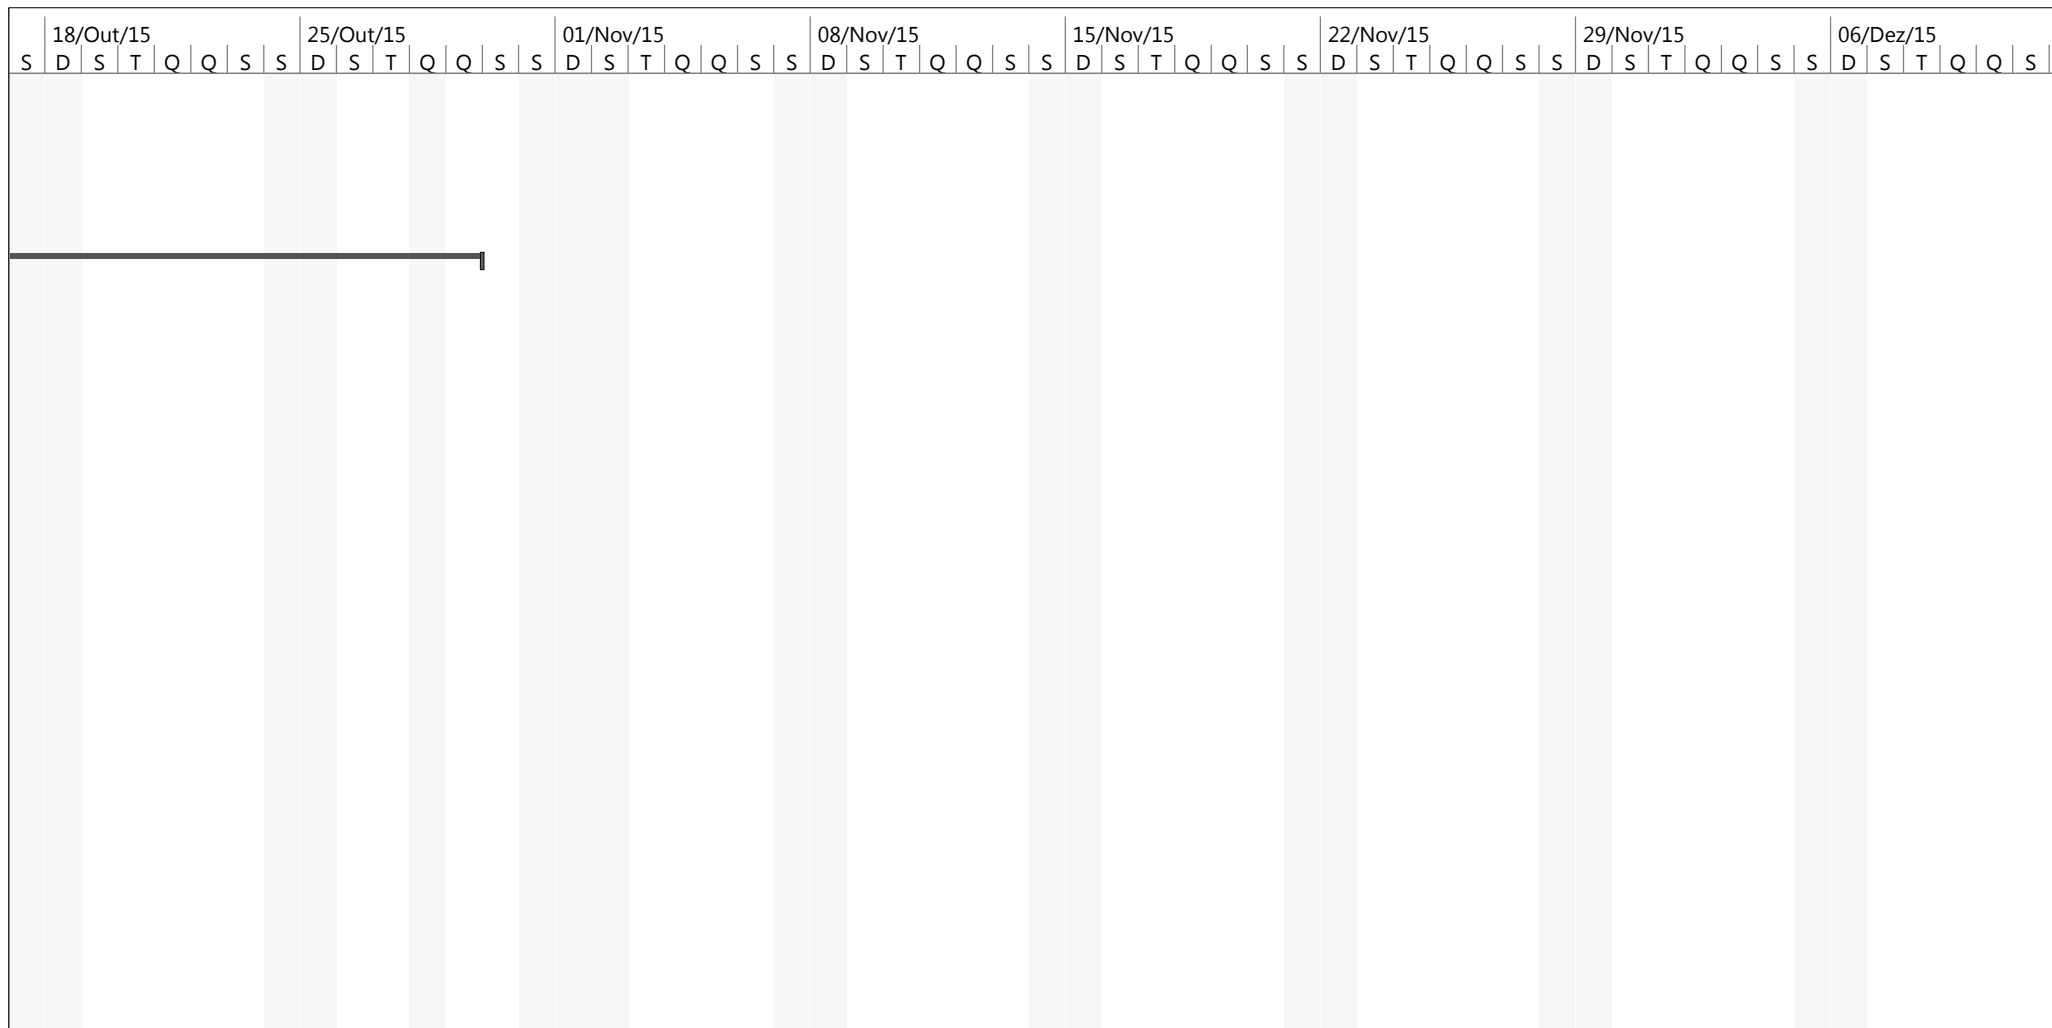


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

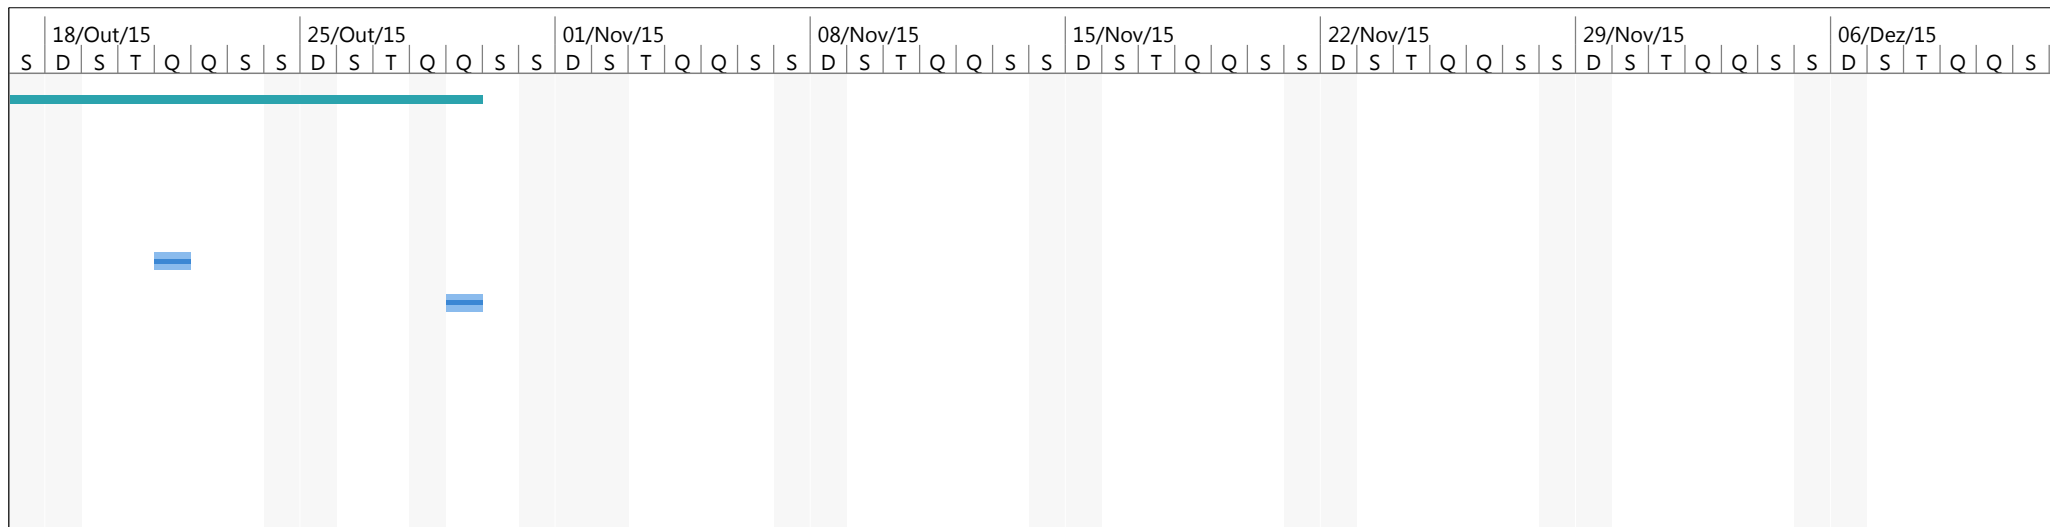


Projeto: SISTEMA DE CONTROL
 Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

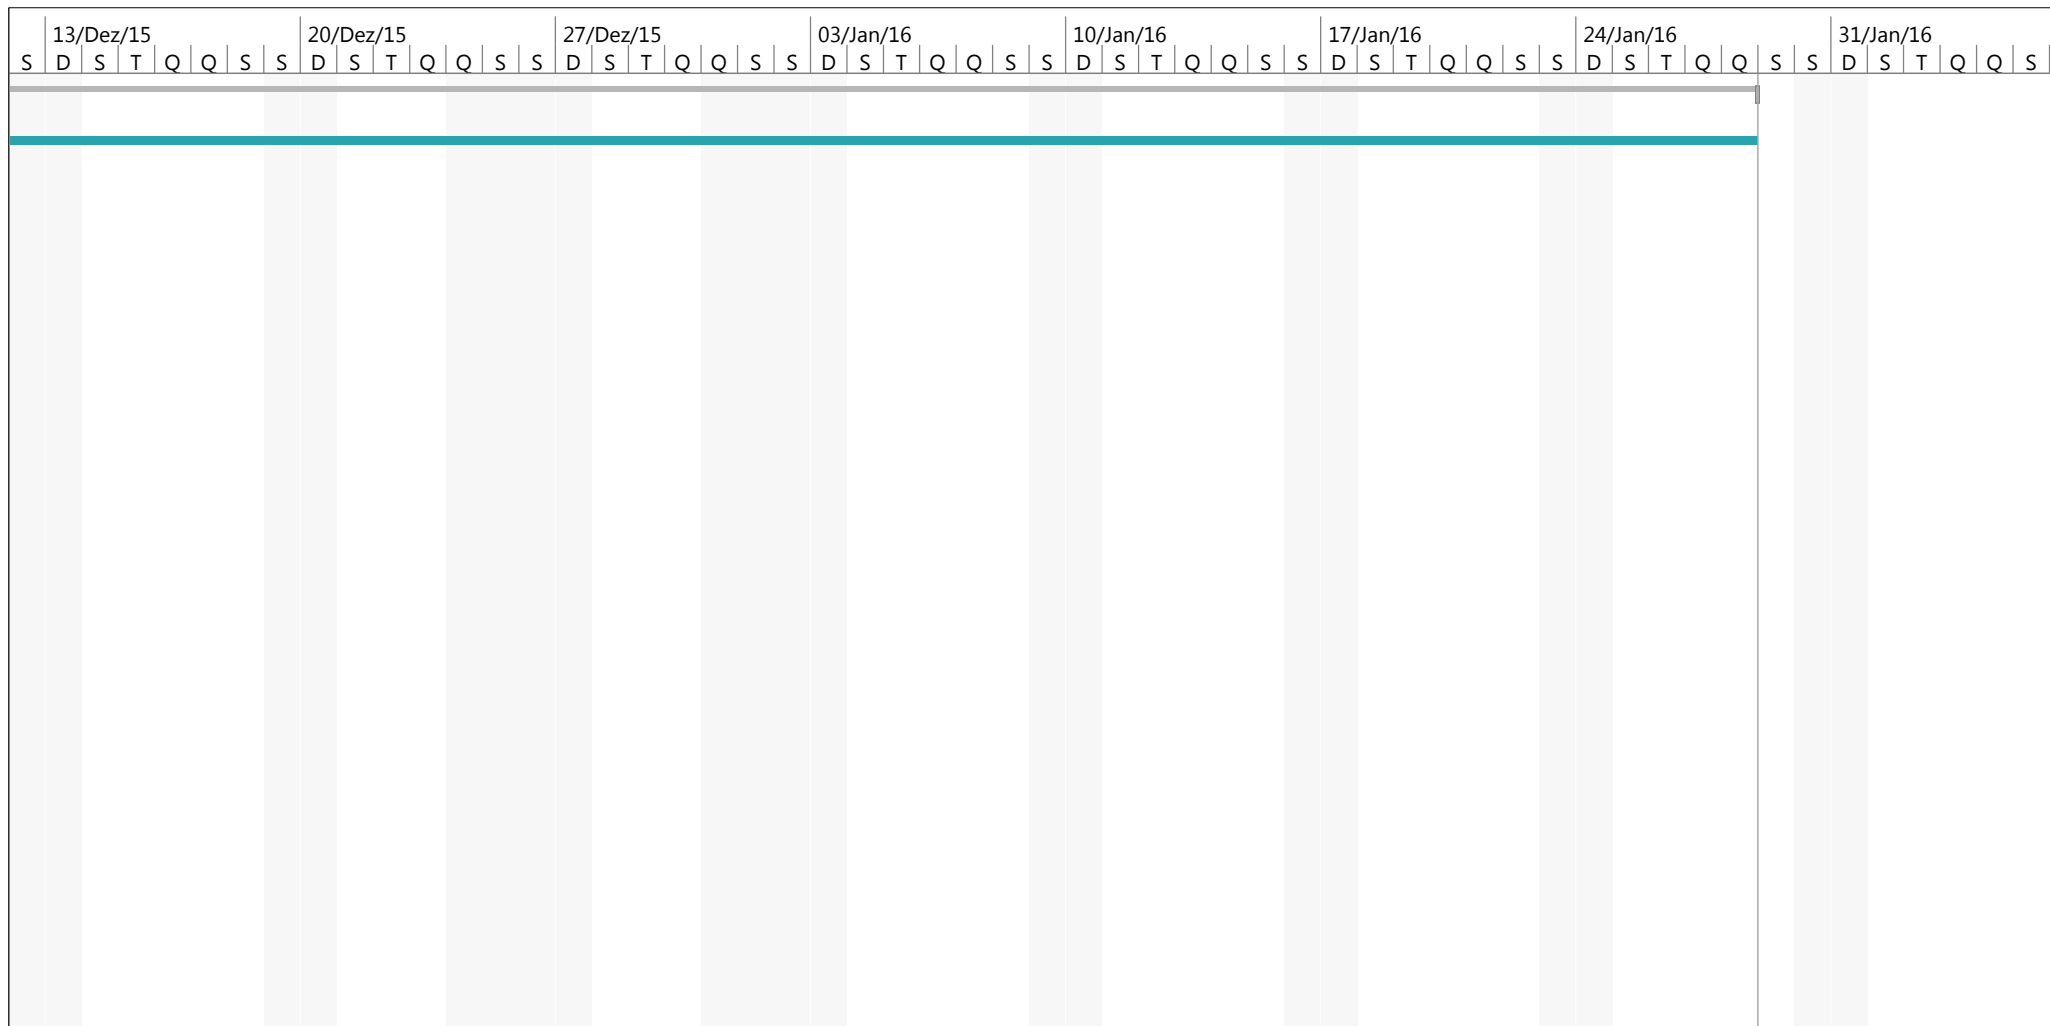


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

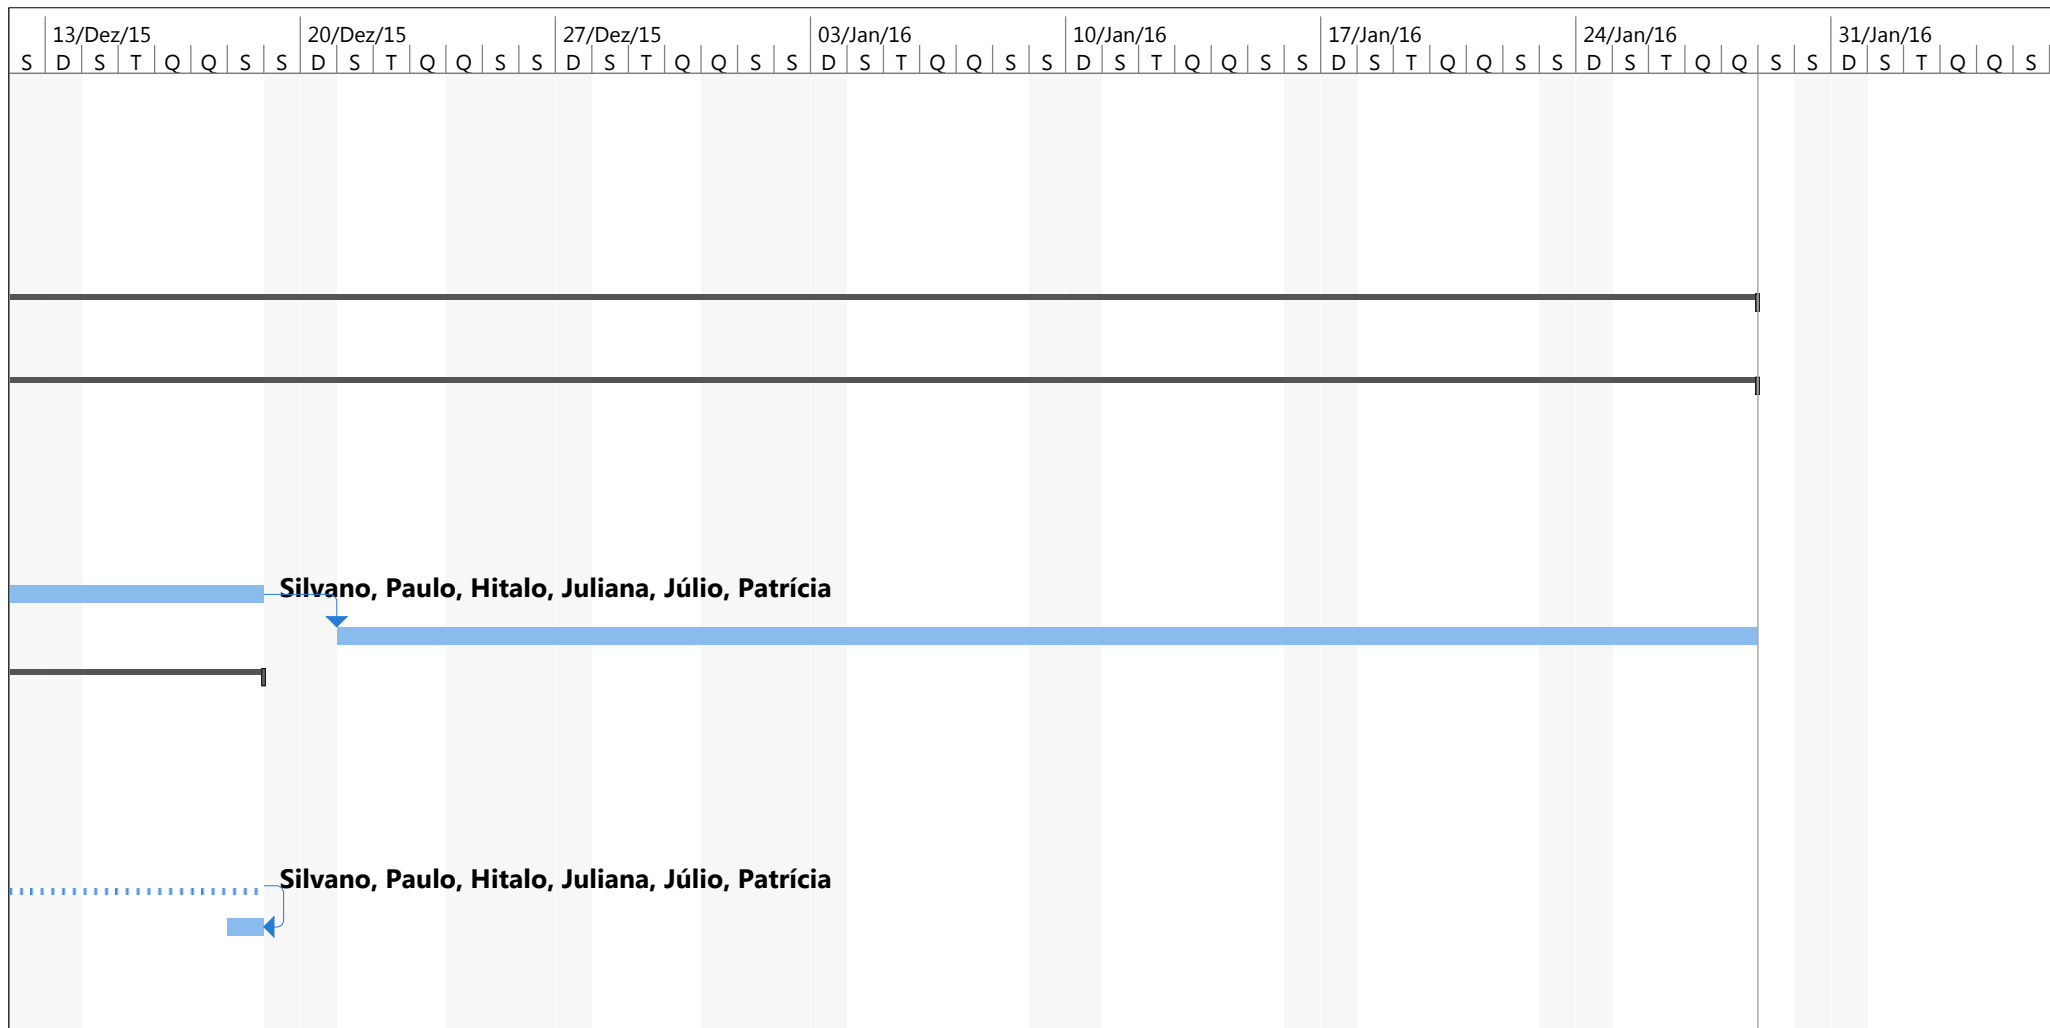


Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

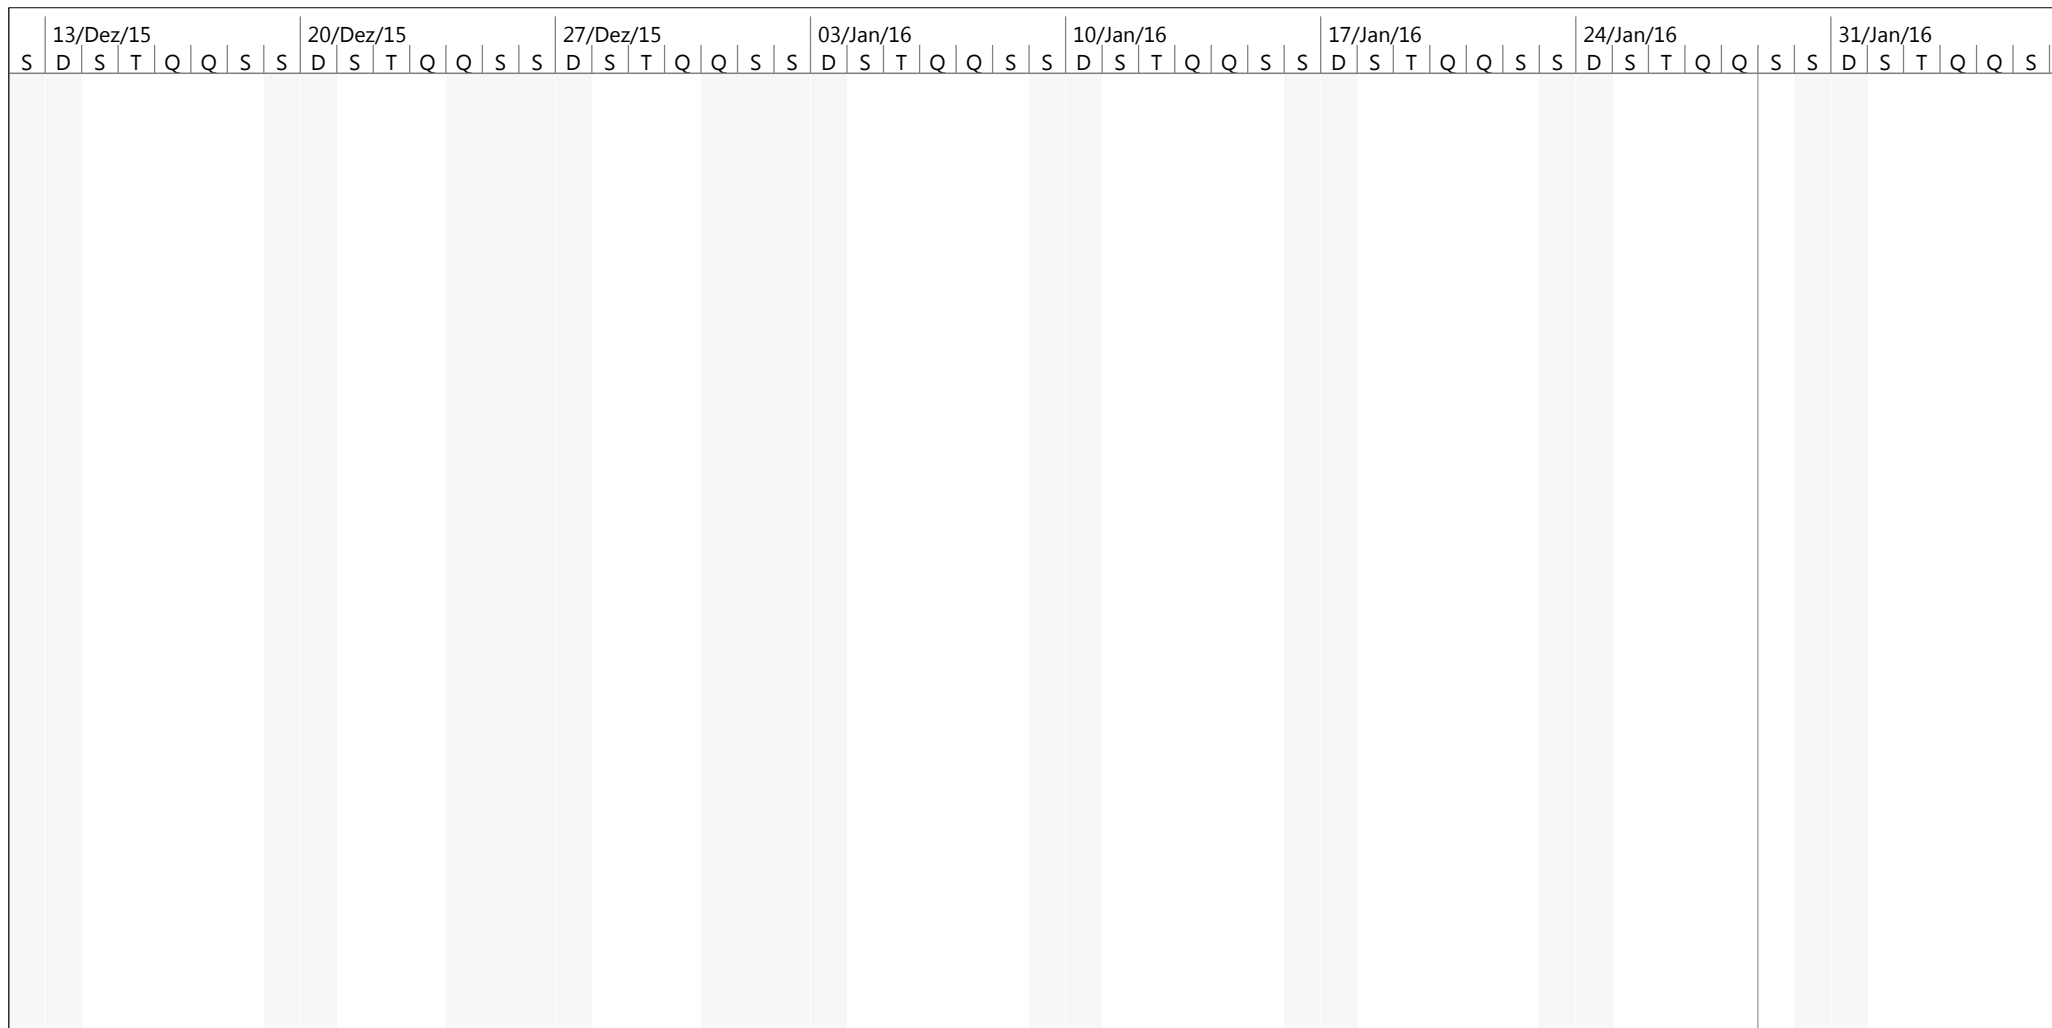



Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

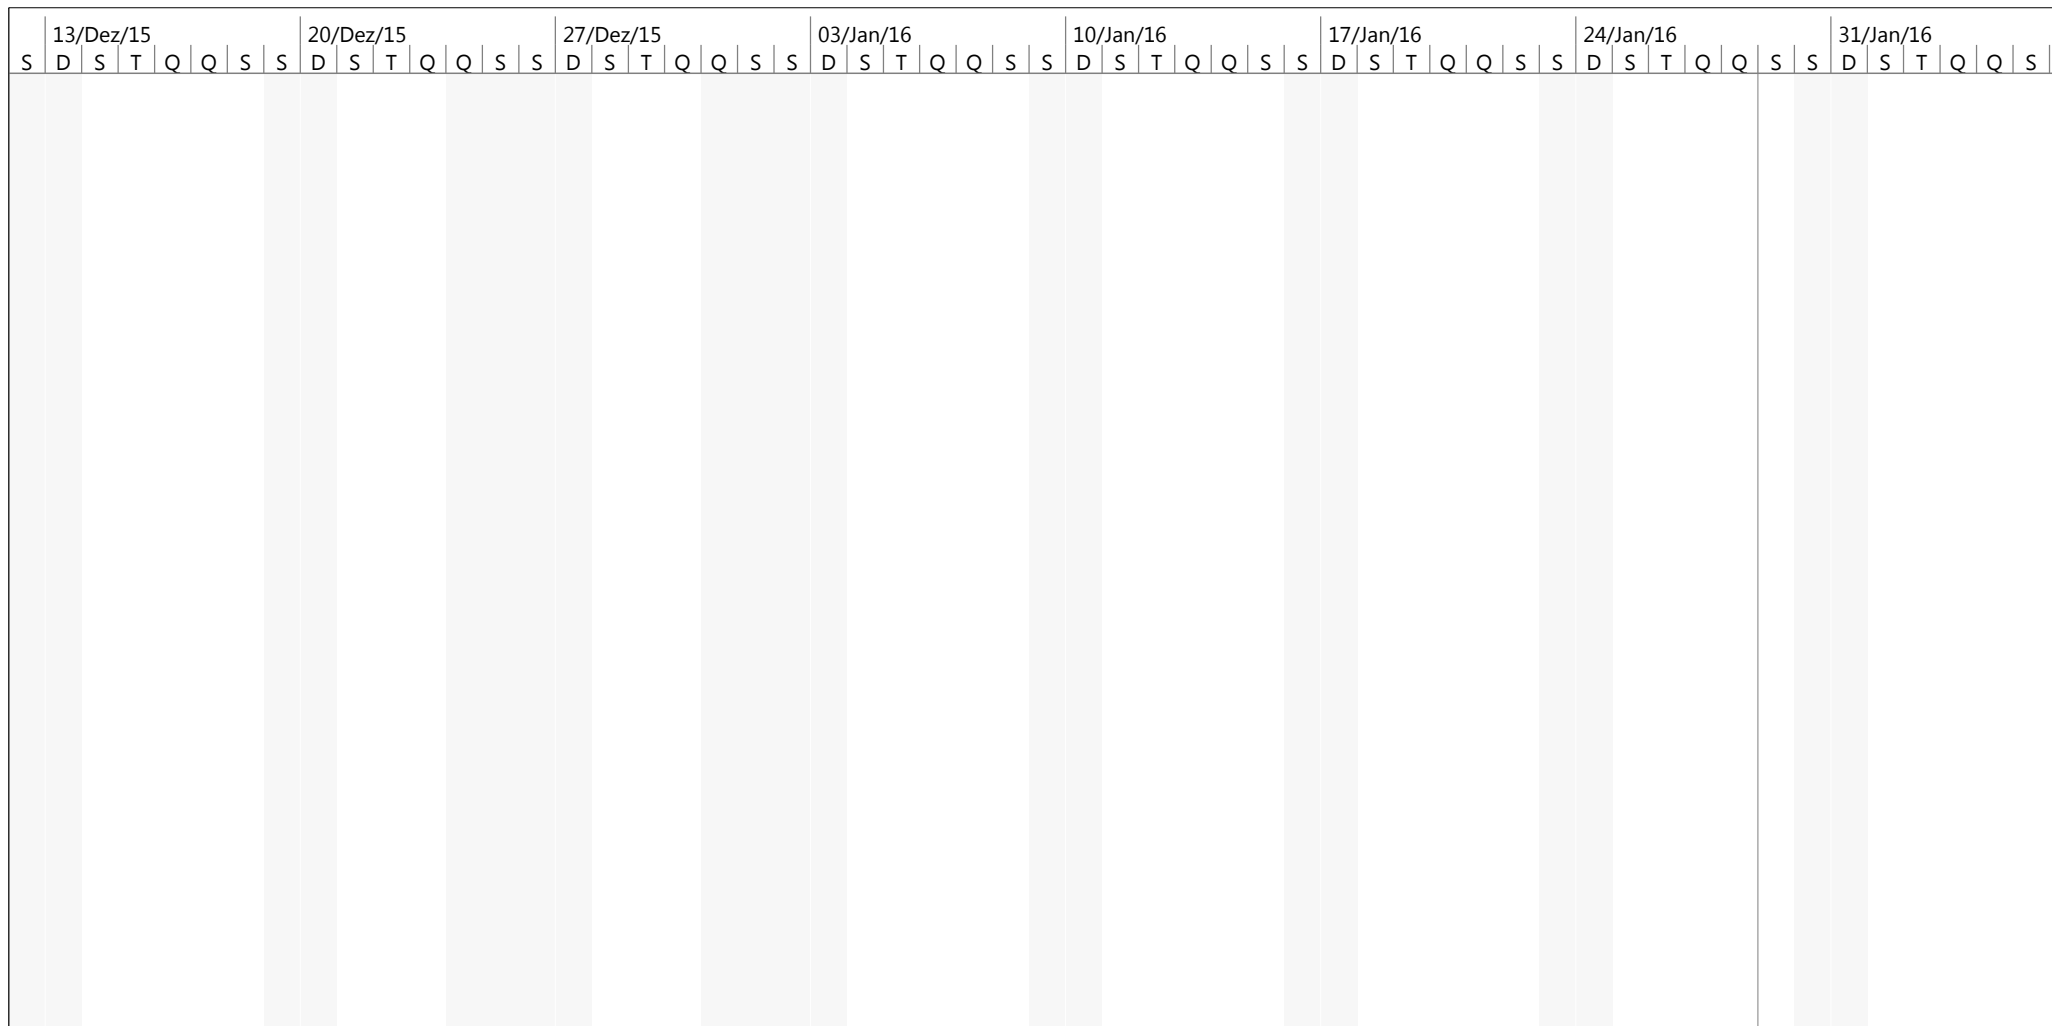

Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

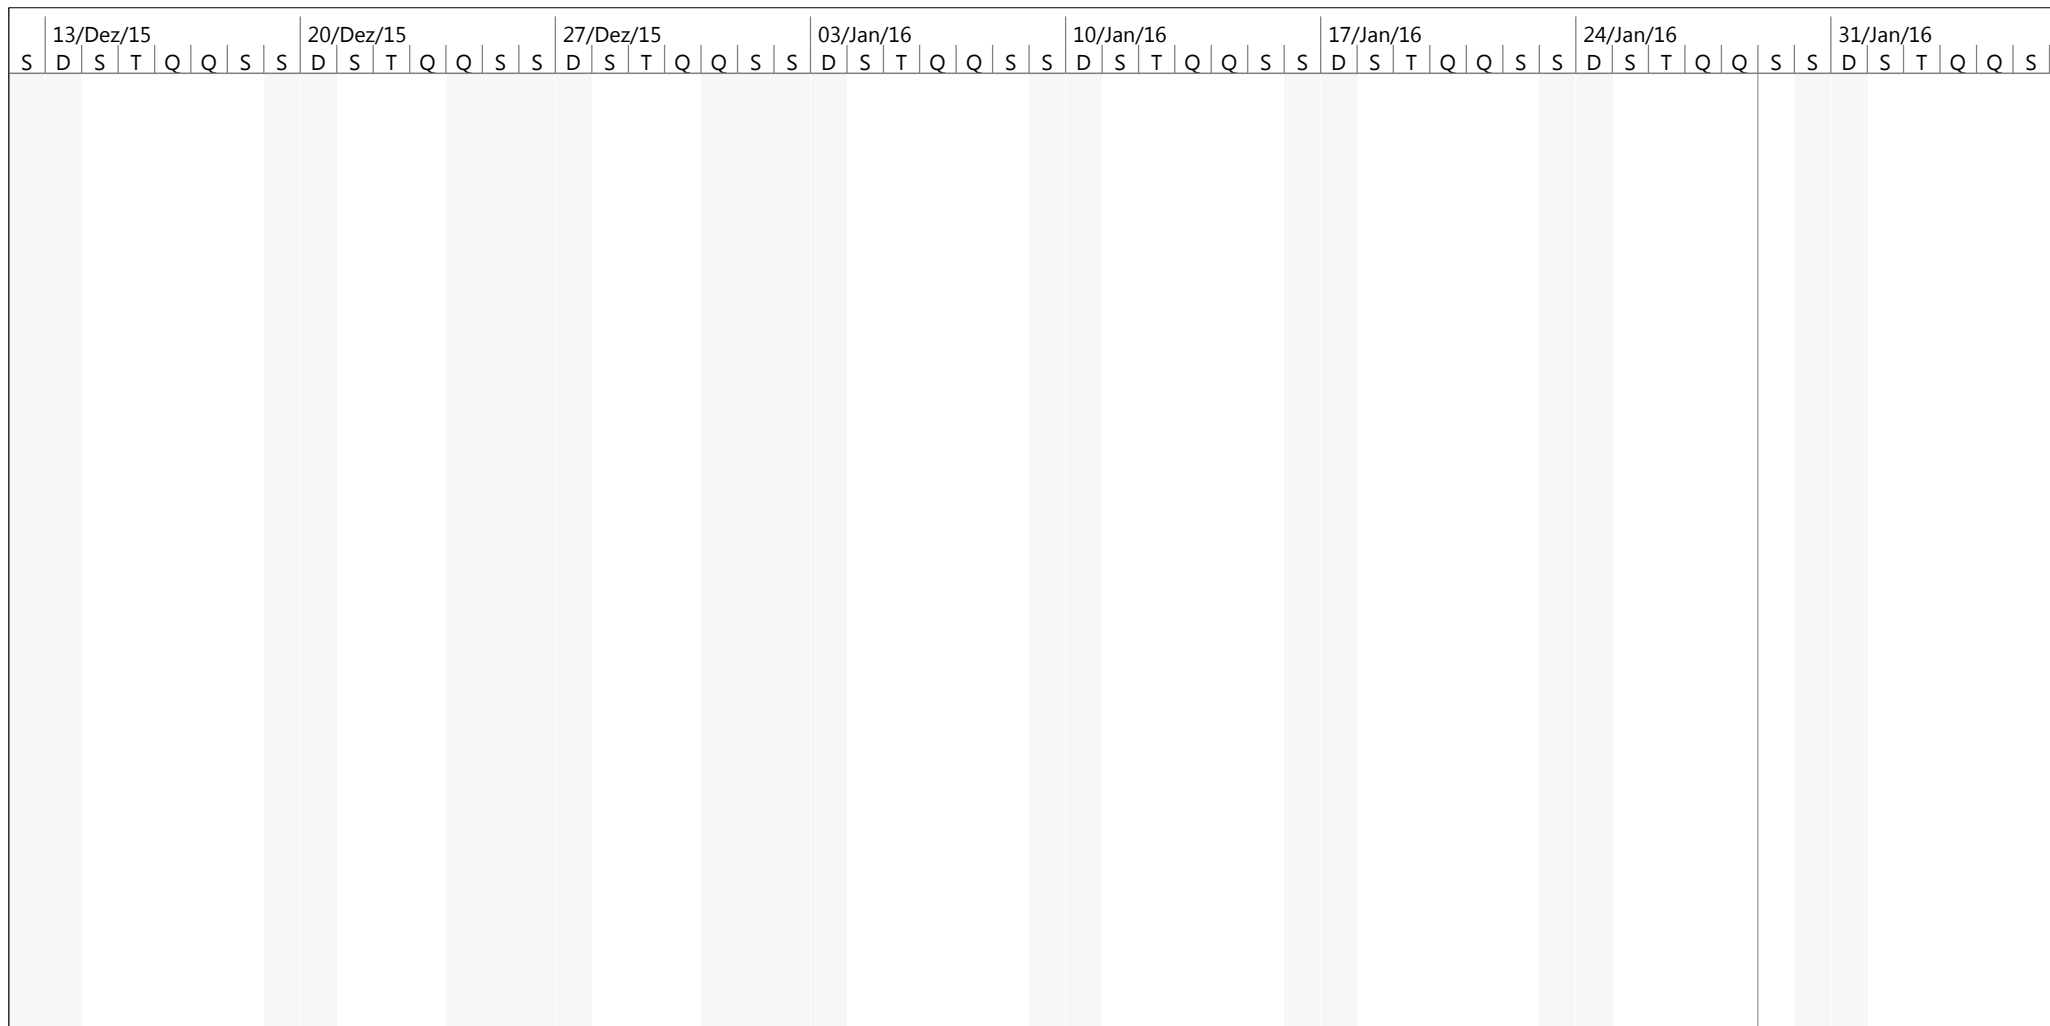

Projeto: SISTEMA DE CONTROL Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

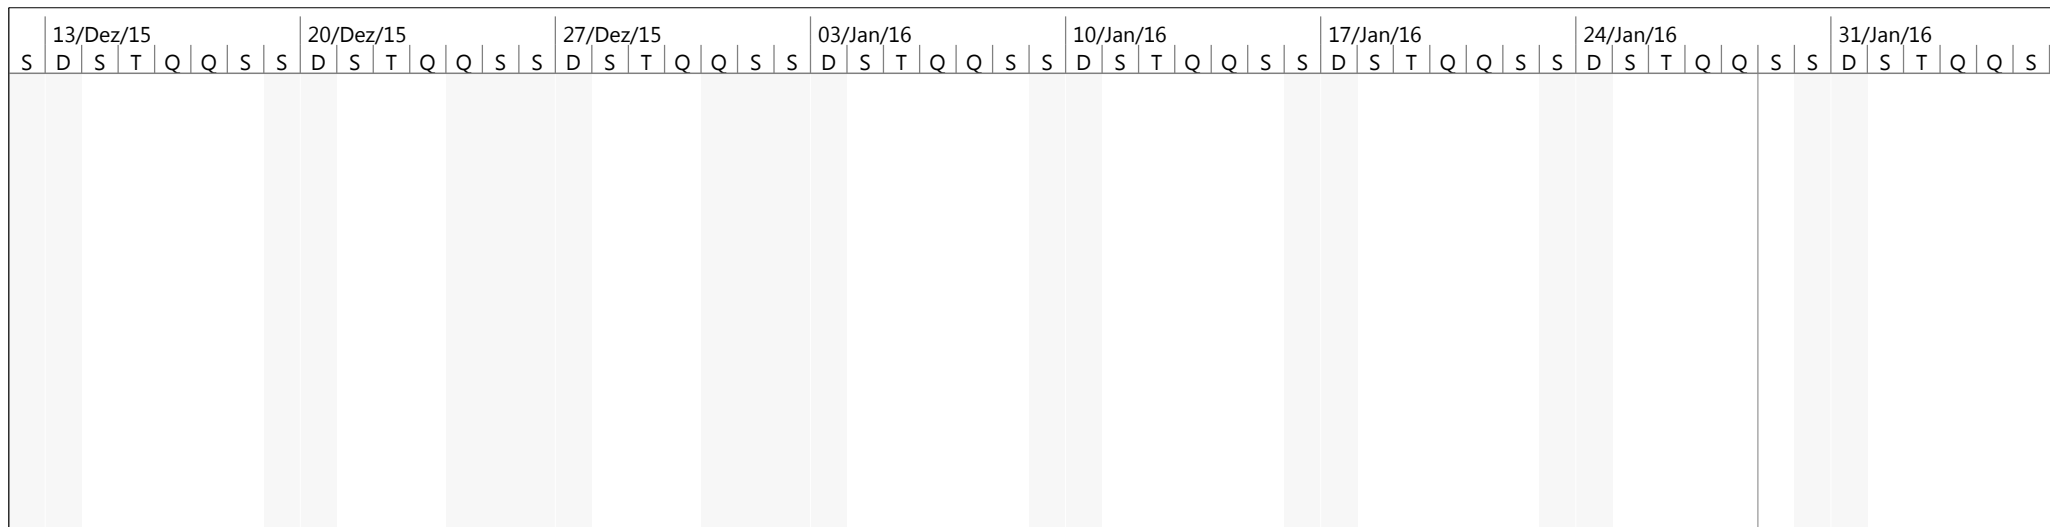

Projeto: SISTEMA DE CONTROL
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
