

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
0			0	<b>PROJETO EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO</b>		74%	726 dias	Seg 04/04/16
1			1	<b>Benchmarking</b>		100%	317 dias	Seg 30/05/16
8			2	<b>Fluxo de trabalho da execução</b>		87%	529 dias	Qua 01/06/16
9			2.1	<b>Estabelecimento do Fluxo de trabalho</b>		100%	146 dias	Qua 01/06/16
11			2.2	<b>Aprovação do Fluxo de trabalho</b>		93%	293 dias	Sex 20/01/17
14			2.3	Implantação do Fluxo de trabalho		86%	507 dias	Sex 01/07/16
15			2.3.1	Pesquisa patrimonial básica - oficiais de justiça		43%	507 dias	Sex 01/07/16
16			2.3.1.1	<b>Mobilização da categoria</b>		38%	477 dias	Sex 01/07/16
17			2.3.1.1.1	<b>Divulgação do projeto</b>		4%	477 dias	Sex 01/07/16
18			2.3.1.1.1.1	Participar do encontro anual dos oficiais de justiça de		100%	1 dia	Sex 01/07/16
19			2.3.1.1.1.2	Participar do encontro nacional dos oficiais de justiça em		100%	1 dia	Sex 08/09/17
20			2.3.1.1.1.3	Estabelecer uma estratégia para divulgação aos oficiais		0%	20 dias	Seg 14/05/18
21			2.3.1.1.1.4	Implementar a estratégia		0%	30 dias	Ter 12/06/18
22			2.3.1.1.2	Estabelecimento de uma comissão de oficiais		100%	20 dias	Seg 04/07/16
23			2.3.1.1.3	Reuniões de alinhamento		100%	246 dias	Qui 11/08/16
24			2.3.1.1.3.1	Reunião com oficiais		100%	1 dia	Qui 11/08/16
25			2.3.1.1.3.2	Reunião com oficiais		100%	1 dia	Sex 26/08/16
26			2.3.1.1.3.3	Reunião com oficiais		100%	1 dia	Sex 16/09/16
27			2.3.1.1.3.4	Reunião com oficiais		100%	1 dia	Sex 30/09/16
28			2.3.1.1.3.5	Reunião com oficiais		100%	1 dia	Qui 09/03/17
29			2.3.1.1.3.6	Reunião com oficiais do interior		100%	1 dia	Sex 31/03/17
30			2.3.1.1.3.7	Reunião com oficiais		100%	1 dia	Sex 26/05/17

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
31			2.3.1.1.3.8	Reunião com oficiais		100%	1 dia	Seg 04/09/17
32			<b>2.3.1.2</b>	<b>Capacitação no uso das ferramentas</b>		<b>57%</b>	<b>344 dias</b>	<b>Ter 21/03/17</b>
33			<b>2.3.1.2.1</b>	<b>Planejamento da capacitação</b>		<b>84%</b>	<b>170 dias</b>	<b>Sex 08/09/17</b>
34			2.3.1.2.1.1	Reunir com EJ para apresentar o projeto		100%	1 dia	Sex 08/09/17
35			2.3.1.2.1.2	Reunir com EJ para planejar as novas capacitações		100%	1 dia	Sex 15/09/17
36			2.3.1.2.1.3	Definir os instrutores		100%	10 dias	Seg 18/09/17
37			2.3.1.2.1.4	Preparar material		100%	93 dias	Seg 18/09/17
38			2.3.1.2.1.5	Encaminhar para a EJ		100%	1 dia	Seg 26/02/18
39			2.3.1.2.1.6	Definir o formato, as datas e locais dos cursos		0%	20 dias	Seg 14/05/18
40			<b>2.3.1.2.2</b>	<b>Realização da capacitação</b>		<b>3%</b>	<b>344 dias</b>	<b>Ter 21/03/17</b>
41			2.3.1.2.2.1	Turma 1 - BH		100%	1 dia	Ter 21/03/17
42			2.3.1.2.2.2	Turma 2 - BH		100%	1 dia	Ter 02/05/17
43			2.3.1.2.2.3	Outras turmas		0%	60 dias	Ter 12/06/18
44			<b>2.3.1.3</b>	<b>Notebooks</b>		<b>2%</b>	<b>110 dias</b>	<b>Ter 20/02/18</b>
45			2.3.1.3.1	Estabelecimento de critérios para distribuição - com Dr.		100%	1 dia	Ter 20/02/18
46			2.3.1.3.2	Estabelecimento de critérios para distribuição - com		0%	20 dias	Seg 14/05/18
47			2.3.1.3.3	Divulgação dos critérios		0%	5 dias	Ter 12/06/18
48			2.3.1.3.4	Distribuição dos notebooks		0%	30 dias	Ter 19/06/18
49			<b>2.3.2</b>	<b>Normatização</b>		<b>97%</b>	<b>484 dias</b>	<b>Seg 01/08/16</b>
62			<b>2.3.3</b>	<b>Melhorias acessórias na execução</b>		<b>95%</b>	<b>392 dias</b>	<b>Qua 17/08/16</b>
63			2.3.3.1	Página reunião de execuções na intranet		100%	43 dias	Qua 17/08/16
64			<b>2.3.3.2</b>	<b>Ferramentas eletrônicas</b>		<b>94%</b>	<b>316 dias</b>	<b>Sex 09/12/16</b>

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
81			<b>3</b>	<b>Projetos pilotos</b>		<b>100%</b>	<b>267 dias</b>	<b>Ter 04/10/16</b>
82			<b>3.1</b>	Itabira		<b>100%</b>	<b>248 dias</b>	<b>Ter 04/10/16</b>
114			<b>3.2</b>	<b>Santa Rita do Sapucaí</b>		<b>100%</b>	<b>9 dias</b>	<b>Qua 22/02/17</b>
119			<b>3.3</b>	<b>Cataguases</b>		<b>100%</b>	<b>125 dias</b>	<b>Seg 29/05/17</b>
120			<b>3.3.1</b>	Planejamento do piloto		<b>100%</b>	<b>8 dias</b>	<b>Seg 29/05/17</b>
123			3.3.2	Desenvolvimento do piloto		100%	119 dias	Seg 05/06/17
124			<b>3.3.3</b>	Acompanhamento do piloto		<b>100%</b>	<b>124 dias</b>	<b>Seg 29/05/17</b>
130			3.3.4	Encerramento do piloto		100%	1 dia	Qui 30/11/17
131			<b>3.4</b>	Passos (entregas iguais às de Itabira)		<b>100%</b>	<b>83 dias</b>	<b>Seg 03/07/17</b>
148			<b>4</b>	<b>Desenvolvimento do Módulo de execução do PJe (subprojeto)</b>		<b>37%</b>	<b>724 dias</b>	<b>Seg 04/04/16</b>
149			4.1	Estabelecimento da parceria com outros regionais (TRT3, TRT5 e		100%	1 dia	Seg 17/10/16
150			4.2	Apresentação e aprovação do projeto no CSJT		100%	2 dias	Seg 20/03/17
151			<b>4.3</b>	Desenvolvimento do projejo		<b>34%</b>	<b>498 dias</b>	<b>Qua 22/03/17</b>
152			4.3.1	Estabelecimento de uma sistemática de desenvolvimento e		100%	10 dias	Qua 22/03/17
153			4.3.2	Definição dos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema		100%	73 dias	Qua 22/03/17
154			<b>4.3.3</b>	<b>Funcionalidade (item a ser desenvolvido à medida que o</b>		<b>31%</b>	<b>410 dias</b>	<b>Ter 01/08/17</b>
155			<b>4.3.3.1</b>	<b>Registro no BNDT - TRT3</b>		<b>56%</b>	<b>224 dias</b>	<b>Sex 25/08/17</b>
161			<b>4.3.3.2</b>	<b>Relatório de execuções - TRT03</b>		<b>24%</b>	<b>247 dias</b>	<b>Qui 19/10/17</b>
167			<b>4.3.3.3</b>	<b>Relatório de grandes demandantes - TRT03</b>		<b>35%</b>	<b>282 dias</b>	<b>Qua 29/11/17</b>
173			<b>4.3.3.4</b>	<b>Pesquisa Patrimonial Básica e Execução frustrada - TRT03</b>		<b>72%</b>	<b>334 dias</b>	<b>Seg 25/09/17</b>
179			<b>4.3.3.5</b>	<b>Aba do Executado - TRT03</b>		<b>0%</b>	<b>233 dias</b>	<b>Ter 17/04/18</b>
185			<b>4.3.3.6</b>	<b>Créditos remanescentes</b>		<b>0%</b>	<b>222 dias</b>	<b>Sex 01/06/18</b>

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
191			4.3.3.7	Registro de obrigações a pagar - TRT05		85%	163 dias	Sex 25/08/17
197			4.3.3.8	Registro de pagamentos e exibir alerta - TRT05		49%	193 dias	Seg 11/09/17
203			4.3.3.9	Envio de cálculos do Pje Calc para o PJeKZ - TRT08		83%	187 dias	Ter 01/08/17
209			4.3.3.10	Consolidar cálculos e anexar em PJC - TRT08		0%	182 dias	Sex 08/09/17
215			4.3.3.11	Automatizar custas de mandados - TRT15		0%	85 dias	Seg 06/11/17
221			4.3.3.12	Reunião de execuções - TRT15		0%	89 dias	Seg 22/01/18
227			4.3.3.13	Cadastro de bens e penhoras realizadas - TRT15		0%	99 dias	Seg 22/01/18
233			4.3.3.14	Hasta Pública - TRT15		0%	212 dias	Seg 16/04/18
239			4.3.3.15	Pesquisa Patrimonial Avançada - TRT15		0%	132 dias	Seg 16/04/18
245			4.3.3.16	Condições para arquivamento - TRT03		0%	65 dias	Seg 02/04/18
251			4.3.3.17	Concluir o desenvolvimento do Módulo de Execução do Pje		0%	0 dias	Seg 01/04/19
252			4.4	<b>Reuniões de alinhamento</b>		88%	479 dias	Seg 04/04/16
253			4.4.1	Reunião 17/10/2016 - Bahia		100%	2 dias	Seg 17/10/16
254			4.4.2	Reunião 04/11/2016 - Videoconferência		100%	1 dia	Sex 04/11/16
255			4.4.3	Reunião 06/12/2016 - Videoconferência		100%	1 dia	Ter 06/12/16
256			4.4.4	Reunião 14/12/2016 - Bhte		100%	1 dia	Seg 04/04/16
257			4.4.5	Reunião 18/01/2017 - Campinas		100%	3 dias	Qua 18/01/17
258			4.4.6	Reunião 20/03/2017 - BSB		100%	2 dias	Seg 20/03/17
259			4.4.7	Reunião 04/07/2017 - Bhte		100%	2 dias	Ter 04/07/17
260			4.4.8	Reunião 23/08/2017 - BSB		100%	2 dias	Qua 23/08/17
261			4.4.9	Reunião 02/10/2017 - Salvador		100%	3 dias	Seg 02/10/17
262			4.4.10	Reunião 22/11/2017 - BSB		100%	2 dias	Qua 22/11/17

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
263			4.4.11	Reunião 23/01/2018 - BSB		100%	2 dias	Ter 23/01/18
264			4.4.12	Reunião 24/04/2018 - BSB		0%	3 dias	Ter 24/04/18
265			<b>4.5</b>	Gestão do subprojeto		<b>87%</b>	<b>490 dias</b>	<b>Qua 22/03/17</b>
266			<b>4.5.1</b>	Planejamento		<b>100%</b>	<b>108 dias</b>	<b>Qua 22/03/17</b>
267			<b>4.5.1.1</b>	TAP (Termo de Abertura do Projeto)		<b>100%</b>	<b>52 dias</b>	<b>Qua 22/03/17</b>
268			4.5.1.1.1	Elaboração do TAP (modelo CSJT)		100%	38 dias	Qua 22/03/17
269			4.5.1.1.2	Assinatura do TAP		100%	13 dias	Seg 22/05/17
270			4.5.1.1.3	Aprovação do TAP no CSJT		100%	1 dia	Qui 08/06/17
271			4.5.1.2	Registro do projeto PJEJT-47476 no JIRA		100%	2 dias	Qua 22/03/17
272			<b>4.5.1.3</b>	PGP (Plano de Gerenciamento do Projeto)		<b>100%</b>	<b>38 dias</b>	<b>Qui 06/07/17</b>
273			<b>4.5.1.3.1</b>	<b>Elaboração do PGP (modelo CSJT)</b>		<b>100%</b>	<b>36 dias</b>	<b>Qui 06/07/17</b>
276			<b>4.5.1.3.2</b>	<b>Assinatura do PGP</b>		<b>100%</b>	<b>27 dias</b>	<b>Qui 20/07/17</b>
279			4.5.1.3.3	Aprovação do PGP no CSJT		100%	1 dia	Qua 30/08/17
280			<b>4.5.2</b>	<b>Acompanhamento</b>		<b>100%</b>	<b>51 dias</b>	<b>Ter 04/07/17</b>
281			<b>4.5.2.1</b>	<b>Relatórios de acompanhamento</b>		<b>100%</b>	<b>51 dias</b>	<b>Ter 04/07/17</b>
282			4.5.2.1.1	Relatório de julho		100%	1 dia	Ter 04/07/17
283			4.5.2.1.2	Relatório de setembro		100%	1 dia	Sex 15/09/17
284			<b>4.5.3</b>	<b>Encerramento</b>		<b>0%</b>	<b>11 dias</b>	<b>Seg 01/04/19</b>
285			4.5.3.1	Elaborar Termos de Encerramento do Projeto		0%	10 dias	Seg 01/04/19
286			4.5.3.2	Assinar e encaminhar o termo ao CSJT		0%	1 dia	Seg 15/04/19
287			<b>5</b>	<b>Revisão na estrutura da Central de Pesquisa Patrimonial e</b>		<b>89%</b>	<b>269 dias</b>	<b>Seg 27/03/17</b>
288			5.1	Proposição de nova estrutura para a Administração e Comissão de		100%	1 dia	Seg 27/03/17

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
289			5.2	Aprovação da estrutura		96%	239 dias	Seg 10/04/17
290			5.3	Implantação da estrutura		0%	20 dias	Qui 26/04/18
291			<b>6</b>	<b>Gestão do Projeto</b>		<b>84%</b>	<b>726 dias</b>	<b>Seg 04/04/16</b>
292			<b>6.1</b>	Planejamento		<b>100%</b>	<b>362 dias</b>	<b>Seg 04/04/16</b>
293			<b>6.1.1</b>	<b>SPE</b>		<b>100%</b>	<b>96 dias</b>	<b>Seg 04/04/16</b>
294			6.1.1.1	Elaboração do SPE		100%	20 dias	Seg 04/04/16
295			6.1.1.2	Aprovação do SPE		100%	76 dias	Ter 03/05/16
296			<b>6.1.2</b>	TAP		<b>100%</b>	<b>185 dias</b>	<b>Seg 09/01/17</b>
297			6.1.2.1	Elaboração do TAP		100%	164 dias	Seg 09/01/17
298			6.1.2.2	Aprovação do TAP		100%	21 dias	Ter 12/09/17
299			<b>6.1.3</b>	PPE		<b>100%</b>	<b>101 dias</b>	<b>Seg 08/05/17</b>
300			<b>6.1.3.1</b>	<b>Elaboração do PPE</b>		<b>100%</b>	<b>101 dias</b>	<b>Seg 08/05/17</b>
301			6.1.3.1.1	Elaborar a minuta do PPE		100%	92 dias	Seg 08/05/17
302			6.1.3.1.2	Submeter para apreciação do EPRO		100%	7 dias	Ter 19/09/17
303			6.1.3.1.3	Submeter para apreciação da Denise		100%	7 dias	Ter 19/09/17
304			6.1.3.1.4	Realizar ajustes		100%	2 dias	Qui 28/09/17
305			<b>6.2</b>	<b>Acompanhamento</b>		<b>100%</b>	<b>306 dias</b>	<b>Seg 04/04/16</b>
306			<b>6.2.1</b>	<b>Reuniões de acompanhamento com EP</b>		<b>100%</b>	<b>306 dias</b>	<b>Seg 04/04/16</b>
313			<b>6.3</b>	<b>Monitoramento</b>		<b>78%</b>	<b>402 dias</b>	<b>Sex 18/11/16</b>
314			6.3.1	Definição de indicadores		100%	2 dias	Sex 18/11/16
315			6.3.2	Medição dos indicadores		78%	400 dias	Ter 22/11/16
316			6.3.3	Análise dos dados		78%	400 dias	Ter 22/11/16

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
317			<b>6.4</b>	<b>Encerramento</b>		<b>0%</b>	<b>21 dias</b>	<b>Seg 01/04/19</b>
318			6.4.1	Elaborar Termo de Encerramento do Projeto		0%	10 dias	Seg 01/04/19
319			6.4.2	Assinar TEP		0%	10 dias	Seg 15/04/19
320			6.4.3	Encaminhar TEP para EPRO		0%	1 dia	Sex 03/05/19

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	03 Abr '16																																		
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	10 Abr '16						17 Abr '16						24 Abr '16						01 Mai '16						08 Mai '16		
<b>Sex 03/05/19</b>			[Gantt chart area]																																		
<b>Sex 29/09/17</b>			[Gantt chart area]																																		
<b>Ter 04/09/18</b>			[Gantt chart area]																																		
<b>Qui 19/01/17</b>			[Gantt chart area]																																		
<b>Qui 26/04/18</b>	9		[Gantt chart area]																																		
<b>Ter 04/09/18</b>			[Gantt chart area]																																		
<b>Ter 04/09/18</b>			[Gantt chart area]																																		
<b>Seg 23/07/18</b>			[Gantt chart area]																																		
<b>Seg 23/07/18</b>			[Gantt chart area]																																		
Sex 01/07/16			[Gantt chart area]																																		
Sex 08/09/17			[Gantt chart area]																																		
Seg 11/06/18	58		[Gantt chart area]																																		
Seg 23/07/18	20		[Gantt chart area]																																		
Sex 29/07/16	18		[Gantt chart area]																																		
<b>Seg 04/09/17</b>			[Gantt chart area]																																		
Qui 11/08/16			[Gantt chart area]																																		
Sex 26/08/16			[Gantt chart area]																																		
Sex 16/09/16			[Gantt chart area]																																		
Sex 30/09/16			[Gantt chart area]																																		
Qui 09/03/17			[Gantt chart area]																																		
Sex 31/03/17			[Gantt chart area]																																		
Sex 26/05/17			[Gantt chart area]																																		

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	03 Abr '16		10 Abr '16		17 Abr '16		24 Abr '16		01 Mai '16		08 Mai '16							
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
Seg 04/09/17																				
<b>Ter 04/09/18</b>																				
<b>Seg 11/06/18</b>																				
Sex 08/09/17																				
Sex 15/09/17																				
Sex 29/09/17	35																			
Sex 23/02/18	35																			
Seg 26/02/18	37																			
Seg 11/06/18	58																			
<b>Ter 04/09/18</b>																				
Ter 21/03/17																				
Ter 02/05/17																				
Ter 04/09/18	39																			
<b>Seg 30/07/18</b>																				
Ter 20/02/18																				
Seg 11/06/18	58																			
Seg 18/06/18	46																			
Seg 30/07/18	47																			
<b>Sex 31/08/18</b>																				
<b>Ter 08/05/18</b>																				
Ter 18/10/16																				
<b>Ter 08/05/18</b>																				

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			






Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	03 Abr '16		10 Abr '16		17 Abr '16		24 Abr '16		01 Mai '16		08 Mai '16								
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
Qua 24/01/18																					
Qui 26/04/18																					
<b>Seg 15/04/19</b>																					
<b>Qua 30/08/17</b>																					
<b>Qui 08/06/17</b>																					
Sex 19/05/17	258																				
Qua 07/06/17	268																				
Qui 08/06/17	269																				
Qui 23/03/17	258																				
<b>Qua 30/08/17</b>																					
<b>Seg 28/08/17</b>																					
<b>Ter 29/08/17</b>																					
Qua 30/08/17	278																				
<b>Sex 15/09/17</b>																					
<b>Sex 15/09/17</b>																					
Ter 04/07/17	259II																				
Sex 15/09/17																					
<b>Seg 15/04/19</b>	<b>251</b>																				
Sex 12/04/19	251																				
Seg 15/04/19	285																				
<b>Qui 24/05/18</b>																					
Seg 27/03/17																					

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			









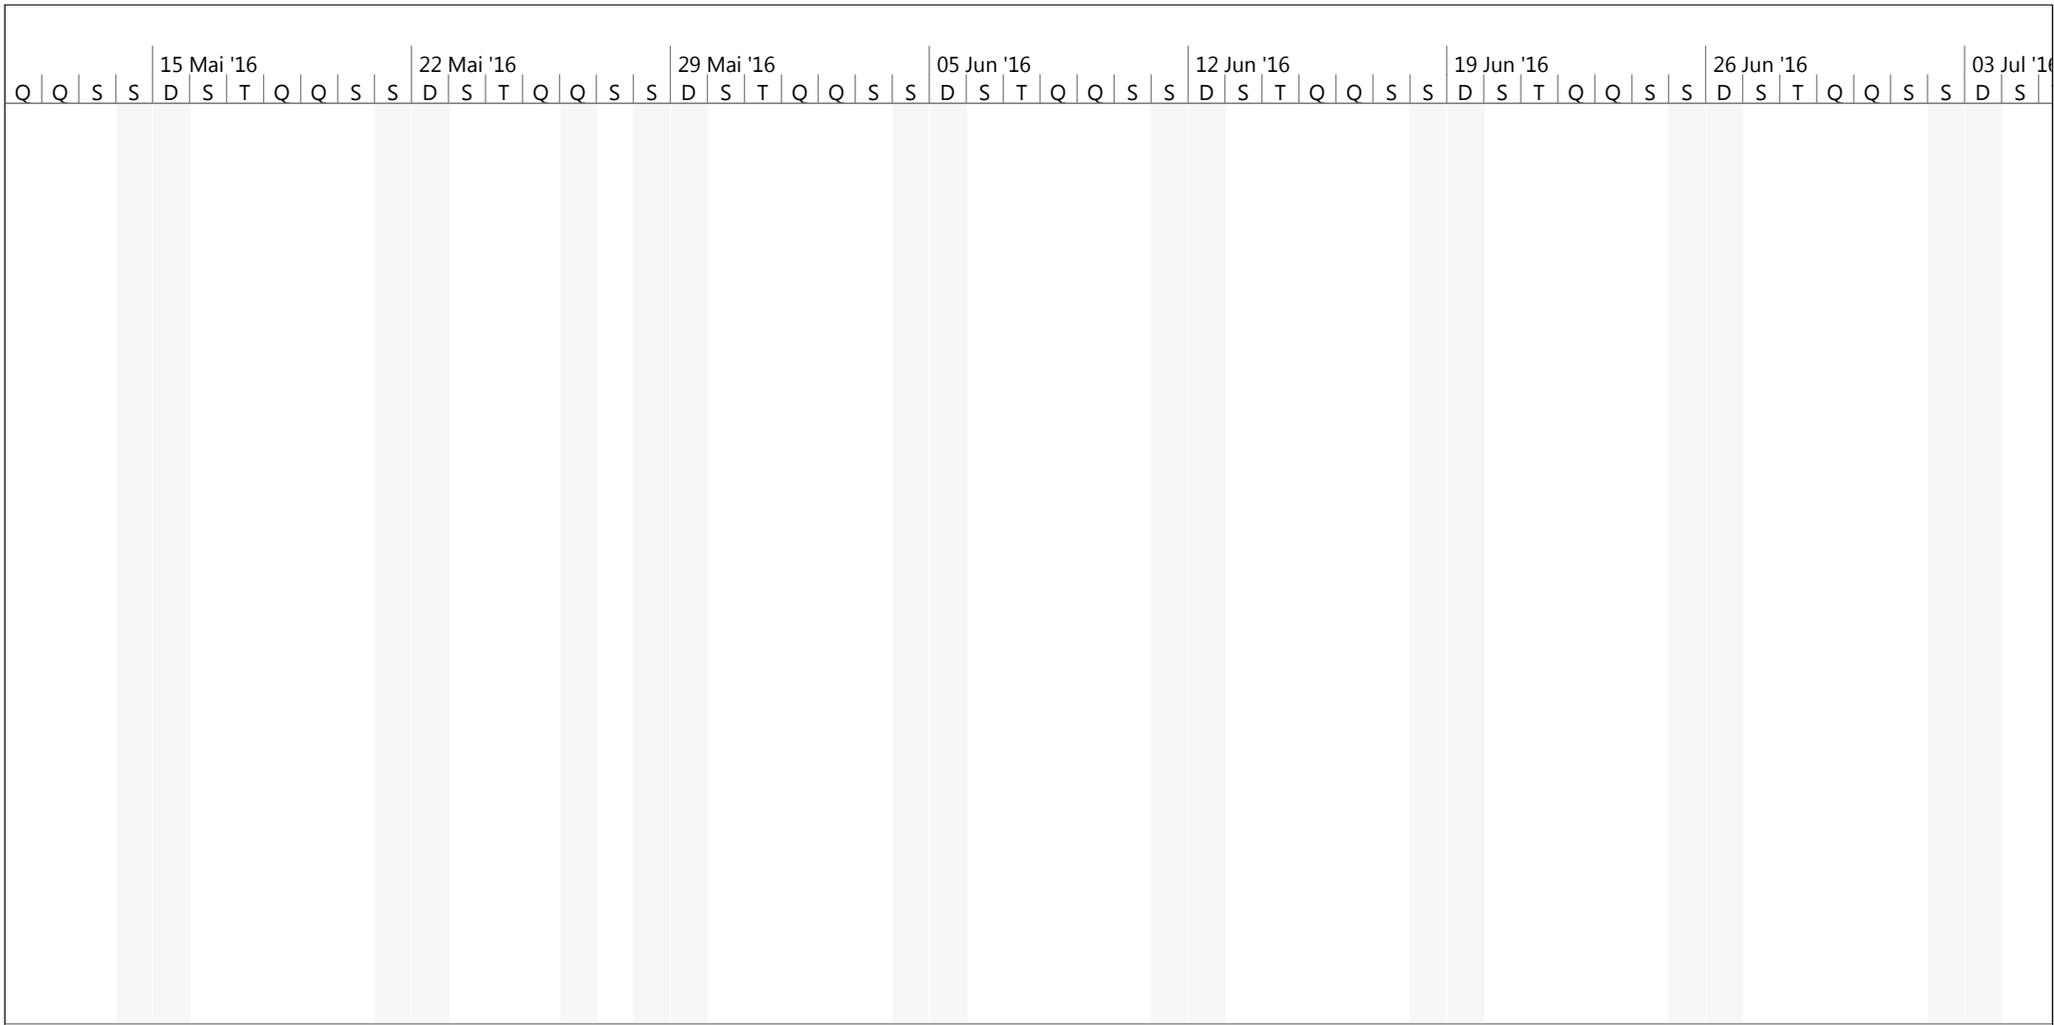

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

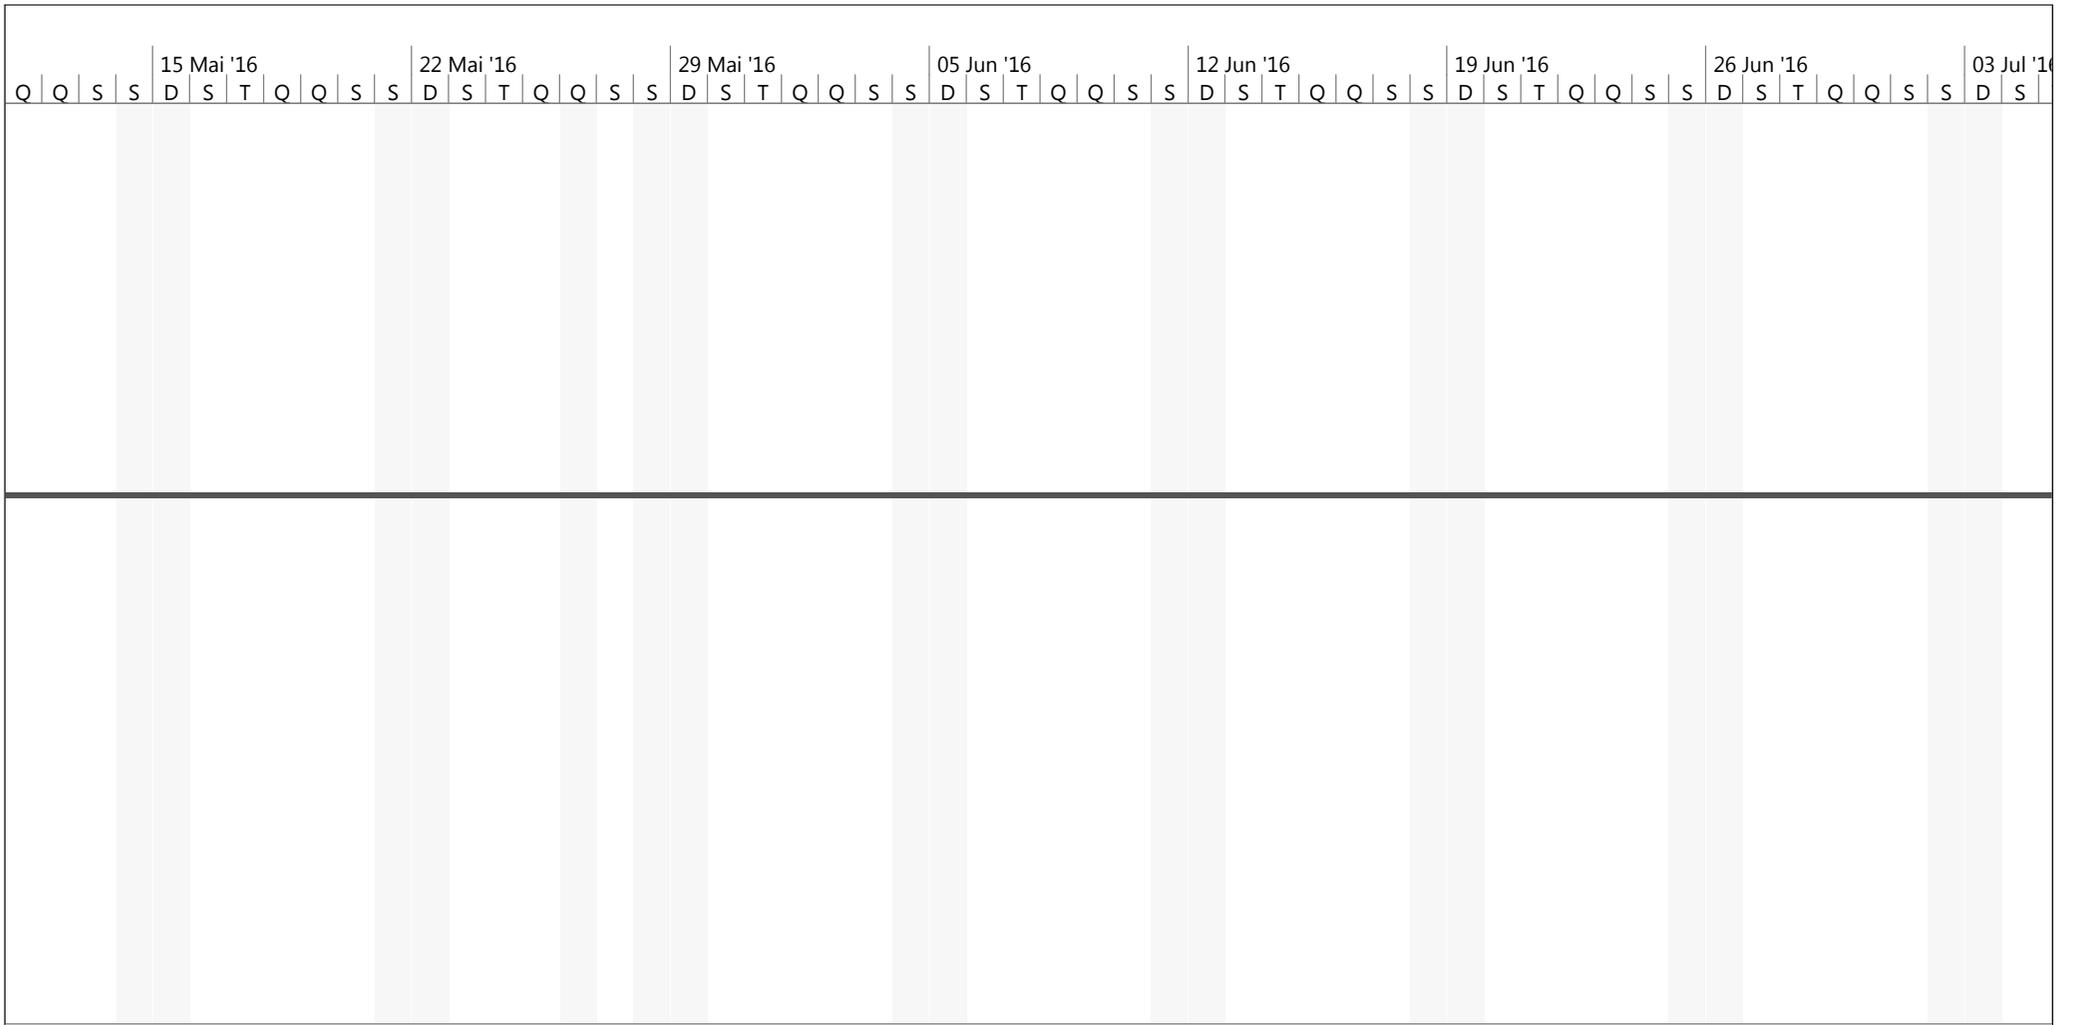


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

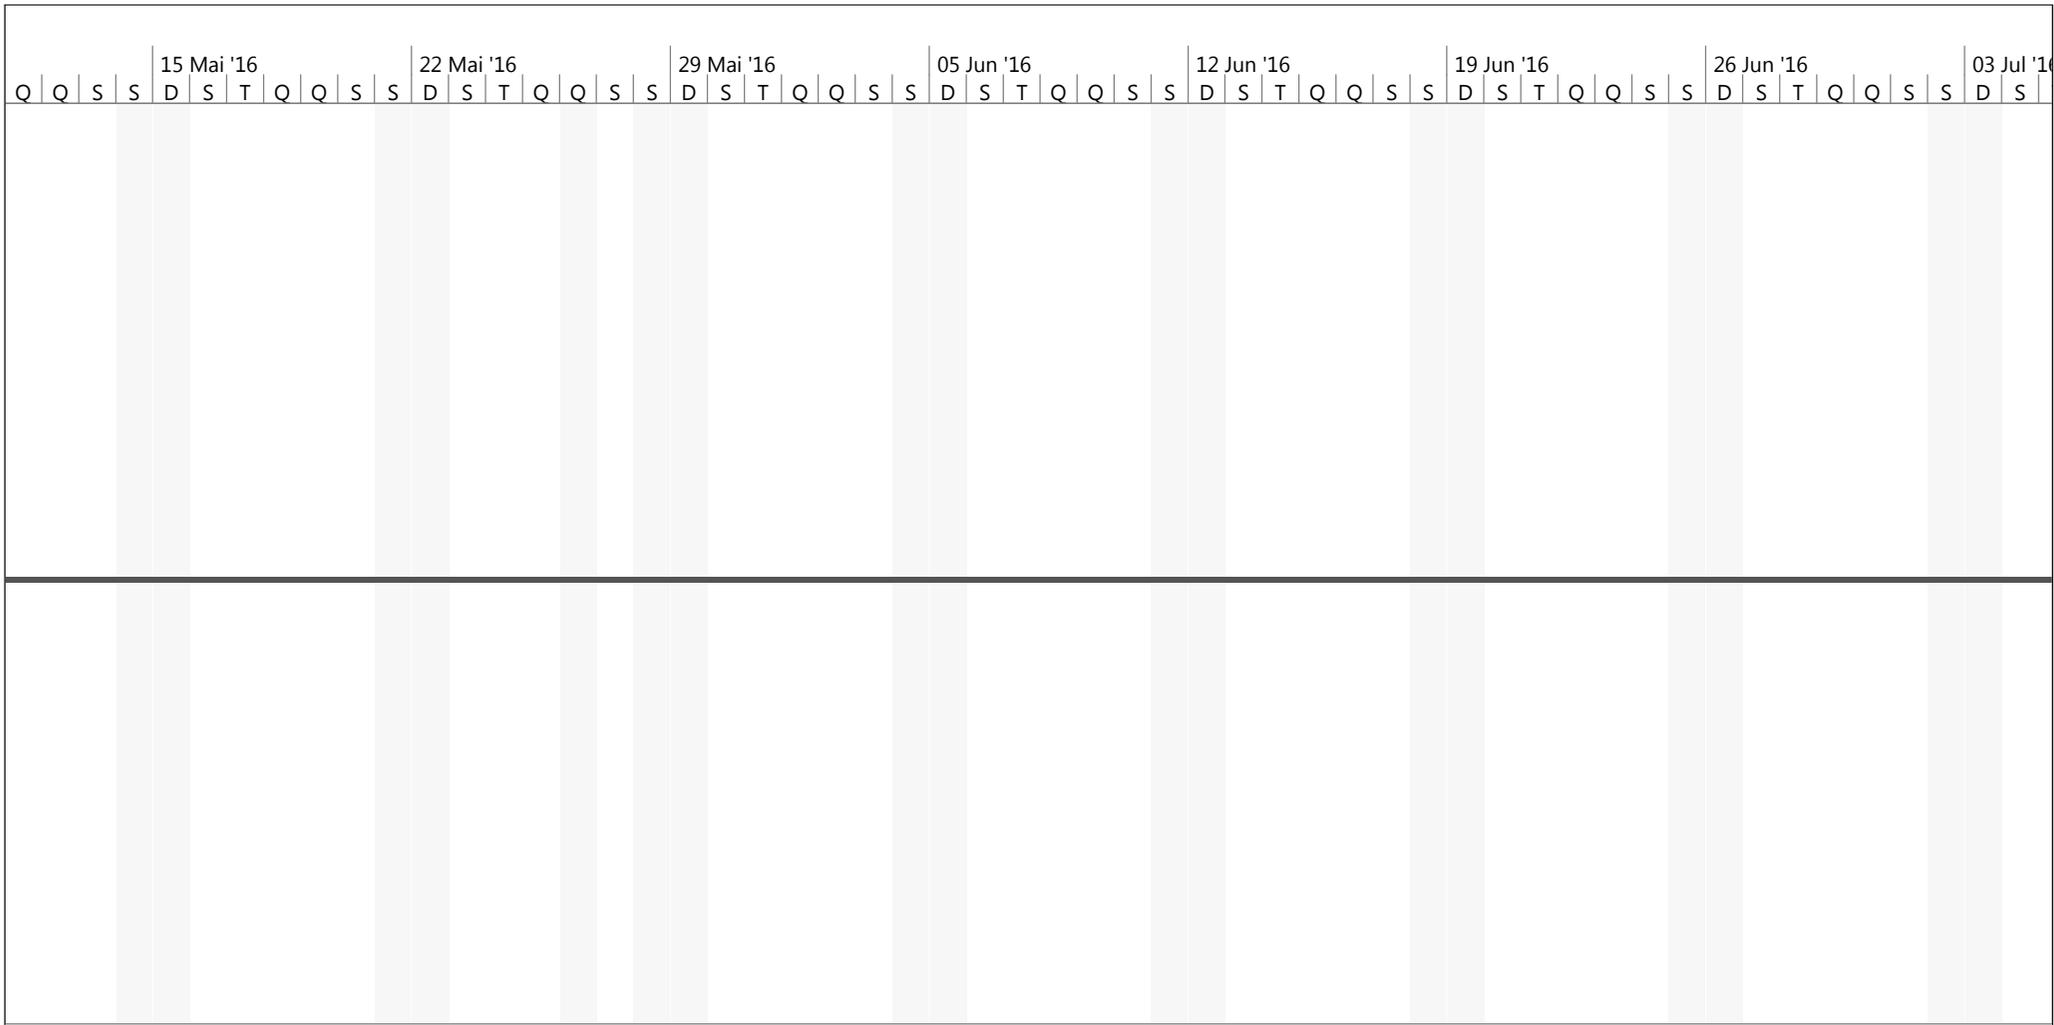


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




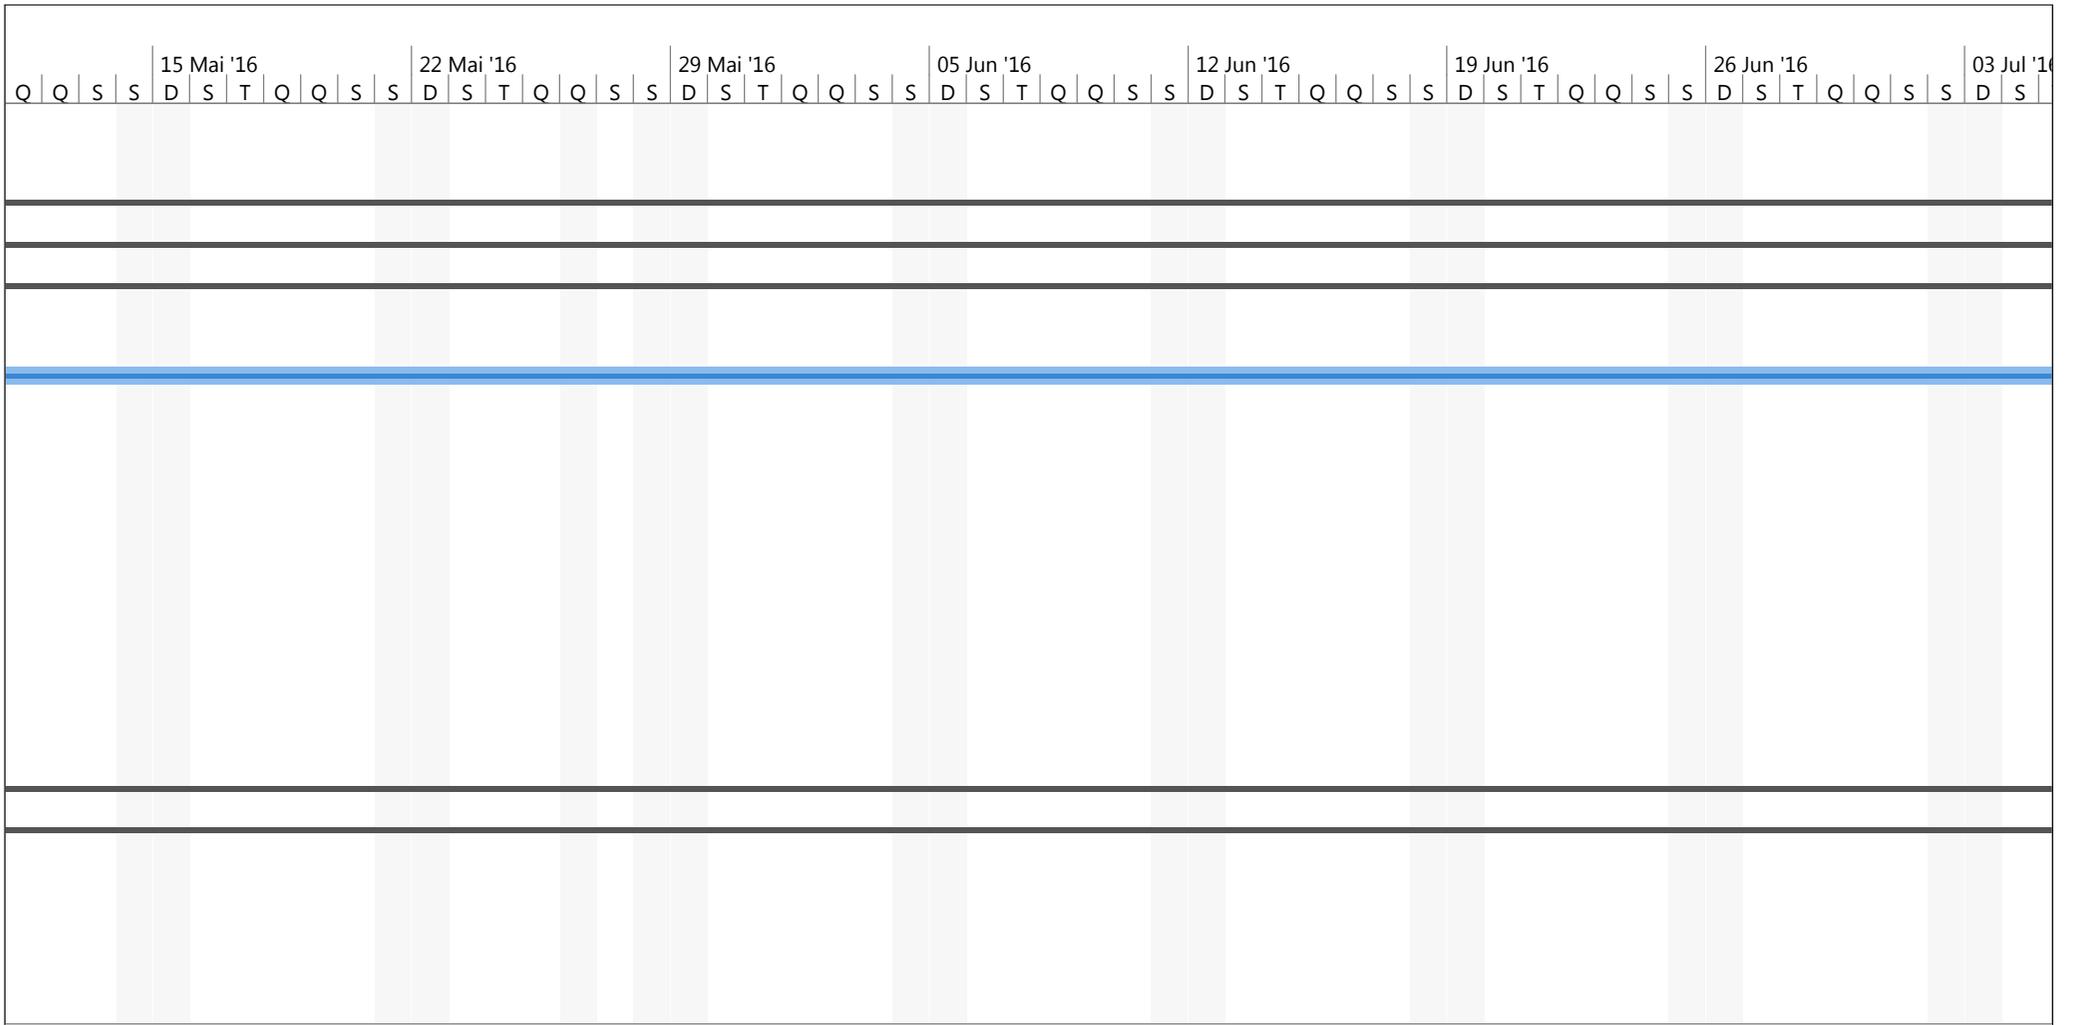


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

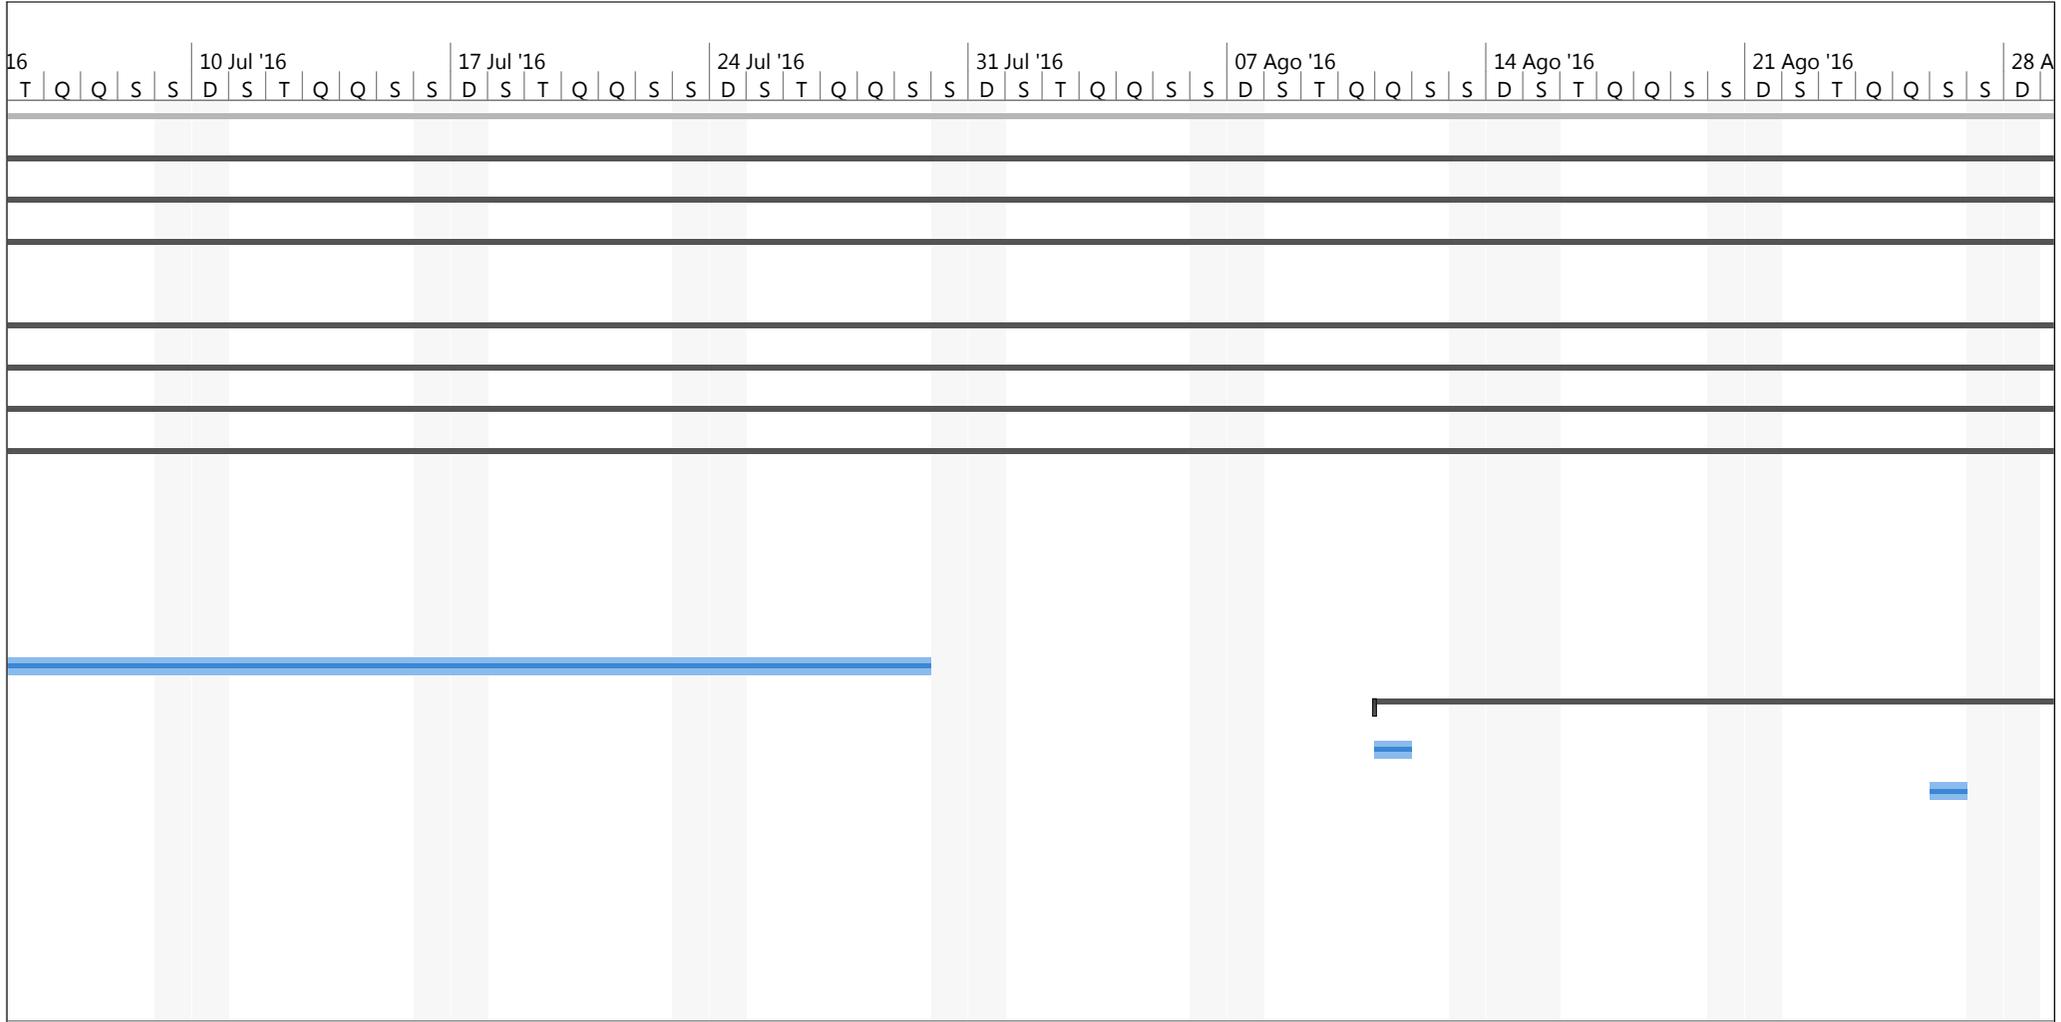


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

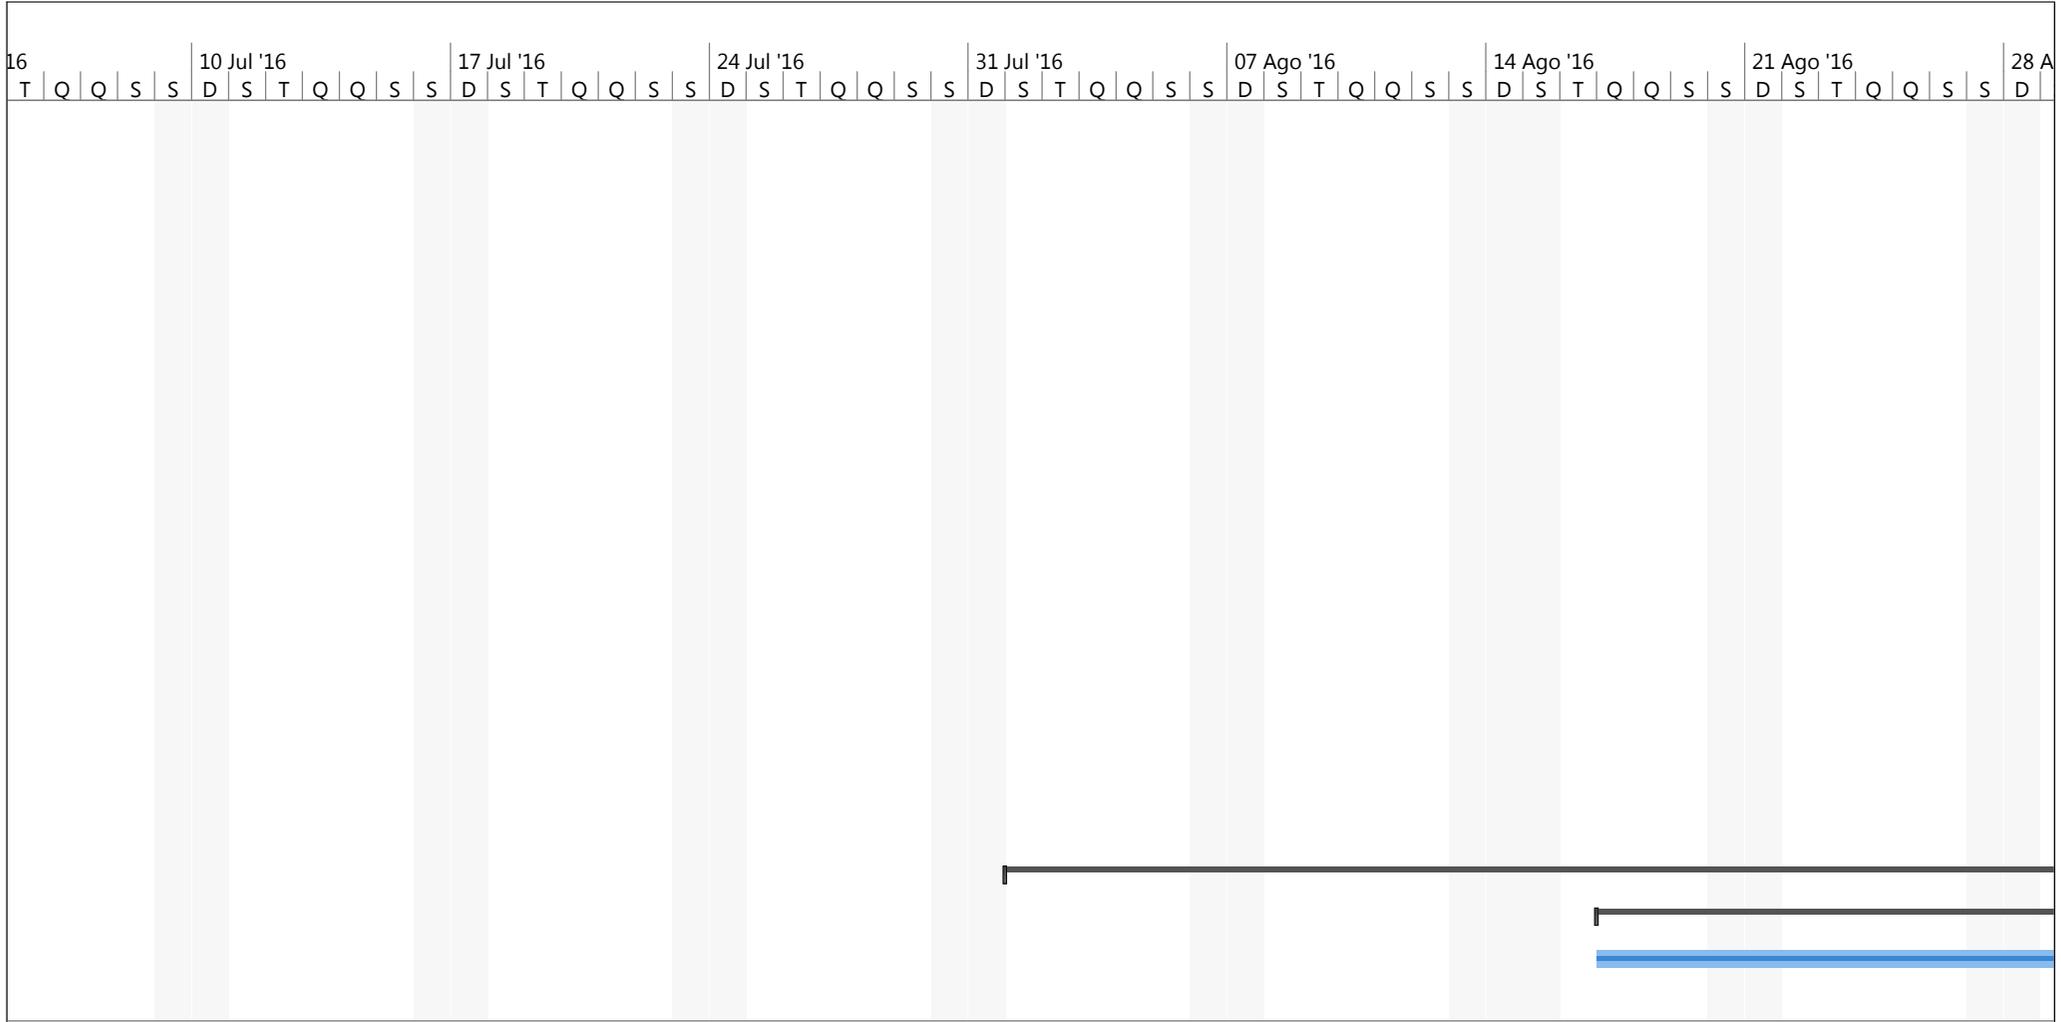

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

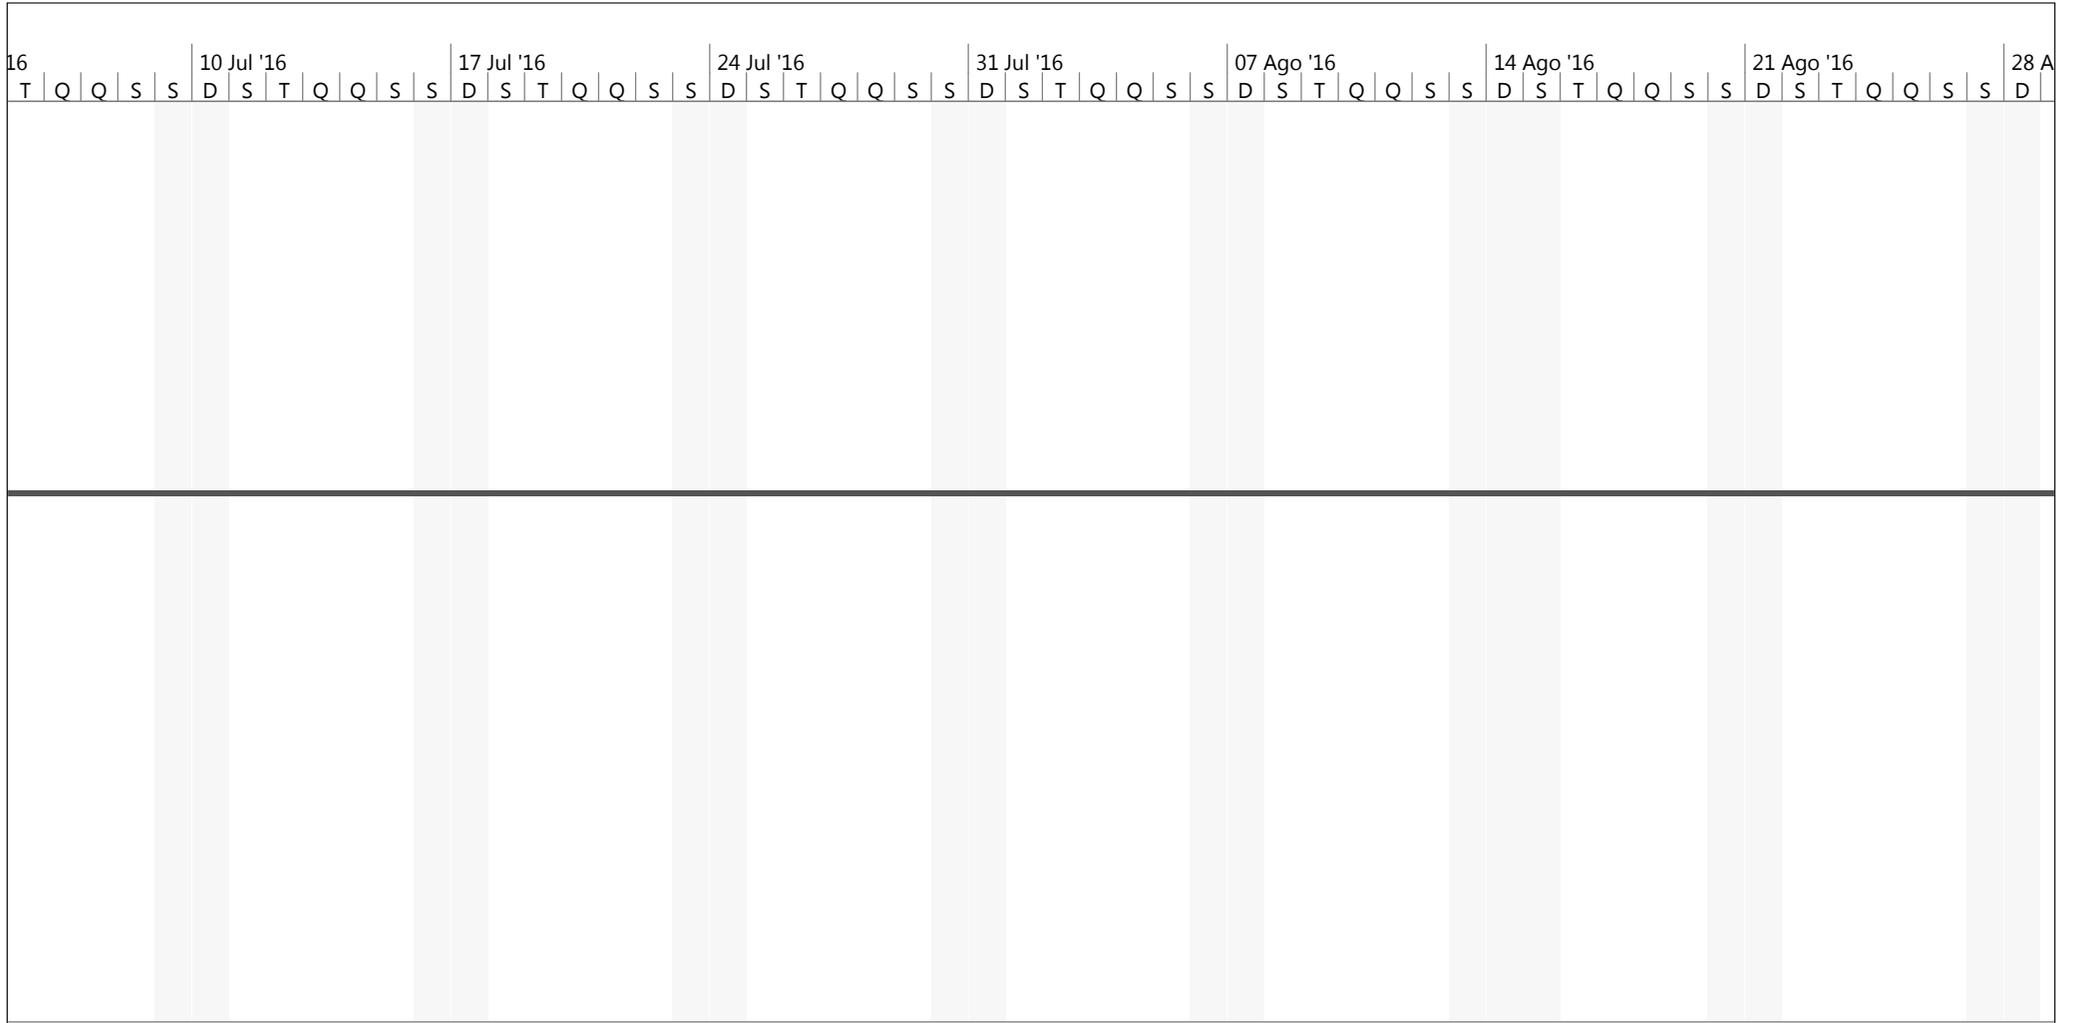


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

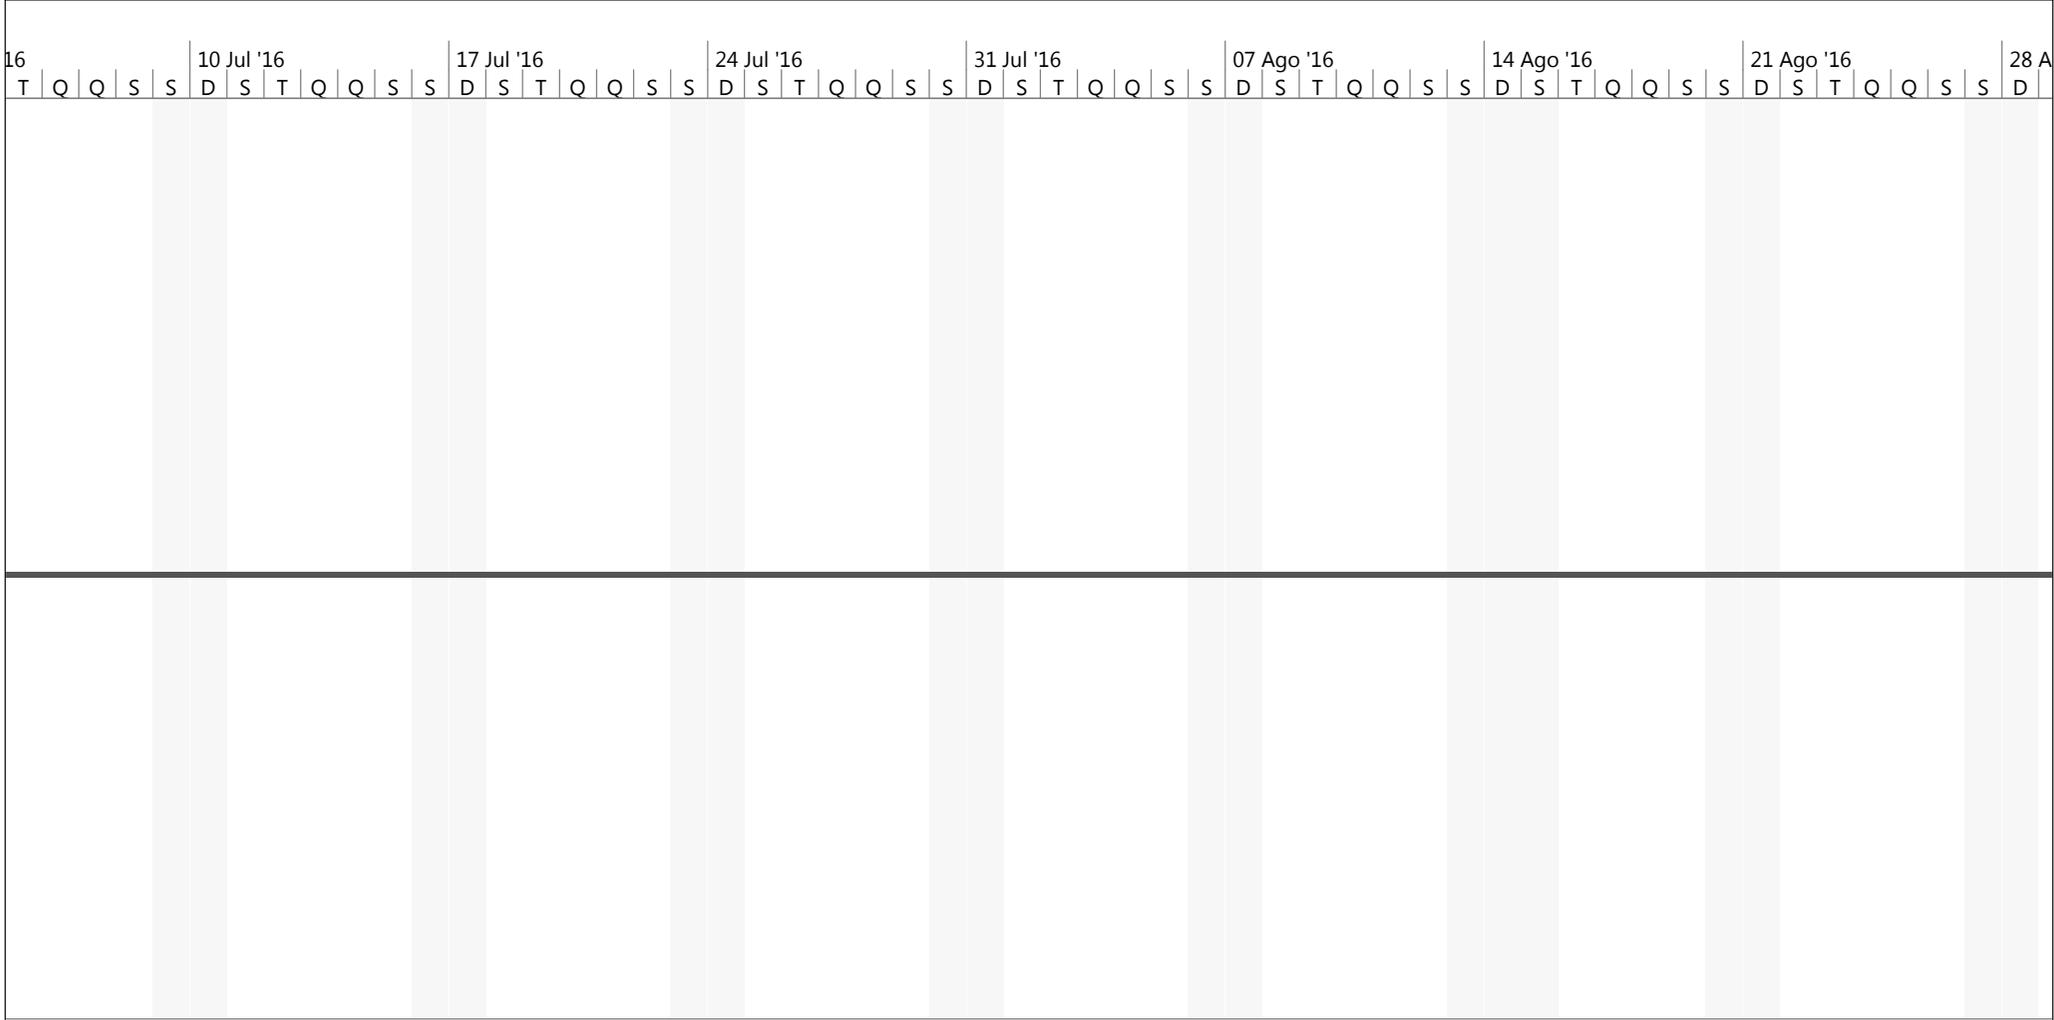


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



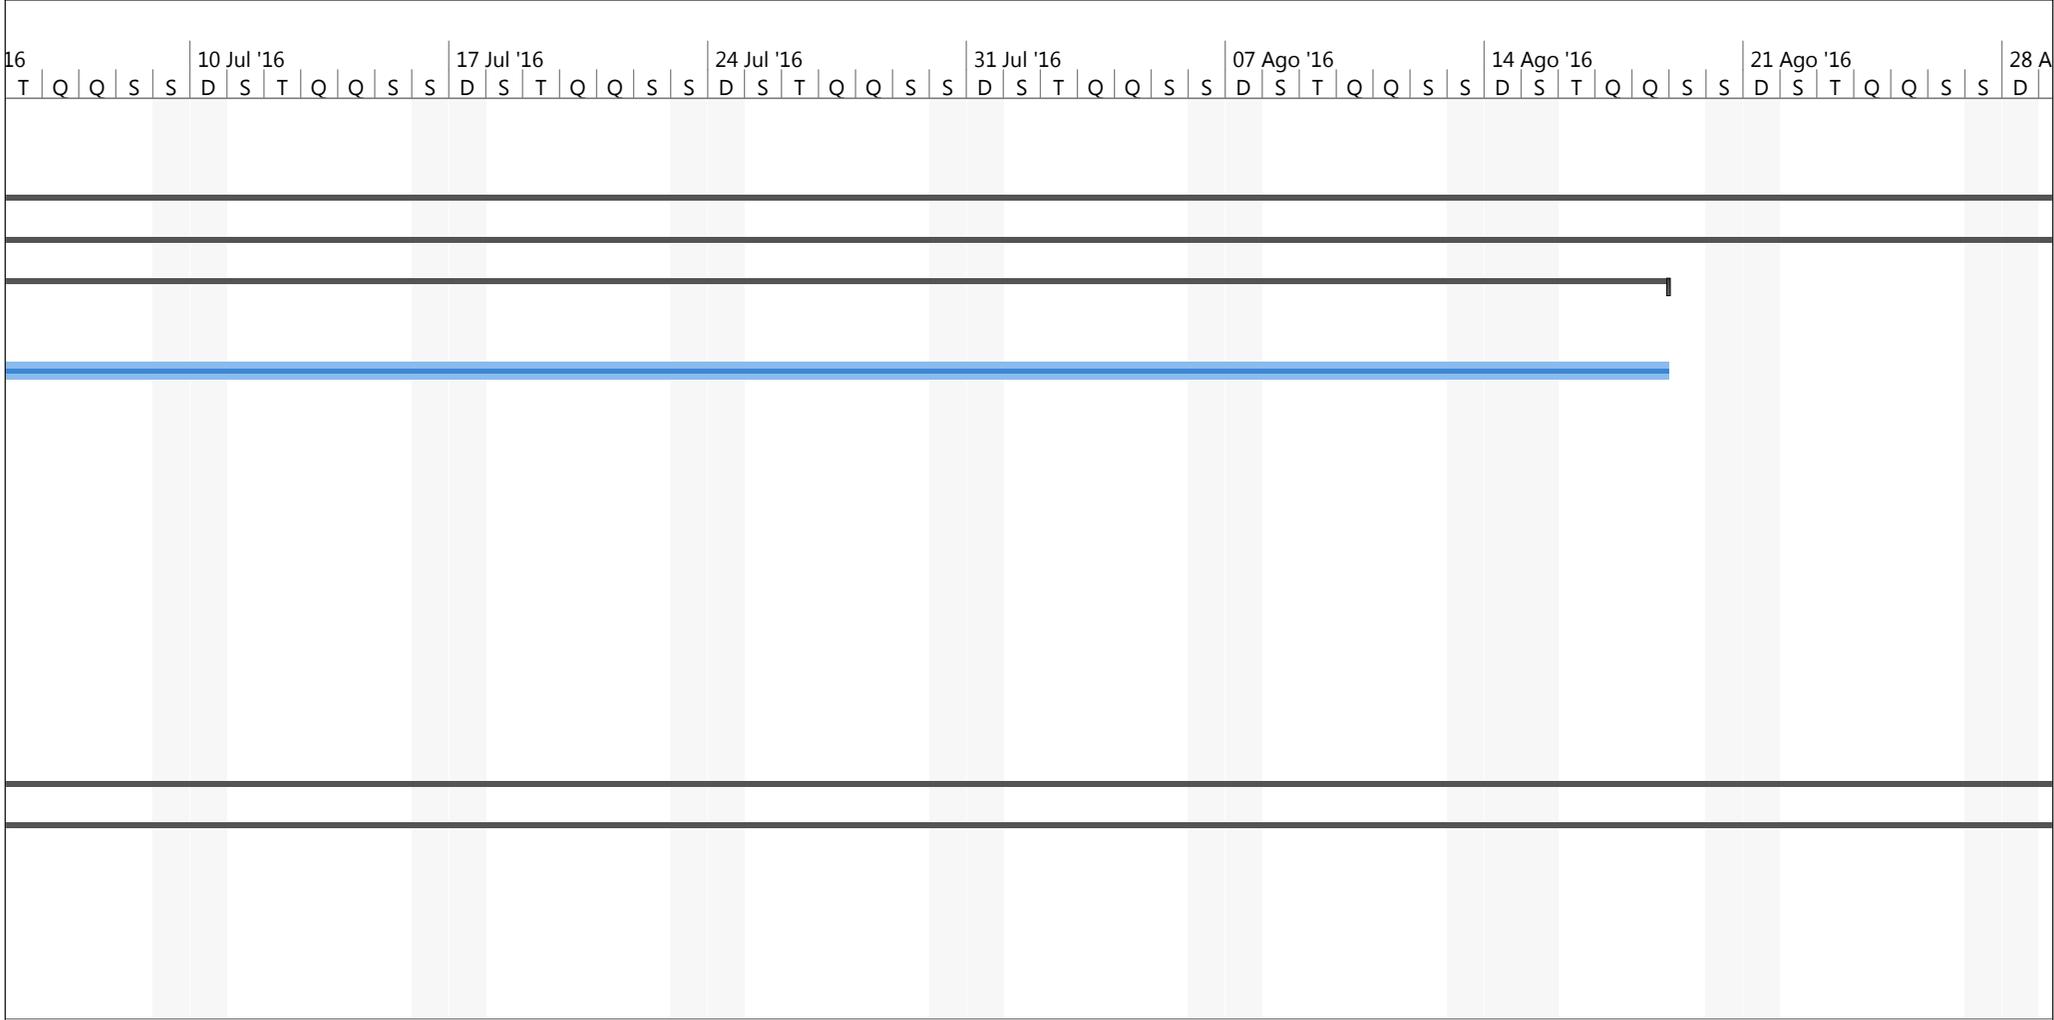


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

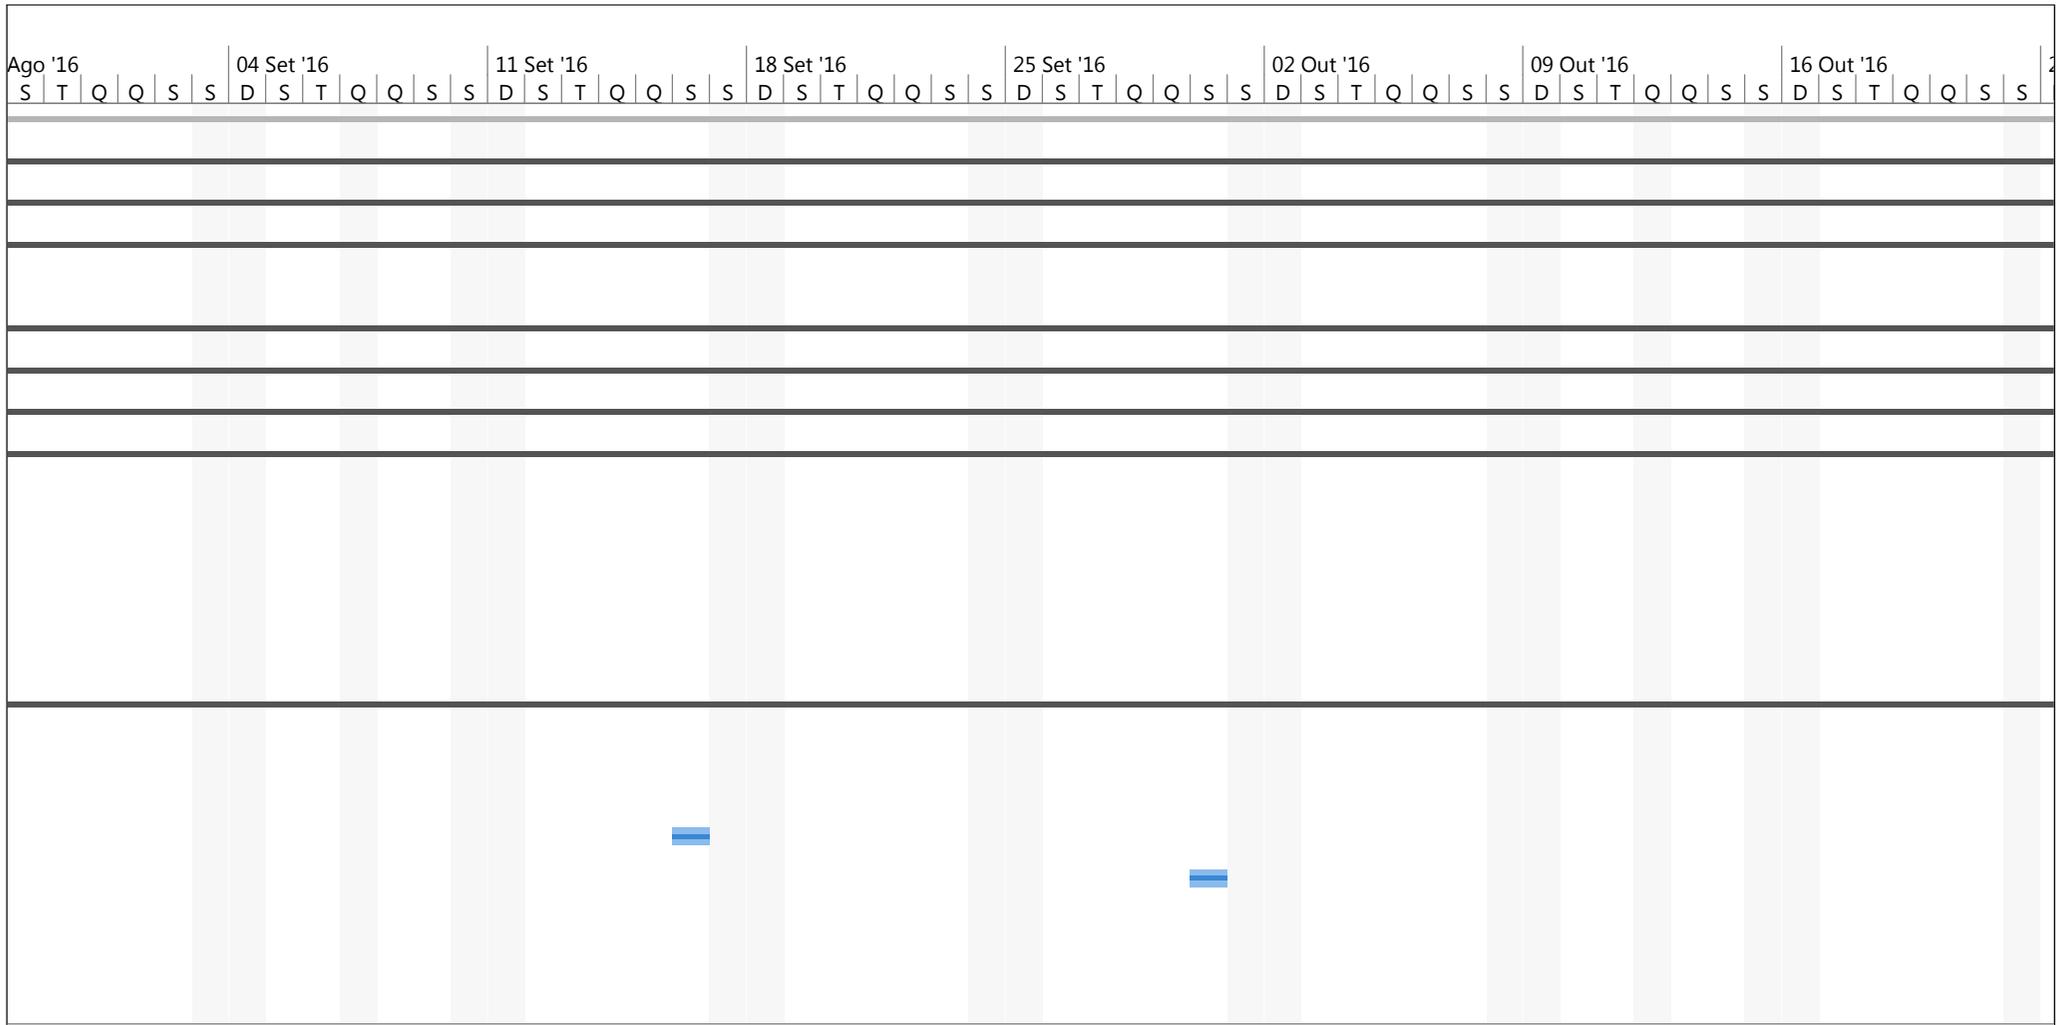


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

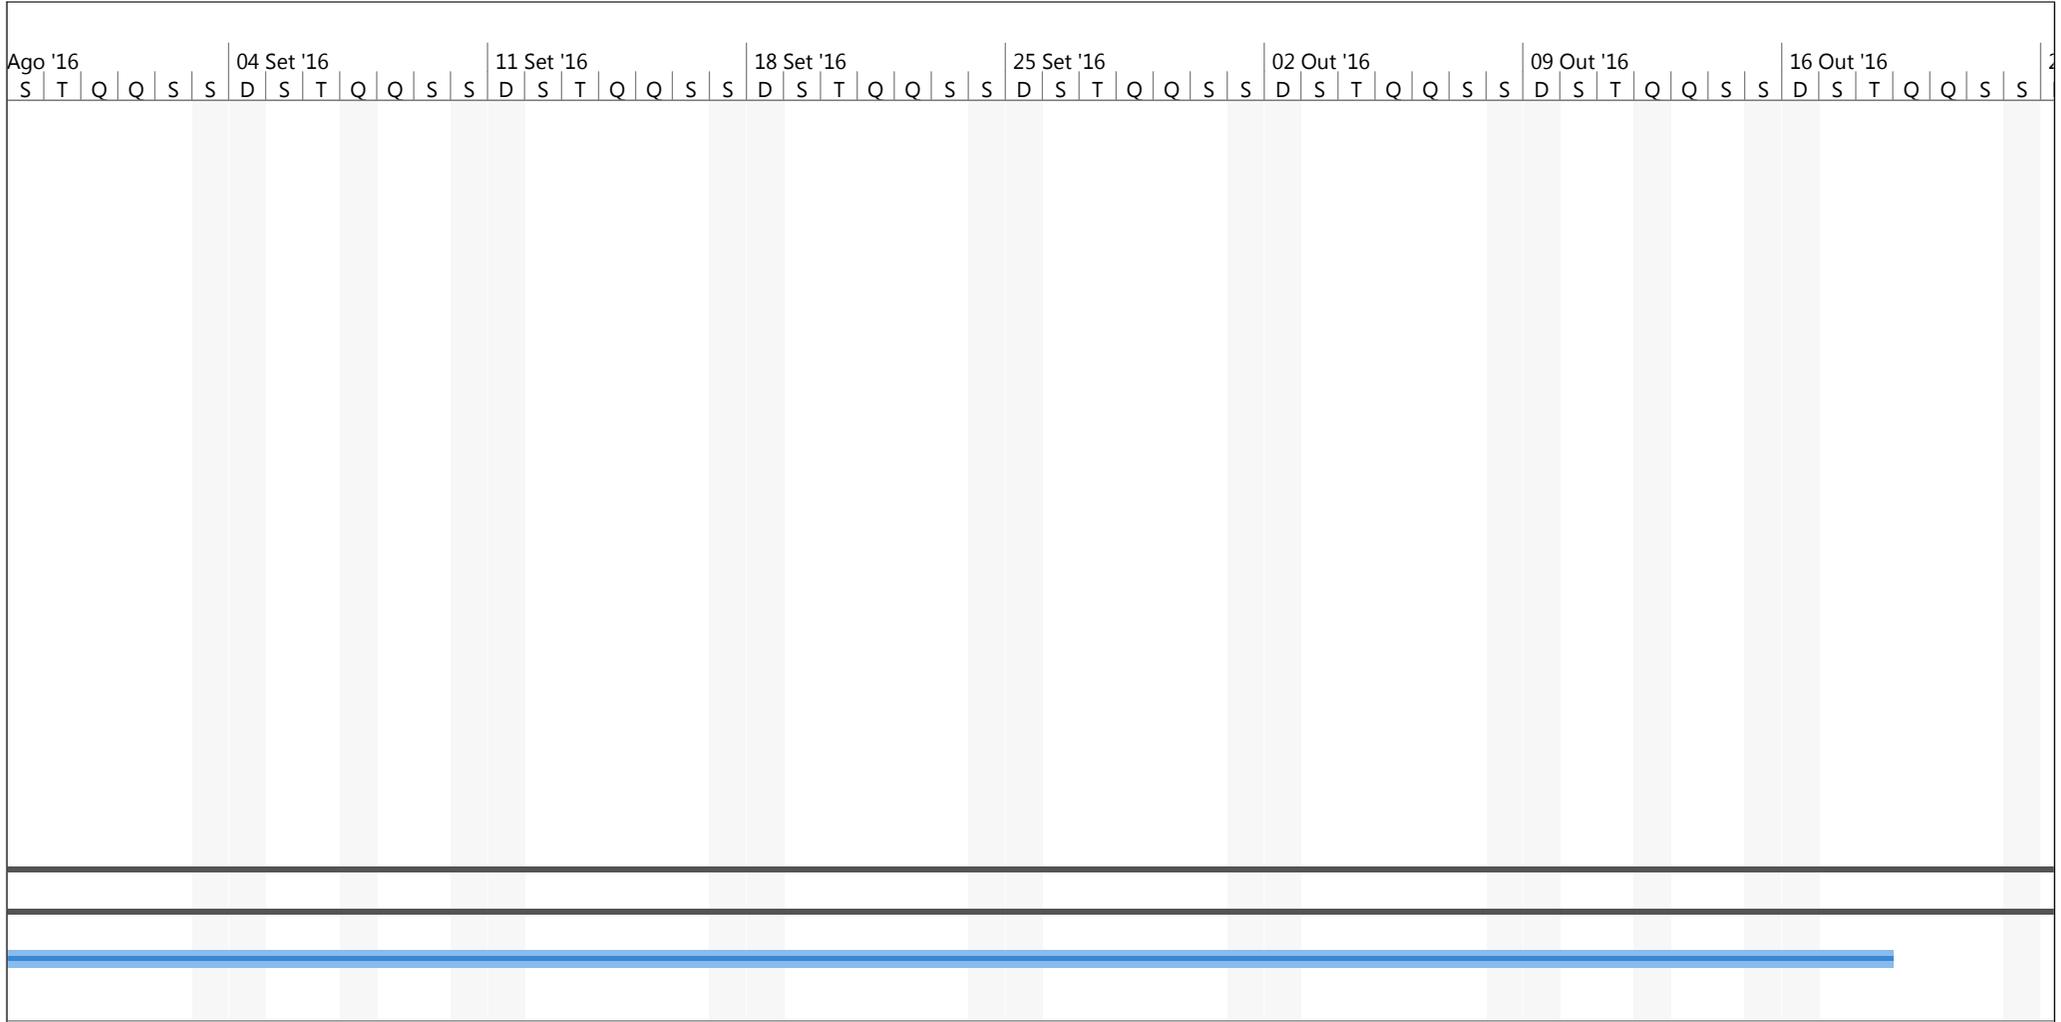


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

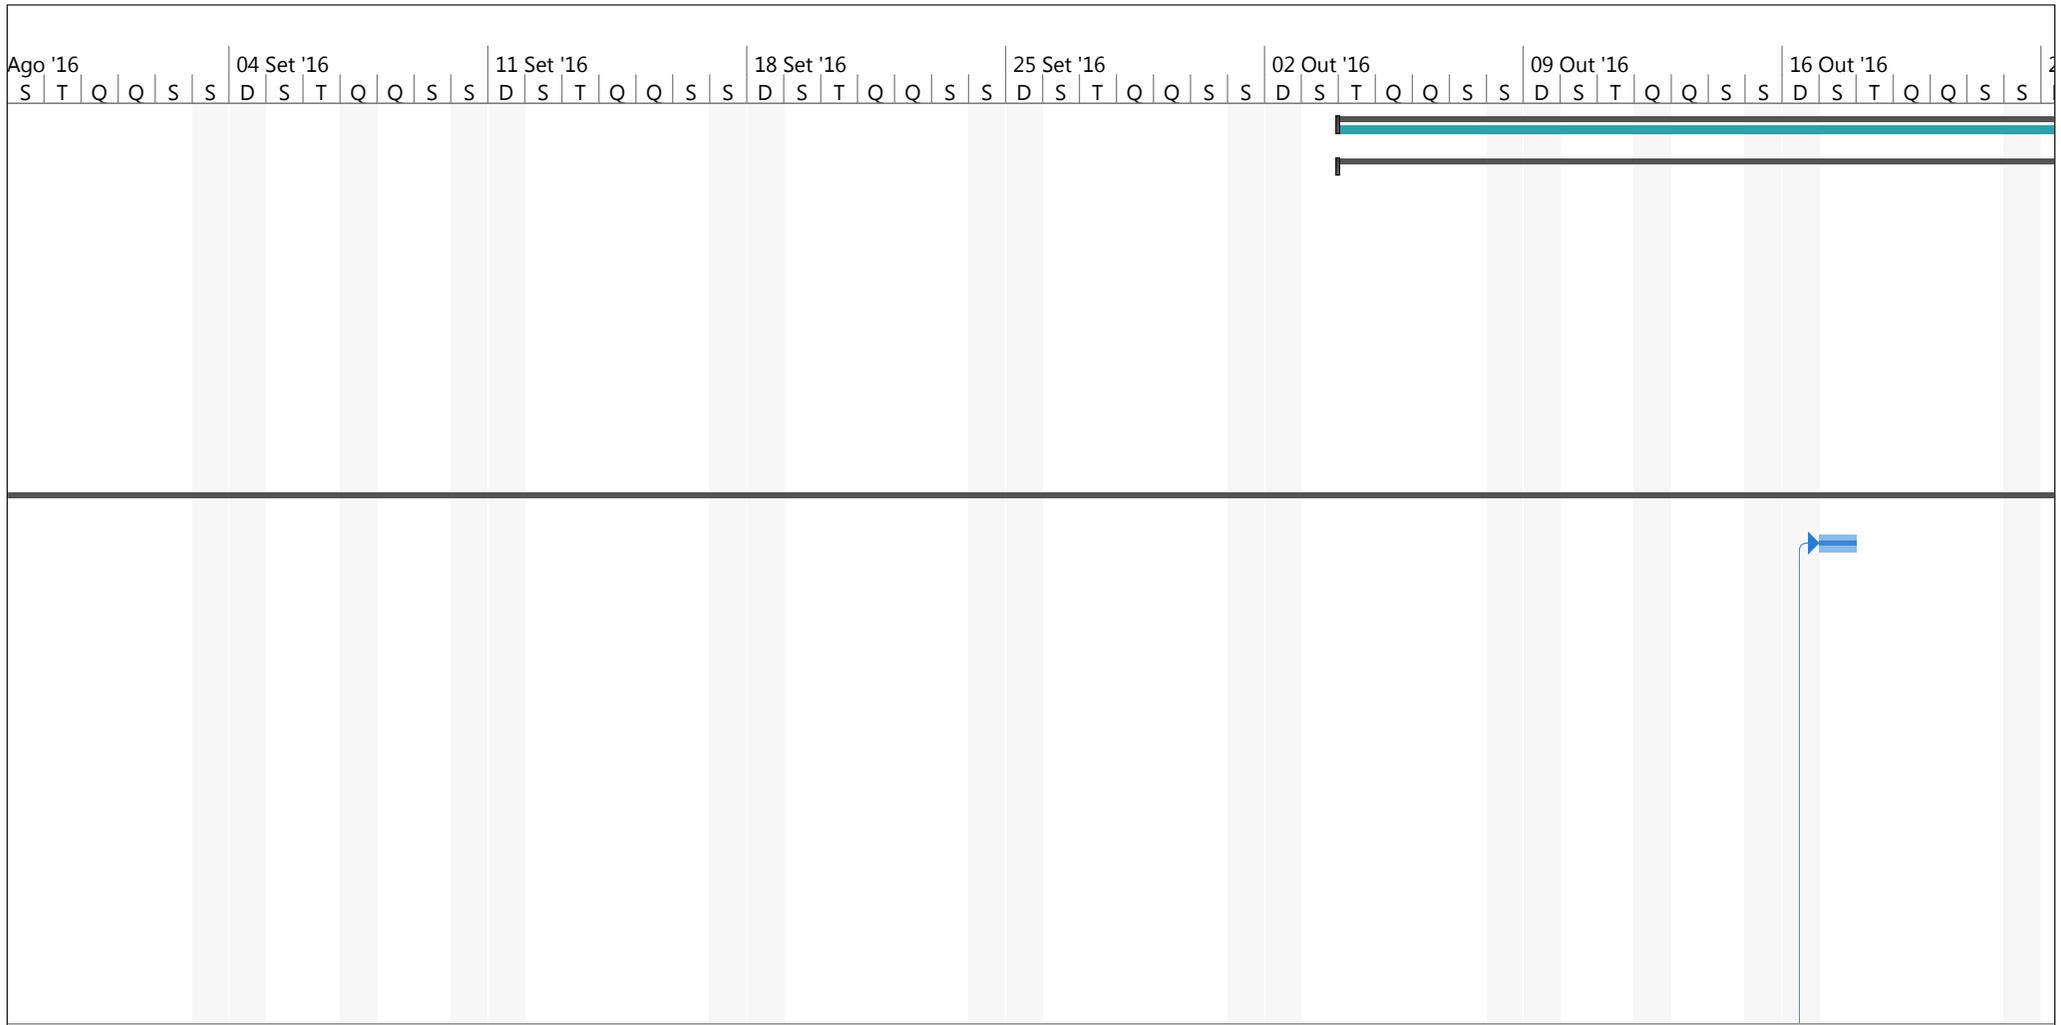

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

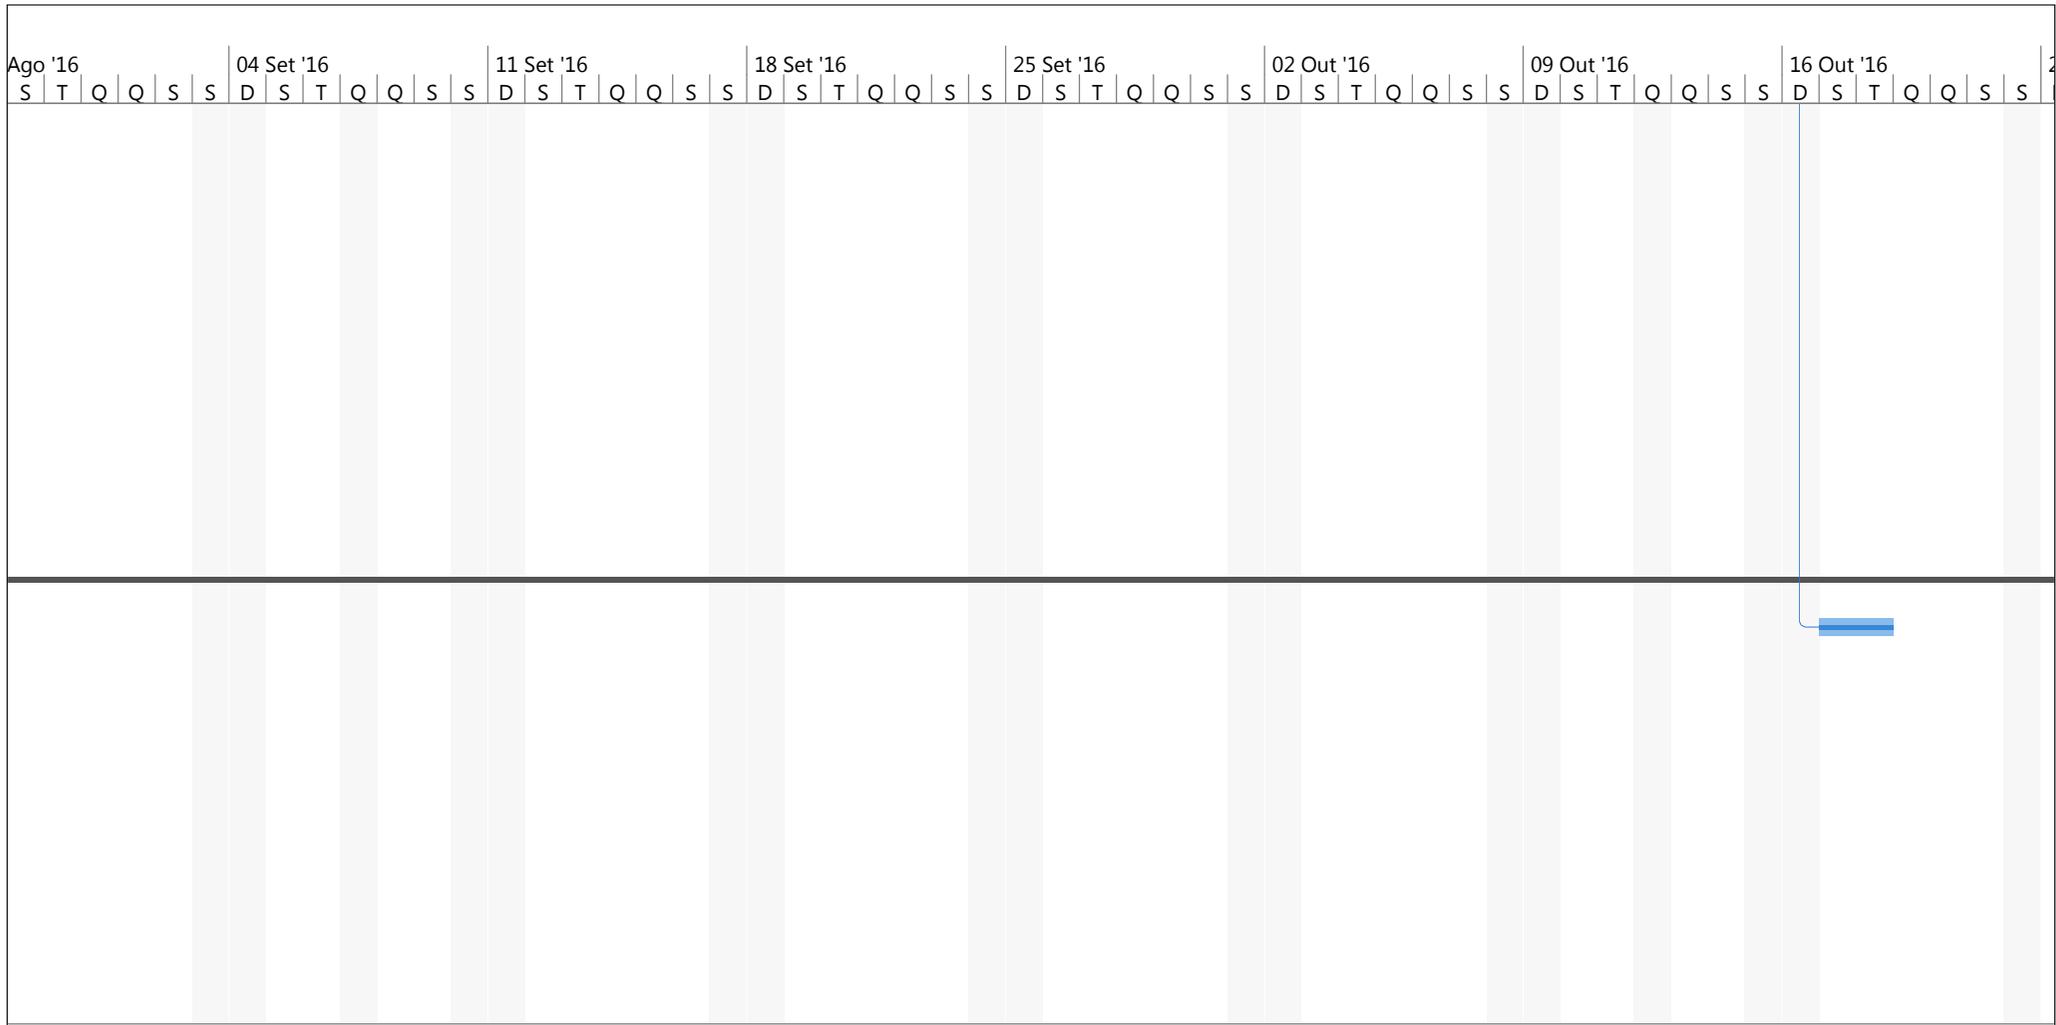

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

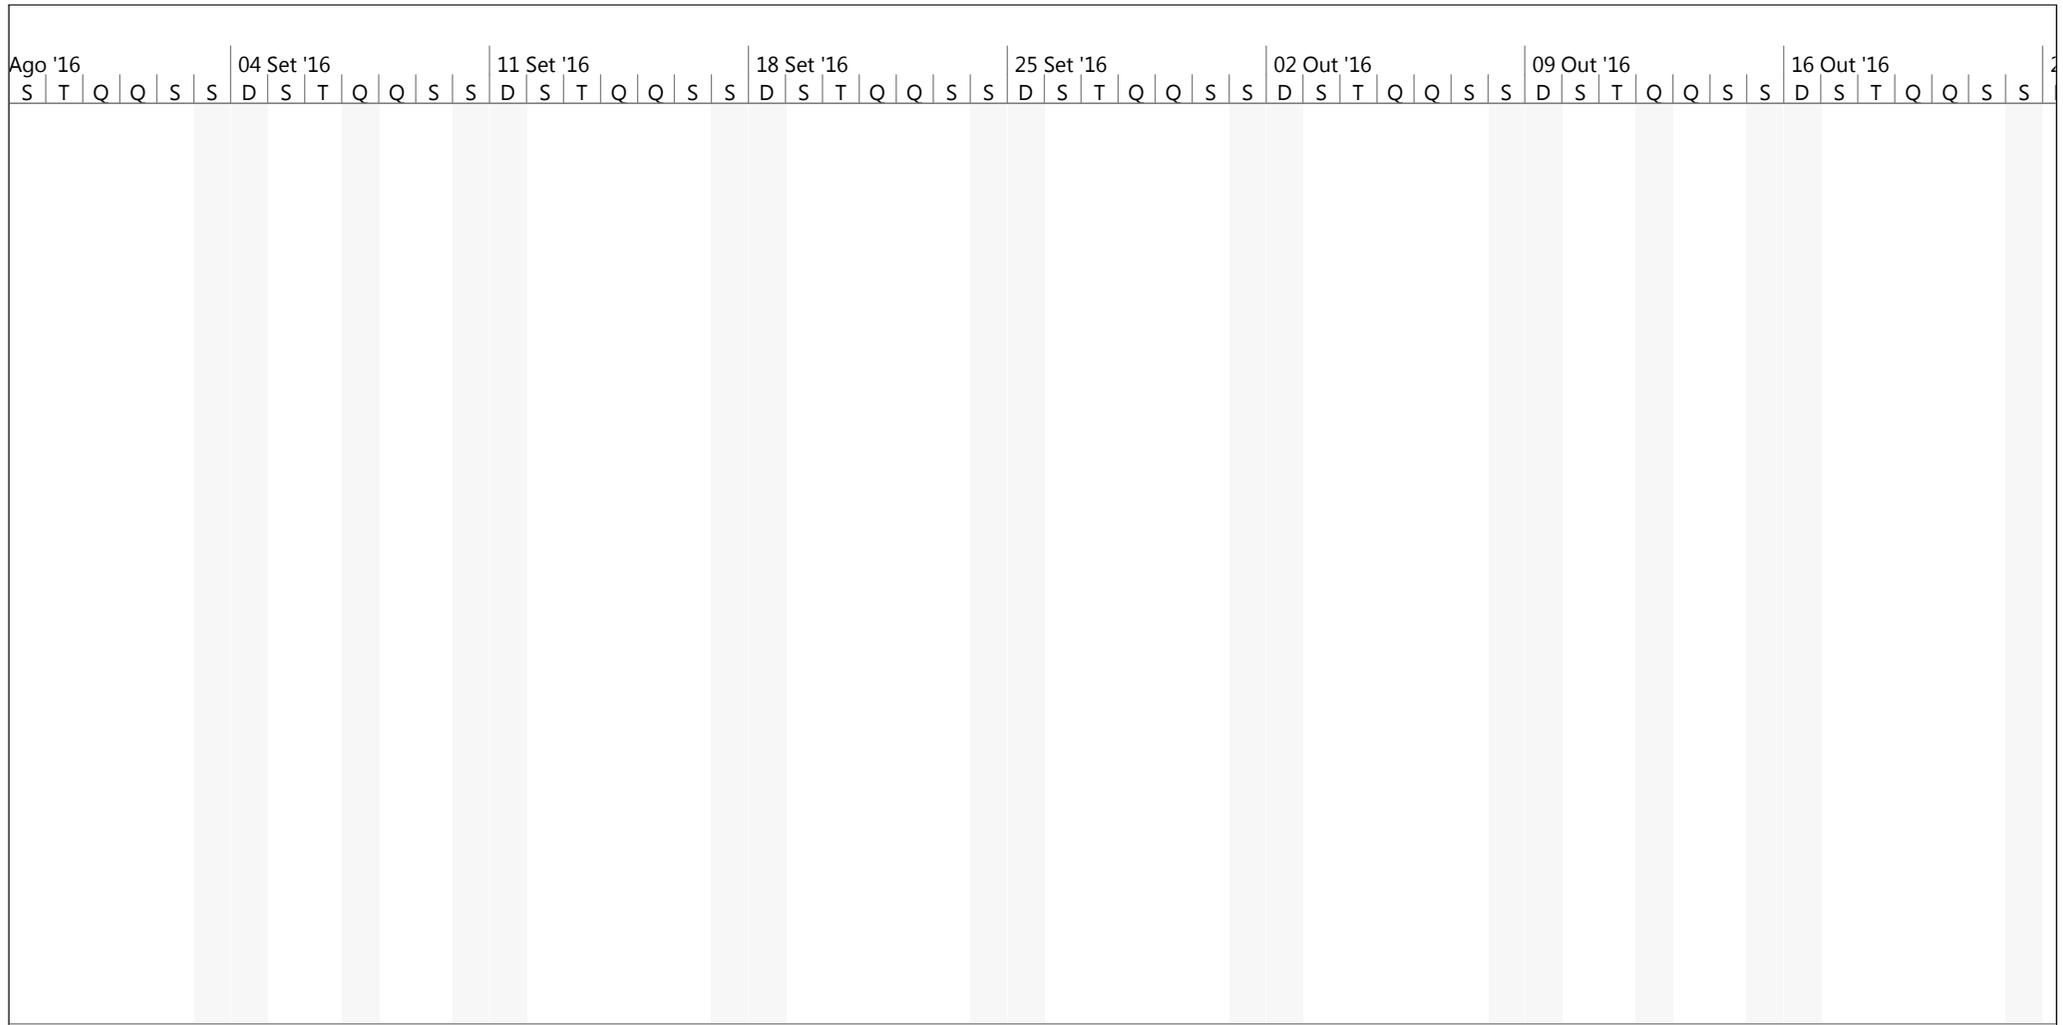


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Ago '16 | 04 Set '16 | 11 Set '16 | 18 Set '16 | 25 Set '16 | 02 Out '16 | 09 Out '16 | 16 Out '16 | 23 Out '16


S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

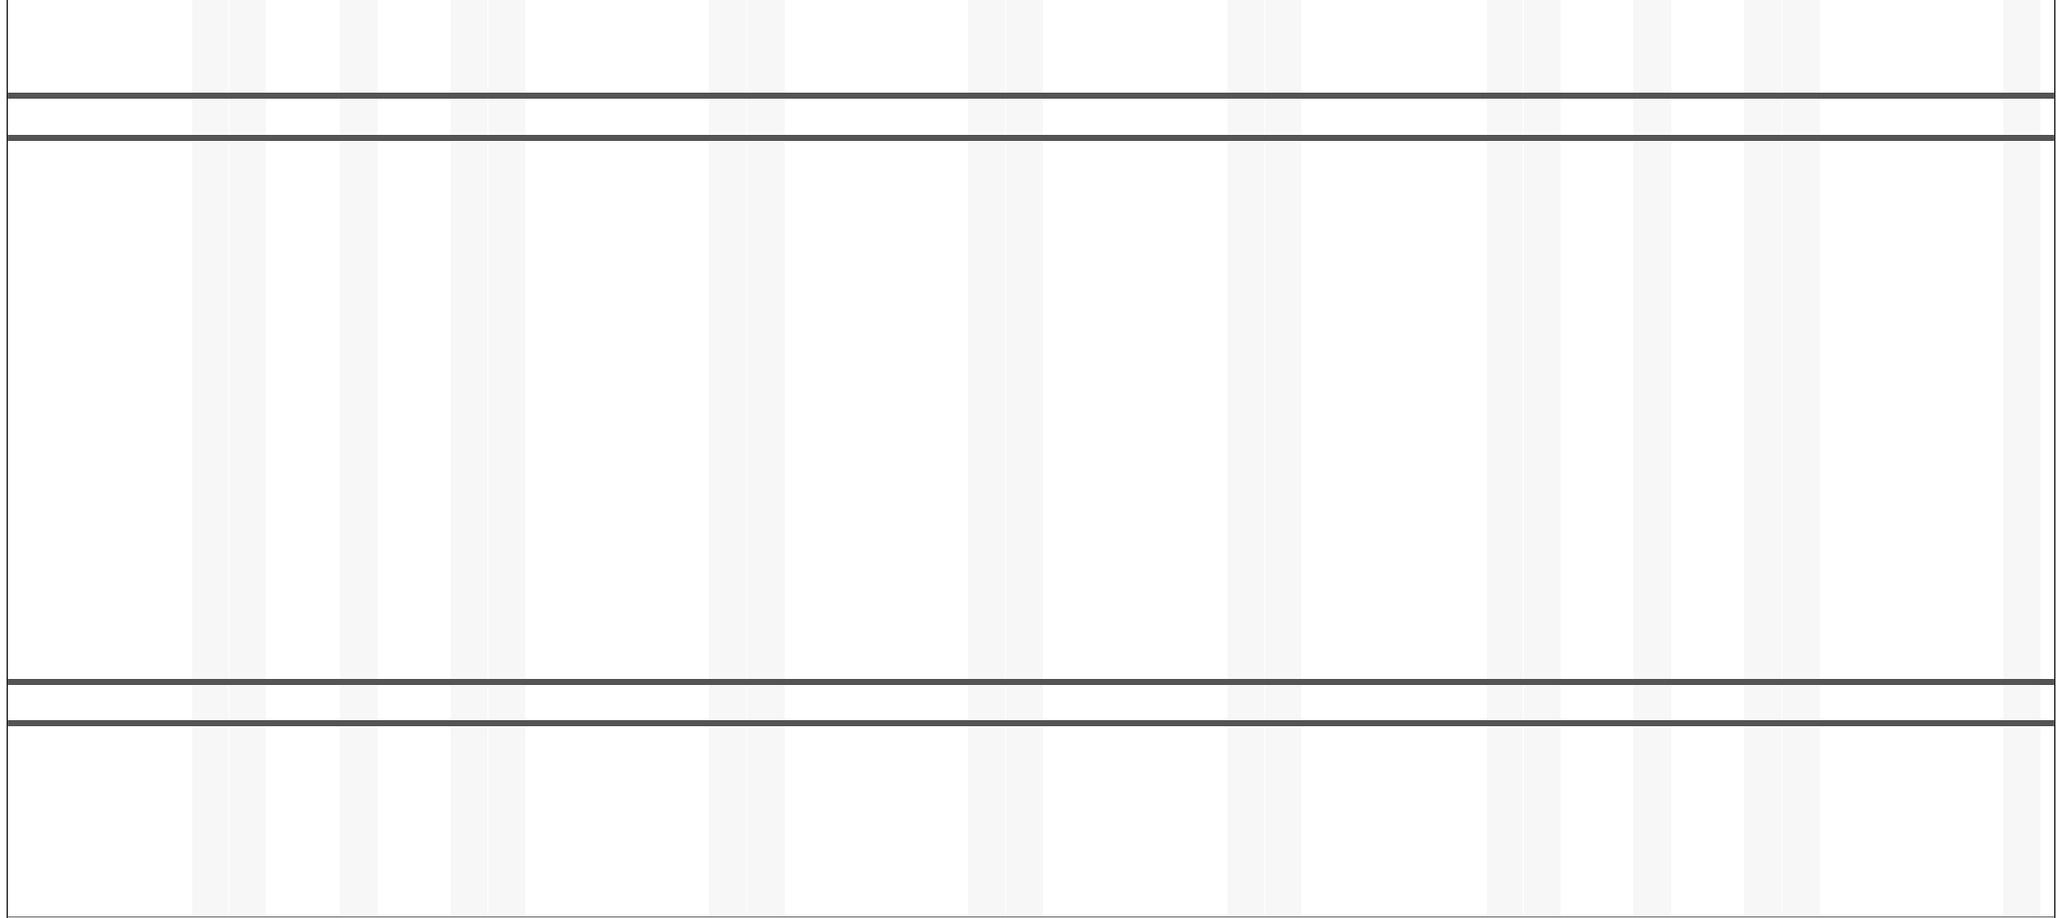


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

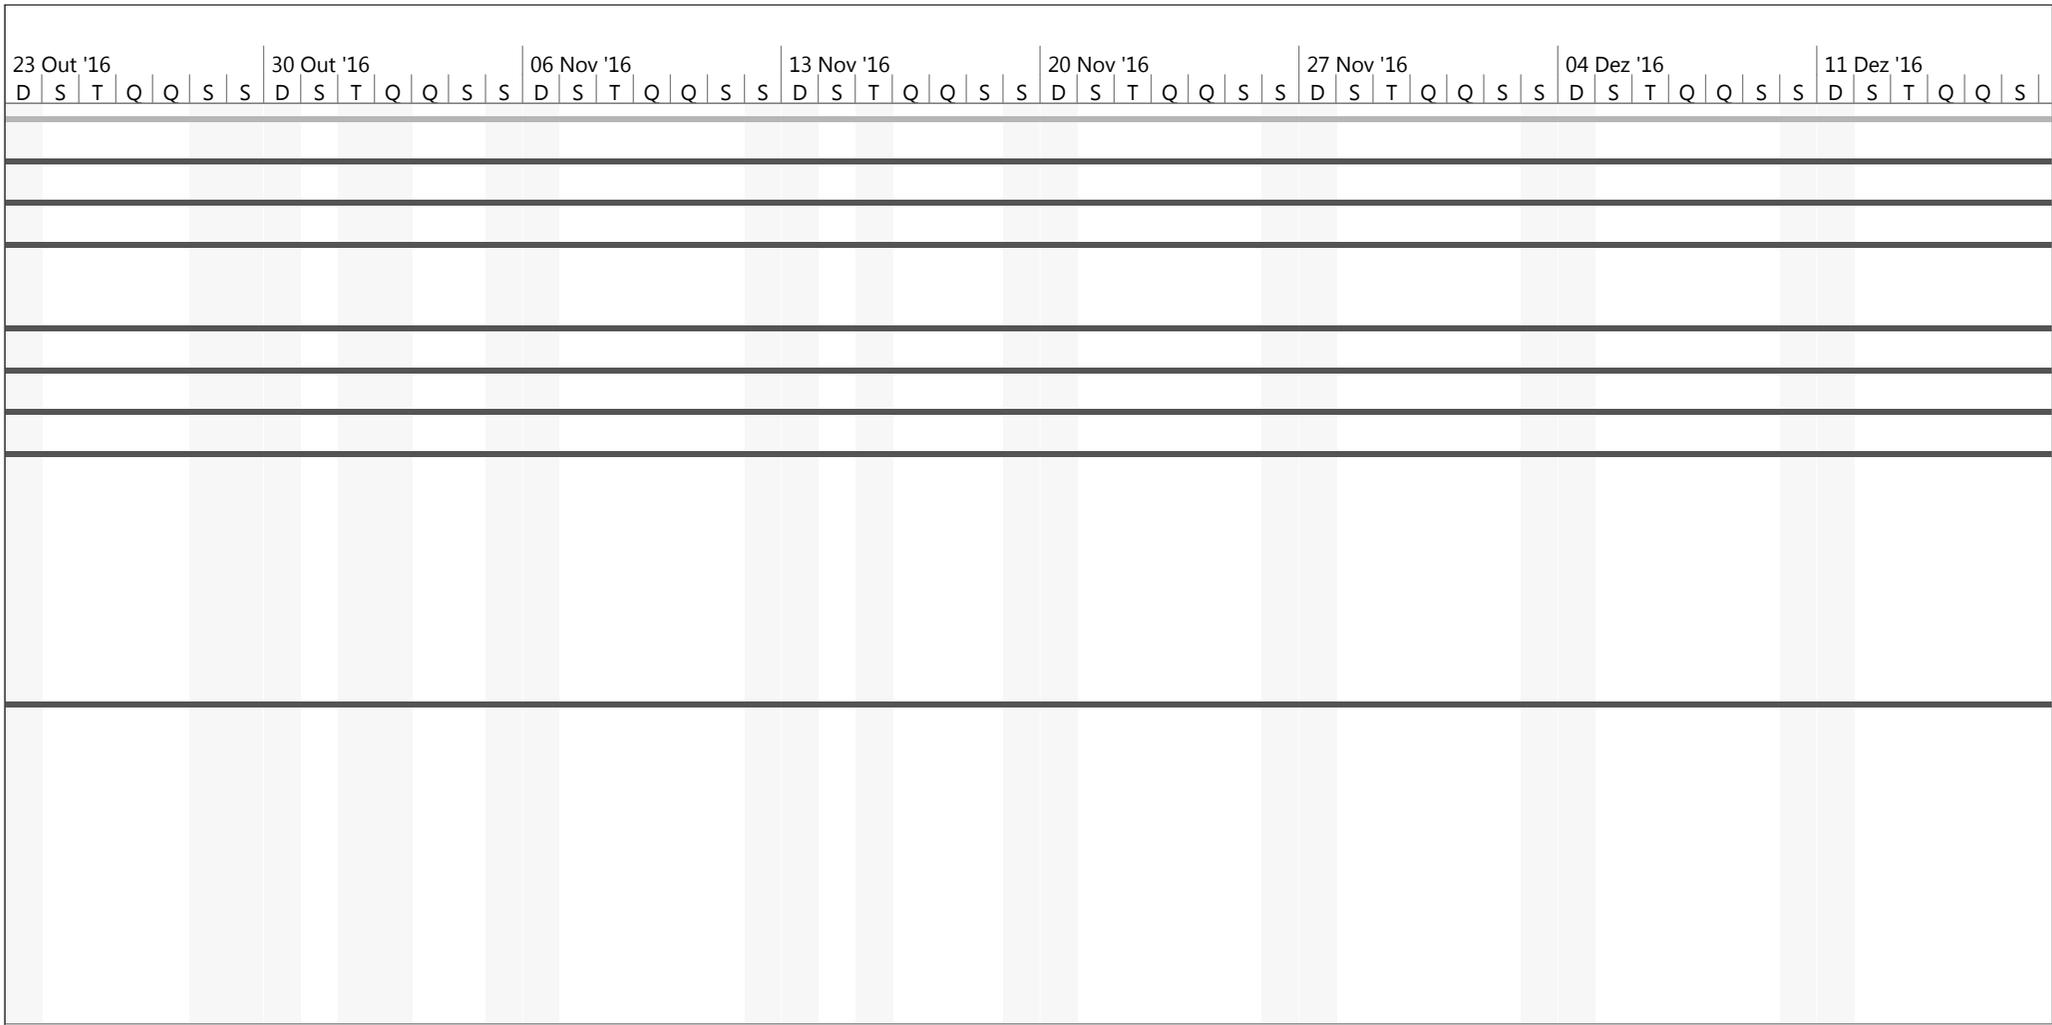


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

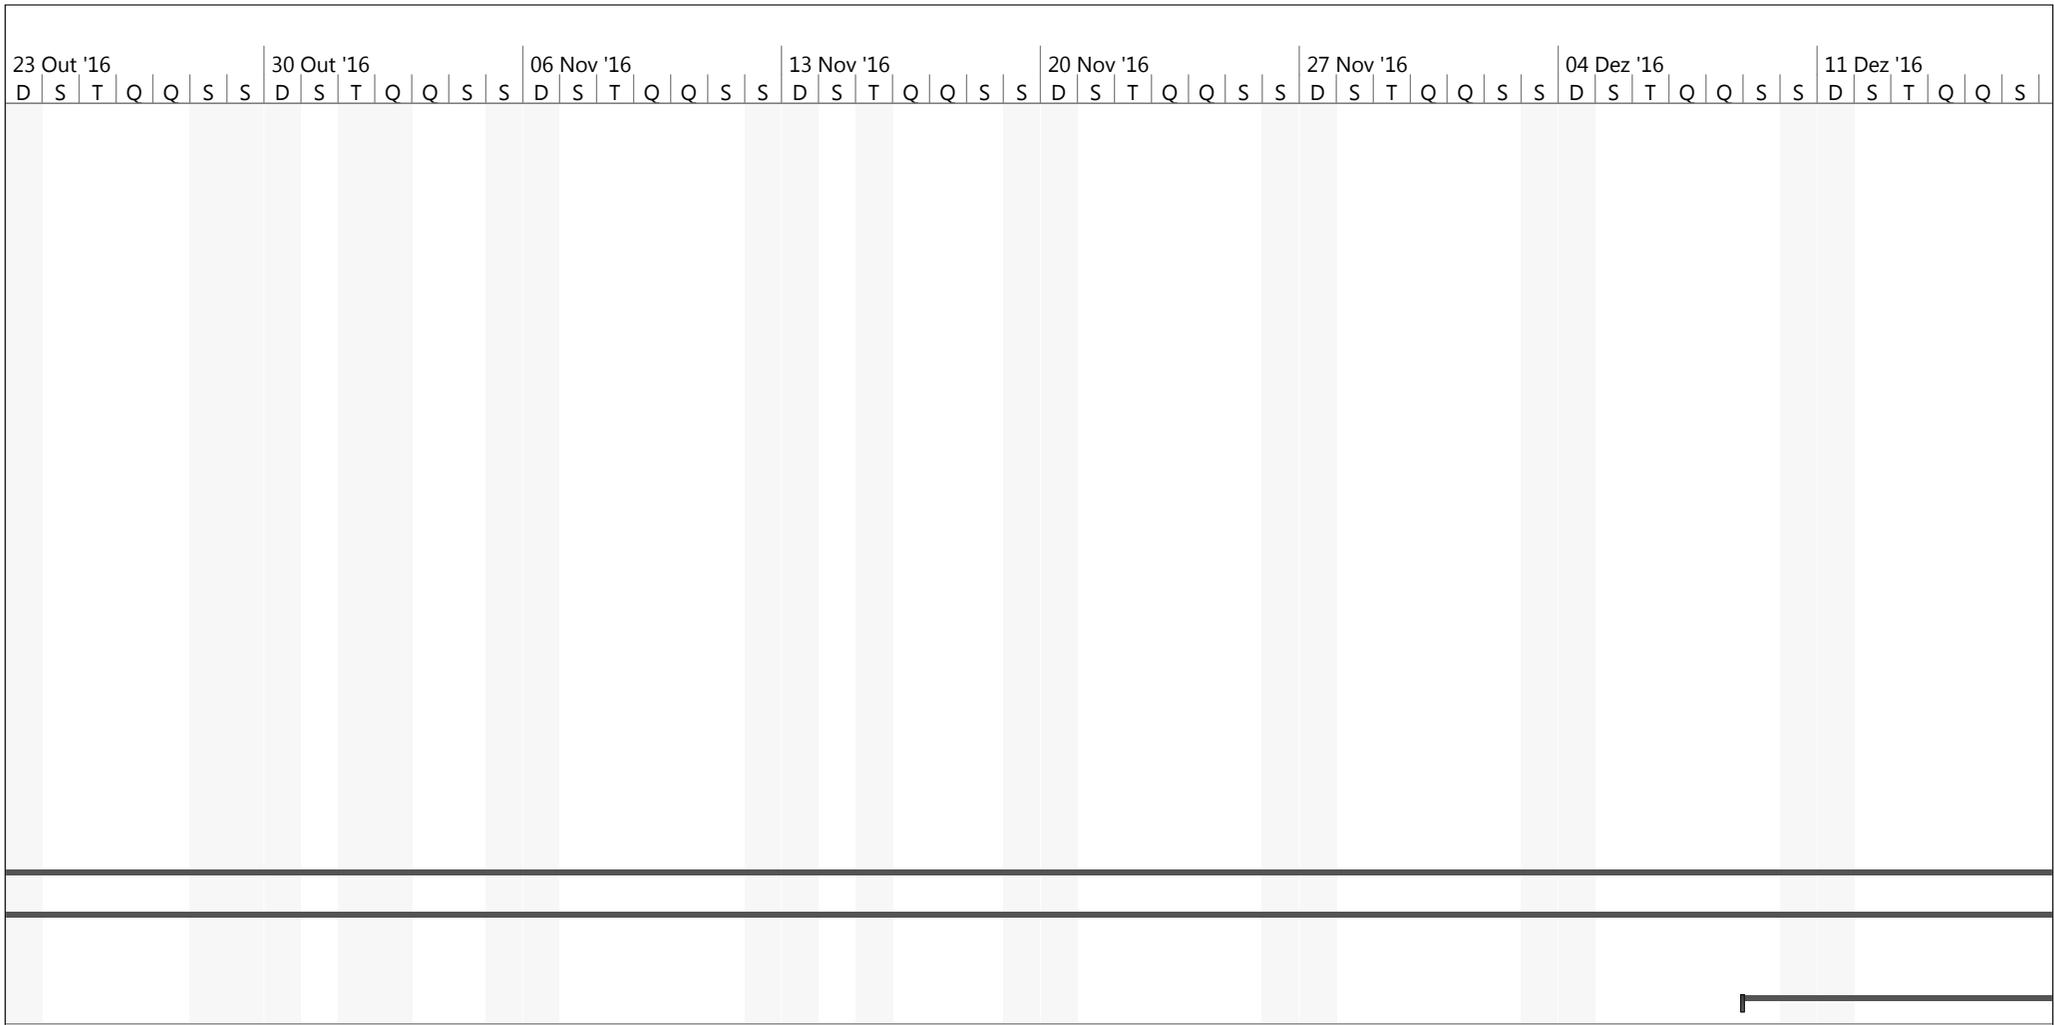


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


23 Out '16 | 30 Out '16 | 06 Nov '16 | 13 Nov '16 | 20 Nov '16 | 27 Nov '16 | 04 Dez '16 | 11 Dez '16  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

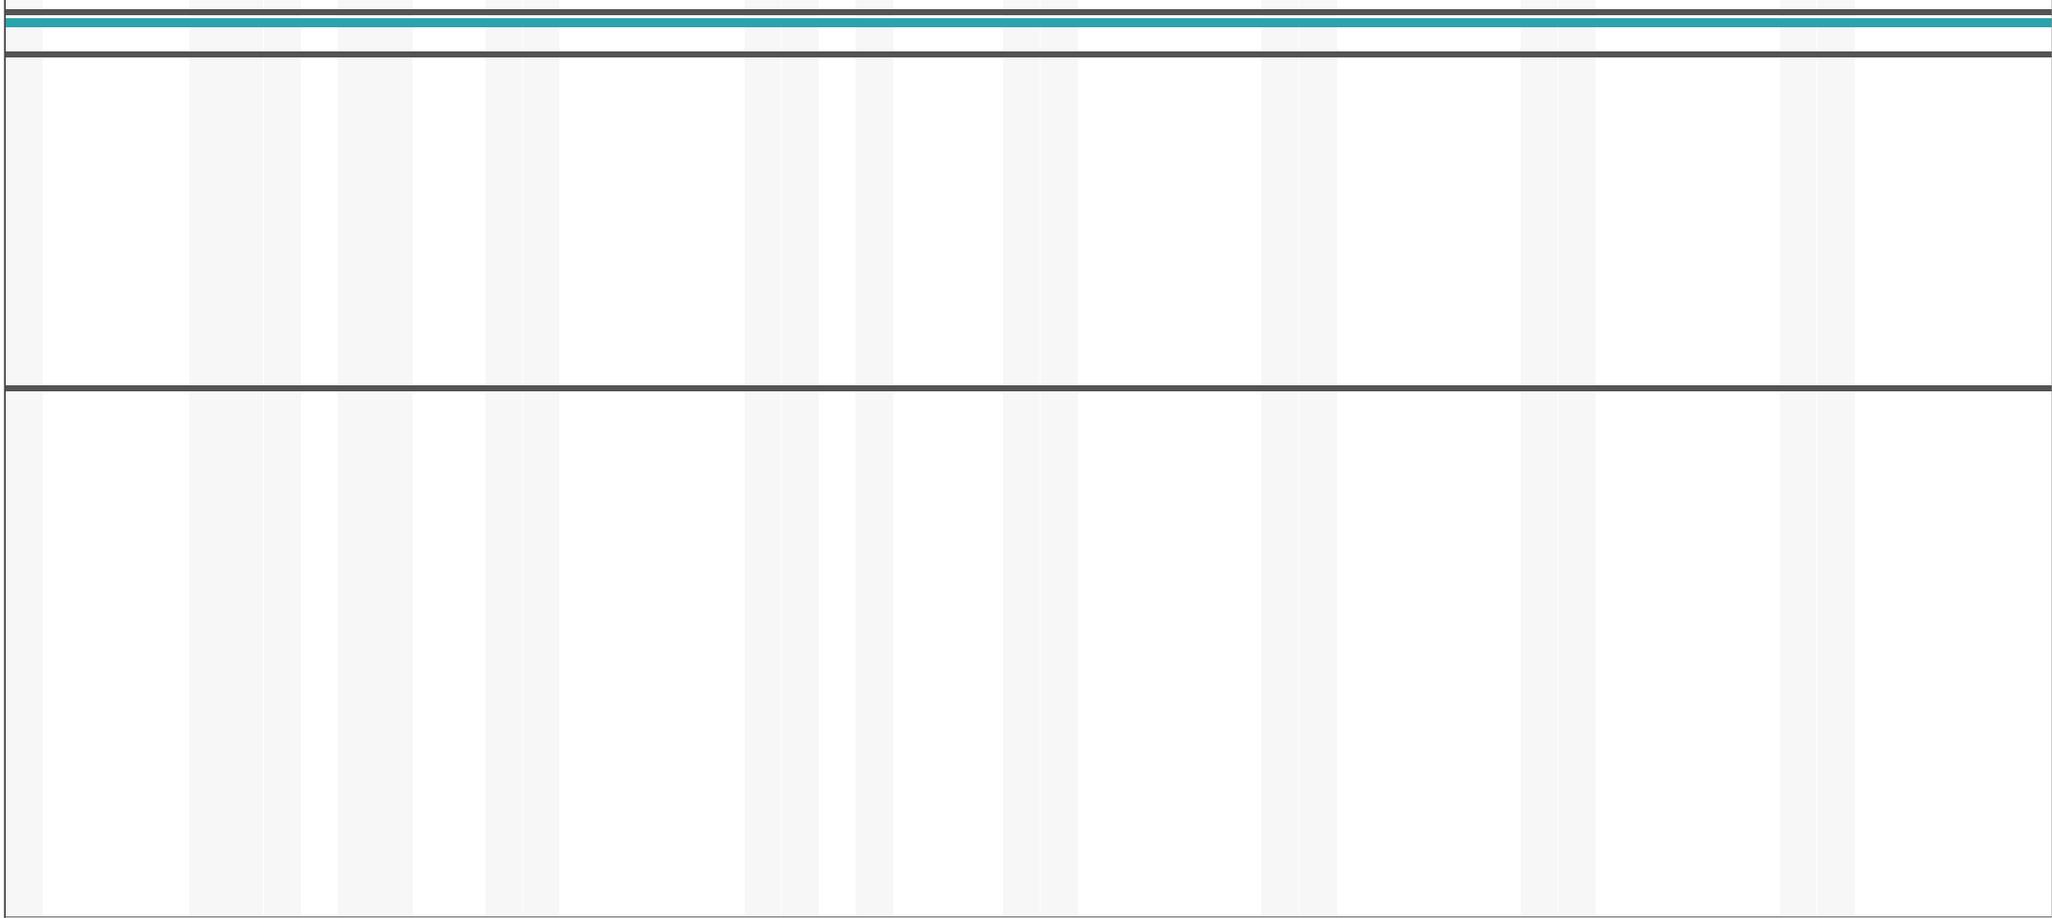


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

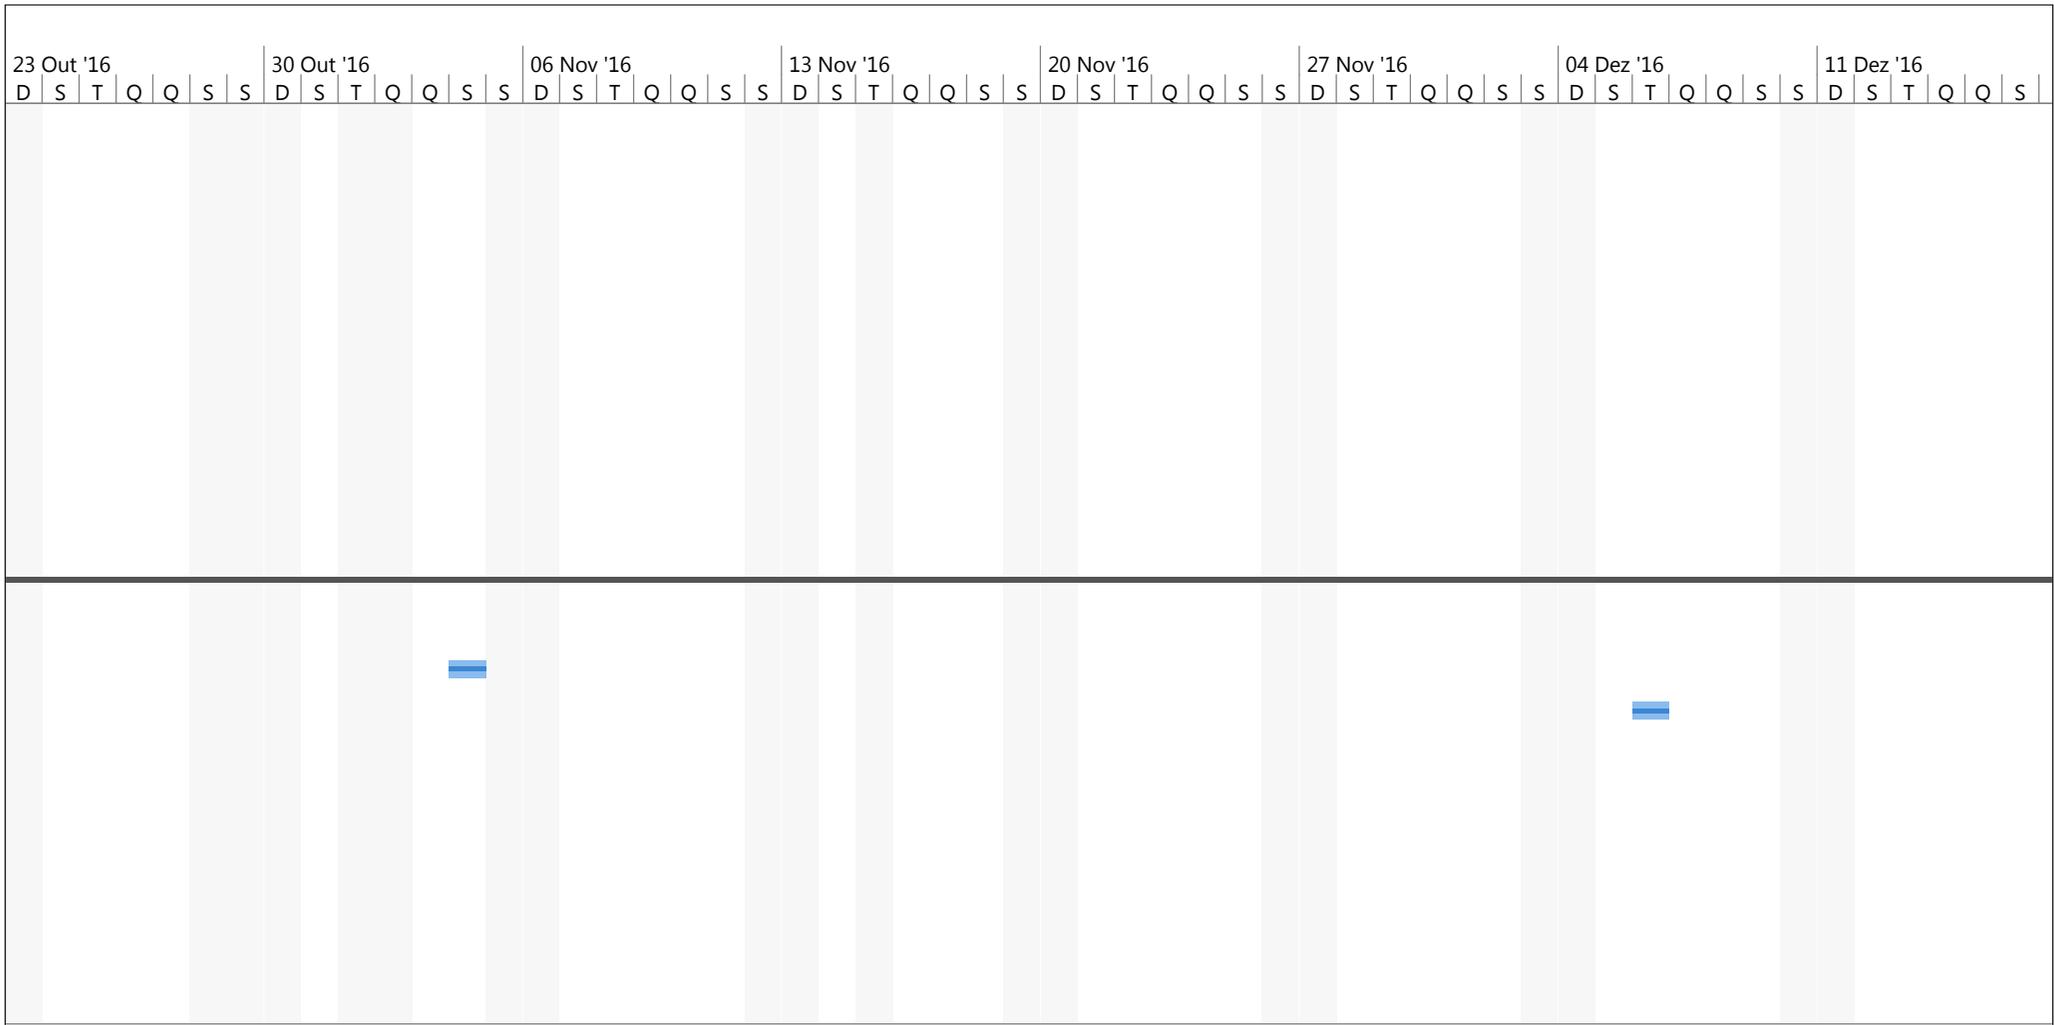


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

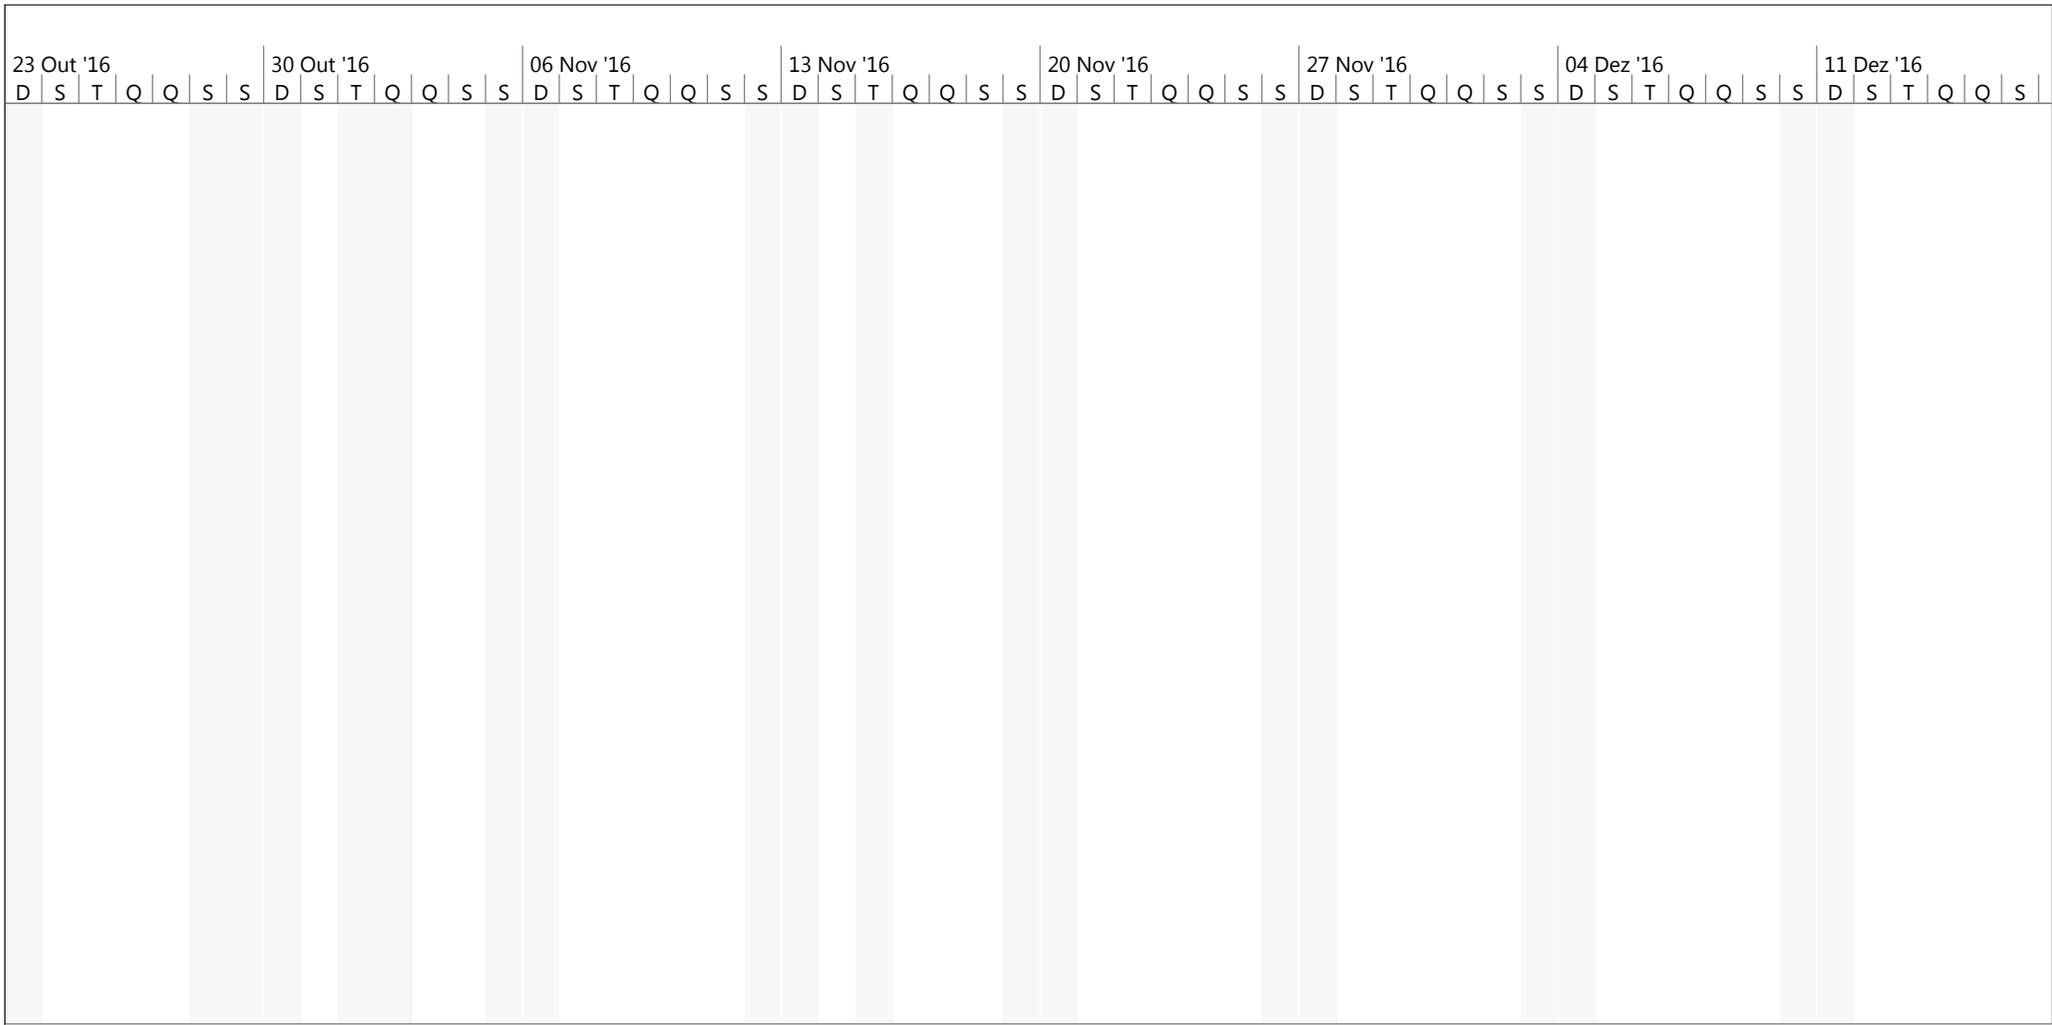


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

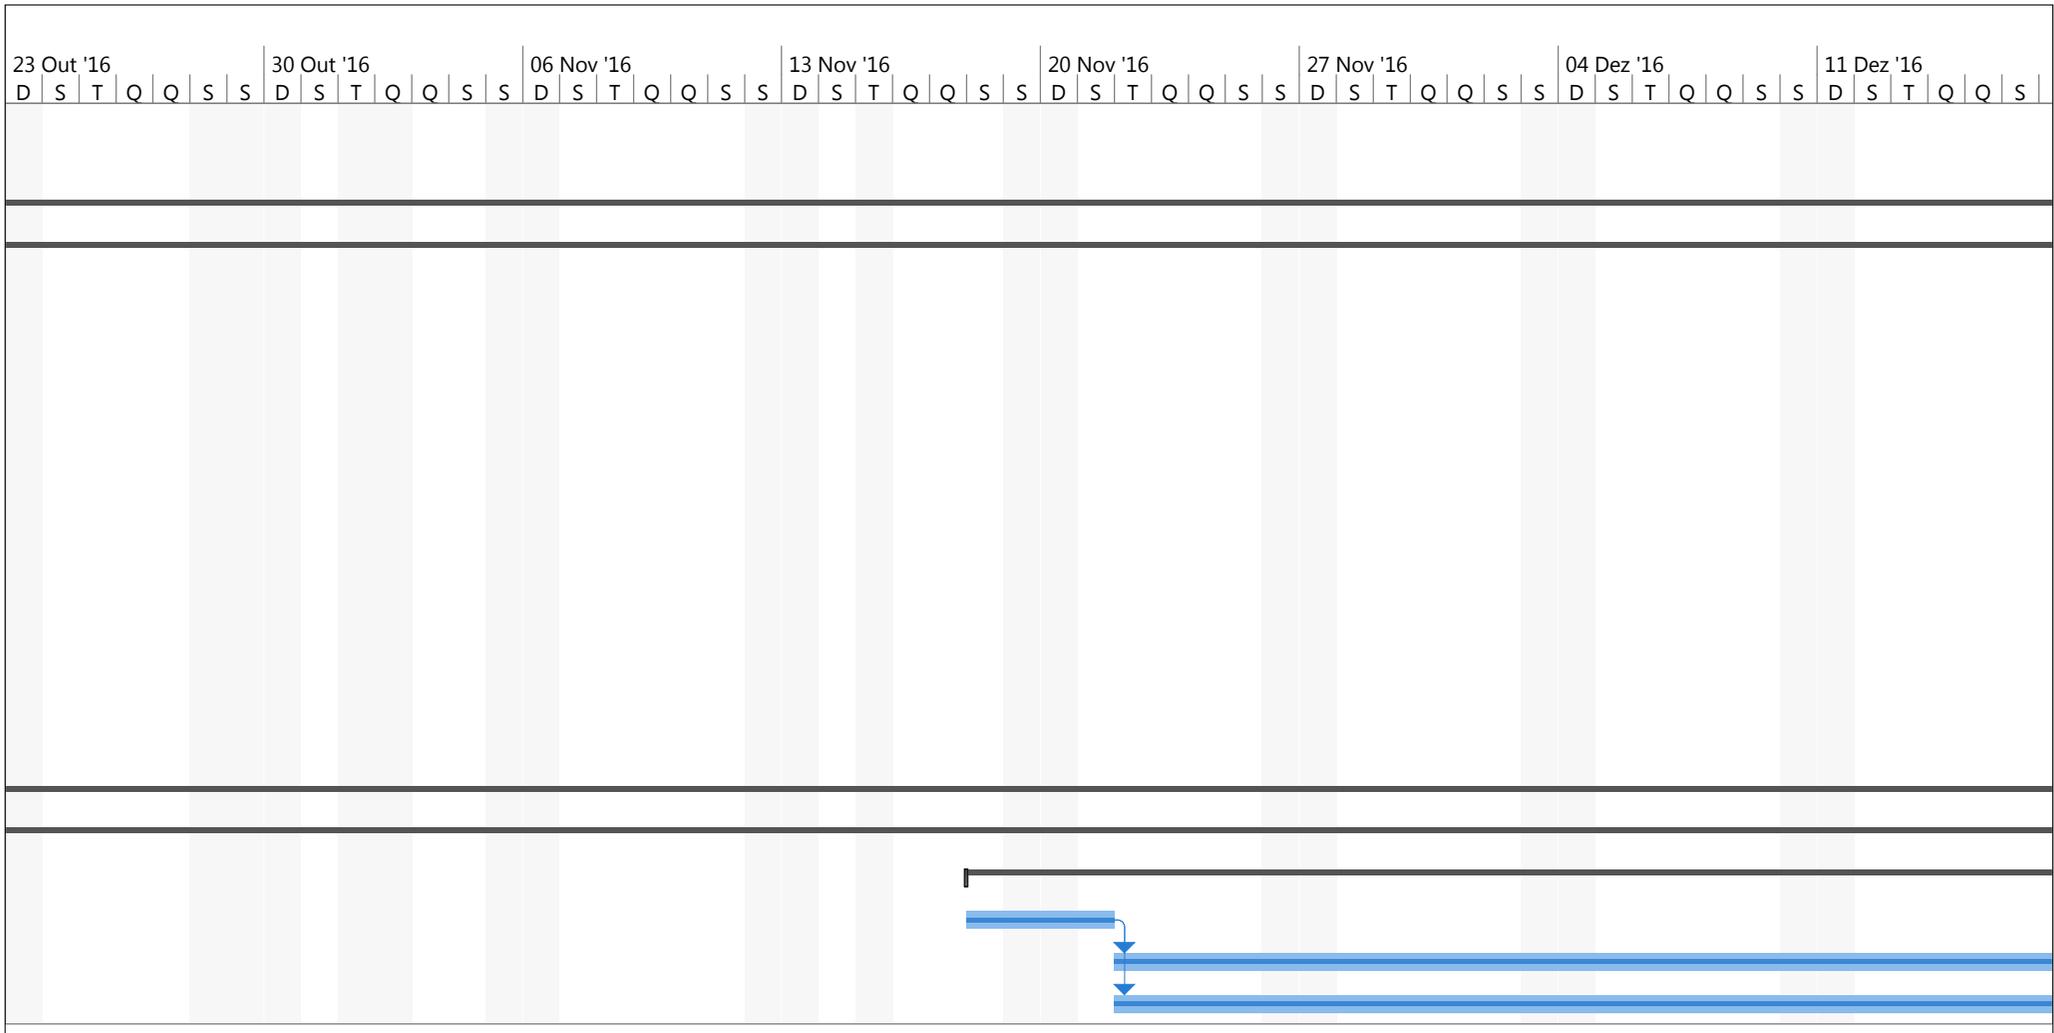


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

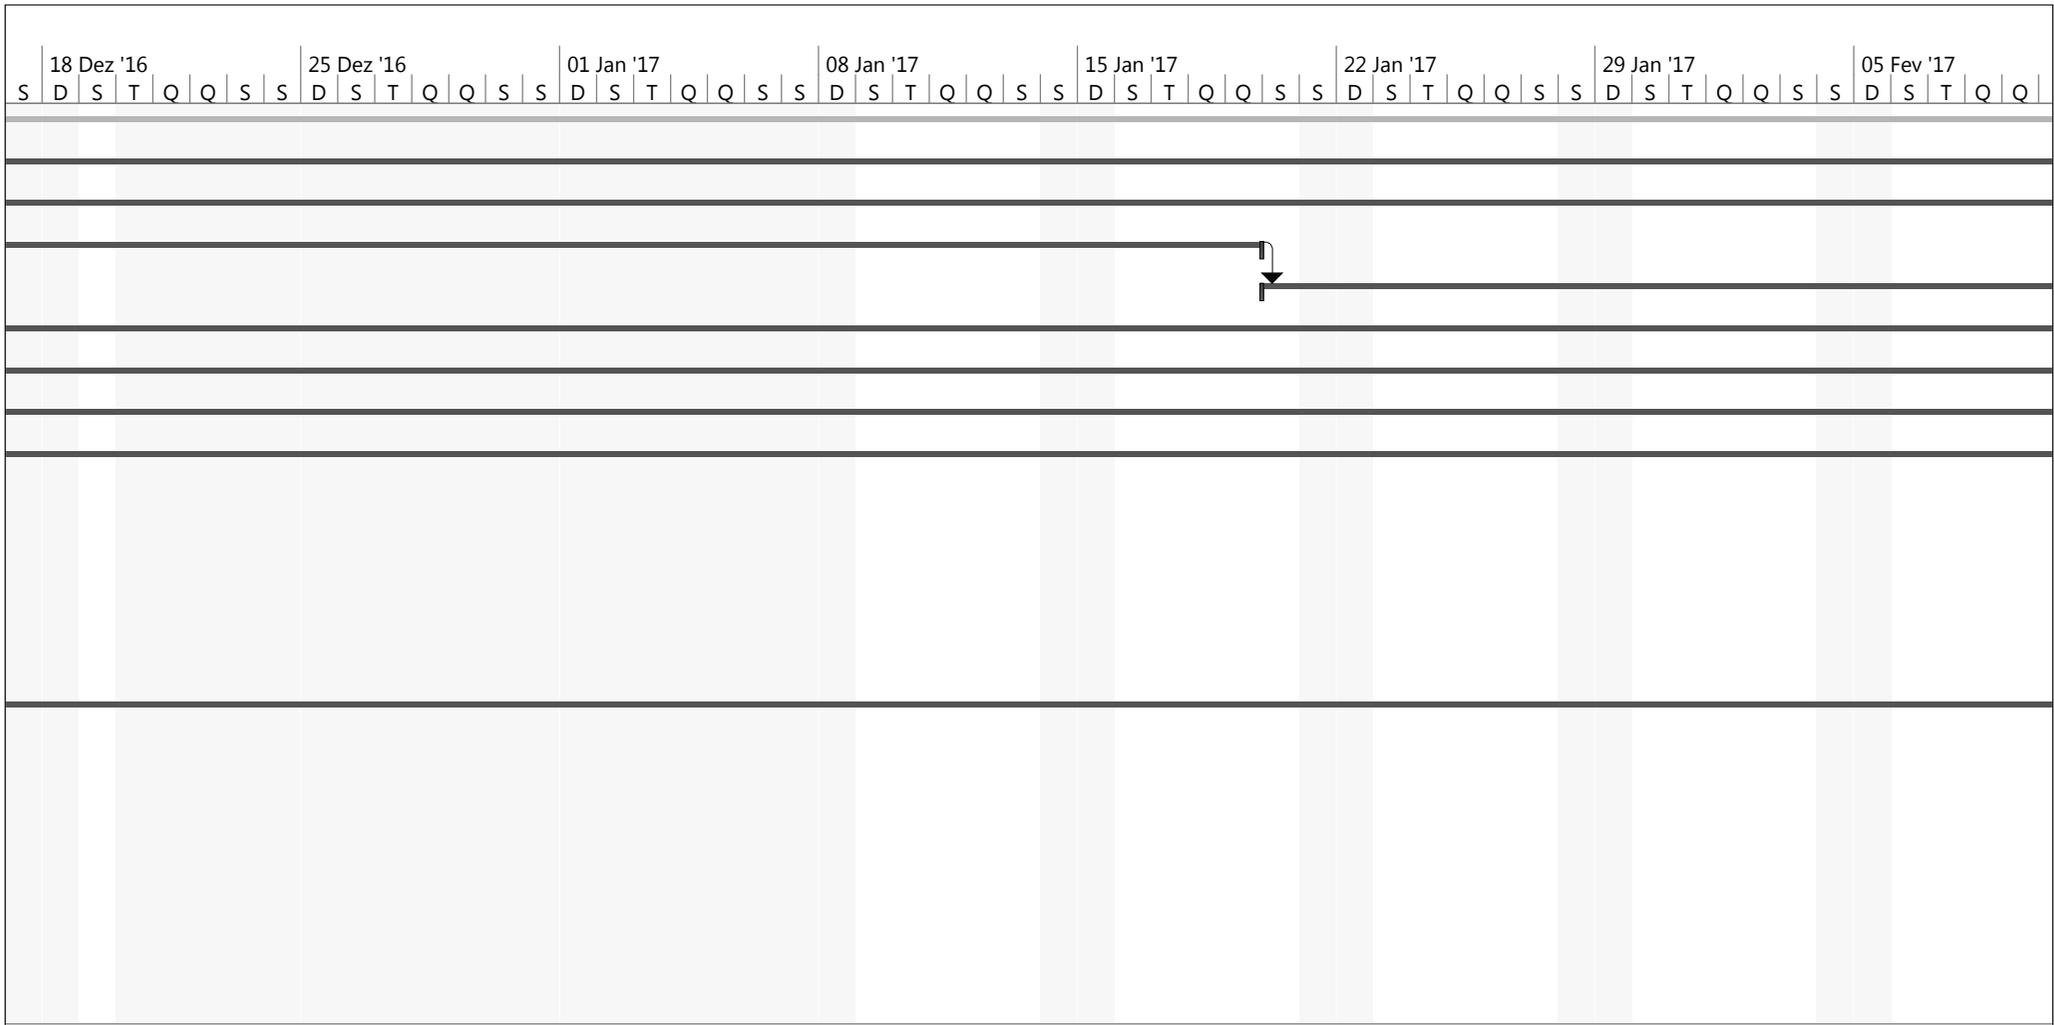

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

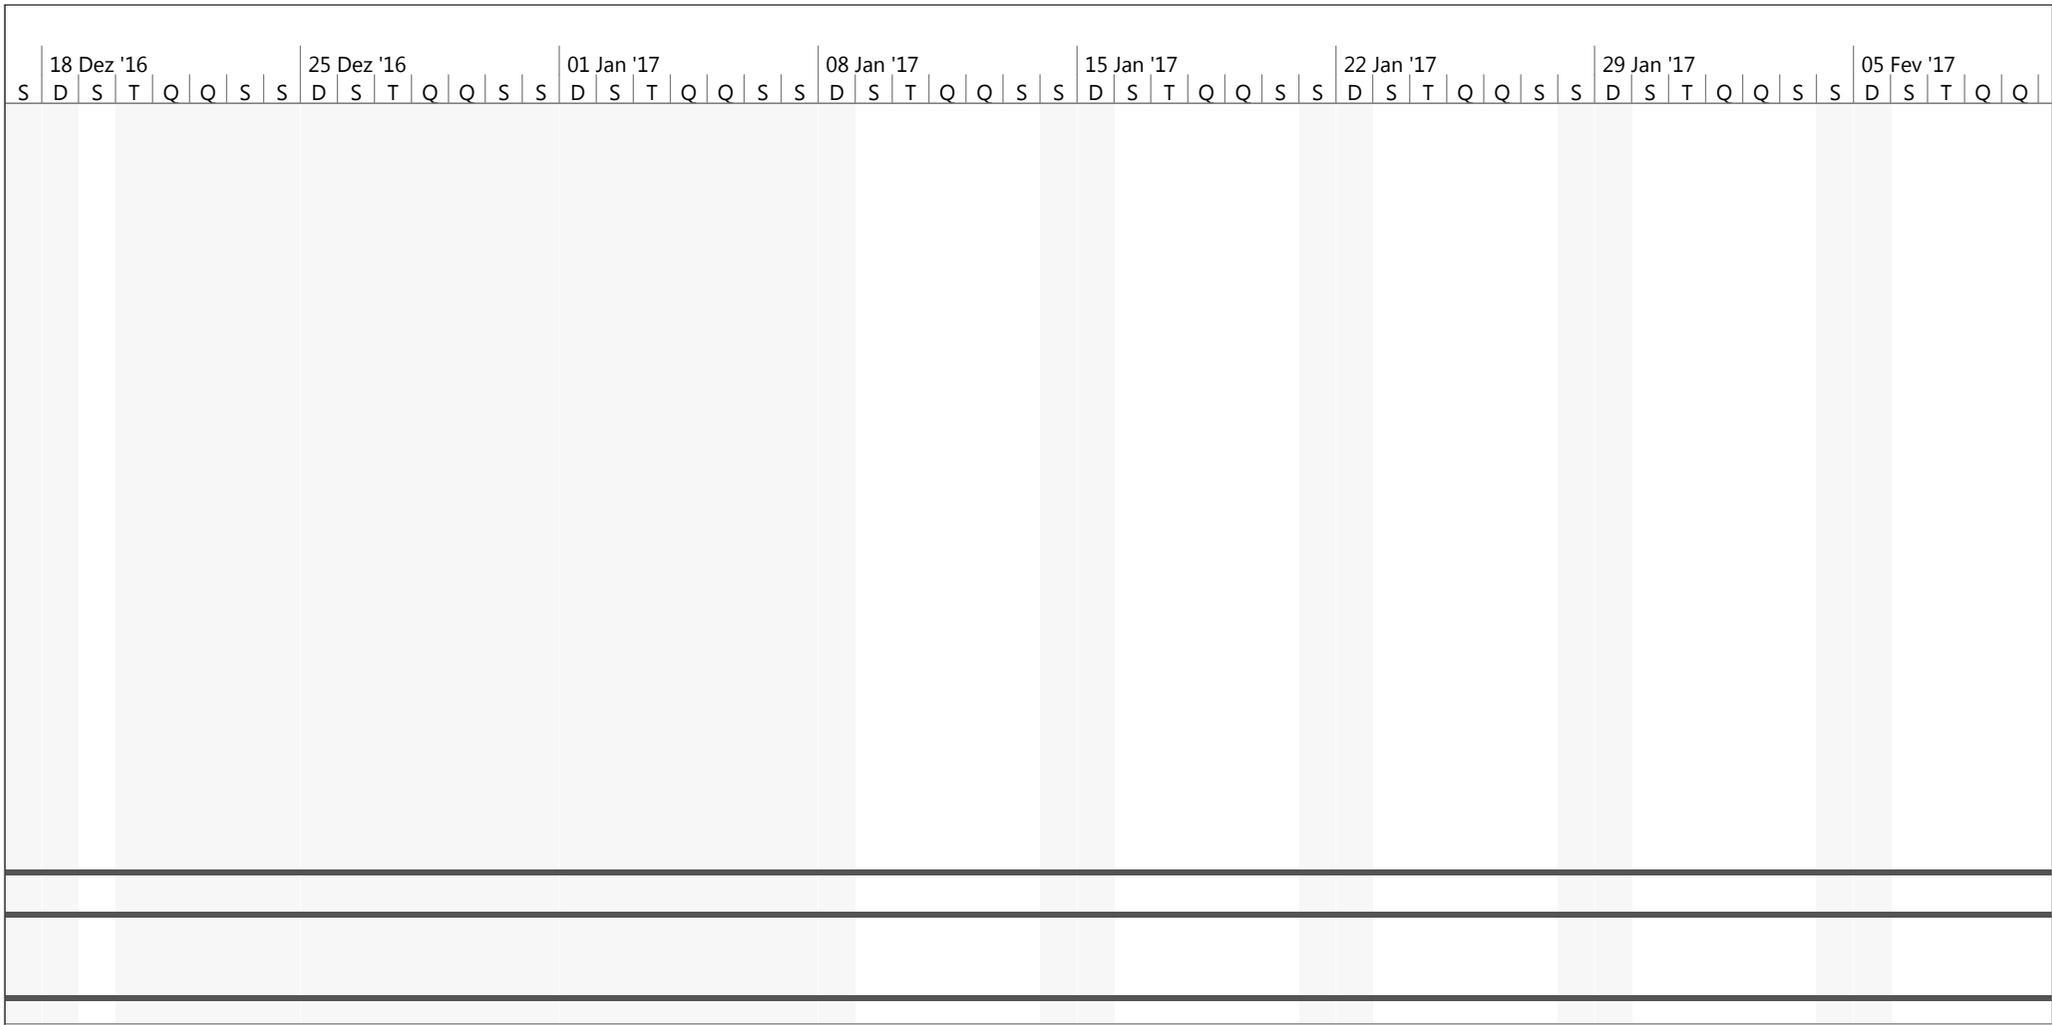


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


18 Dez '16 25 Dez '16 01 Jan '17 08 Jan '17 15 Jan '17 22 Jan '17 29 Jan '17 05 Fev '17  
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

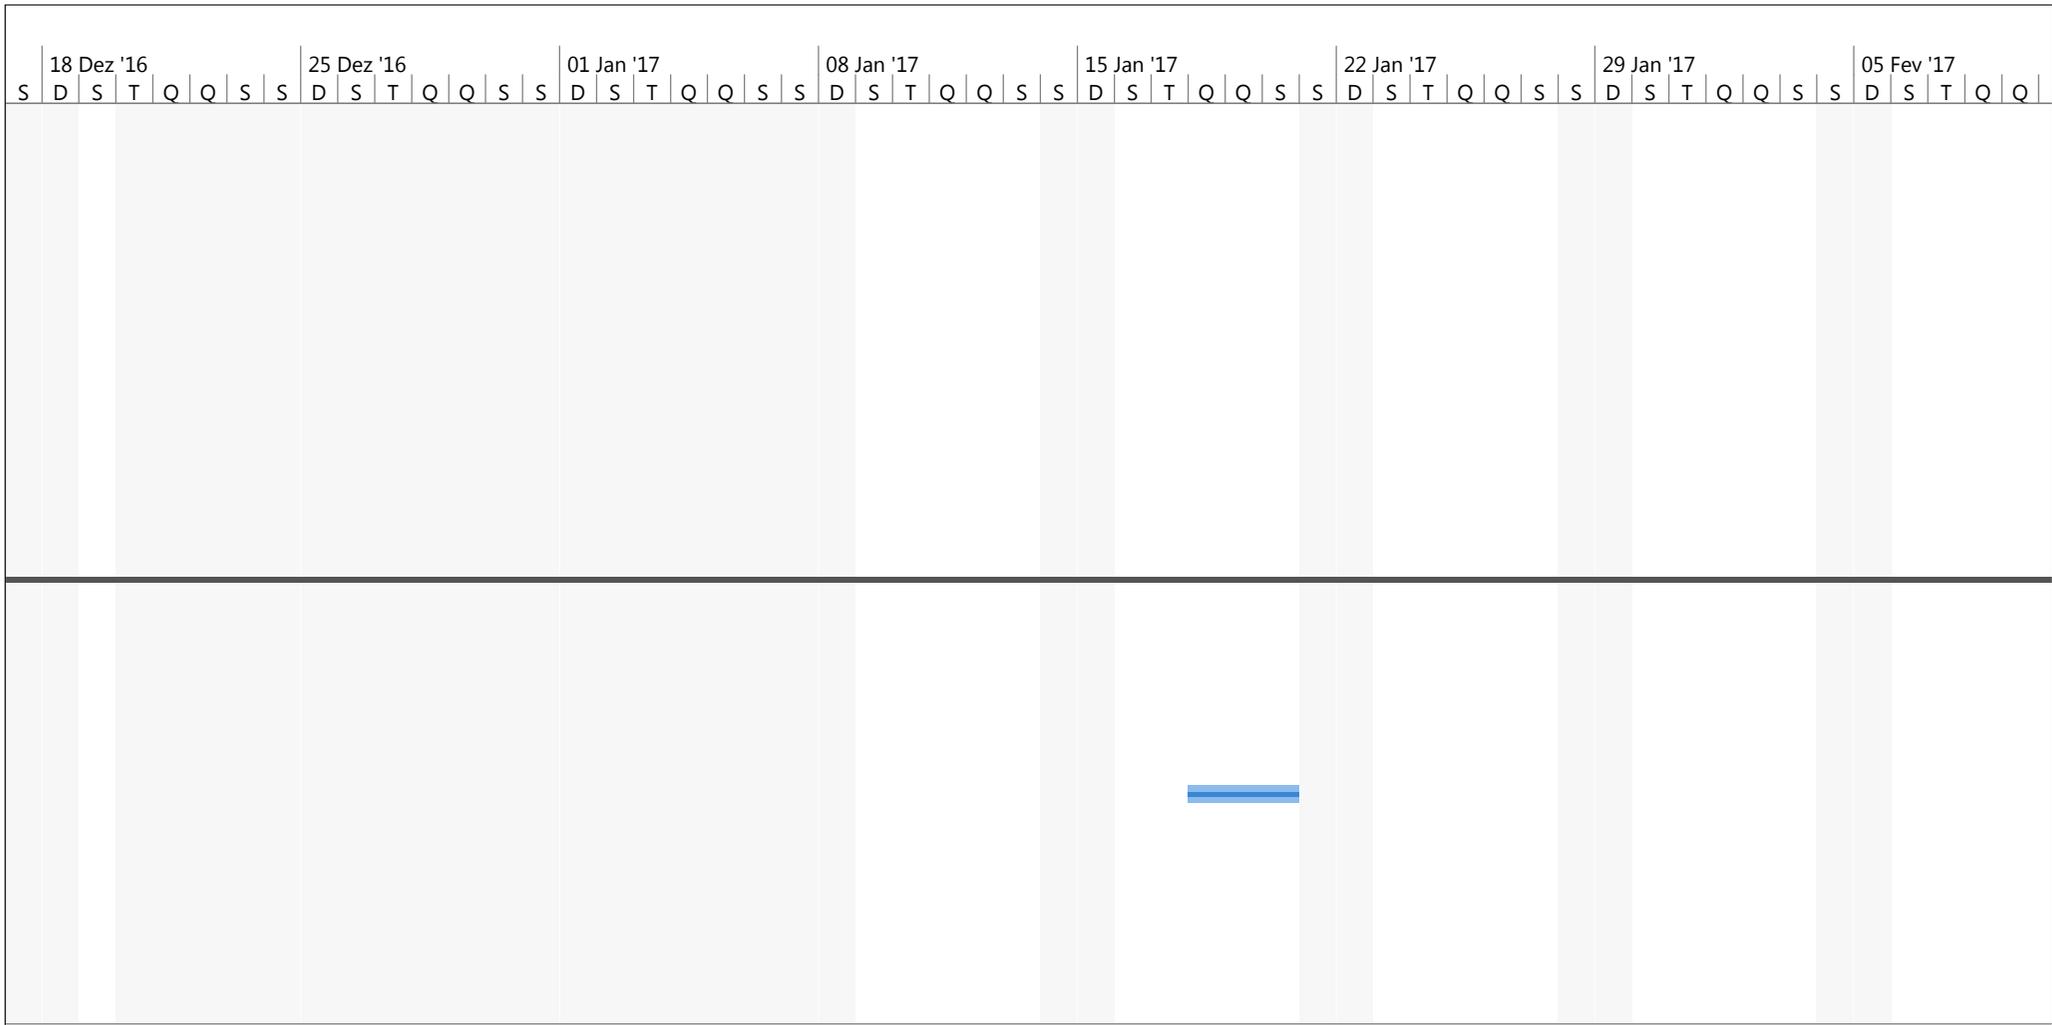


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

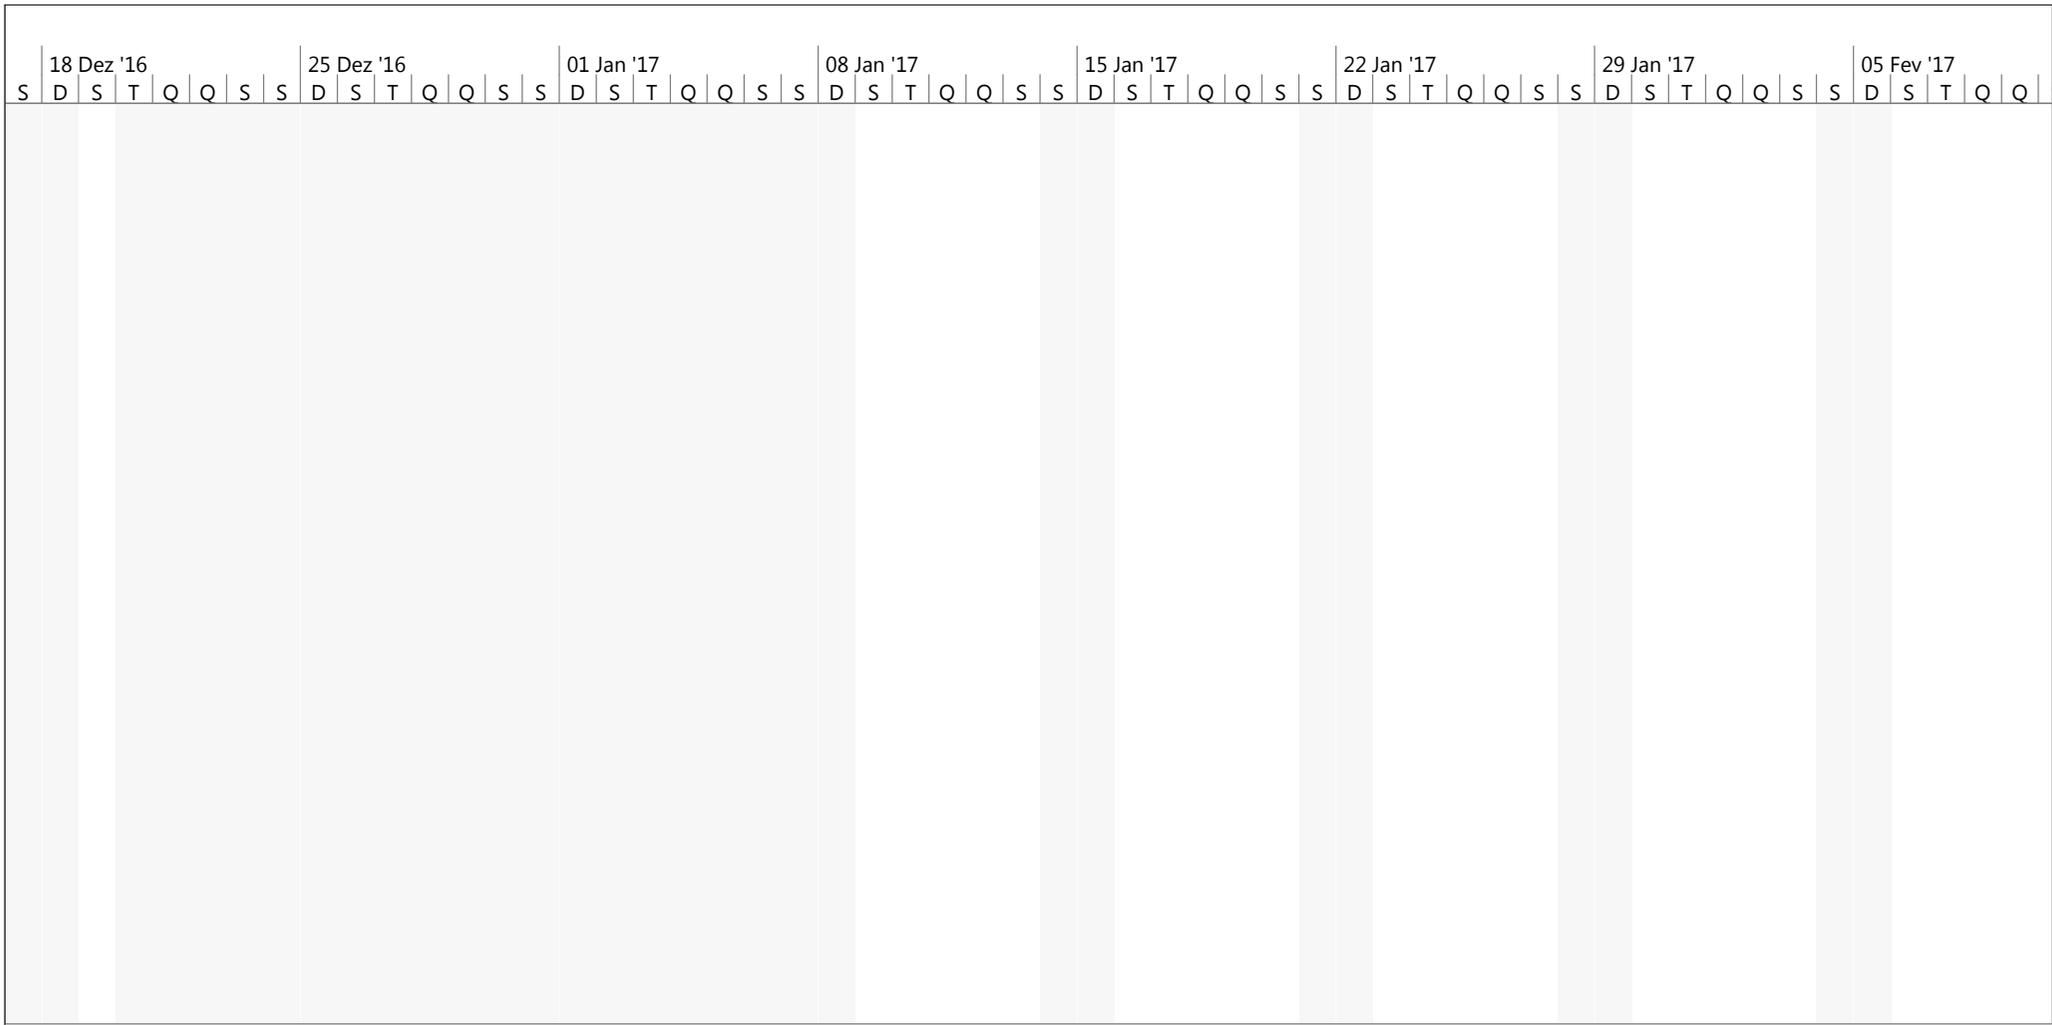

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

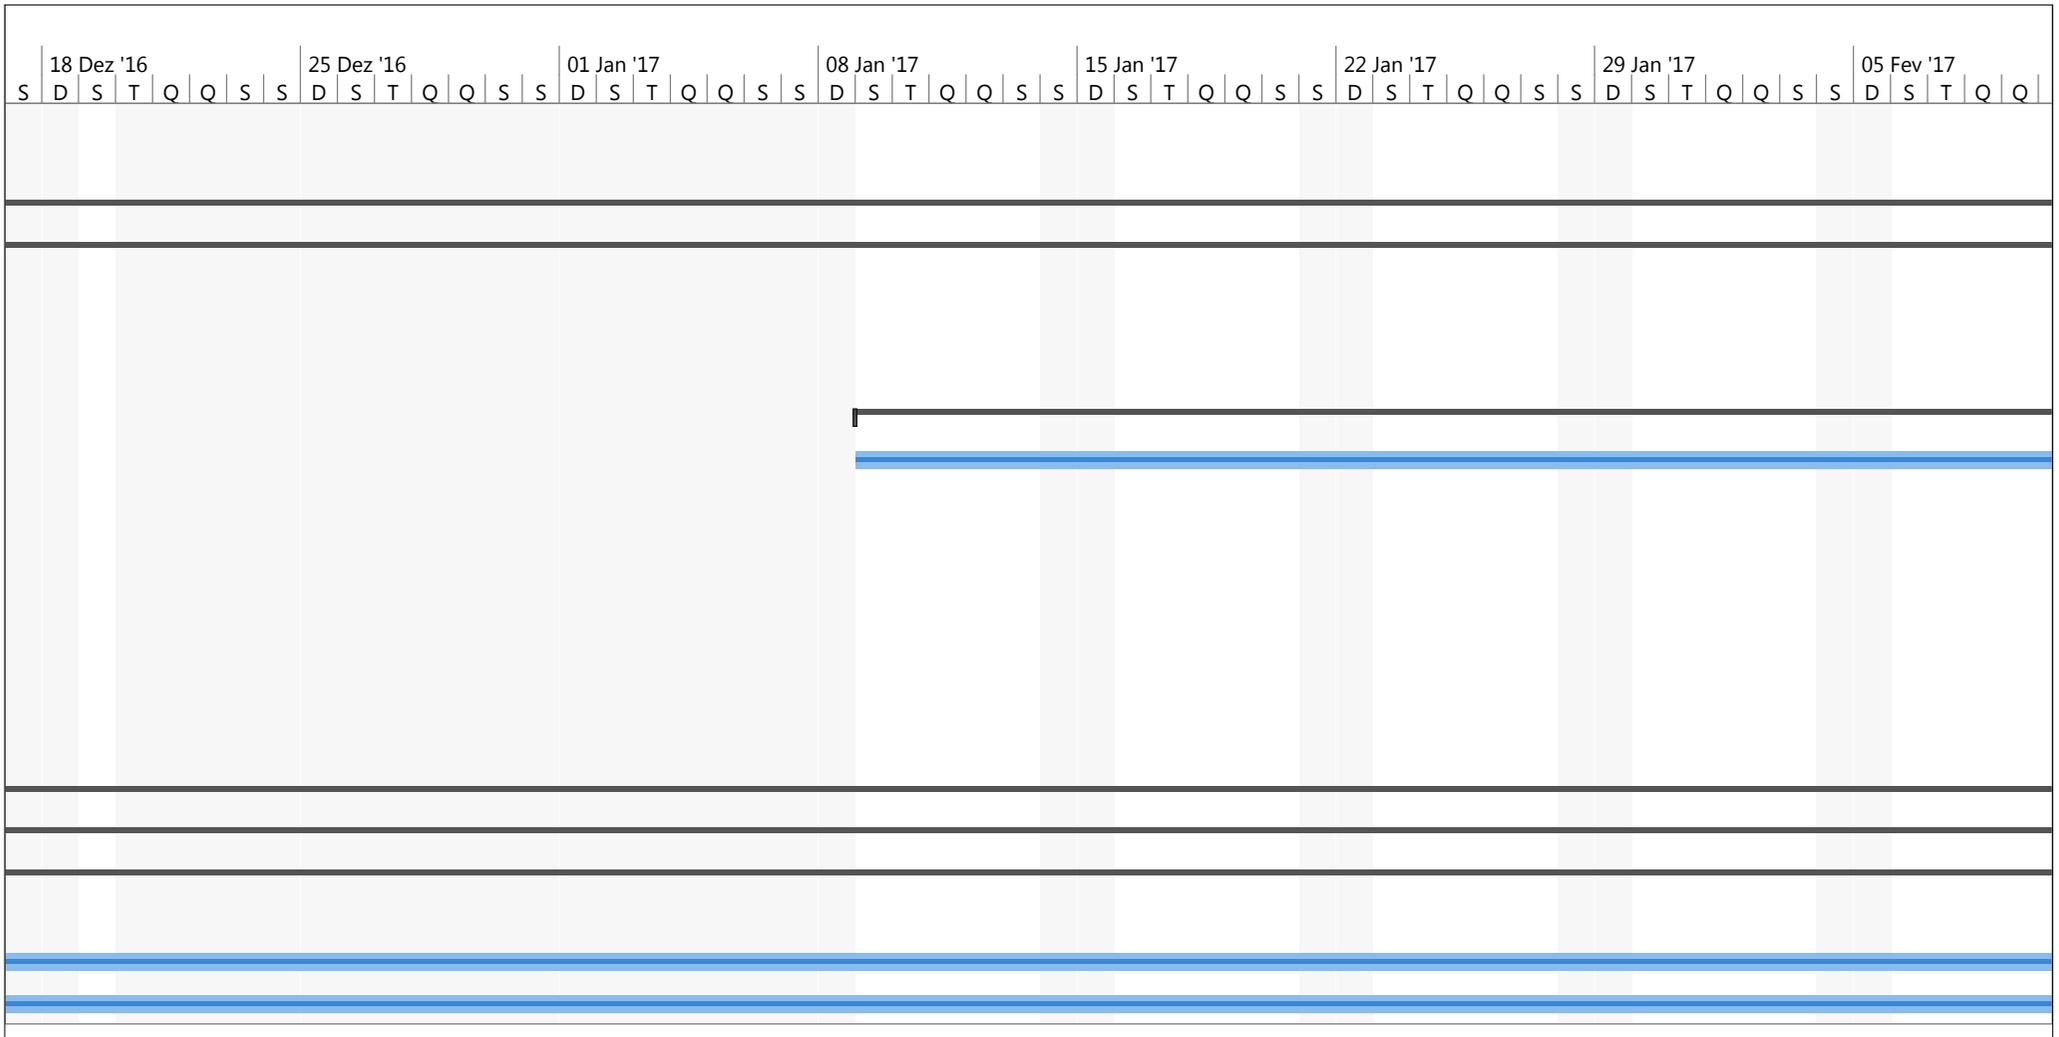


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

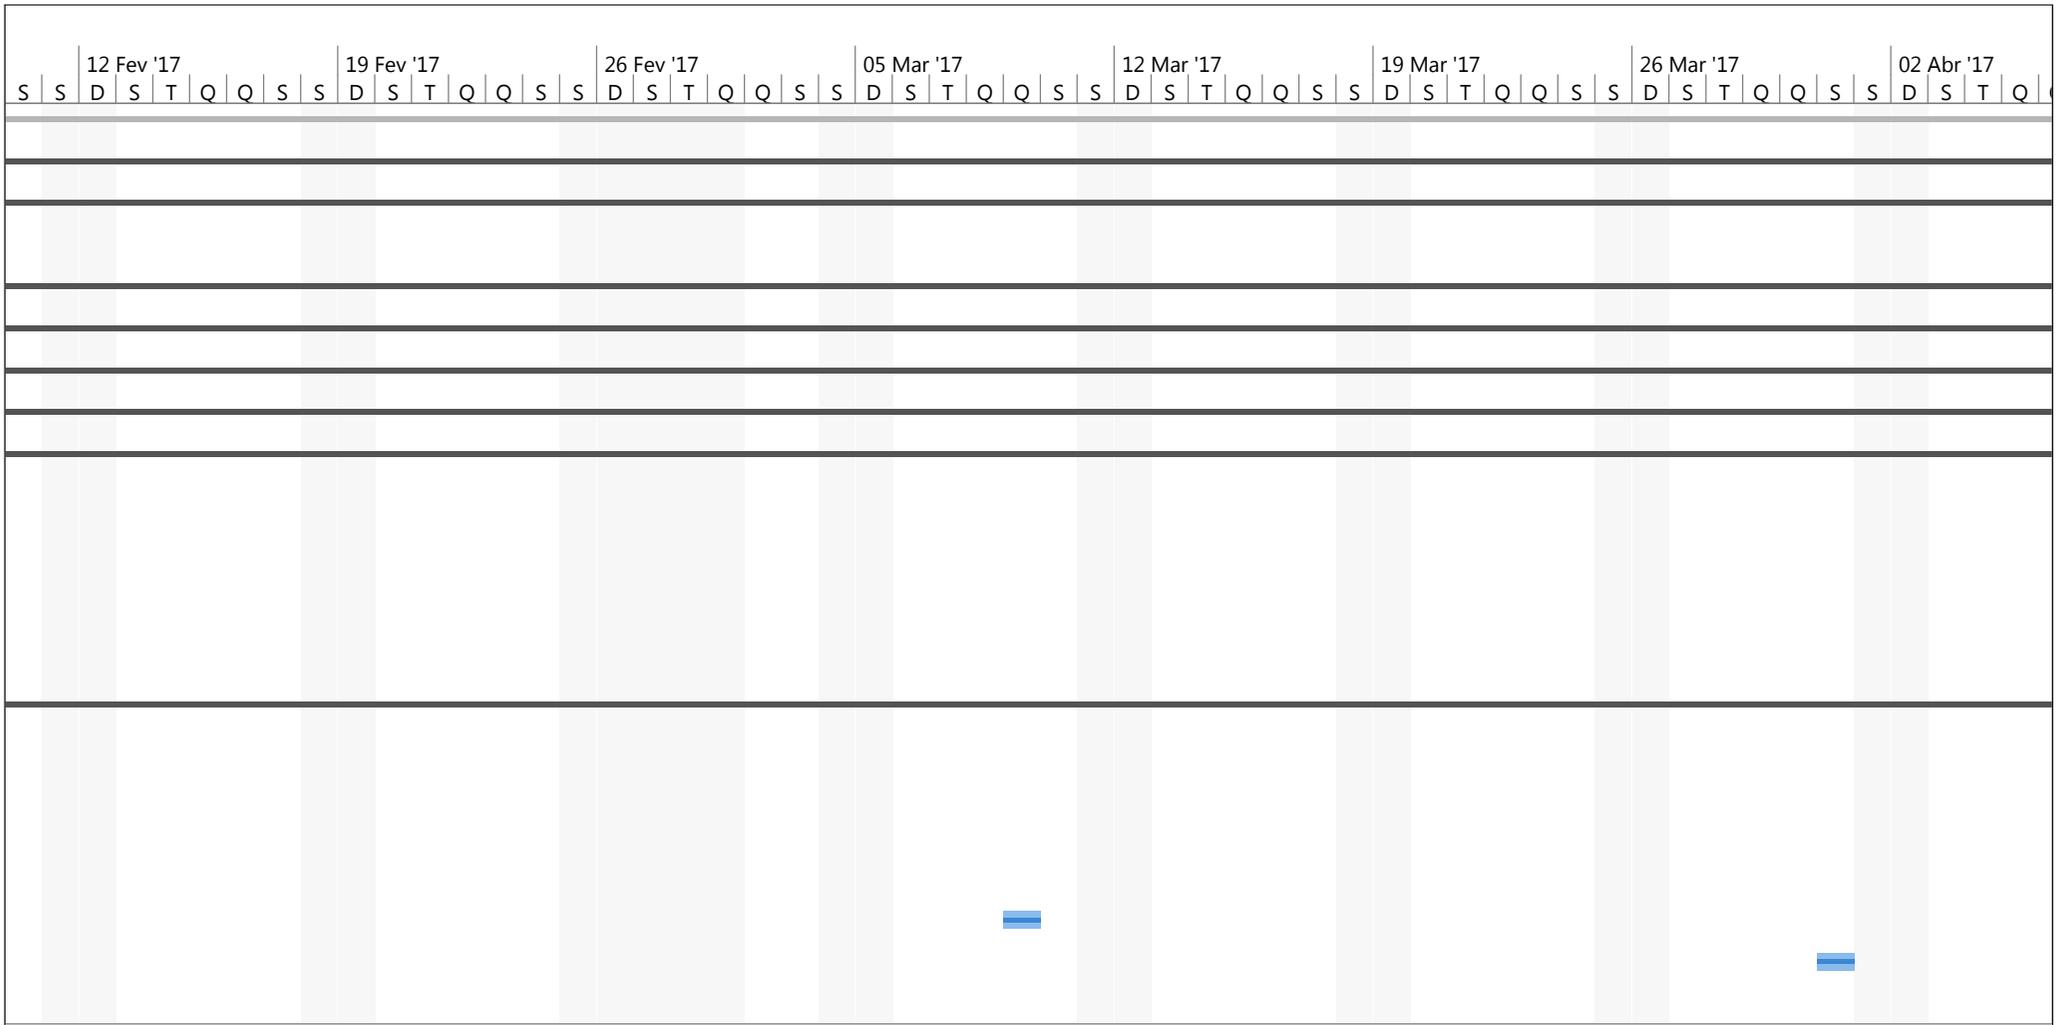


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

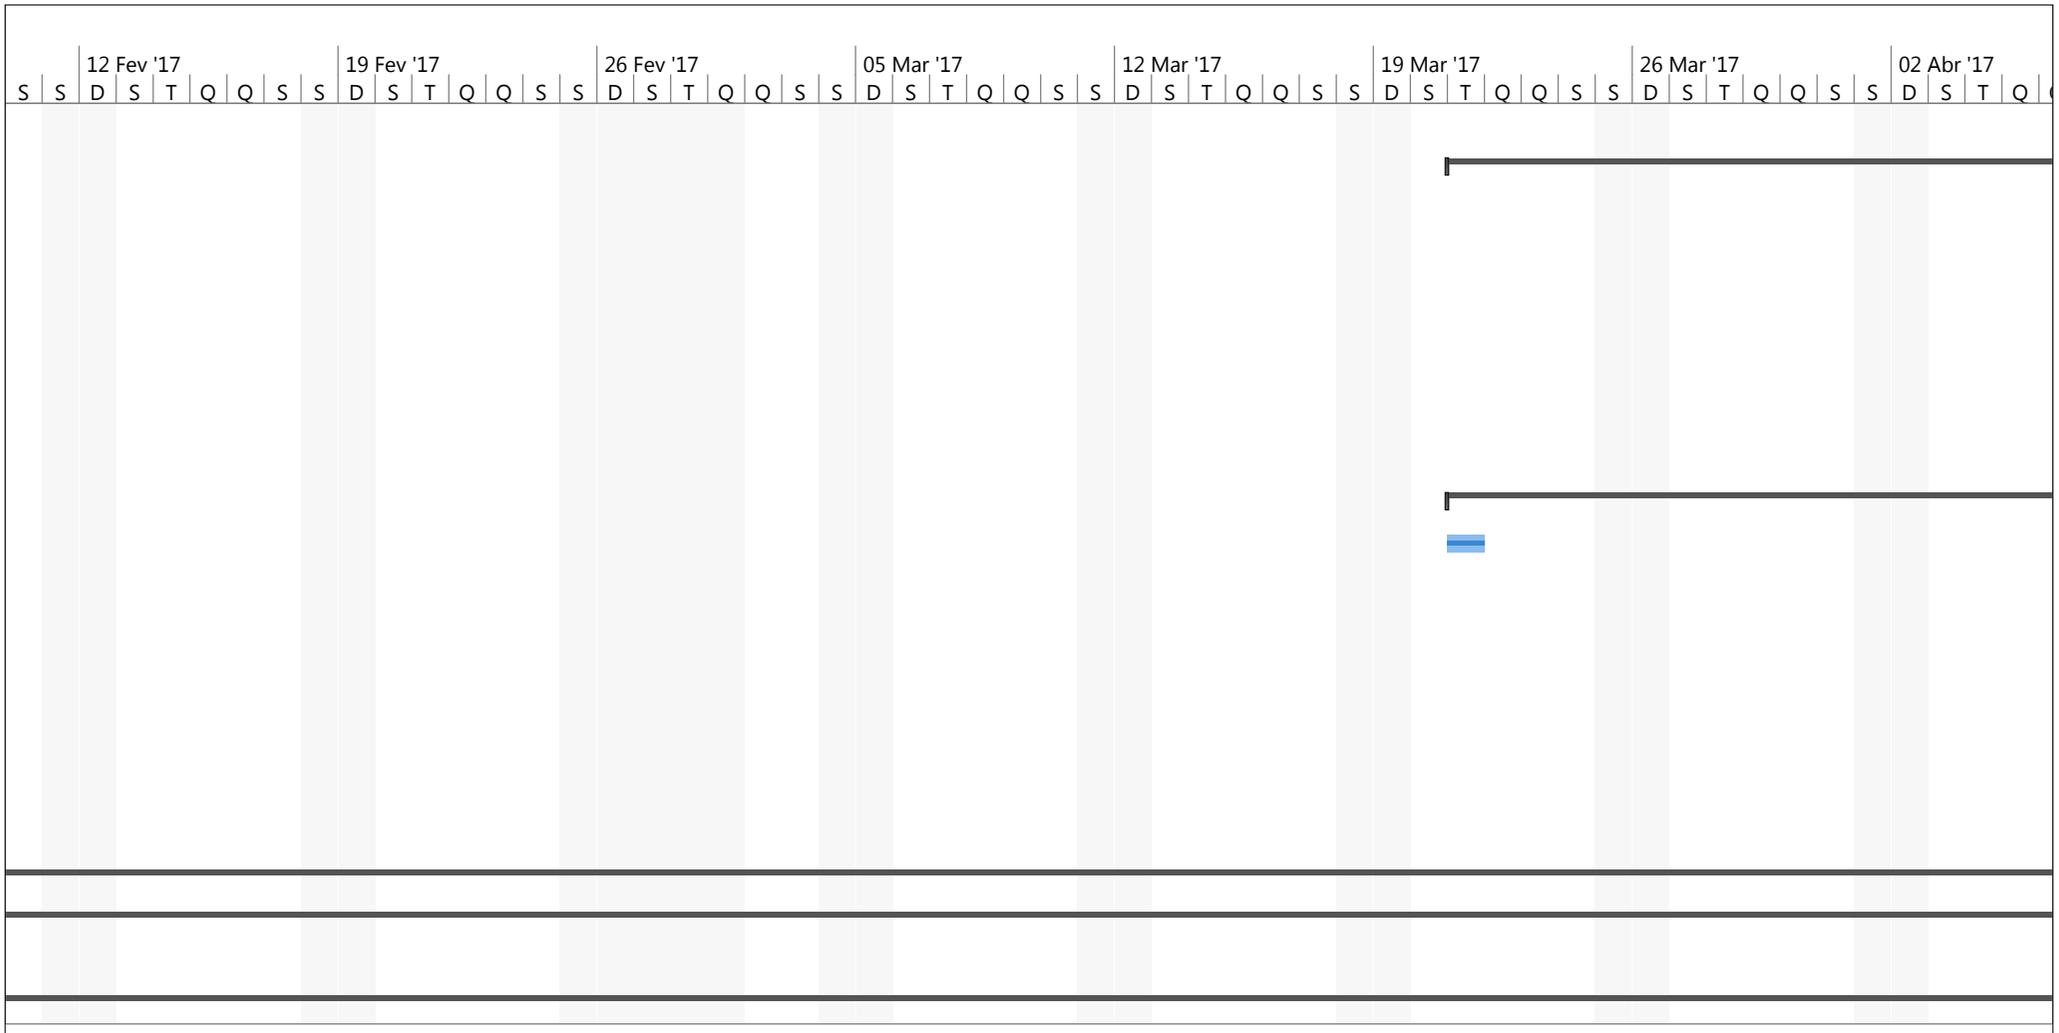


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


S S D S T Q Q S S 12 Fev '17 19 Fev '17 26 Fev '17 05 Mar '17 12 Mar '17 19 Mar '17 26 Mar '17 02 Abr '17

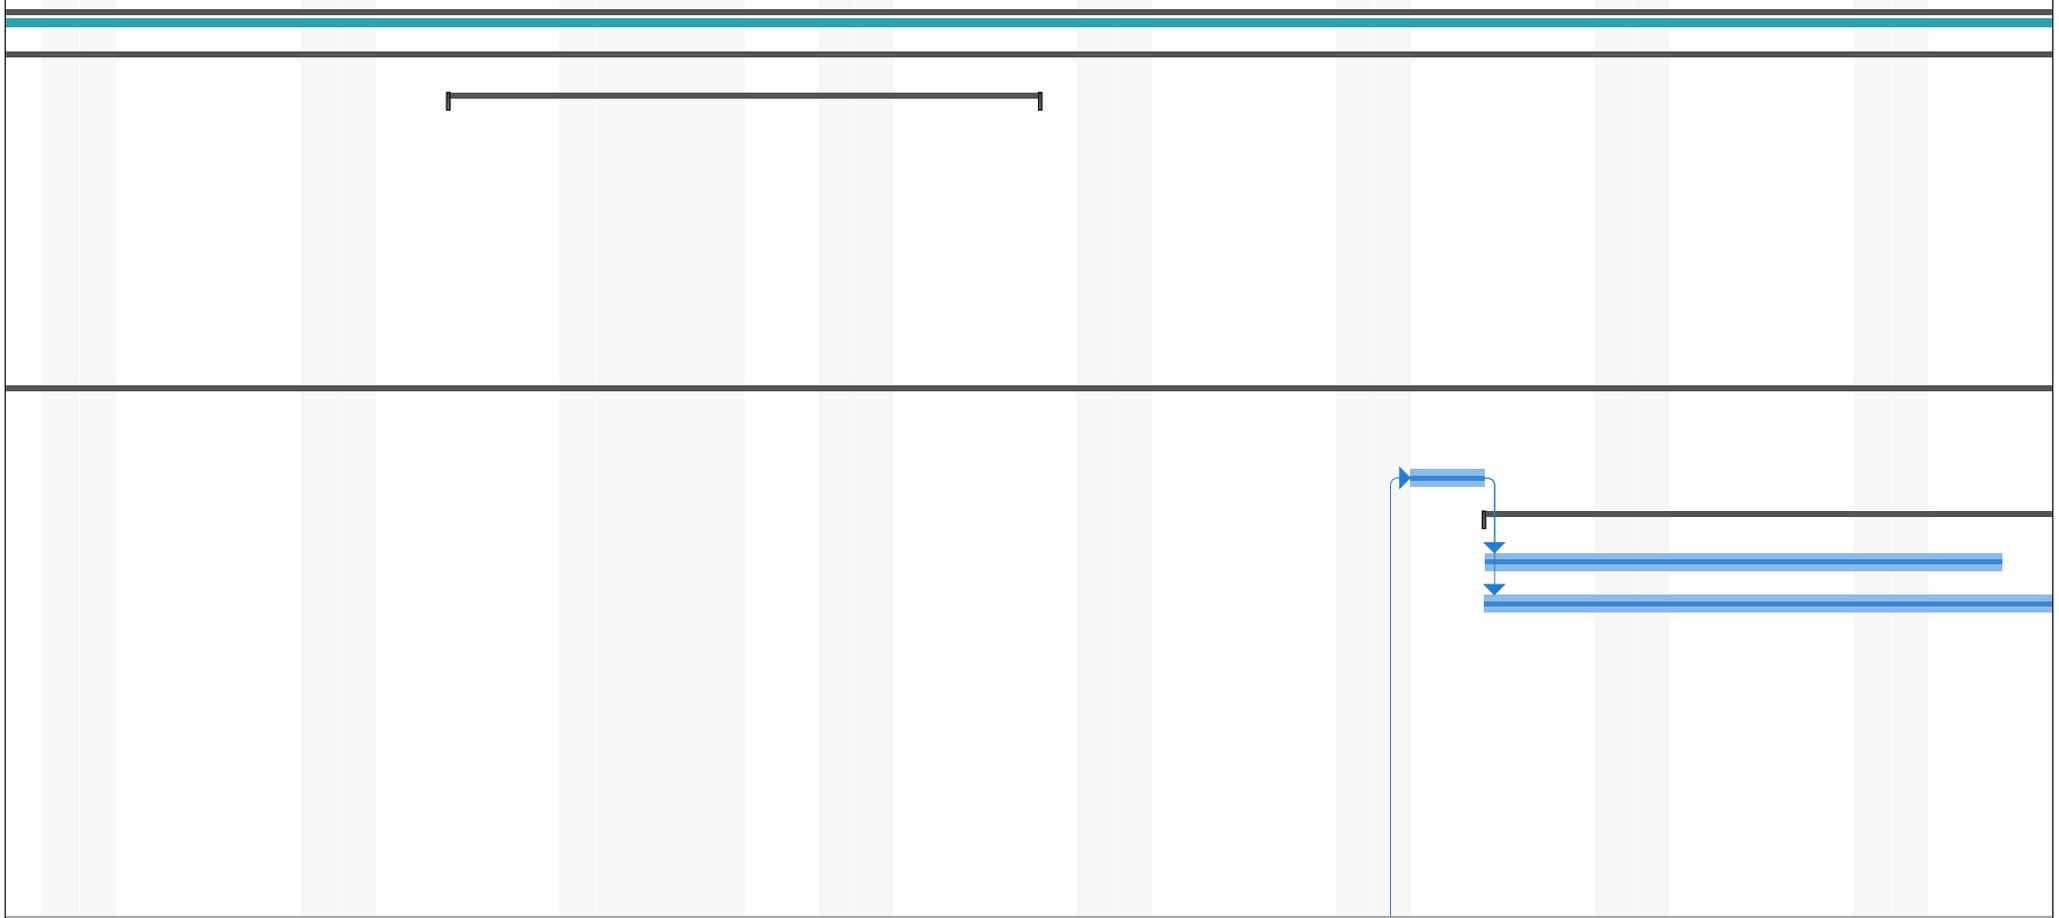


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

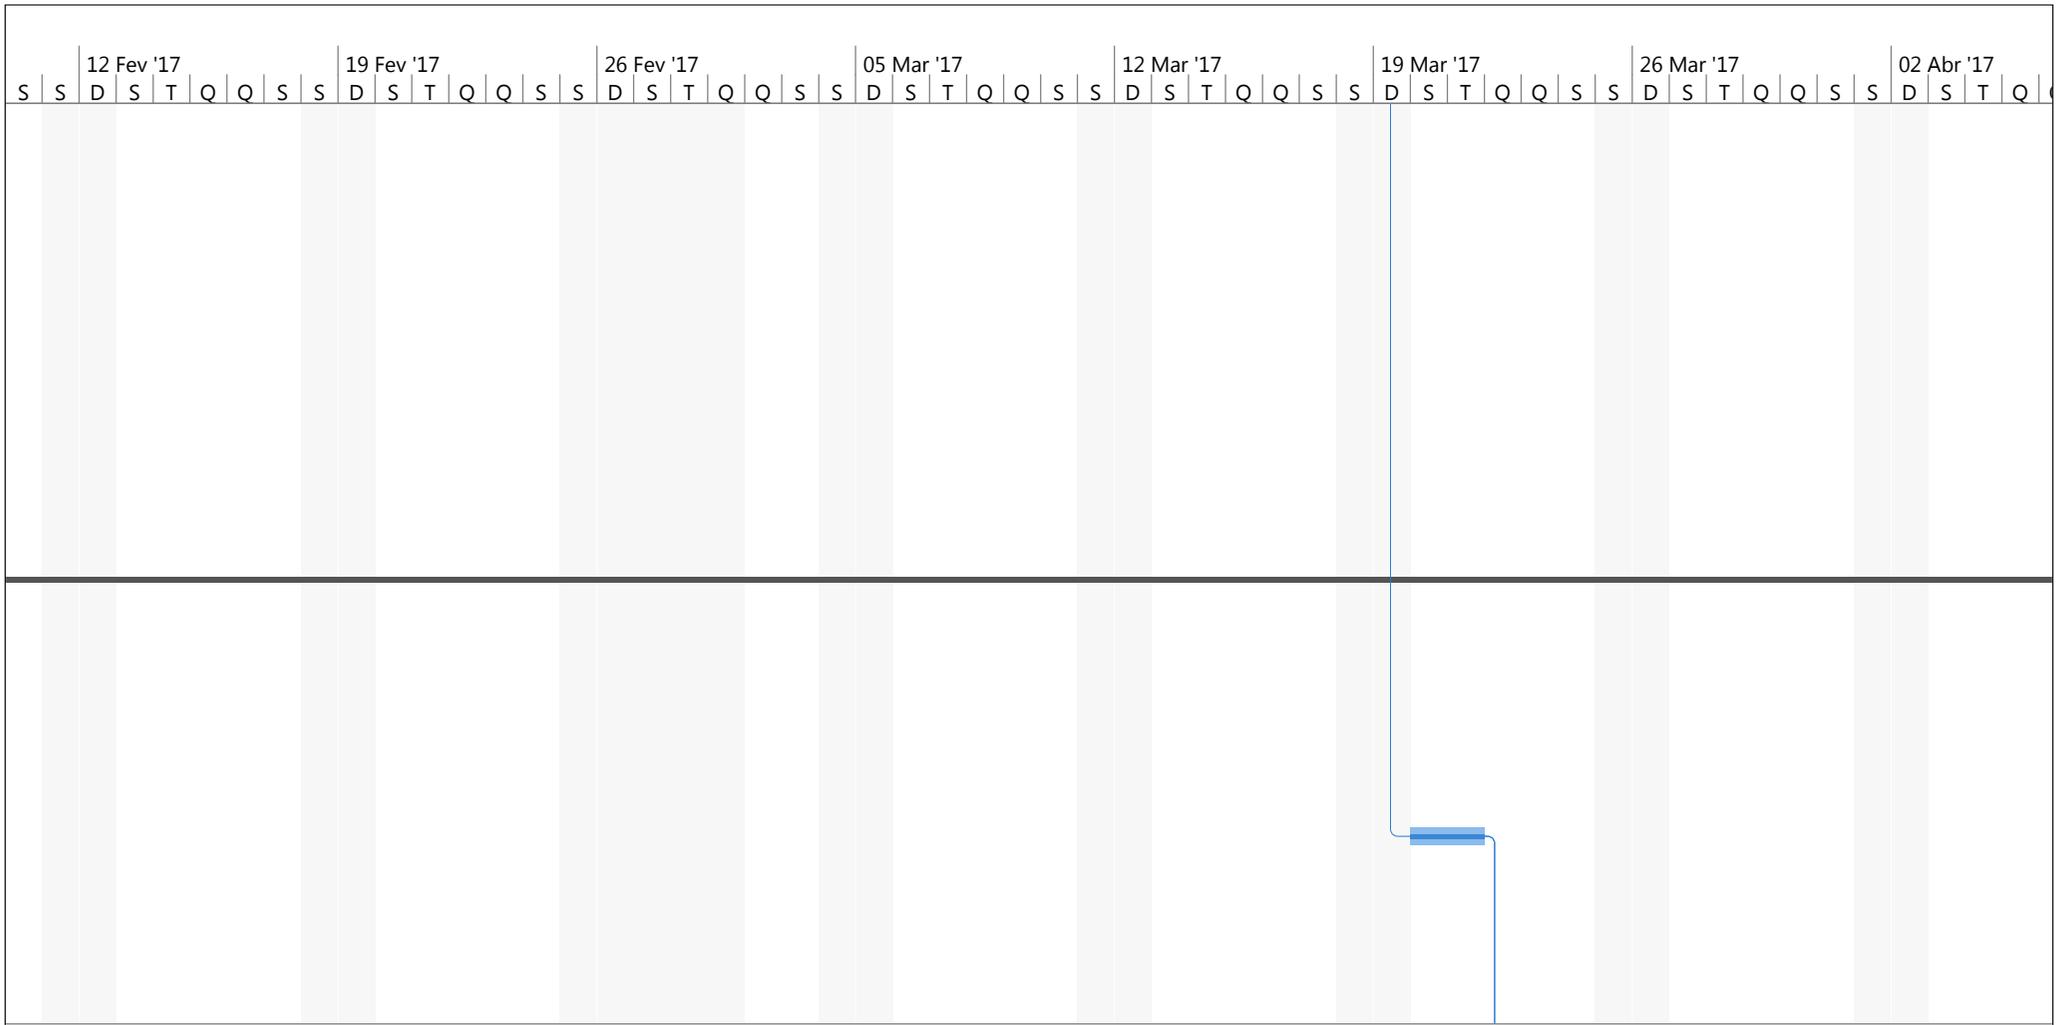


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

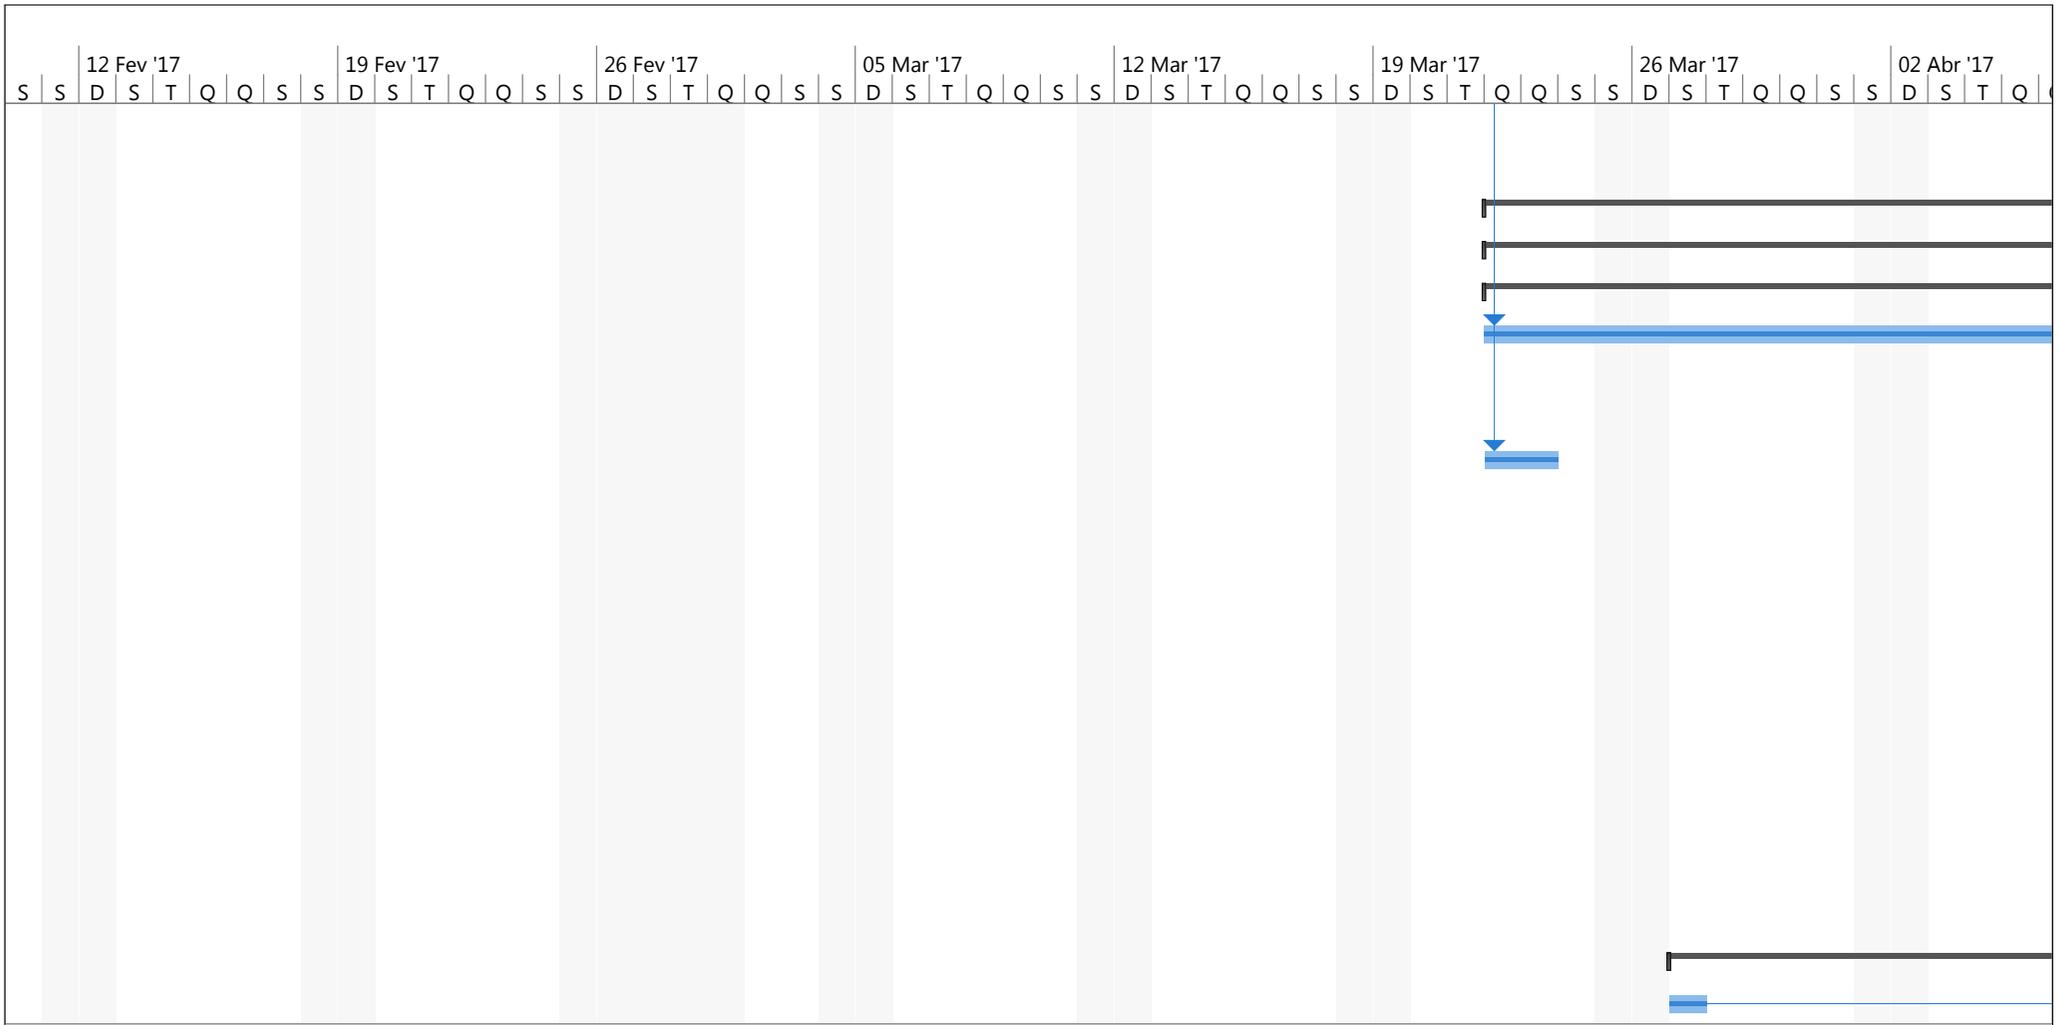

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

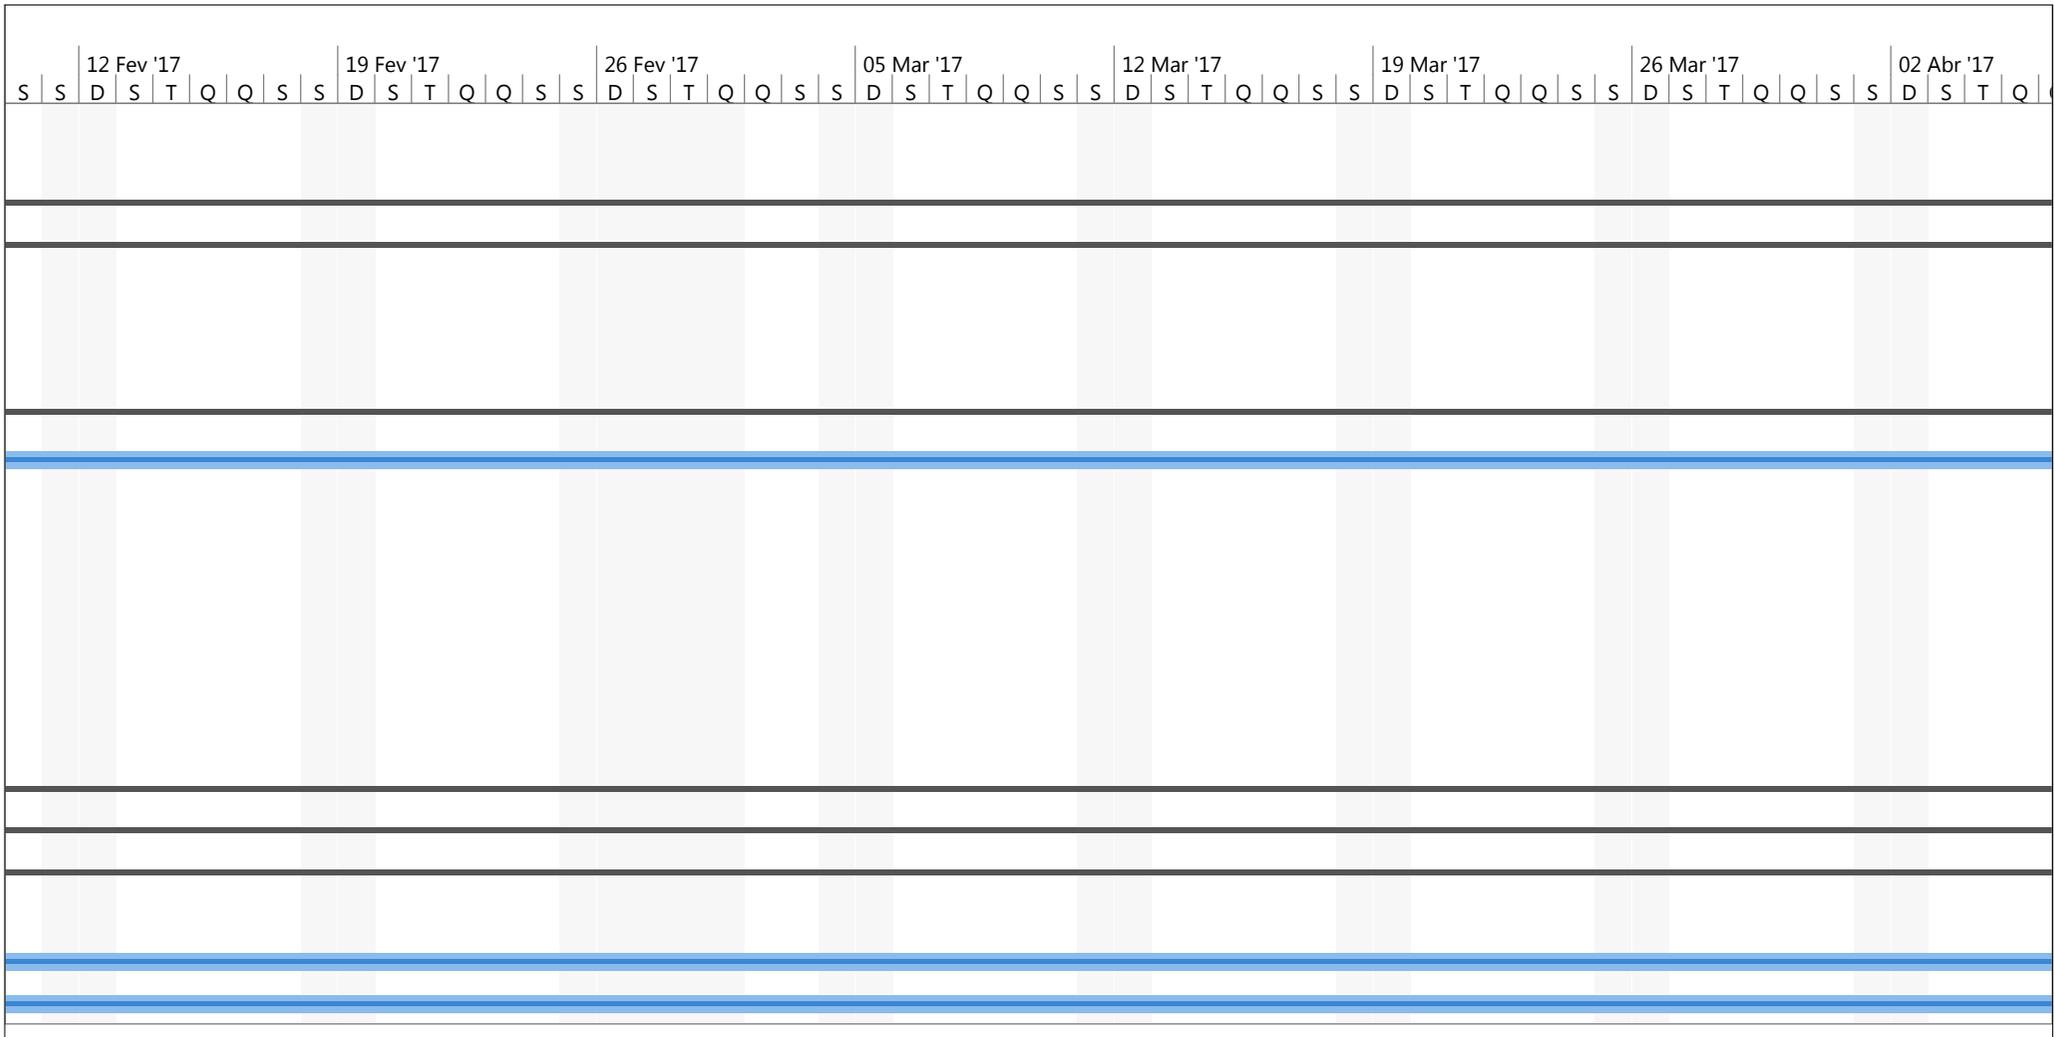


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

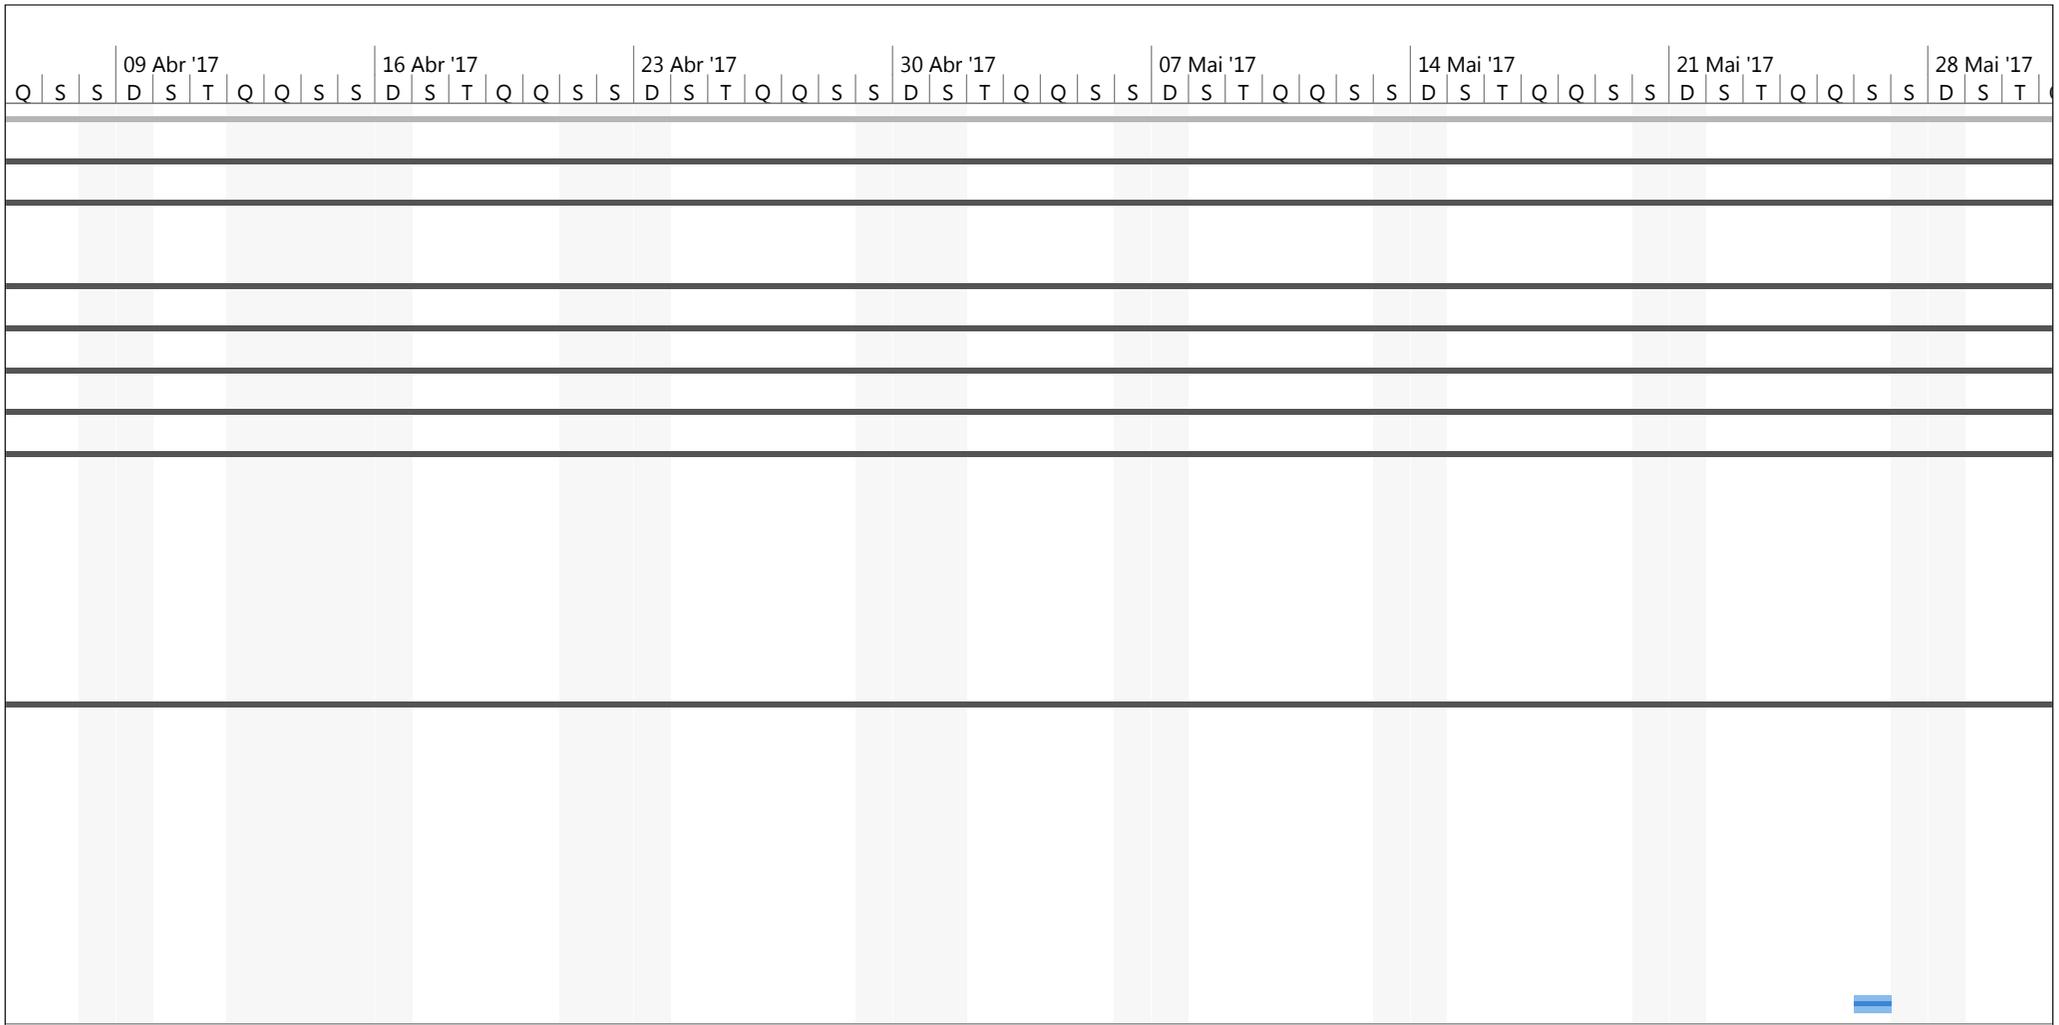


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

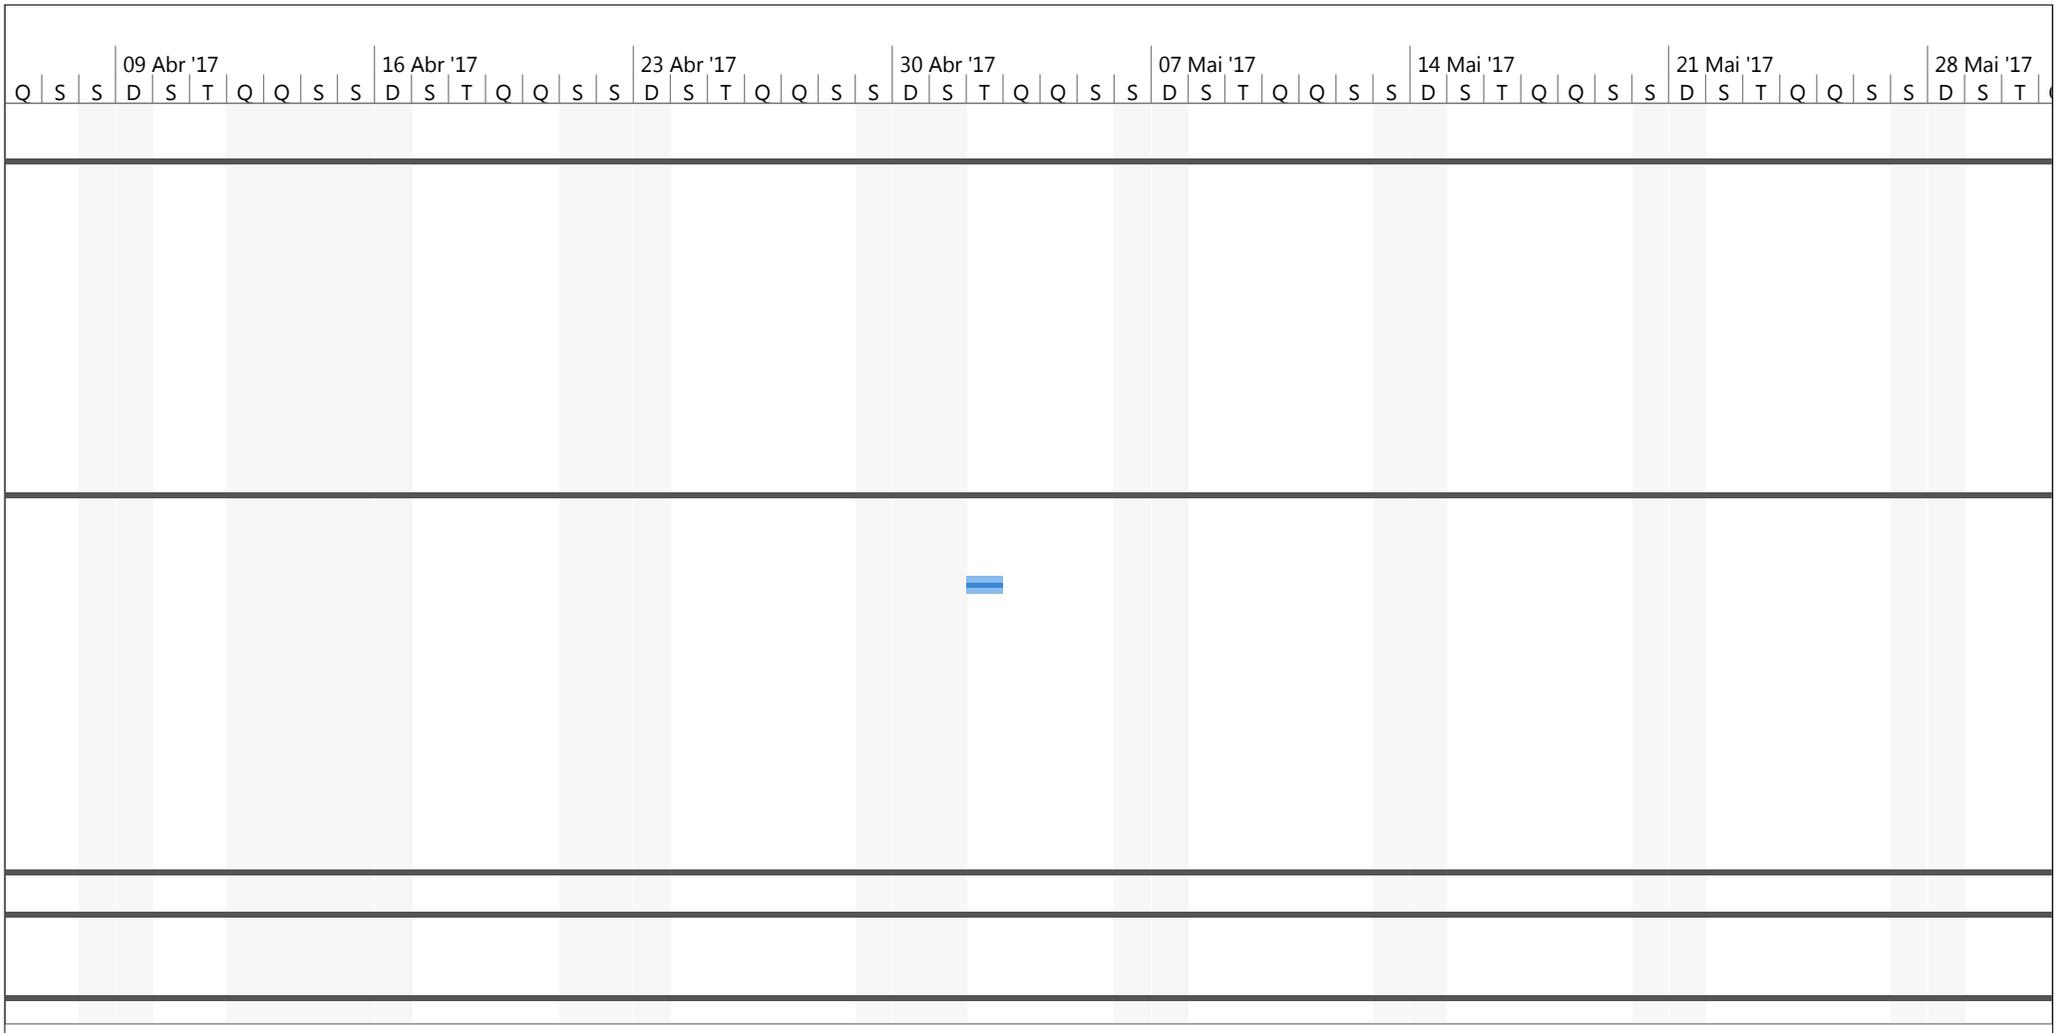


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

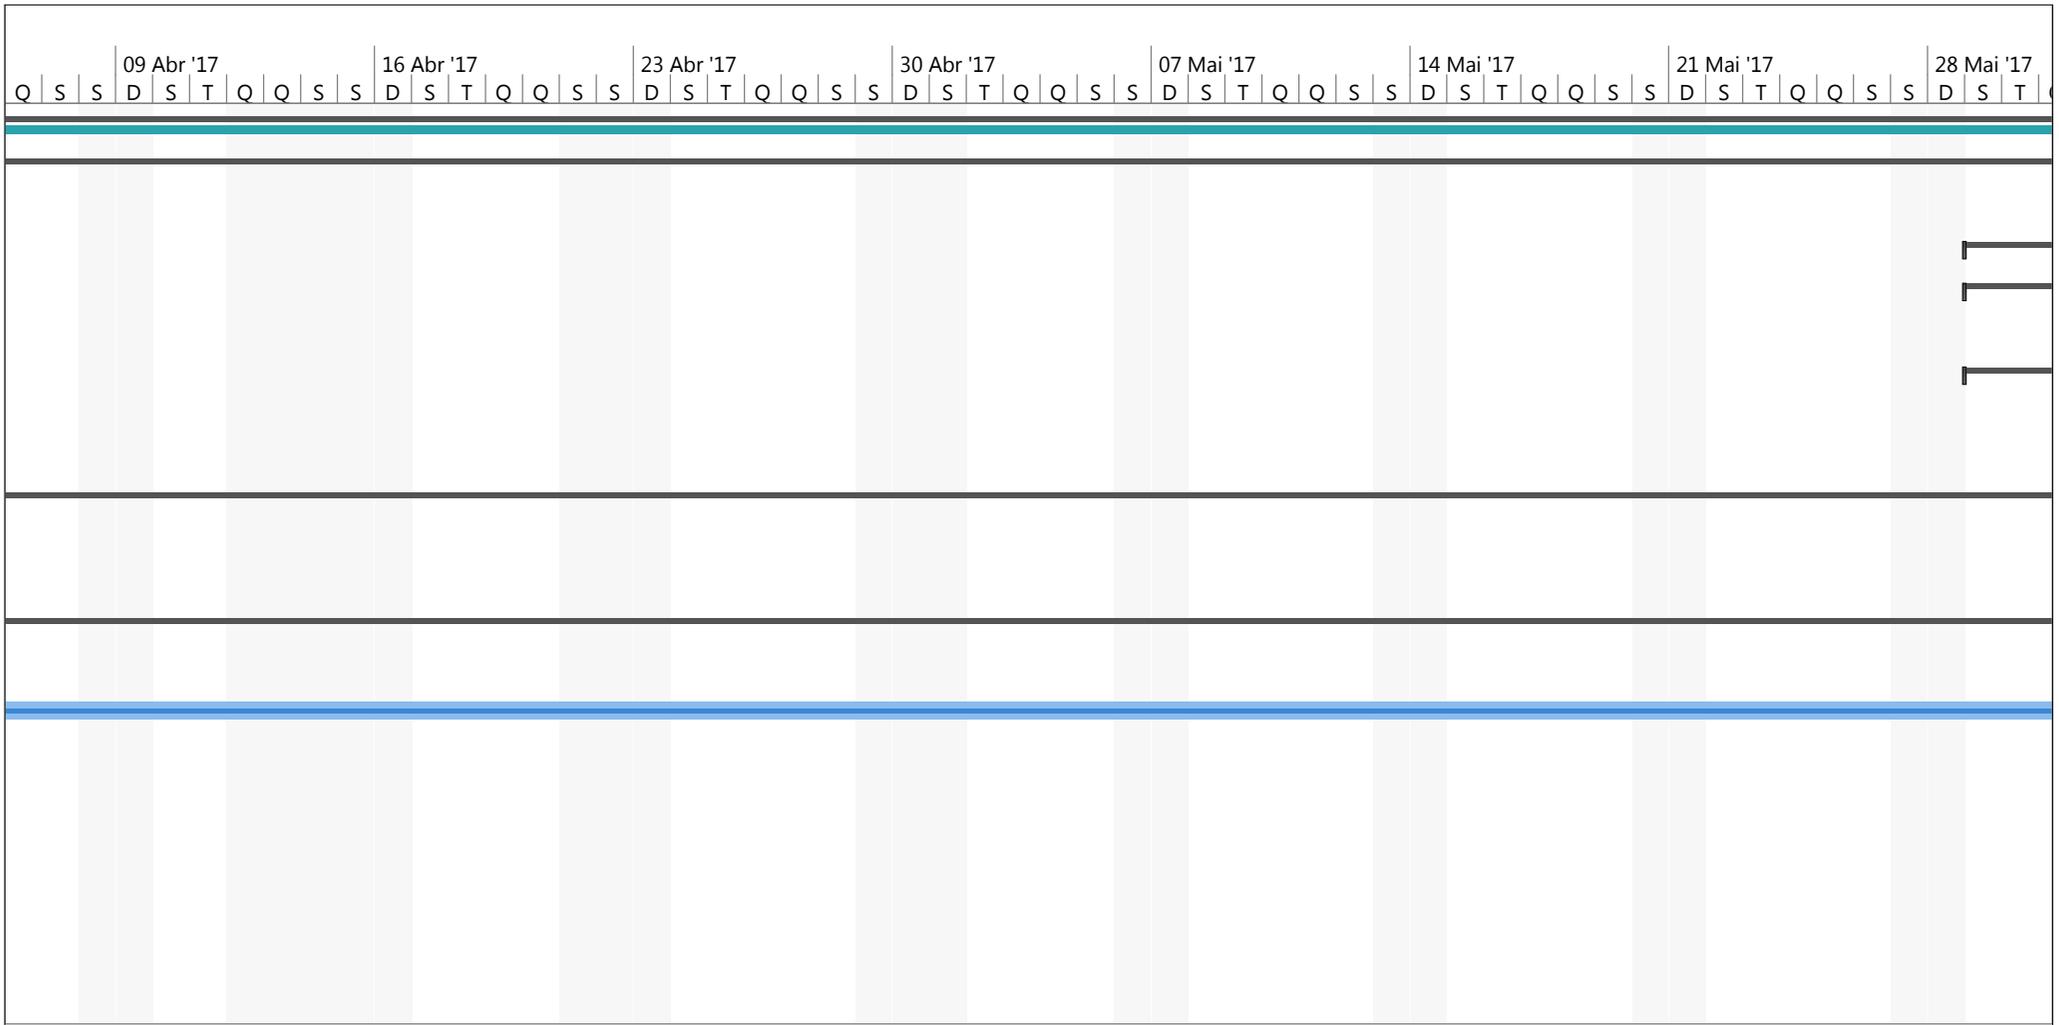


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

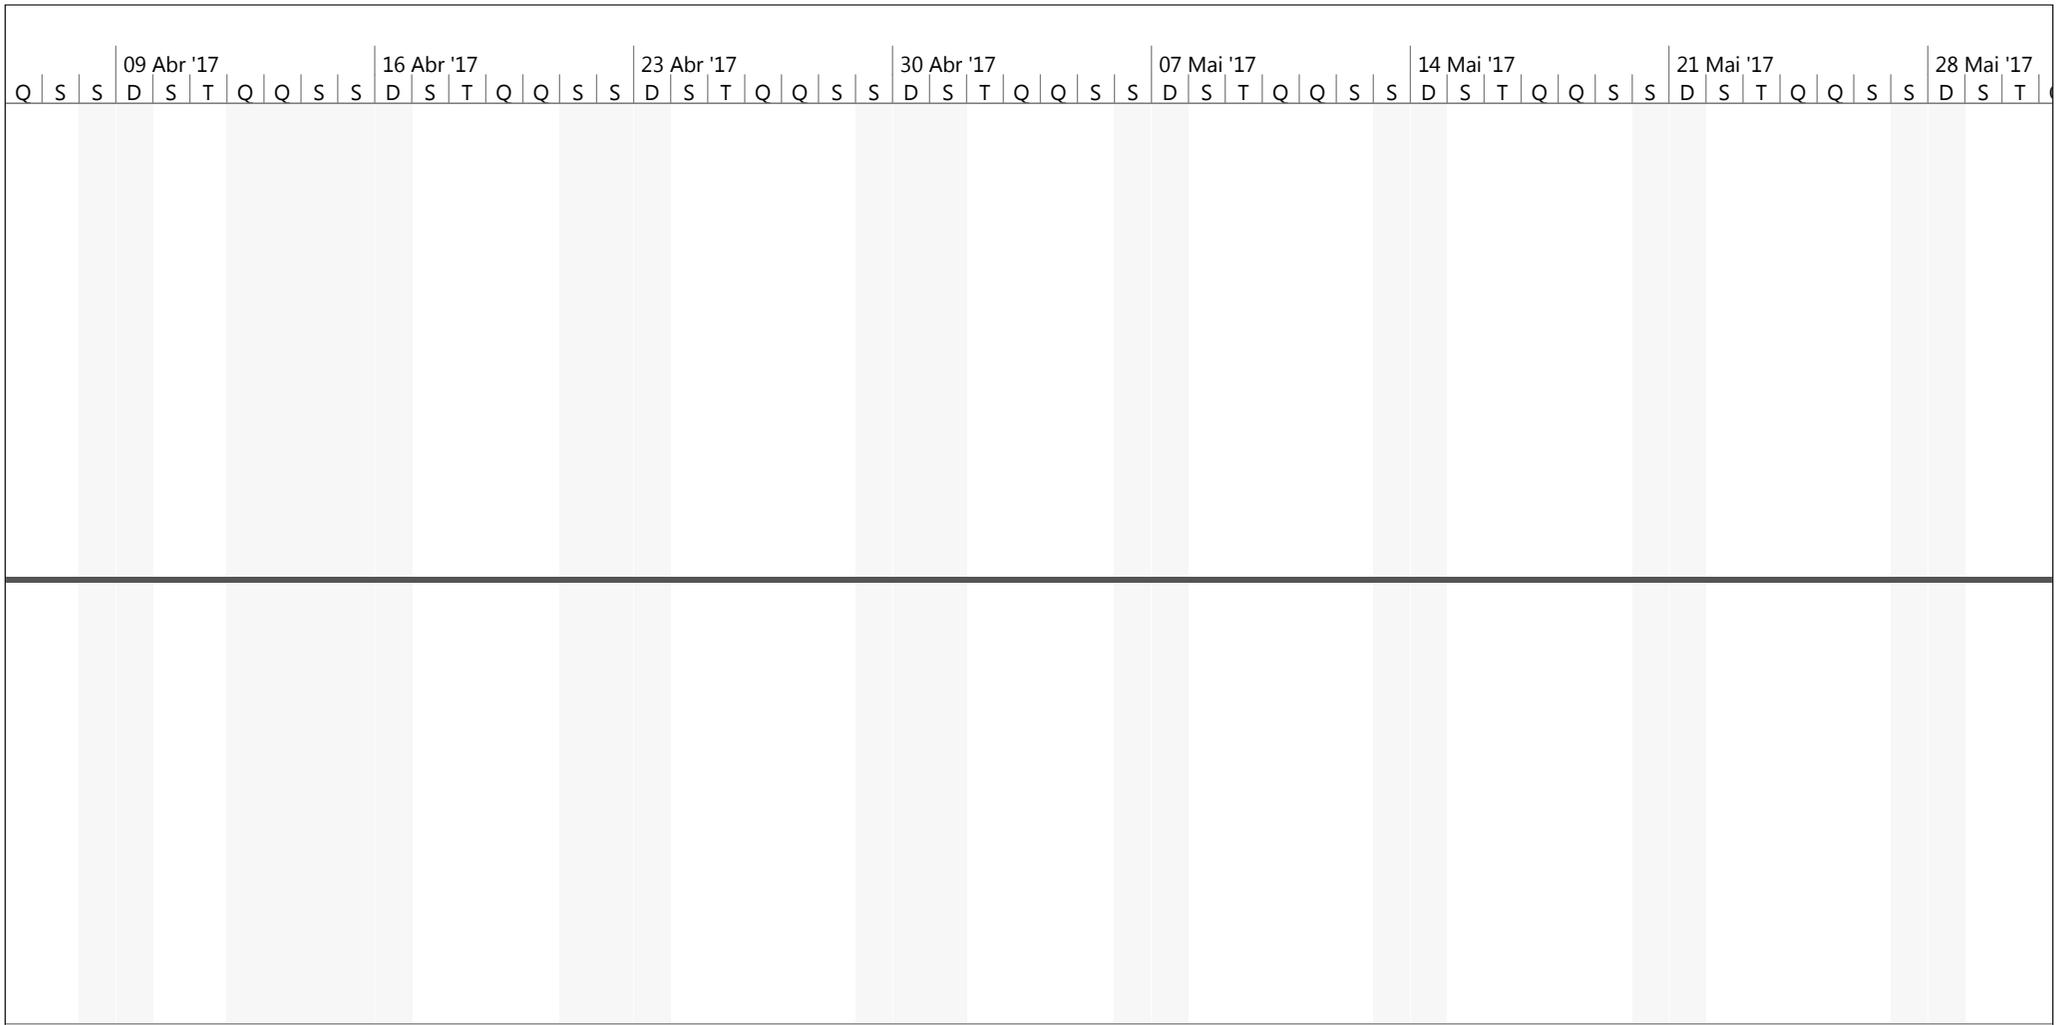

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

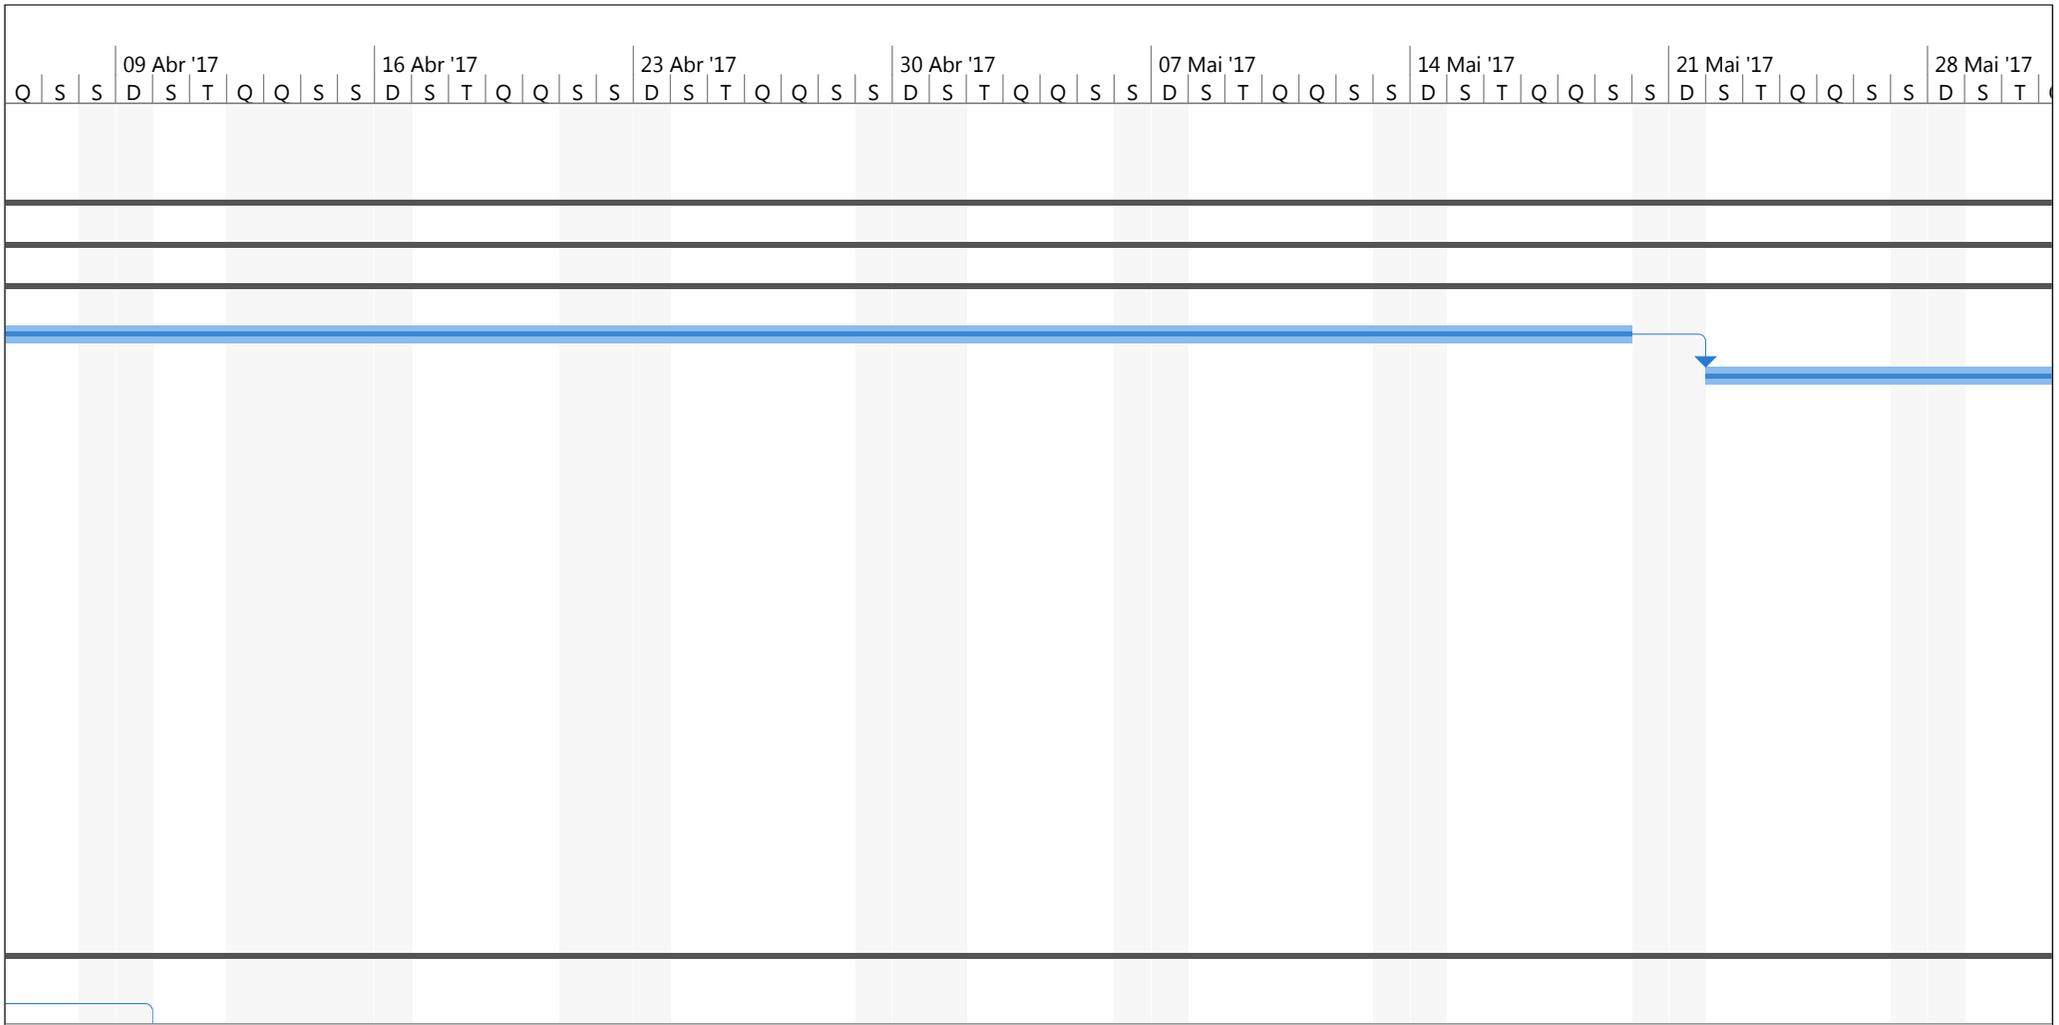


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

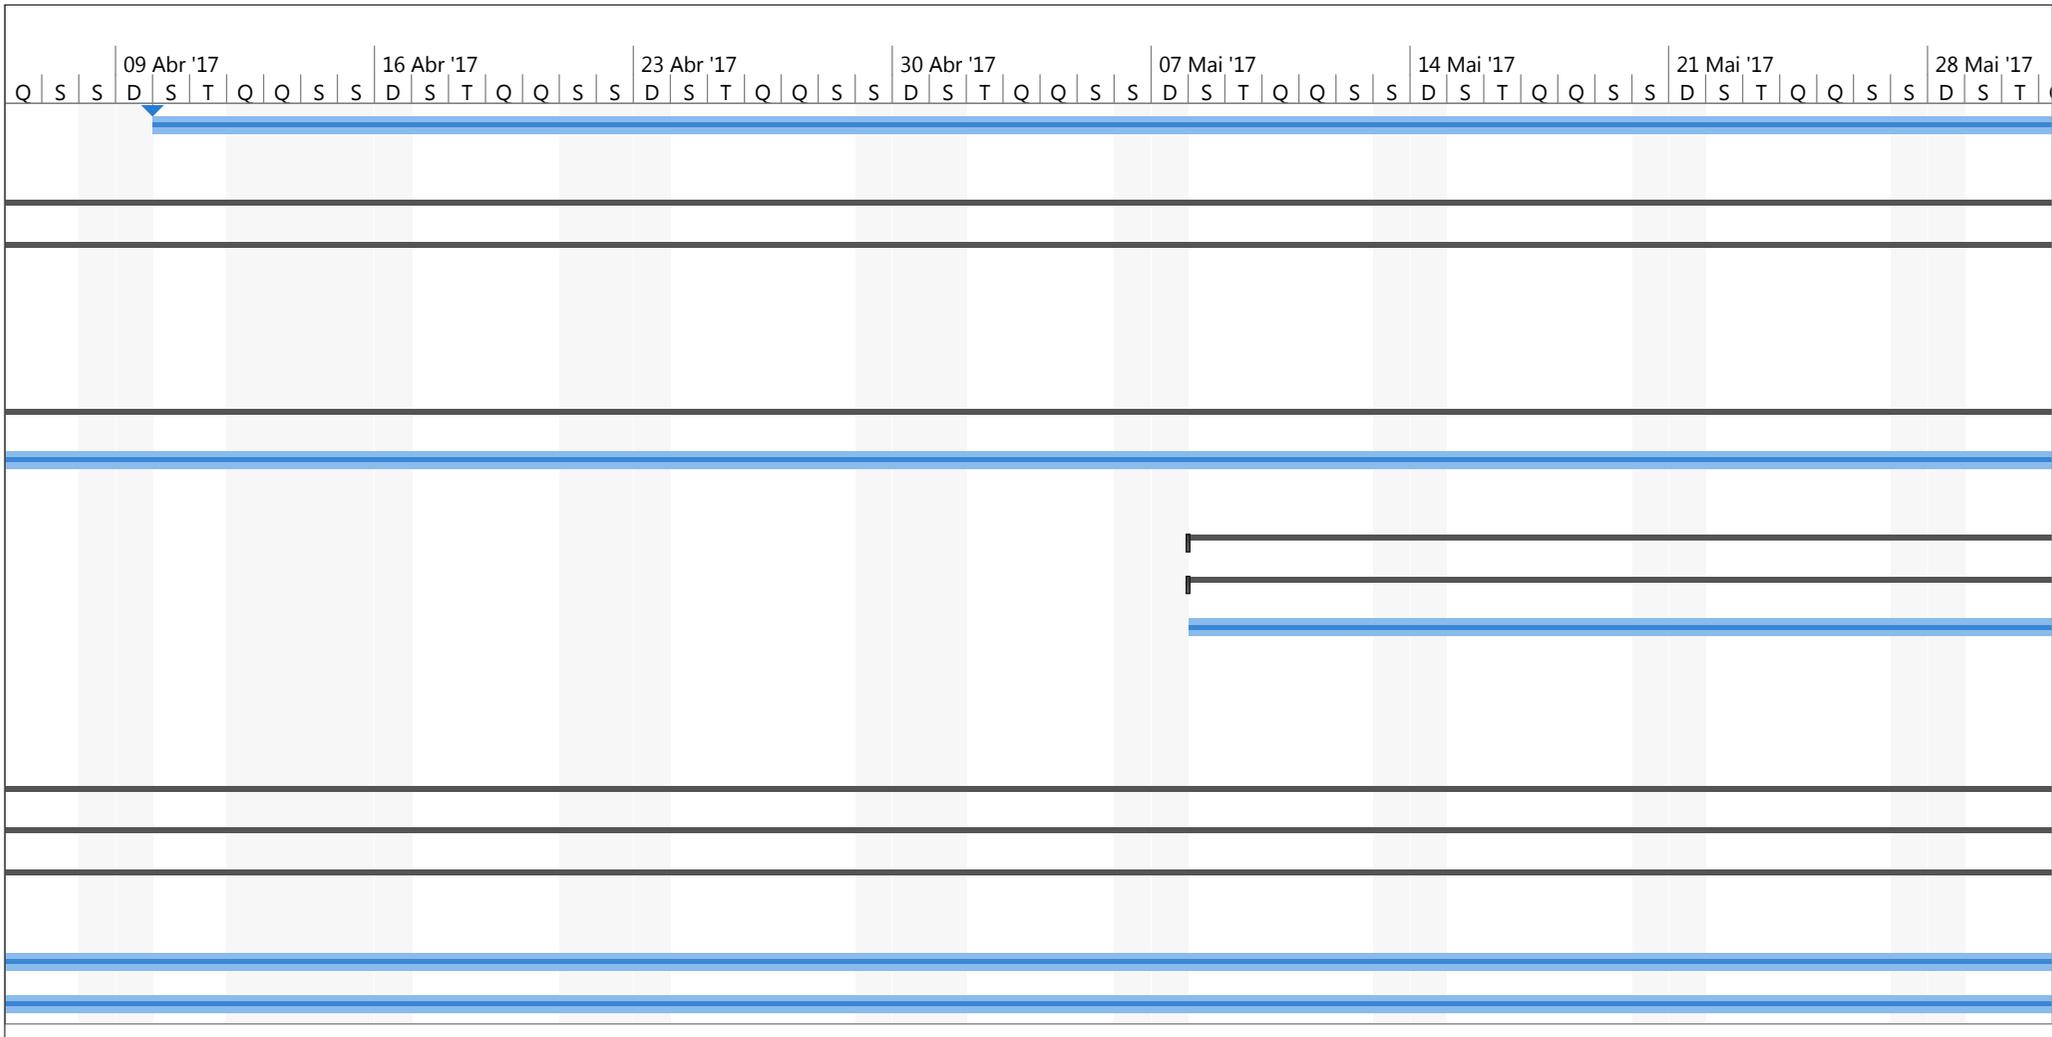


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

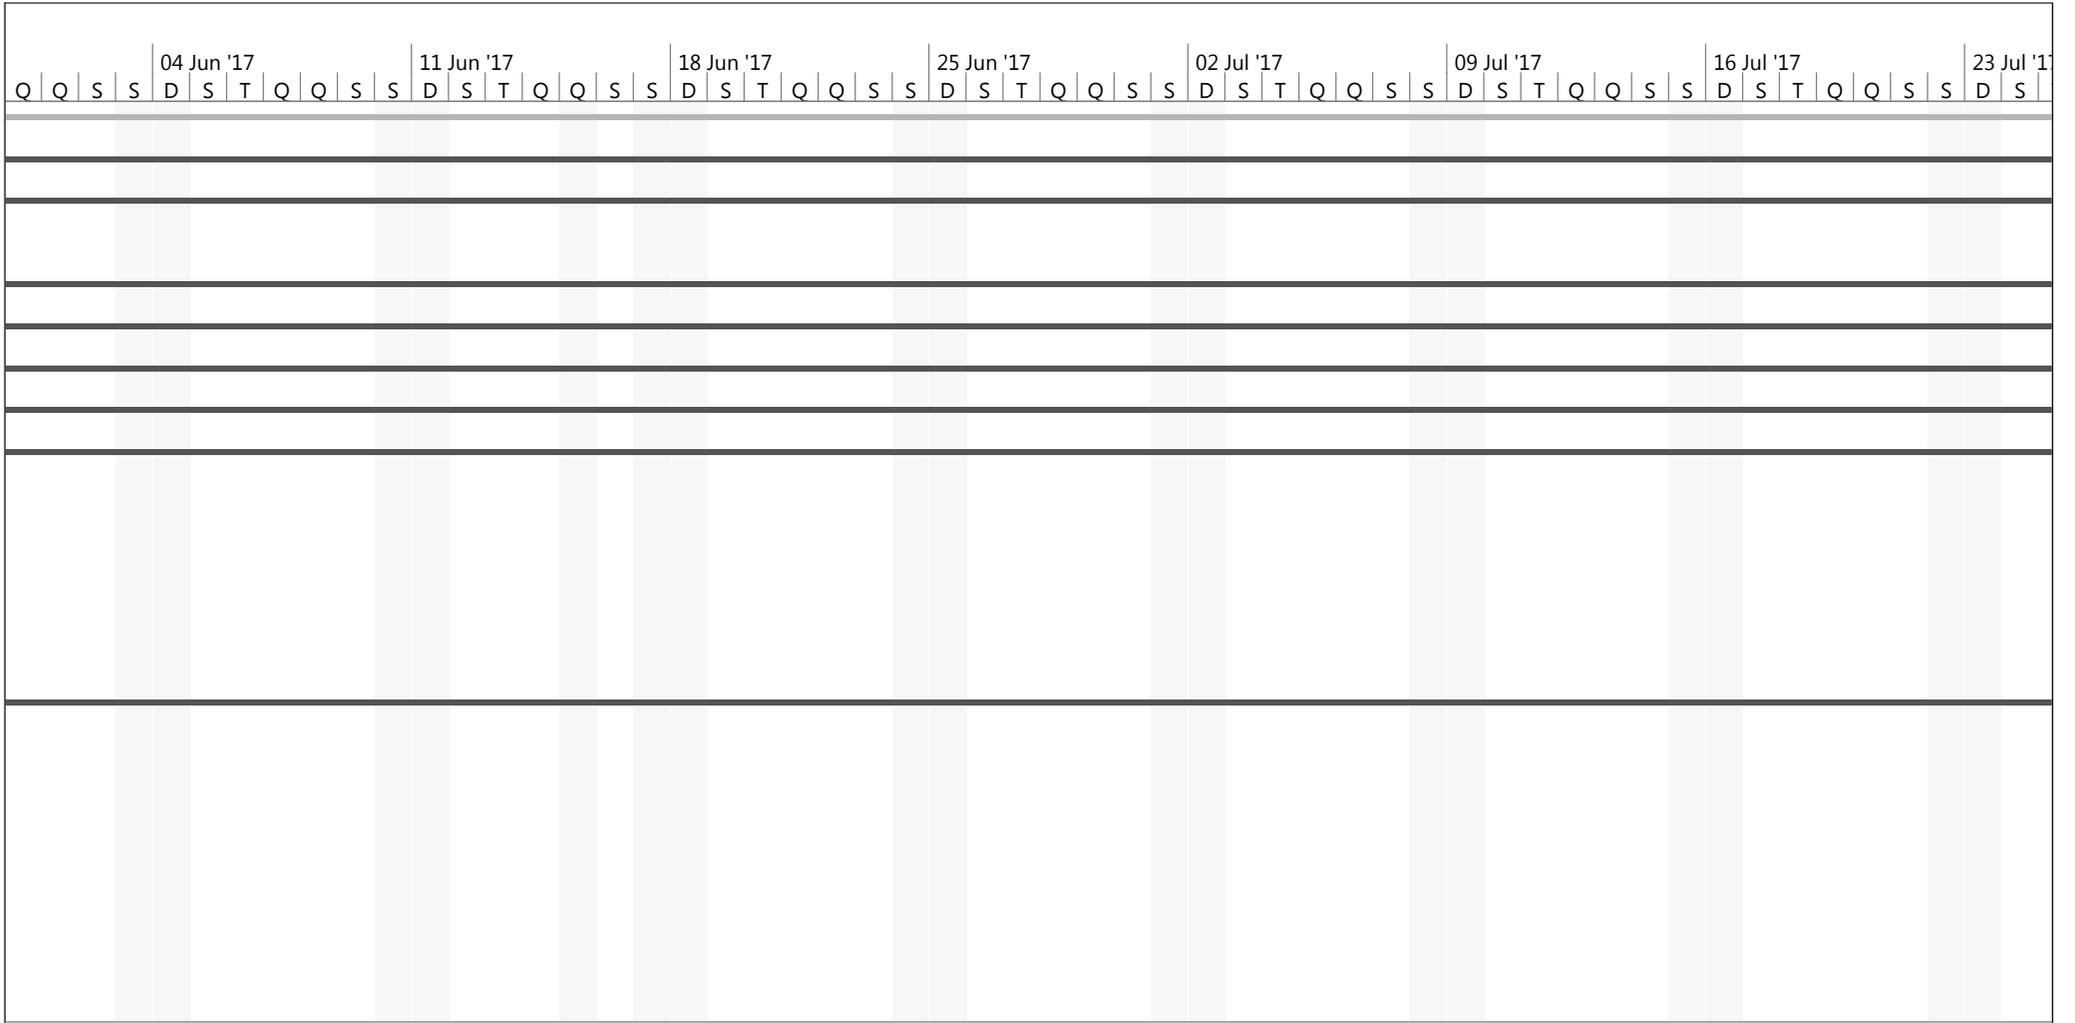

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

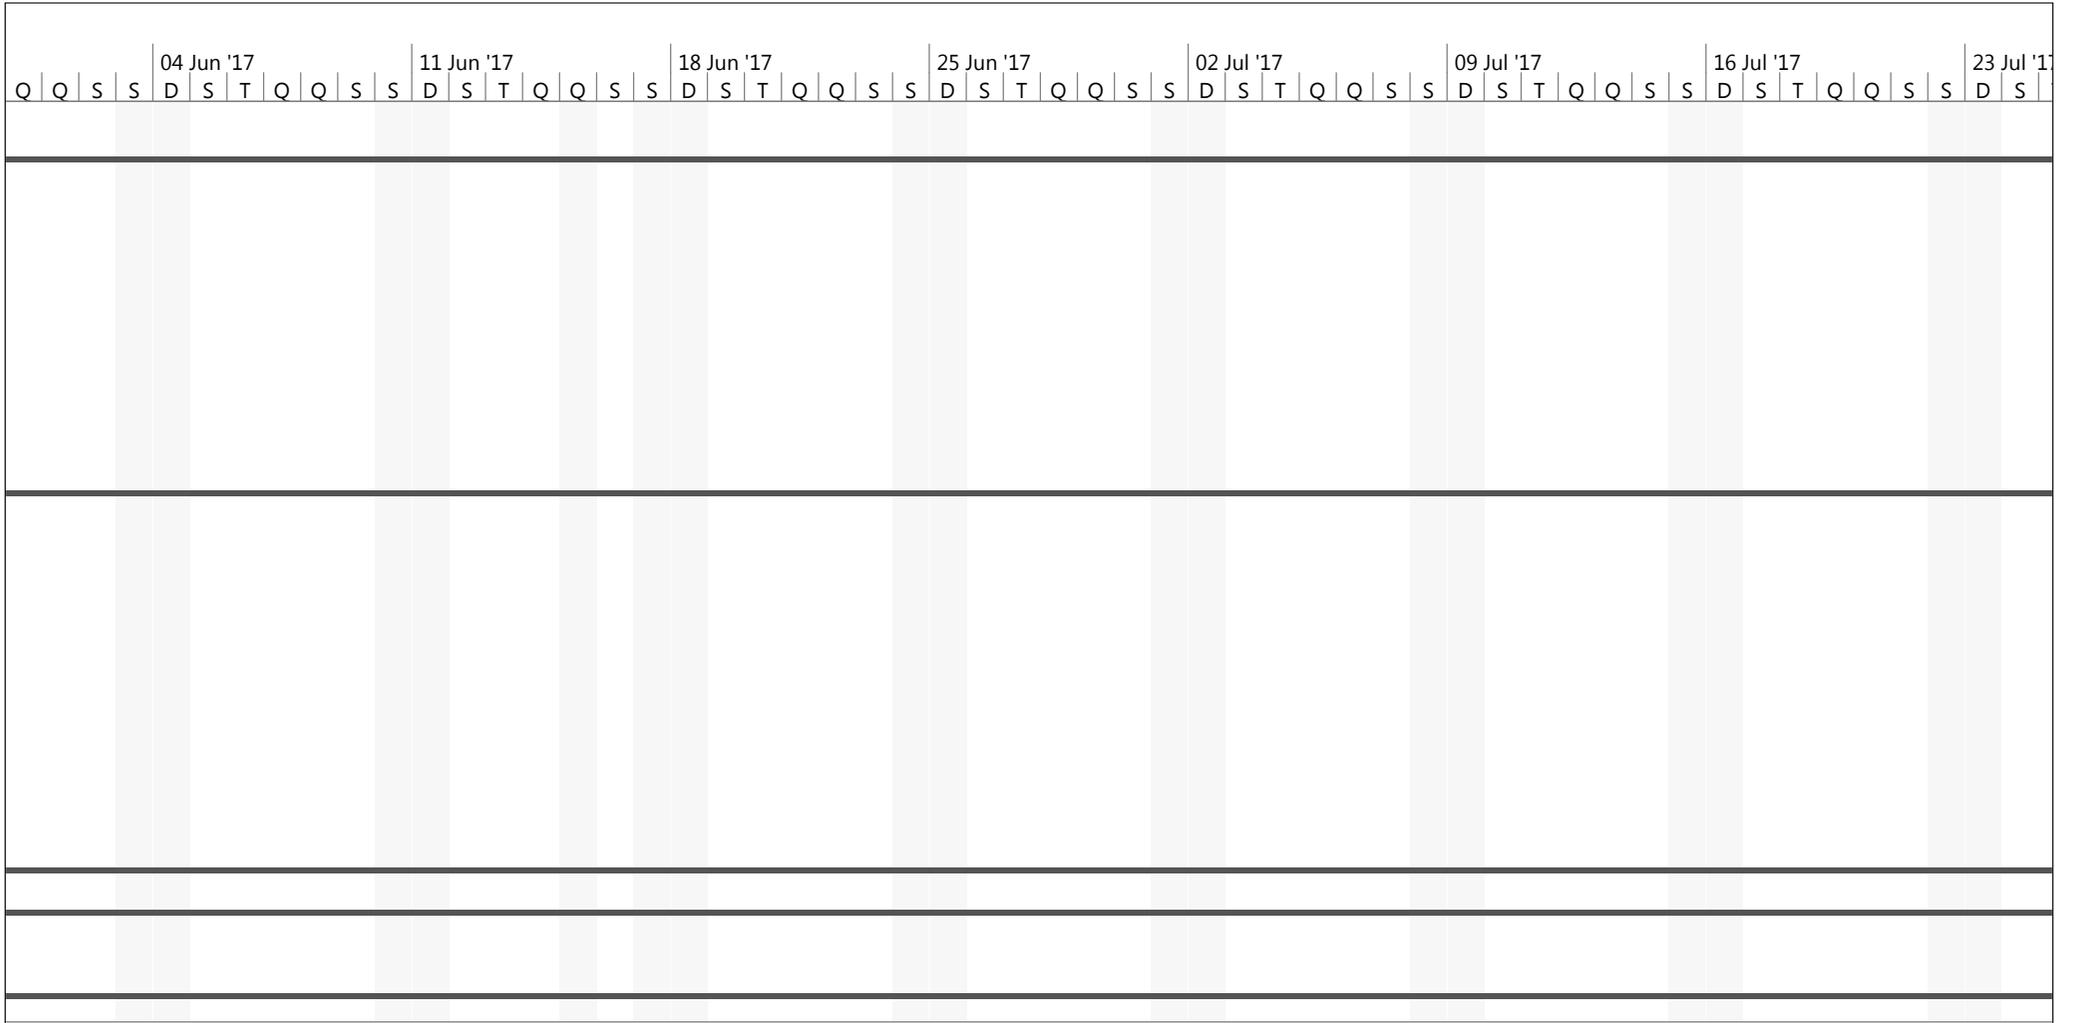


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

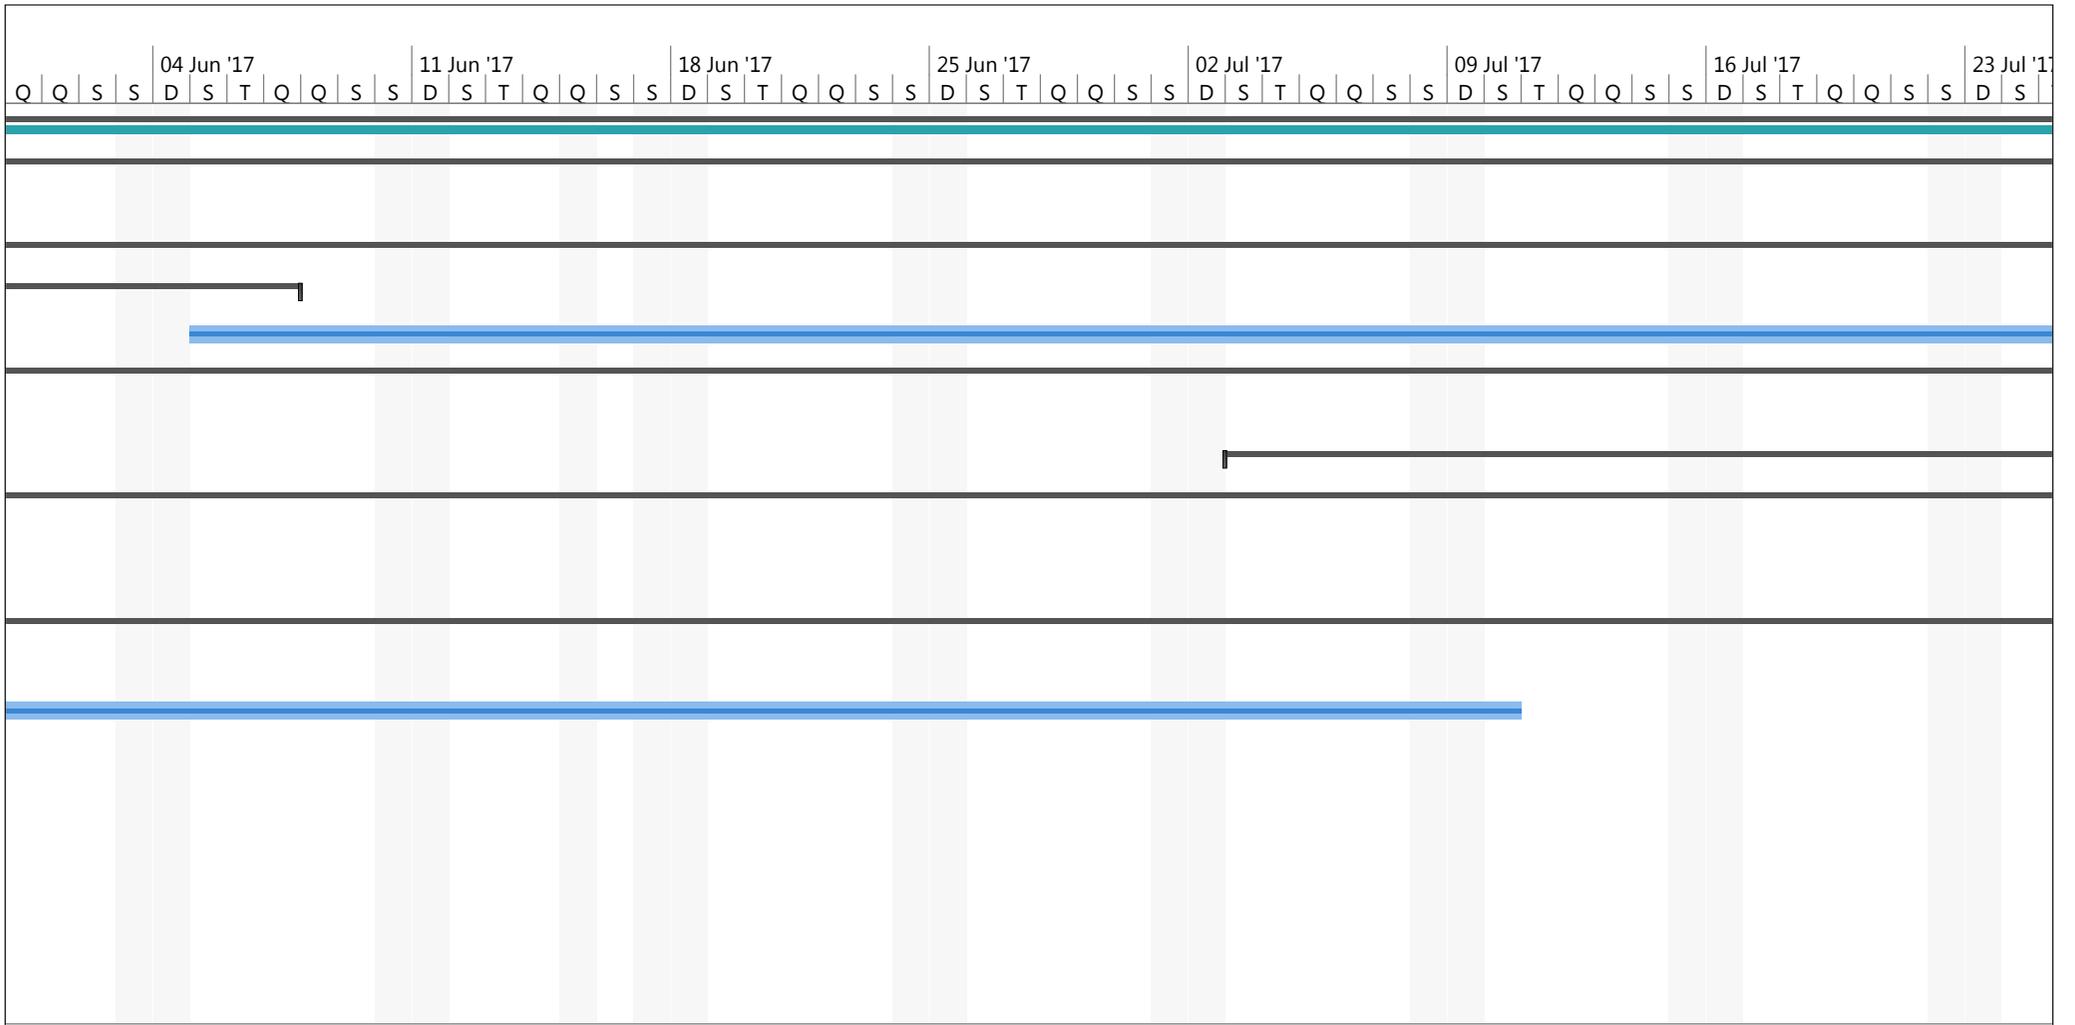


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				



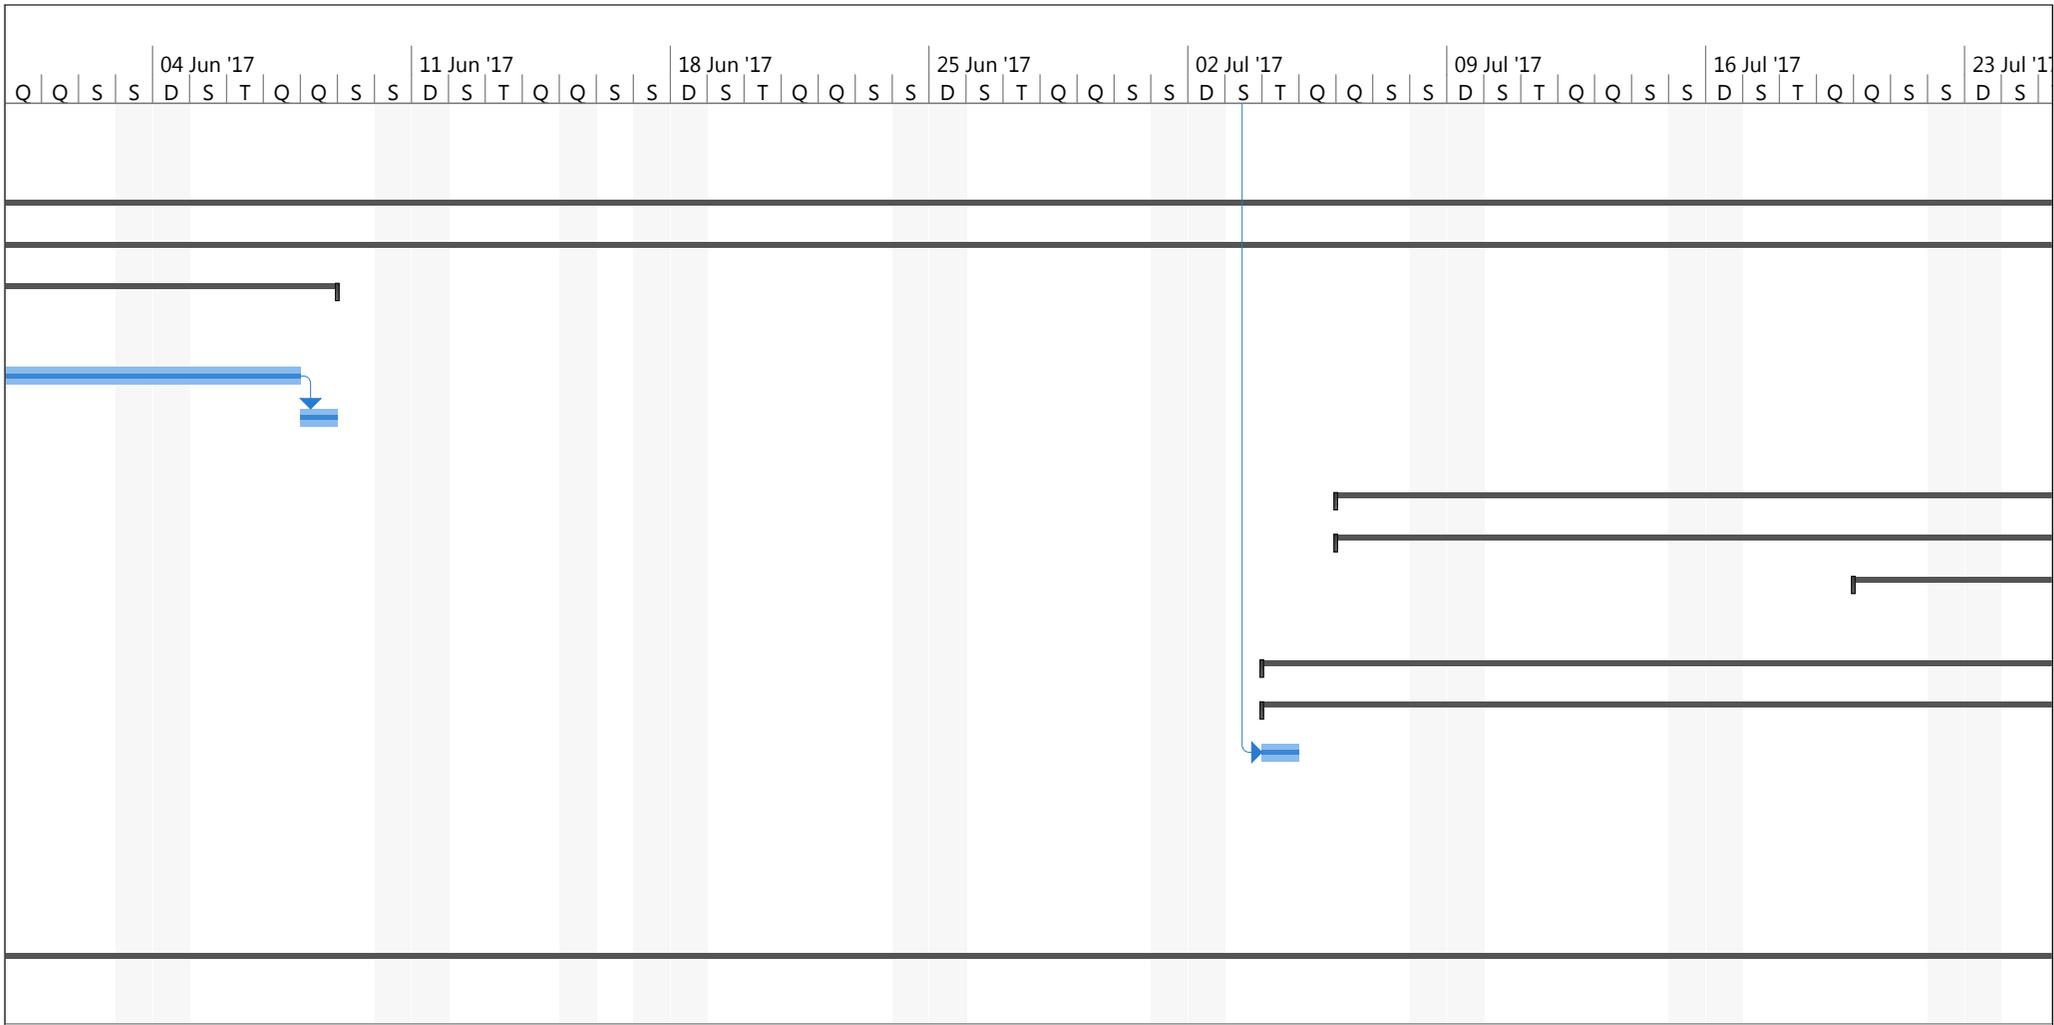


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

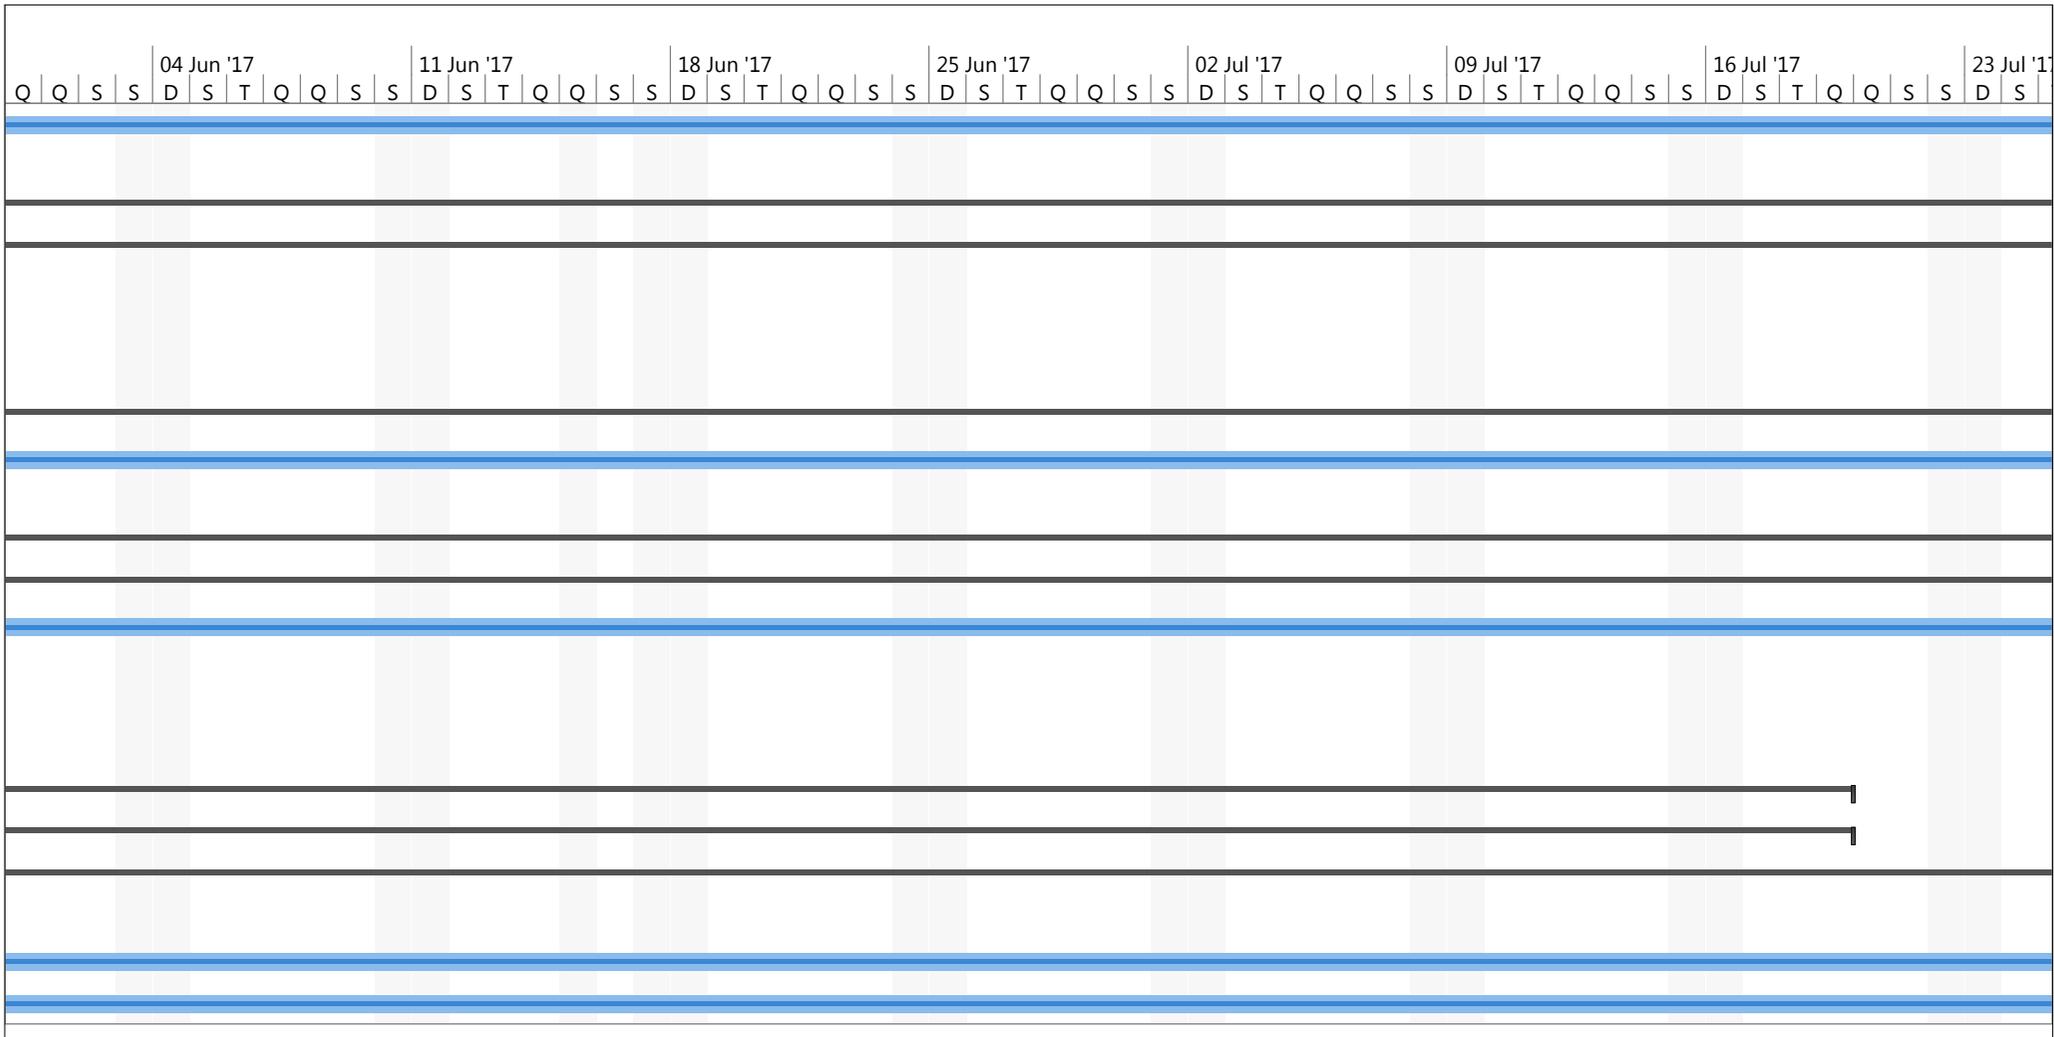


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



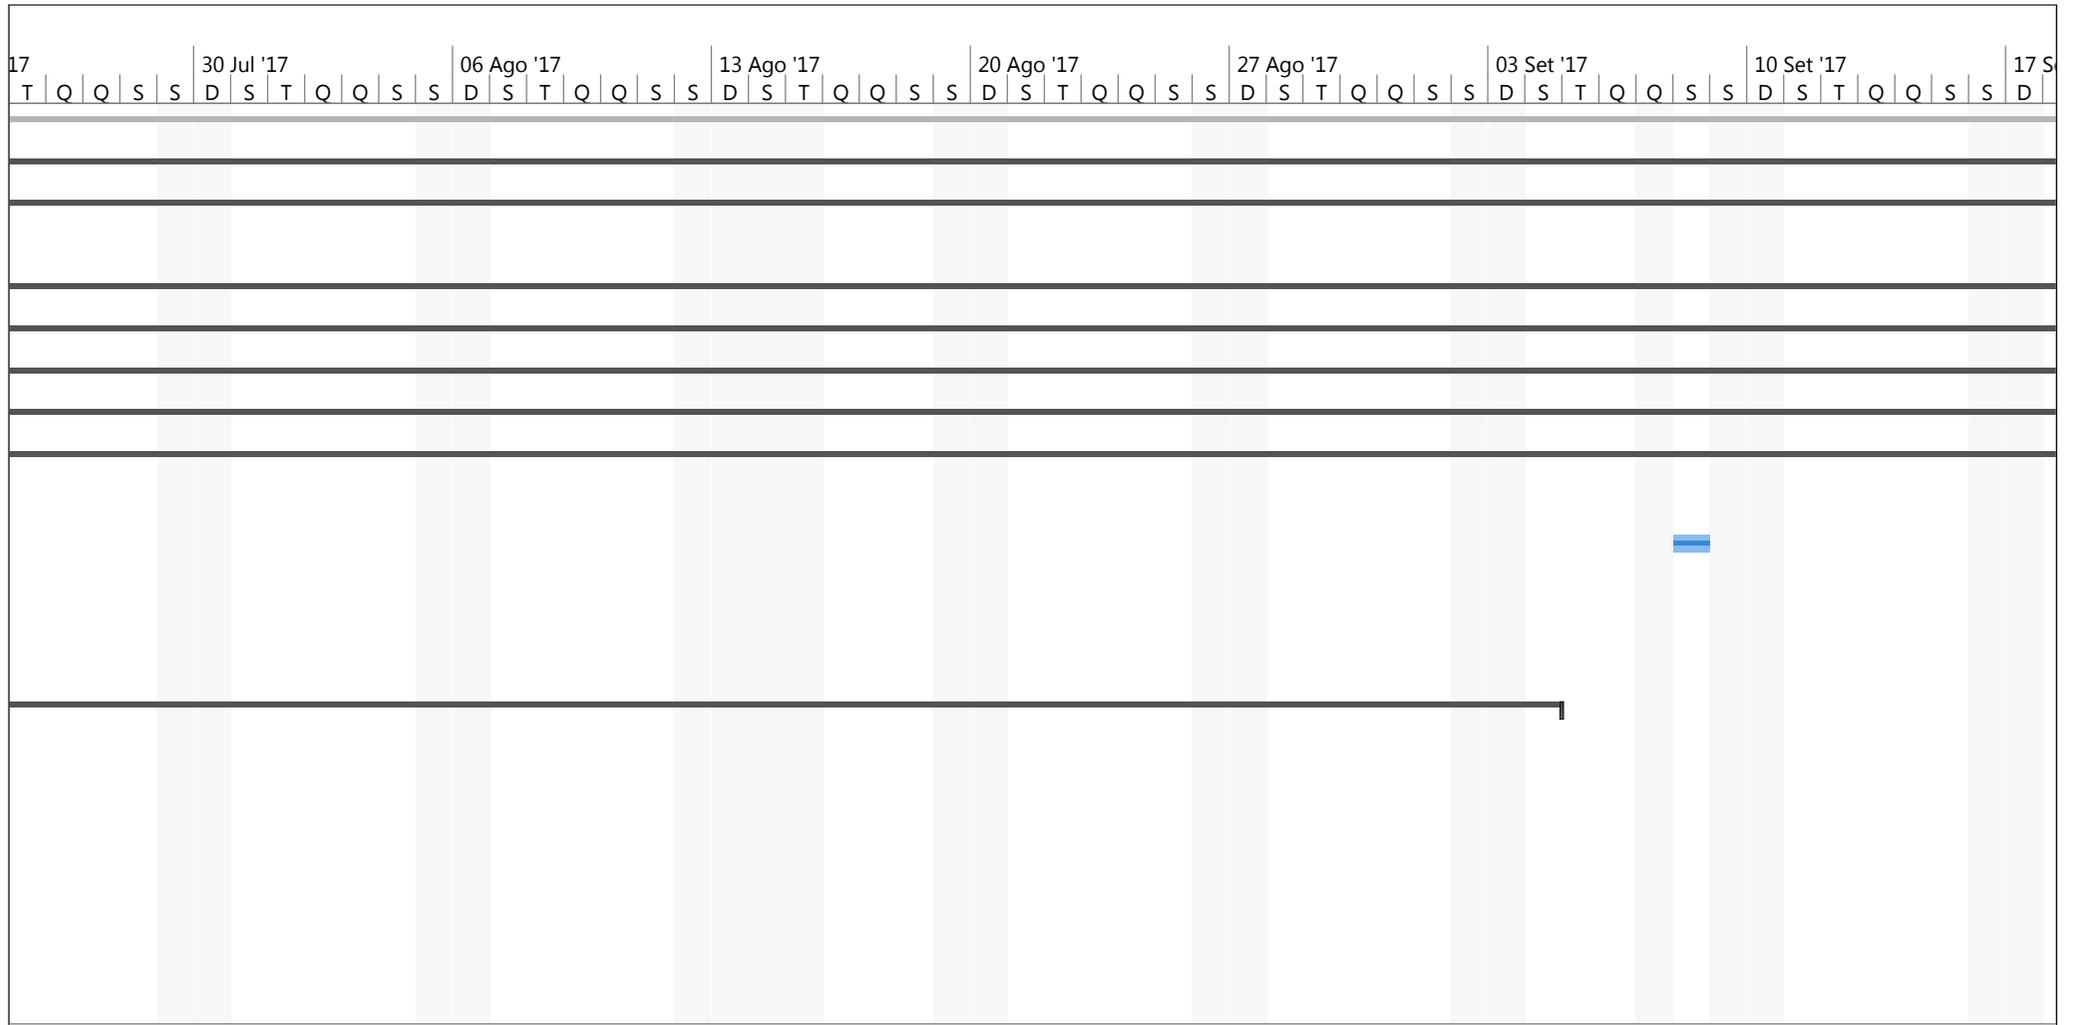


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

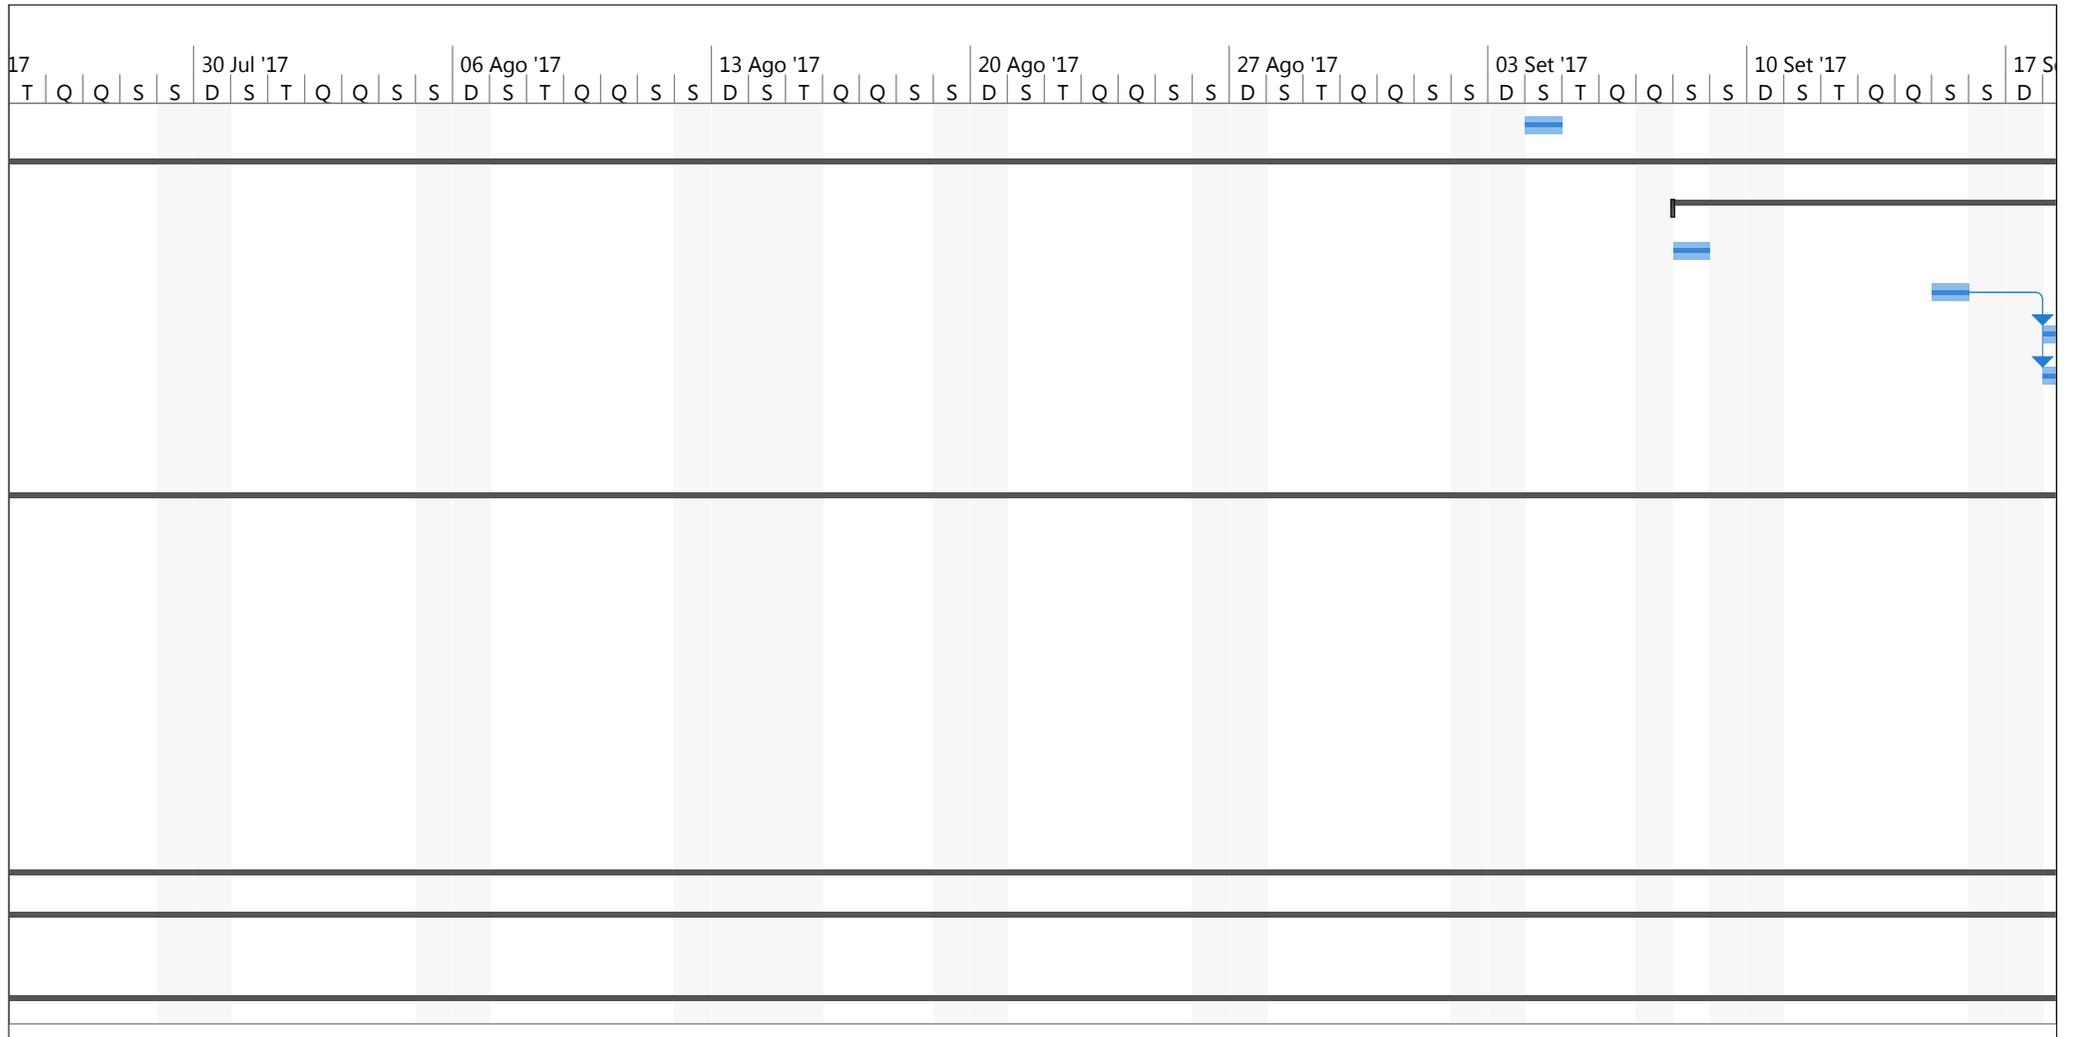


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

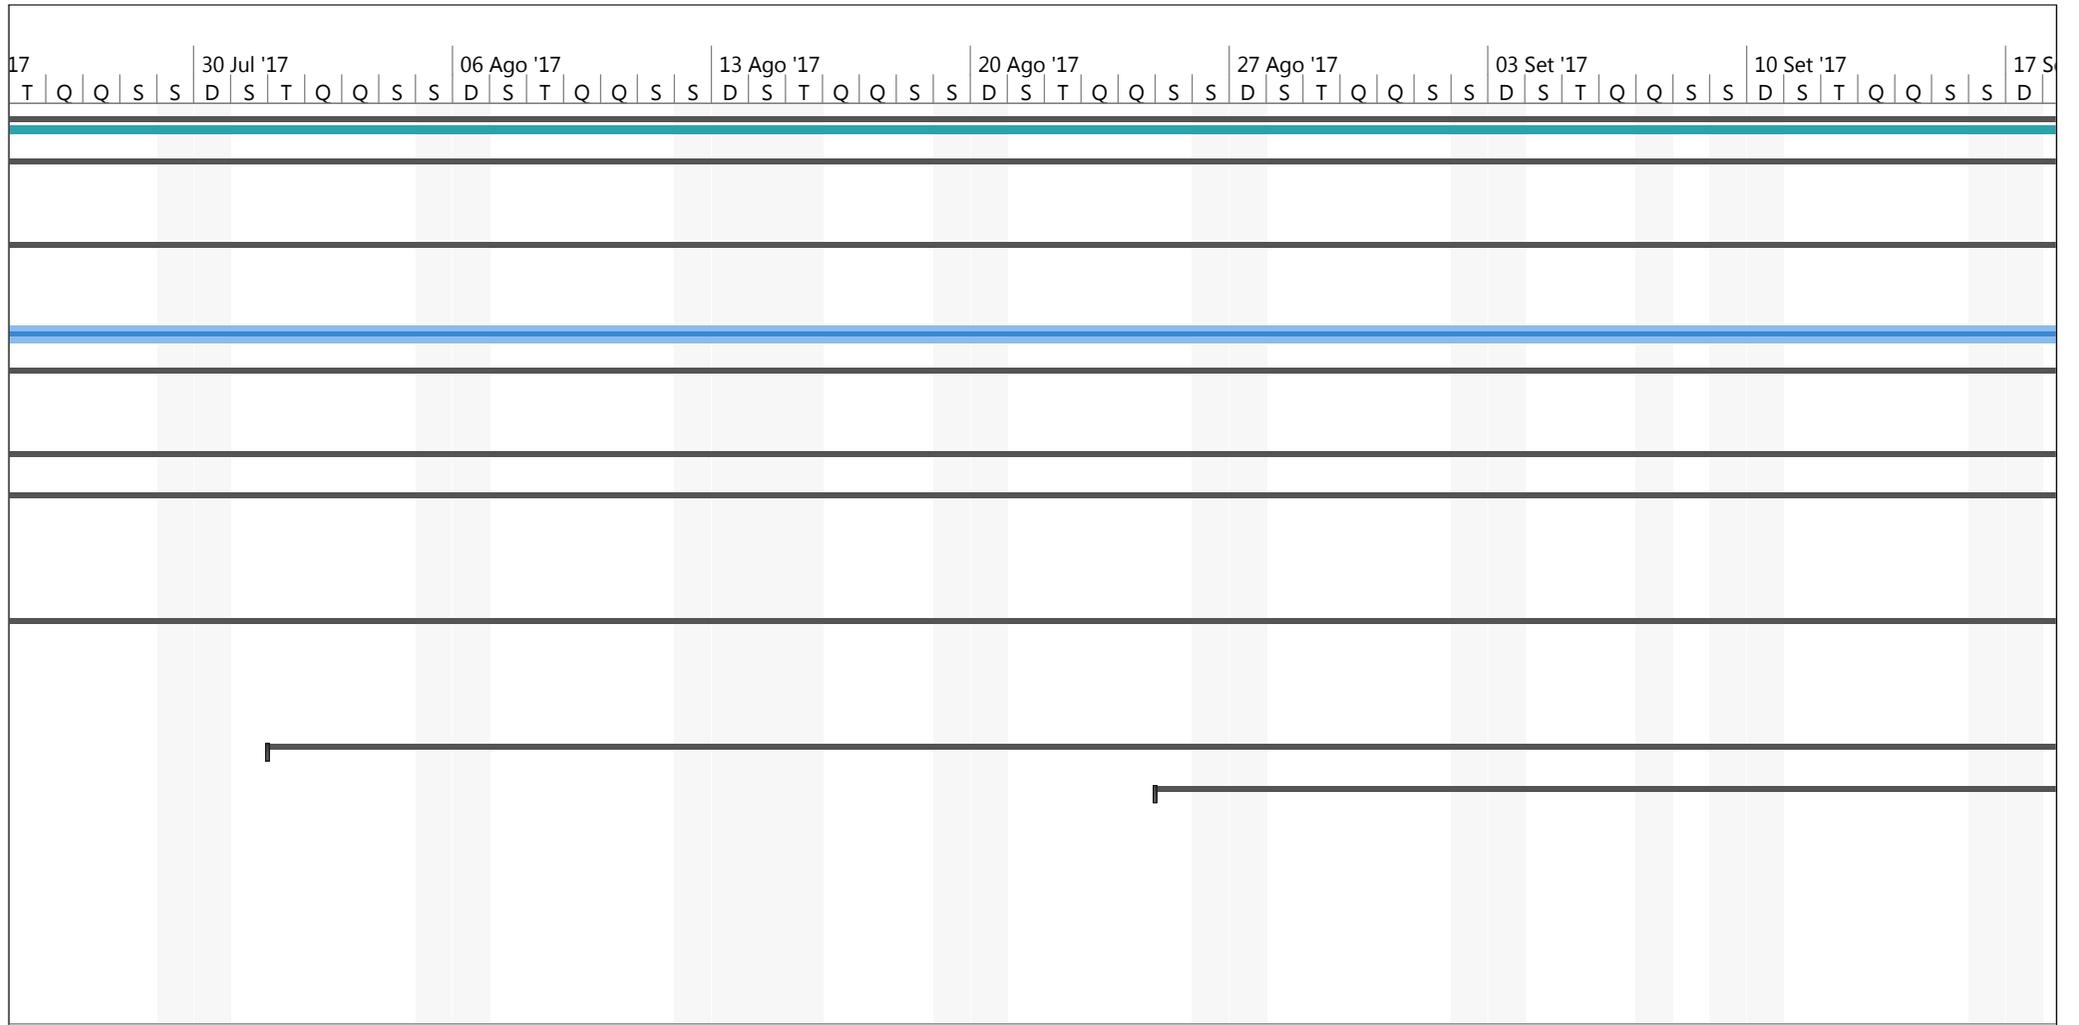


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

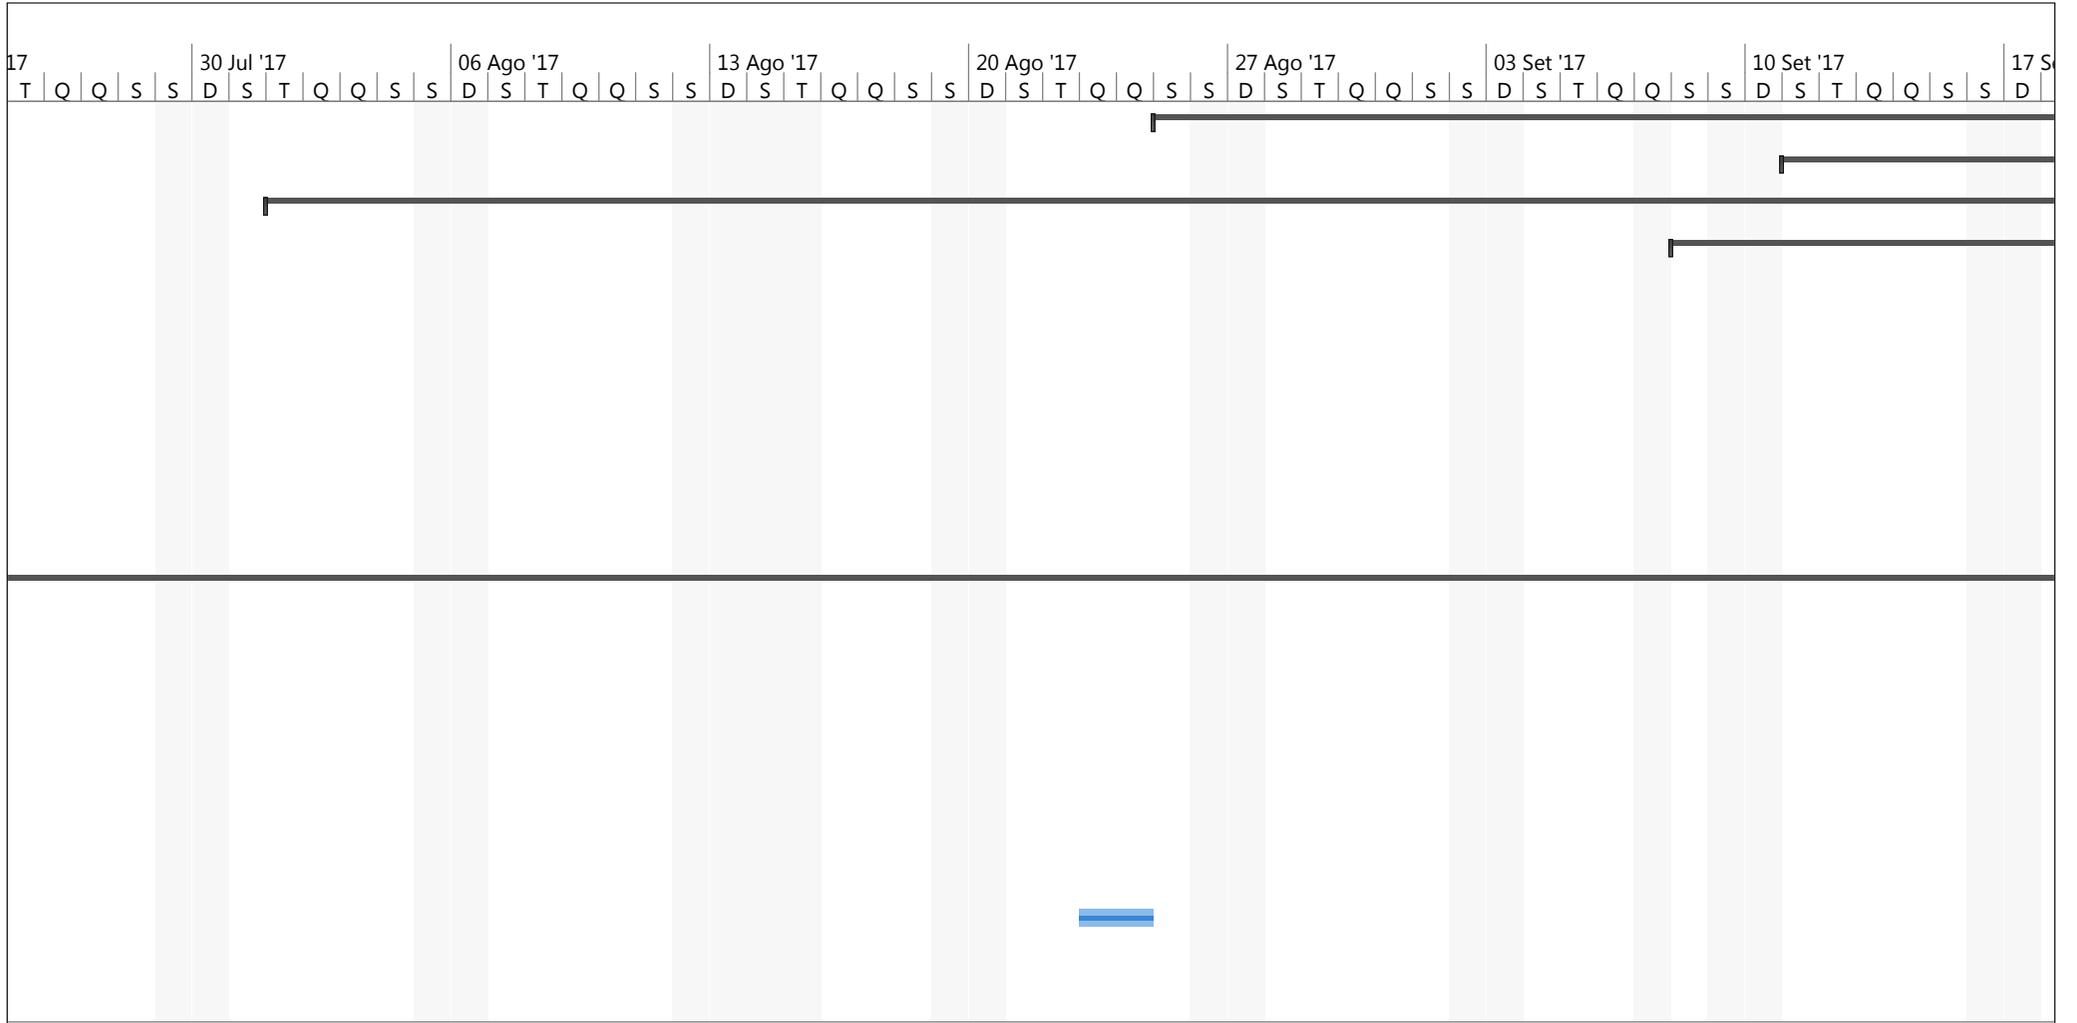

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

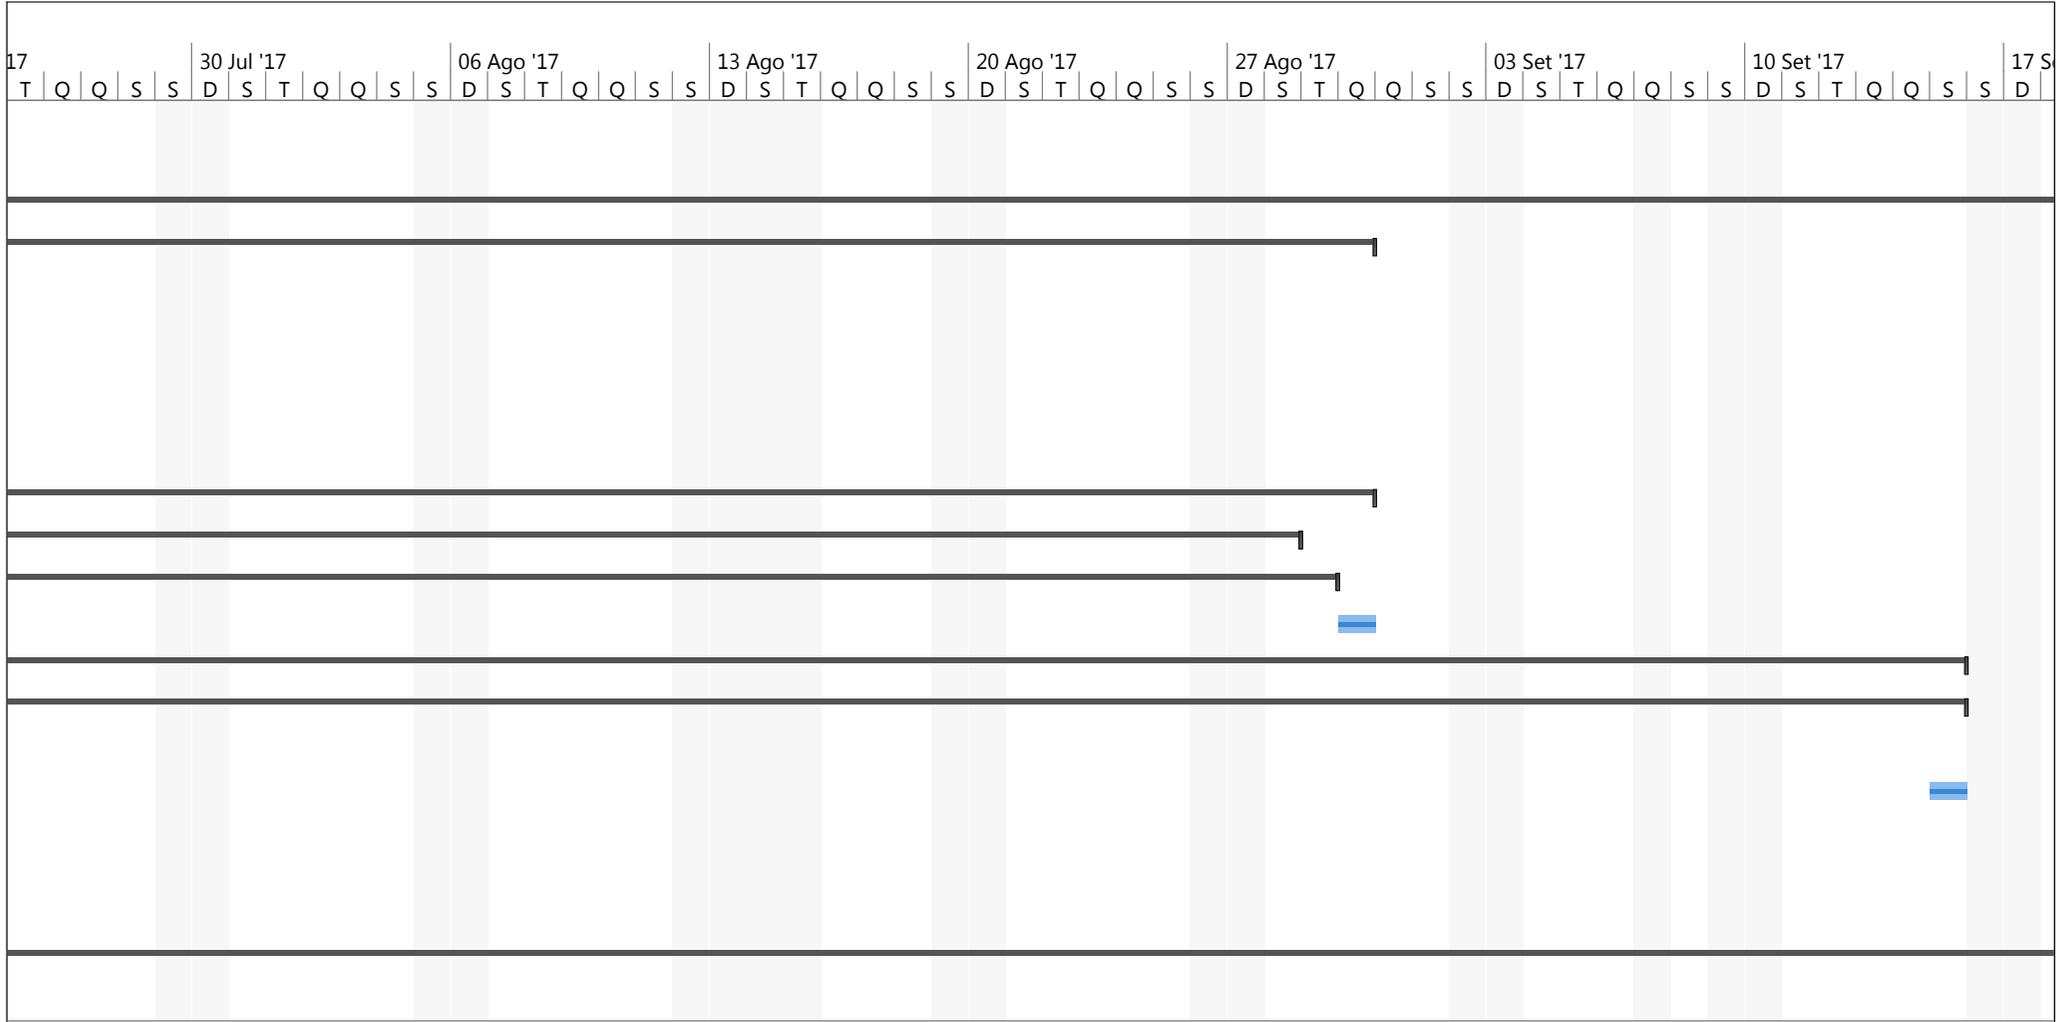


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

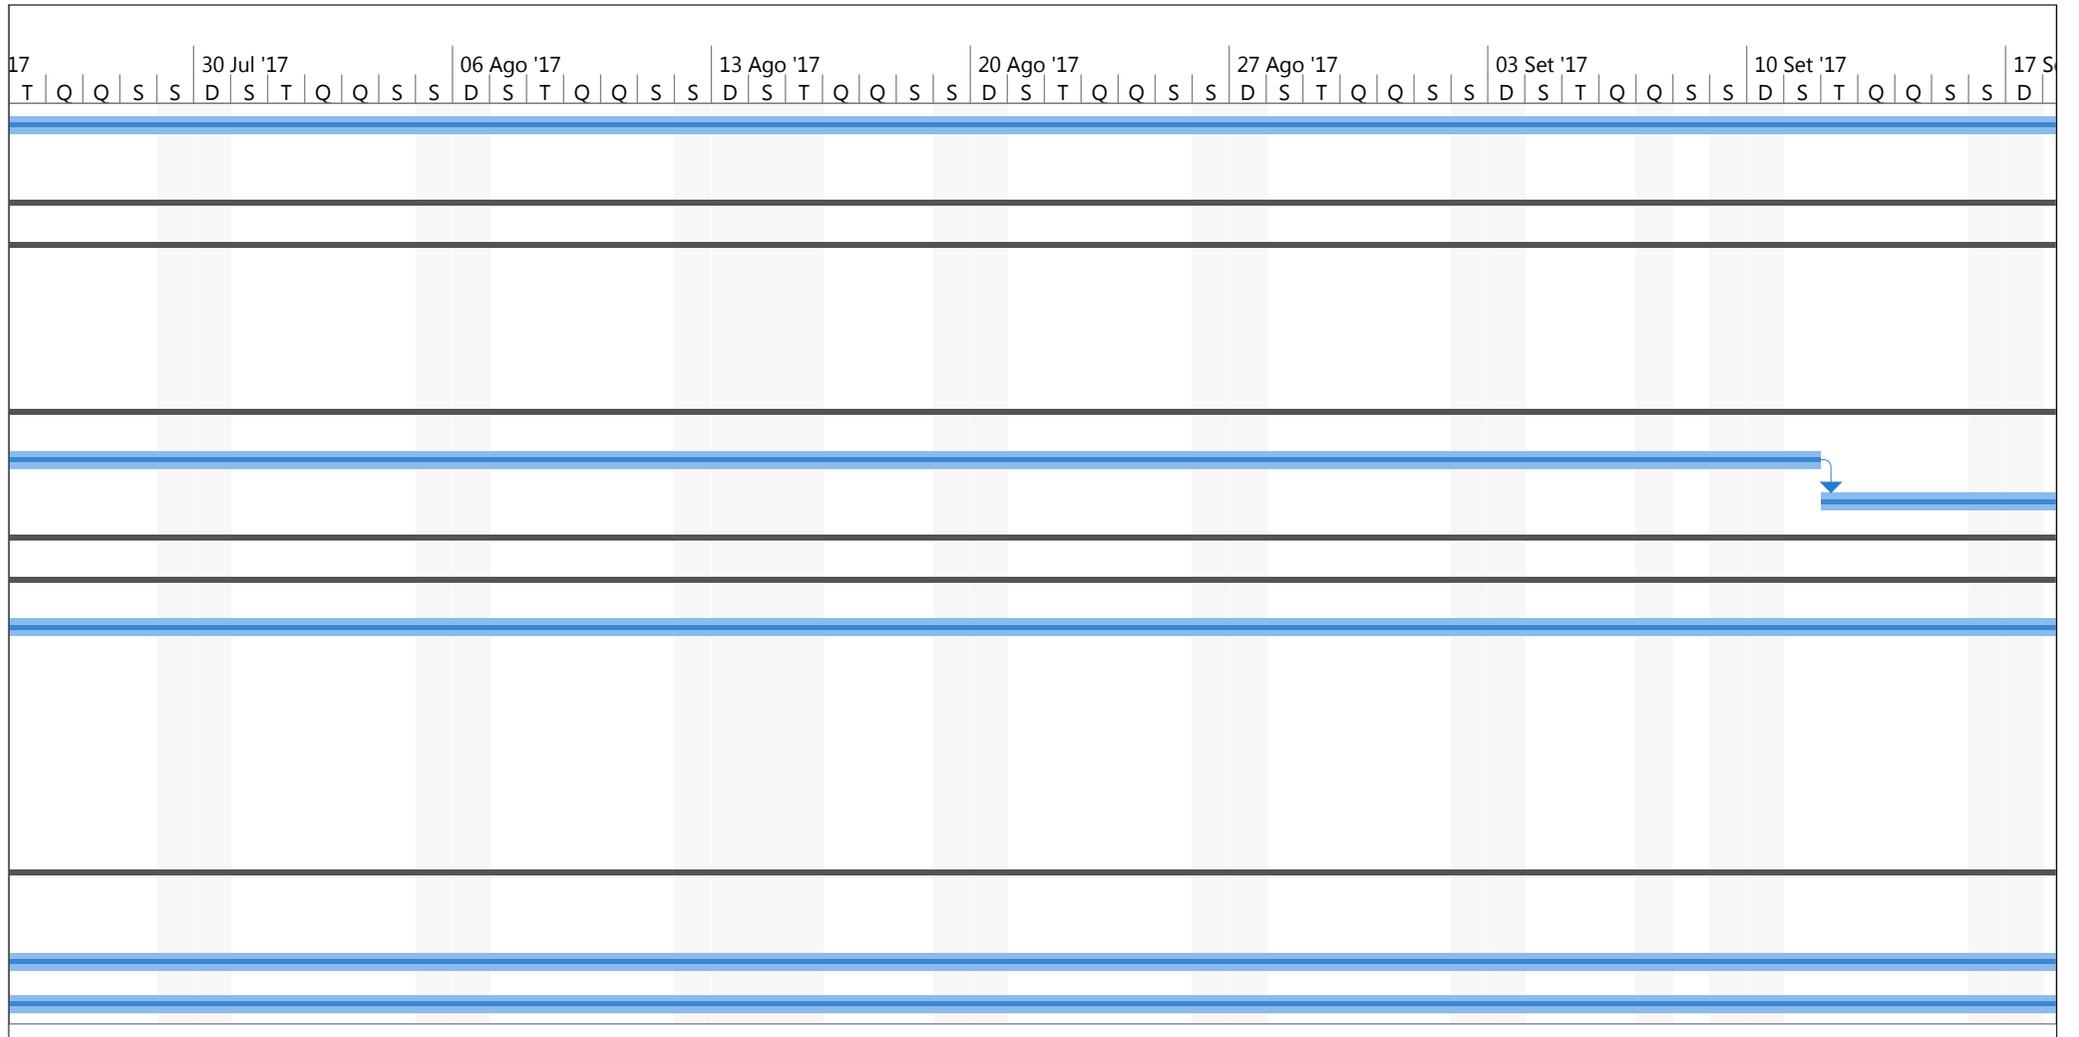


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

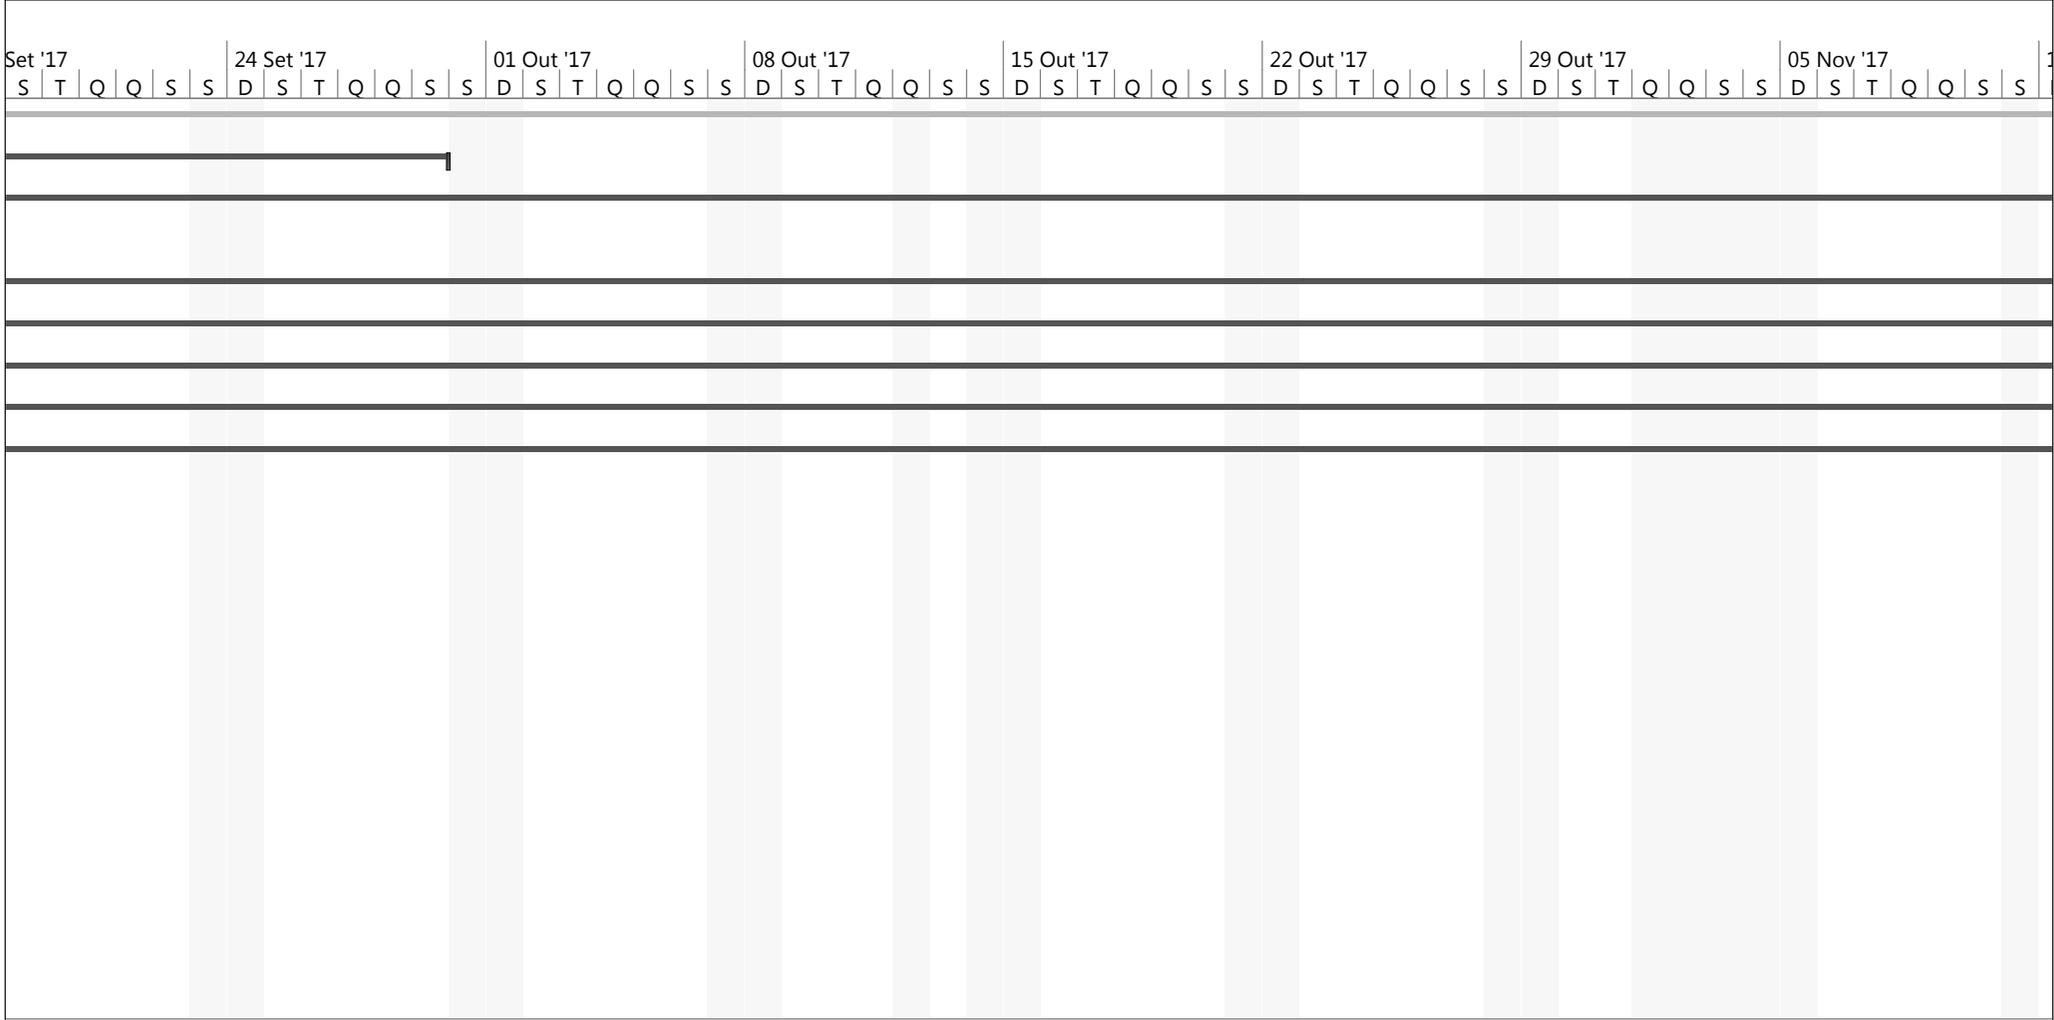


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

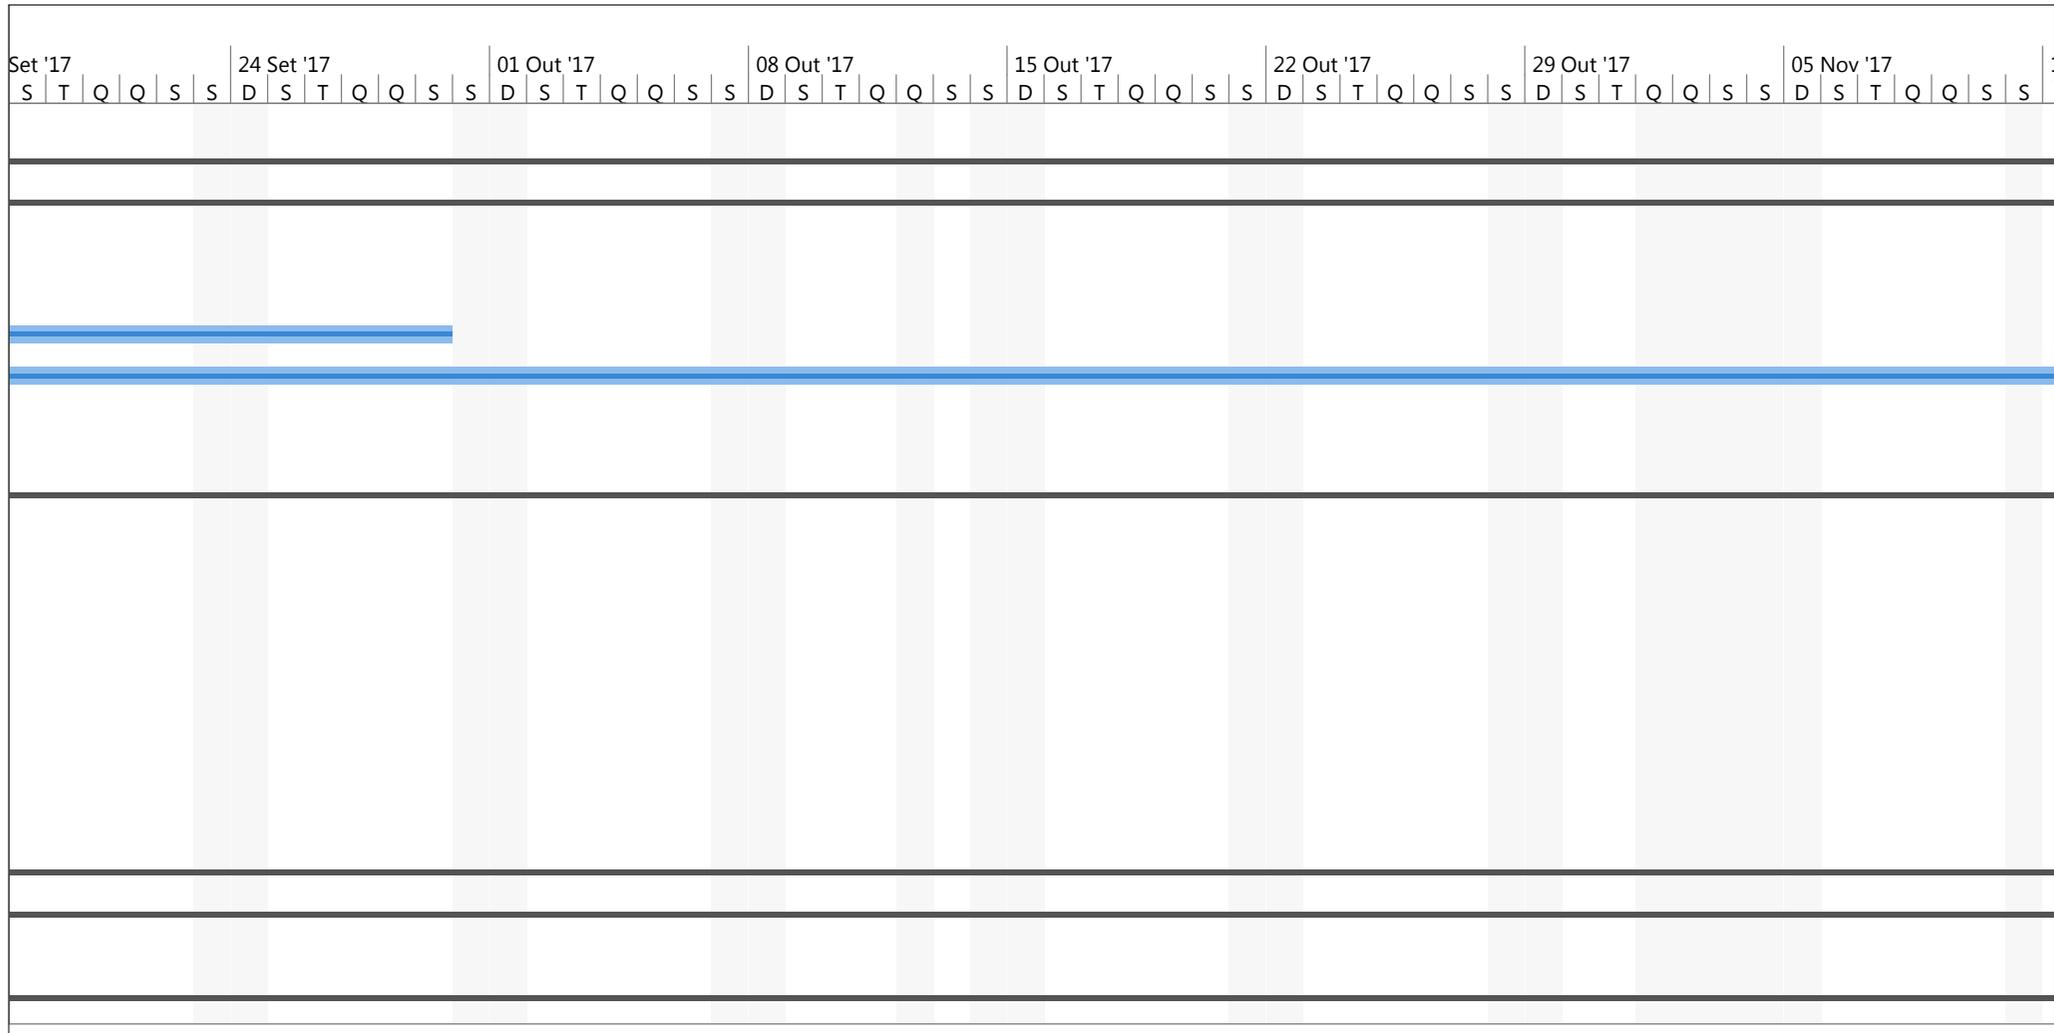


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

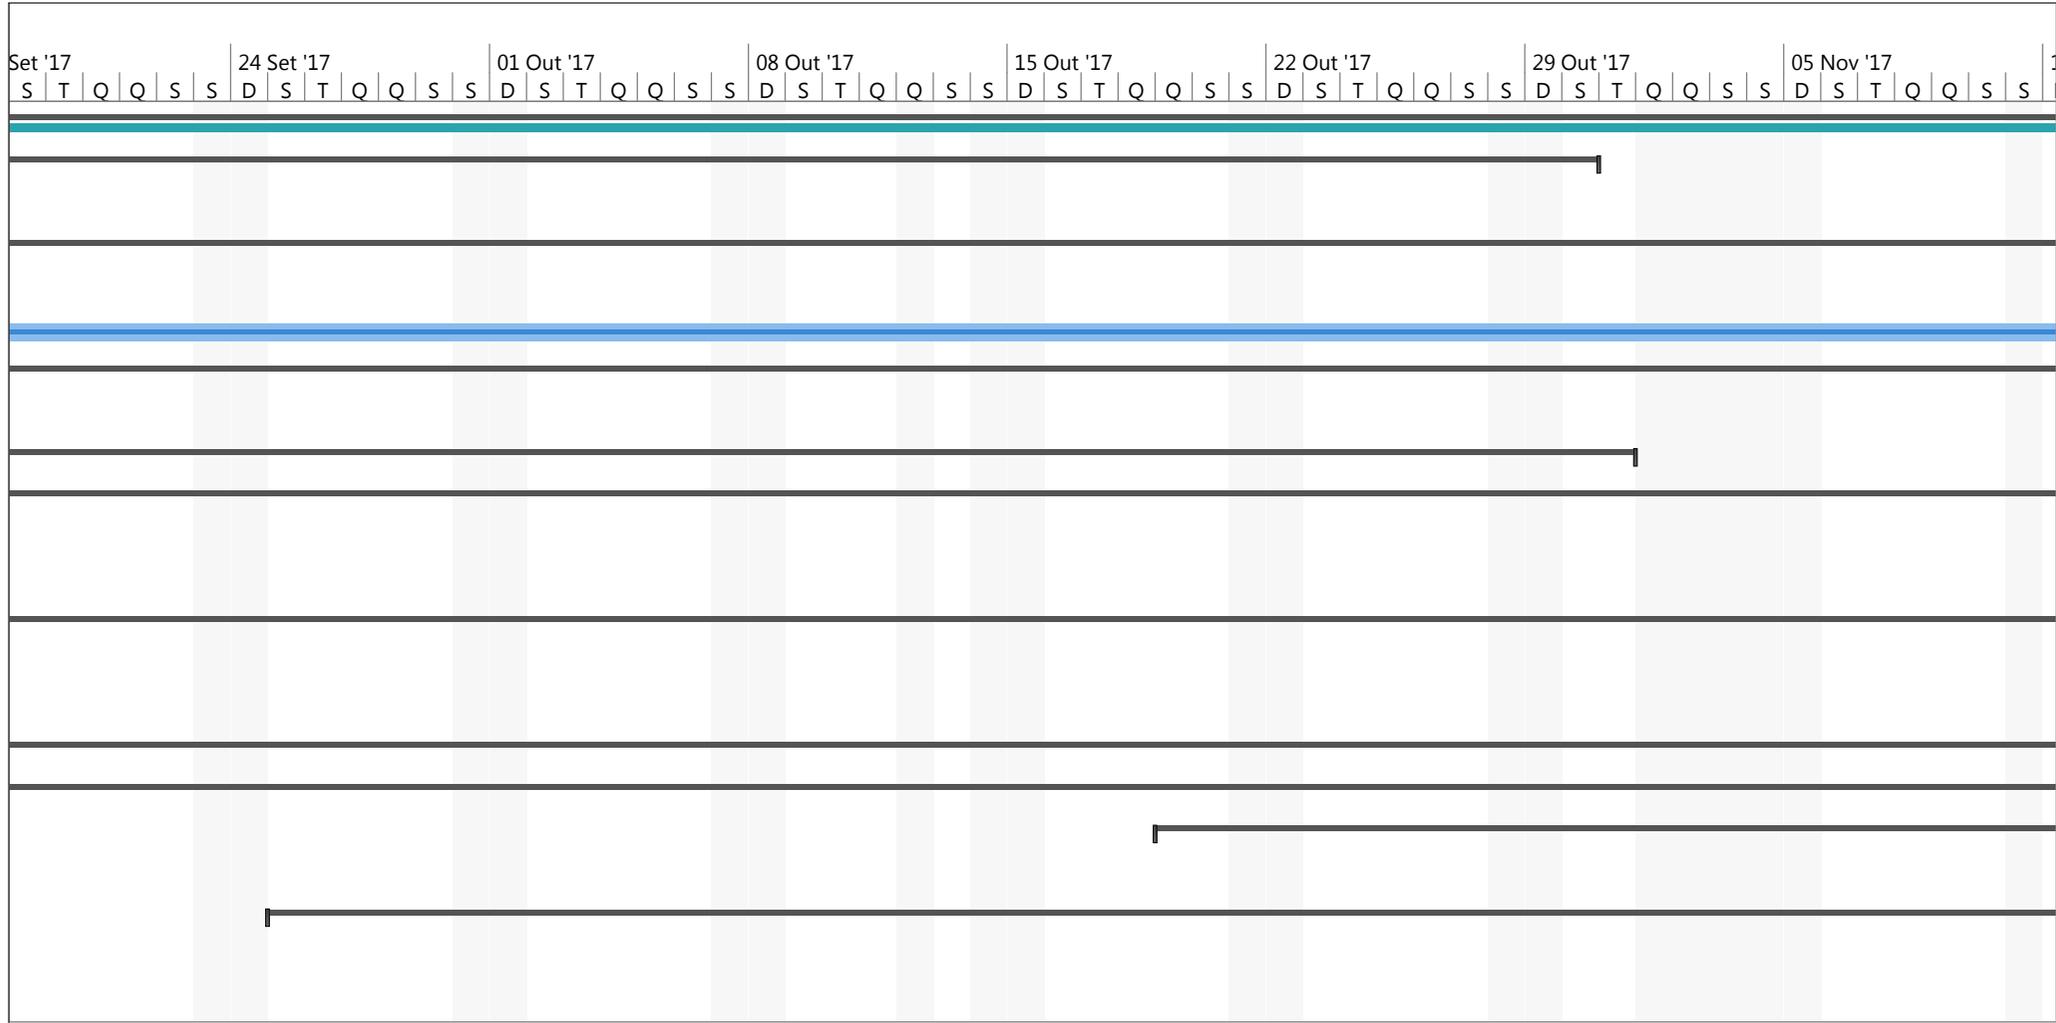

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

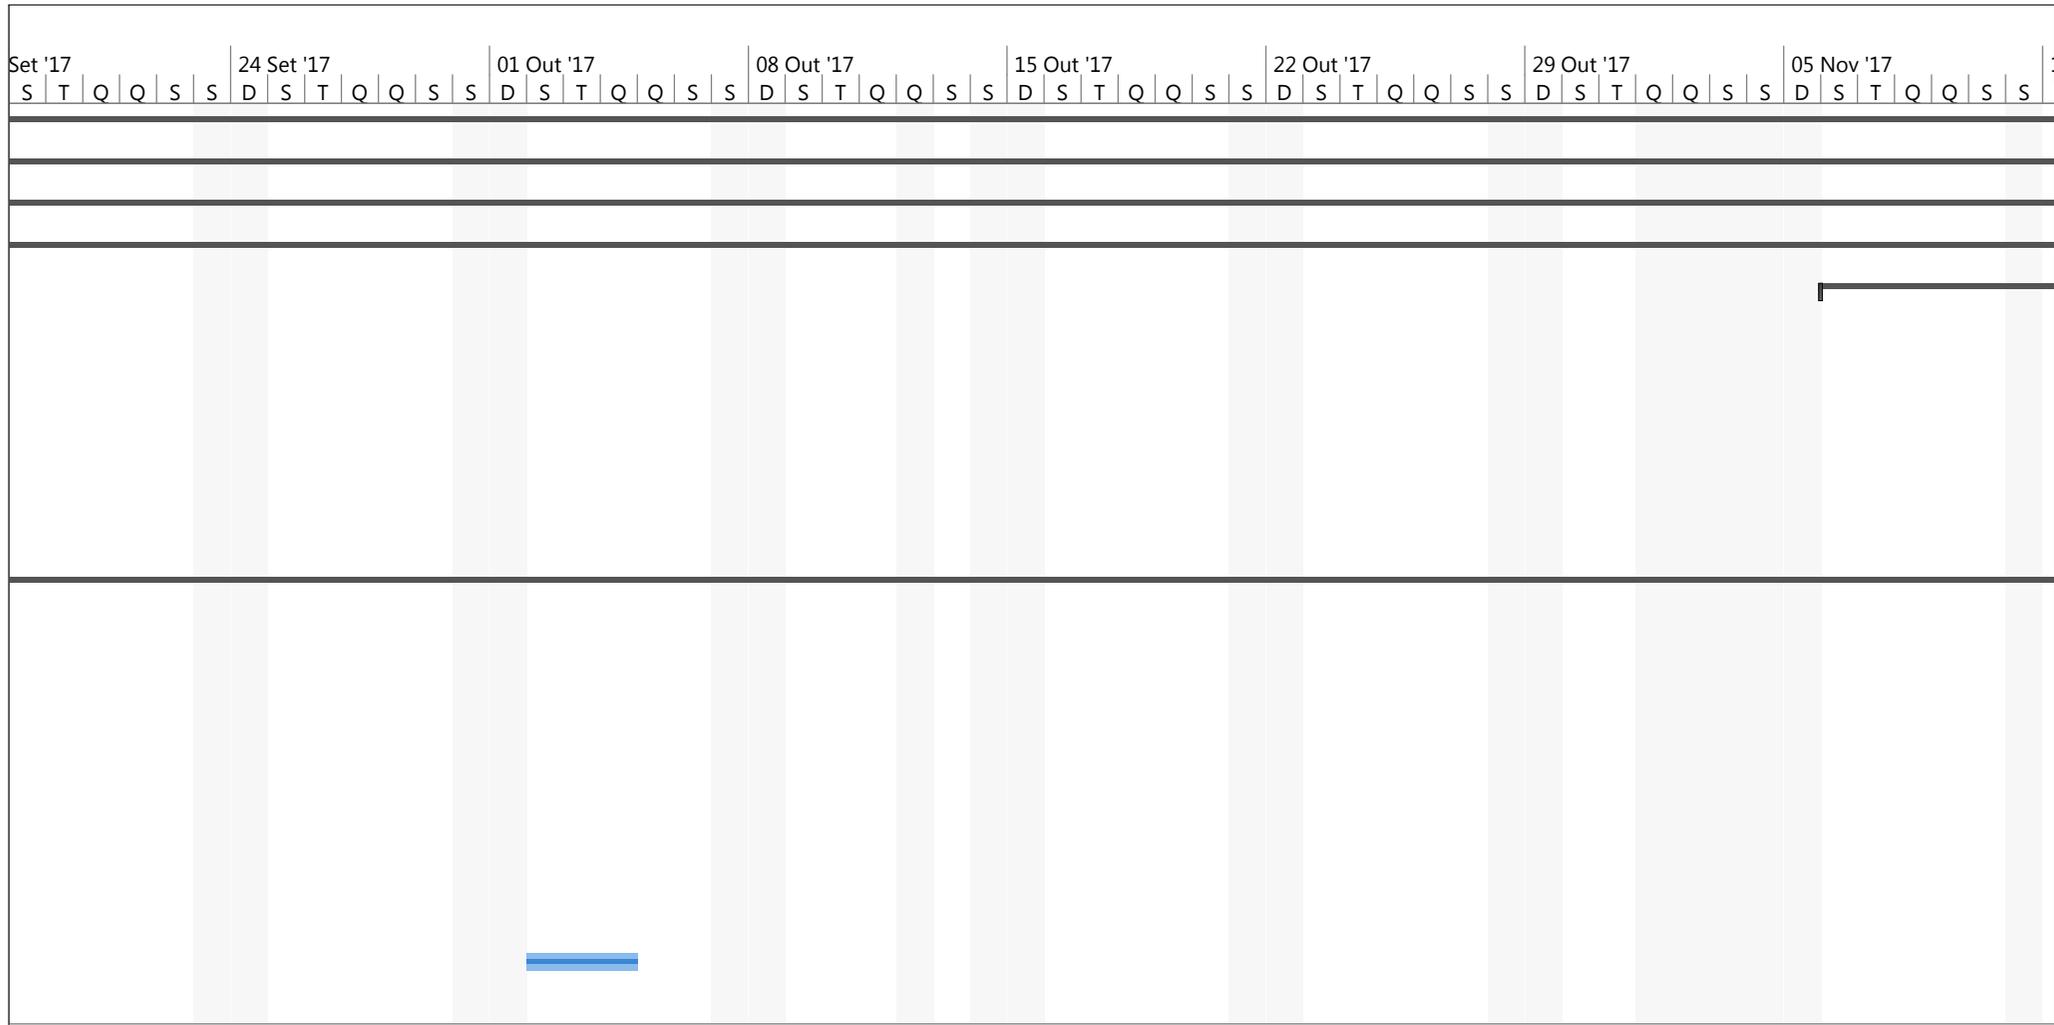

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Set '17      24 Set '17      01 Out '17      08 Out '17      15 Out '17      22 Out '17      29 Out '17      05 Nov '17

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

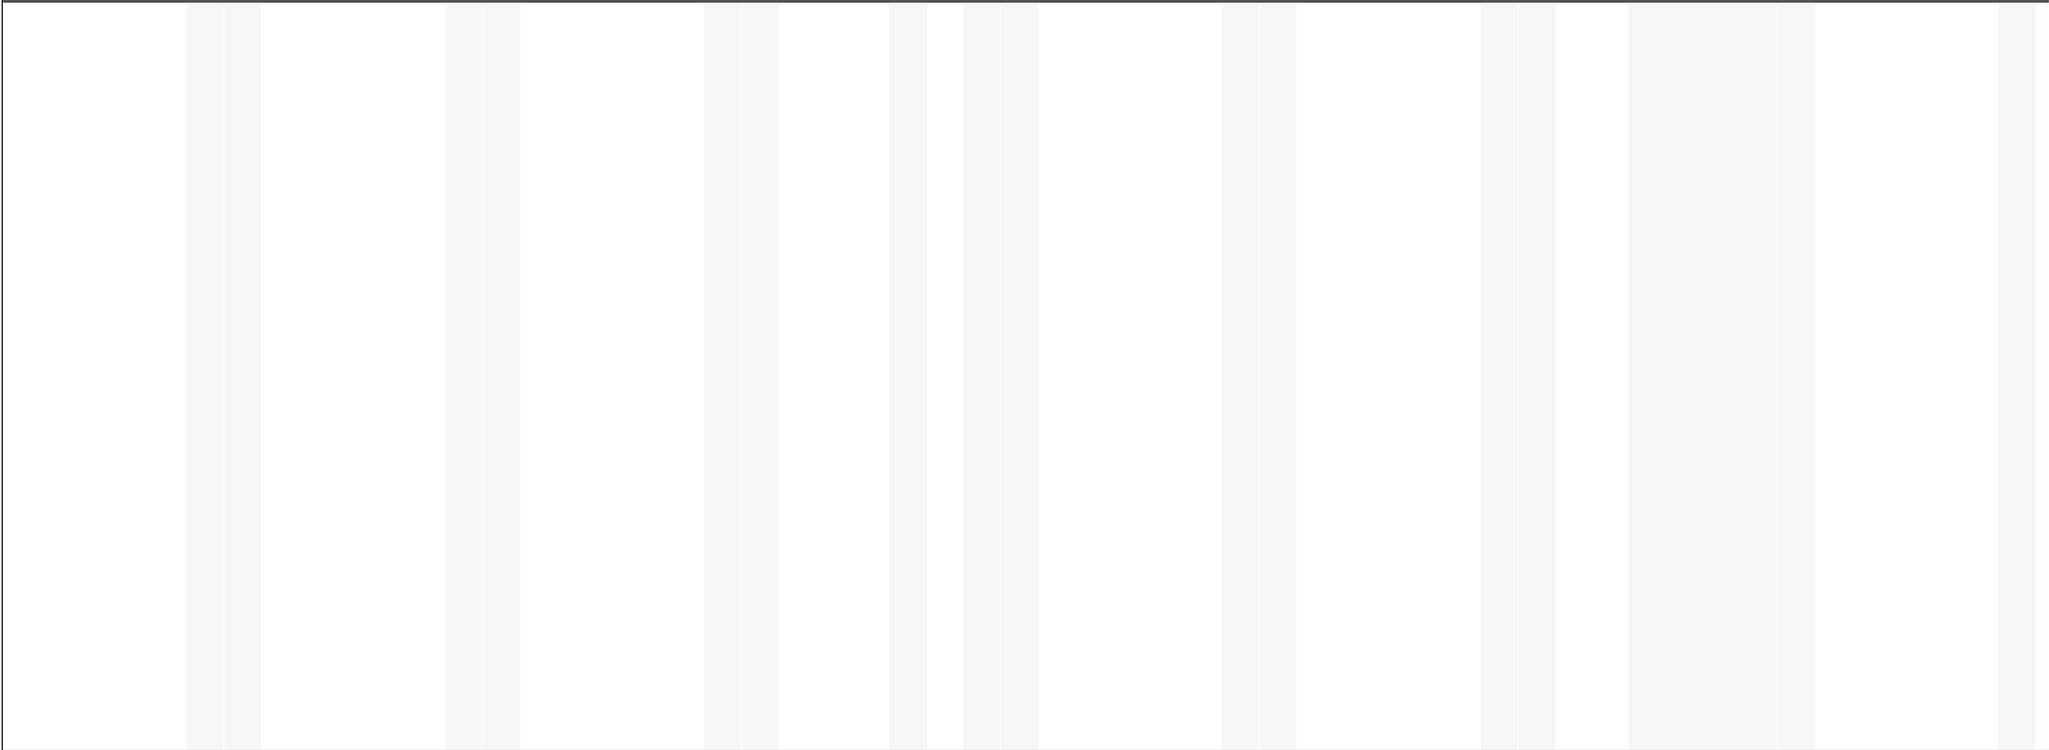


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

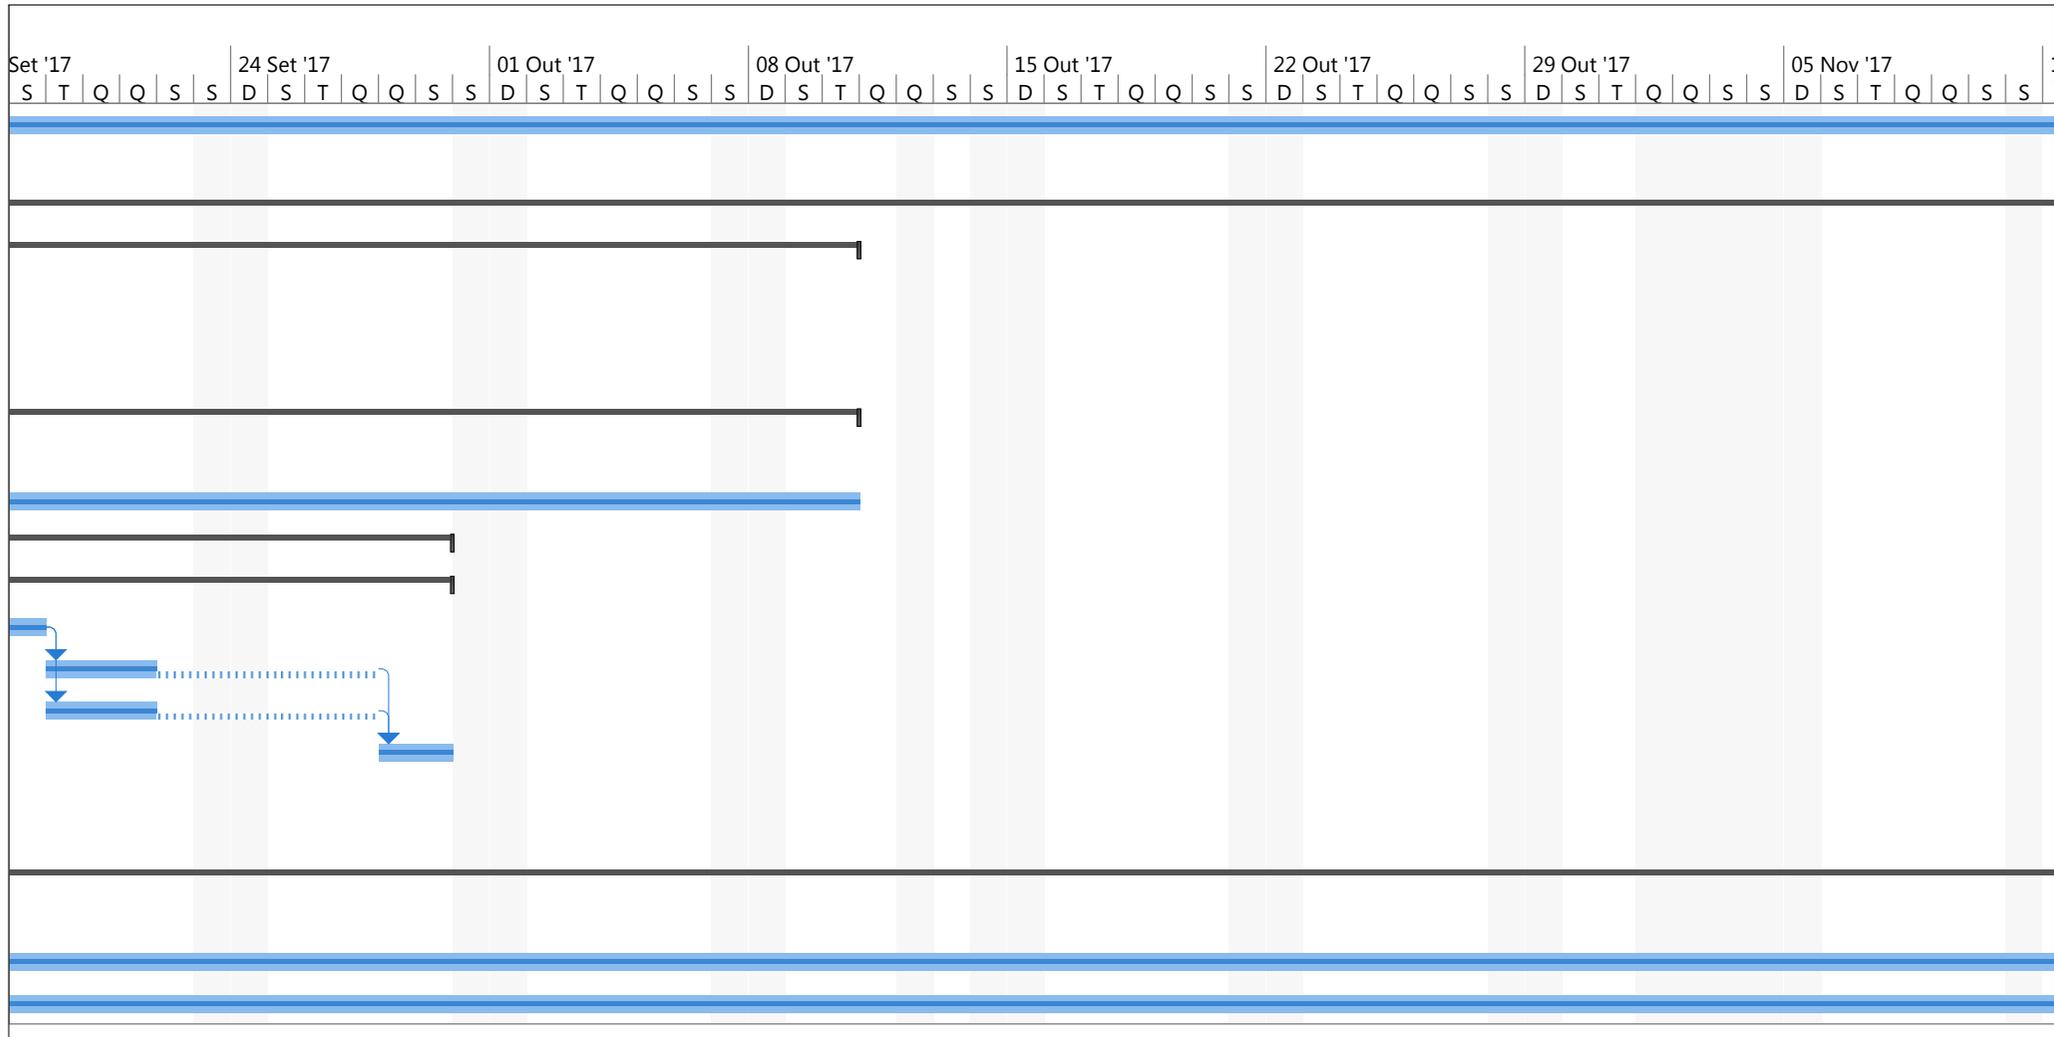


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

12 Nov '17 | 19 Nov '17 | 26 Nov '17 | 03 Dez '17 | 10 Dez '17 | 17 Dez '17 | 24 Dez '17 | 31 Dez '17  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

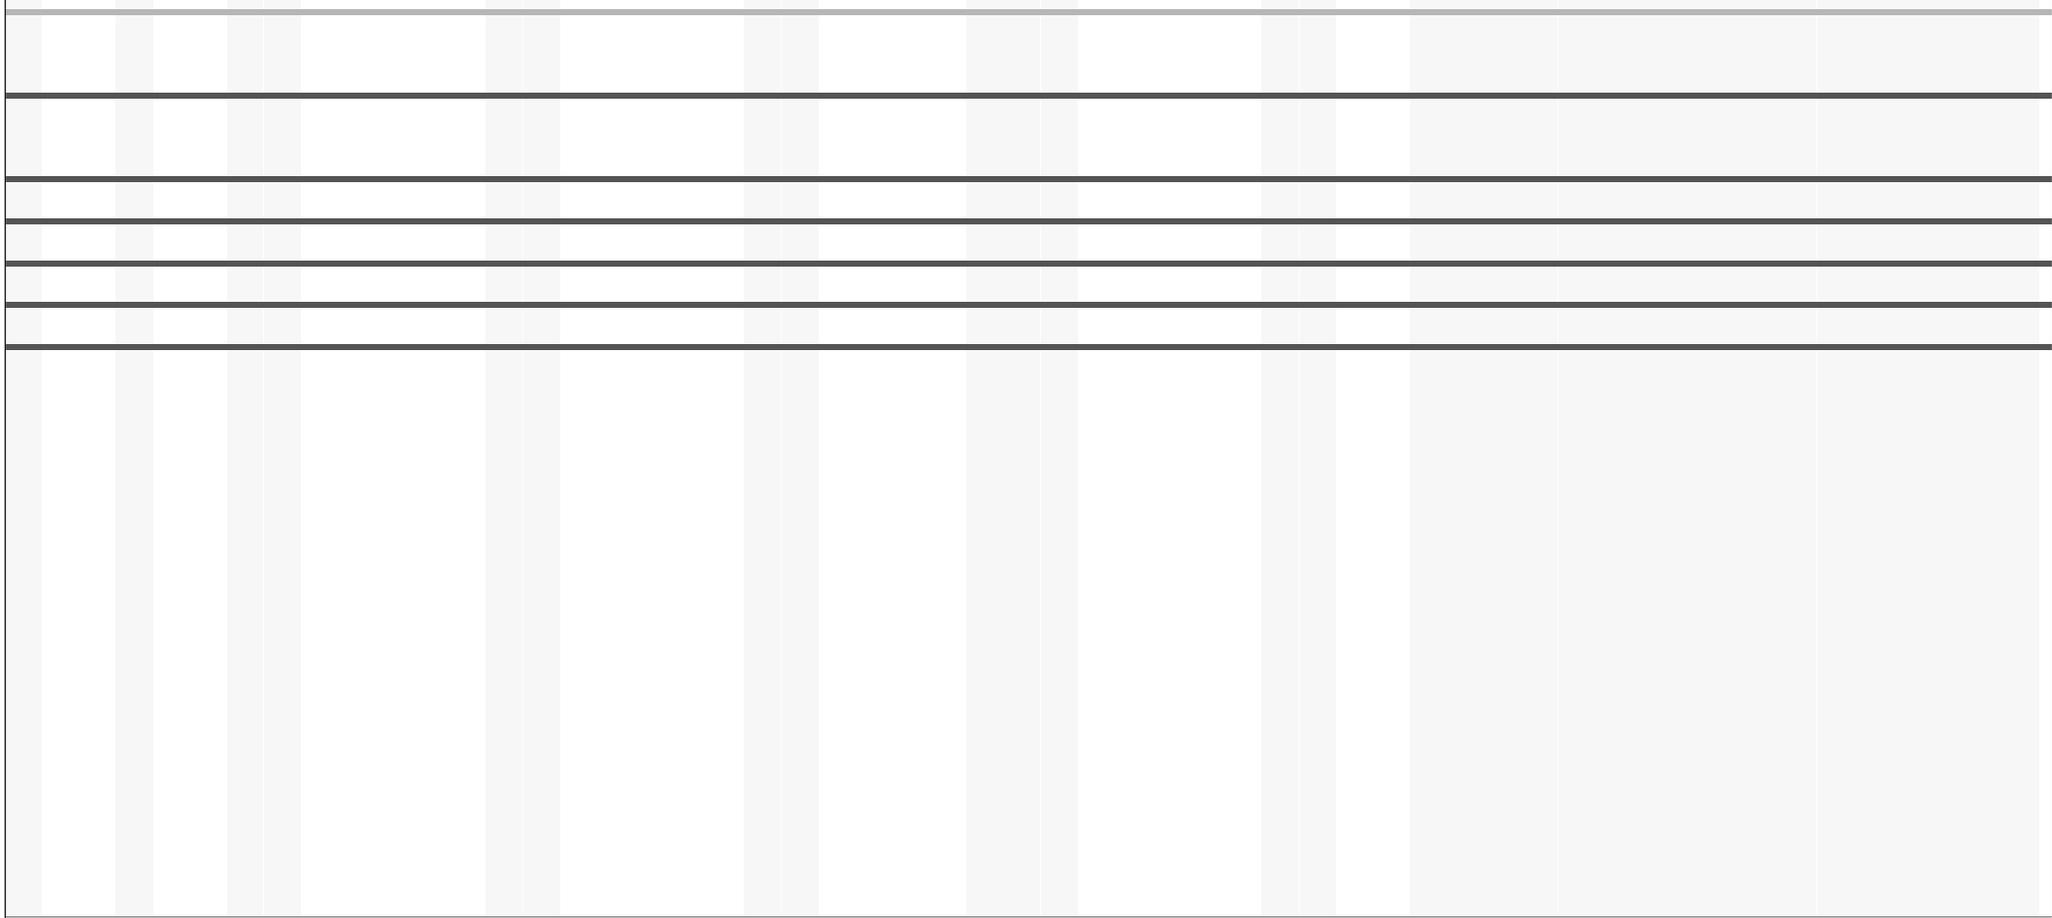


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Nov '17 | 19 Nov '17 | 26 Nov '17 | 03 Dez '17 | 10 Dez '17 | 17 Dez '17 | 24 Dez '17 | 31 Dez '17  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

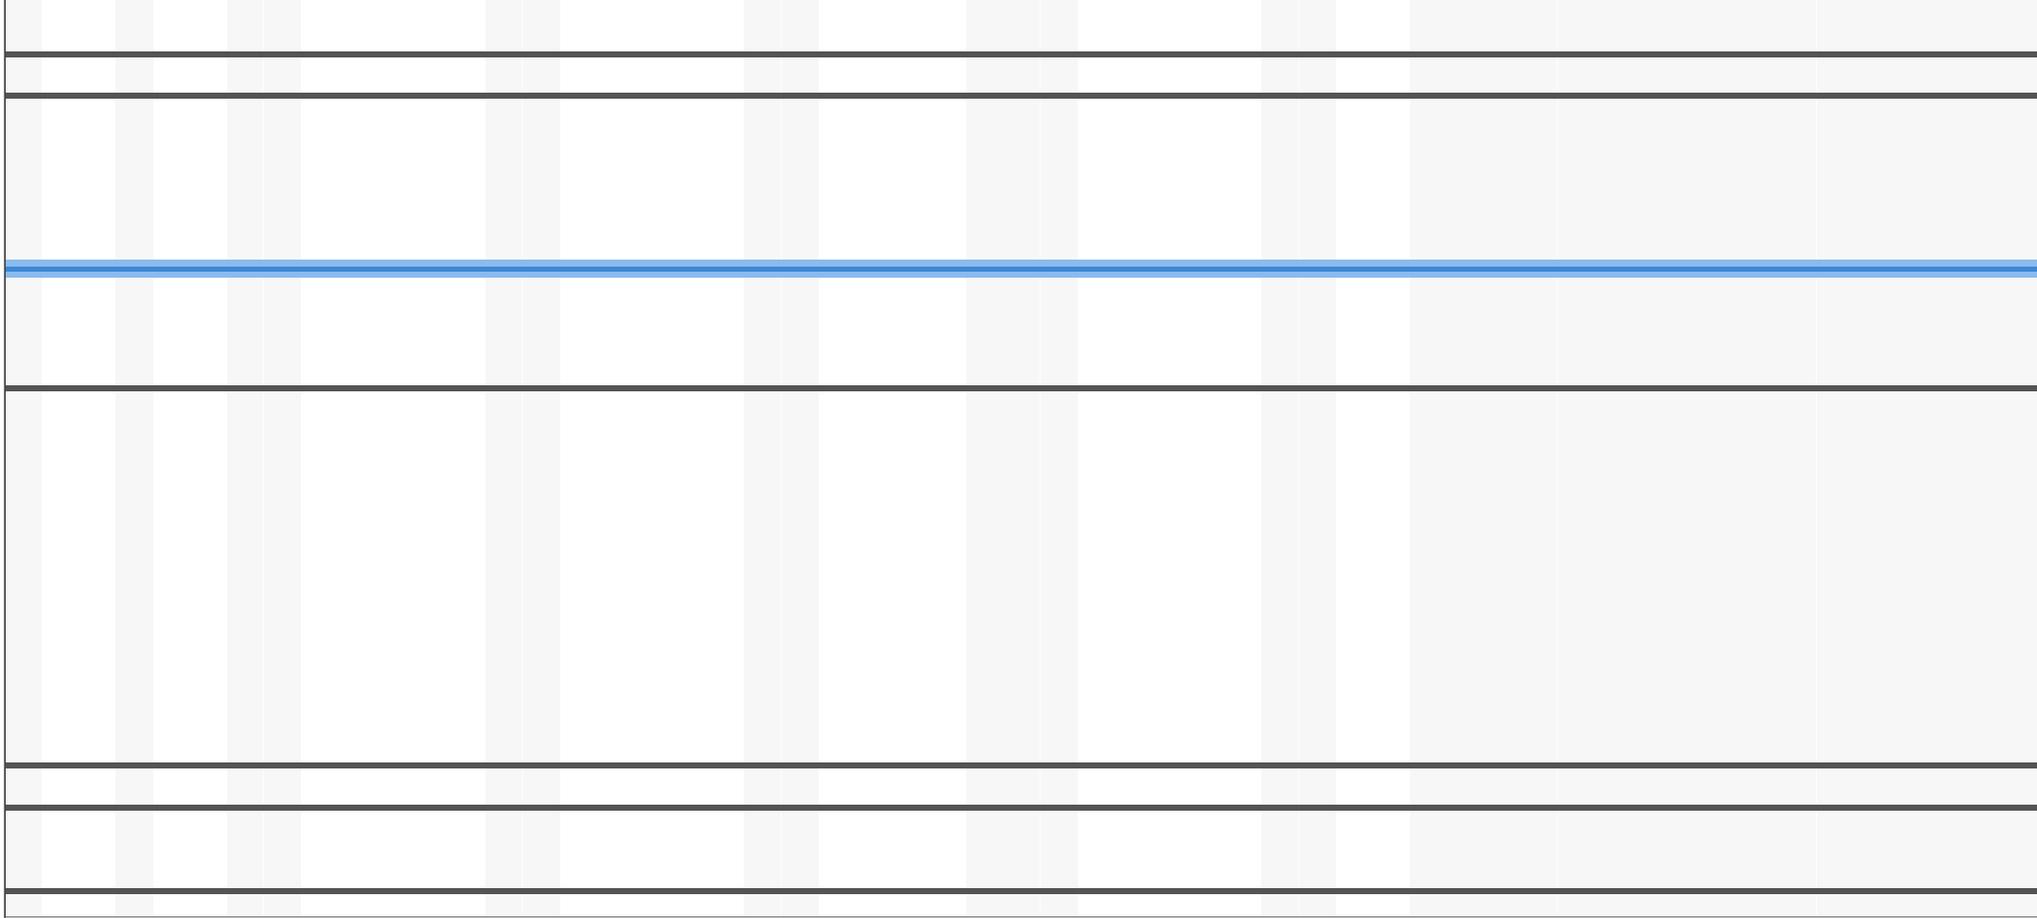


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

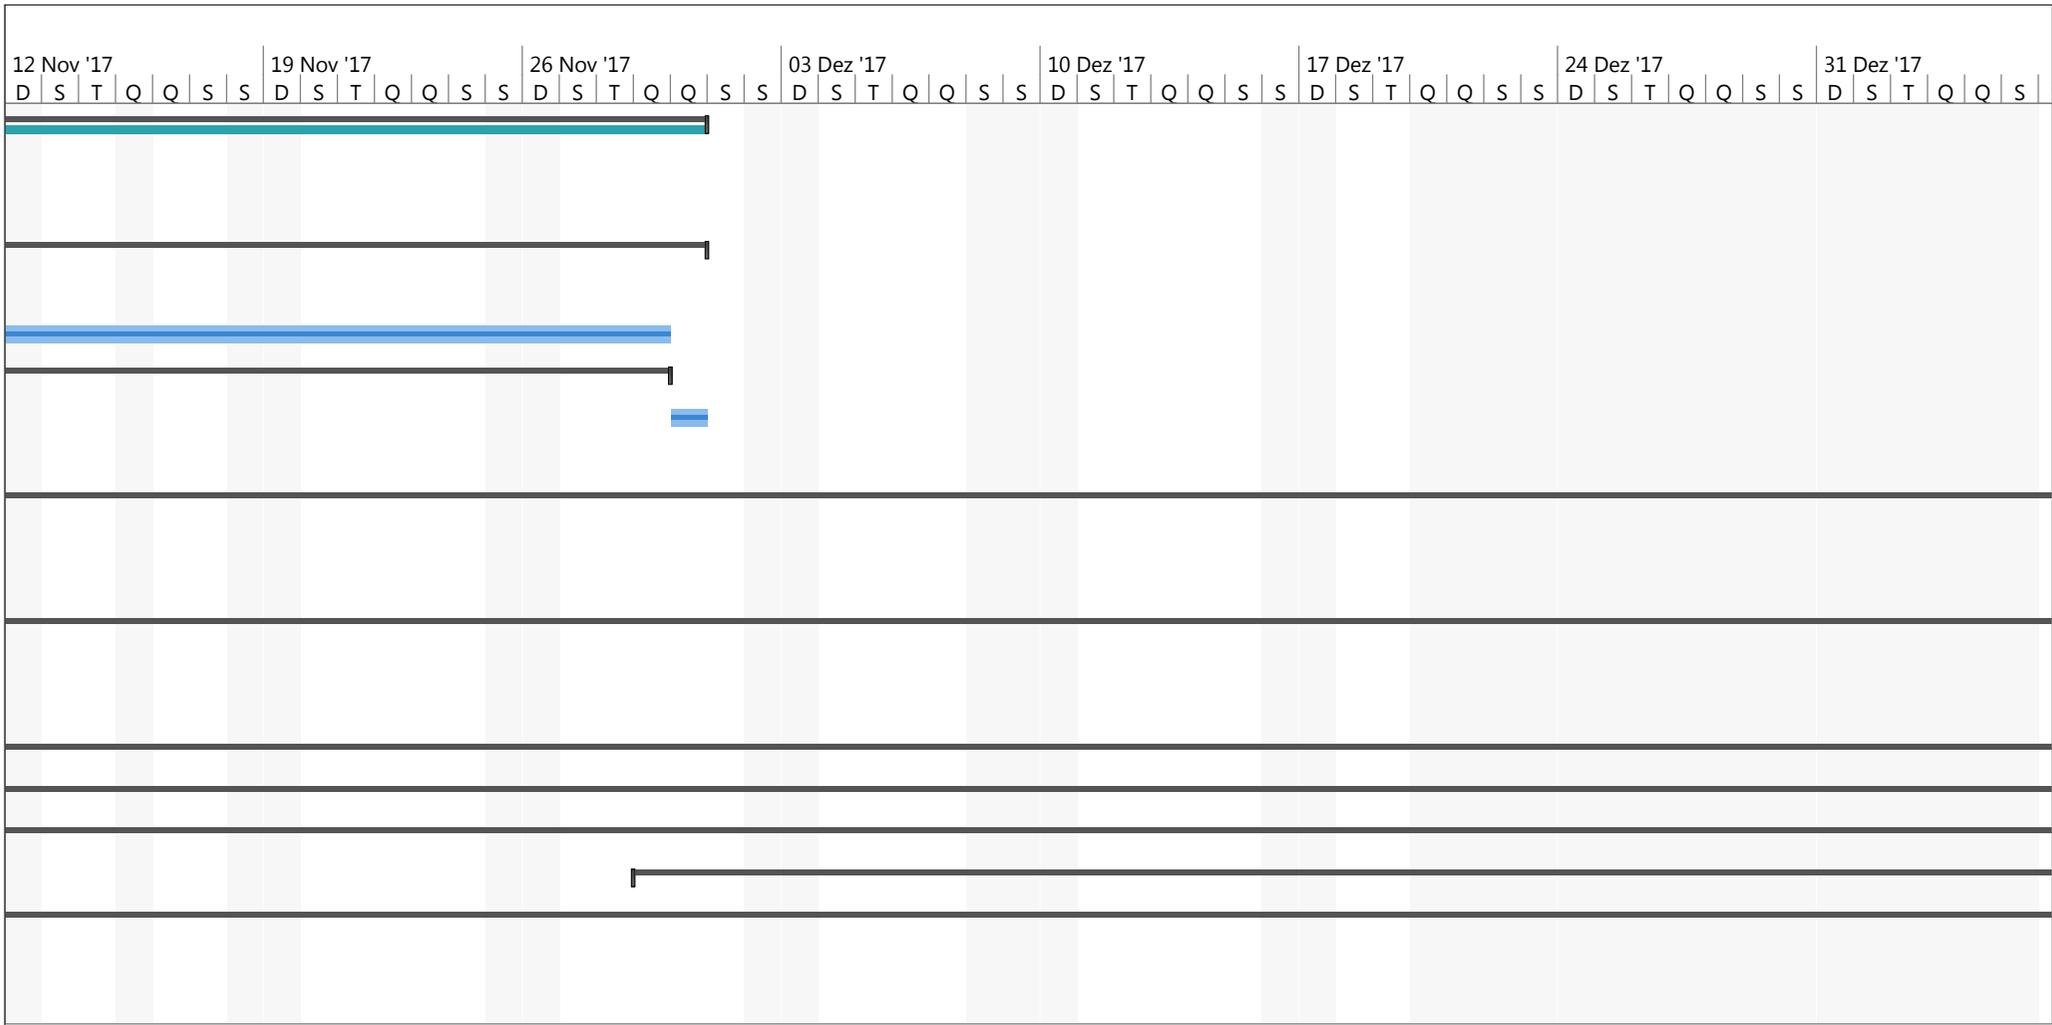


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Nov '17 | 19 Nov '17 | 26 Nov '17 | 03 Dez '17 | 10 Dez '17 | 17 Dez '17 | 24 Dez '17 | 31 Dez '17  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

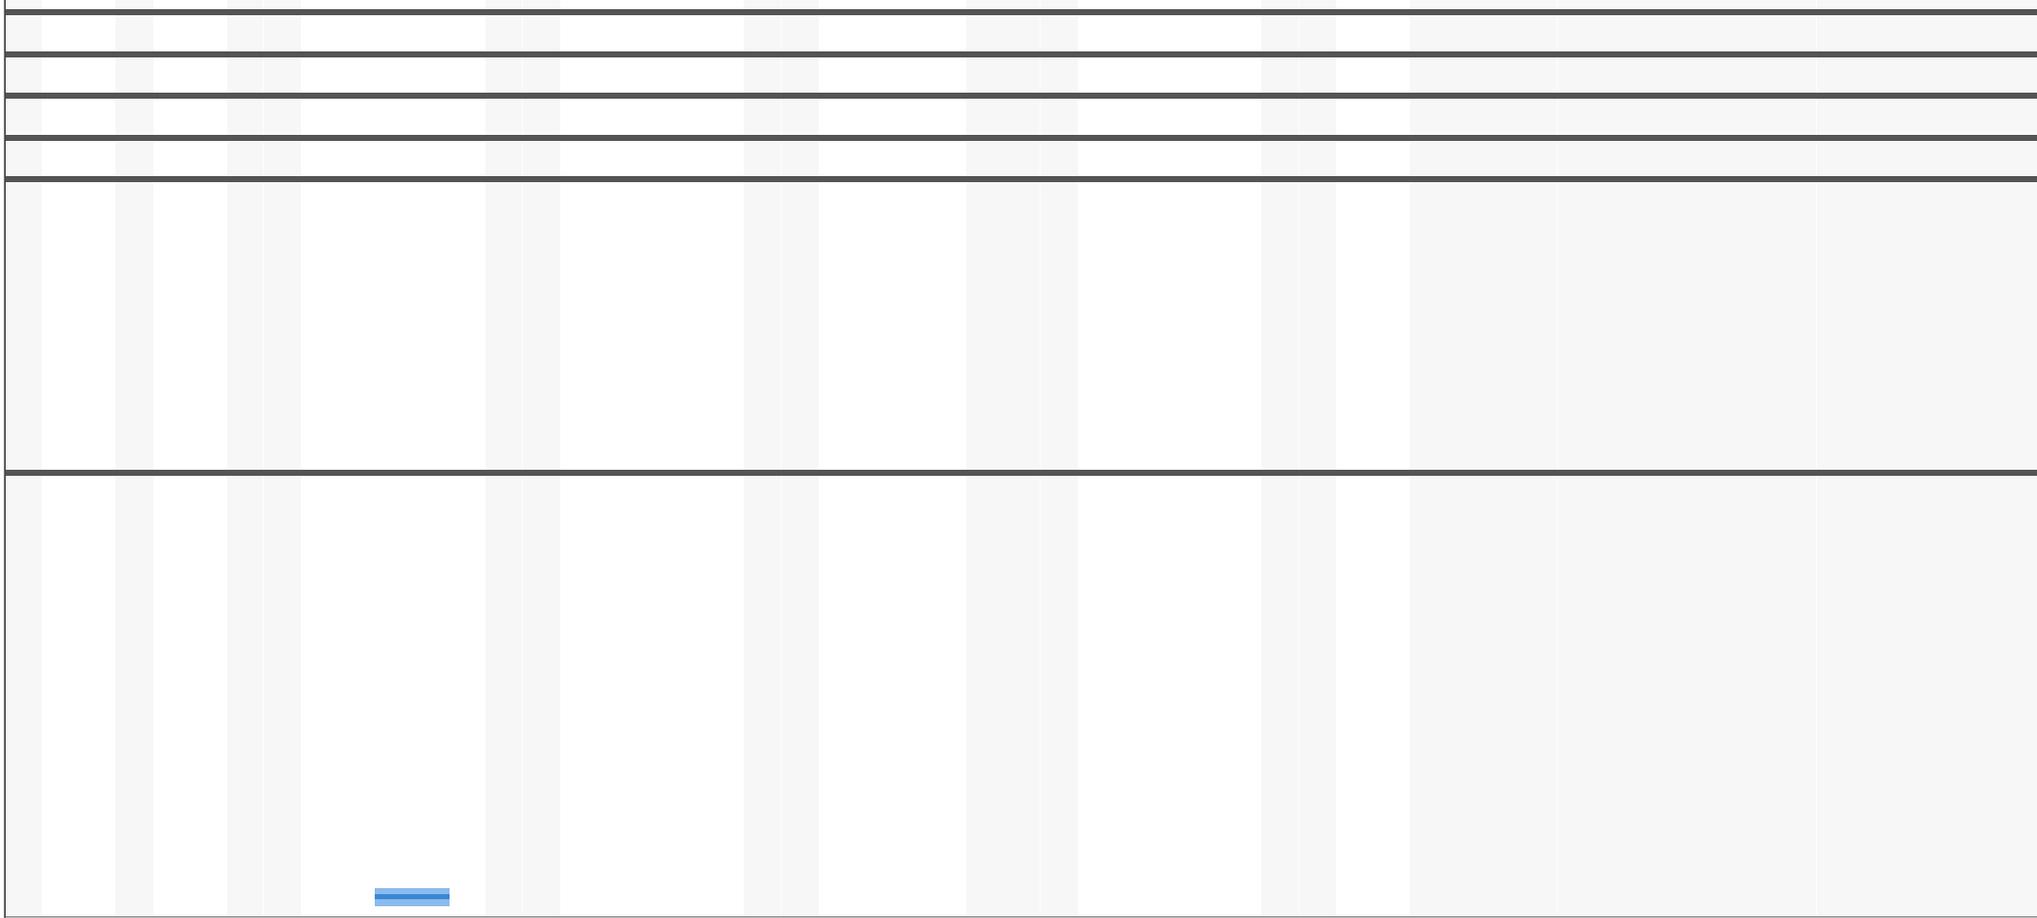


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Nov '17 | 19 Nov '17 | 26 Nov '17 | 03 Dez '17 | 10 Dez '17 | 17 Dez '17 | 24 Dez '17 | 31 Dez '17  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

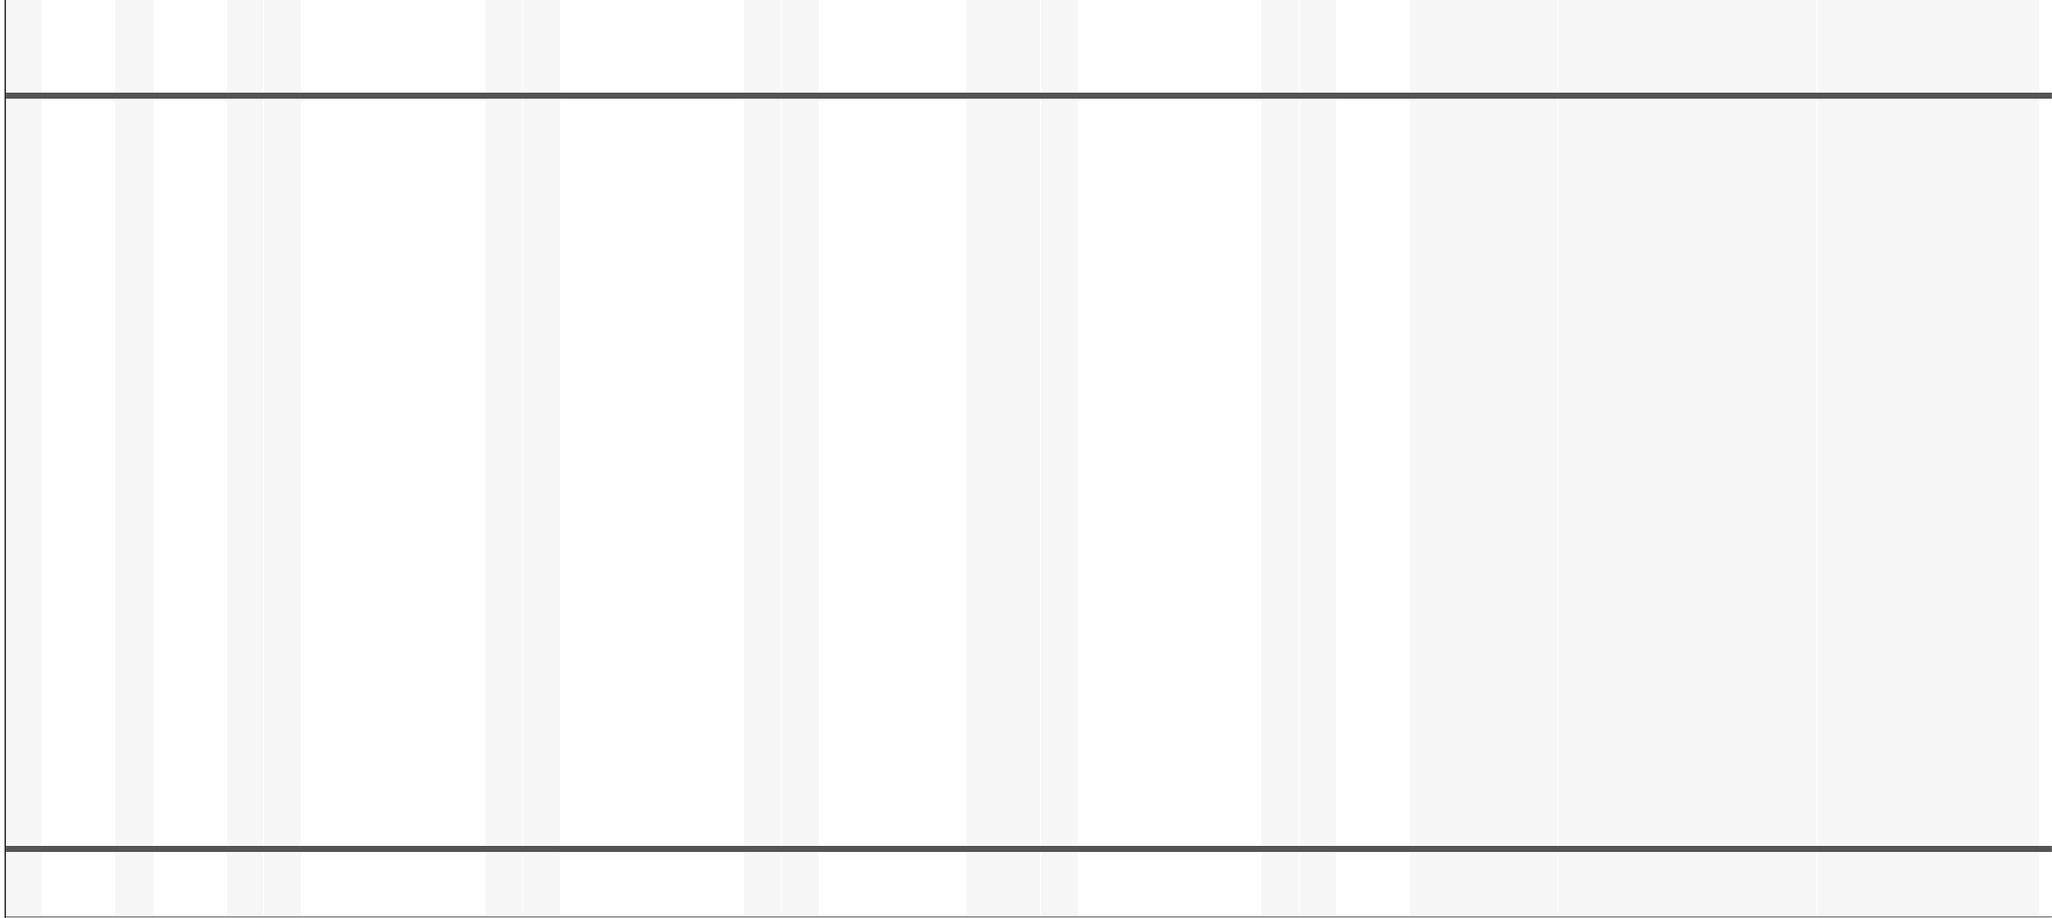


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


12 Nov '17 | 19 Nov '17 | 26 Nov '17 | 03 Dez '17 | 10 Dez '17 | 17 Dez '17 | 24 Dez '17 | 31 Dez '17  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

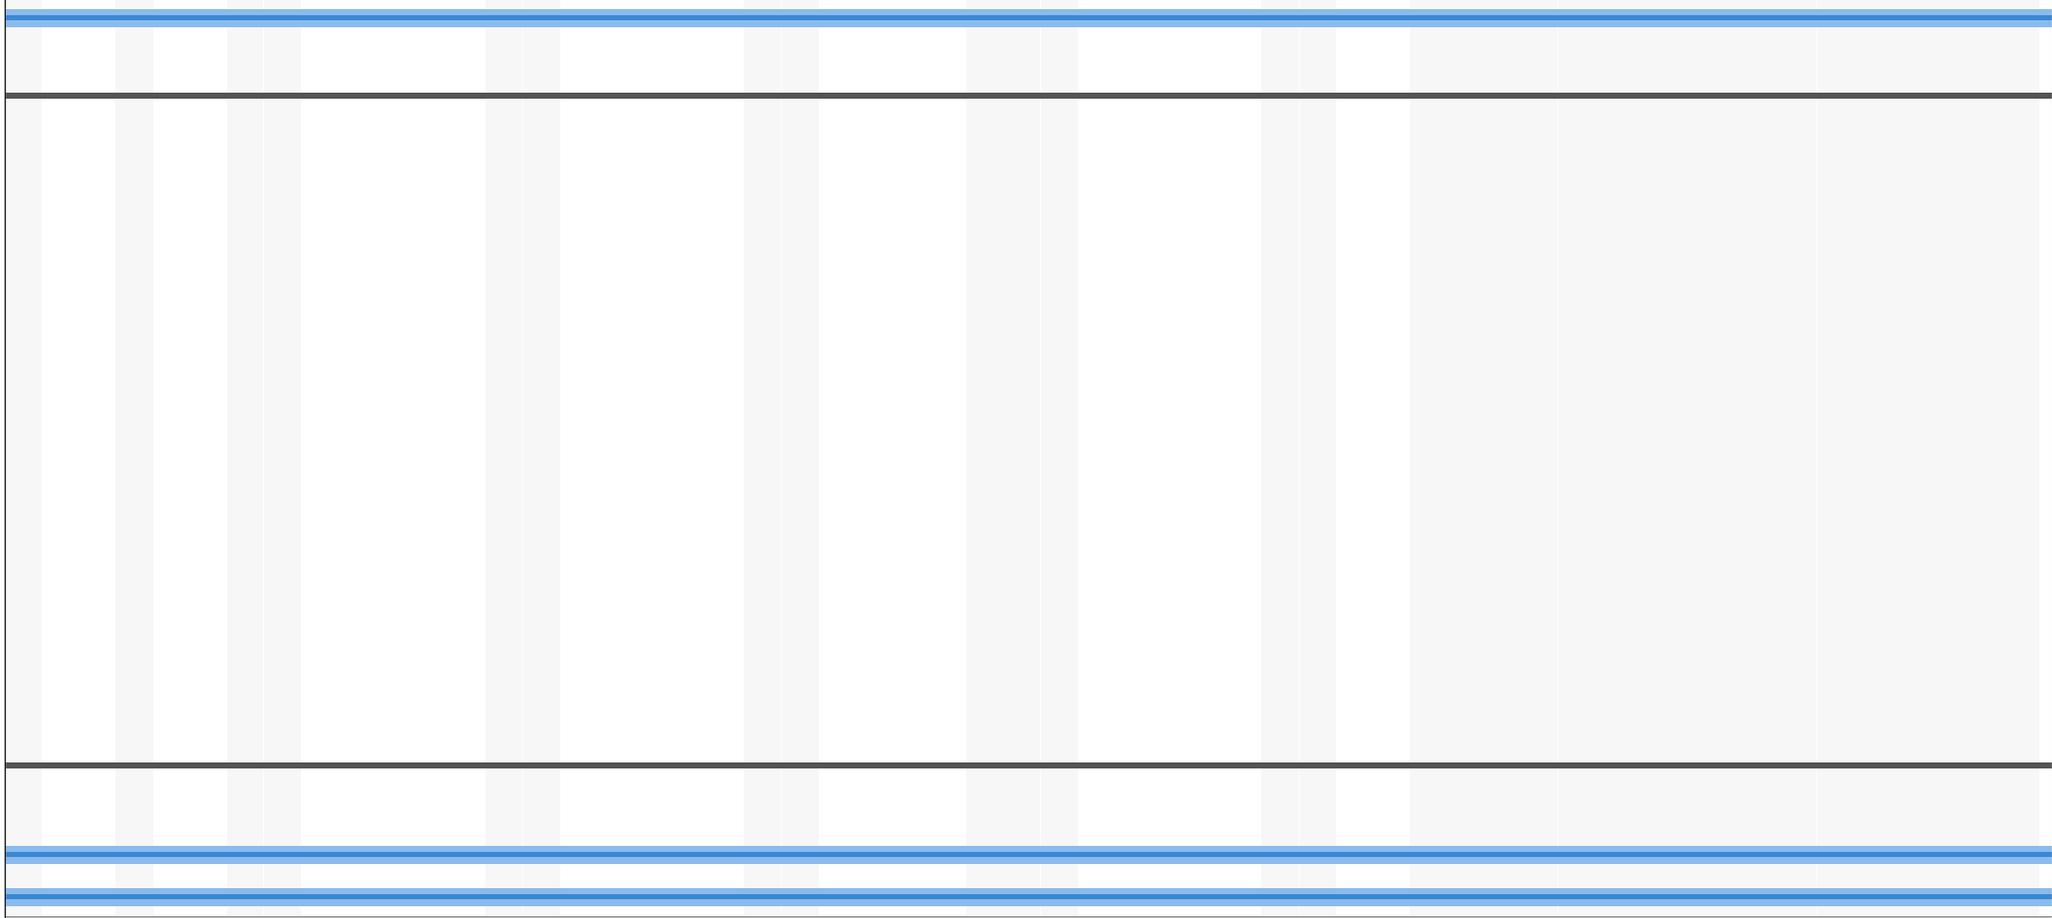


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

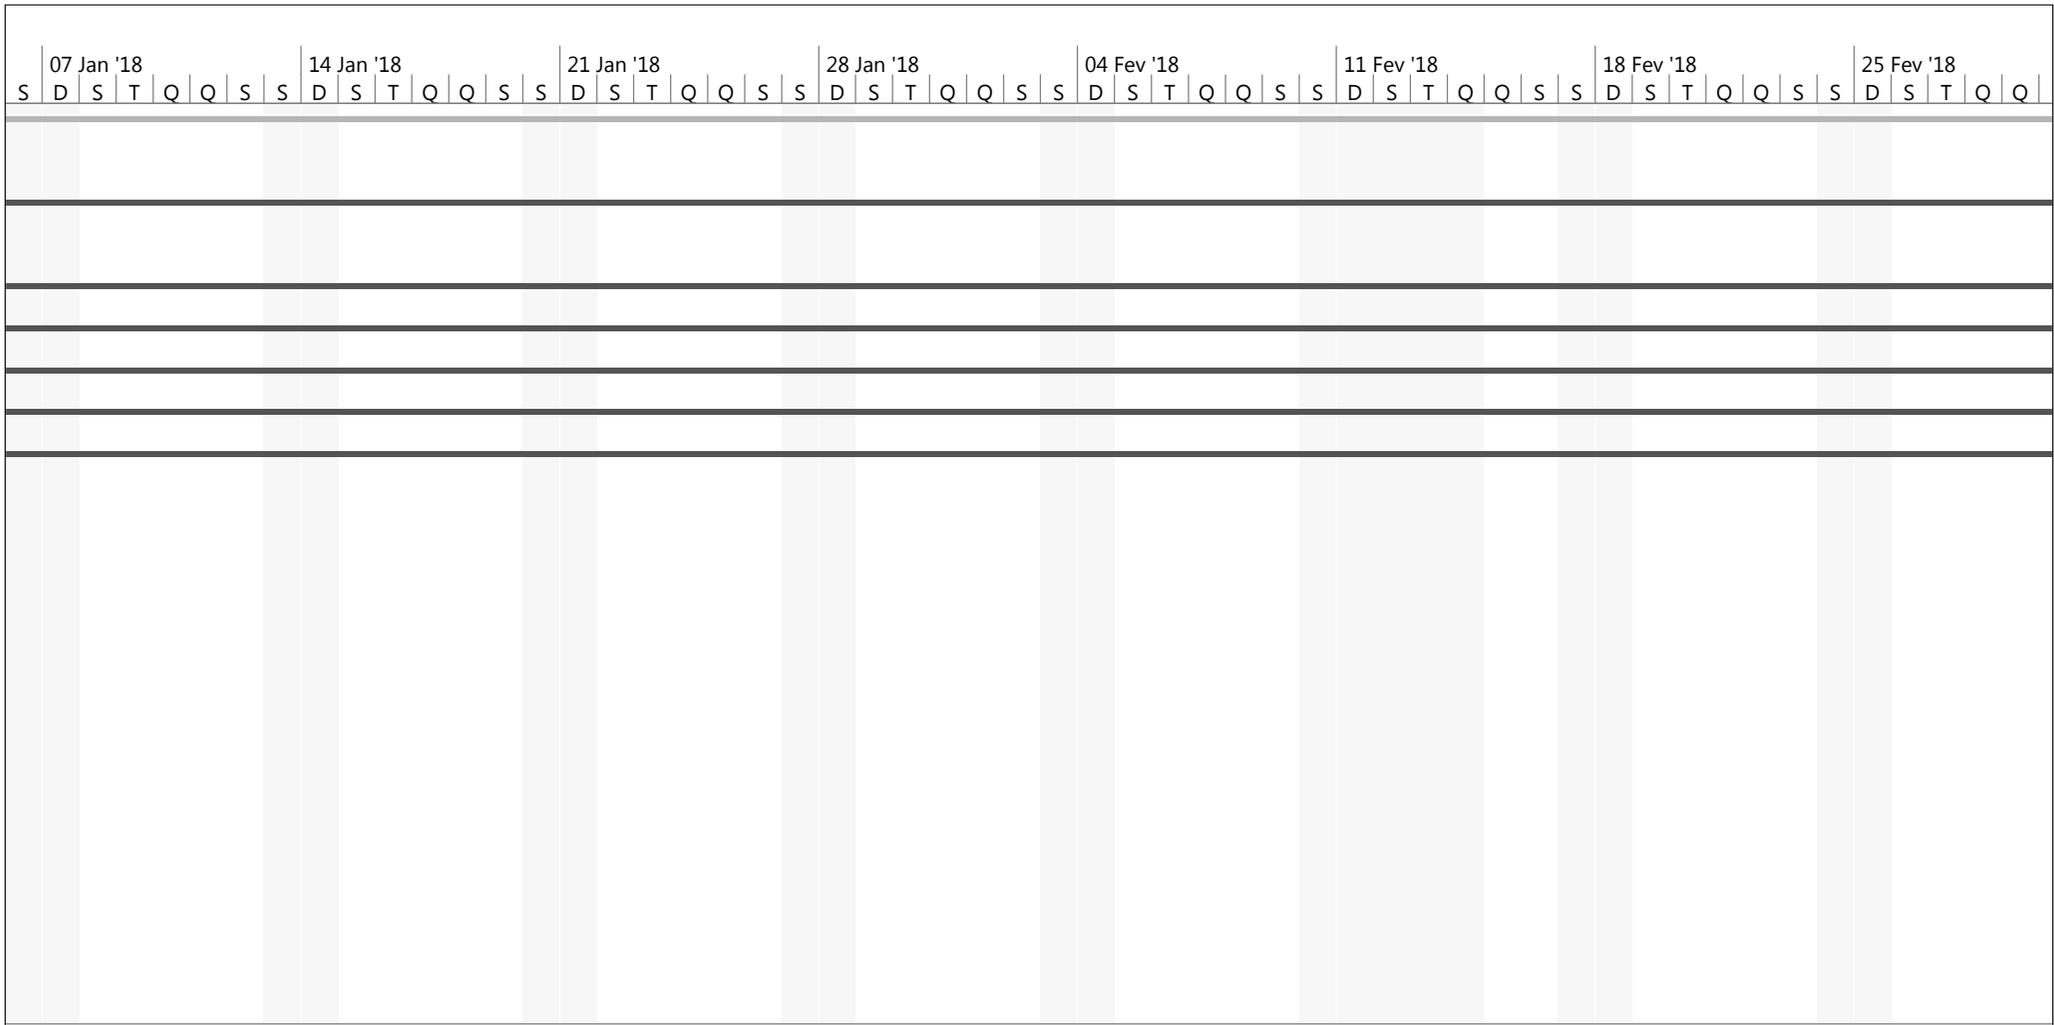


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

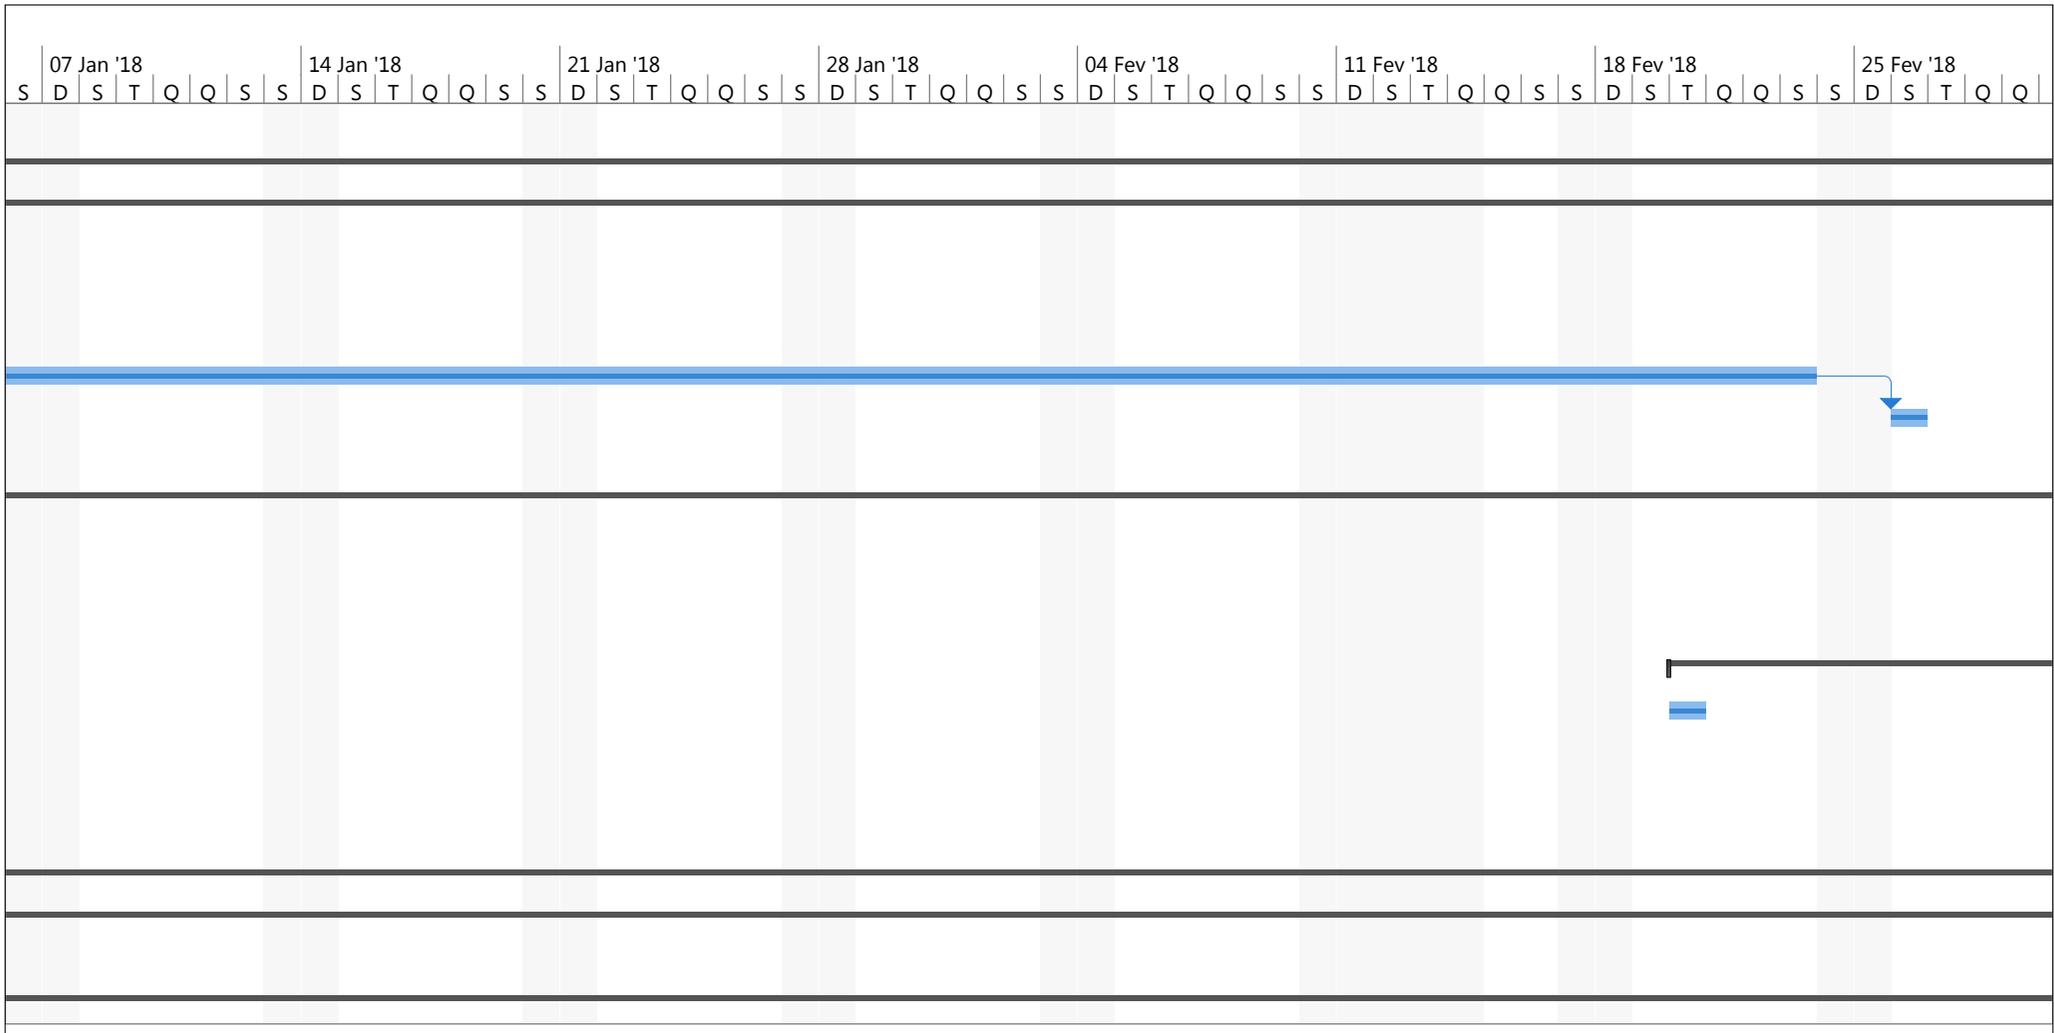

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

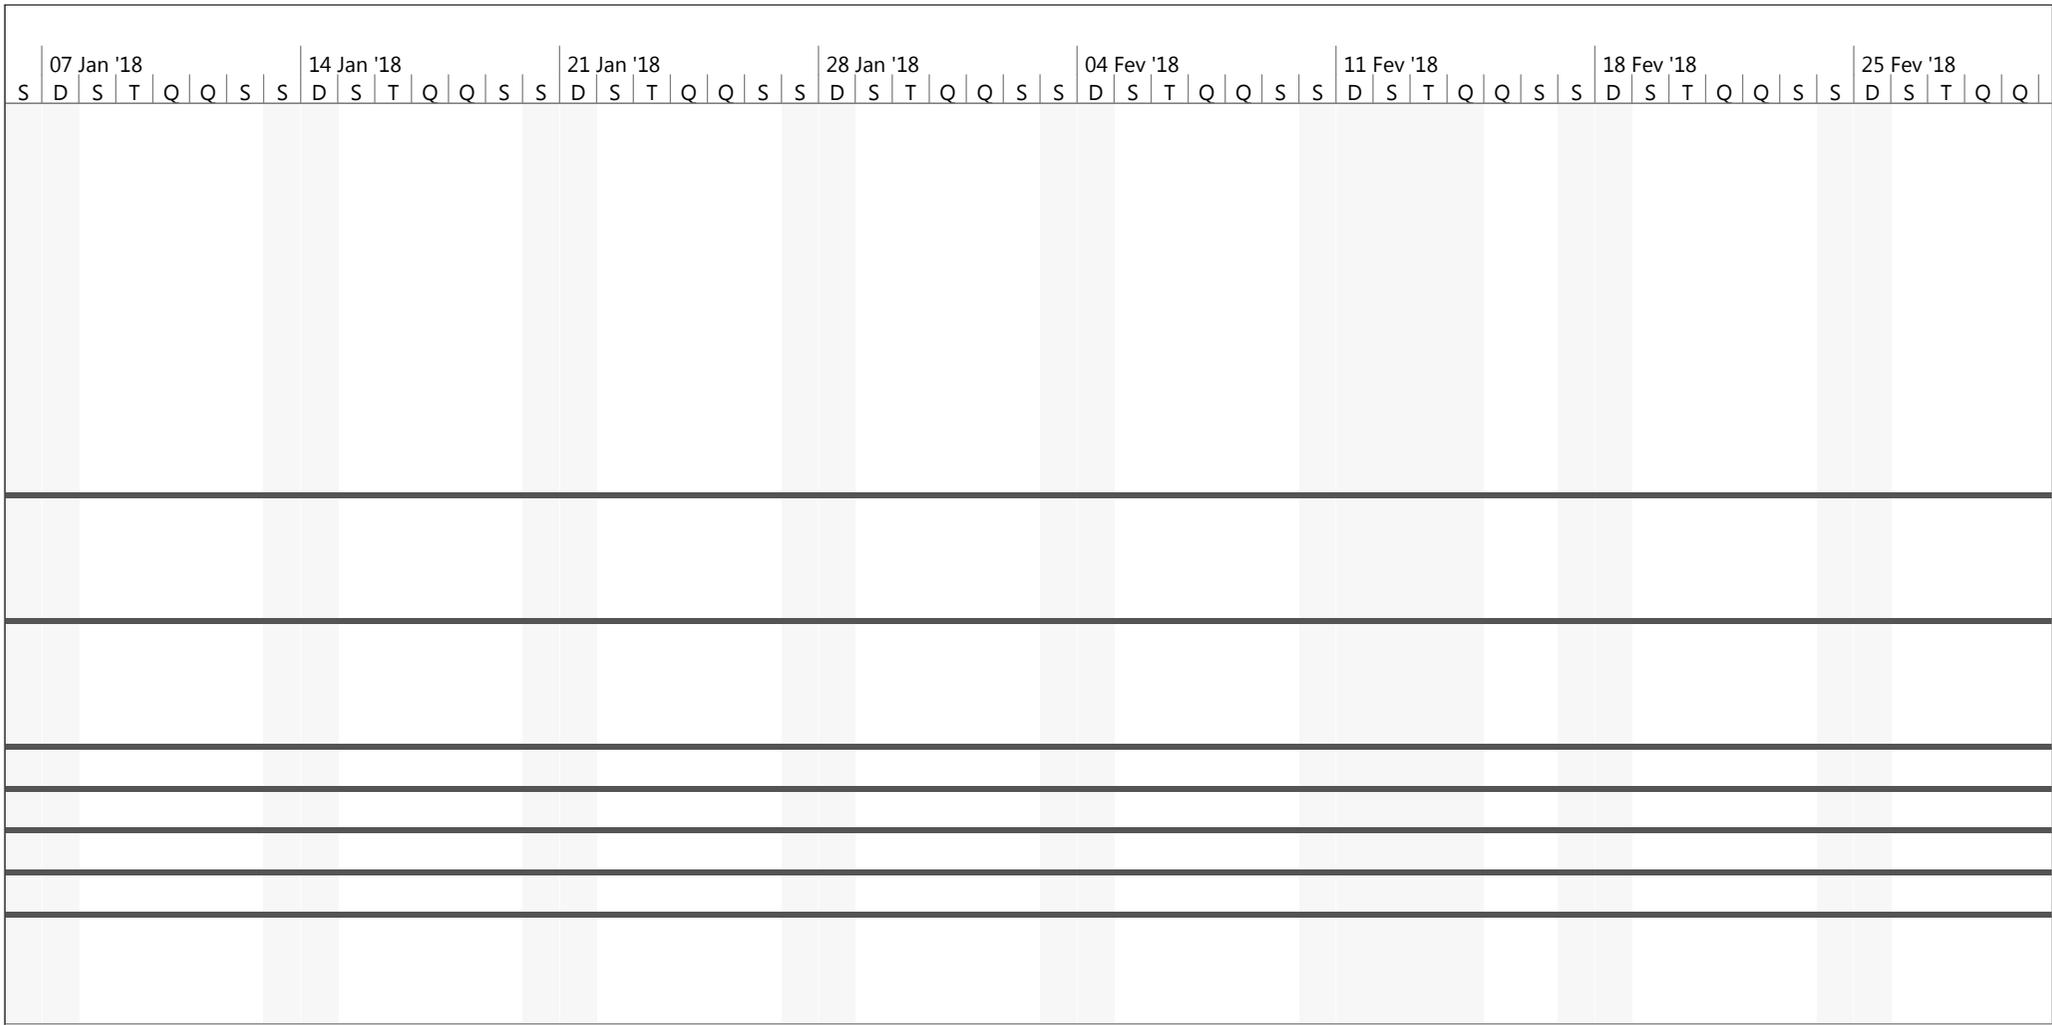

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

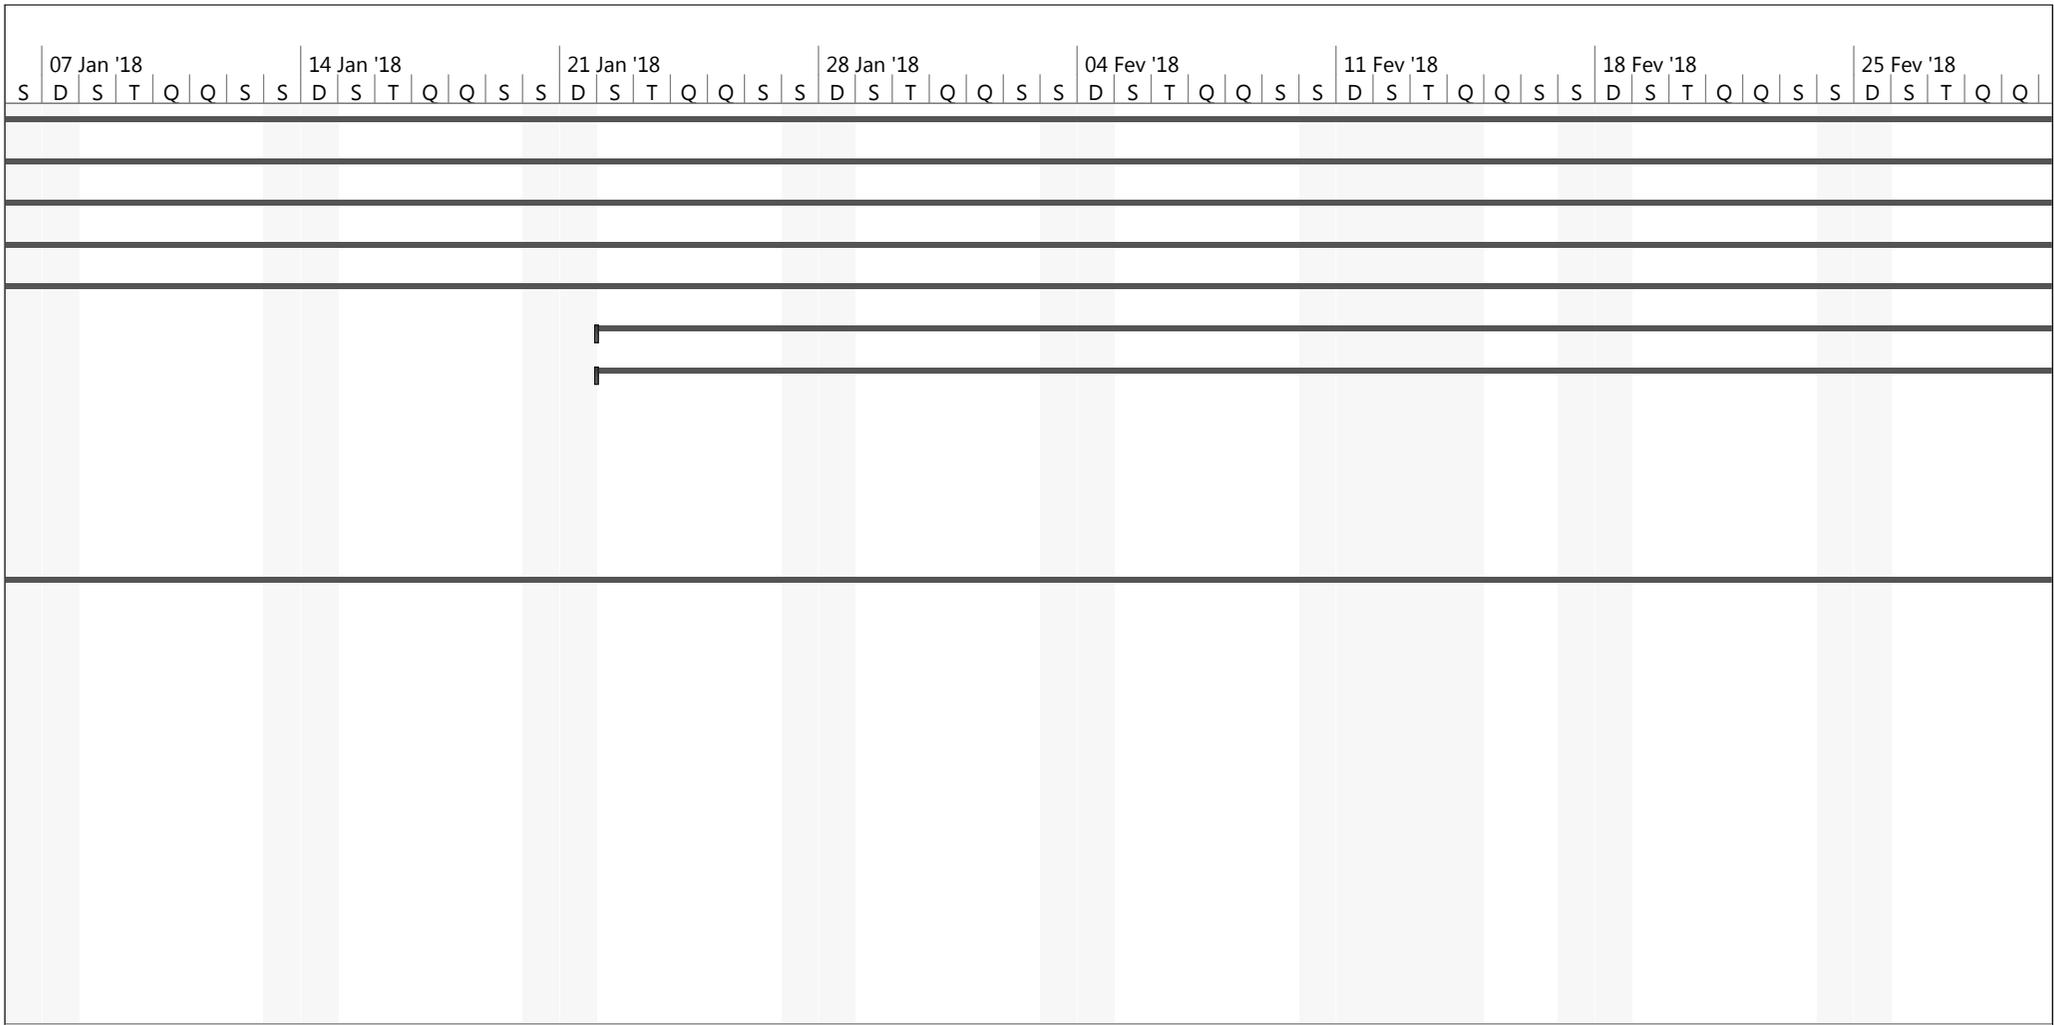

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

07 Jan '18 14 Jan '18 21 Jan '18 28 Jan '18 04 Feb '18 11 Feb '18 18 Feb '18 25 Feb '18  
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

07 Jan '18 14 Jan '18 21 Jan '18 28 Jan '18 04 Feb '18 11 Feb '18 18 Feb '18 25 Feb '18  
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

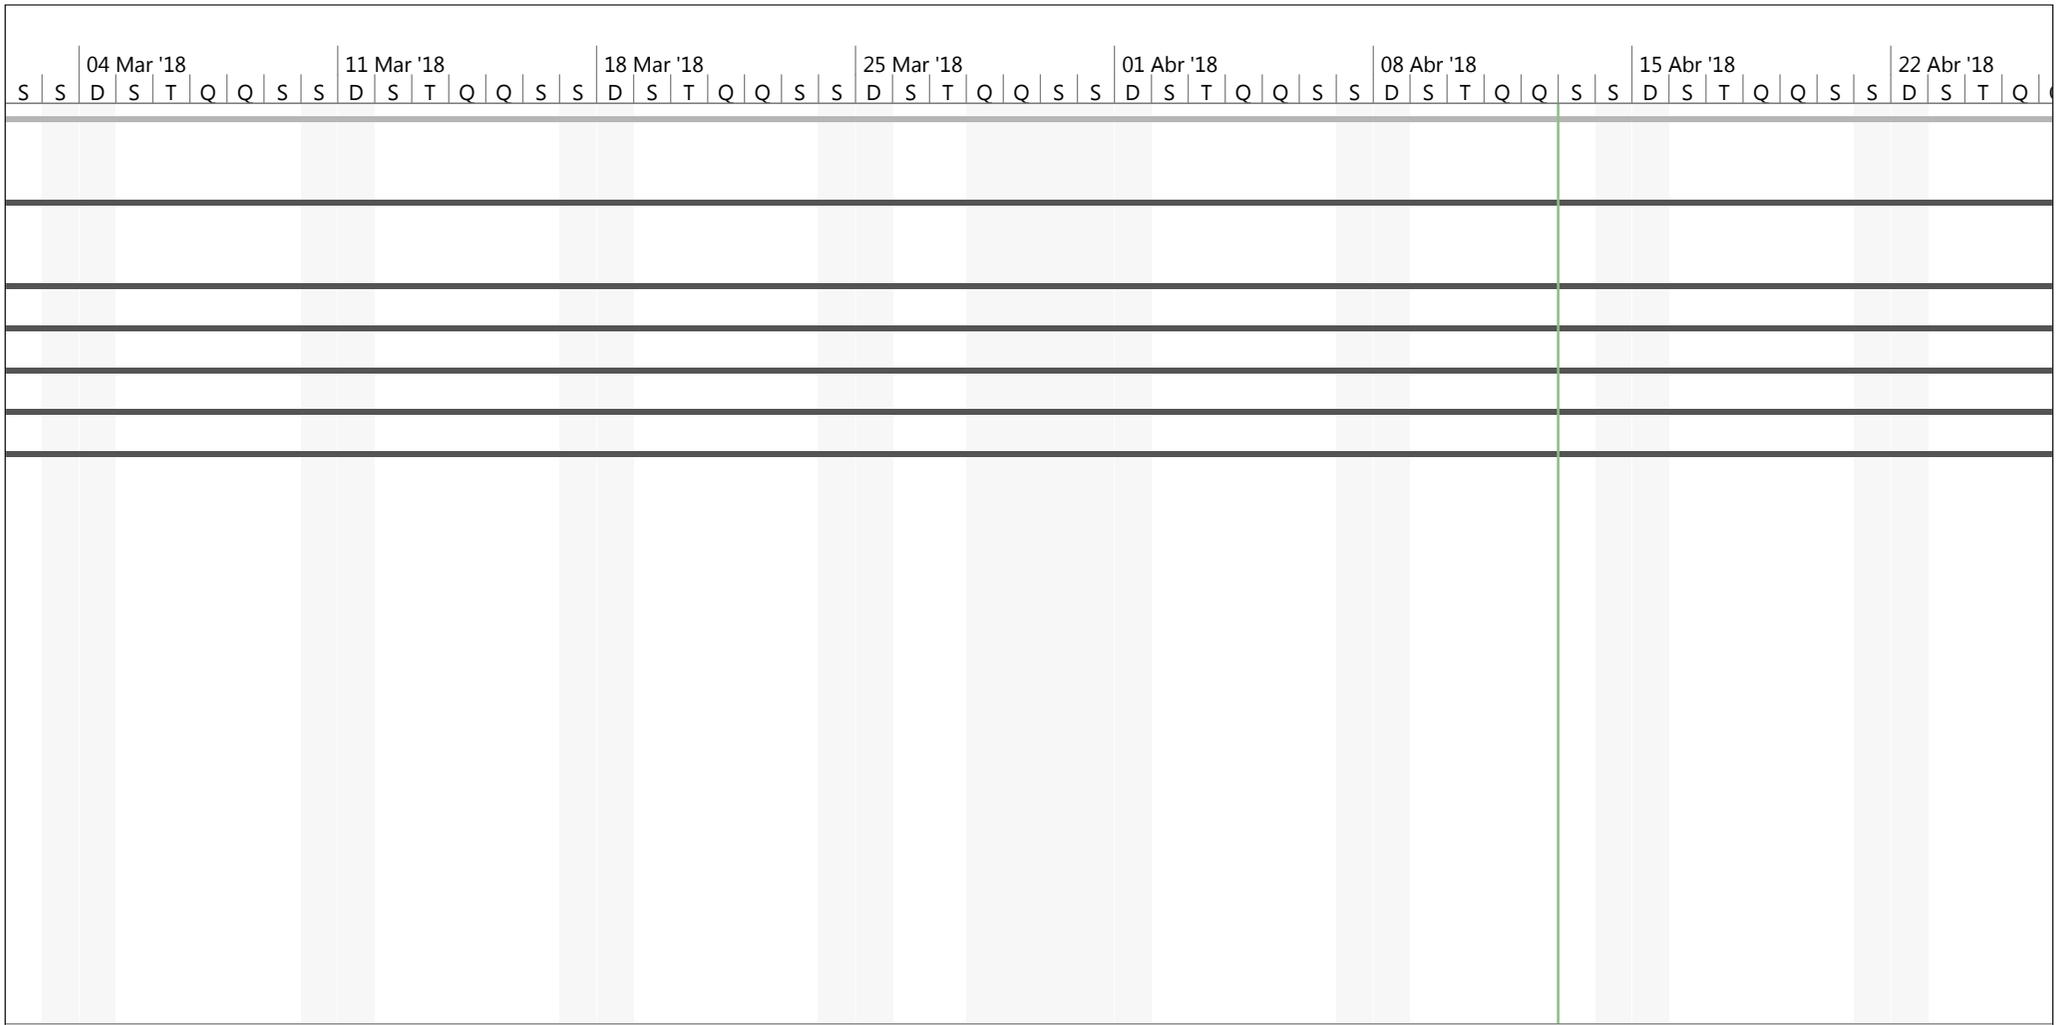


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

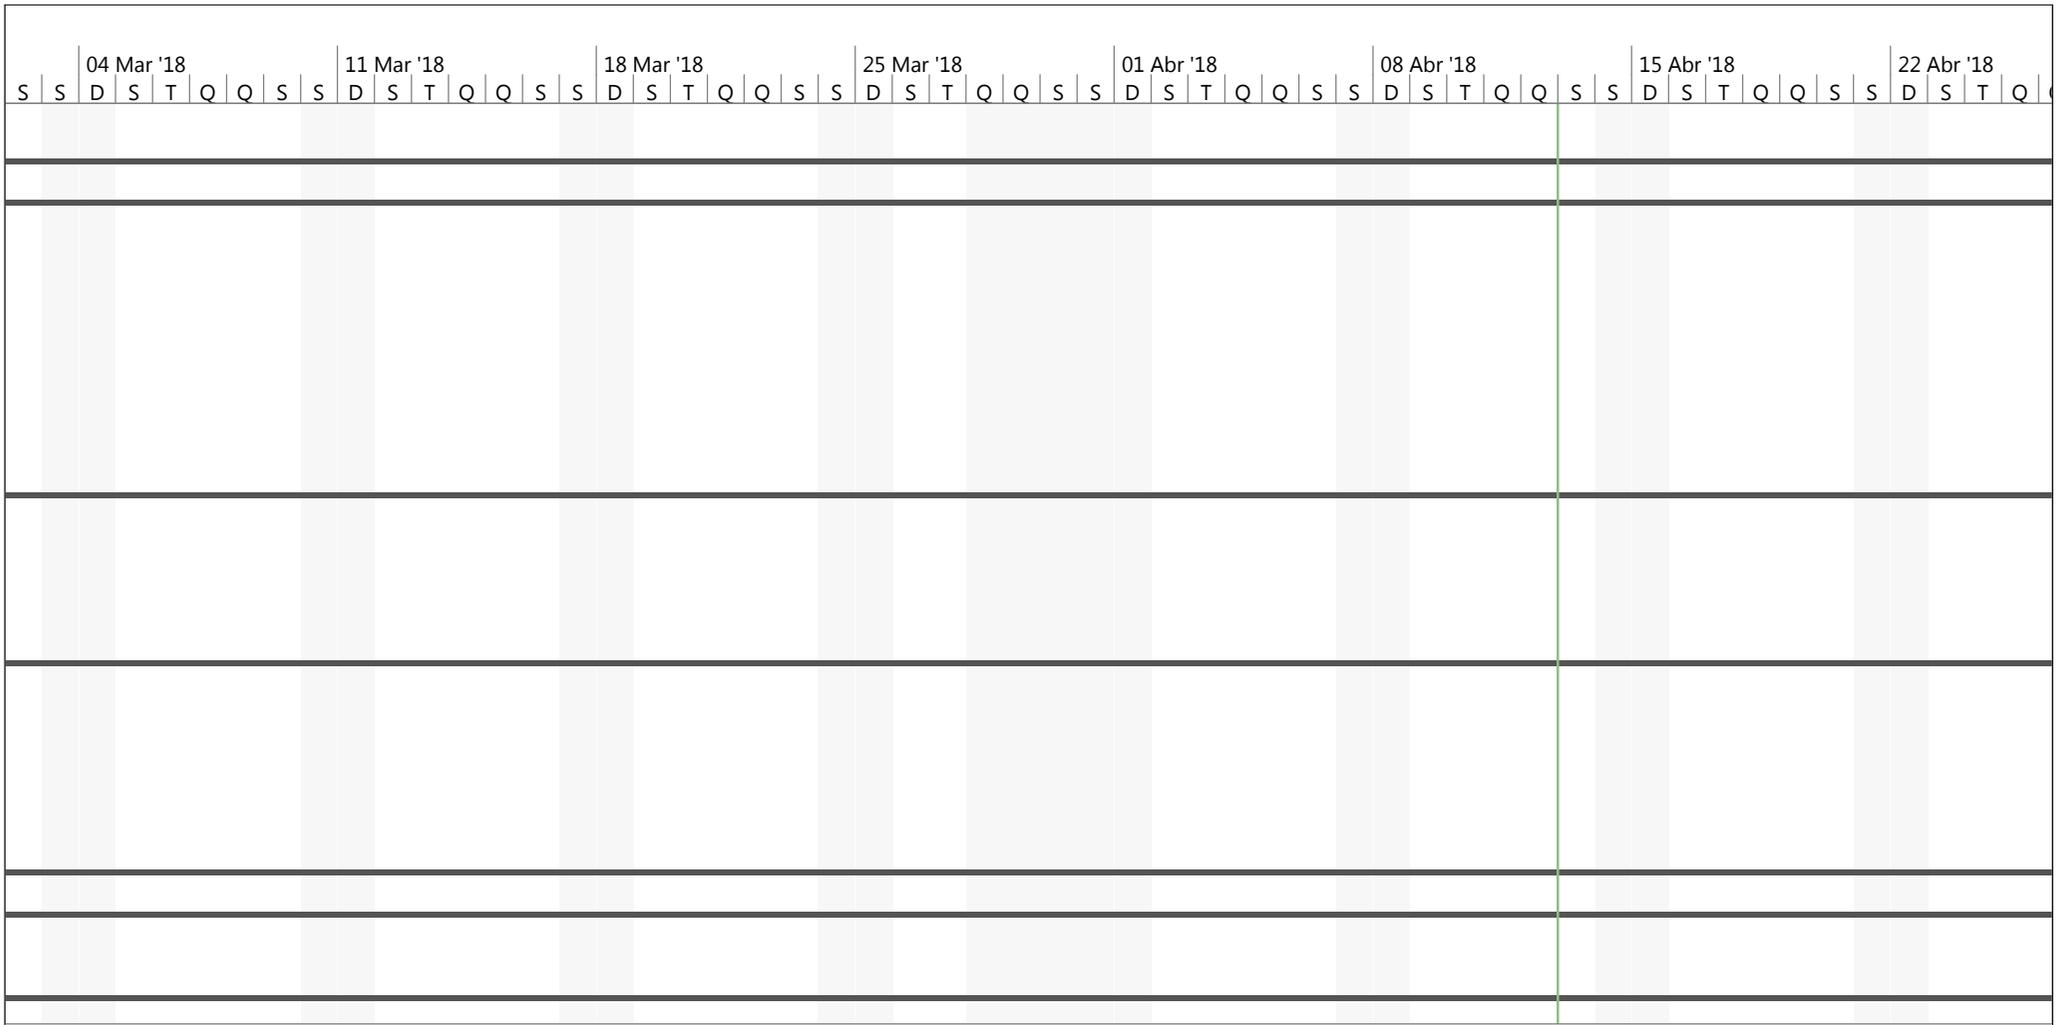


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

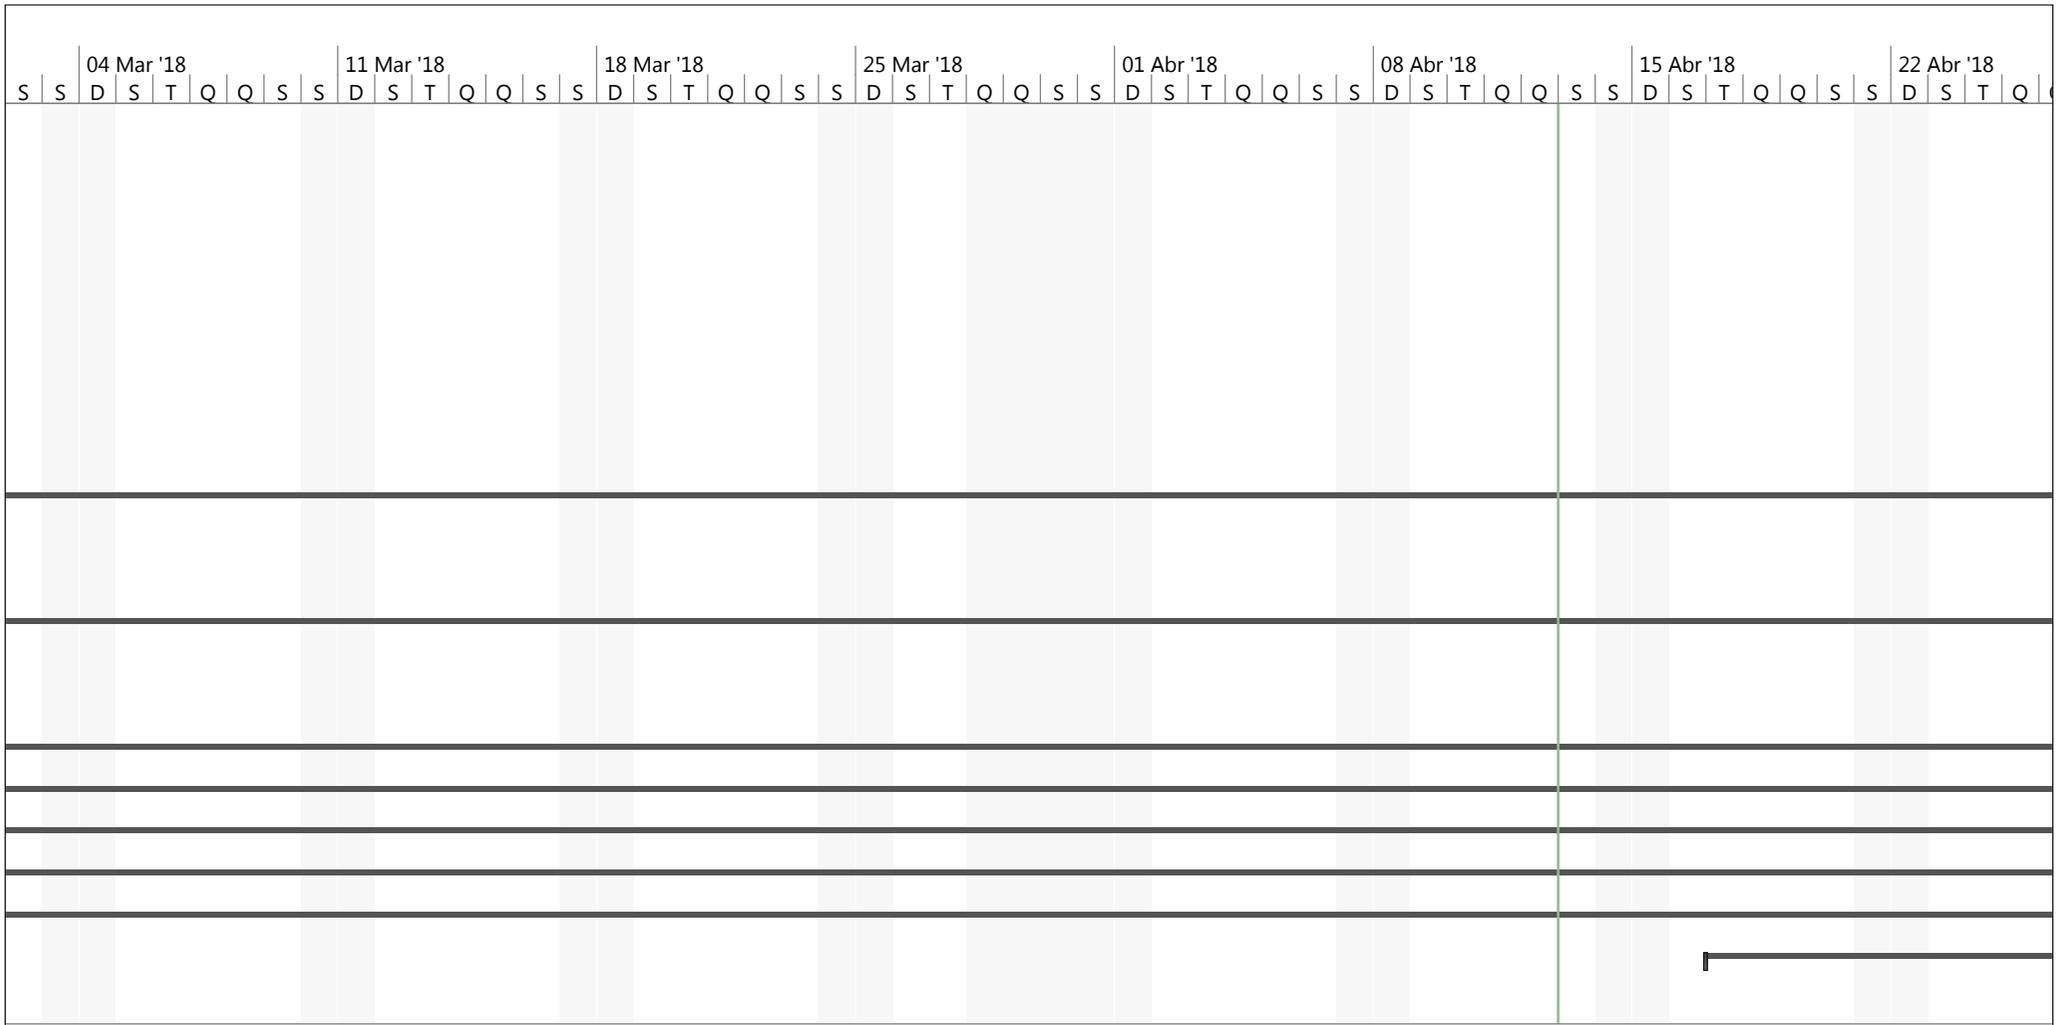


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

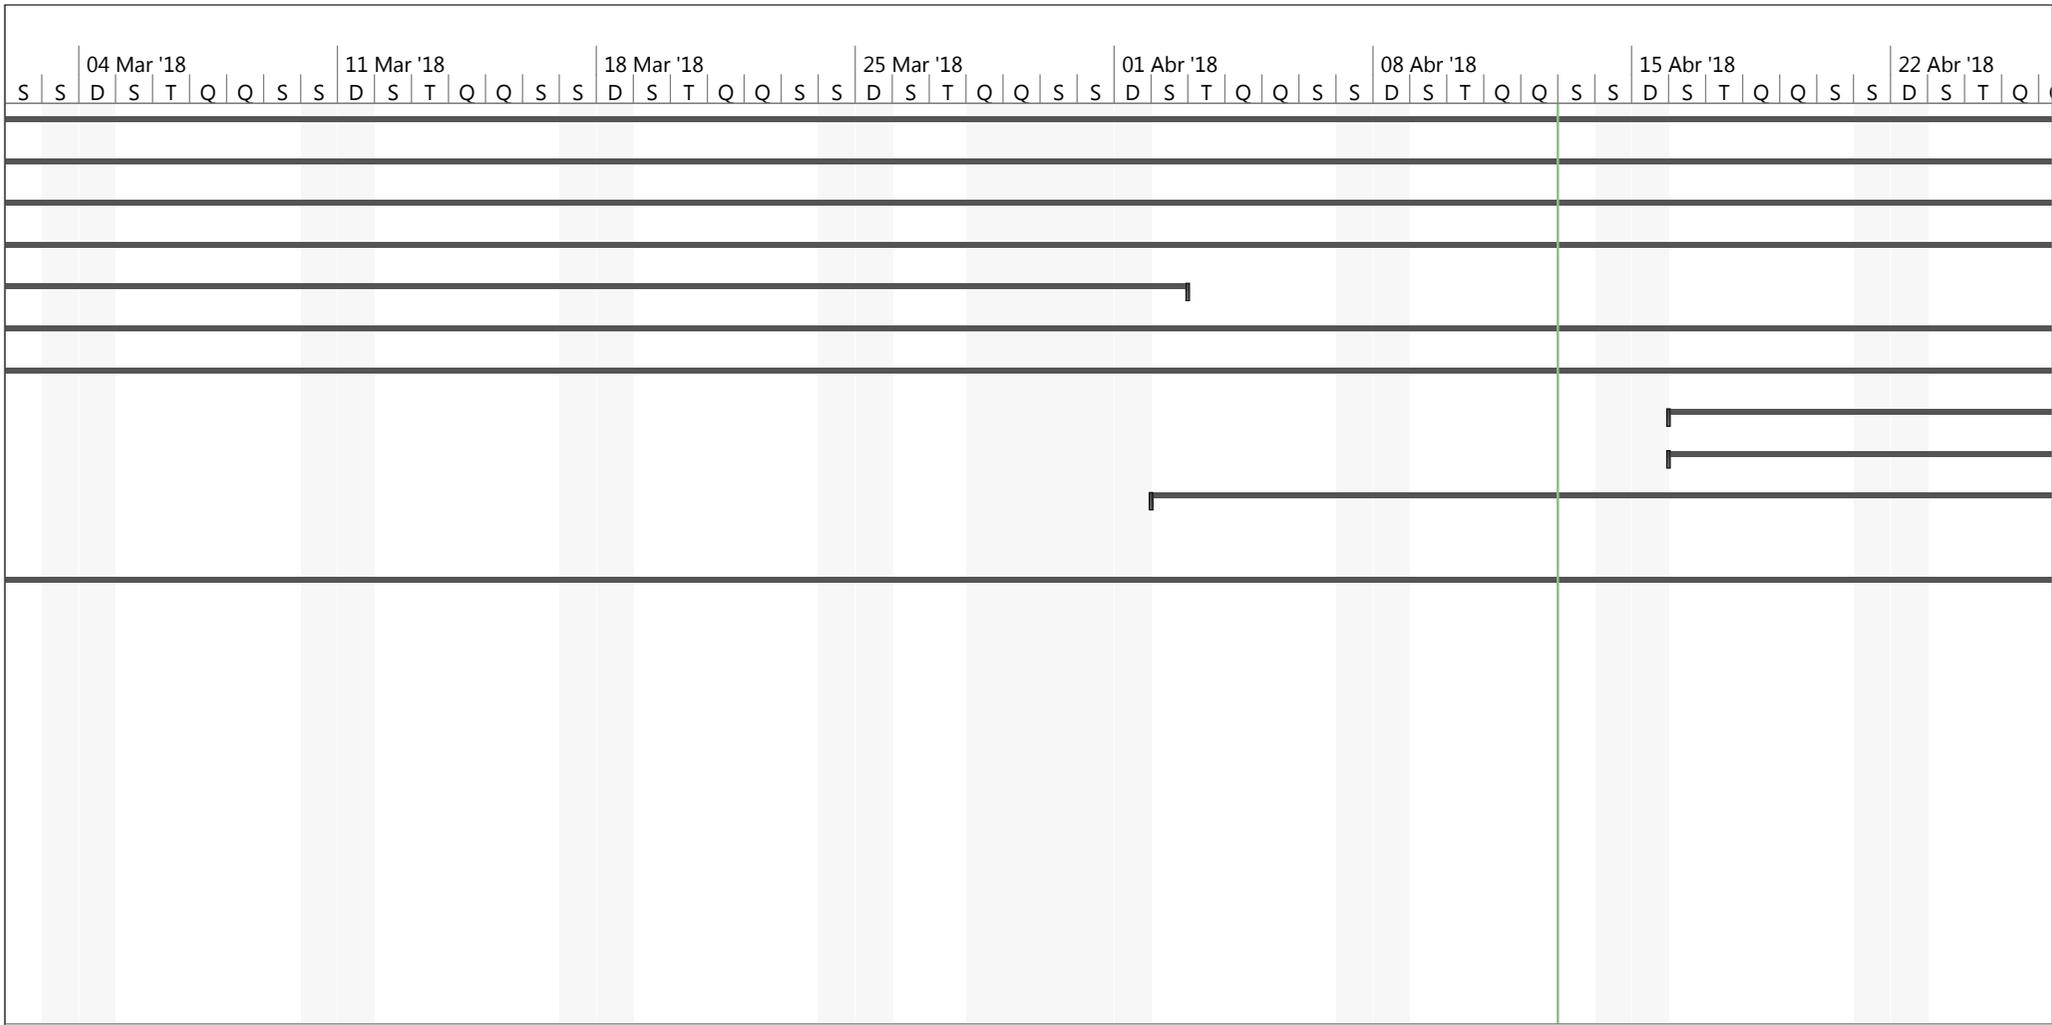


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

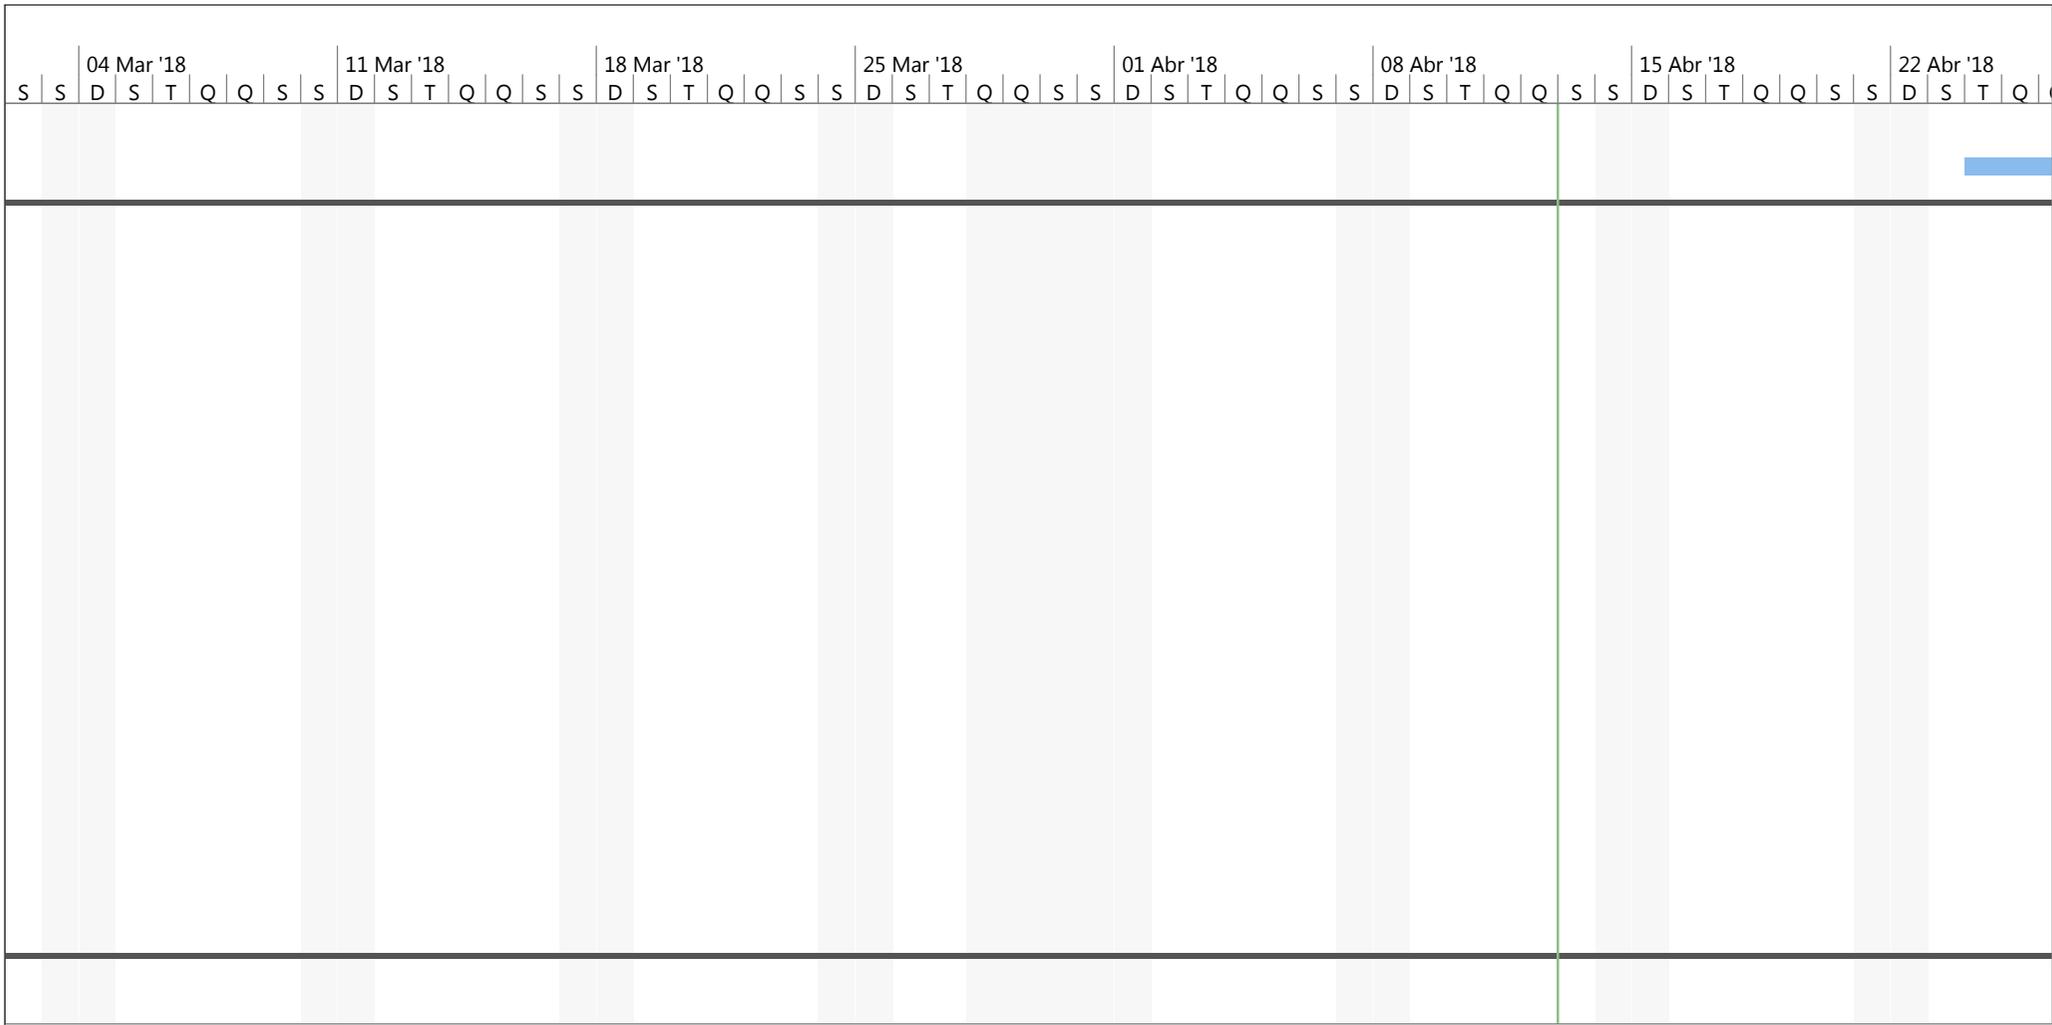

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

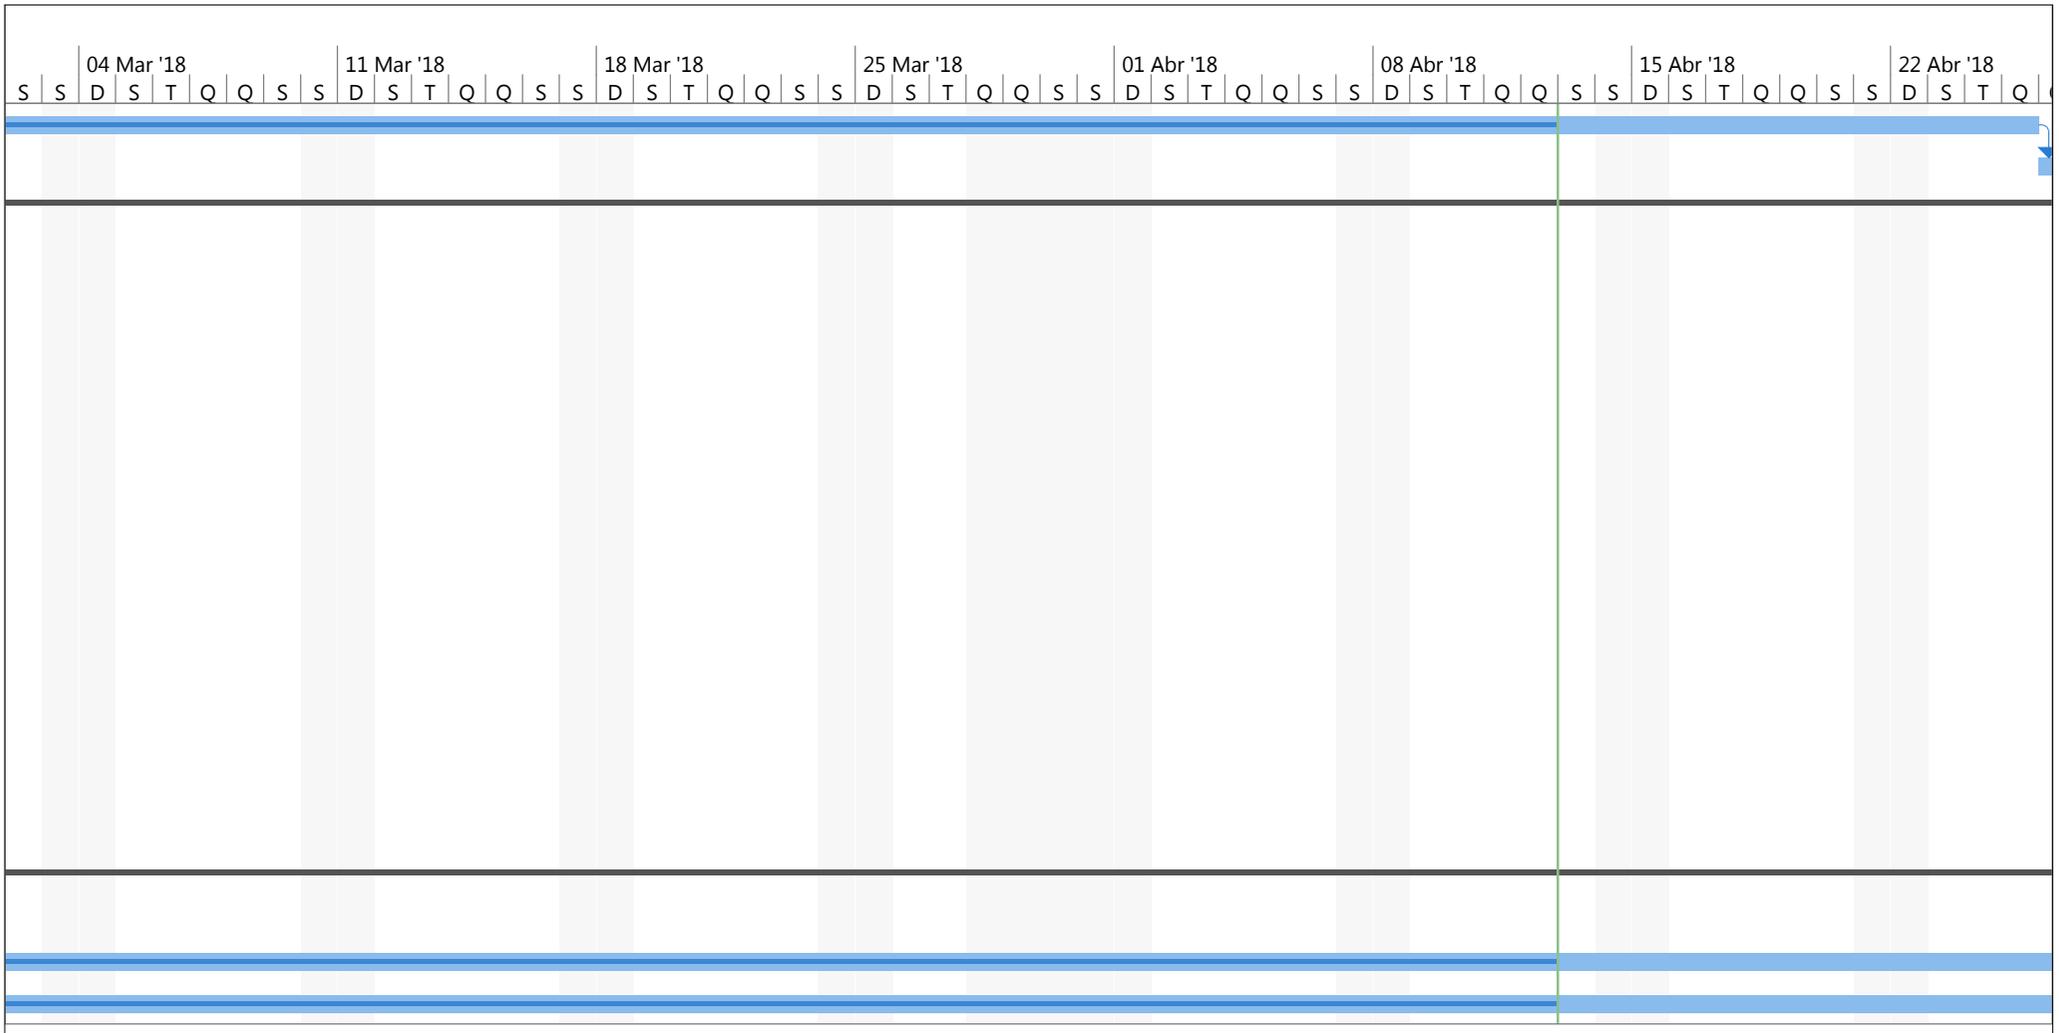


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Q S S 29 Abr '18 D S T Q Q S S 06 Mai '18 D S T Q Q S S 13 Mai '18 D S T Q Q S S 20 Mai '18 D S T Q Q S S 27 Mai '18 D S T Q Q S S 03 Jun '18 D S T Q Q S S 10 Jun '18 D S T Q Q S S 17 Jun '18 D S T Q

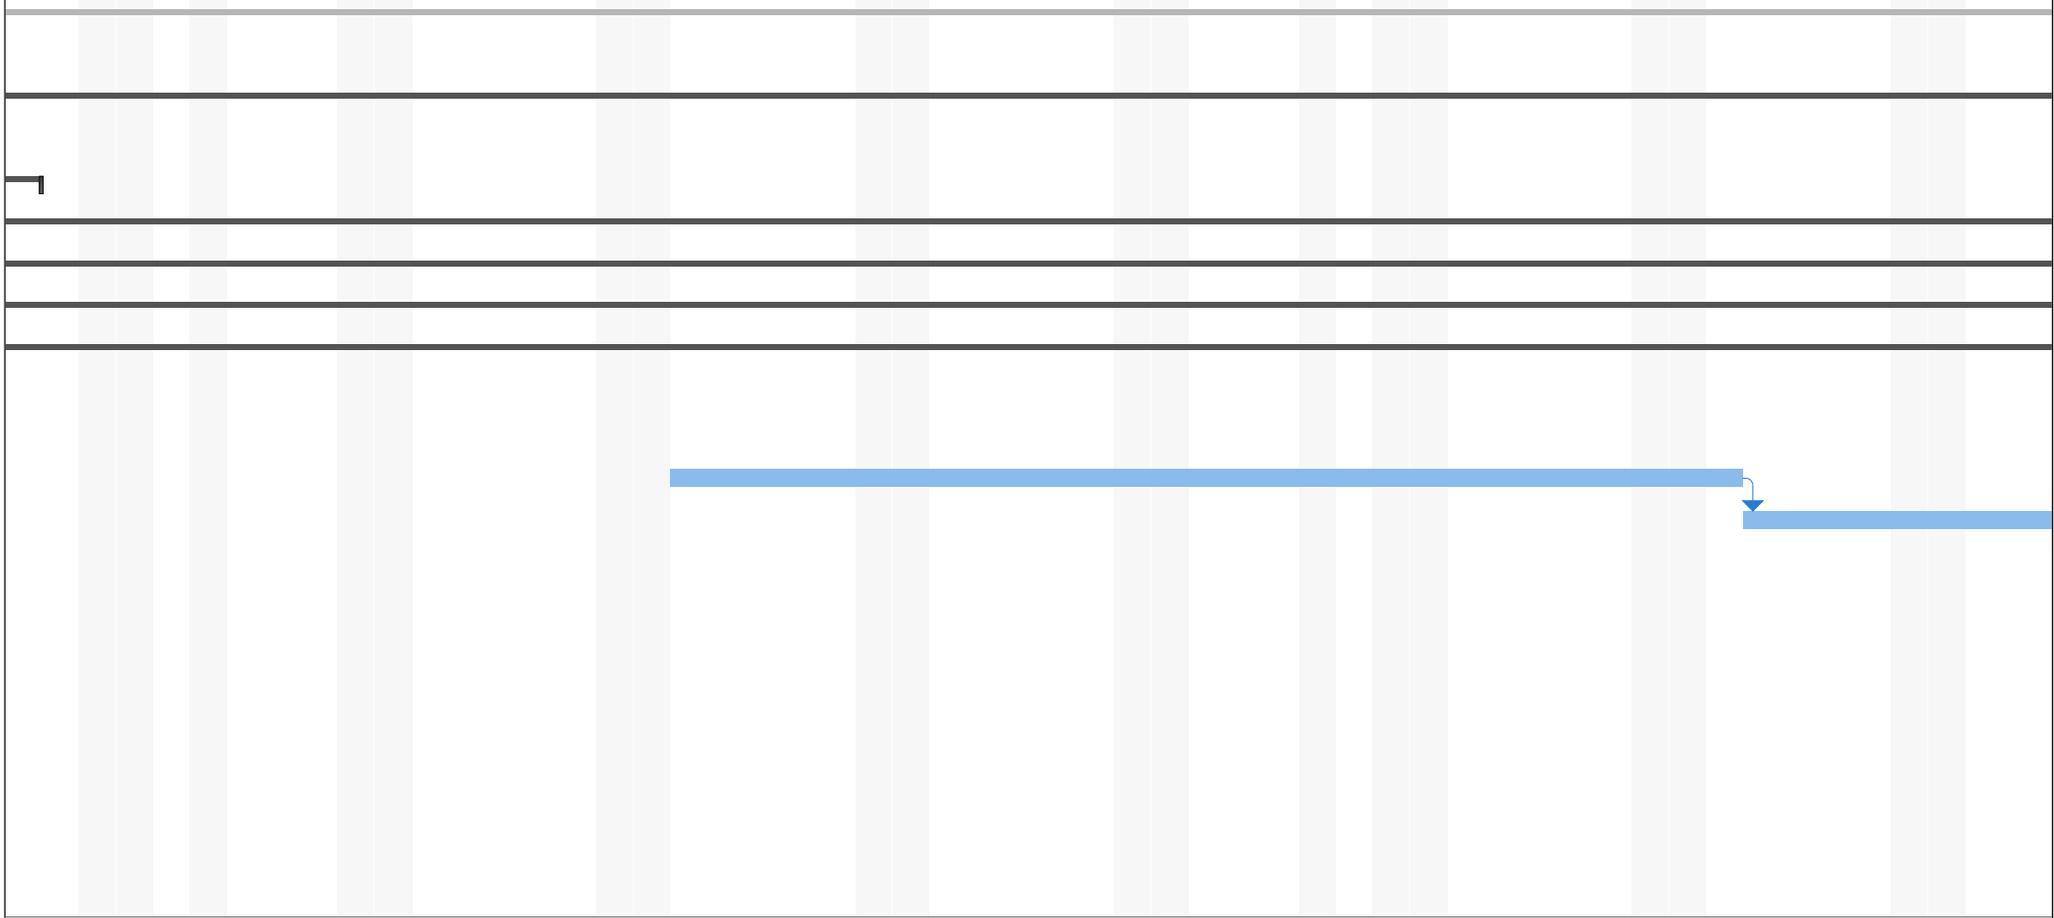


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

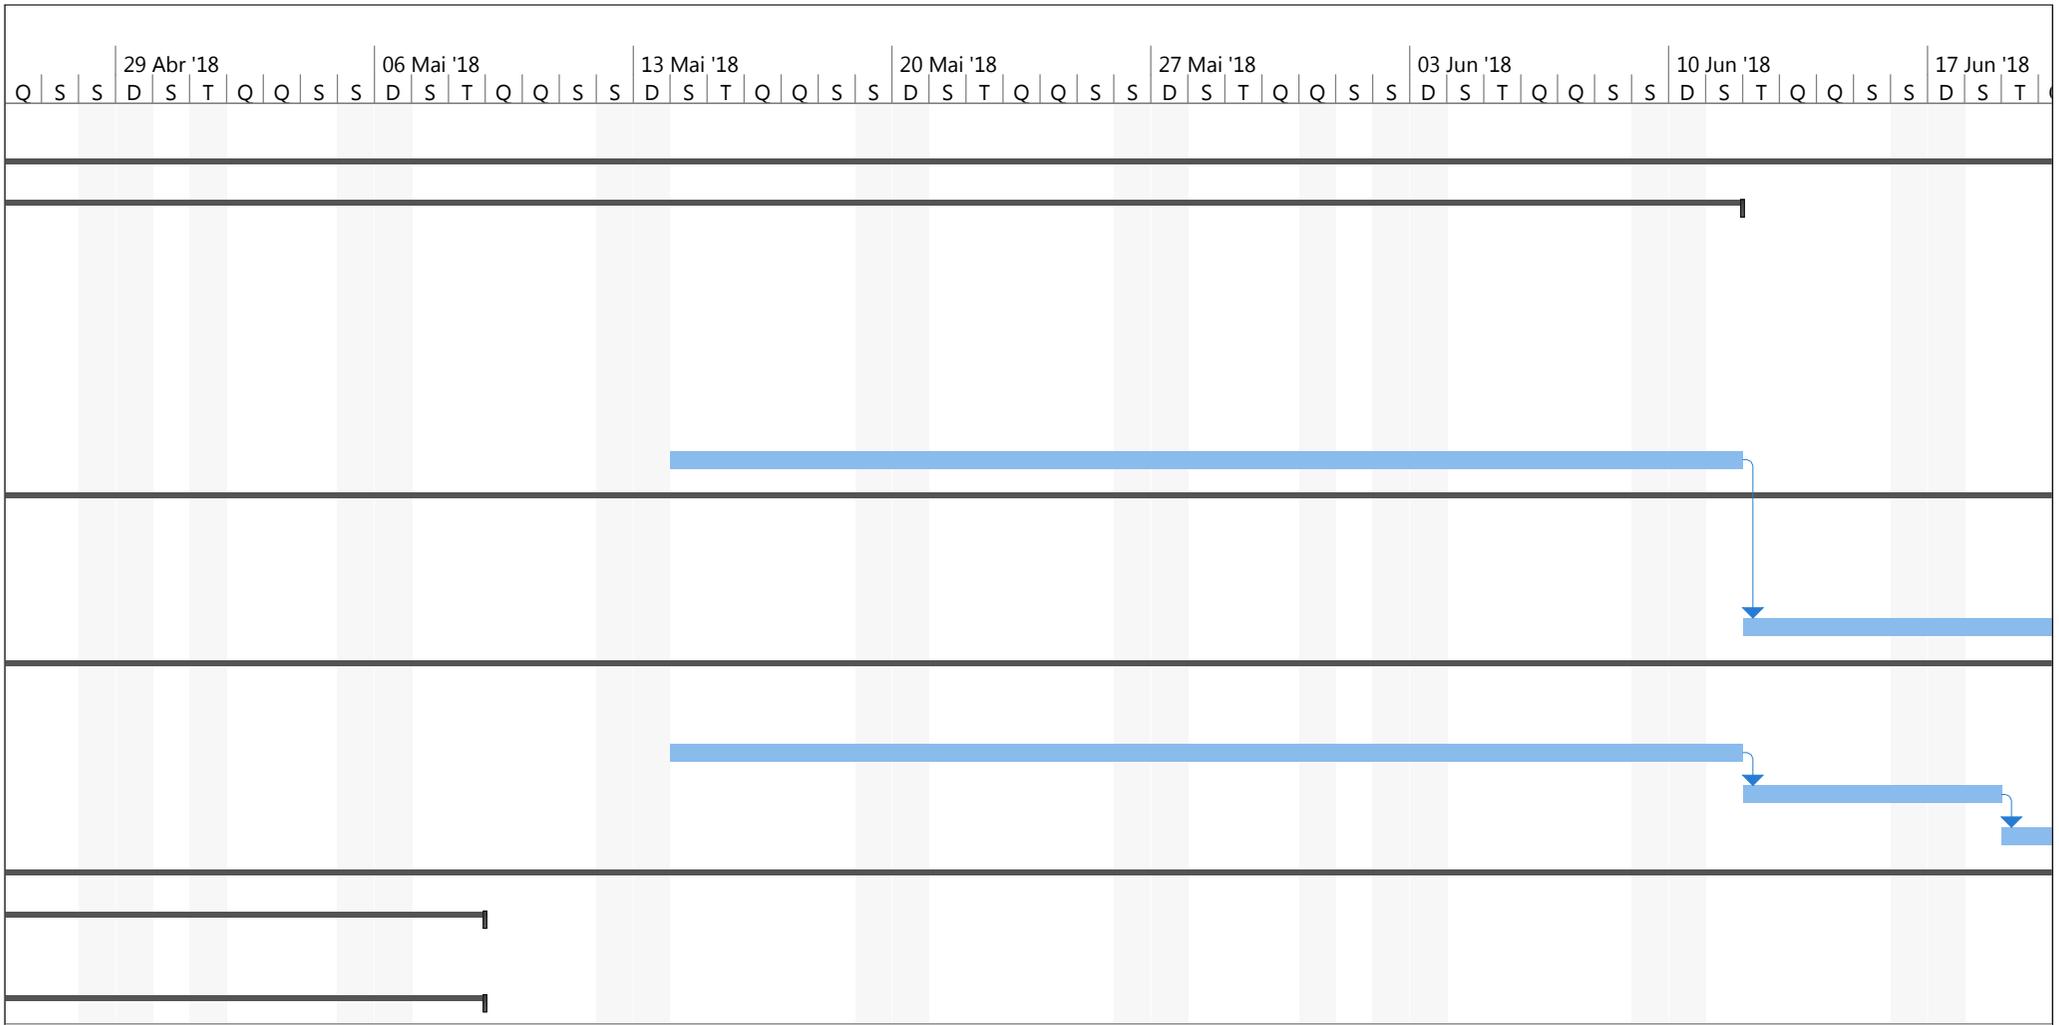

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

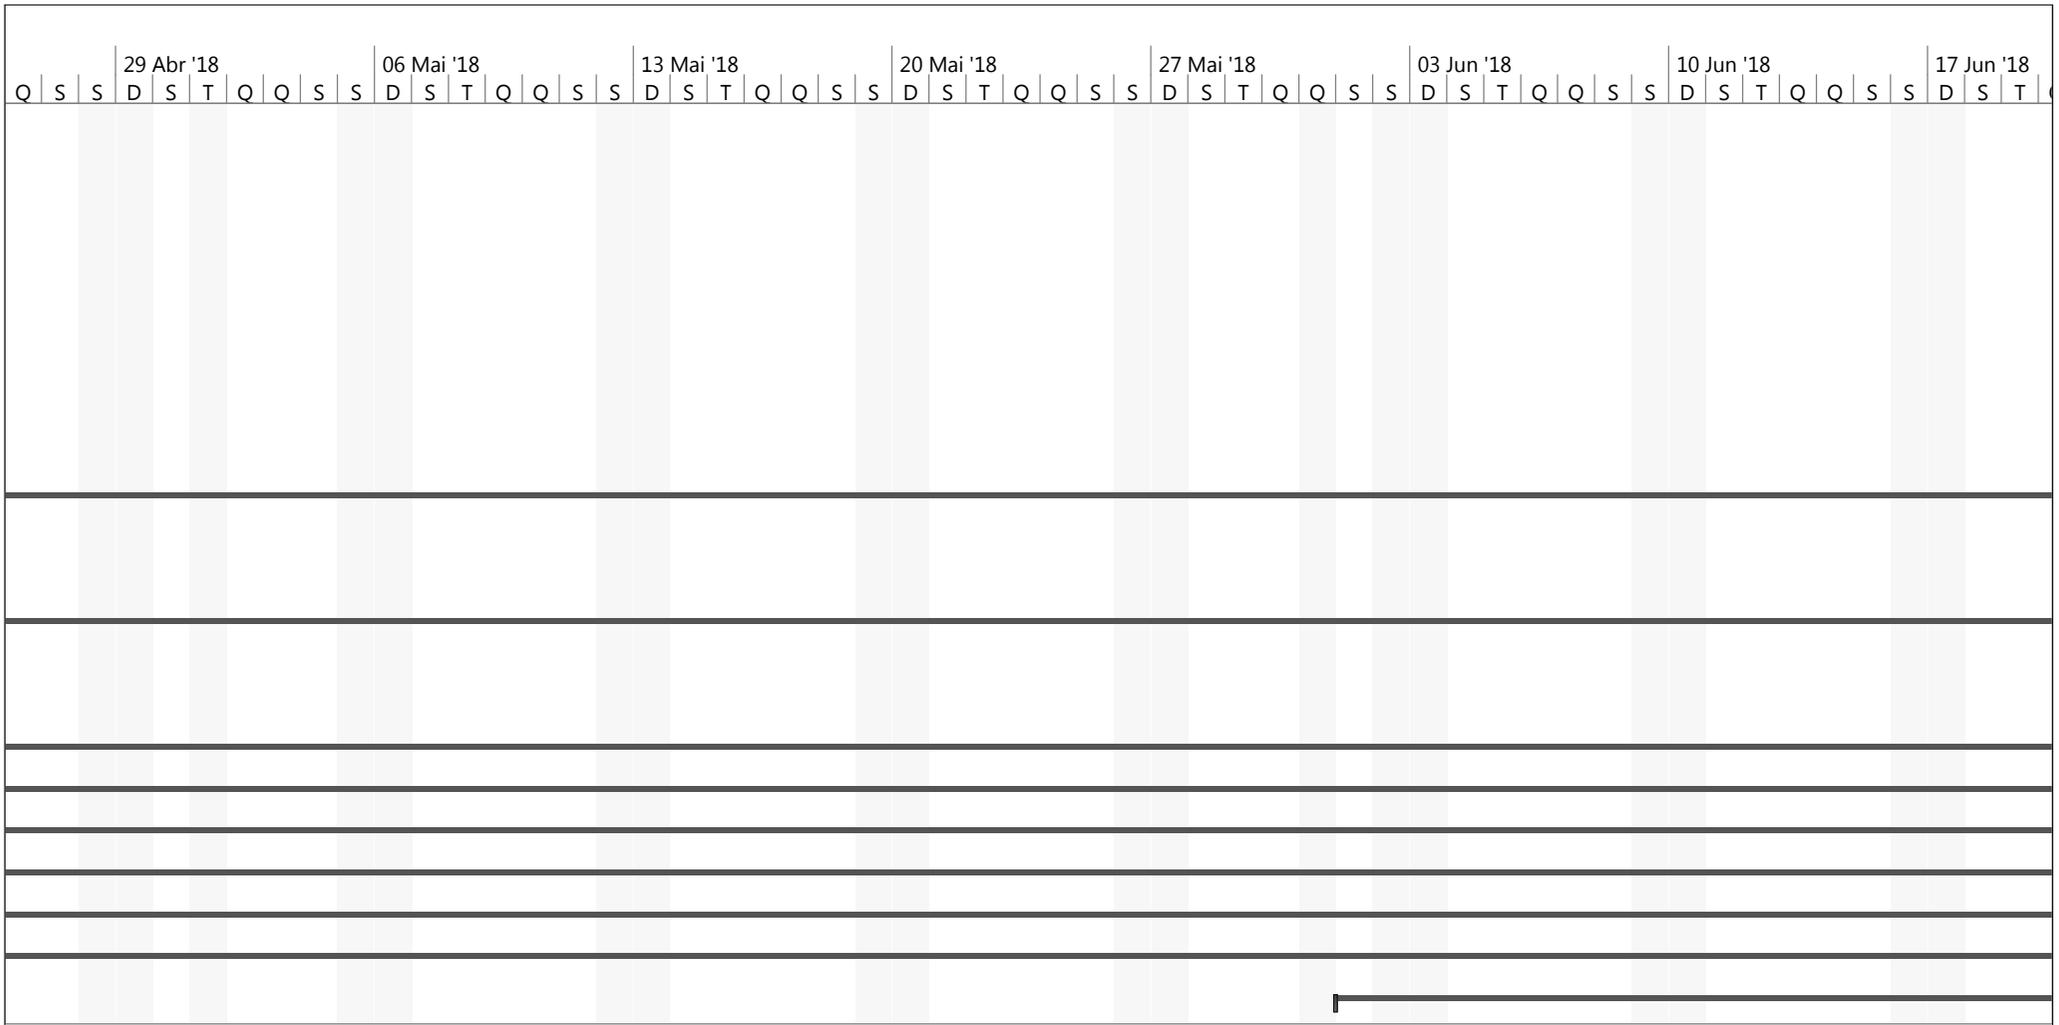


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

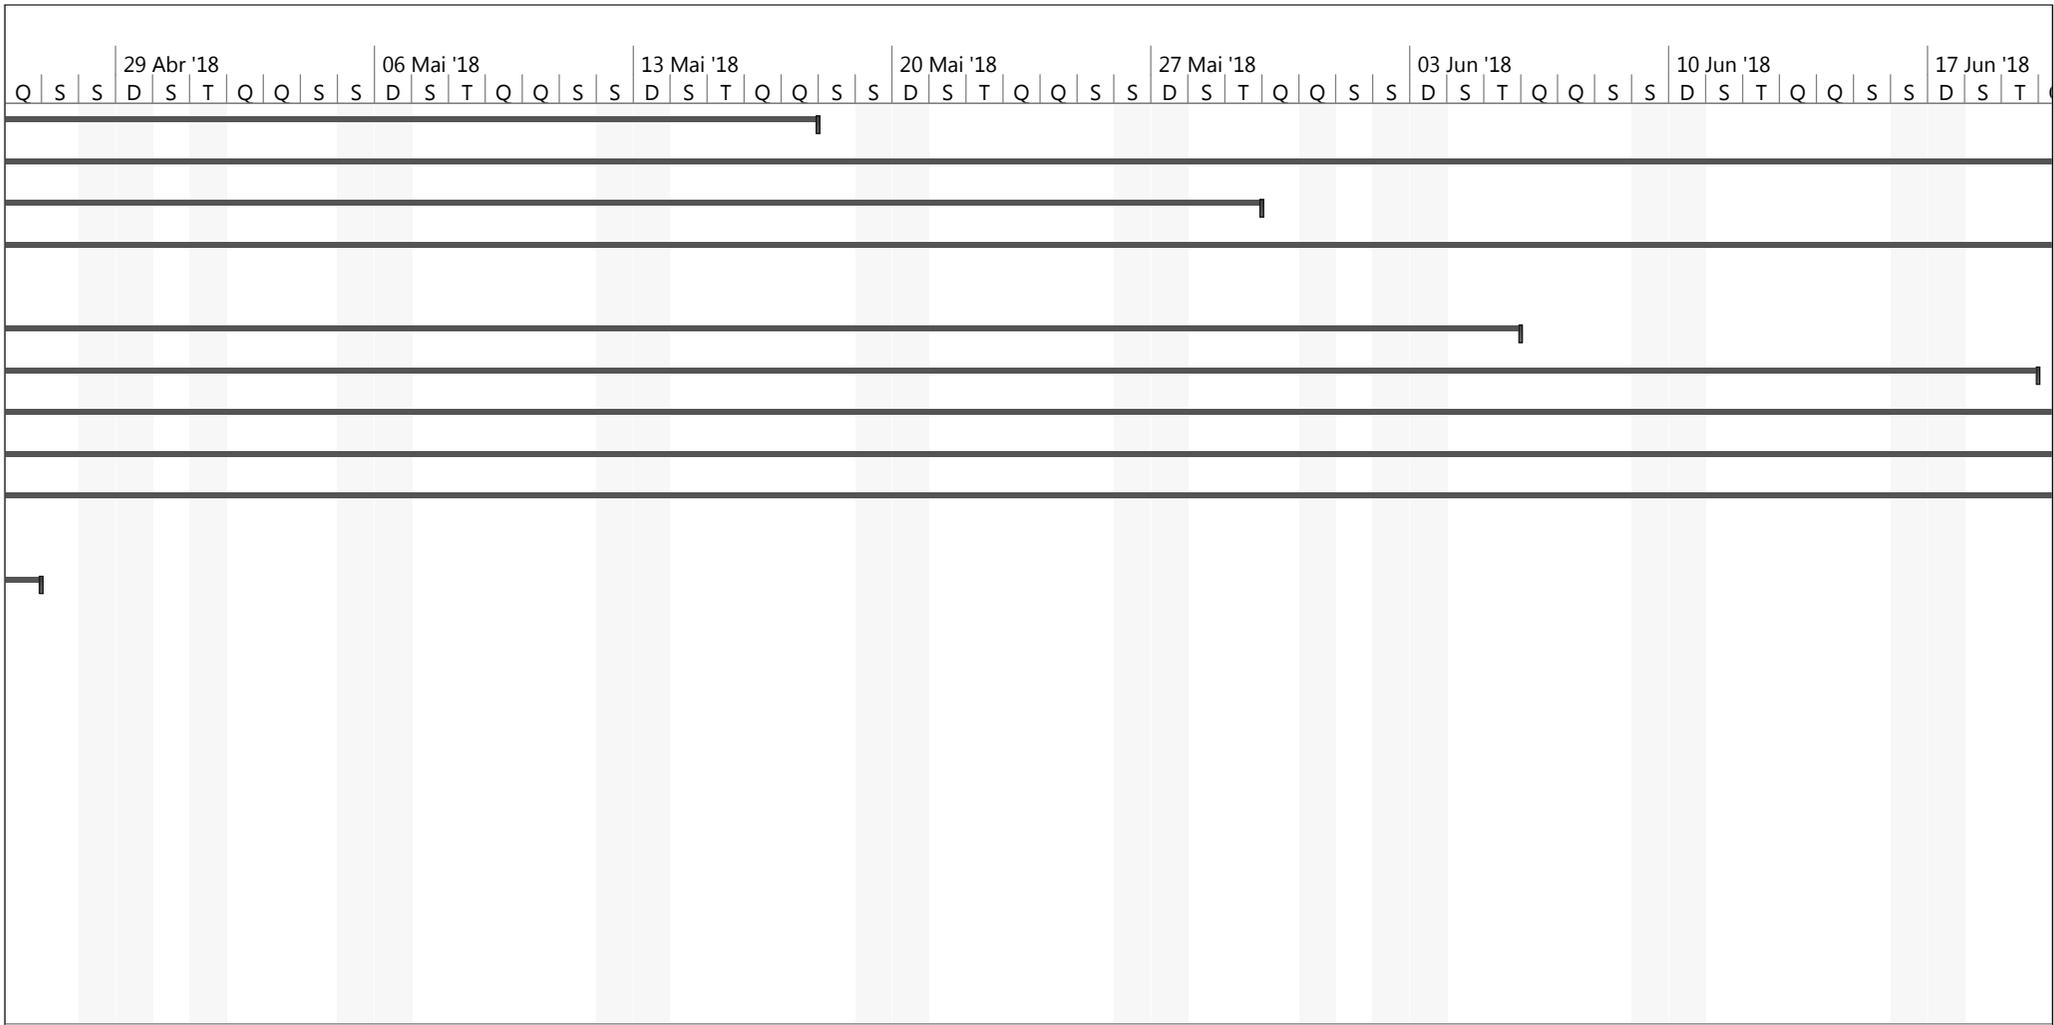

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Q S S 29 Abr '18 D S T Q Q S S 06 Mai '18 D S T Q Q S S 13 Mai '18 D S T Q Q S S 20 Mai '18 D S T Q Q S S 27 Mai '18 D S T Q Q S S 03 Jun '18 D S T Q Q S S 10 Jun '18 D S T Q Q S S 17 Jun '18 D S T Q

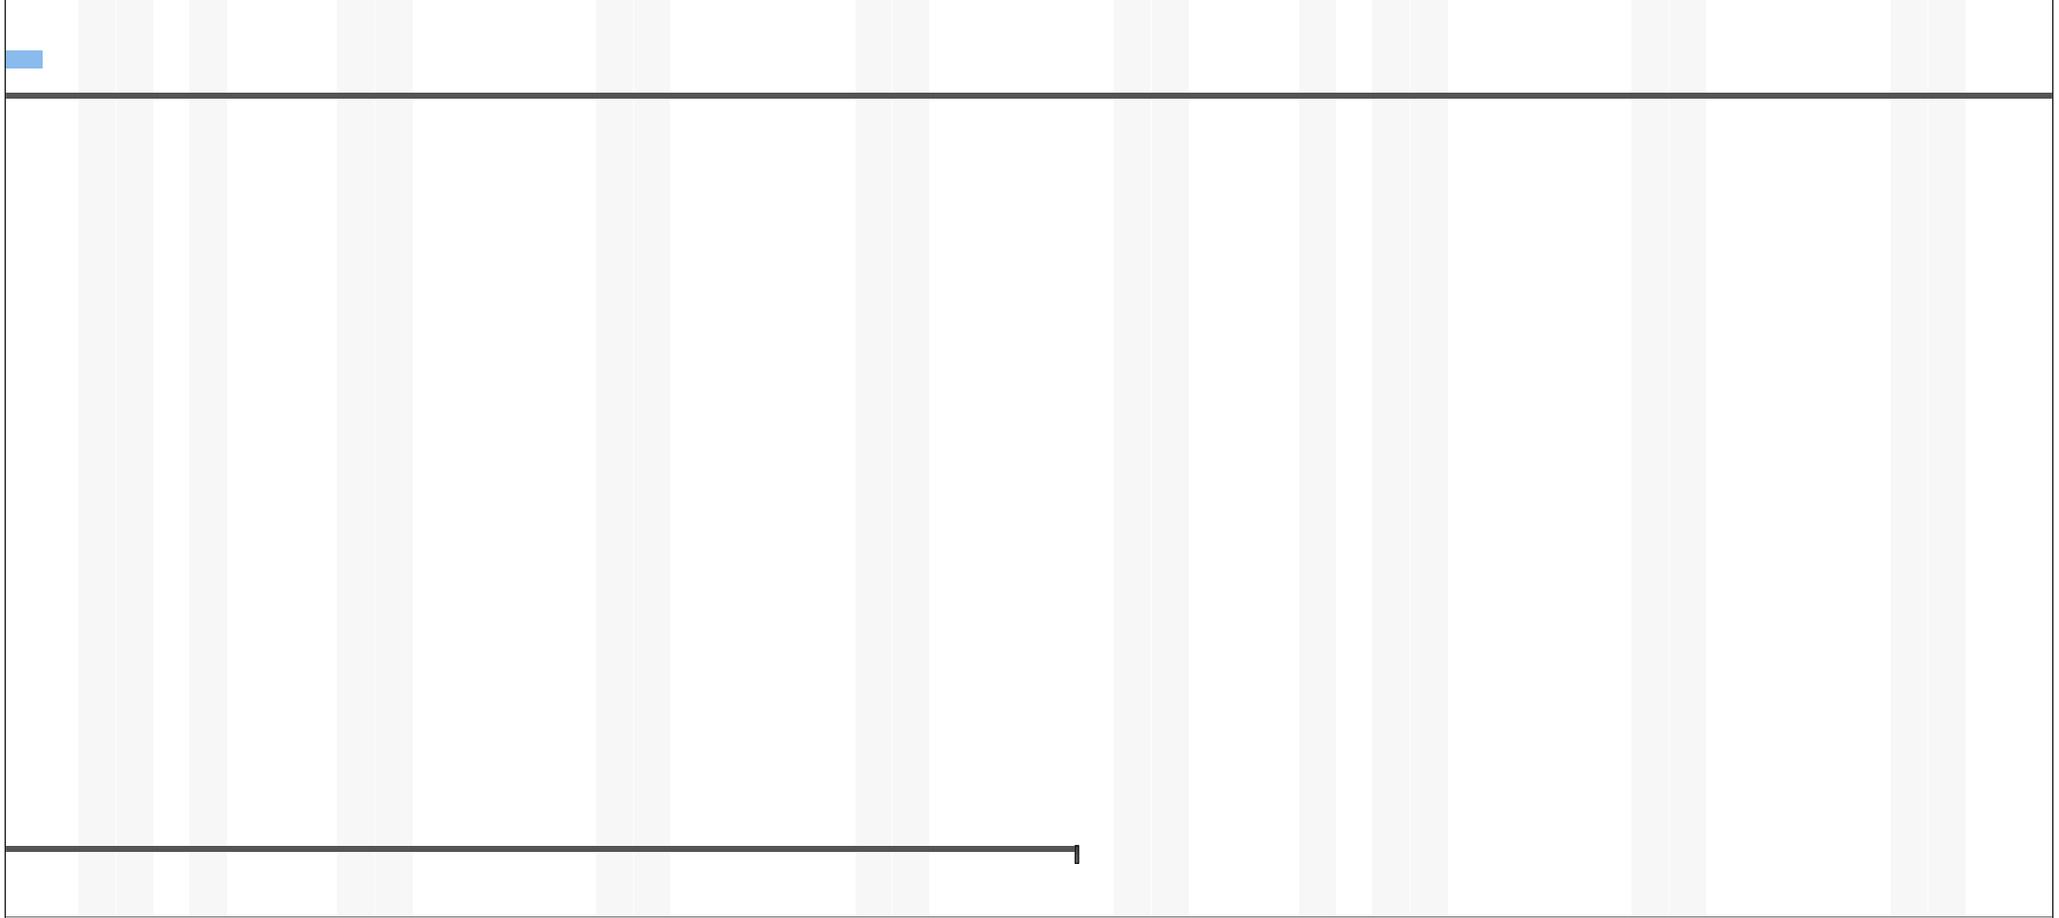


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


Q S S 29 Abr '18 D S T Q Q S S 06 Mai '18 D S T Q Q S S 13 Mai '18 D S T Q Q S S 20 Mai '18 D S T Q Q S S 27 Mai '18 D S T Q Q S S 03 Jun '18 D S T Q Q S S 10 Jun '18 D S T Q Q S S 17 Jun '18 D S T Q




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

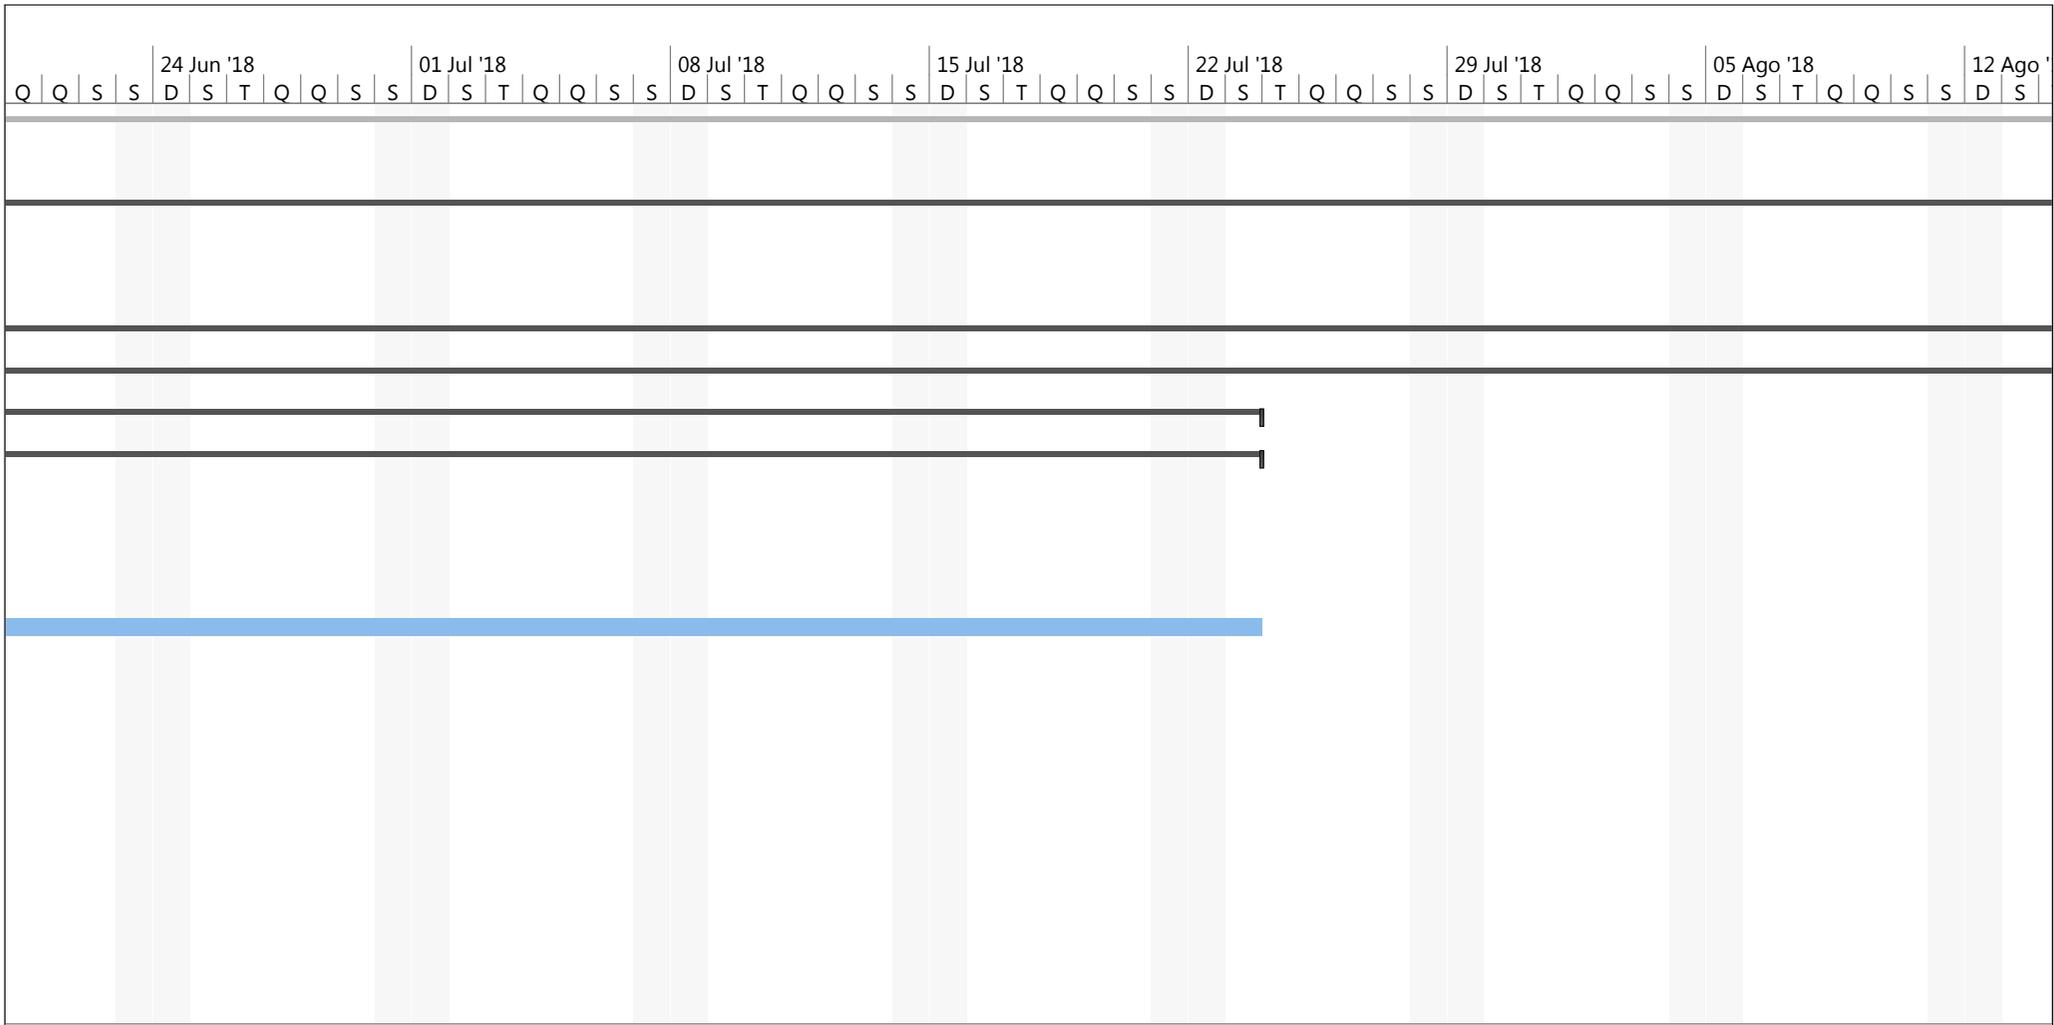


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

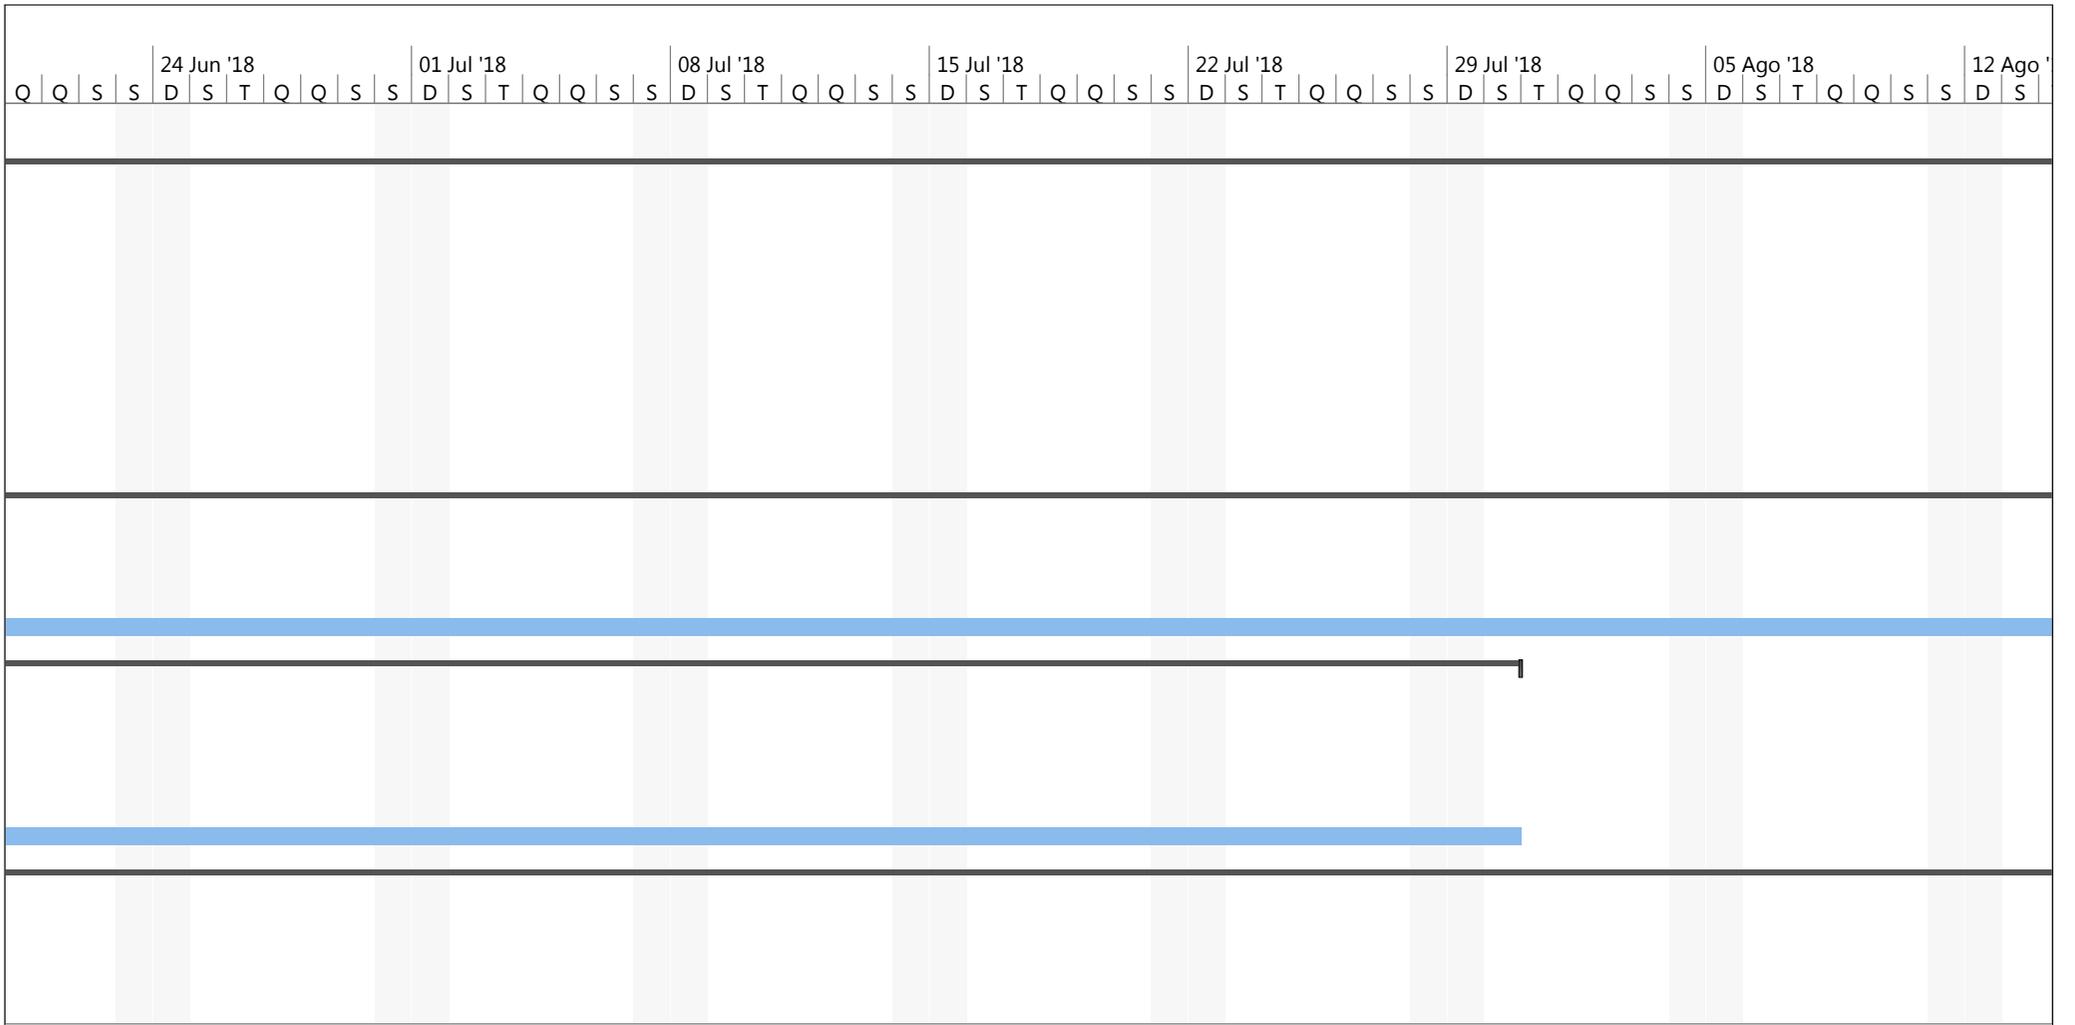


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

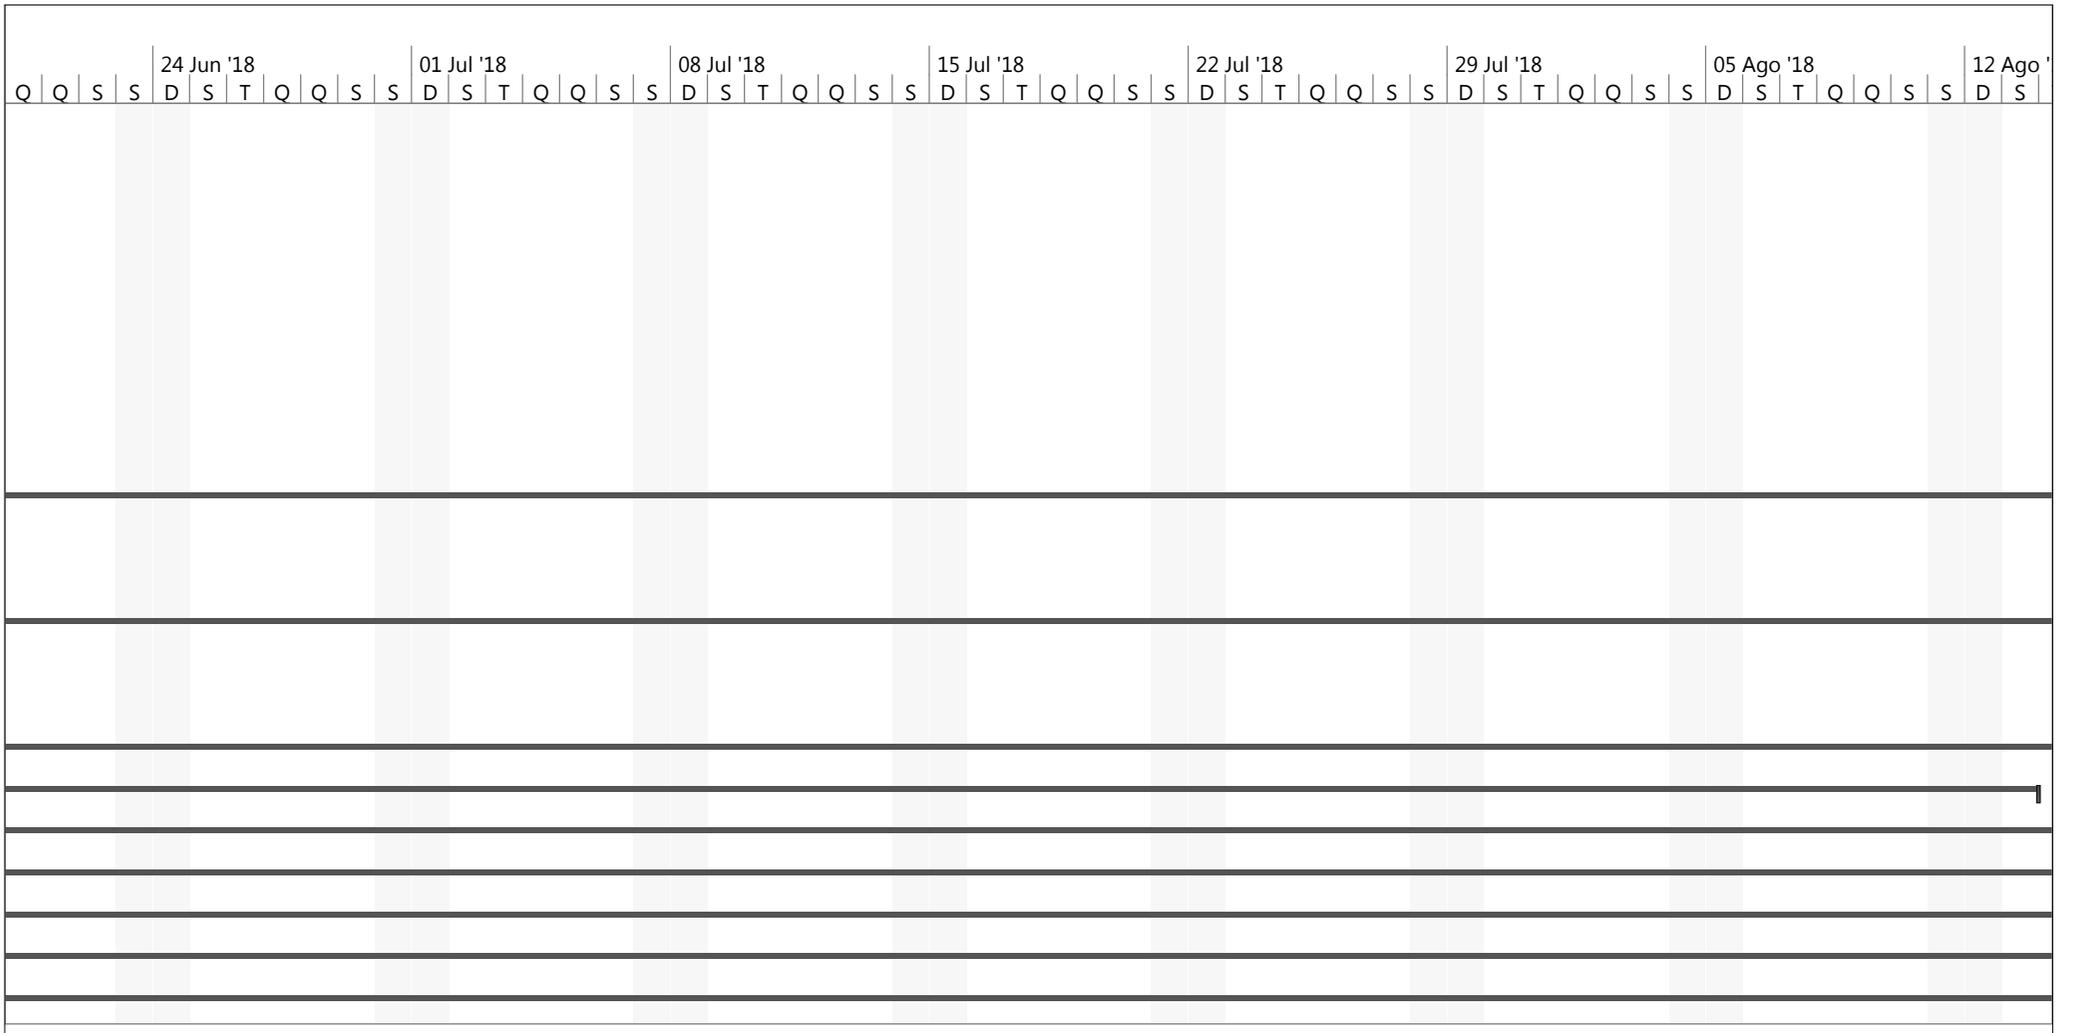

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

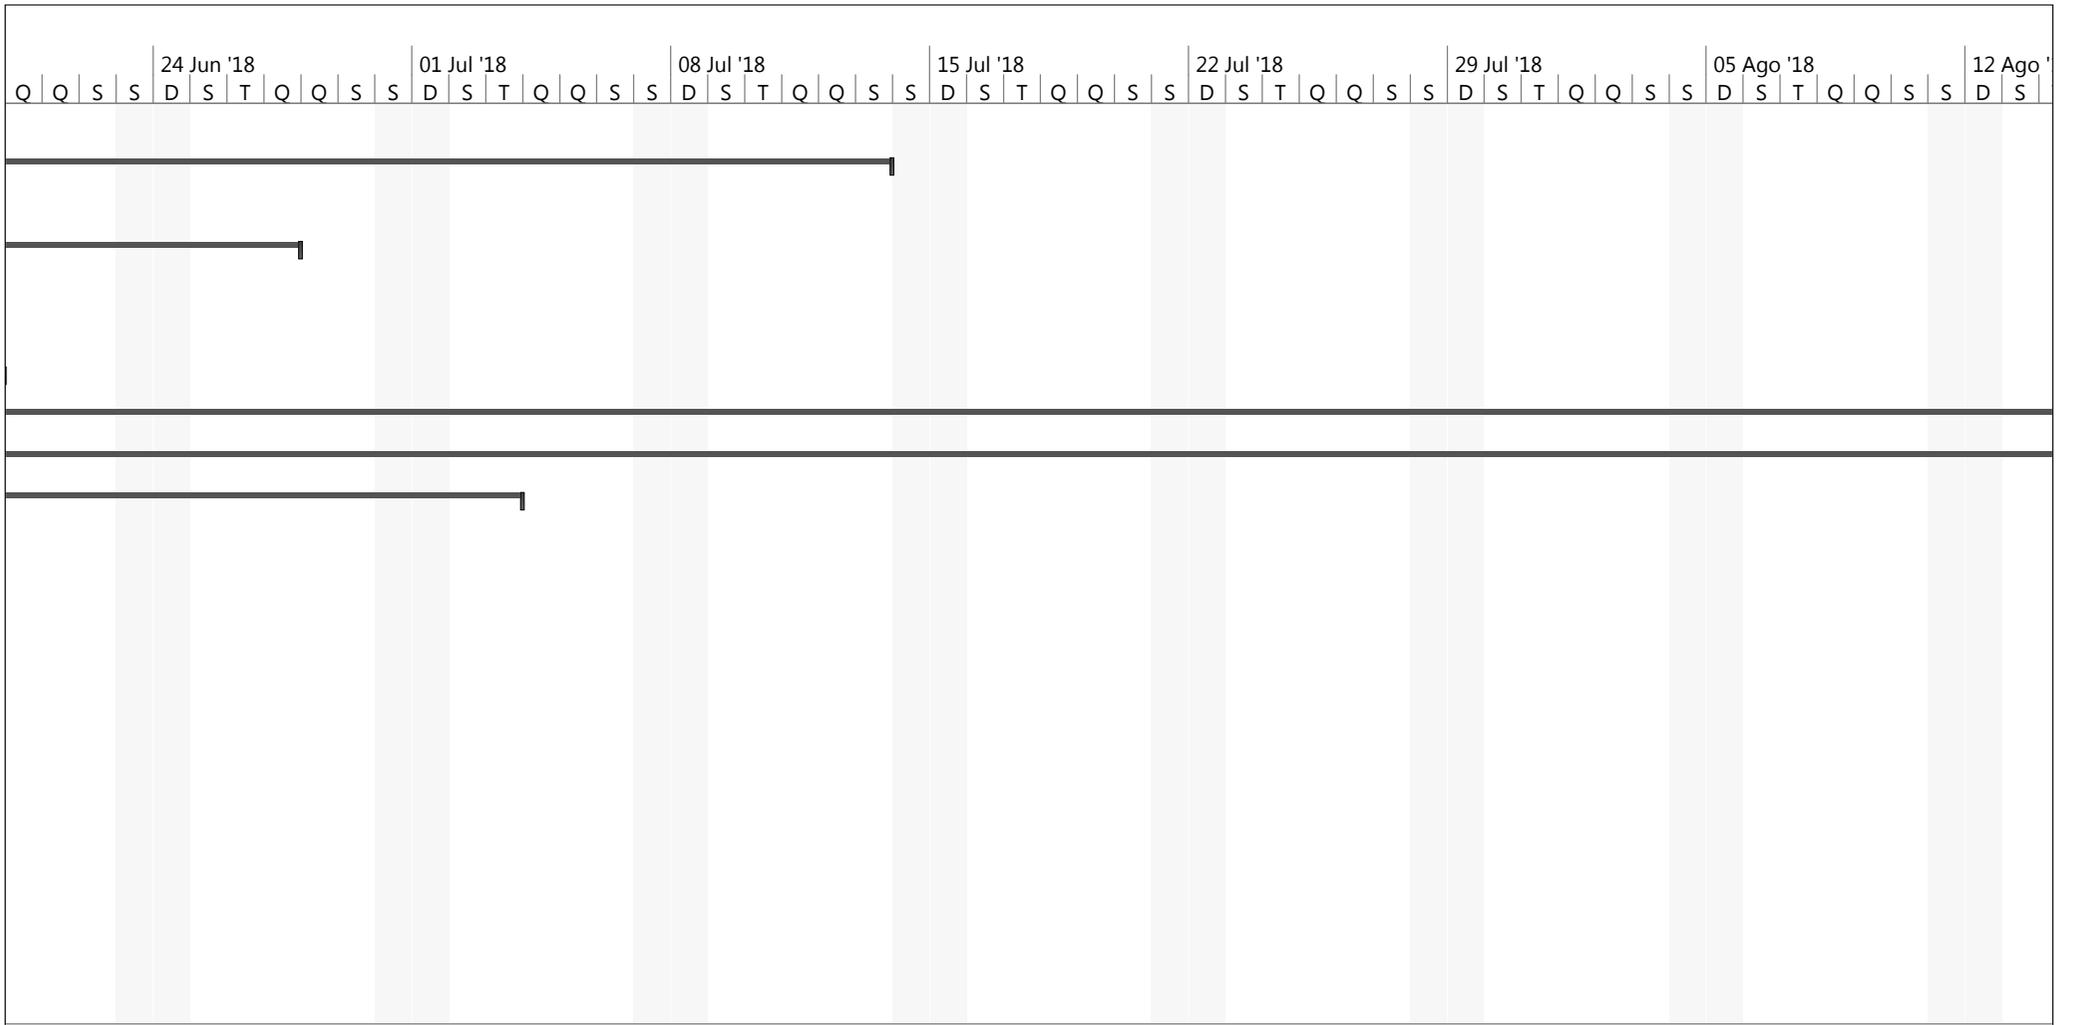


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


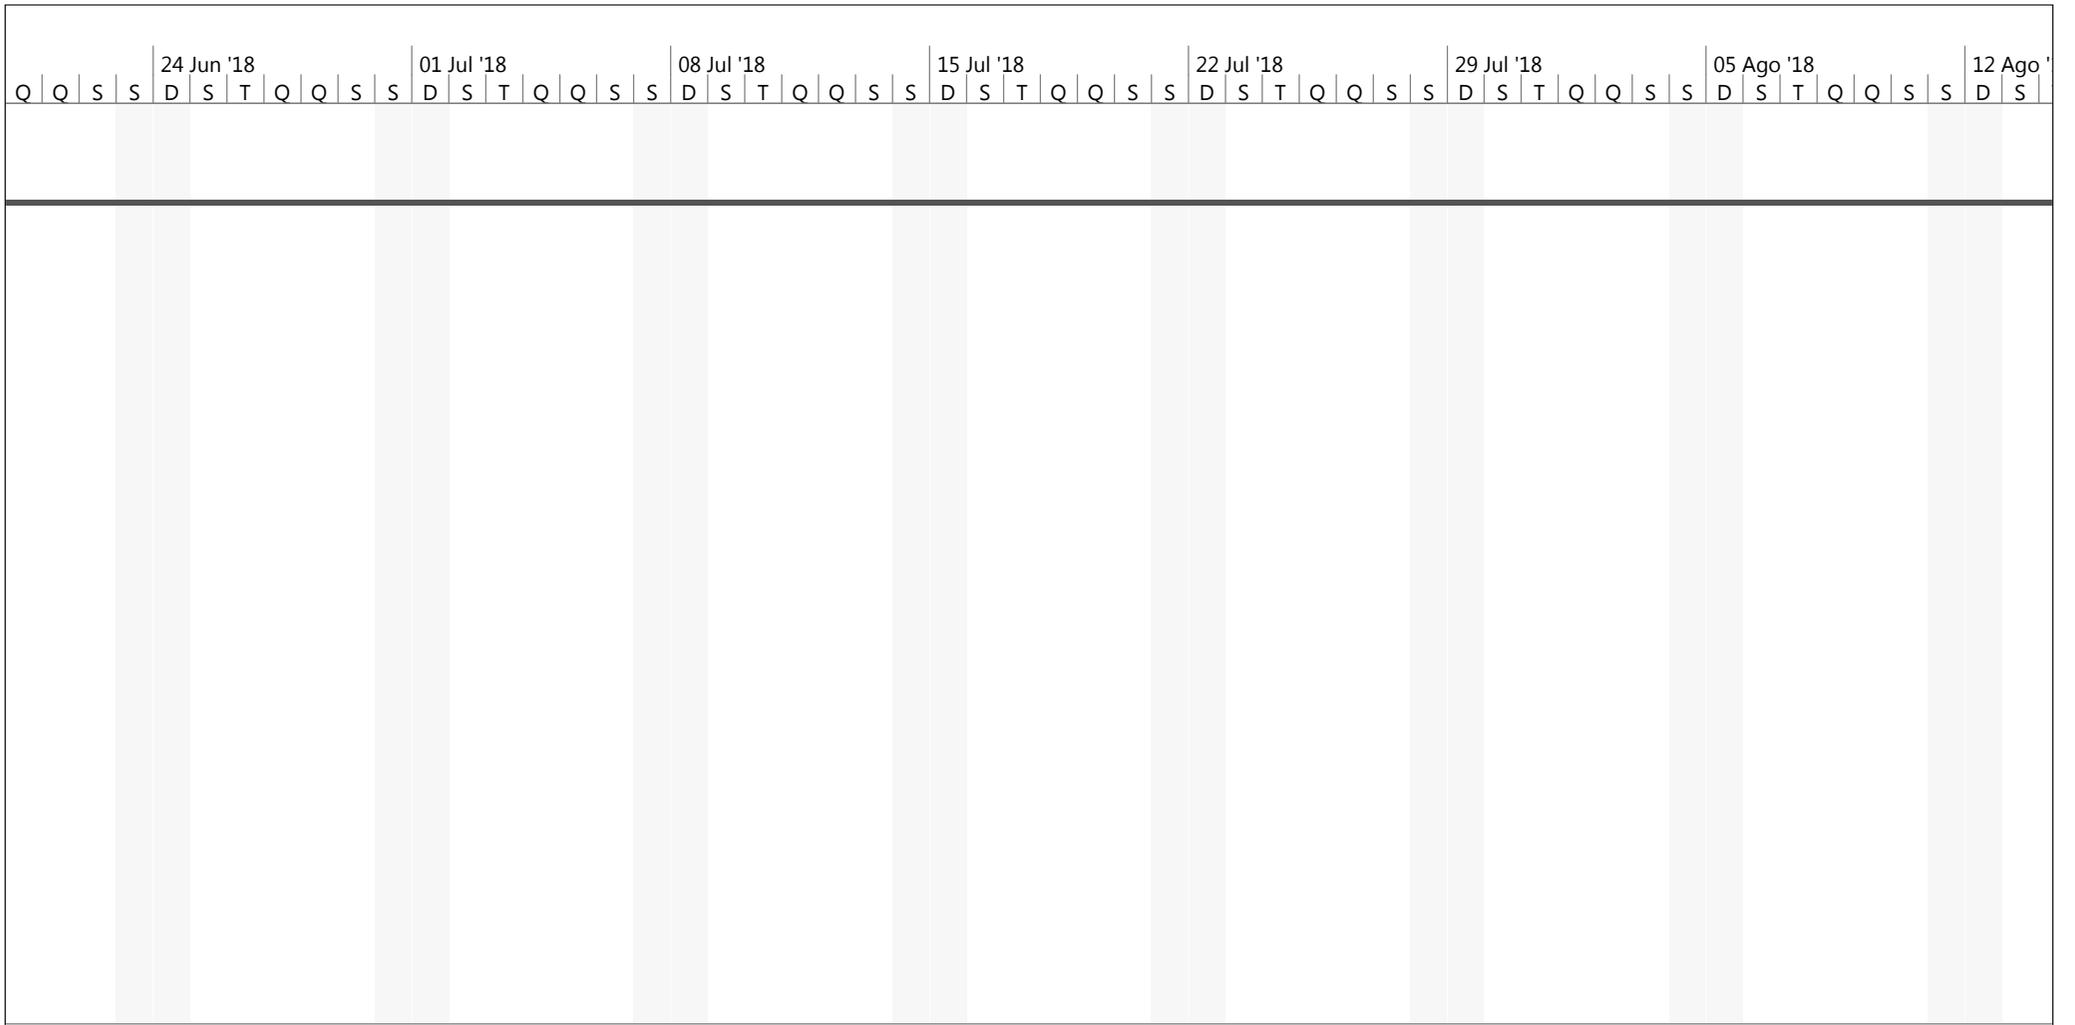


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Q Q S S 24 Jun '18 D S T Q Q S S 01 Jul '18 D S T Q Q S S 08 Jul '18 D S T Q Q S S 15 Jul '18 D S T Q Q S S 22 Jul '18 D S T Q Q S S 29 Jul '18 D S T Q Q S S 05 Ago '18 D S T Q Q S S 12 Ago '18

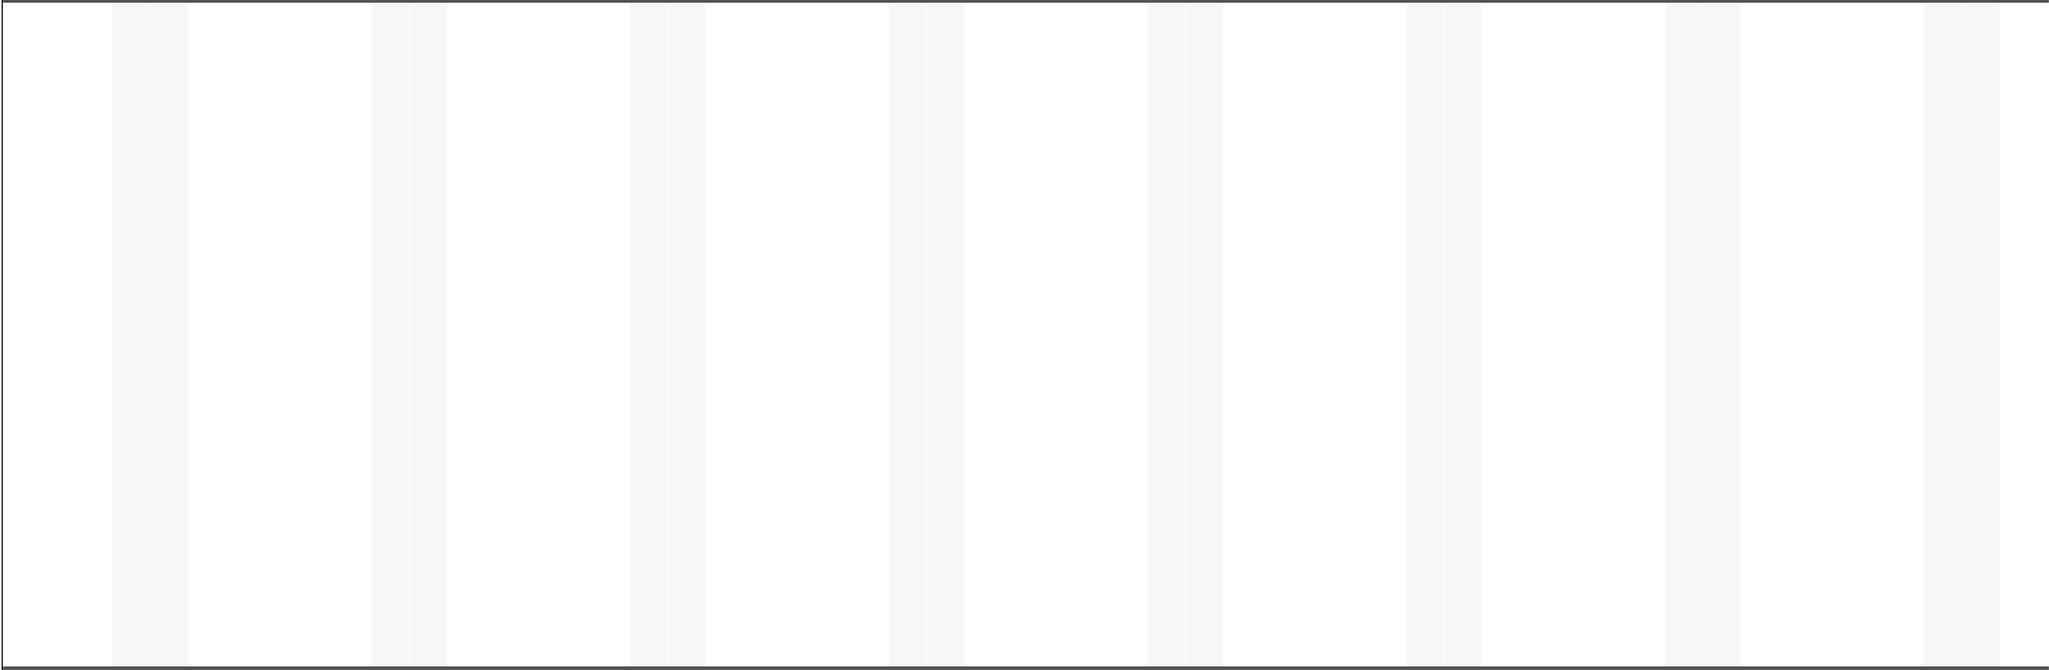


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

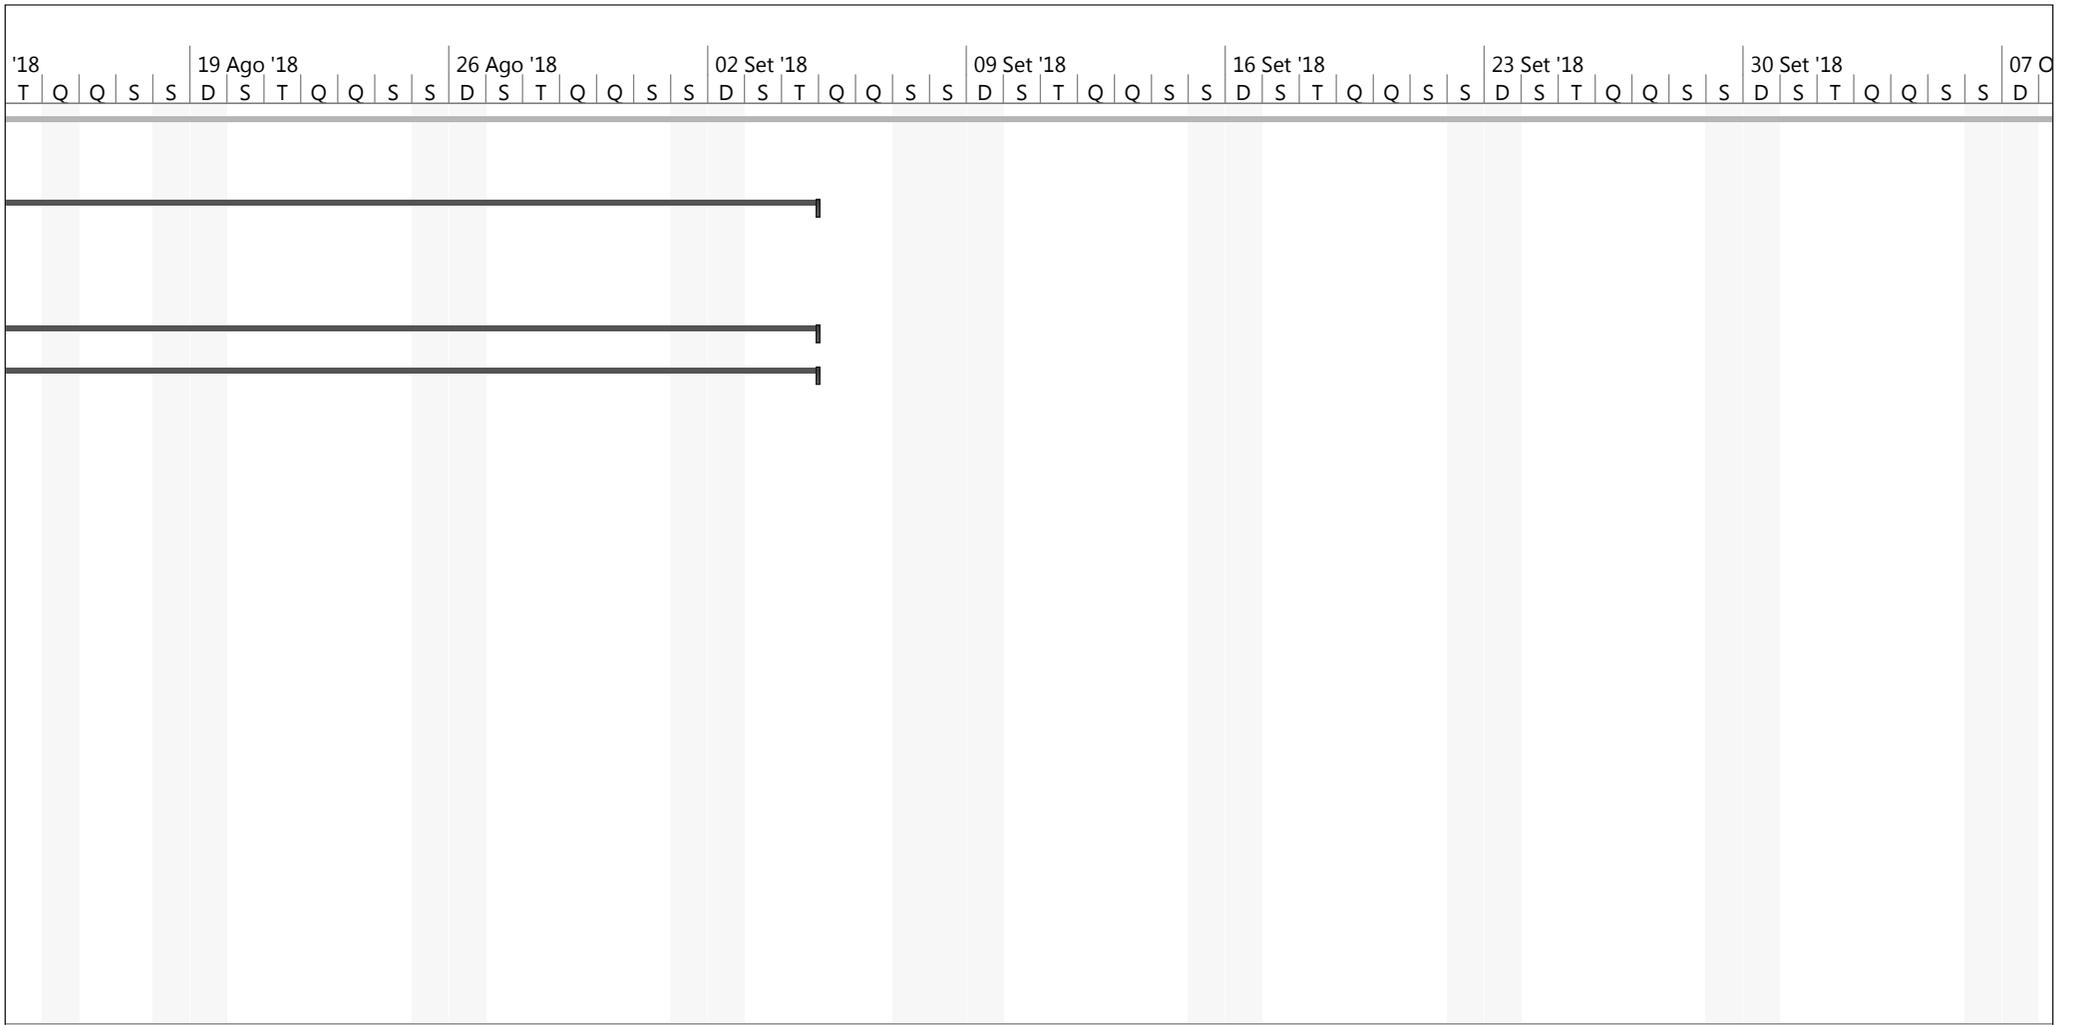


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

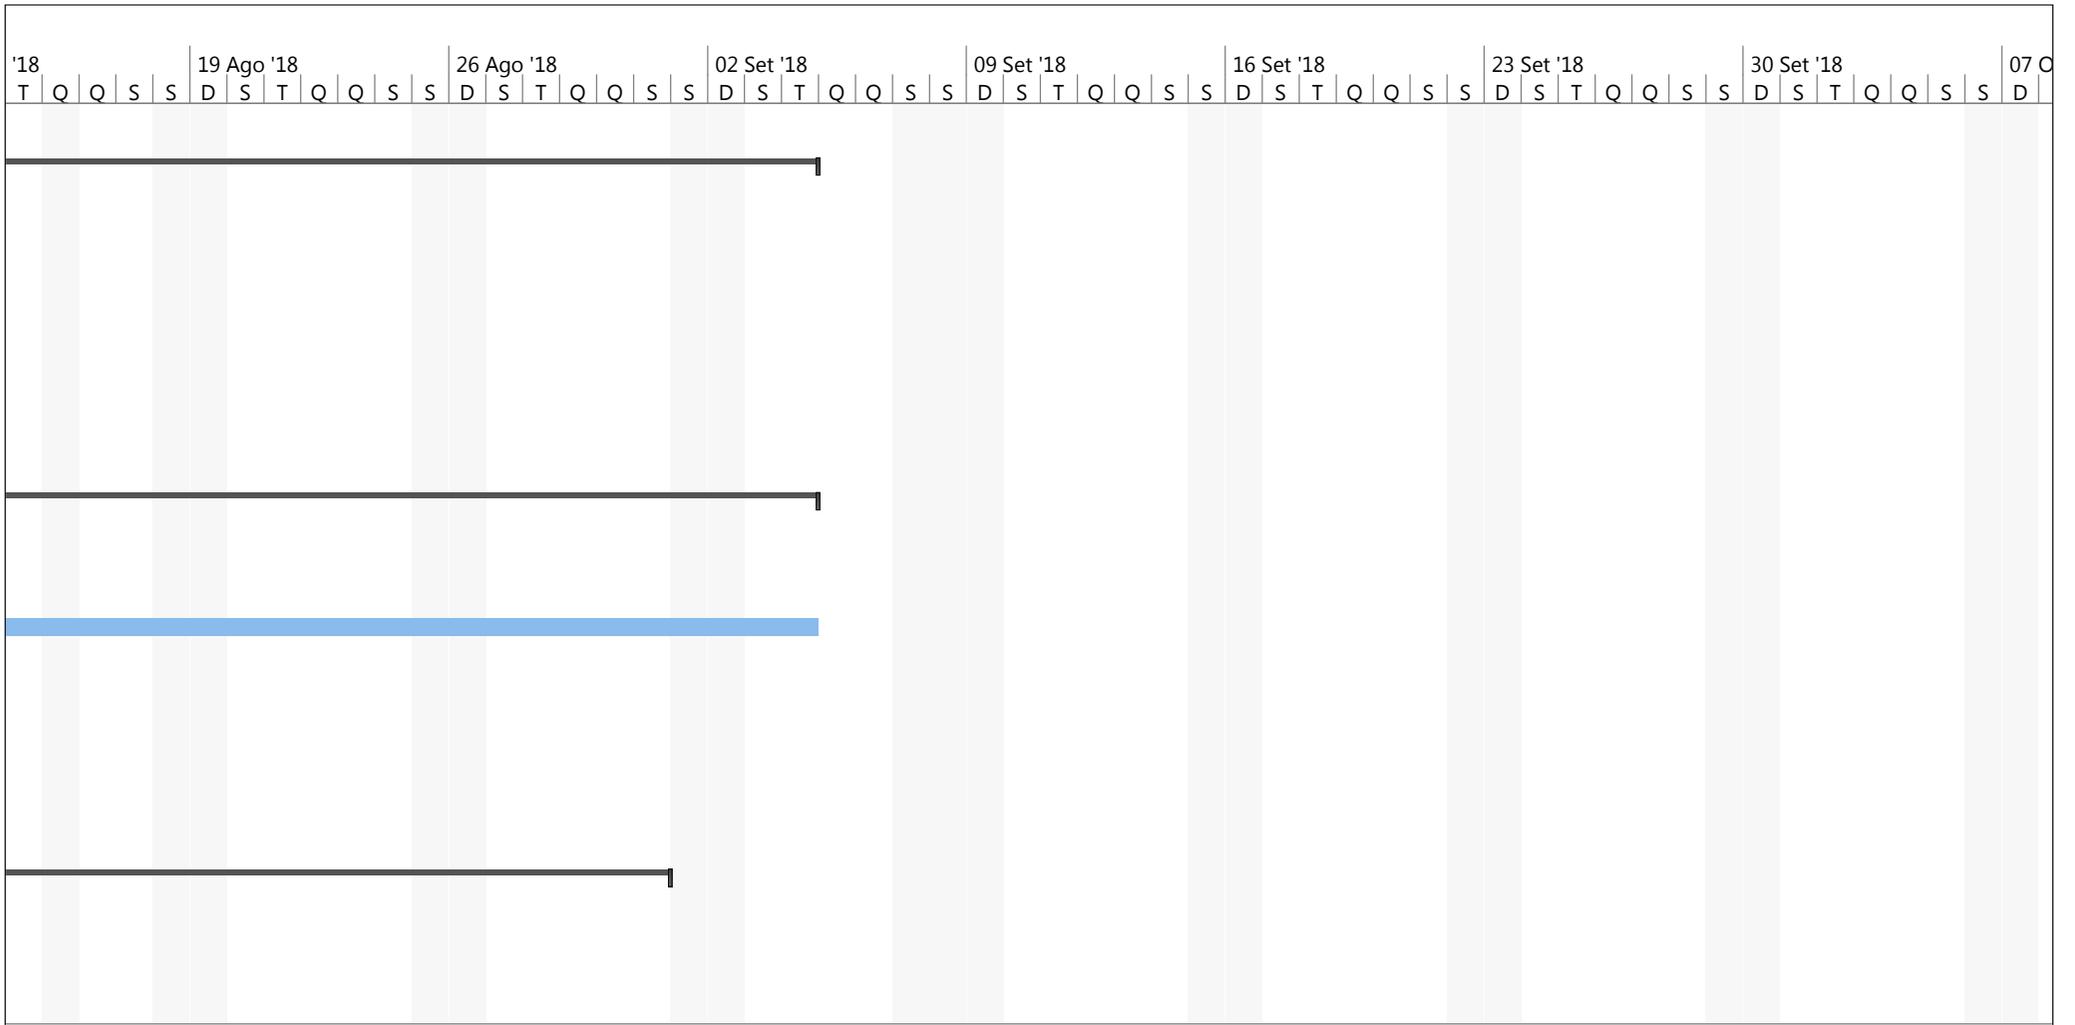


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

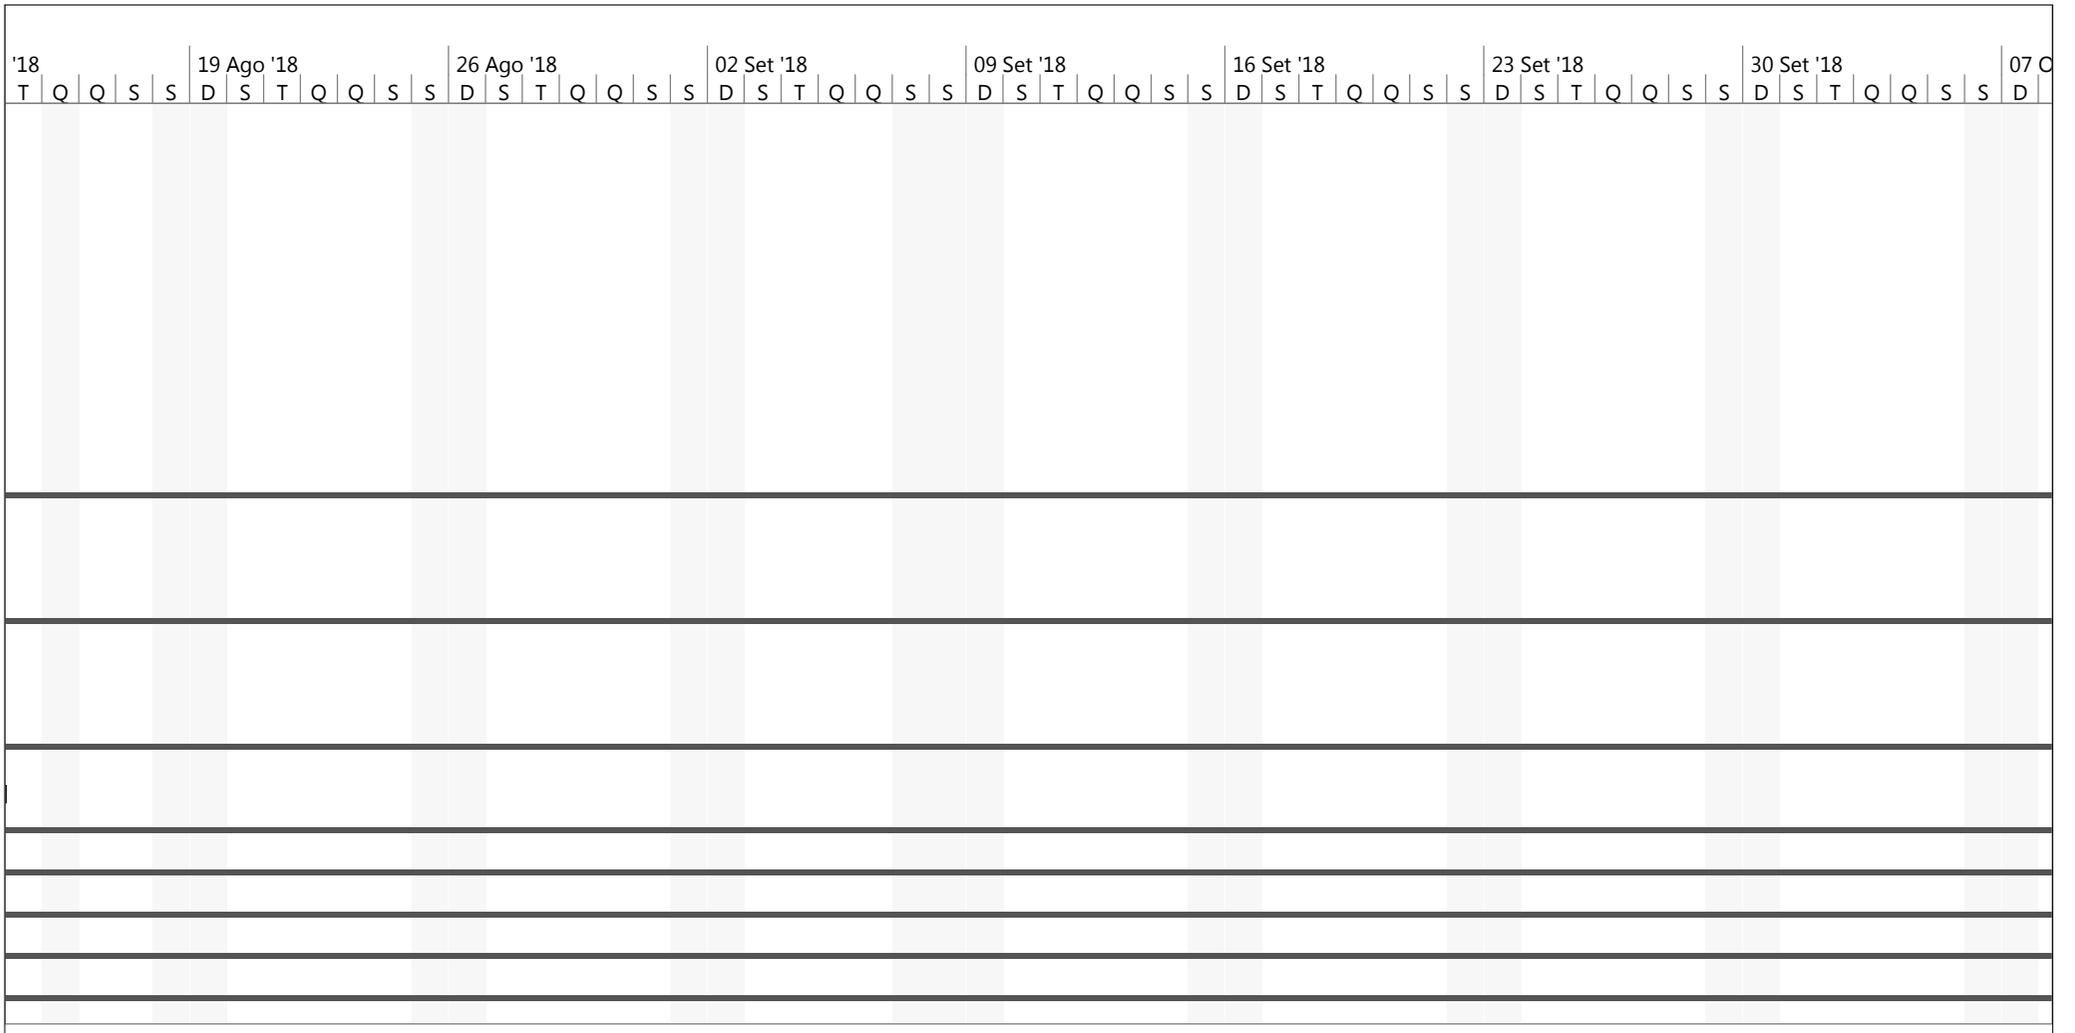


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

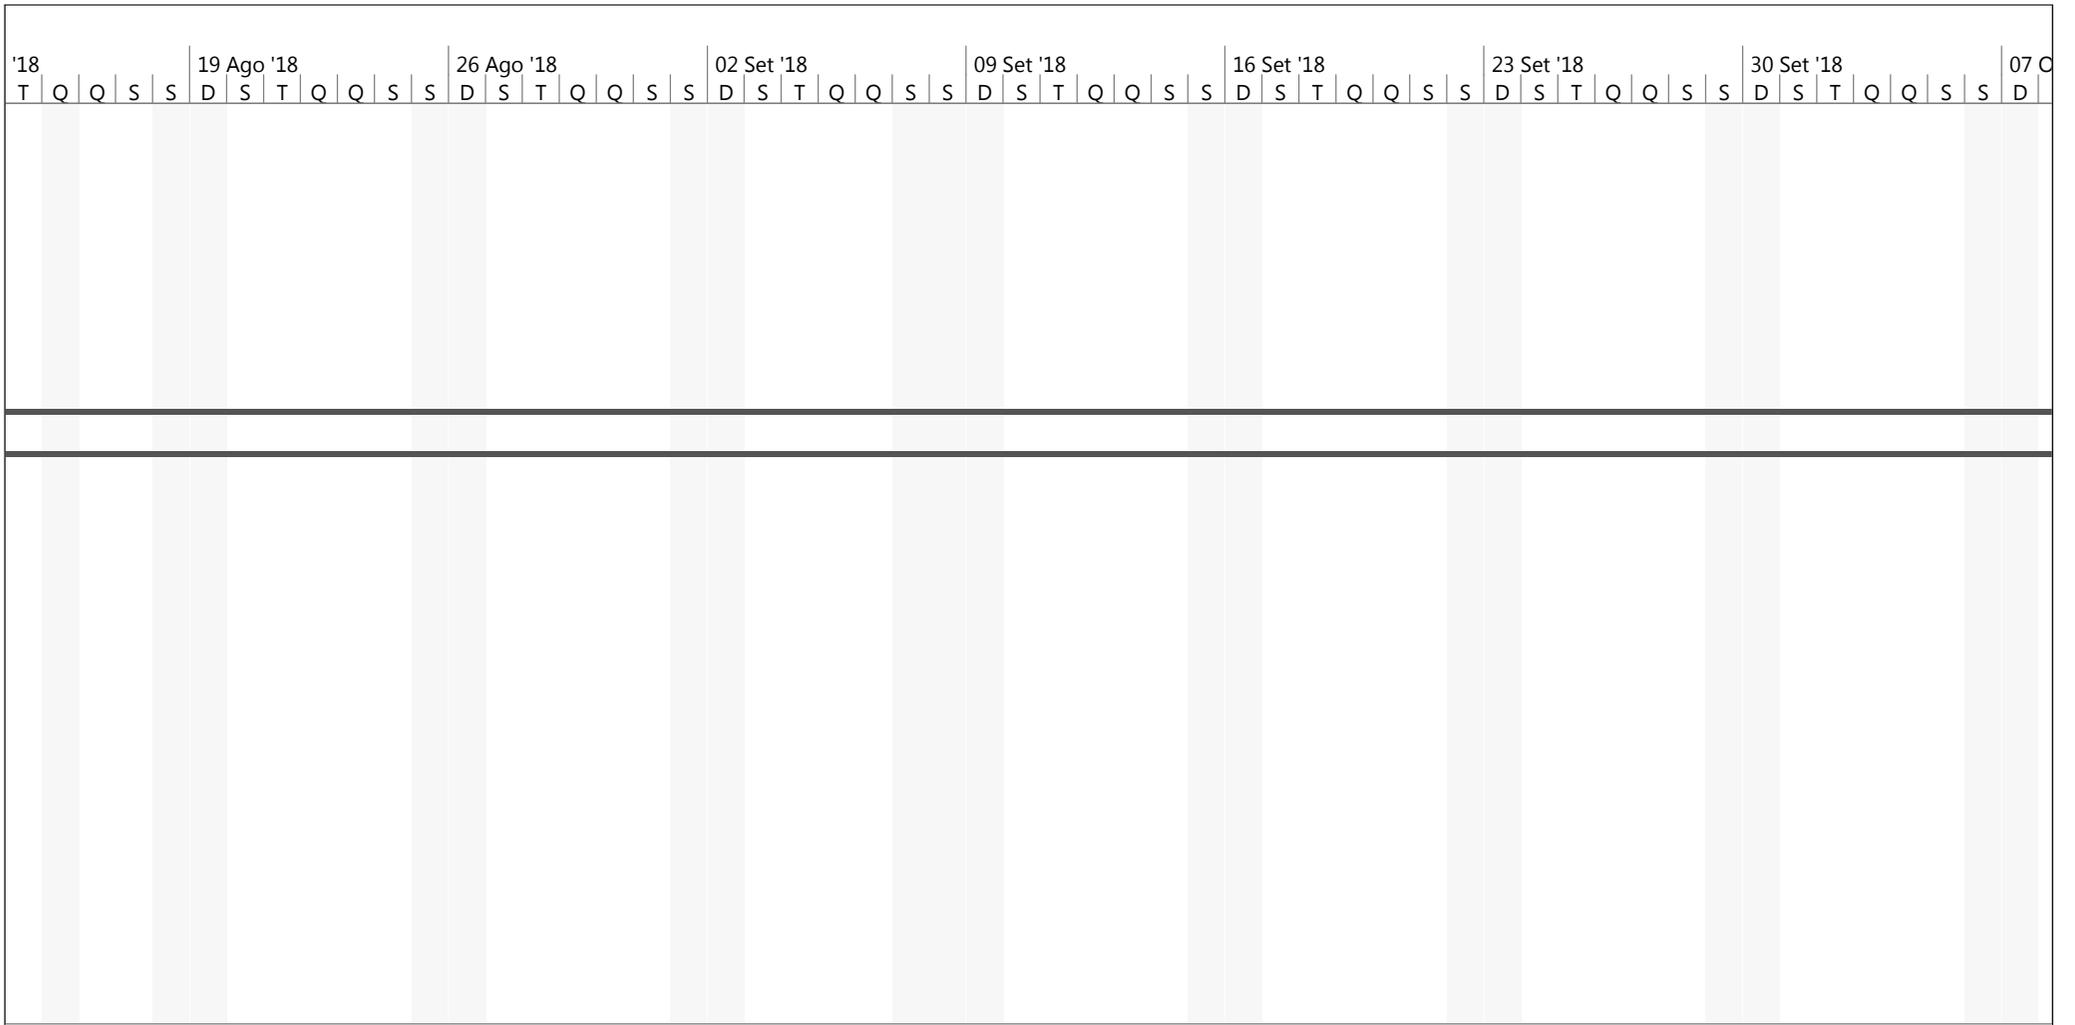

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

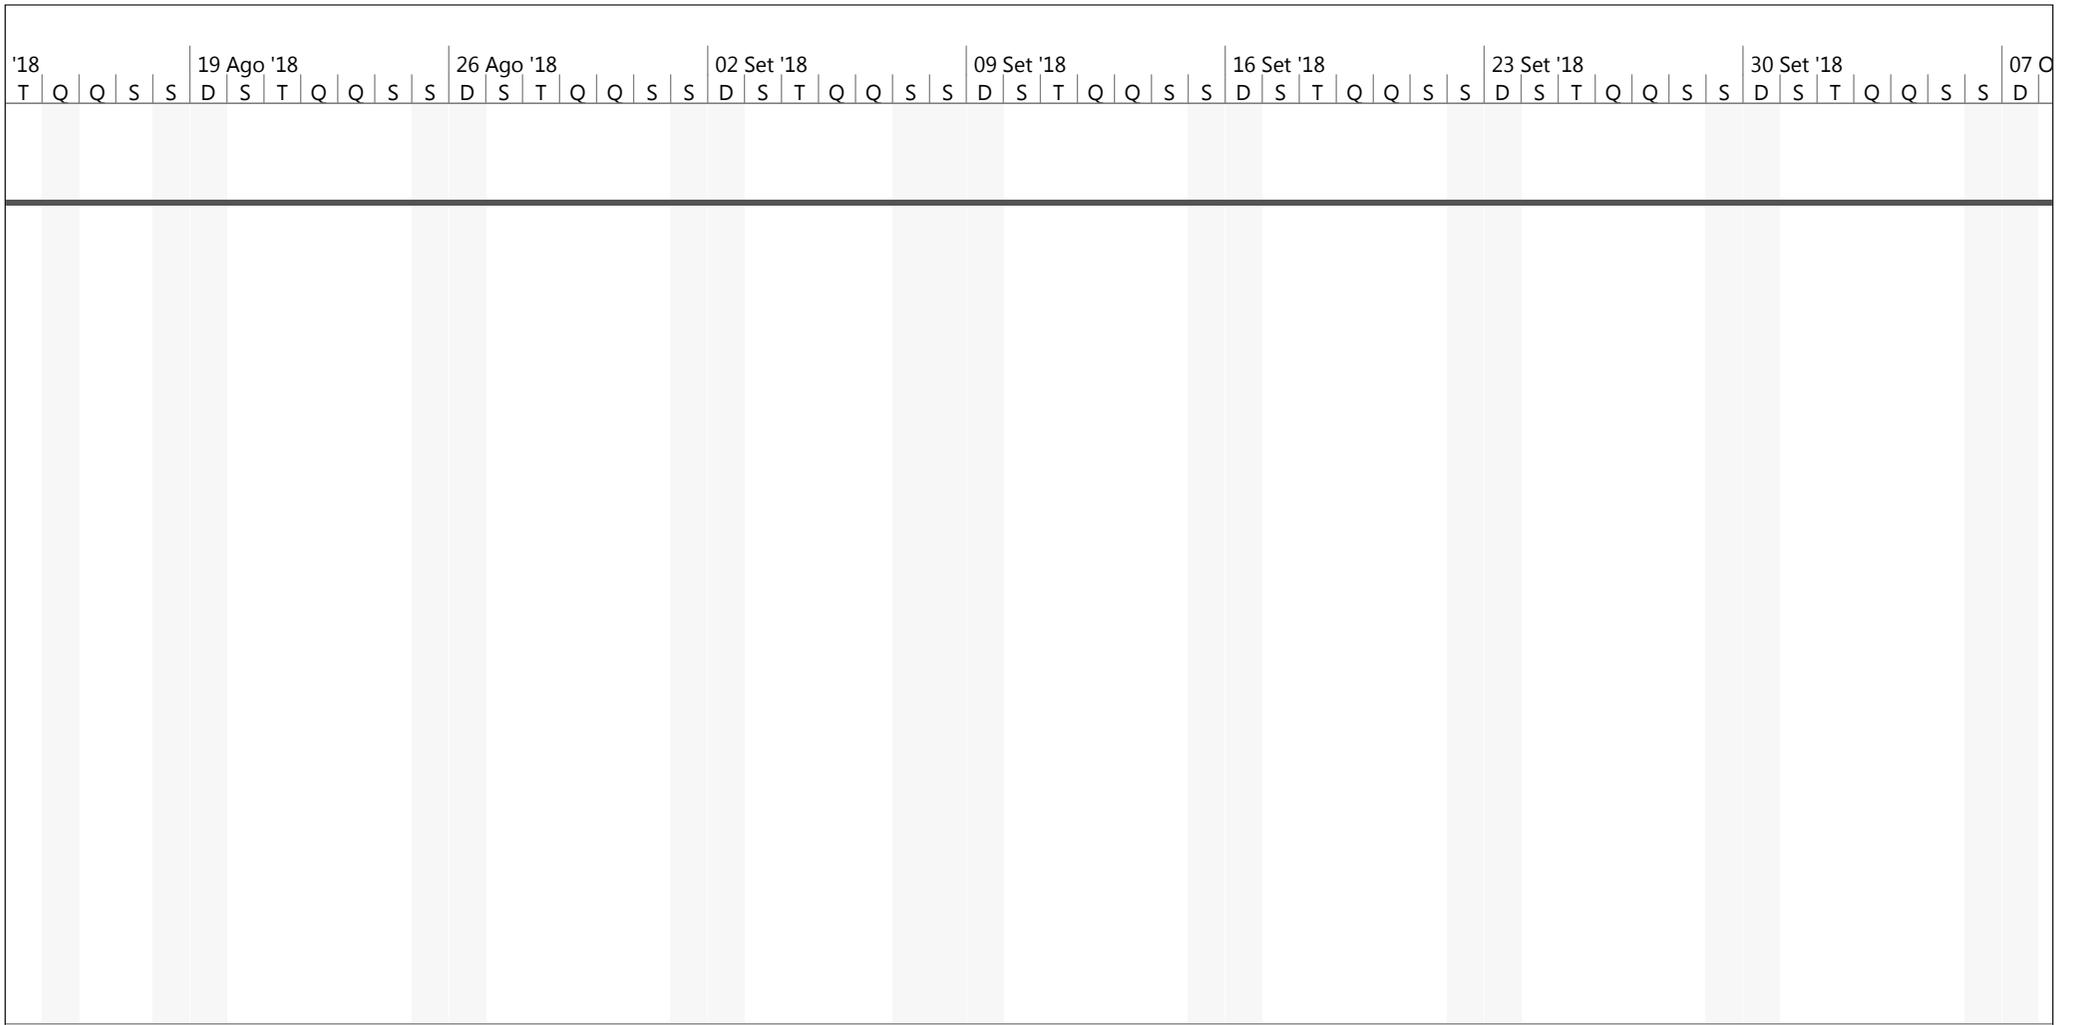

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

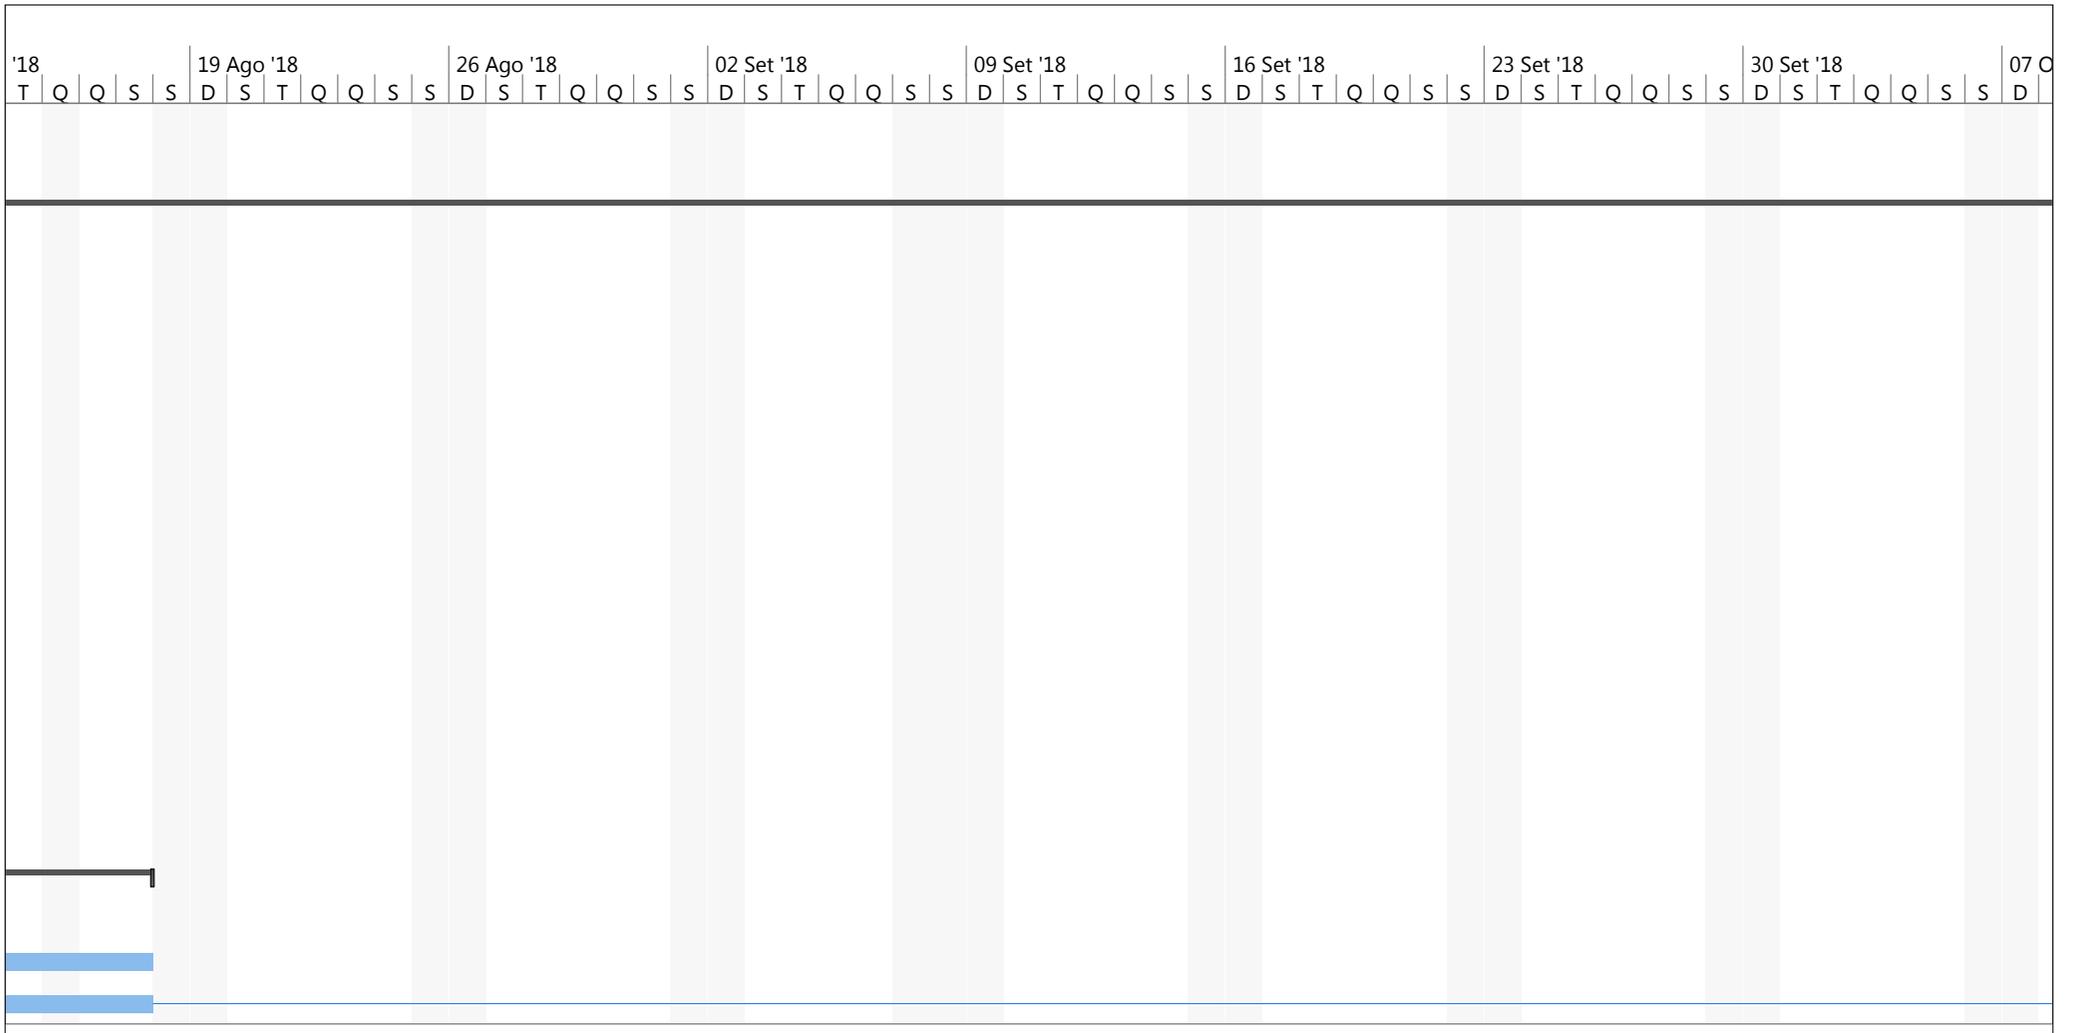

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Out '18      14 Out '18      21 Out '18      28 Out '18      04 Nov '18      11 Nov '18      18 Nov '18      25 Nov '18


S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

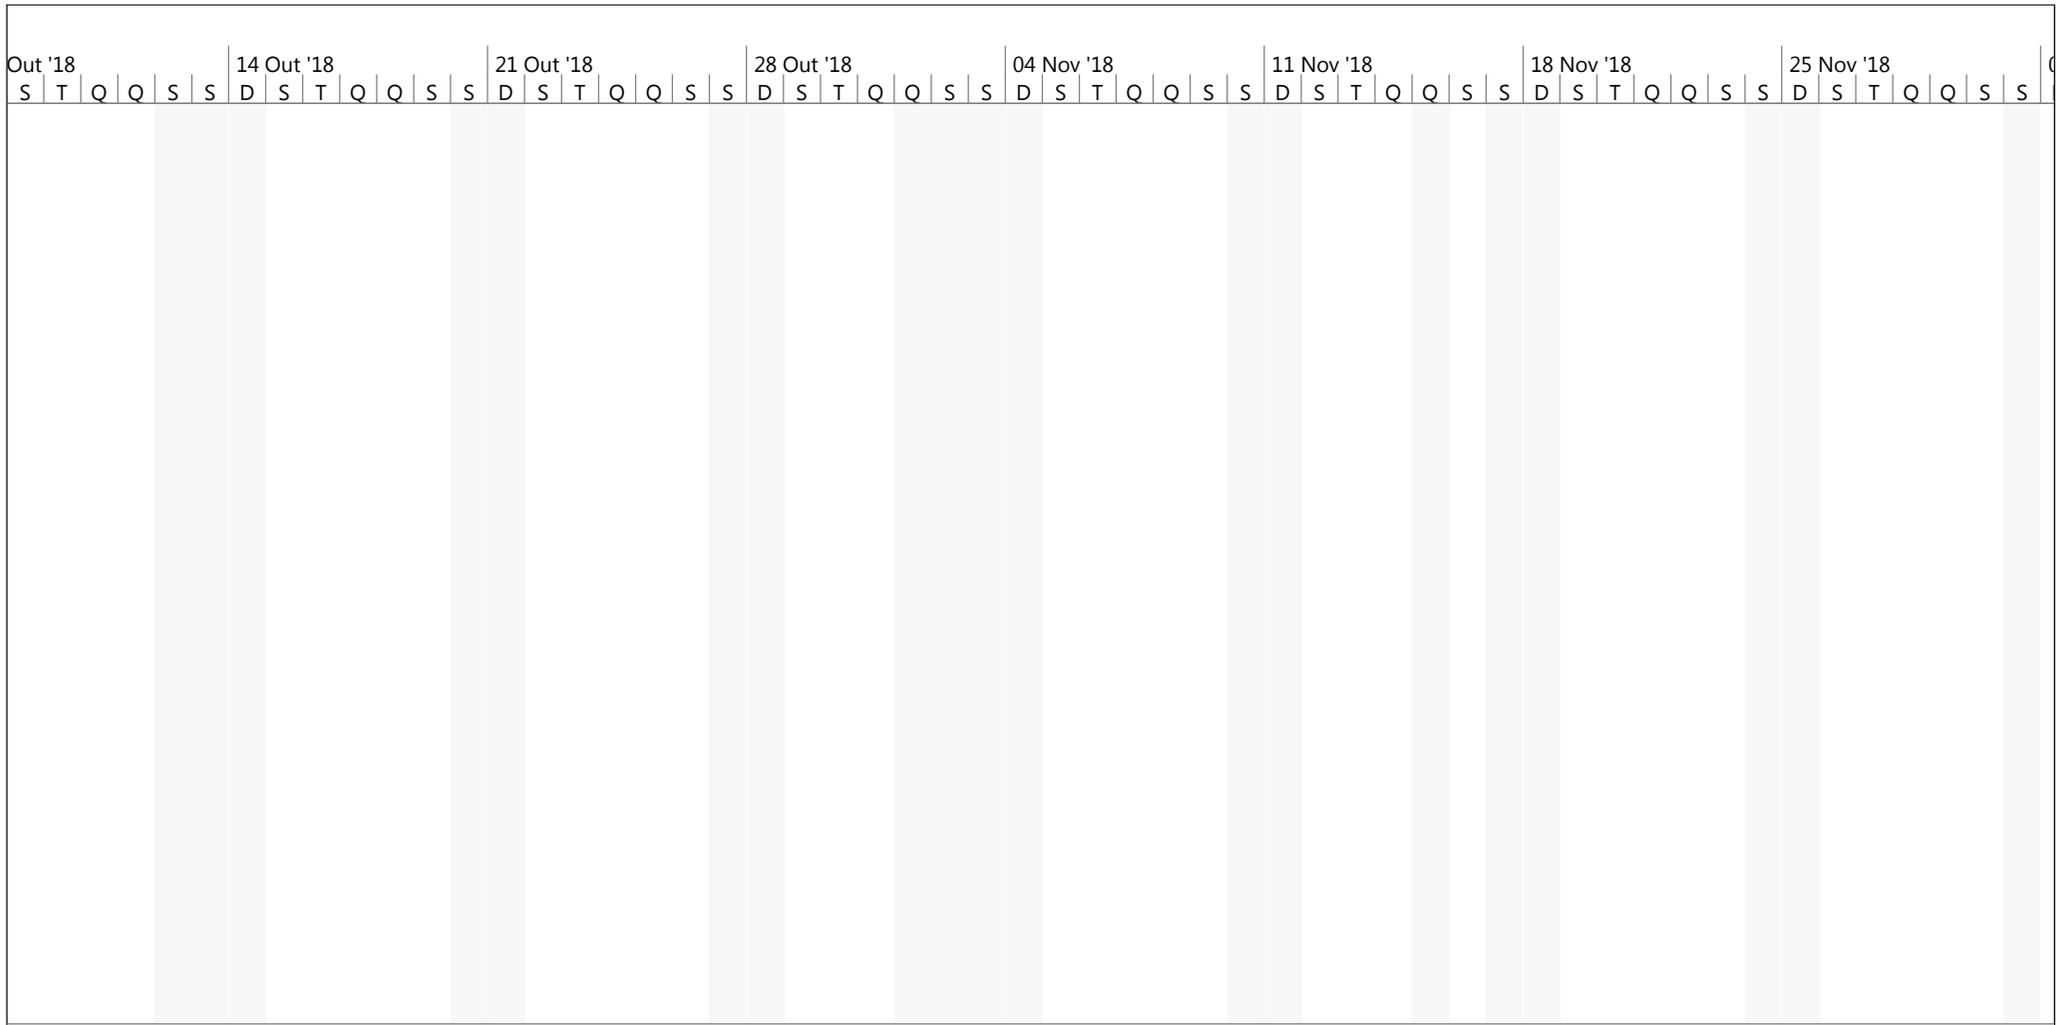


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

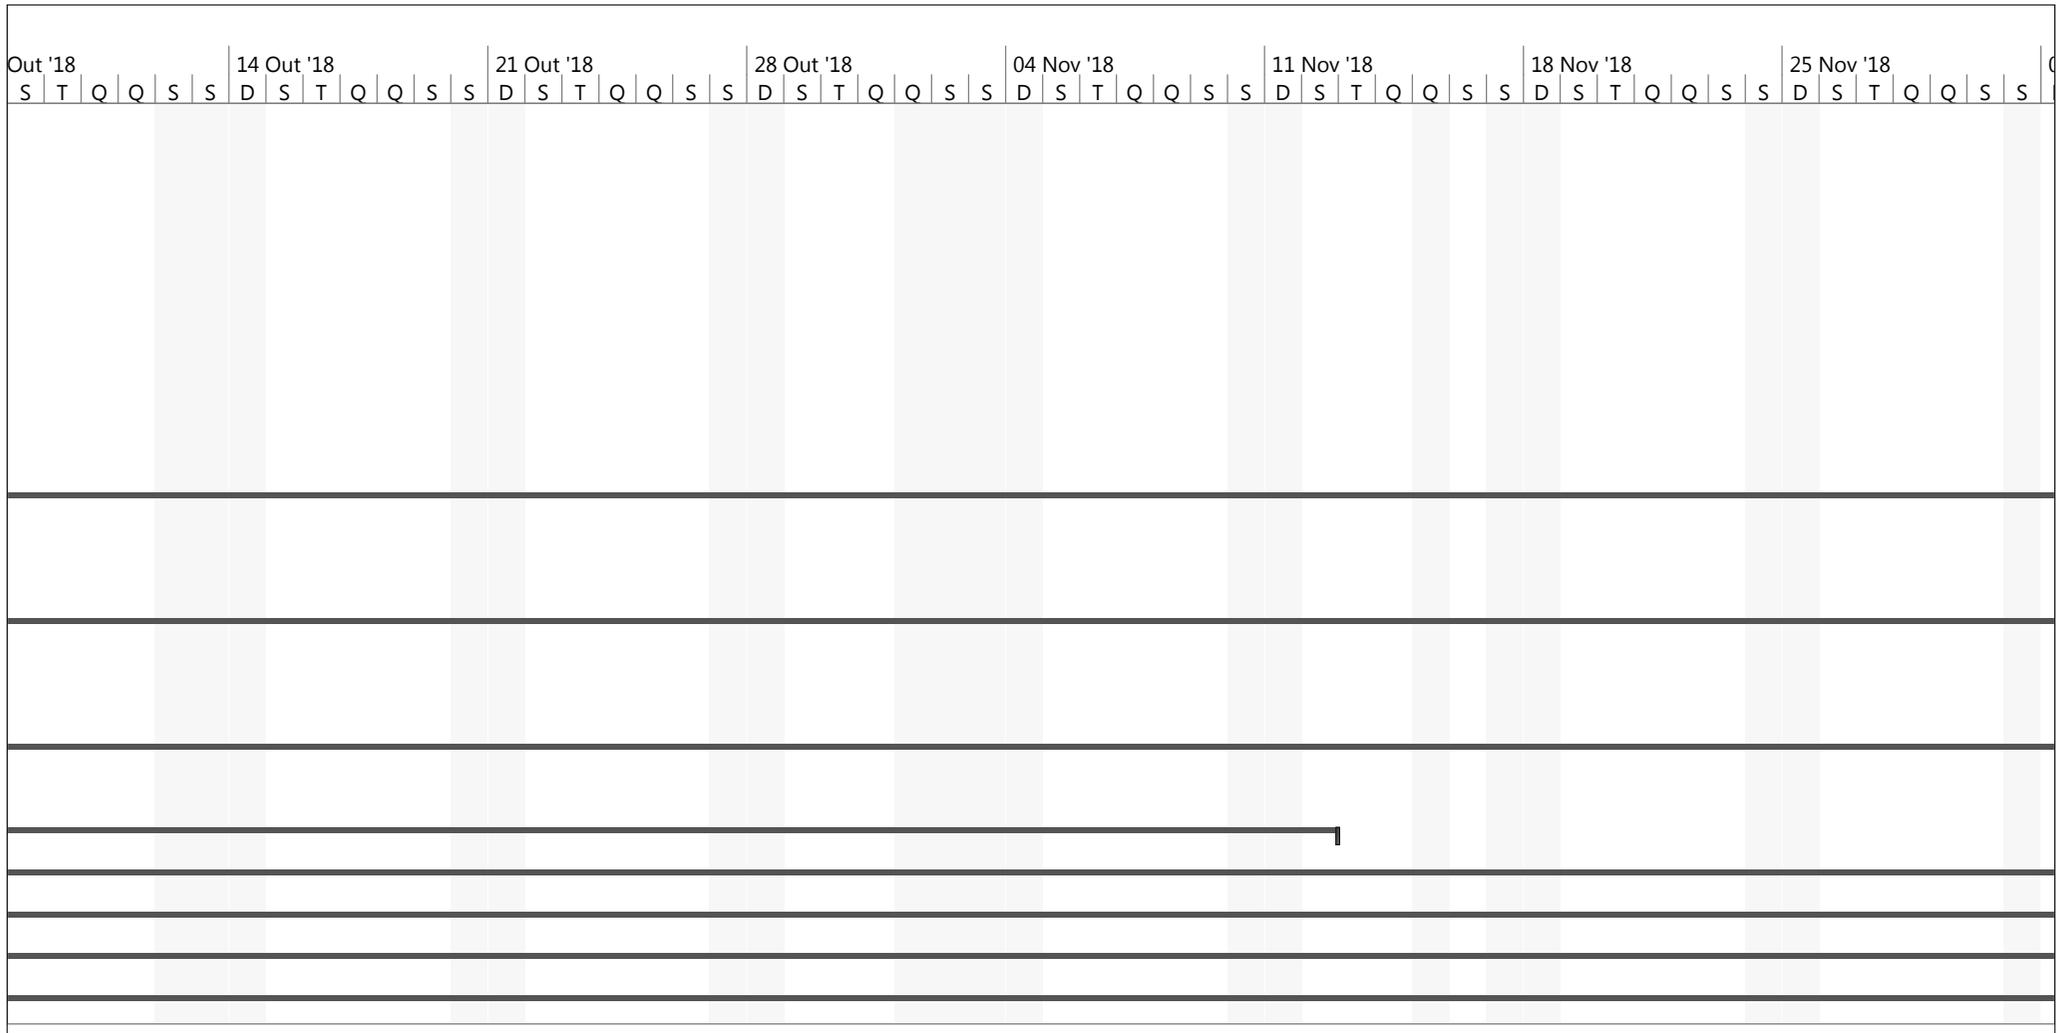

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

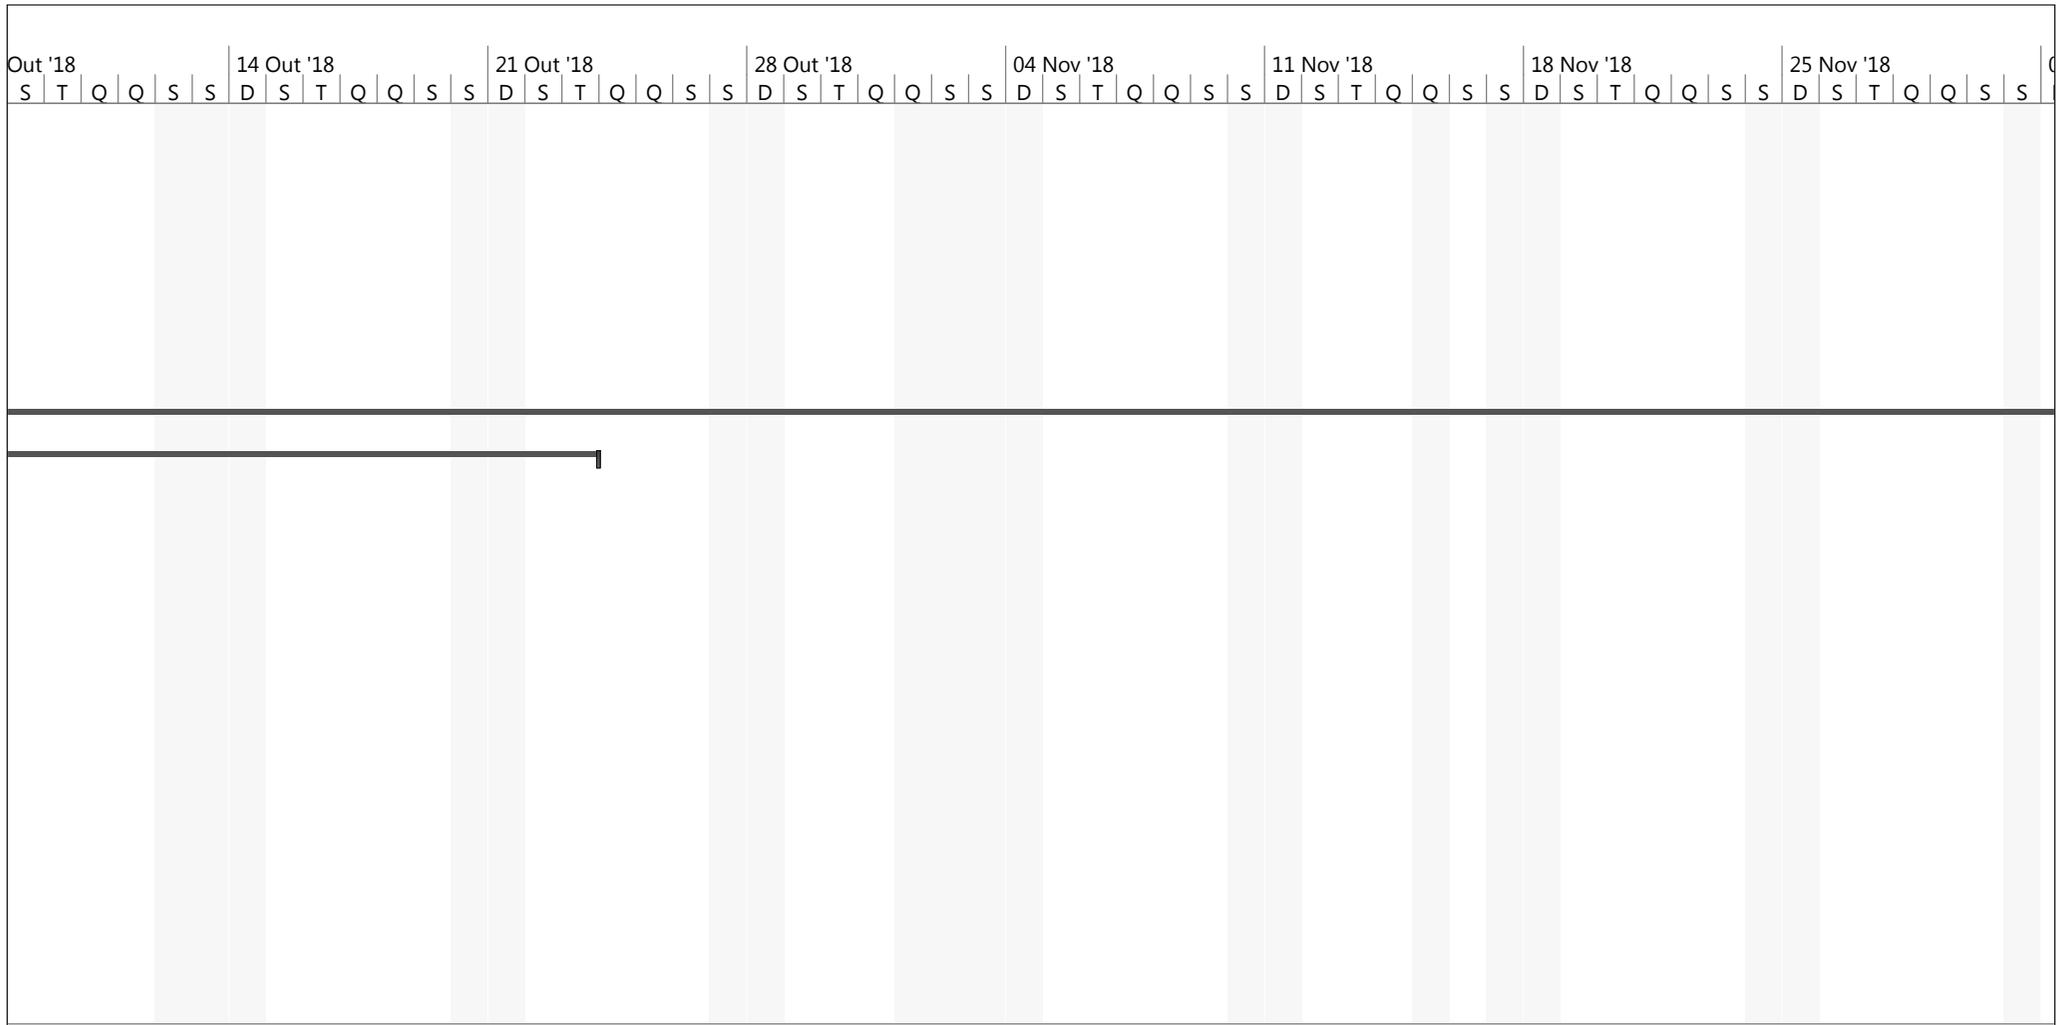


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

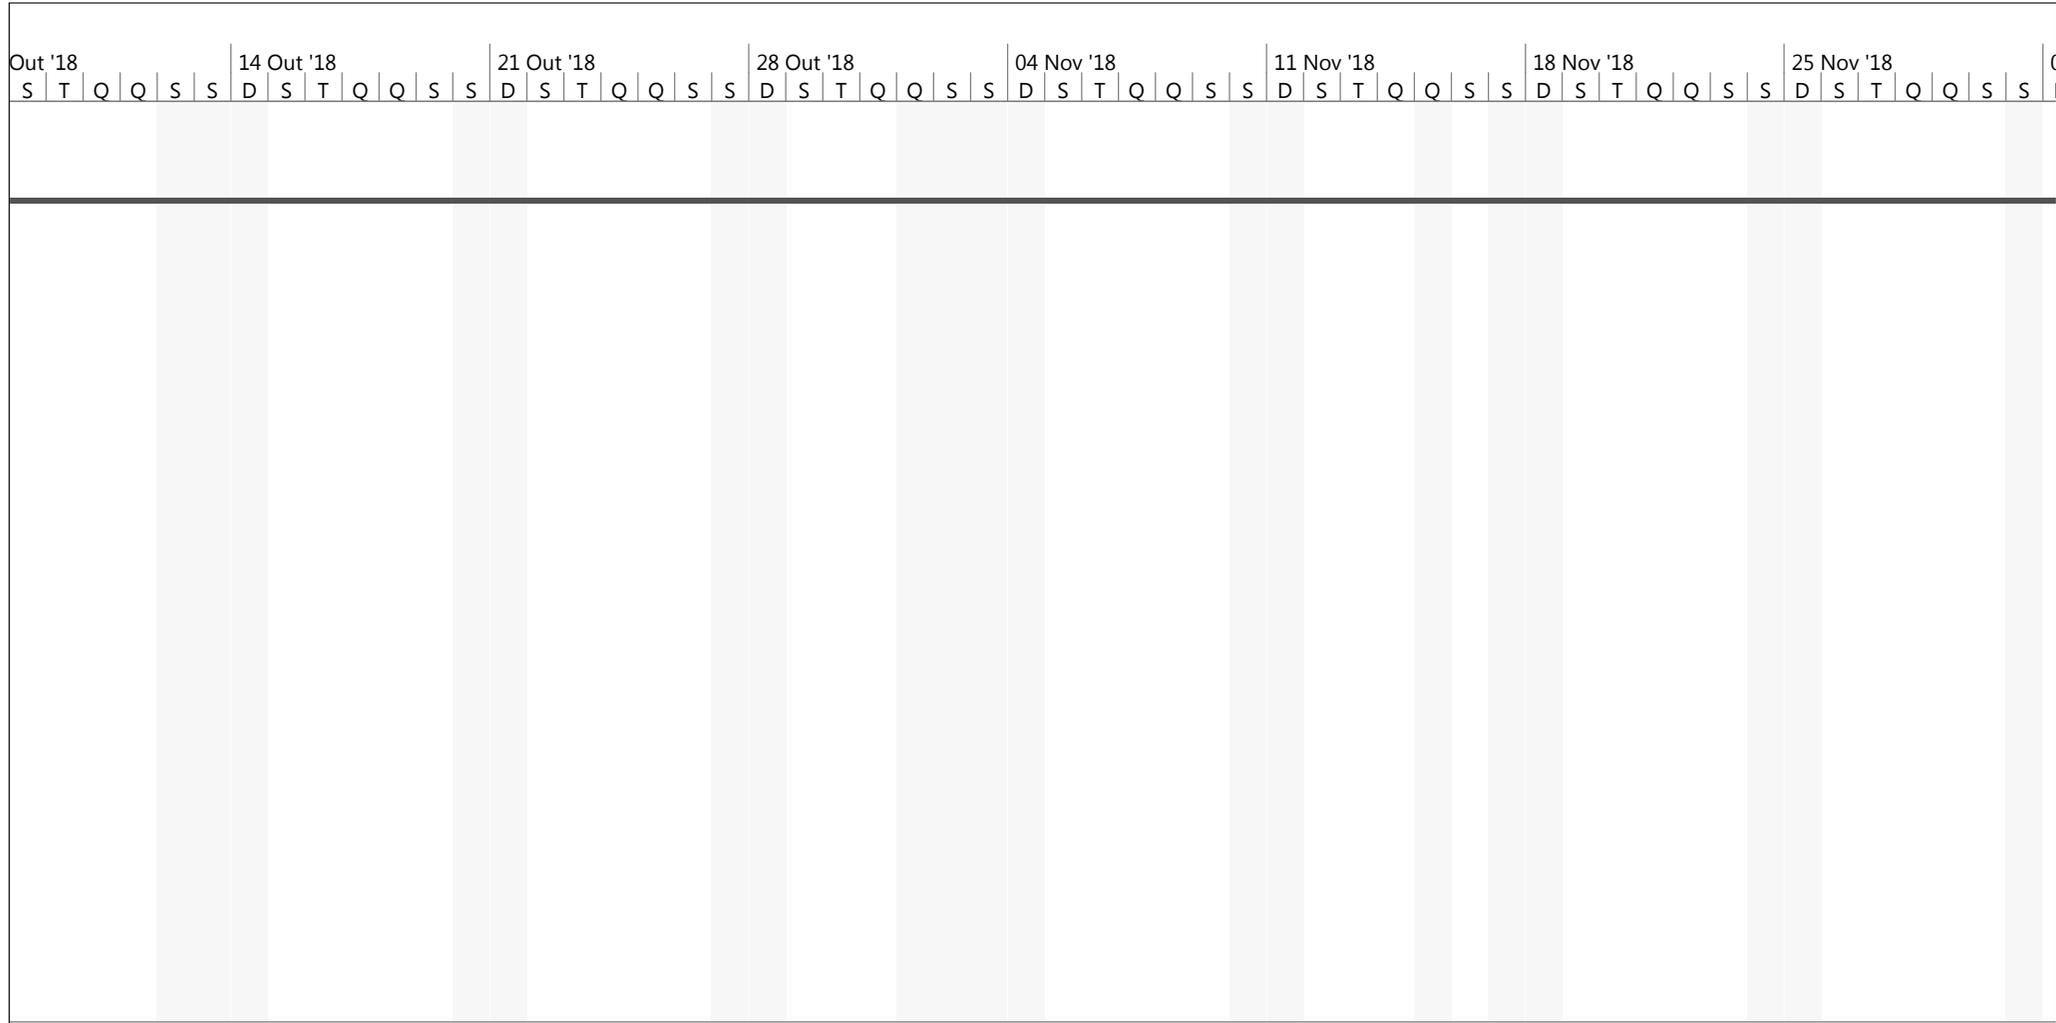


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

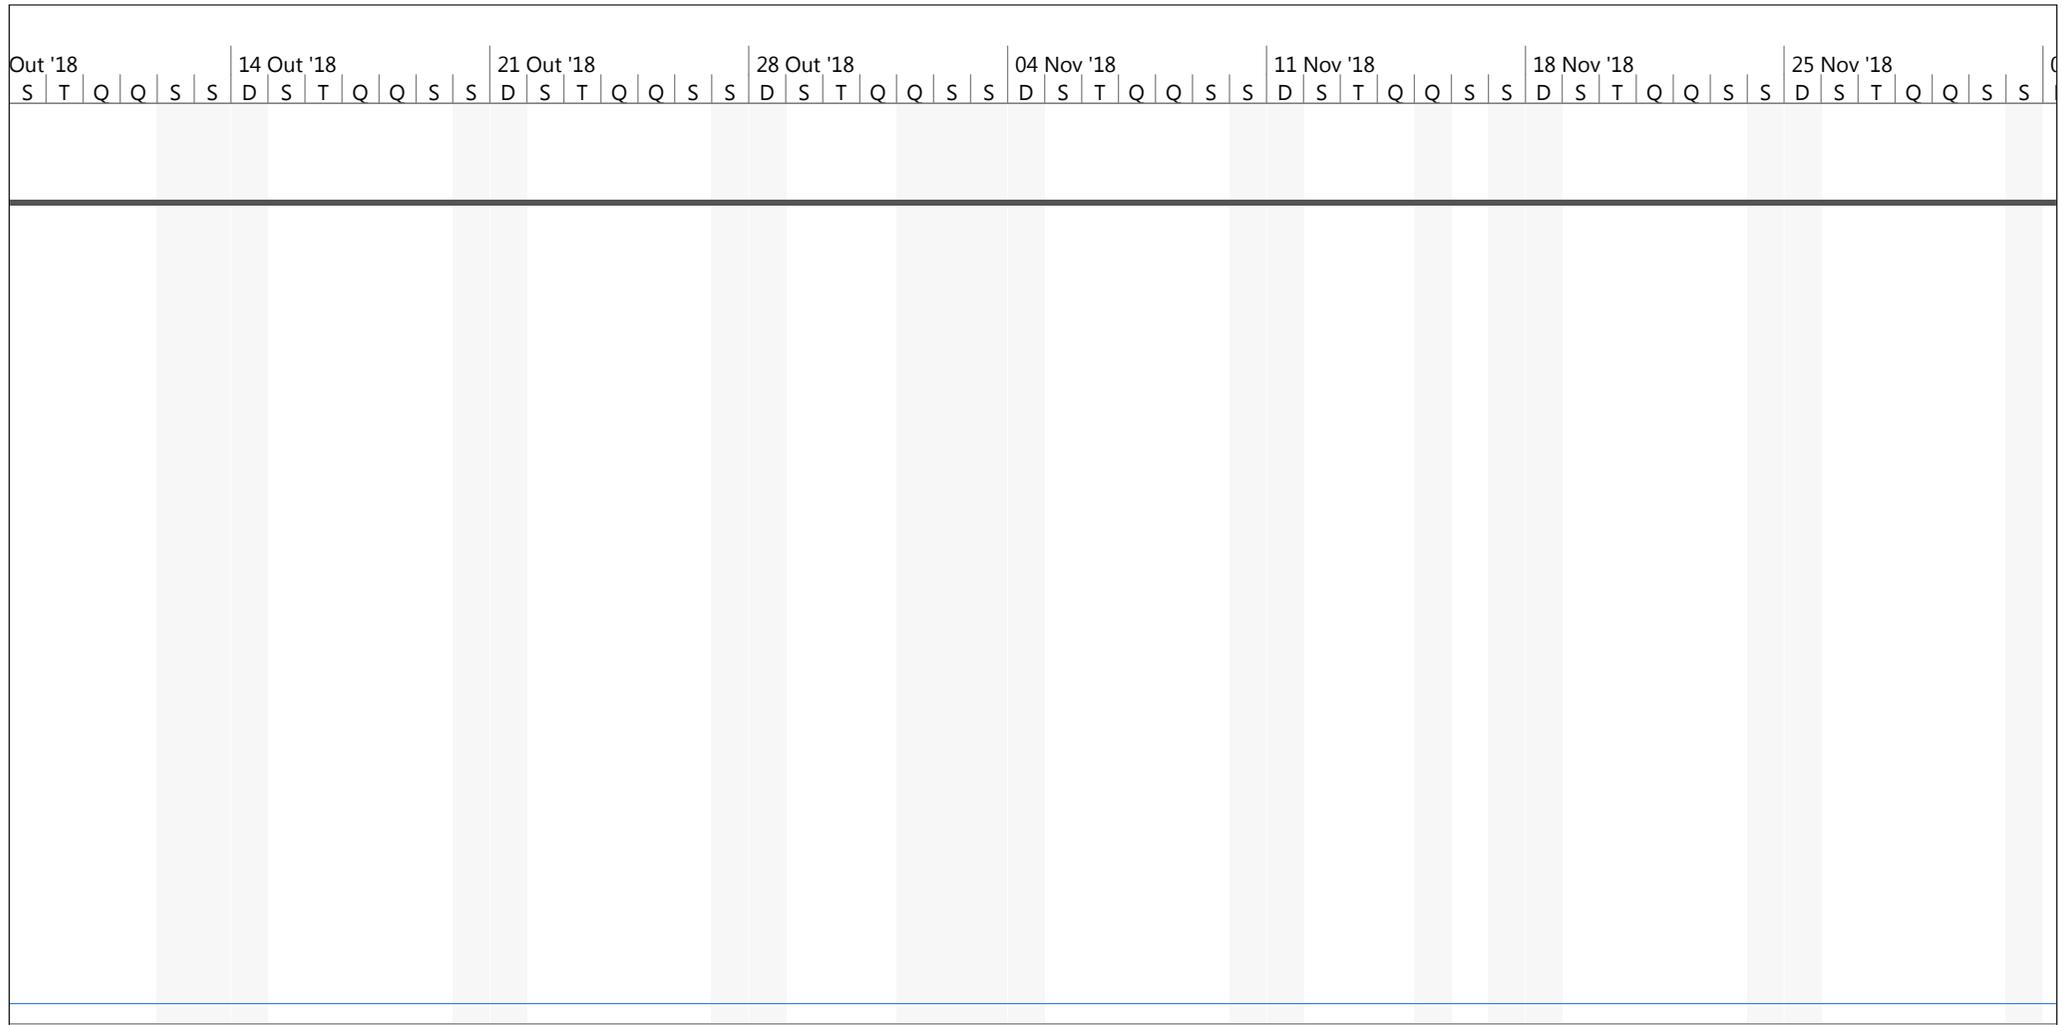

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


02 Dez '18 | 09 Dez '18 | 16 Dez '18 | 23 Dez '18 | 30 Dez '18 | 06 Jan '19 | 13 Jan '19 | 20 Jan '19  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

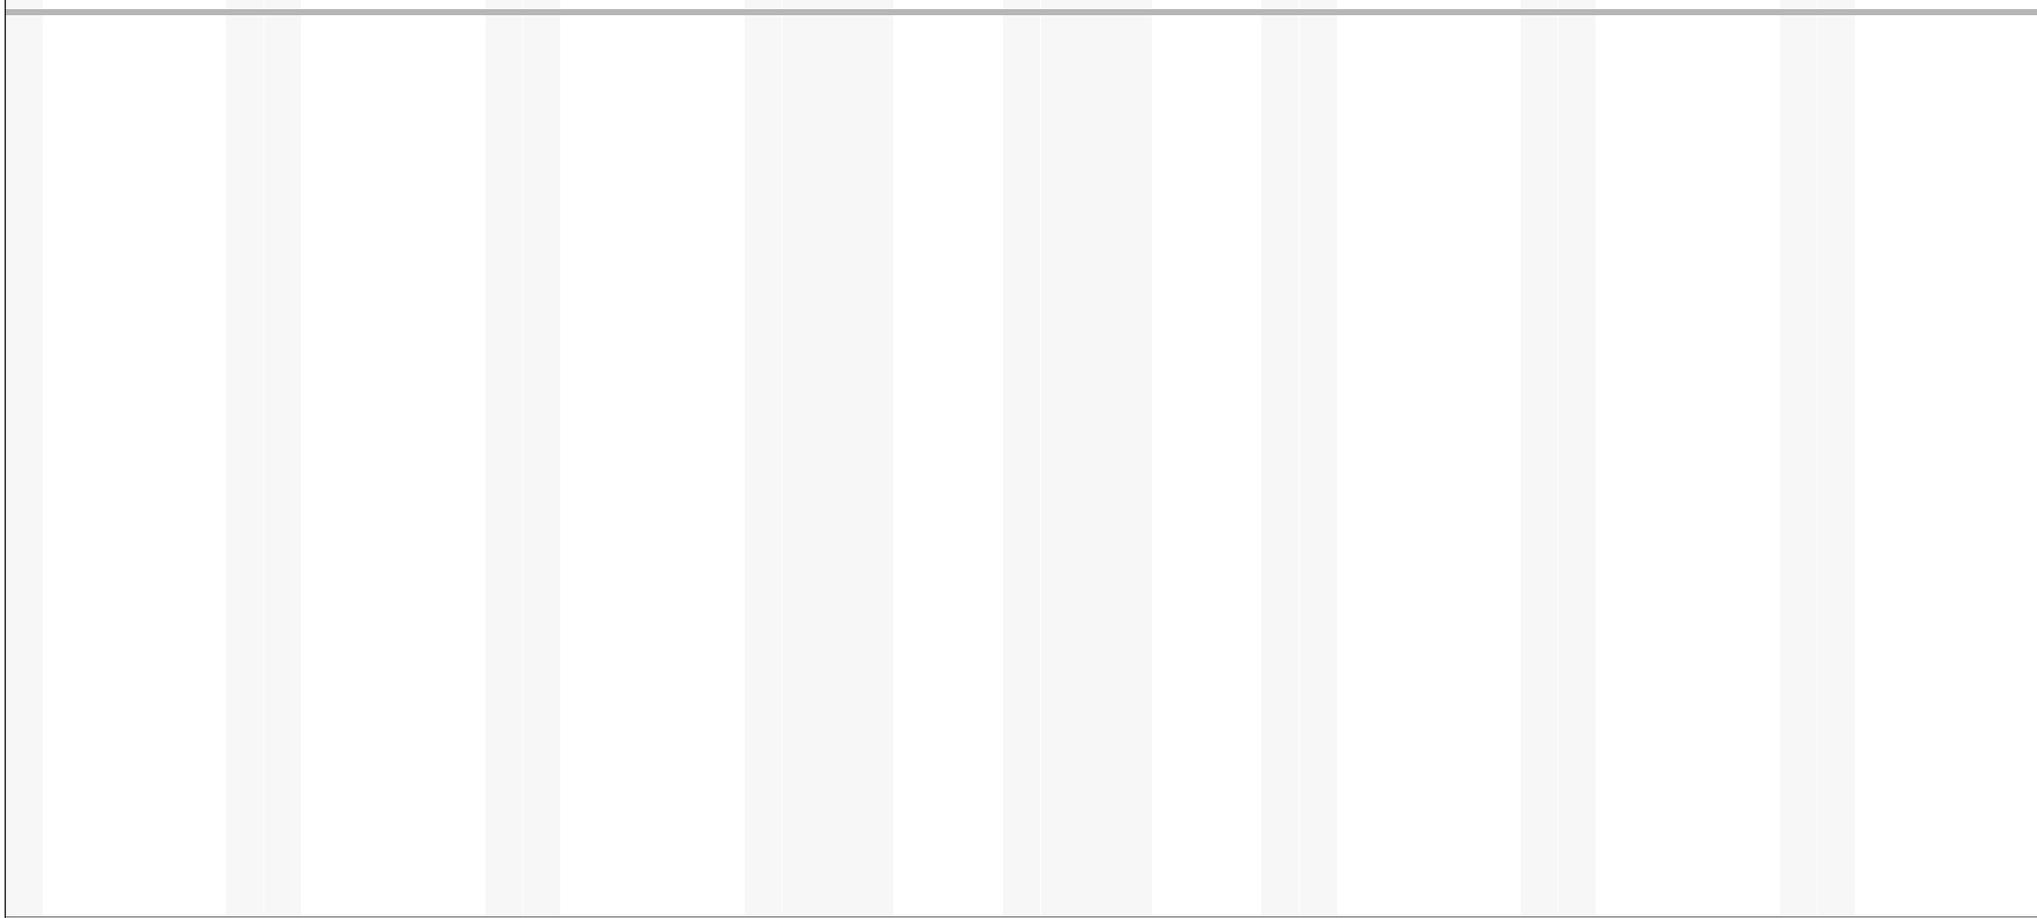


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

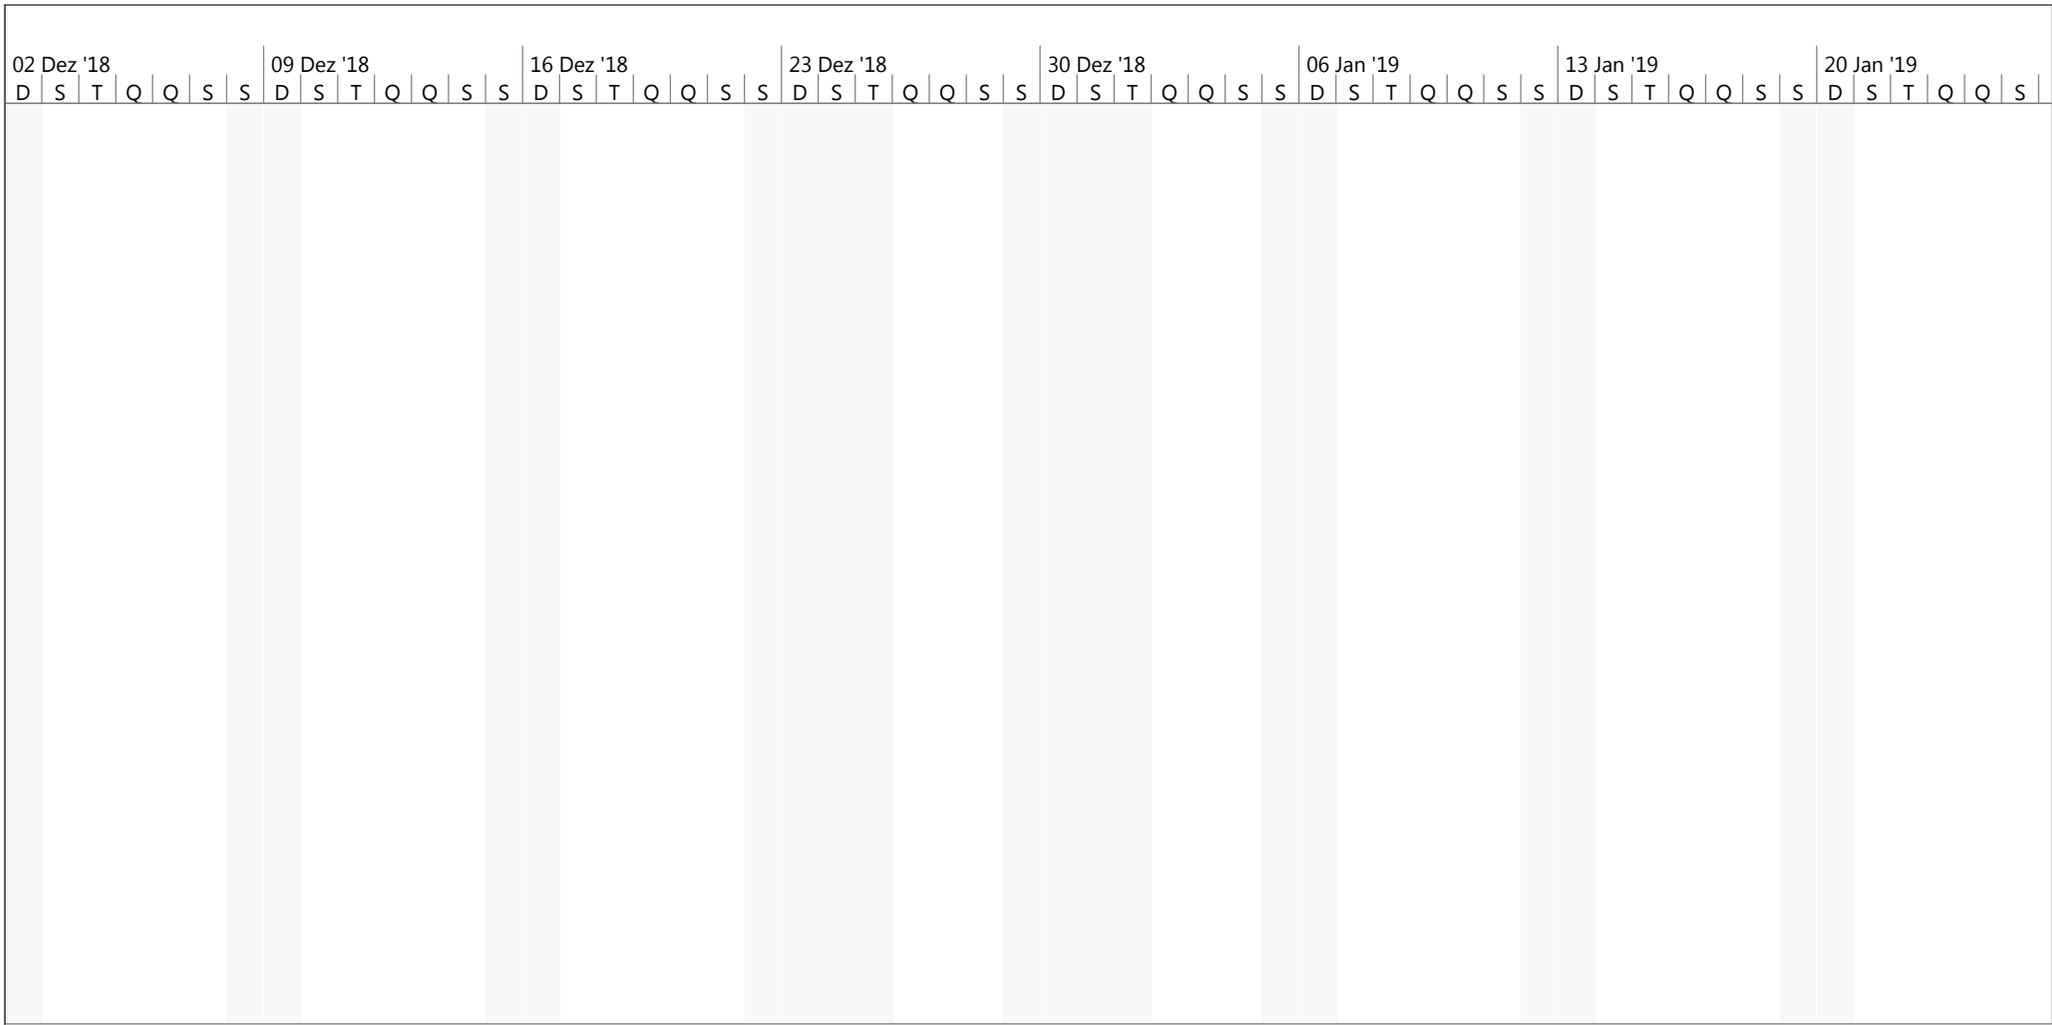

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

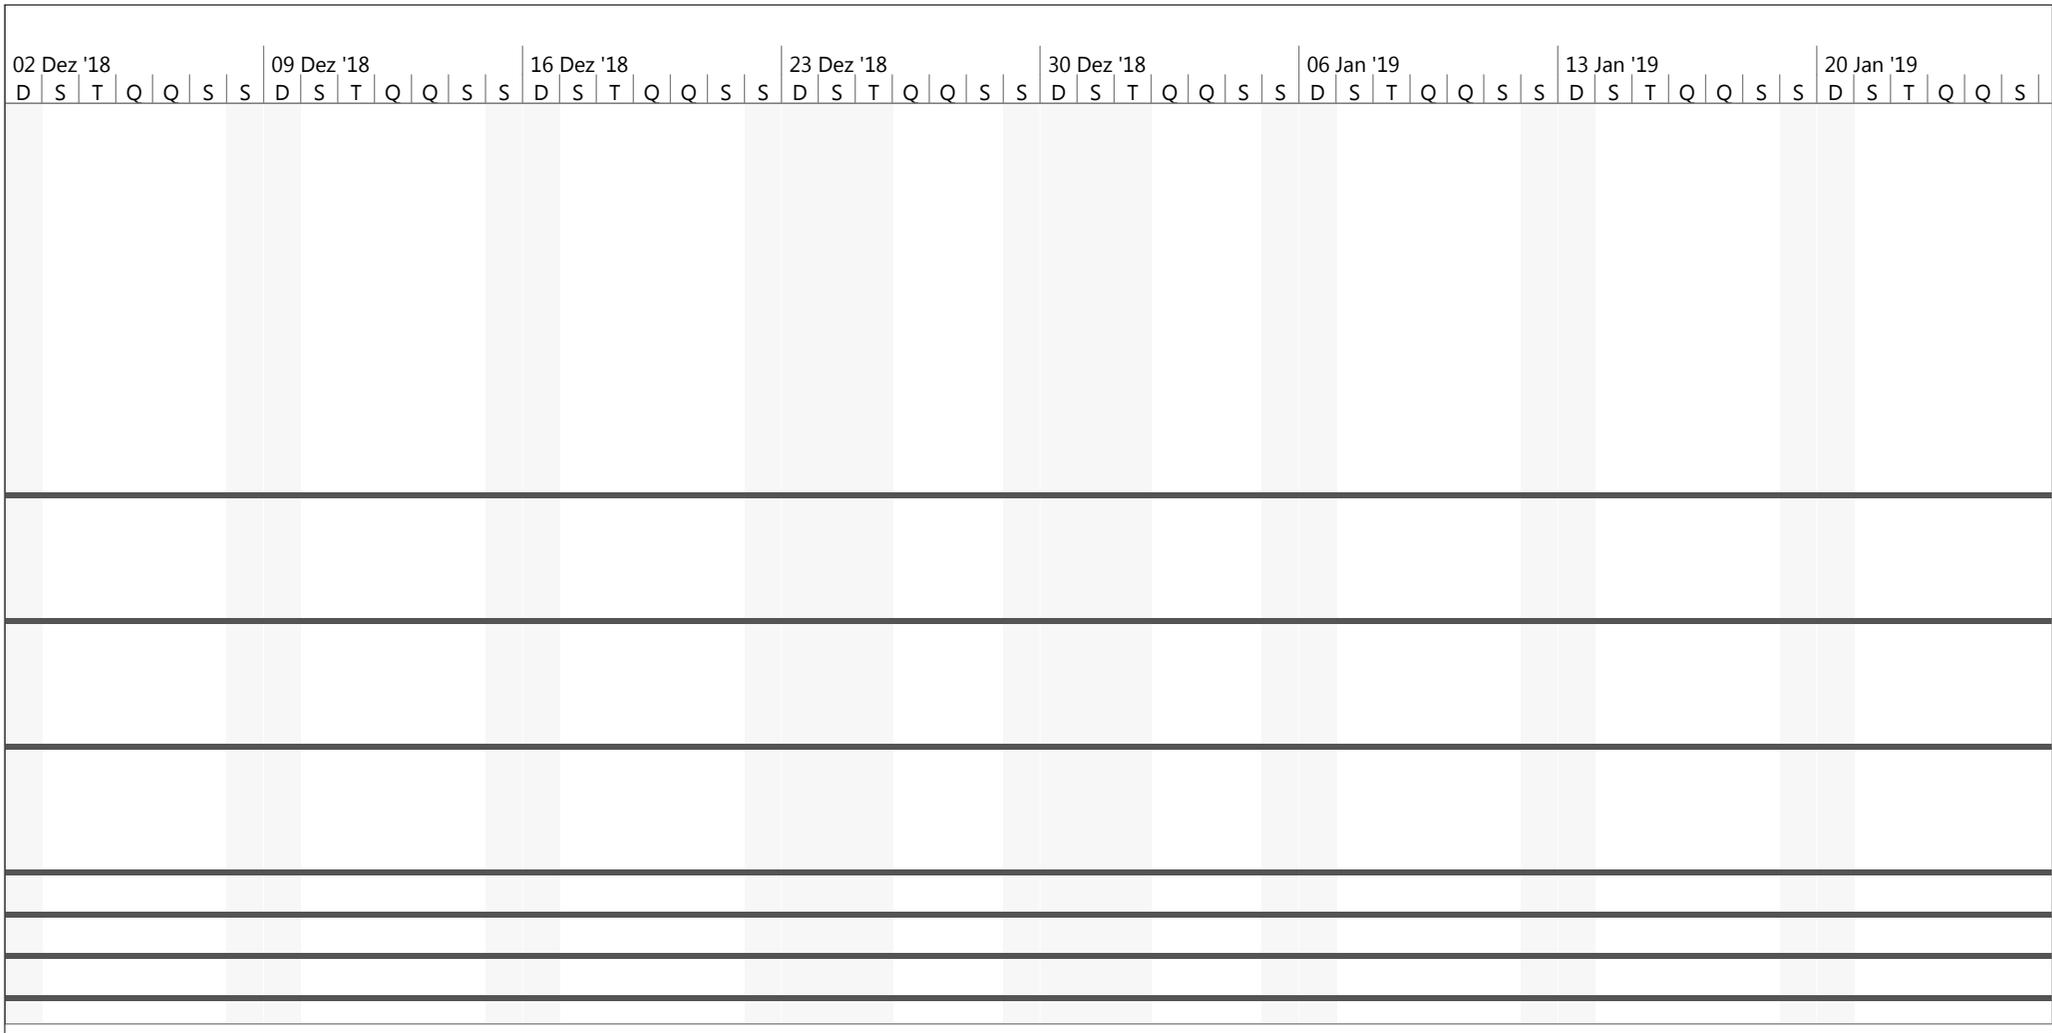


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

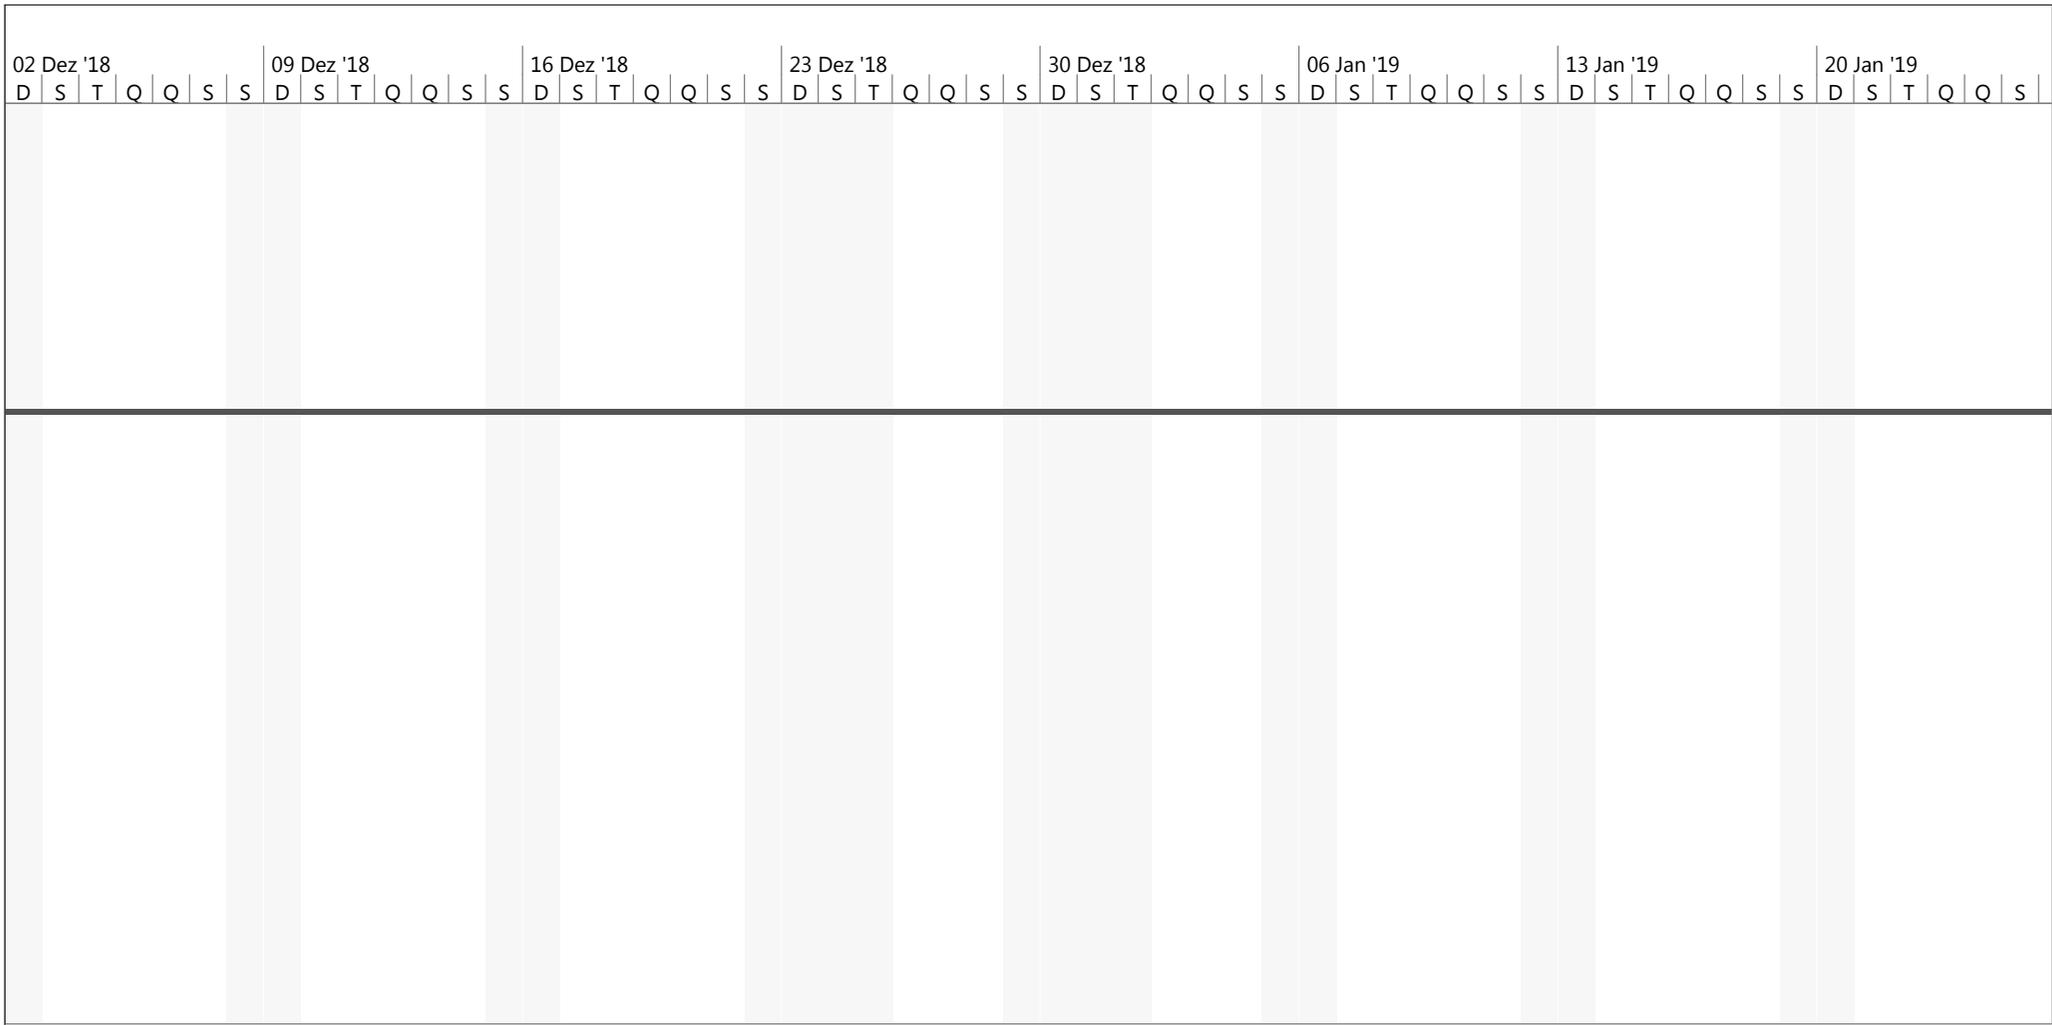


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


02 Dez '18 | 09 Dez '18 | 16 Dez '18 | 23 Dez '18 | 30 Dez '18 | 06 Jan '19 | 13 Jan '19 | 20 Jan '19  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

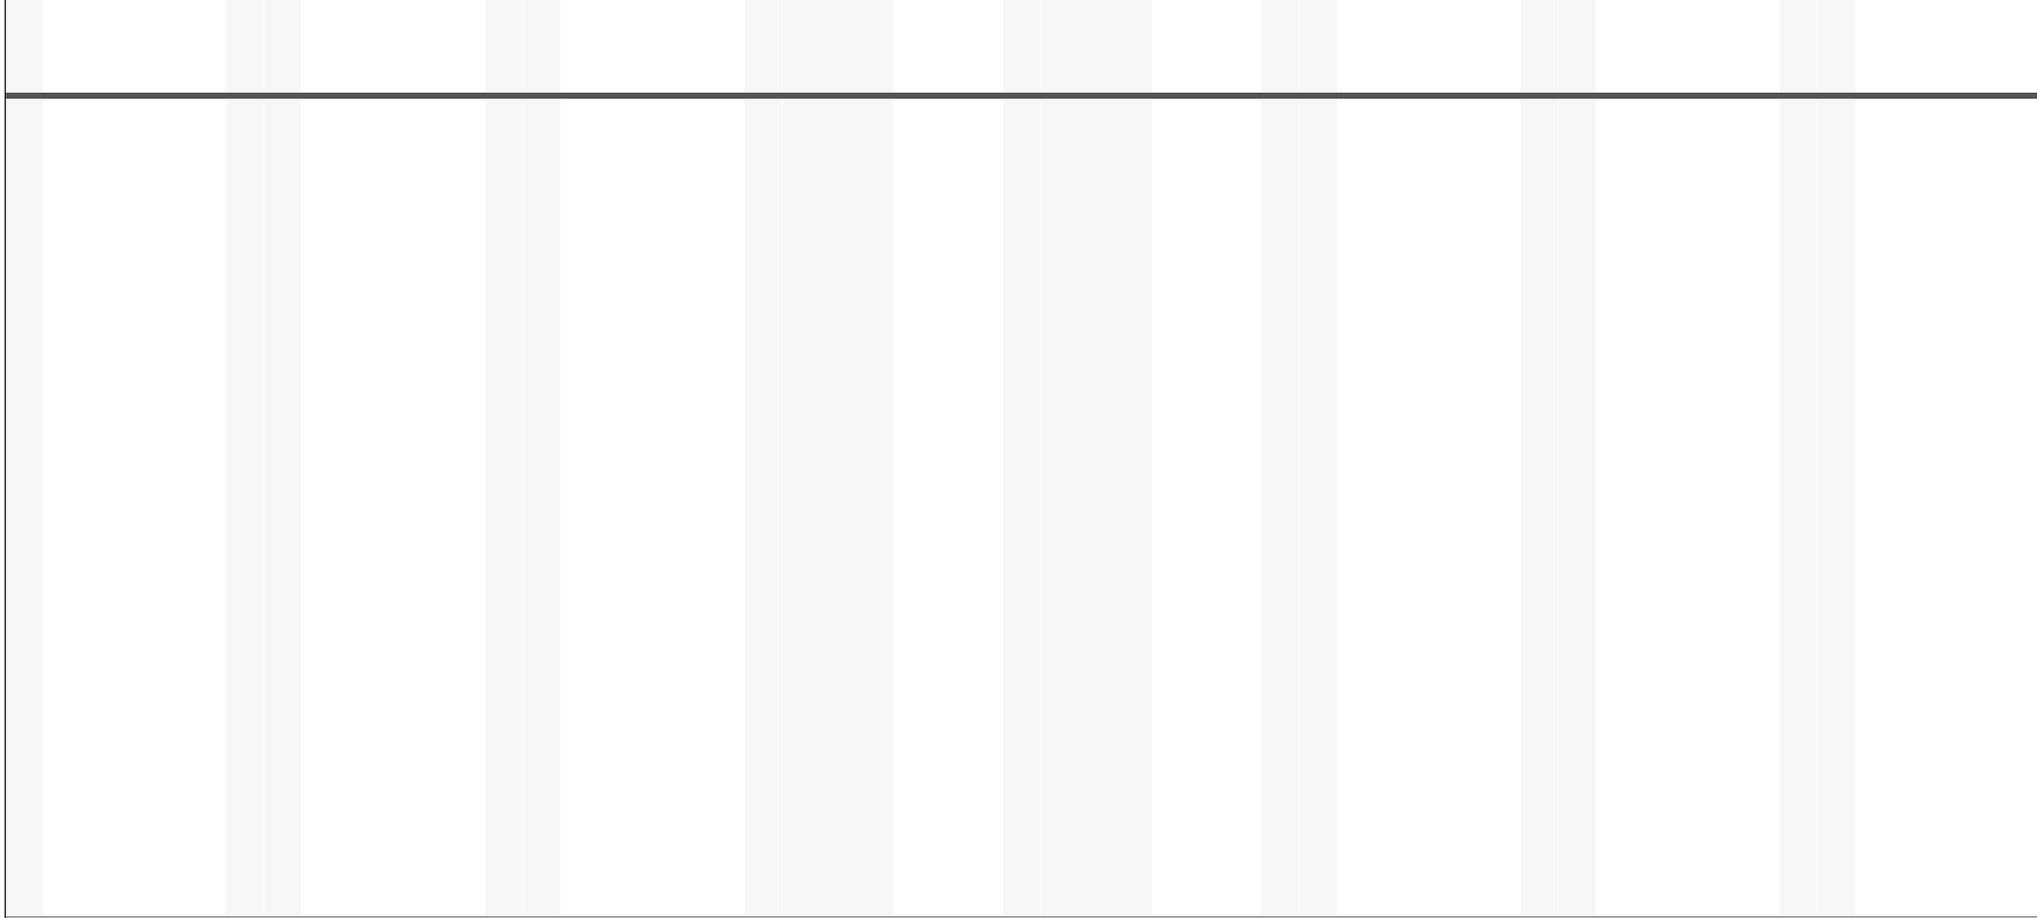

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

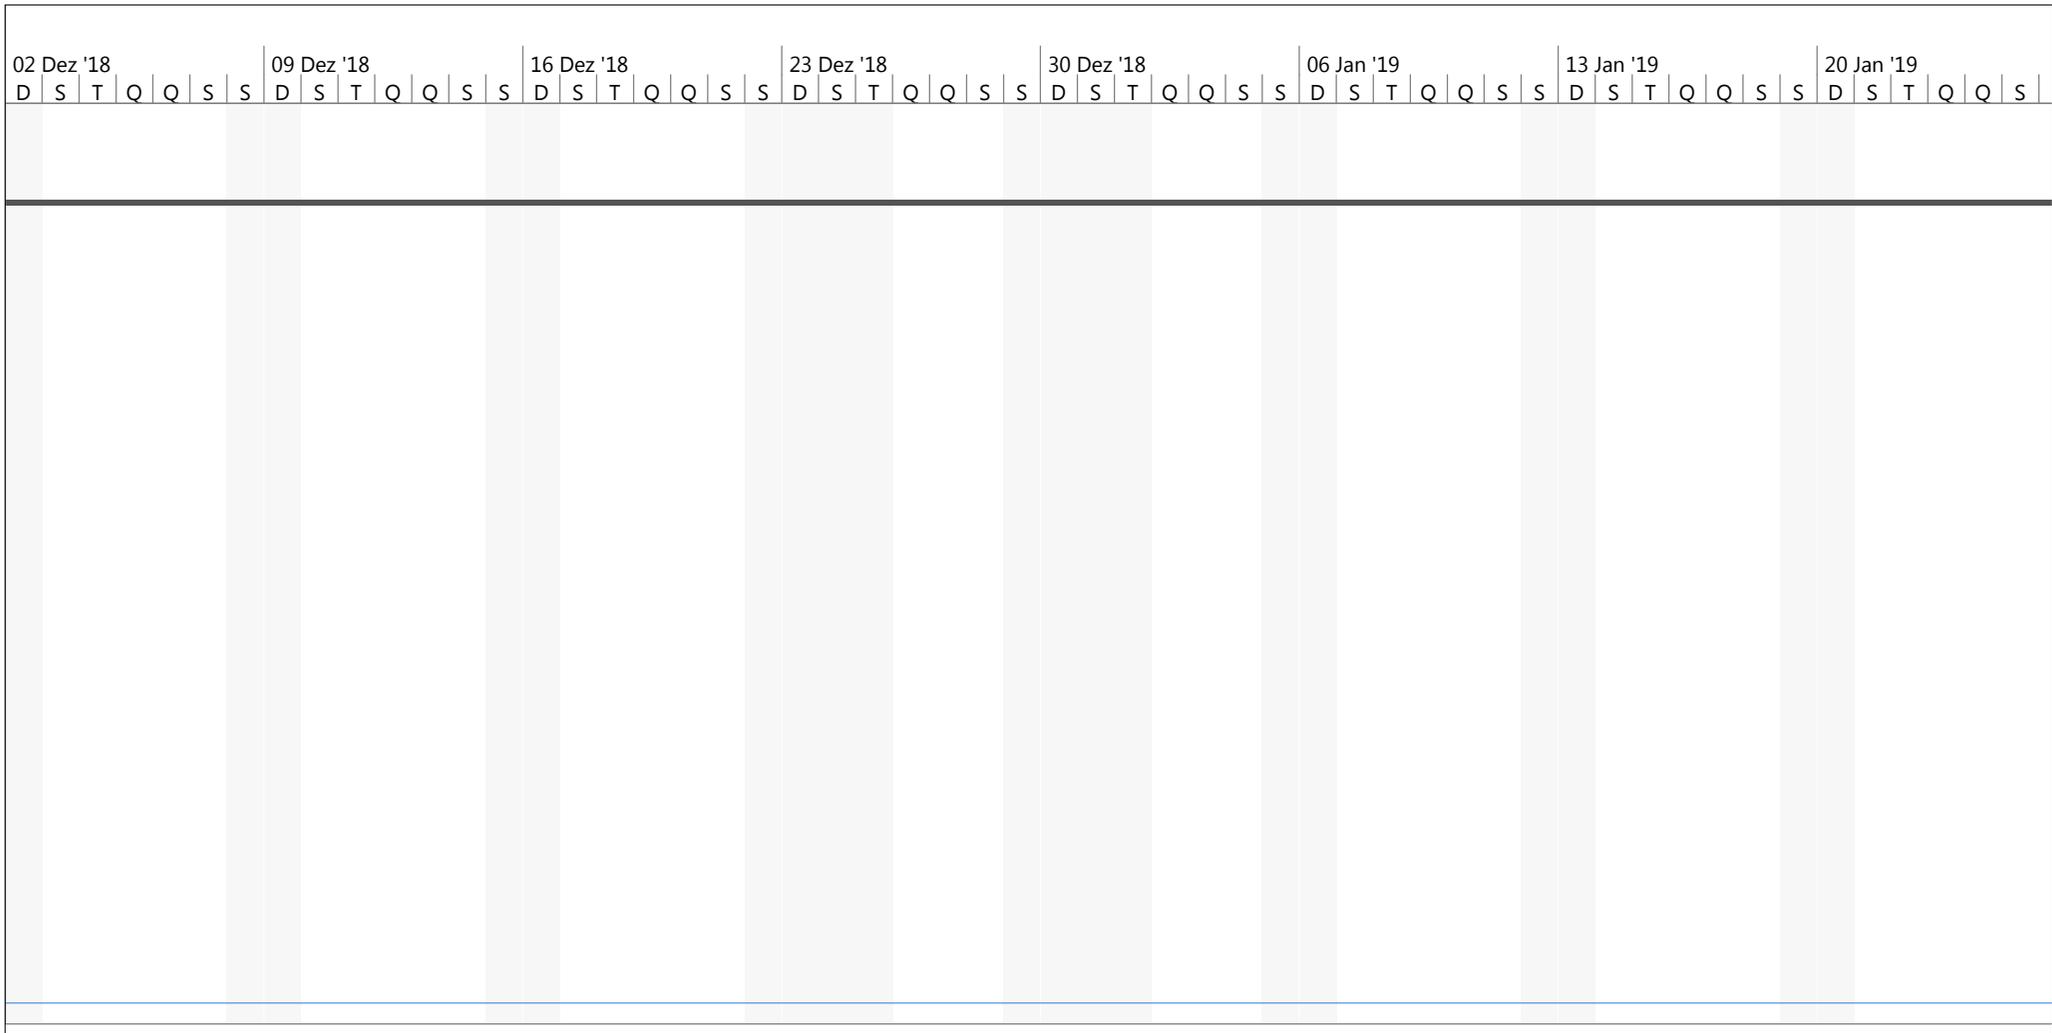


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


27 Jan '19 03 Fev '19 10 Fev '19 17 Fev '19 24 Fev '19 03 Mar '19 10 Mar '19 17 Mar '19  
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

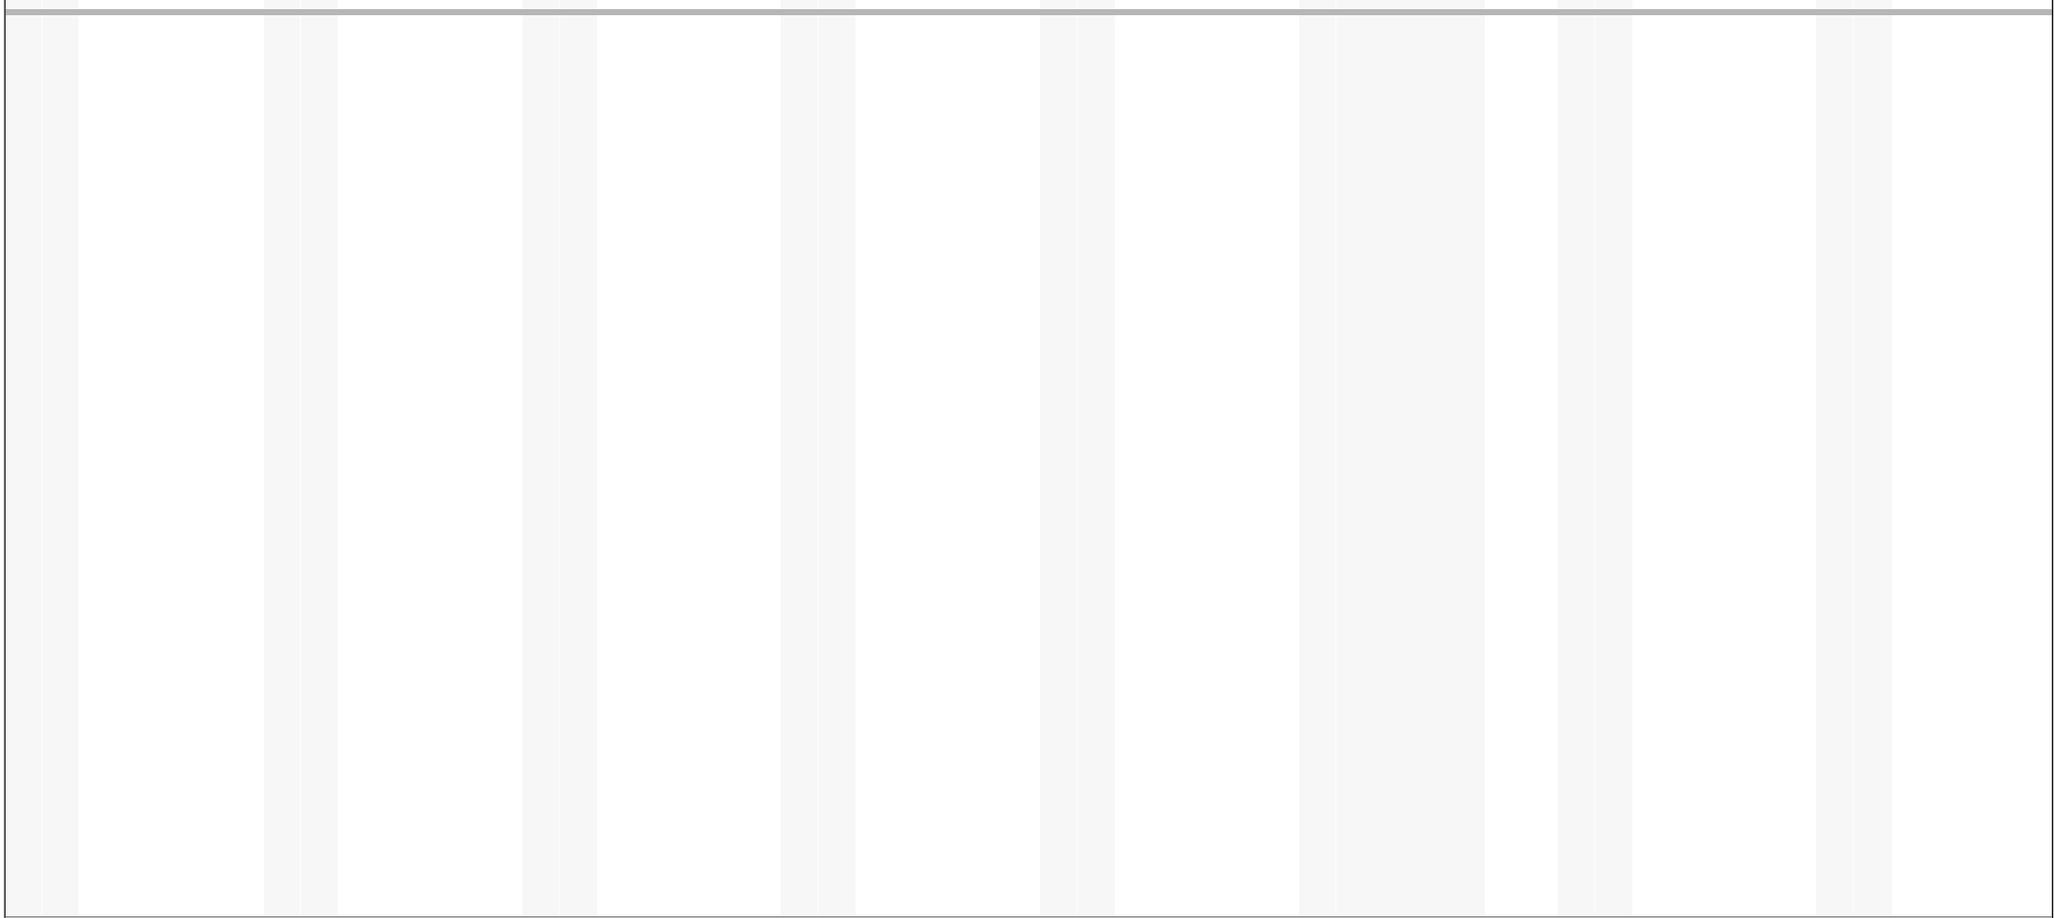


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

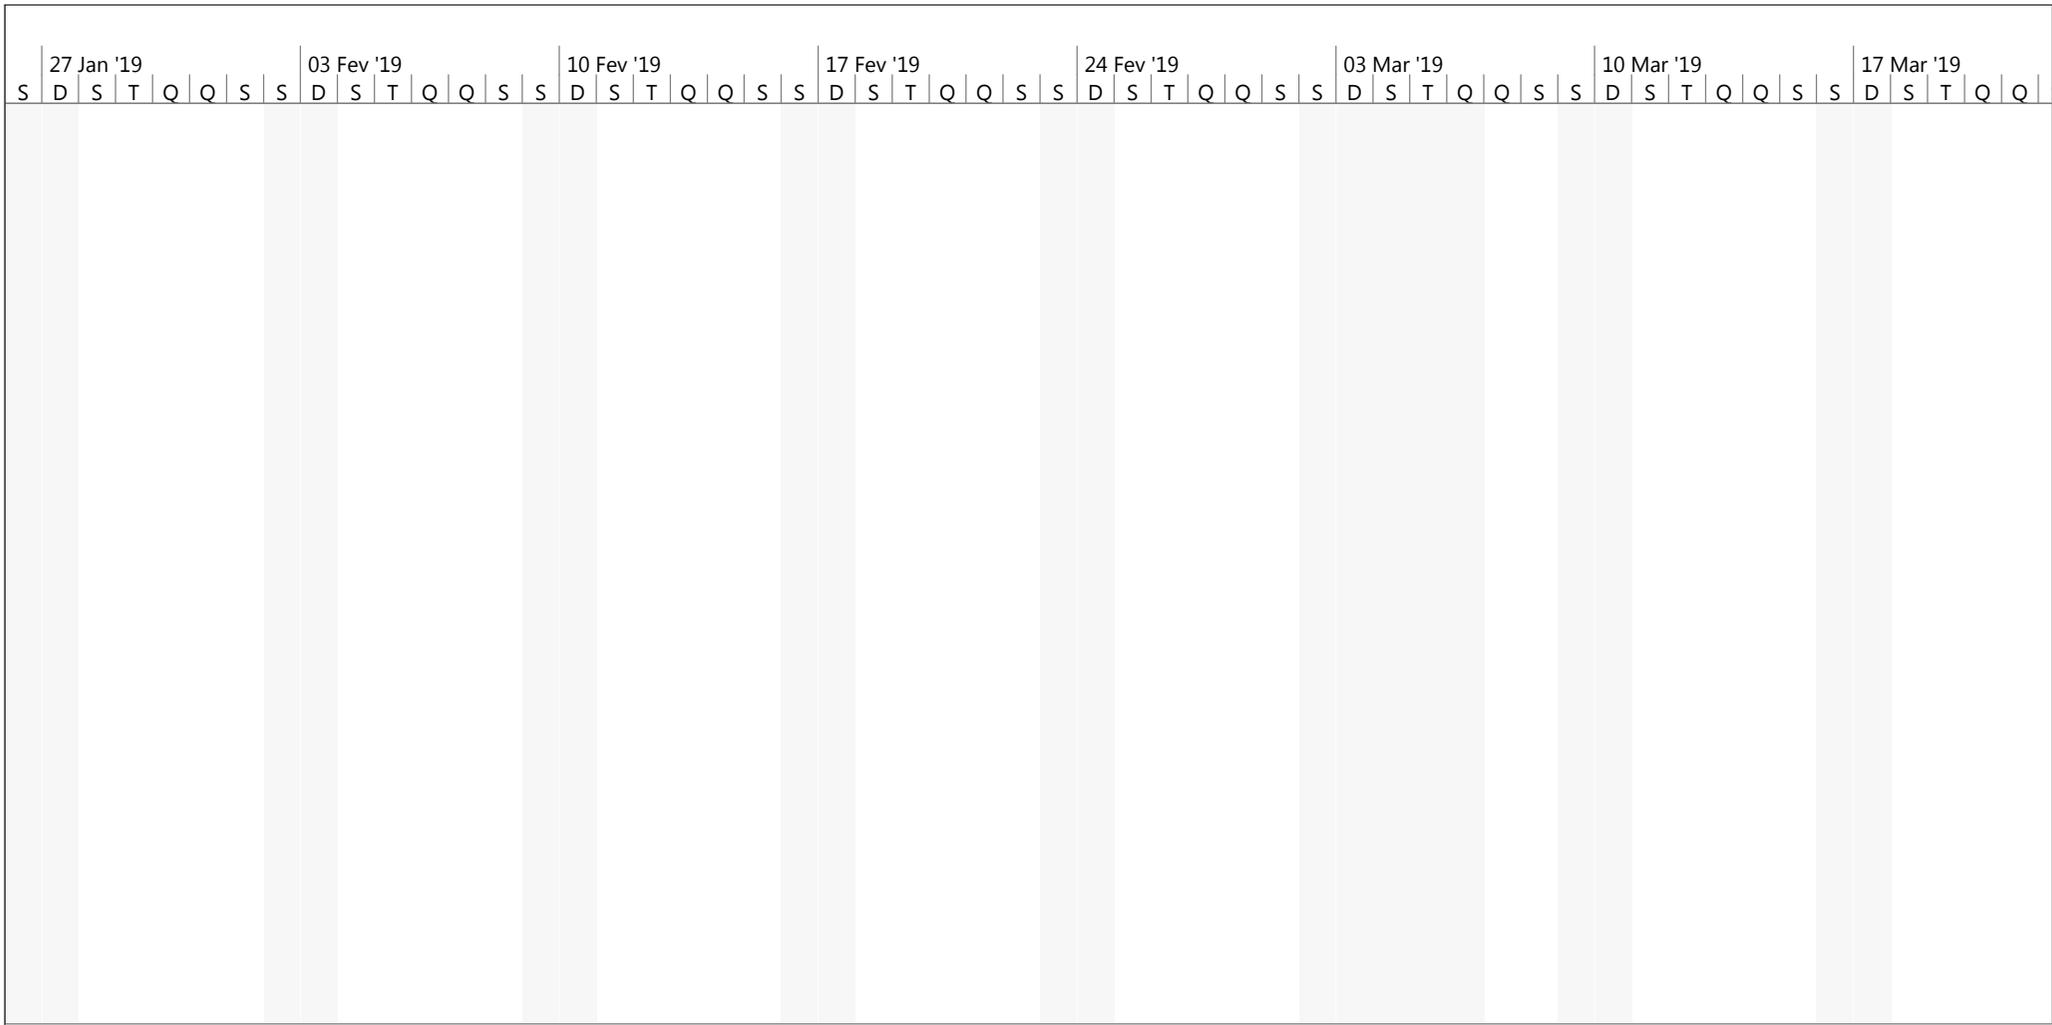


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

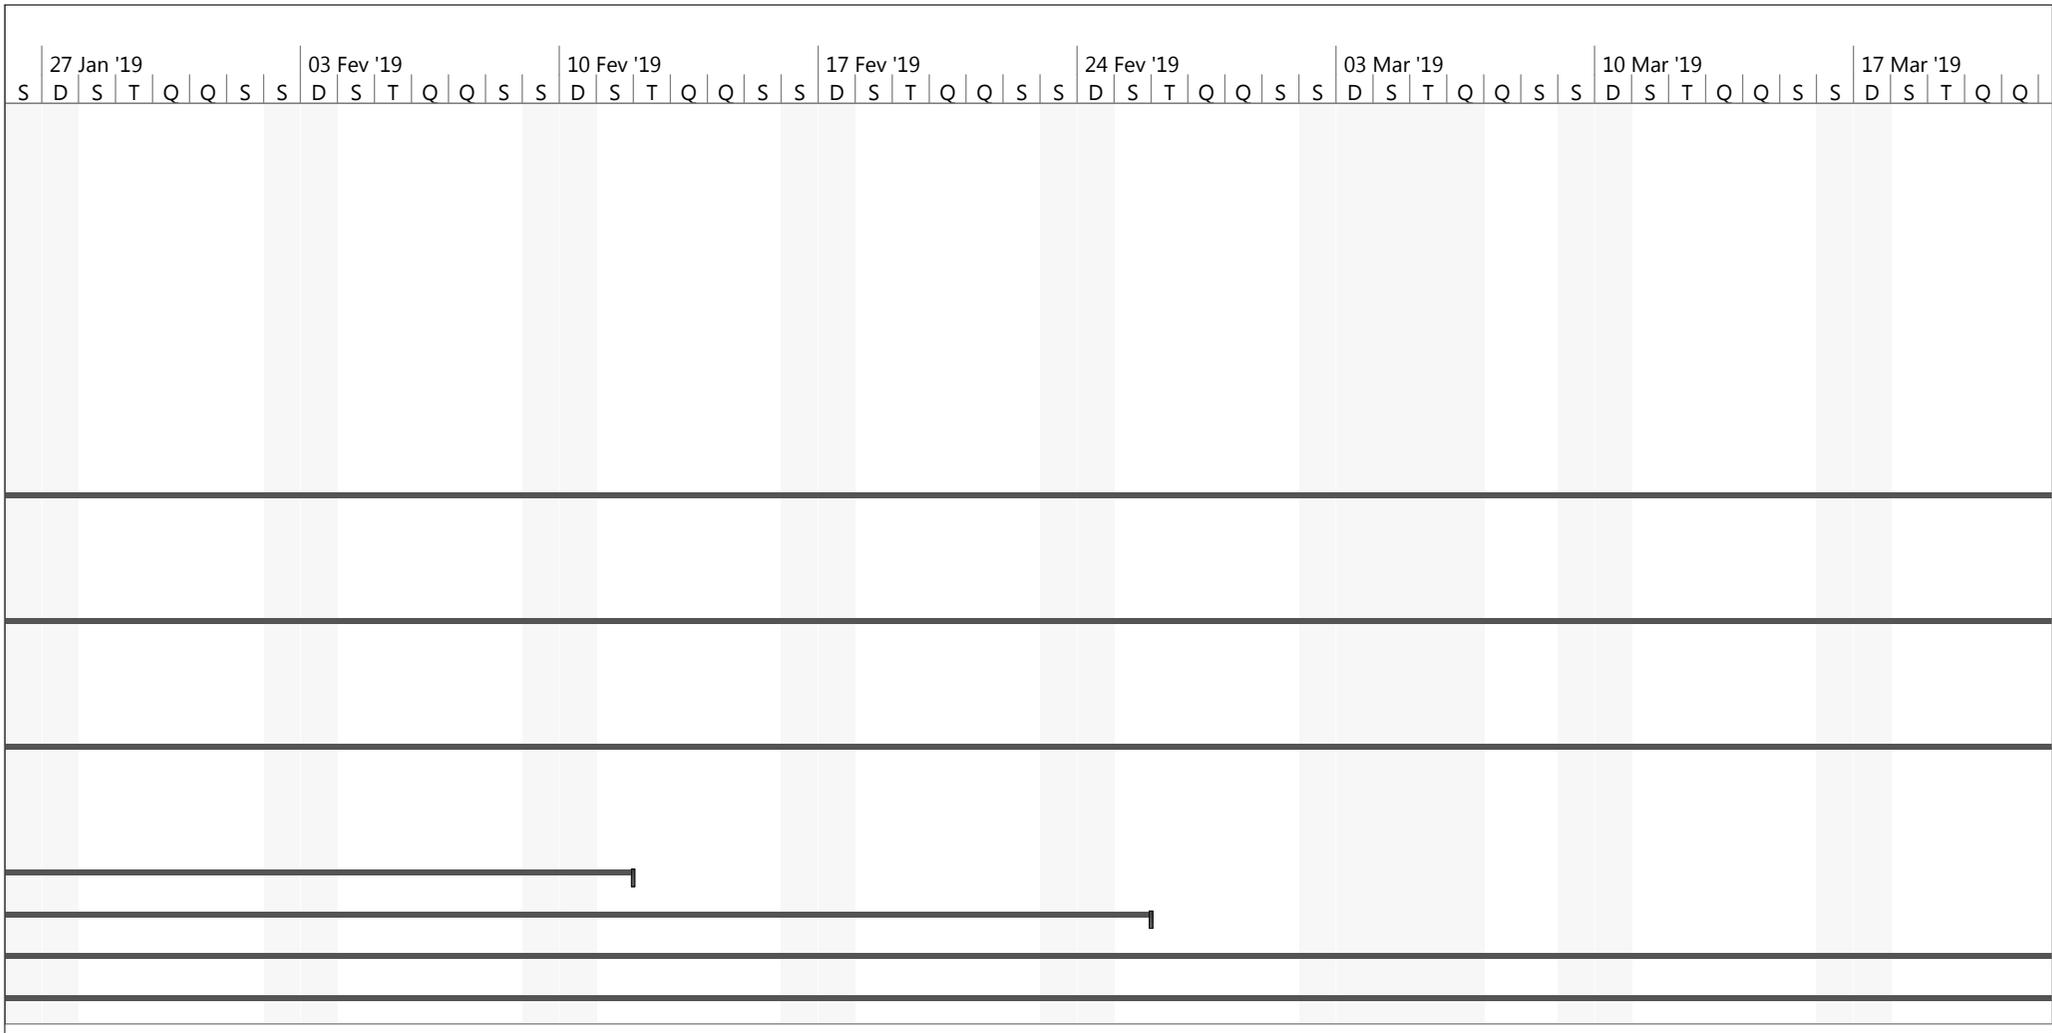

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

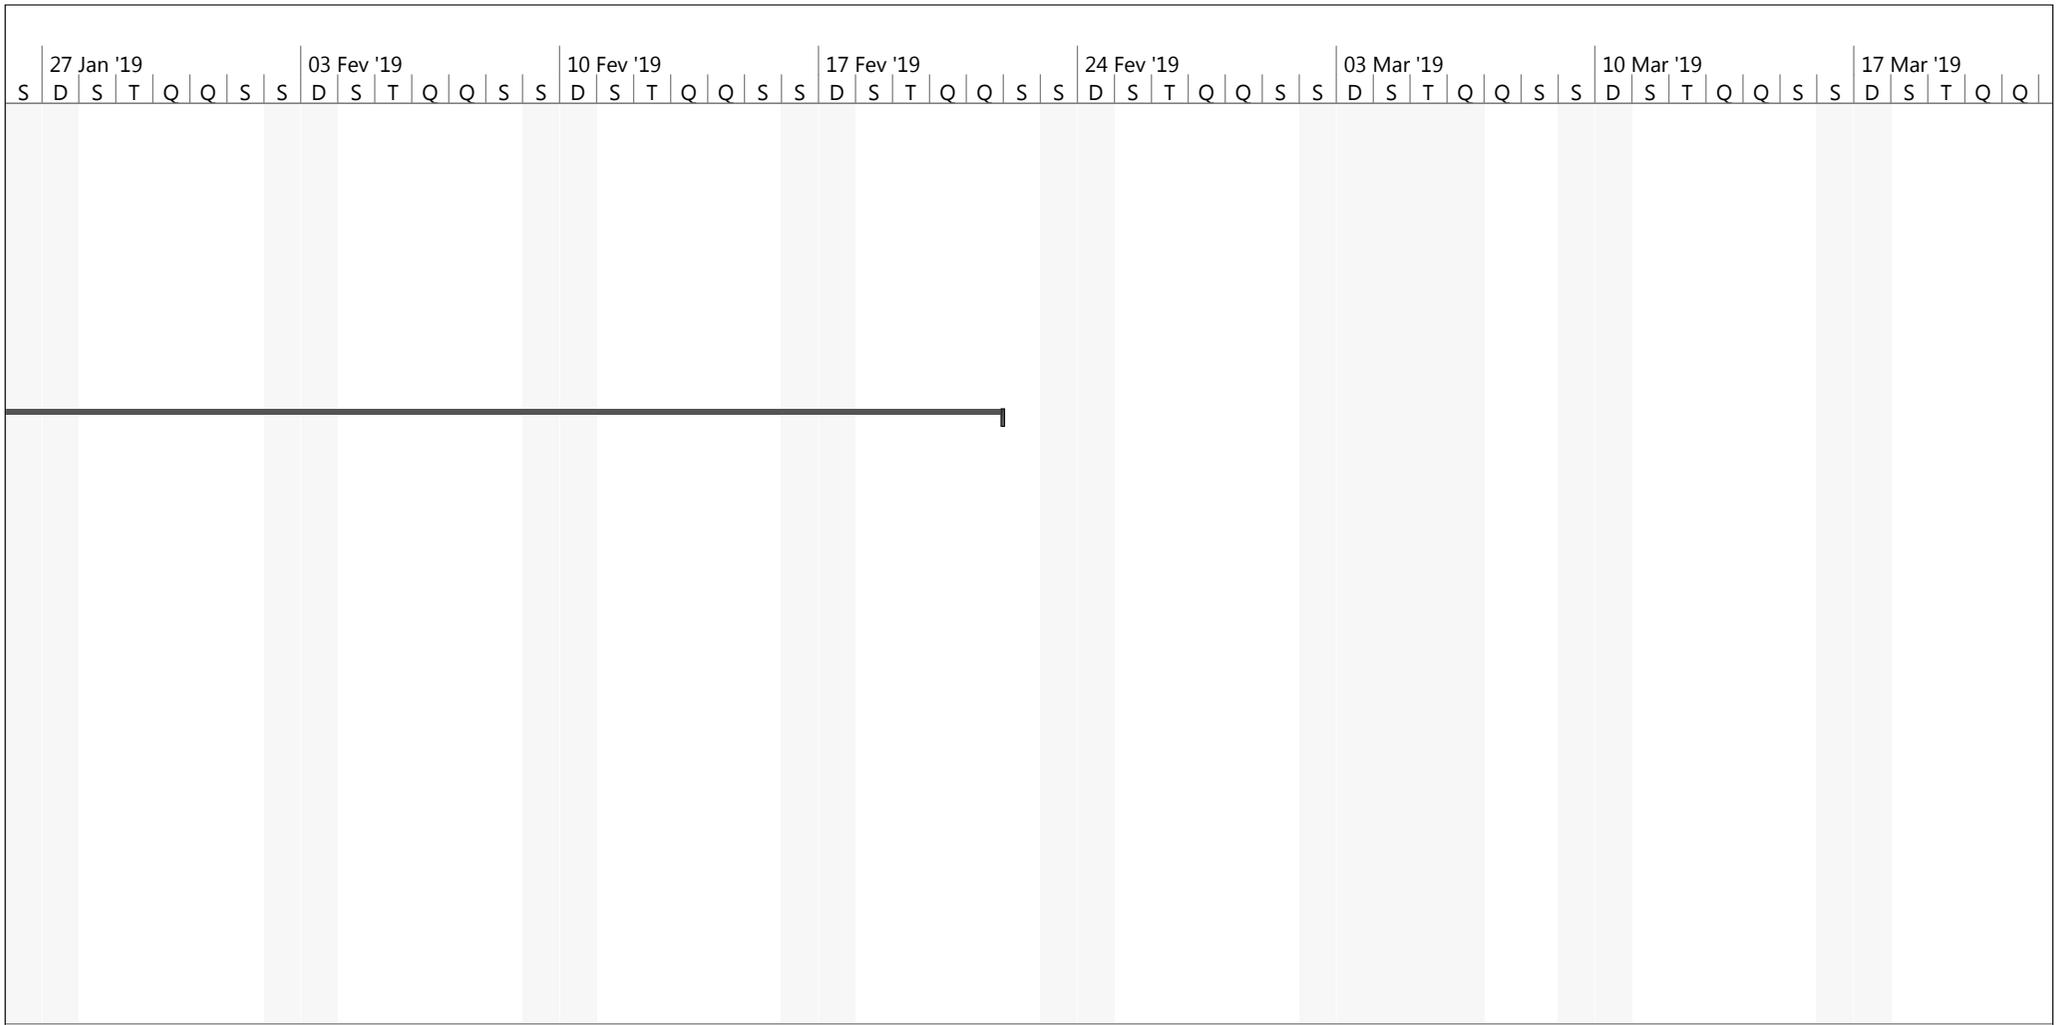


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

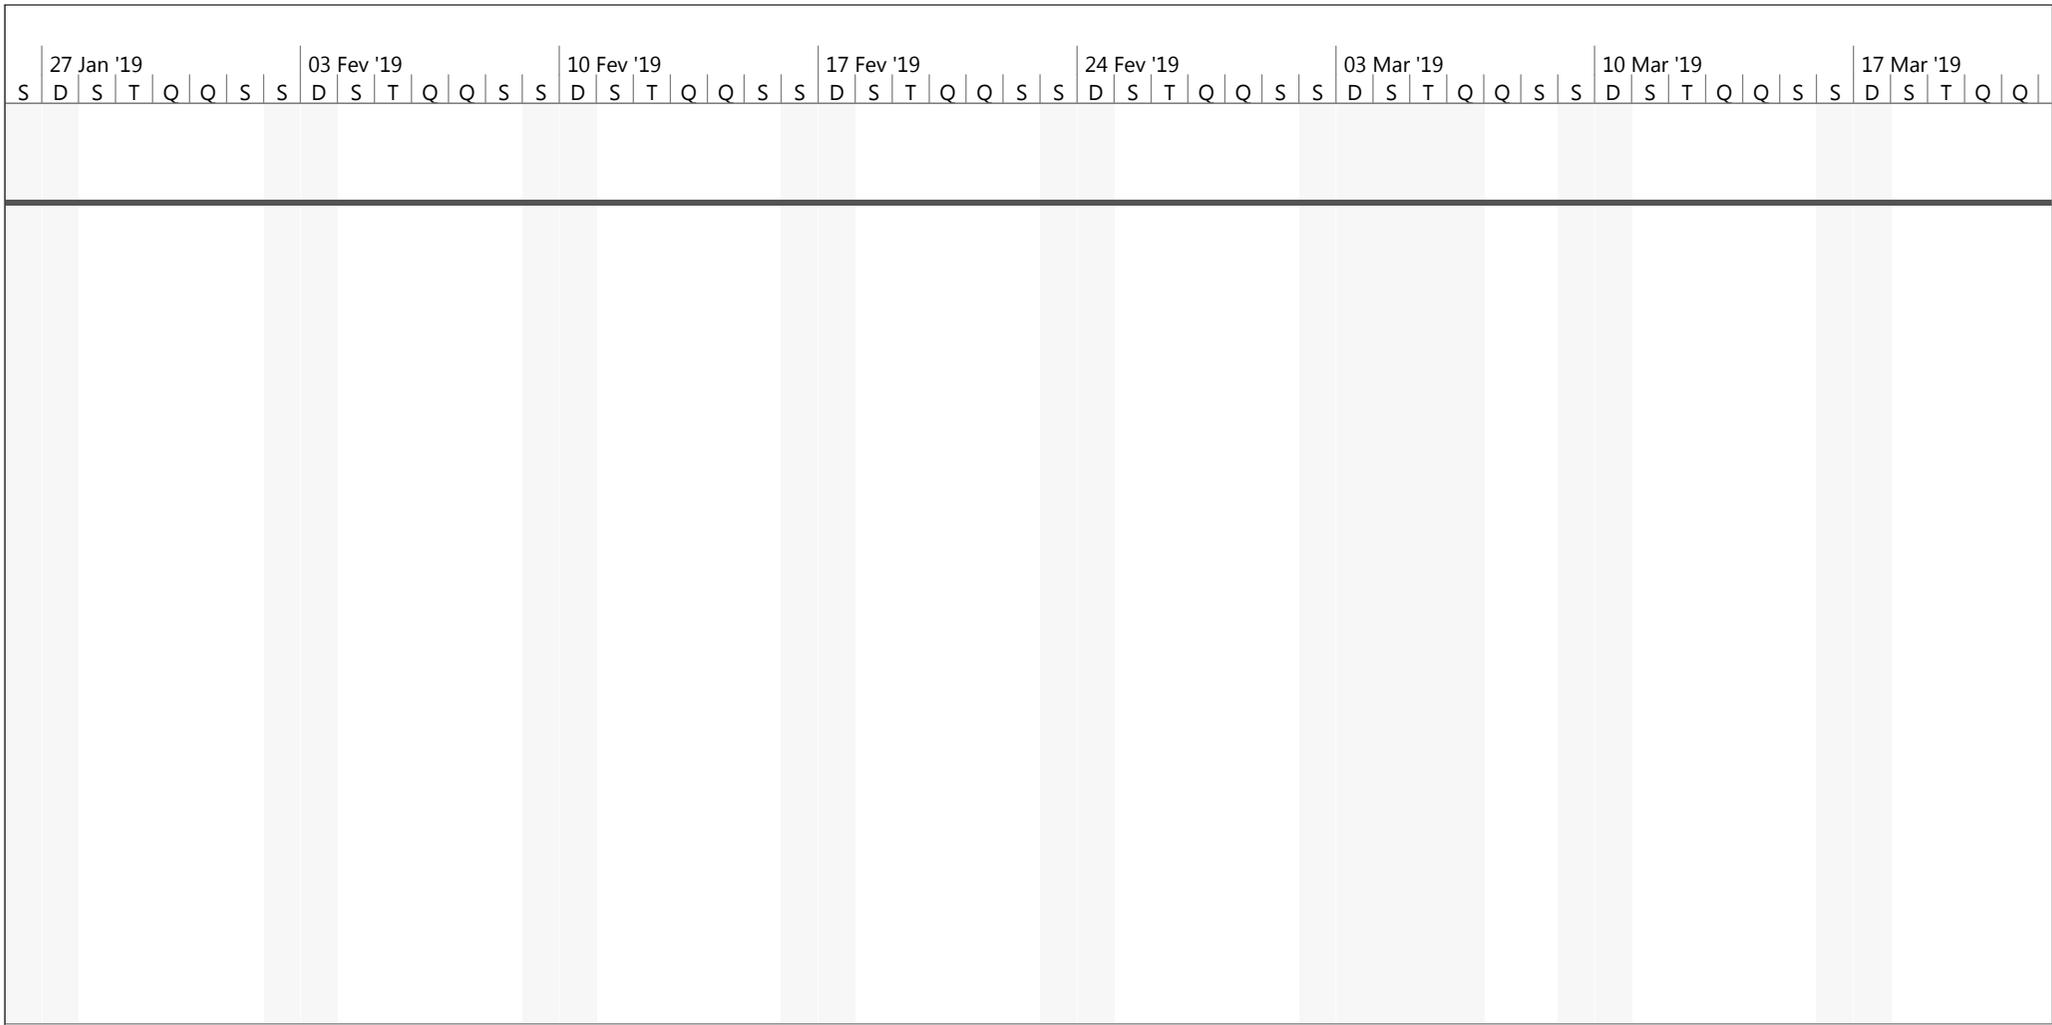


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

27 Jan '19      03 Fev '19      10 Fev '19      17 Fev '19      24 Fev '19      03 Mar '19      10 Mar '19      17 Mar '19

S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

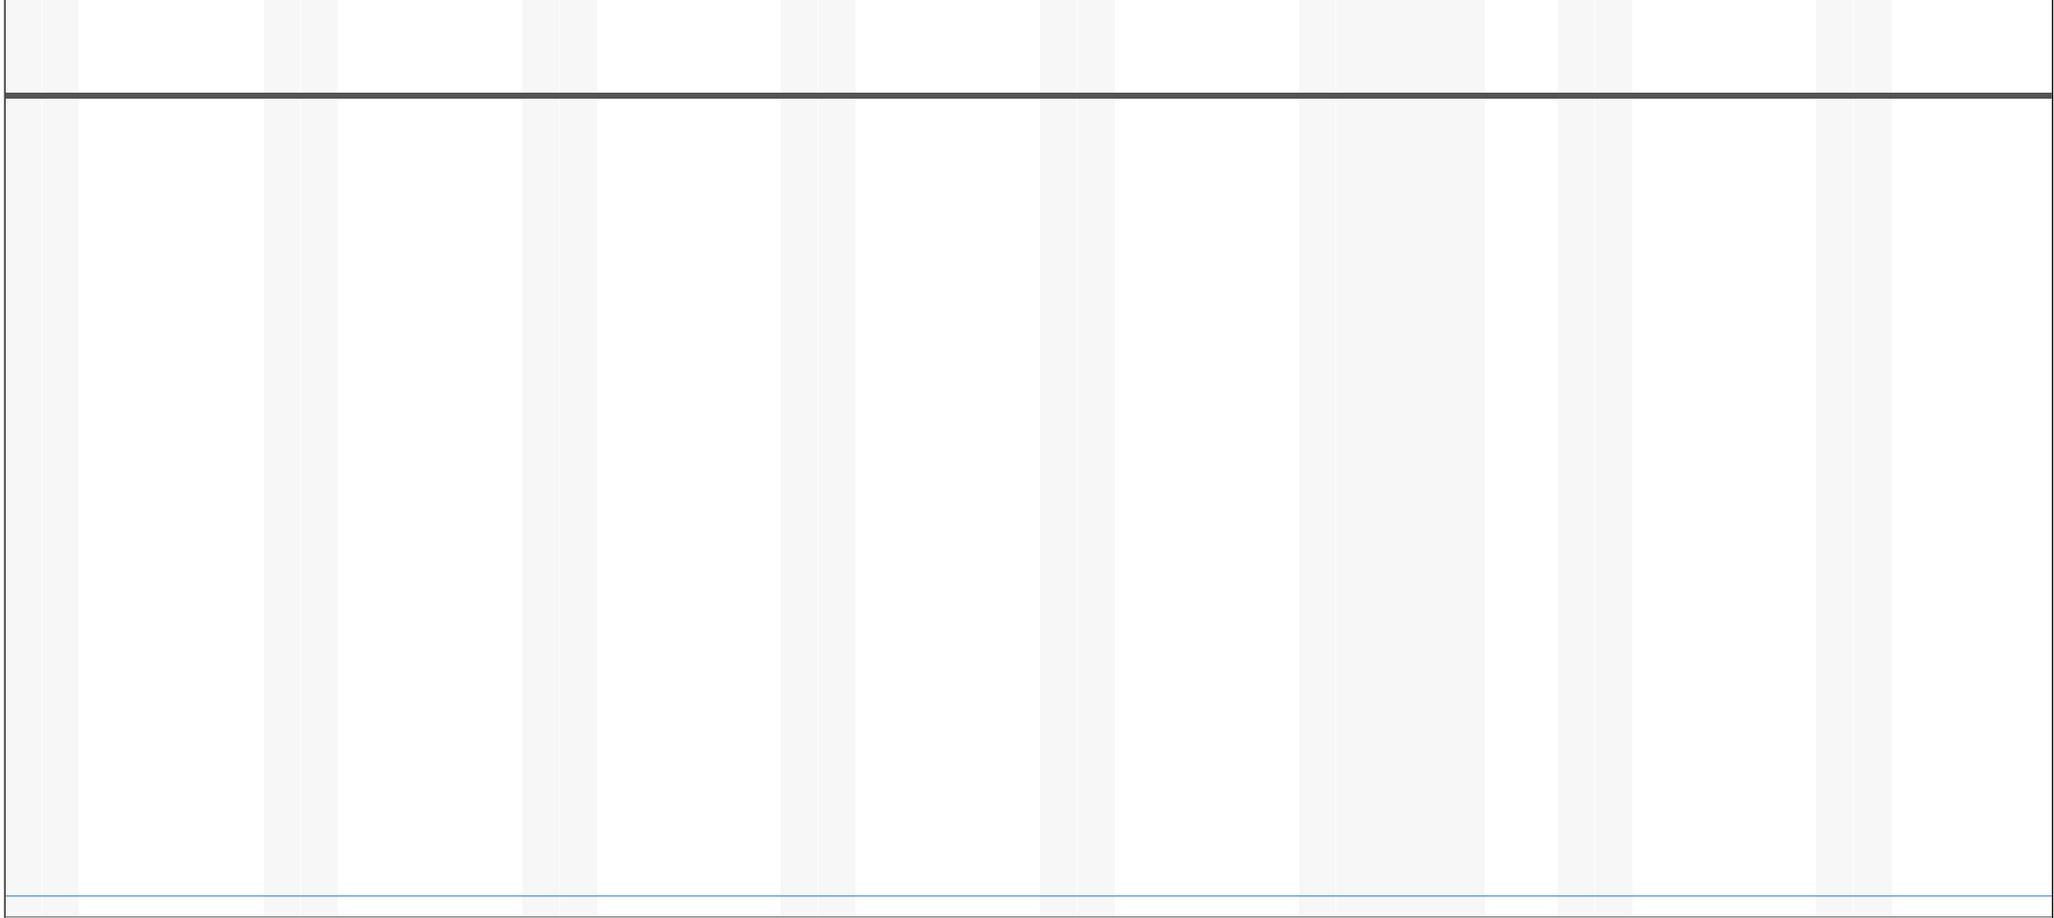


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

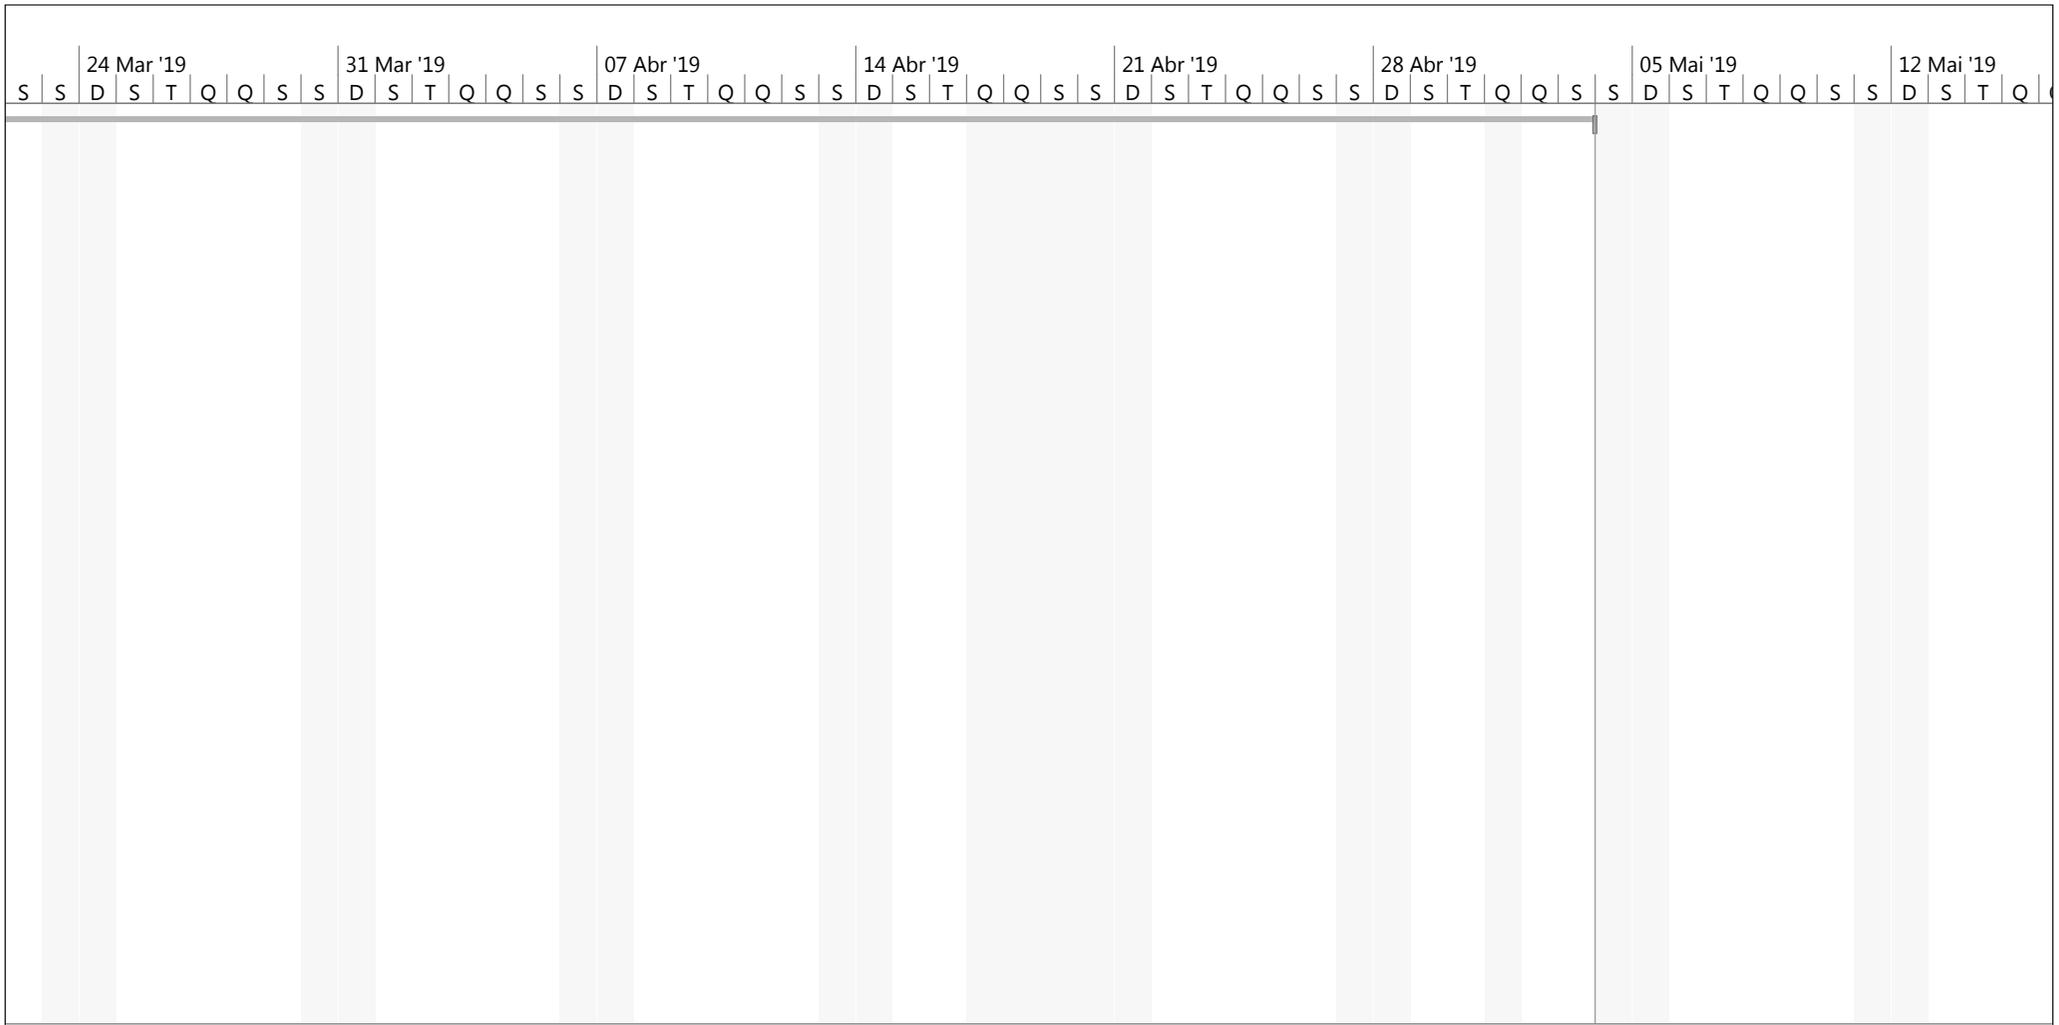


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

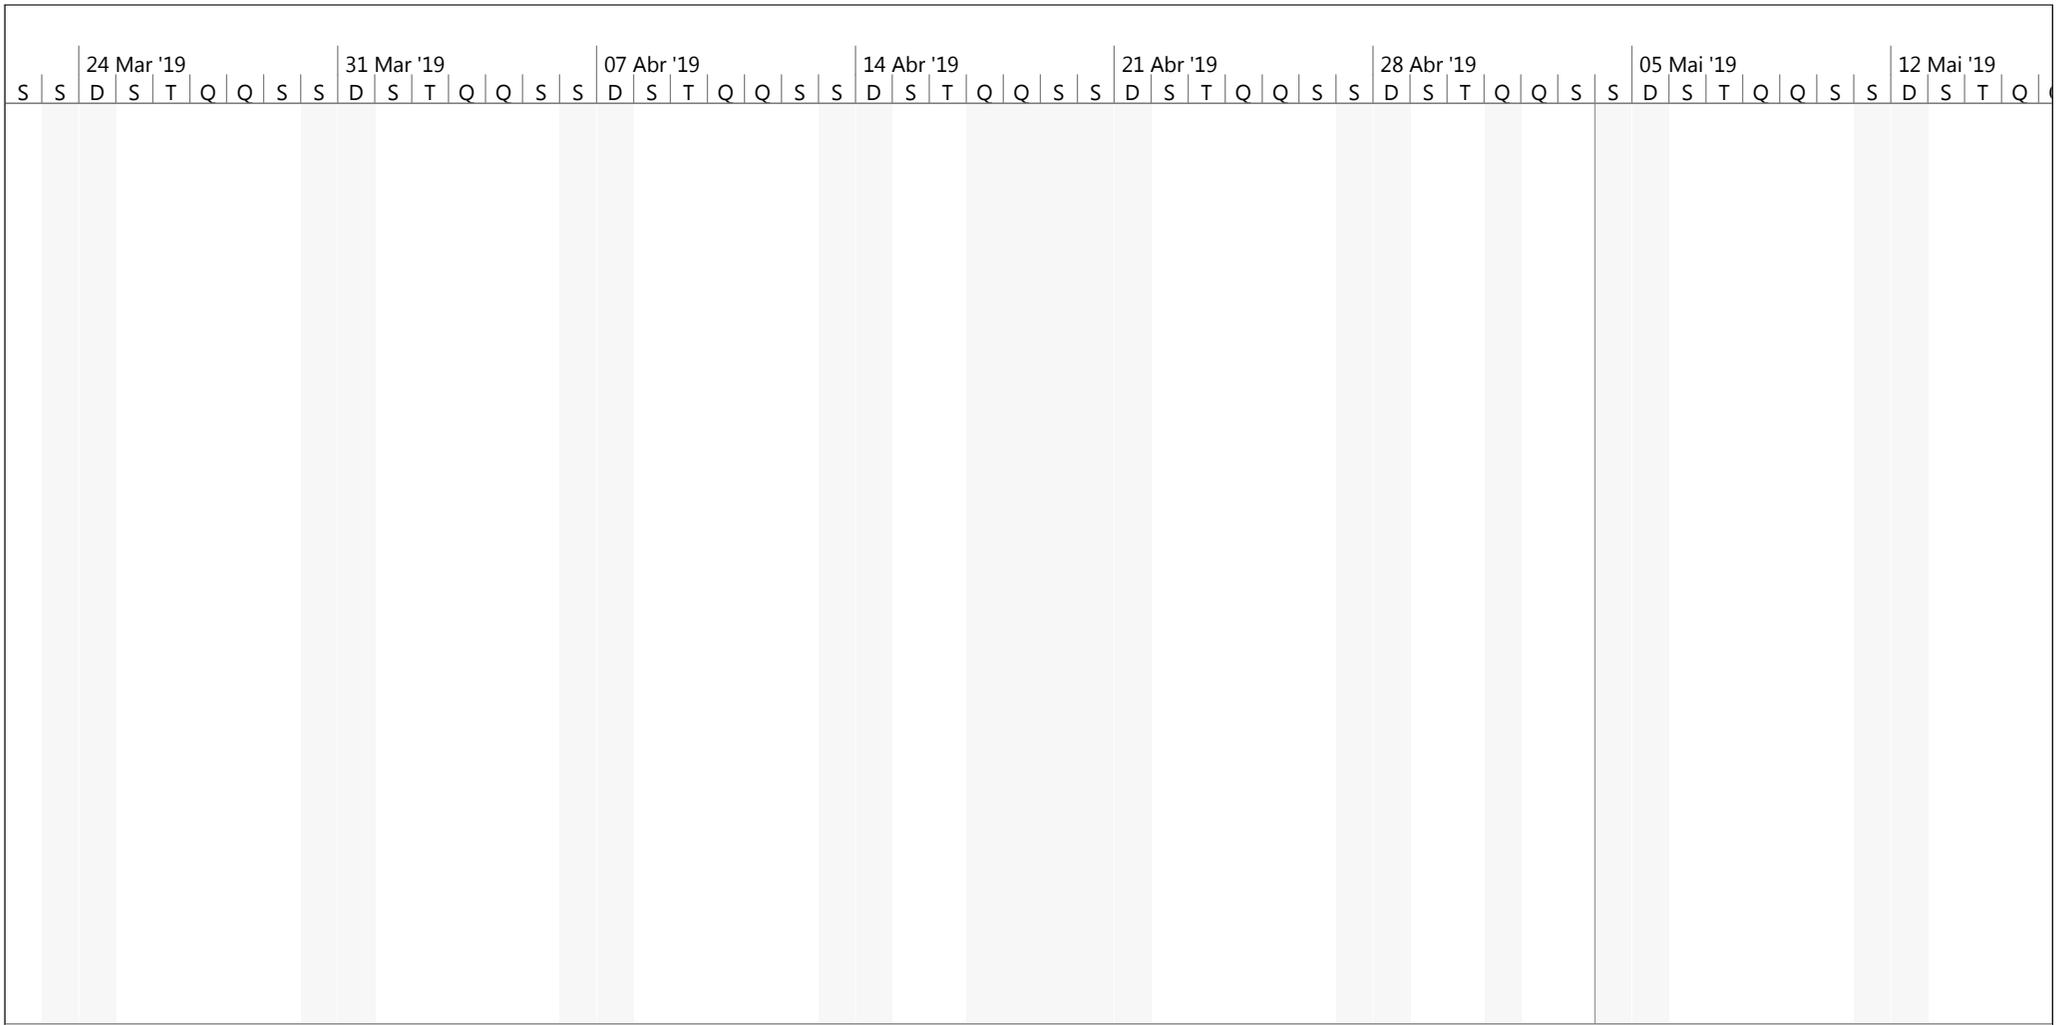

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

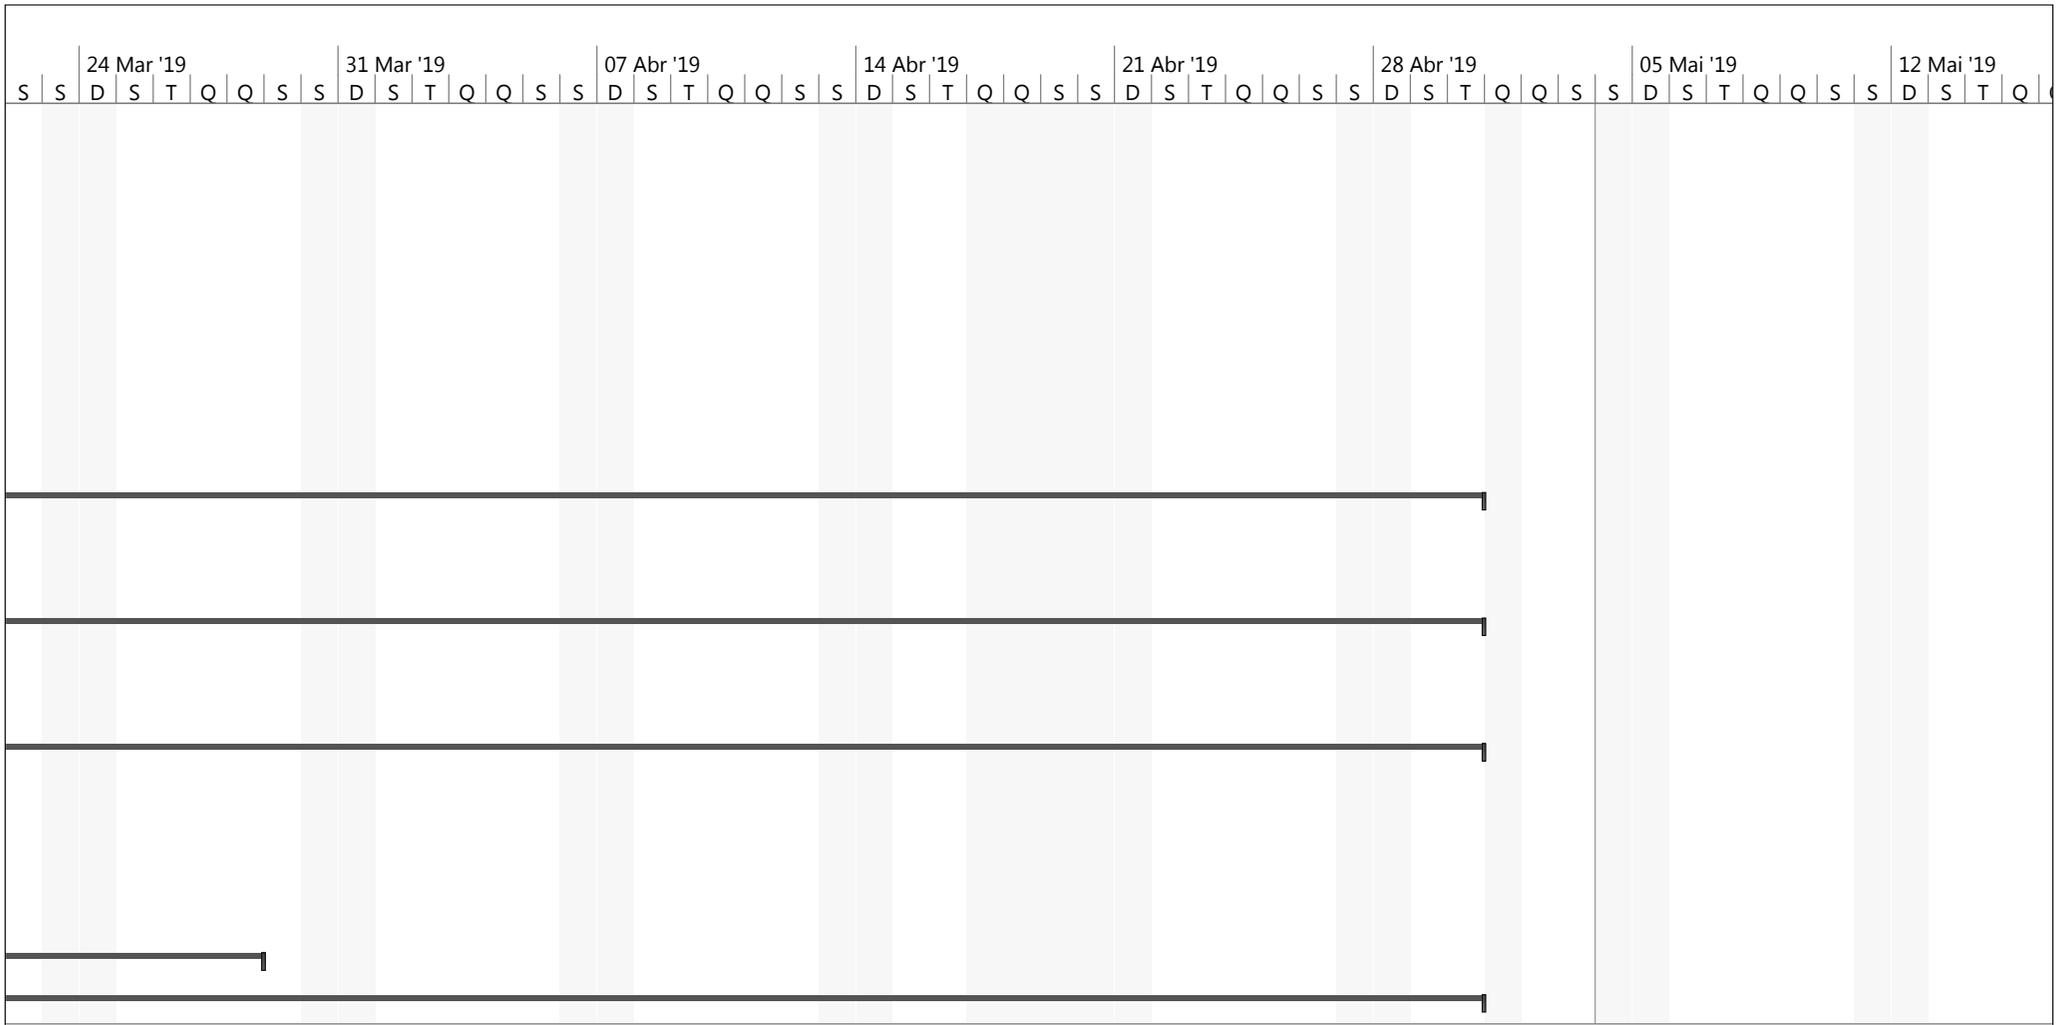


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

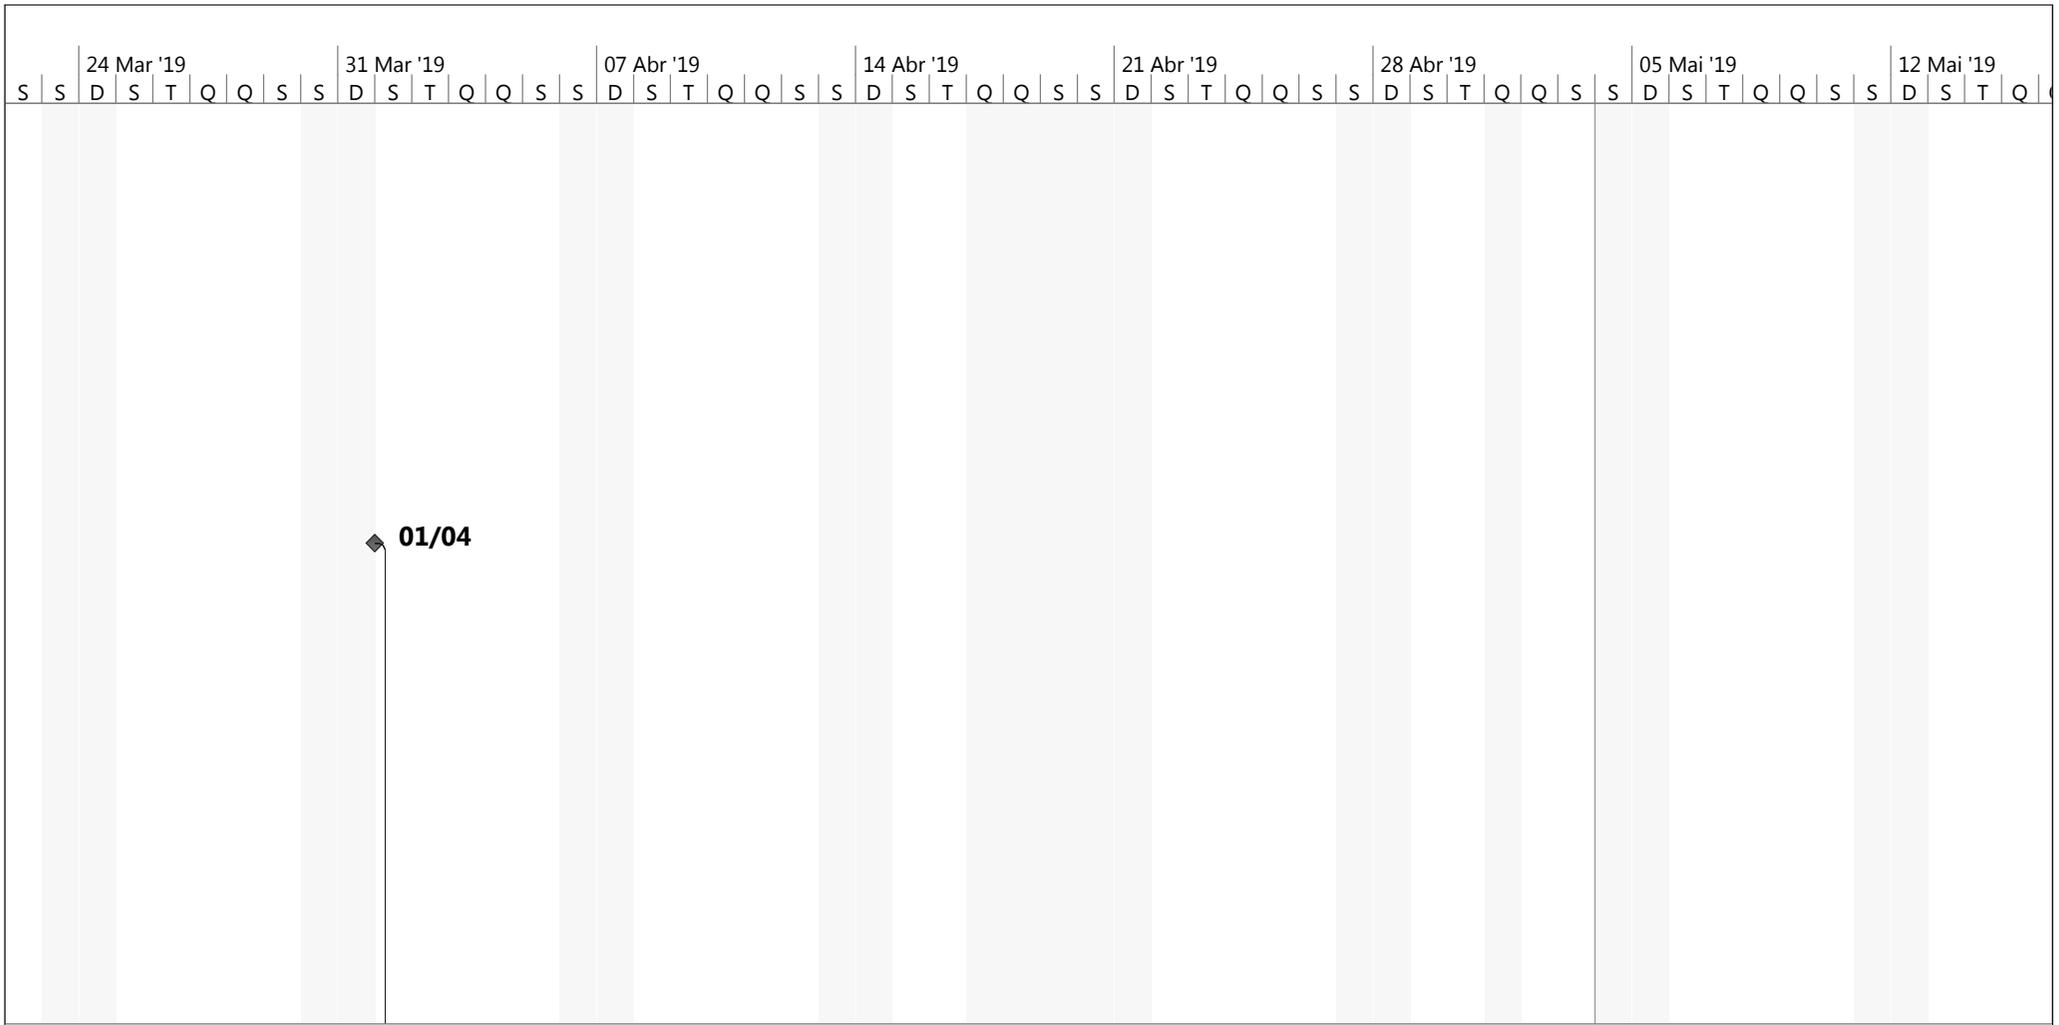


Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

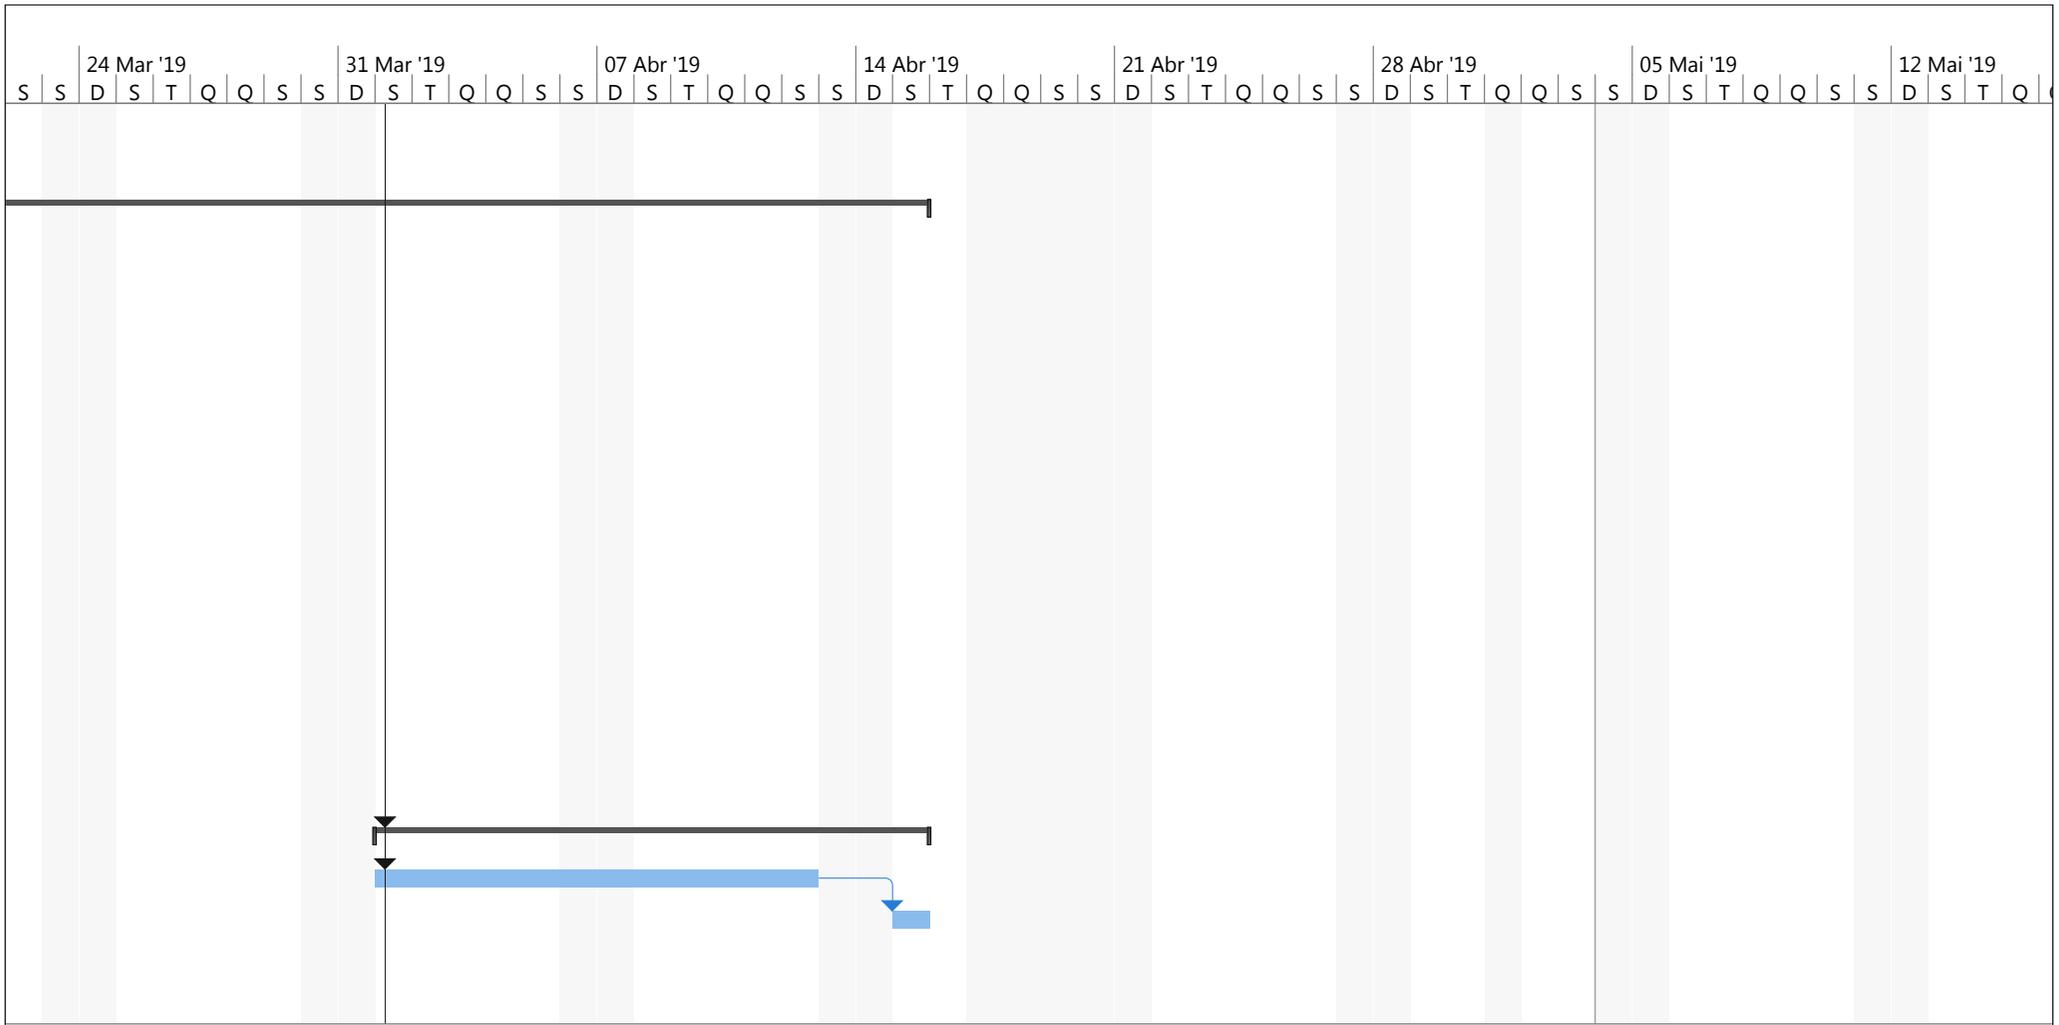

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

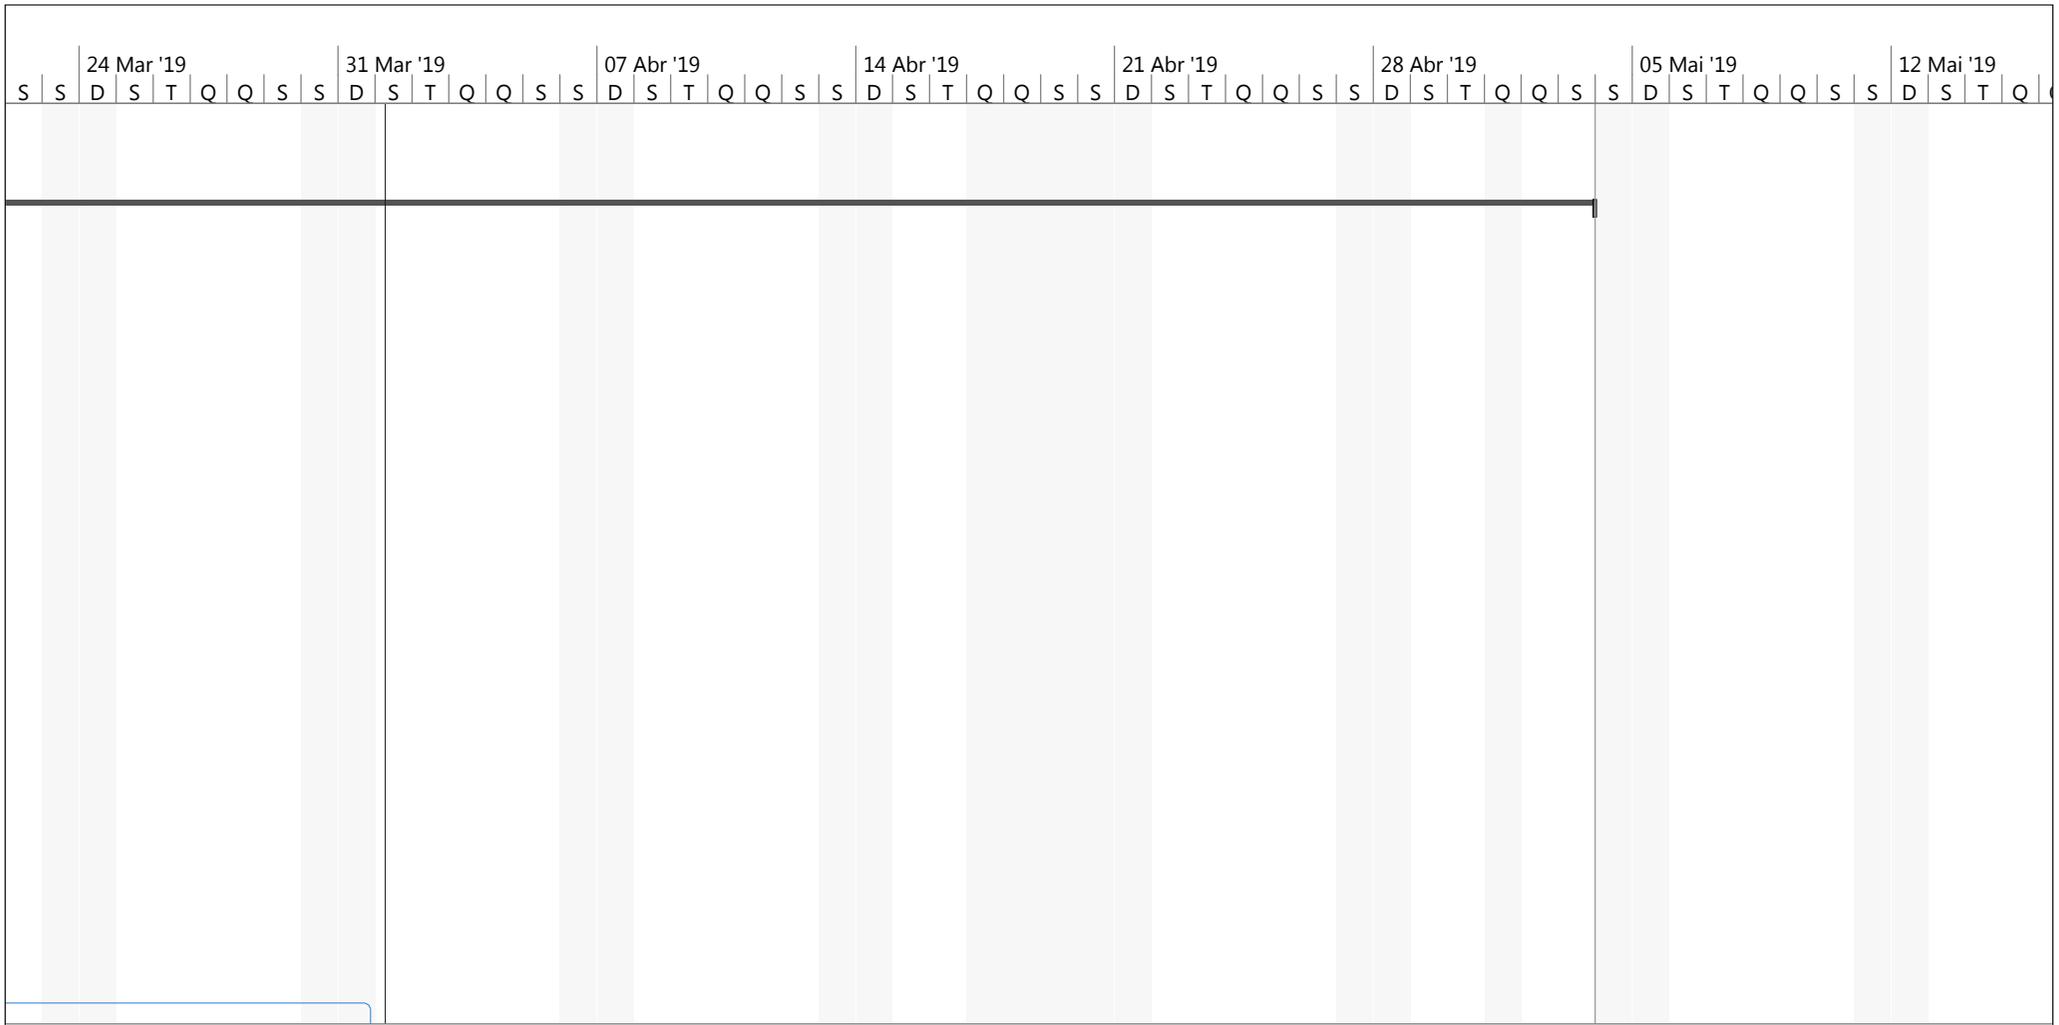

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE Data: Sex 13/04/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

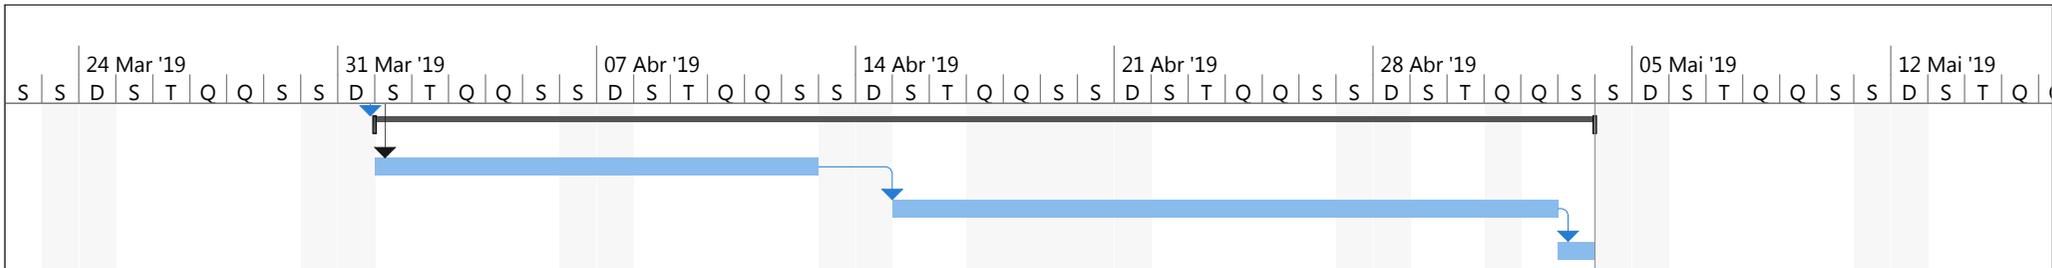

Projeto: PROJETO EFETIVIDADE  
 Data: Sex 13/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
