

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
0			0	<b>SER COMPETENTE</b>		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
1			1	<b>Mapeamento das competências organizacionais</b>		0%	102 dias	Sex 15/05/15	Qua 07/10/15
2			1.1	Realizar benchmarking		0%	10 dias	Sex 15/05/15	Qui 28/05/15
3			1.2	Identificar competências		0%	21 dias	Sex 29/05/15	Seg 29/06/15
4			1.3	Validar competências		0%	70 dias	Ter 30/06/15	Ter 06/10/15
5			1.4	Elaborar matriz de competências		0%	70 dias	Ter 30/06/15	Ter 06/10/15
6			1.5	Homologar matriz de competências		0%	70 dias	Ter 30/06/15	Ter 06/10/15
7			1.6	Divulgar matriz de competências		0%	1 dia	Qua 07/10/15	Qua 07/10/15
8			1.7	<b>MATRIZ DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS</b>		0%	0 dias	Qua 07/10/15	Qua 07/10/15
9			2	<b>Mapeamento dos postos de trabalho do 1º grau</b>		0%	342 dias	Ter 30/06/15	Seg 28/11/16
10			2.1	Identificar postos de trabalho de 1º grau		0%	21 dias	Ter 30/06/15	Ter 28/07/15
11			2.2	Identificar competências		0%	200 dias	Qua 29/07/15	Seg 06/06/16
12			2.3	Validar competências		0%	80 dias	Ter 07/06/16	Ter 27/09/16
13			2.4	Elaborar matriz de competências		0%	10 dias	Qua 28/09/16	Ter 11/10/16
14			2.5	Homologar matriz de competências		0%	30 dias	Qui 13/10/16	Sex 25/11/16
15			2.6	Divulgar matriz de competências		0%	1 dia	Seg 28/11/16	Seg 28/11/16
16			2.7	<b>MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DOS POSTOS DE 1º GRAU</b>		0%	0 dias	Seg 28/11/16	Seg 28/11/16
17			3	<b>Mapeamento dos postos de trabalho do 2º grau</b>		0%	271 dias	Qui 01/09/16	Qui 26/10/17
18			3.1	Identificar postos de trabalho de 2º grau		0%	20 dias	Qui 01/09/16	Qui 29/09/16
19			3.2	Identificar competências		0%	110 dias	Sex 30/09/16	Sex 31/03/17
20			3.3	Validar competências		0%	40 dias	Seg 03/04/17	Sex 02/06/17
21			3.4	Elaborar matriz de competências		0%	10 dias	Seg 05/06/17	Seg 19/06/17

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
22			3.5	Homologar matriz de competências		0%	90 dias	Ter 20/06/17	Qua 25/10/17
23			3.6	Divulgar matriz de competências		0%	1 dia	Qui 26/10/17	Qui 26/10/17
24			3.7	<b>MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DOS POSTOS DE 2º GRAU</b>		0%	0 dias	Qui 26/10/17	Qui 26/10/17
25			4	<b>Mapeamento dos postos de trabalho da área</b>		0%	621 dias	Sex 27/10/17	Qui 23/04/20
26			4.1	Identificar unidades administrativas		0%	30 dias	Sex 27/10/17	Sex 08/12/17
27			4.2	Identificar competências		0%	420 dias	Seg 11/12/17	Qui 15/08/19
28			4.3	Validar competências		0%	50 dias	Sex 16/08/19	Qui 24/10/19
29			4.4	Elaborar matriz de competências		0%	20 dias	Sex 25/10/19	Seg 25/11/19
30			4.5	Homologar matriz de competências		0%	100 dias	Ter 26/11/19	Qua 22/04/20
31			4.6	Divulgar matriz de competências		0%	1 dia	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20
32			4.7	<b>MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DOS POSTOS DE</b>		0%	0 dias	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20
33			5	<b>Mapeamento de encargos especiais</b>		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
34			5.1	Receber demandas de mapeamento		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
35			5.2	Identificar competências		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
36			5.3	Validar competências		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
37			5.4	Elaborar matriz de competências		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
38			5.5	Homologar matriz de competências		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
39			5.6	Divulgar matriz de competências		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
40			5.7	<b>MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>		0%	0 dias	Qui 10/12/20	Qui 10/12/20
41			6	<b>Normatização da Gestão por Competências</b>		0%	160 dias	Sex 24/04/20	Qui 10/12/20
42			6.1	Realizar benchmarking		0%	30 dias	Sex 24/04/20	Sex 05/06/20
43			6.2	Elaborar manual conforme práticas internas e		0%	30 dias	Seg 08/06/20	Seg 20/07/20

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
44			6.3	Elaborar minuta de normativo		0%	20 dias	Ter 21/07/20	Seg 17/08/20
45			6.4	Aprovar minuta de normativo		0%	60 dias	Ter 18/08/20	Qui 12/11/20
46			6.5	Publicar normativo		0%	20 dias	Sex 13/11/20	Qui 10/12/20
47			6.6	<b>NORMATIVO PUBLICADO</b>		0%	0 dias	Qui 10/12/20	Qui 10/12/20
48			<b>7</b>	<b>Gerenciamento do Projeto</b>		<b>0%</b>	<b>1393 dias</b>	<b>Seg 06/04/15</b>	<b>Qui 10/12/20</b>
49			7.1	Cronograma		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
50			7.2	Comunicações		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
51			7.3	Riscos		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
52			7.4	Partes envolvidas		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
53			7.5	Recursos		0%	1393 dias	Seg 06/04/15	Qui 10/12/20
54			7.6	<b>GERENCIAMENTO DO PROJETO REALIZADO</b>		0%	0 dias	Qui 10/12/20	Qui 10/12/20

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			






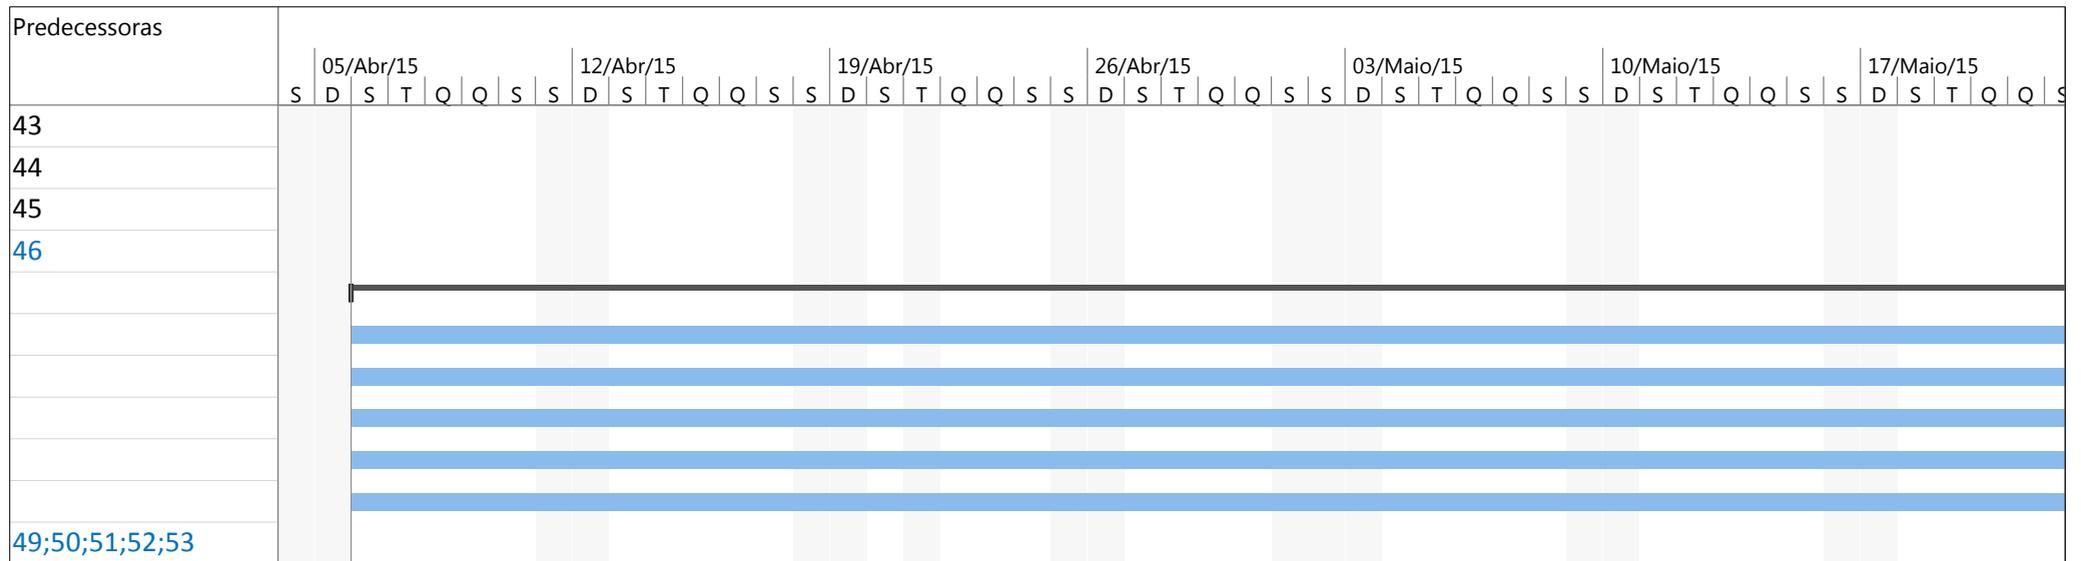


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

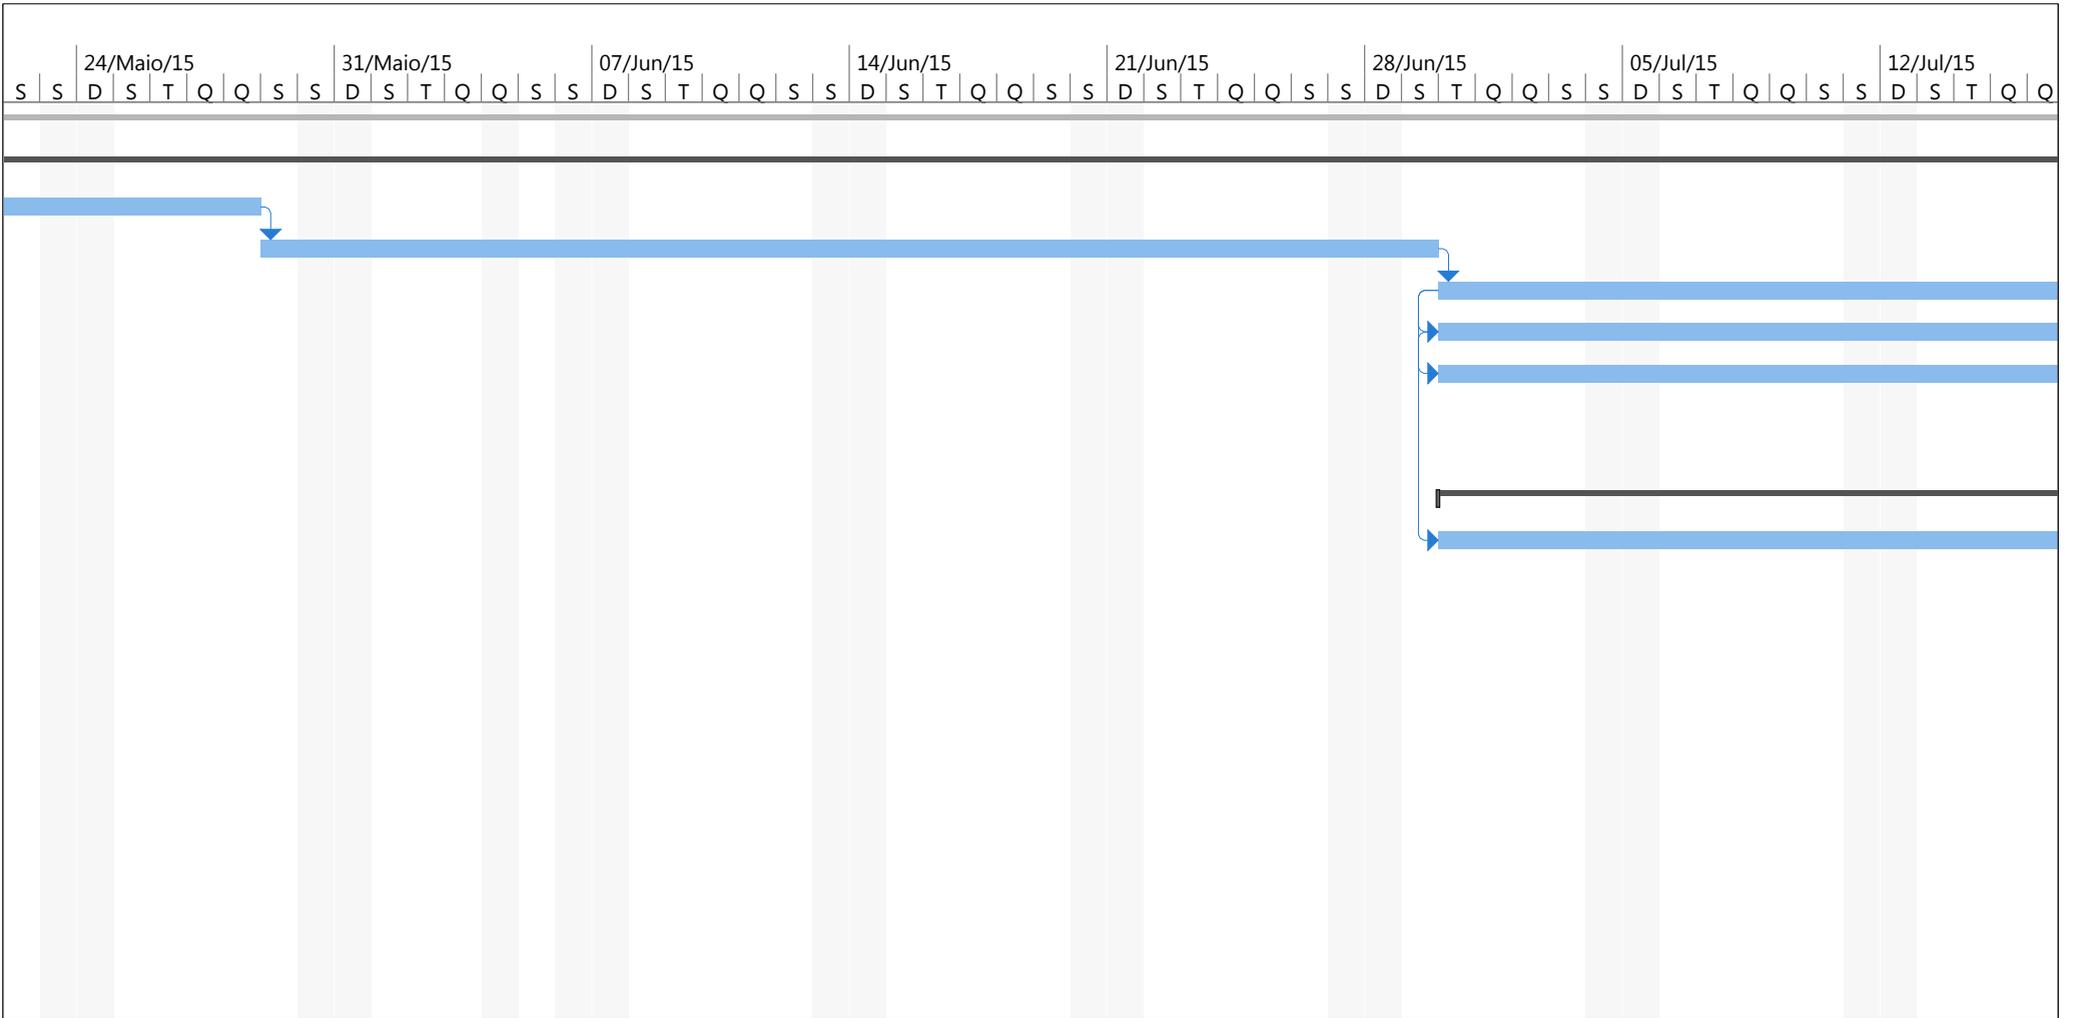


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

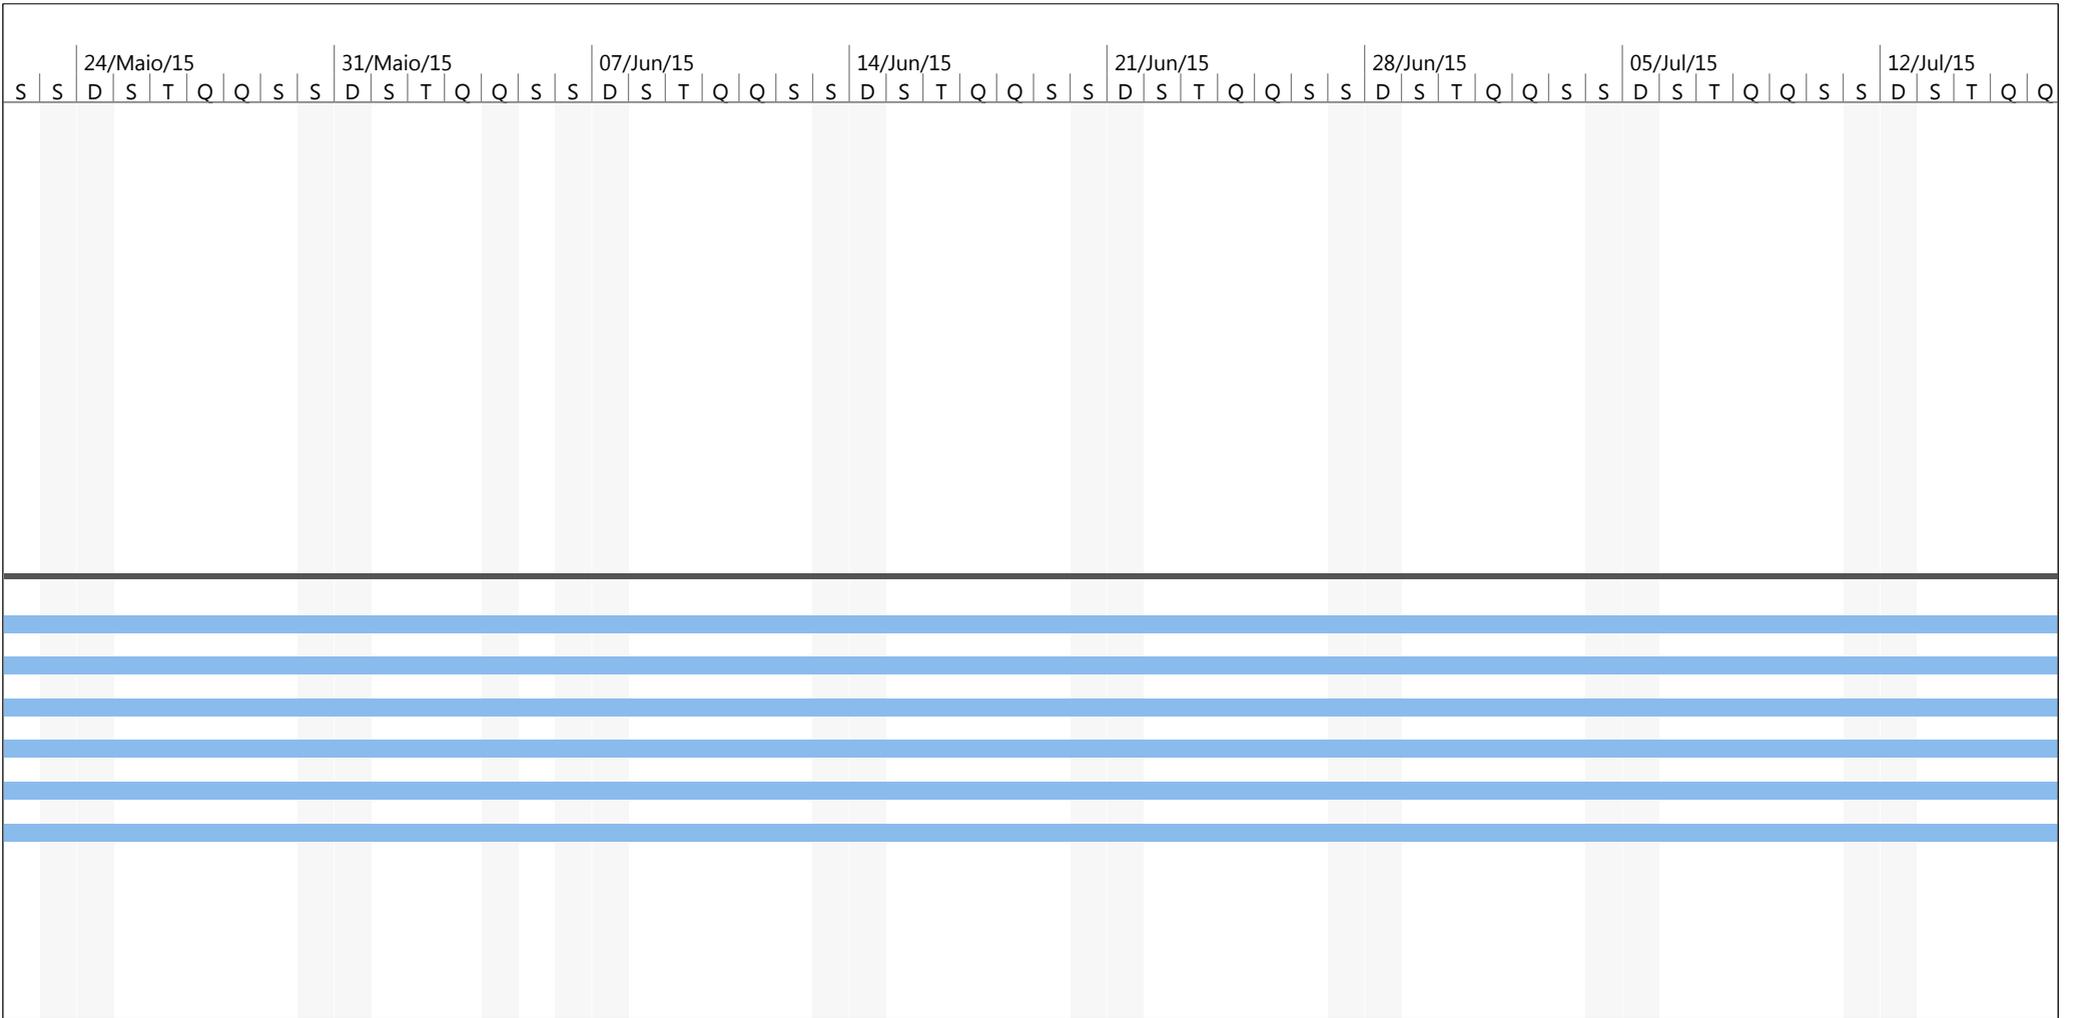


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

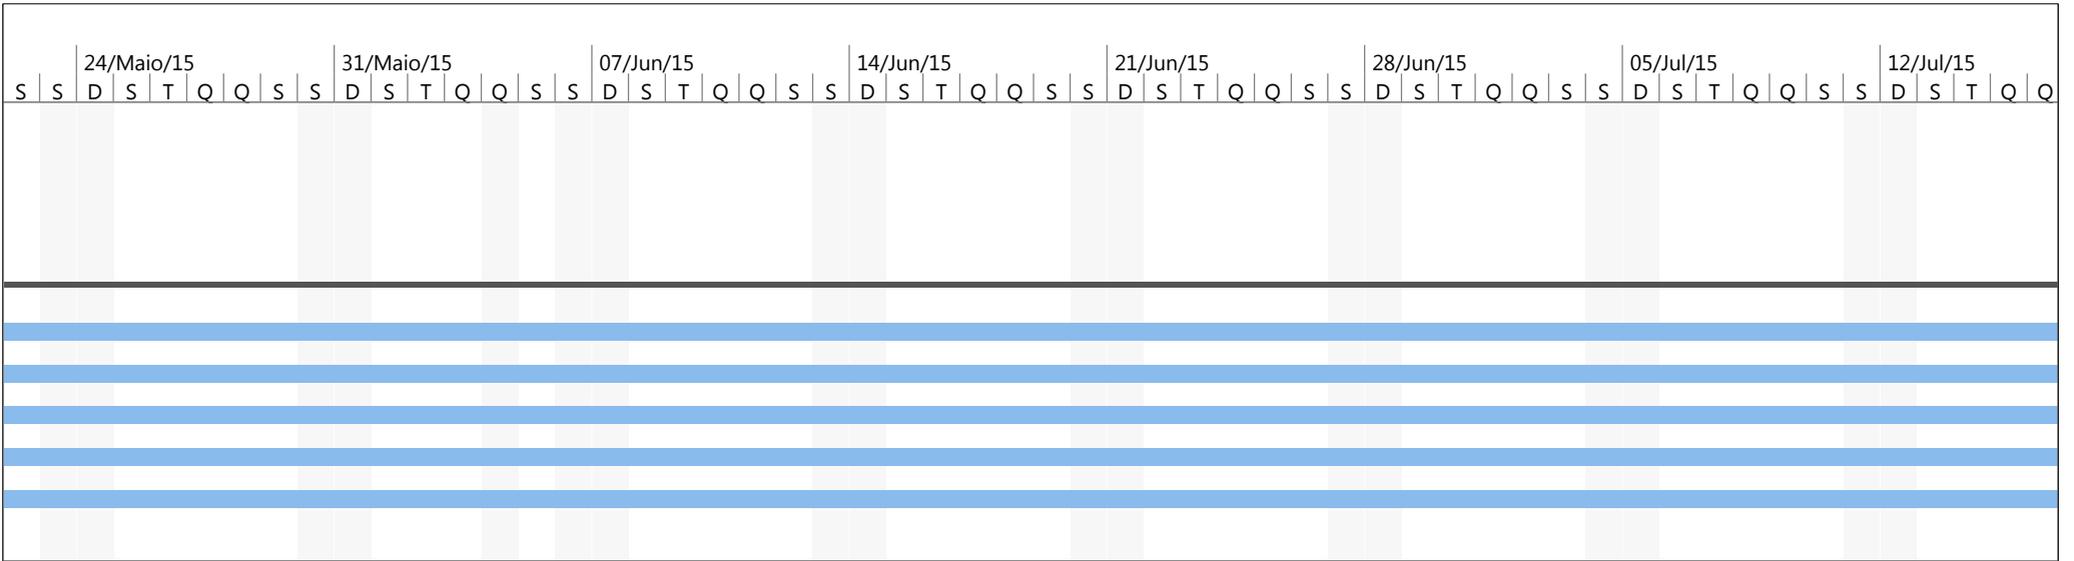


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

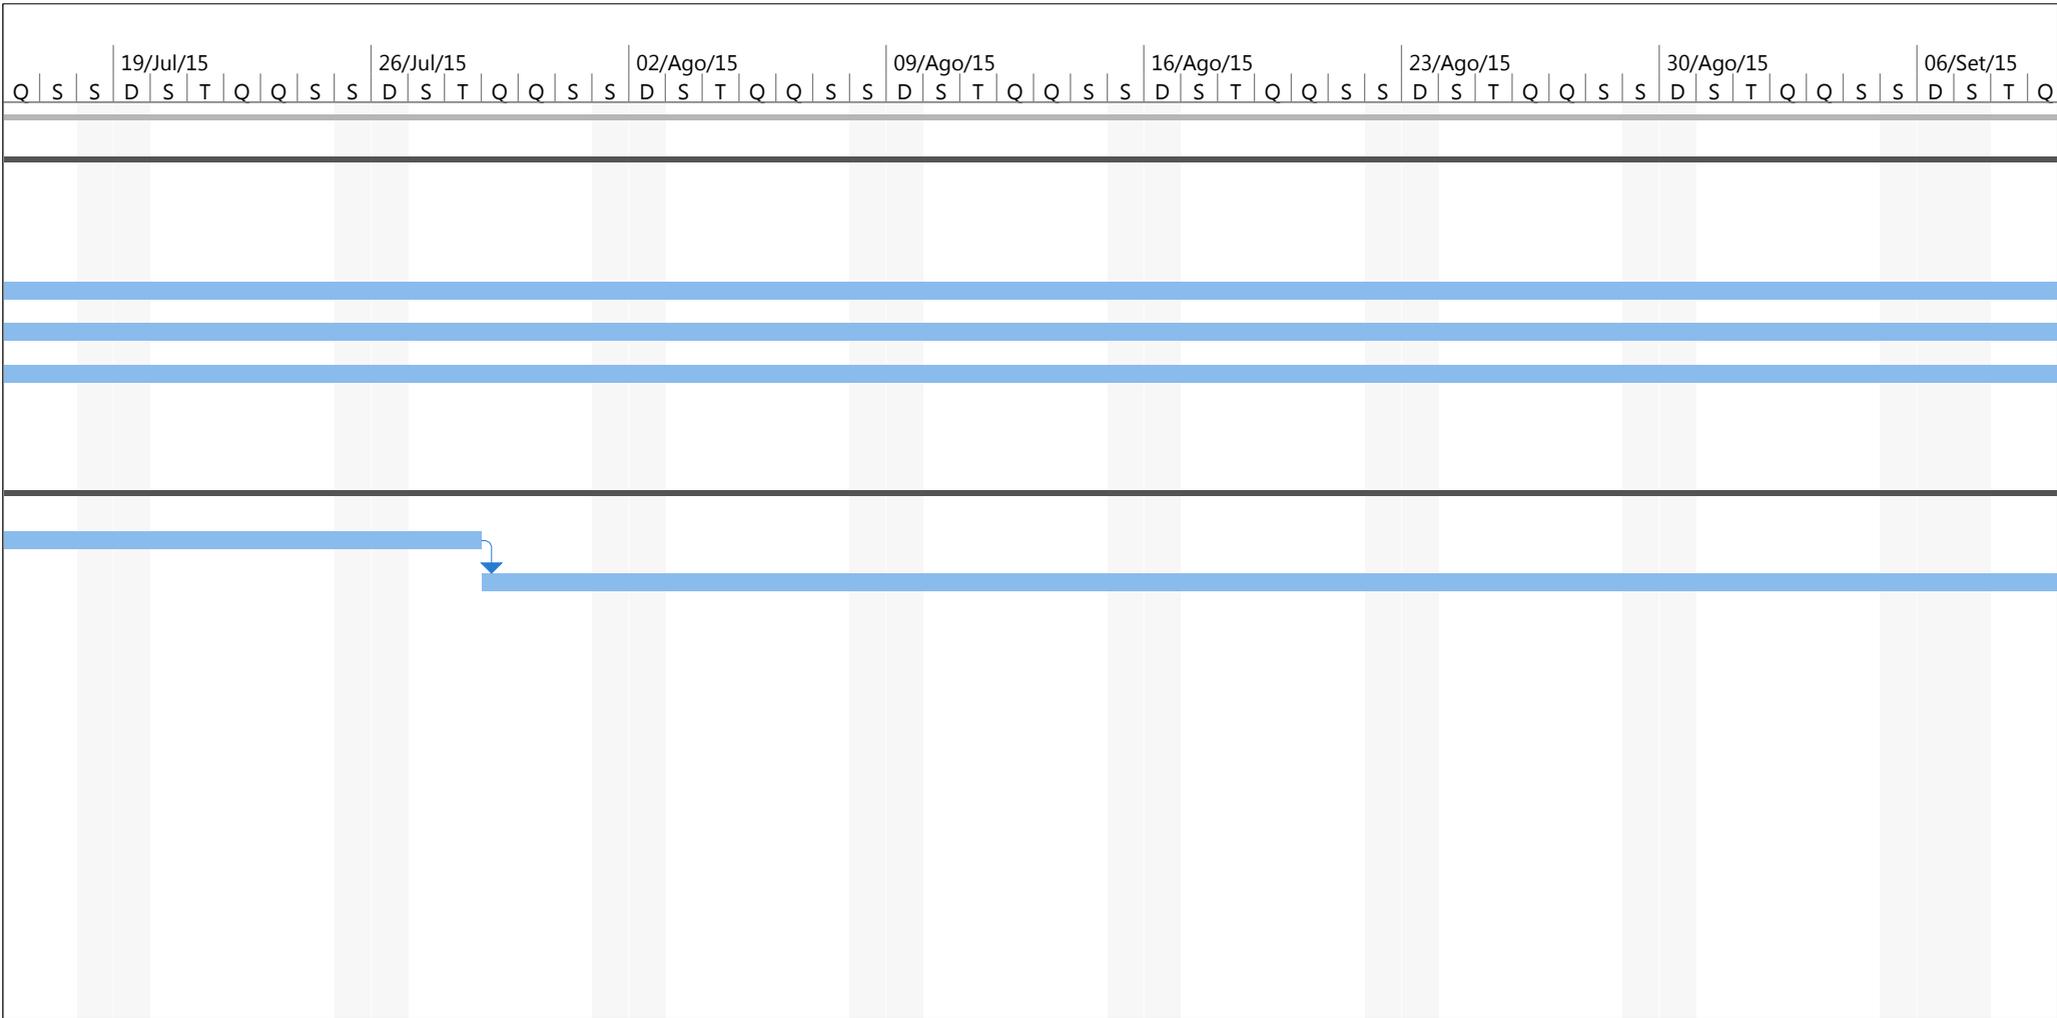


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

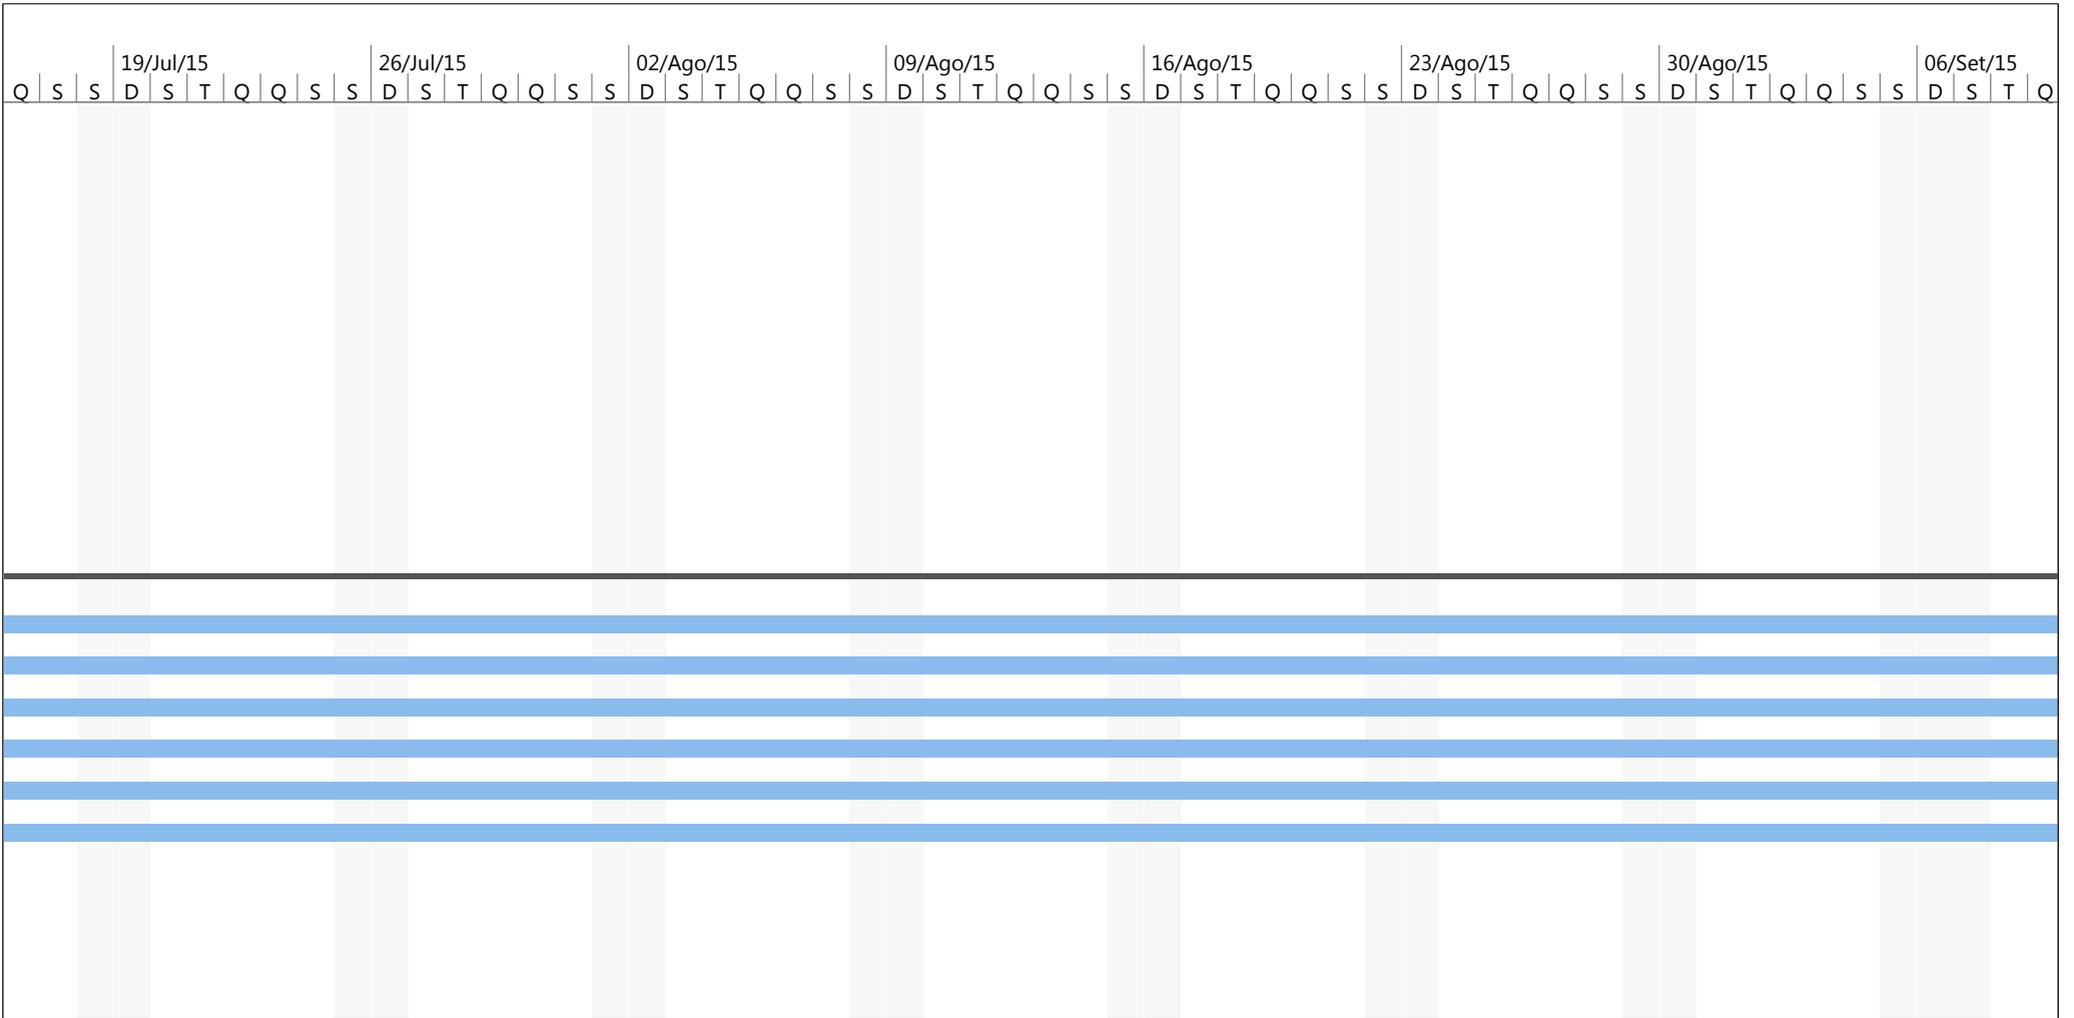


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

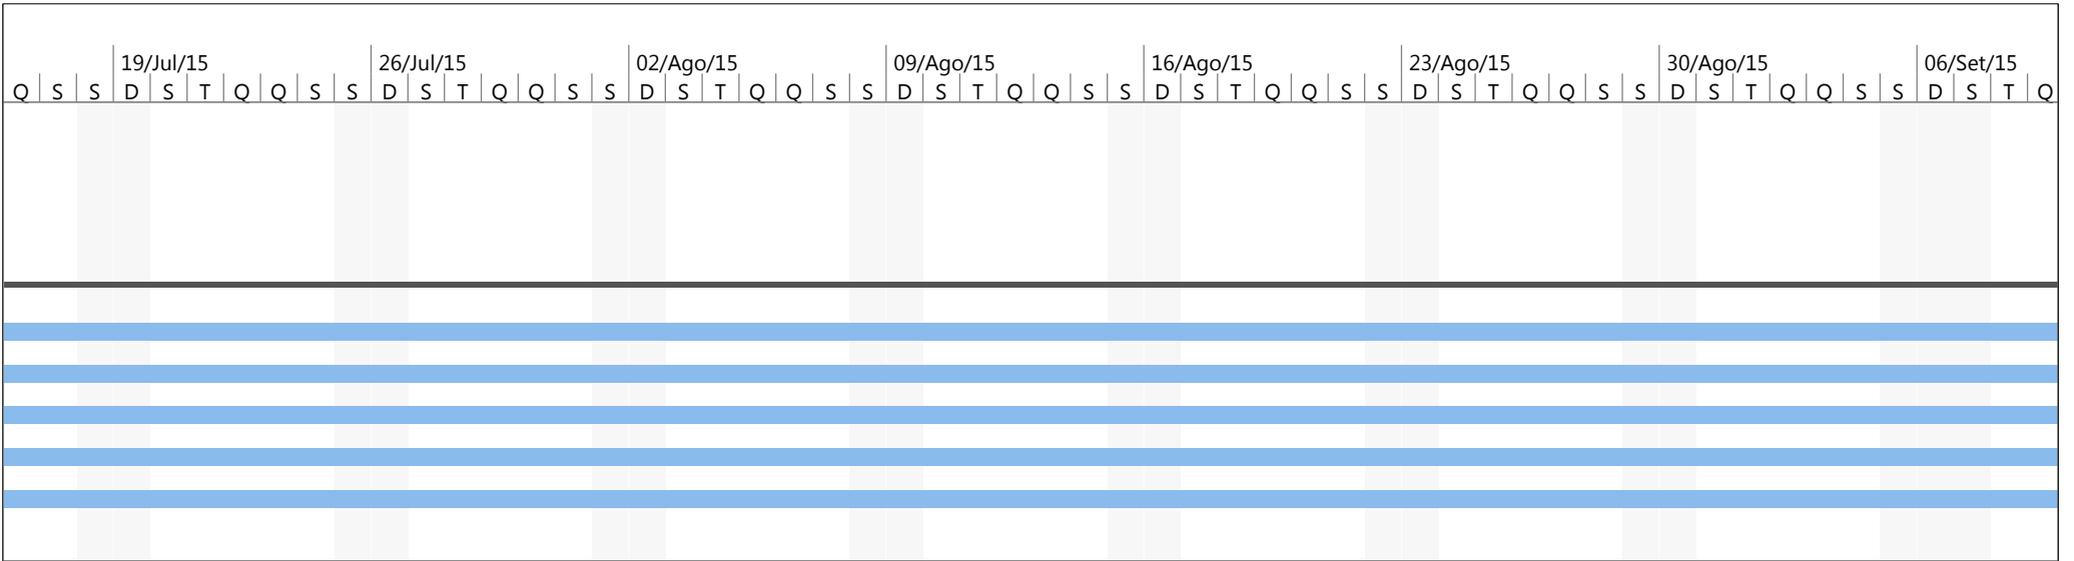


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

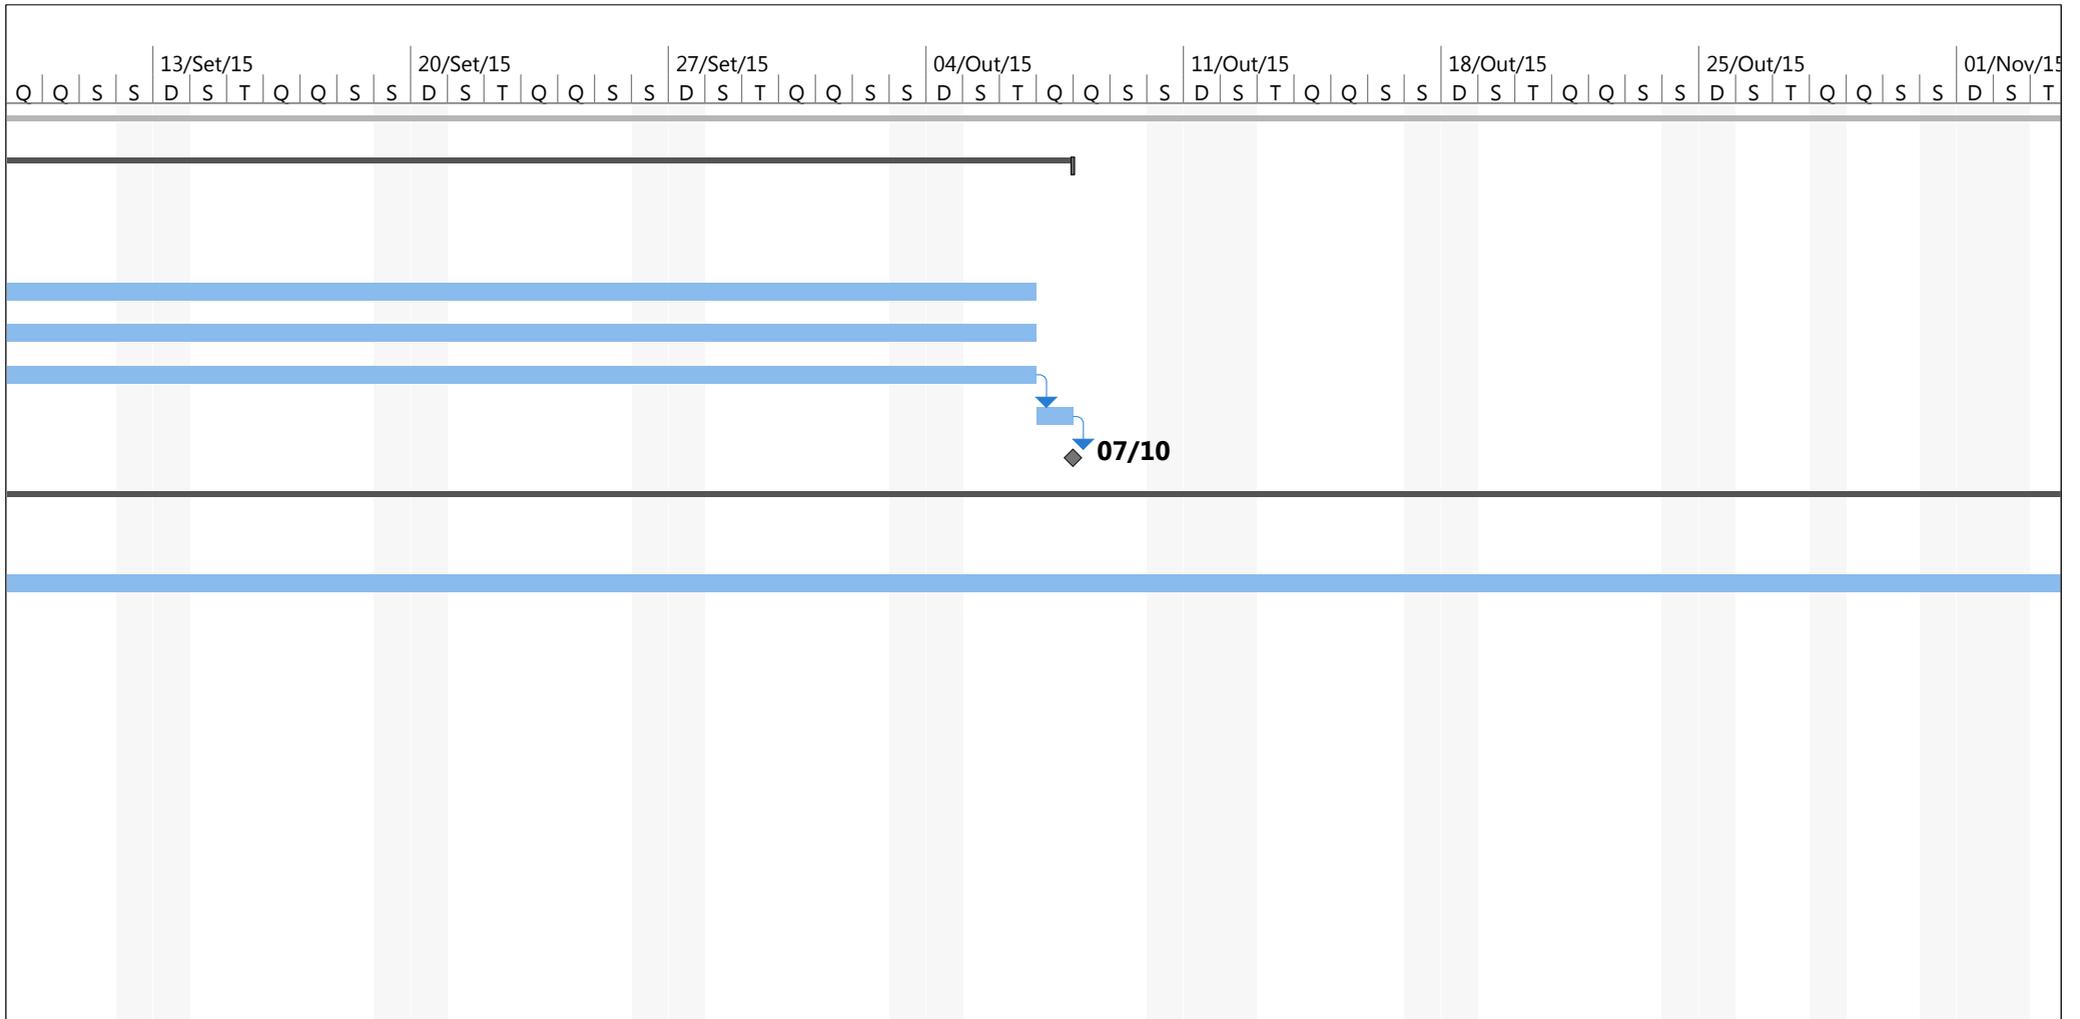


Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

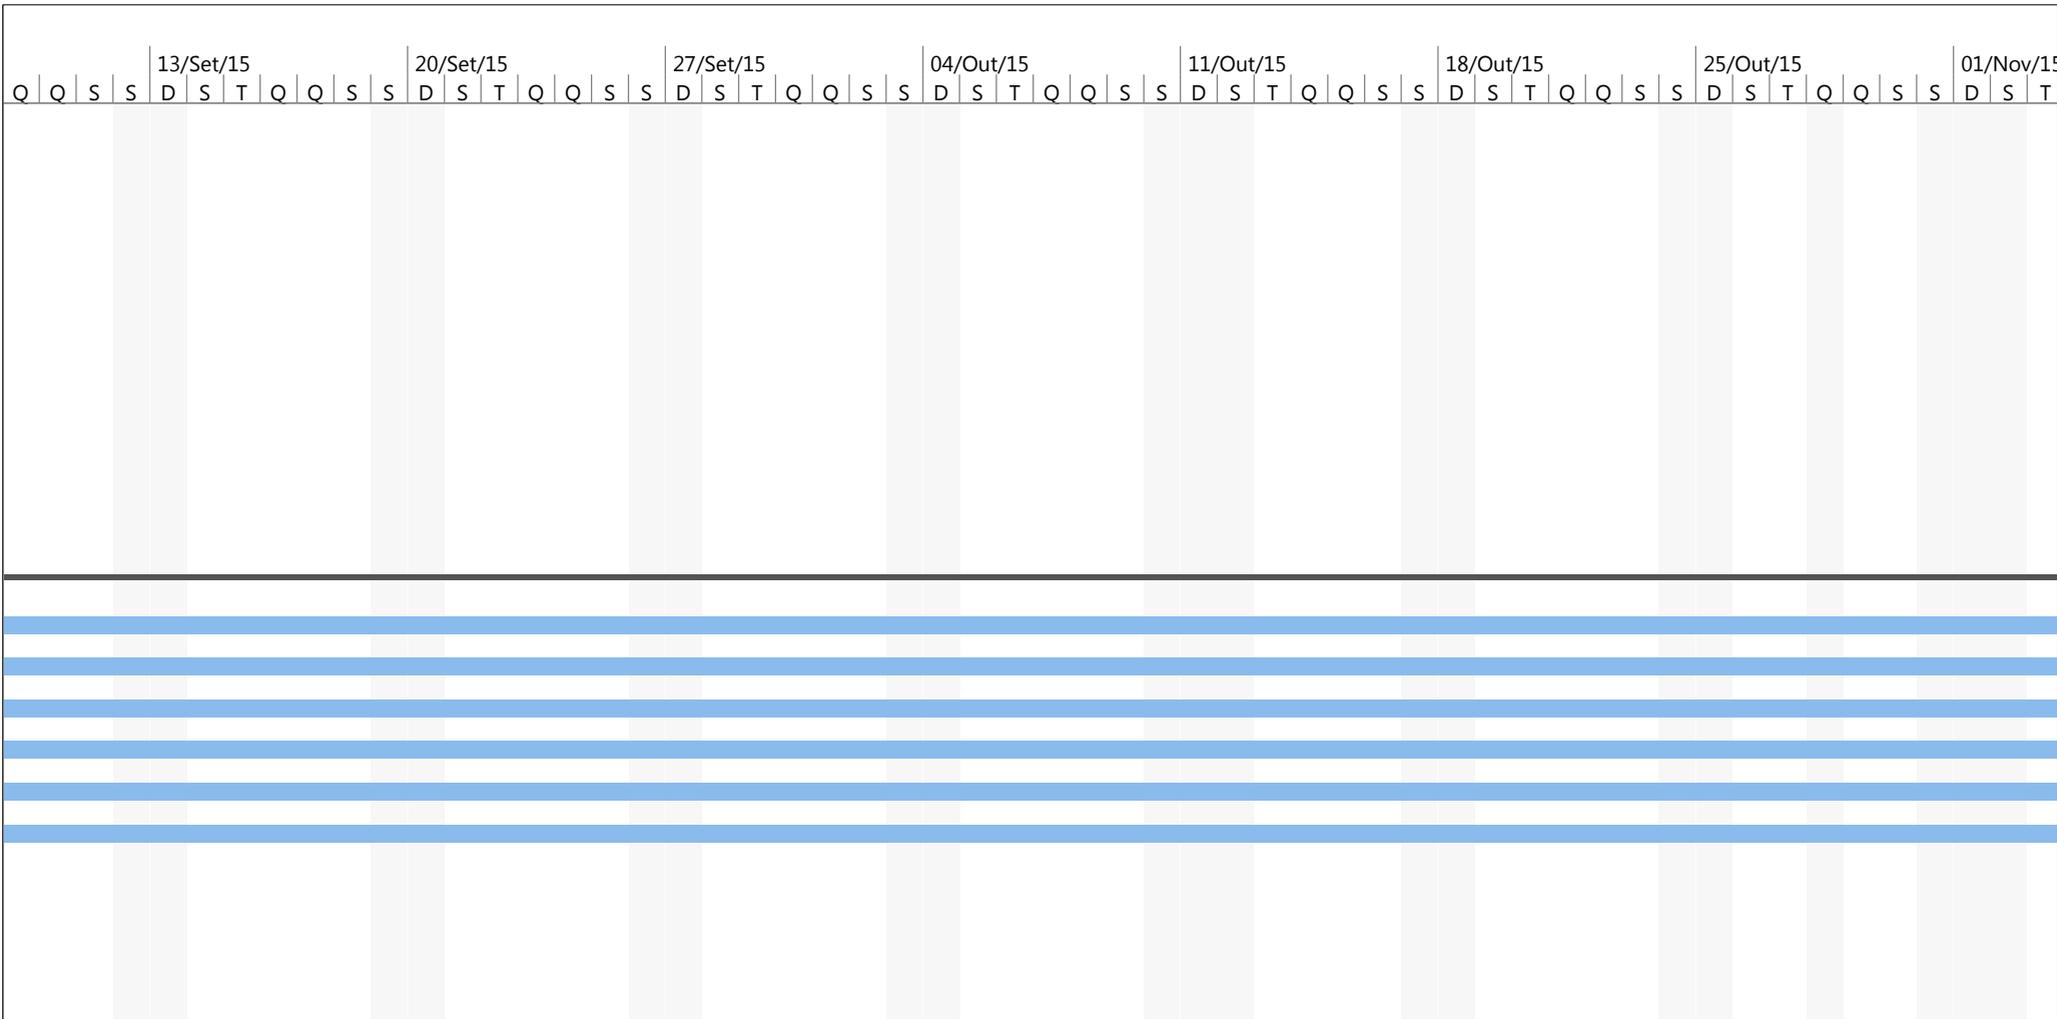

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

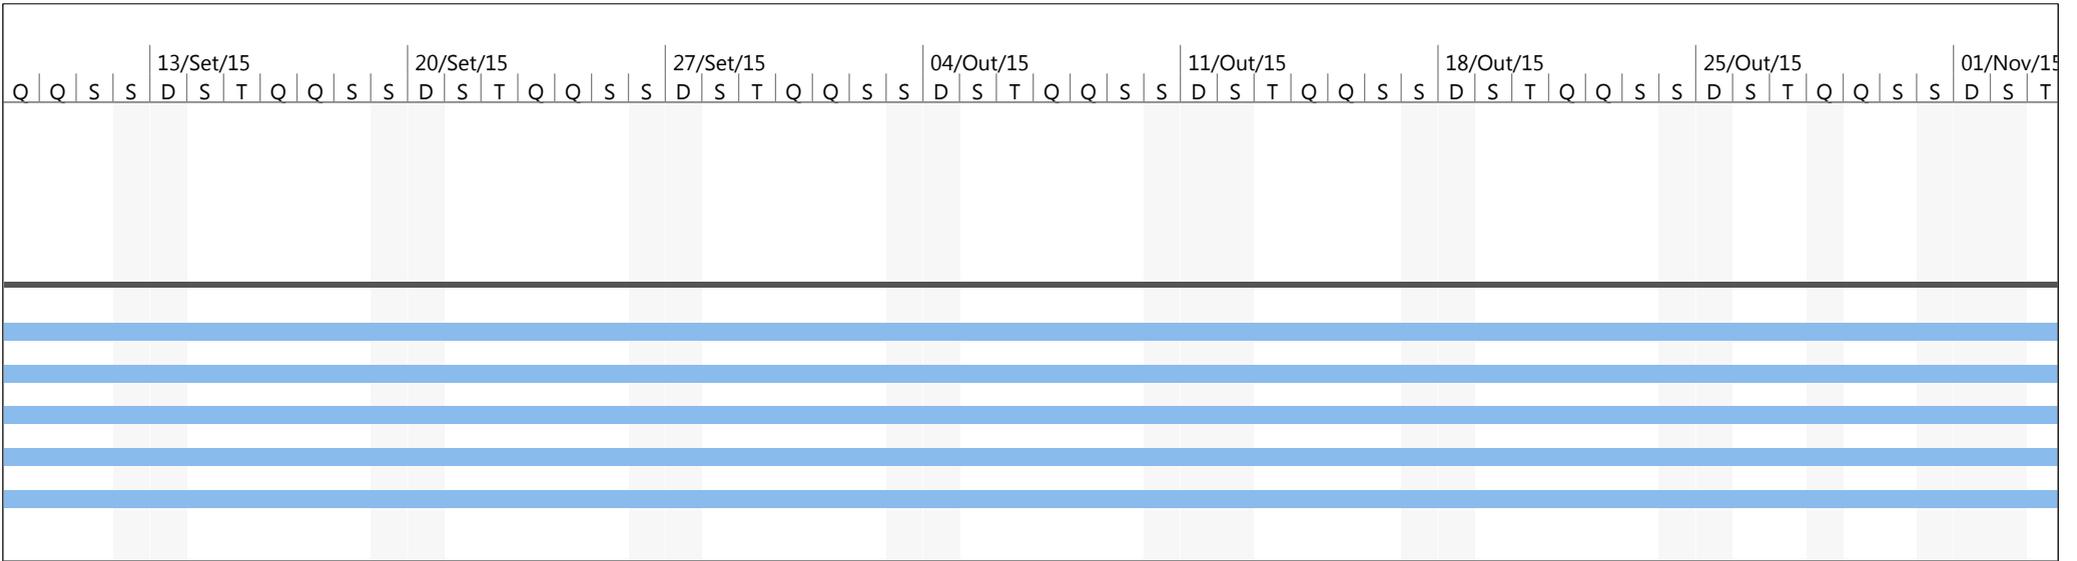

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

/15 | 08/Nov/15 | 15/Nov/15 | 22/Nov/15 | 29/Nov/15 | 06/Dez/15 | 13/Dez/15 | 20/Dez/15 | 27/De

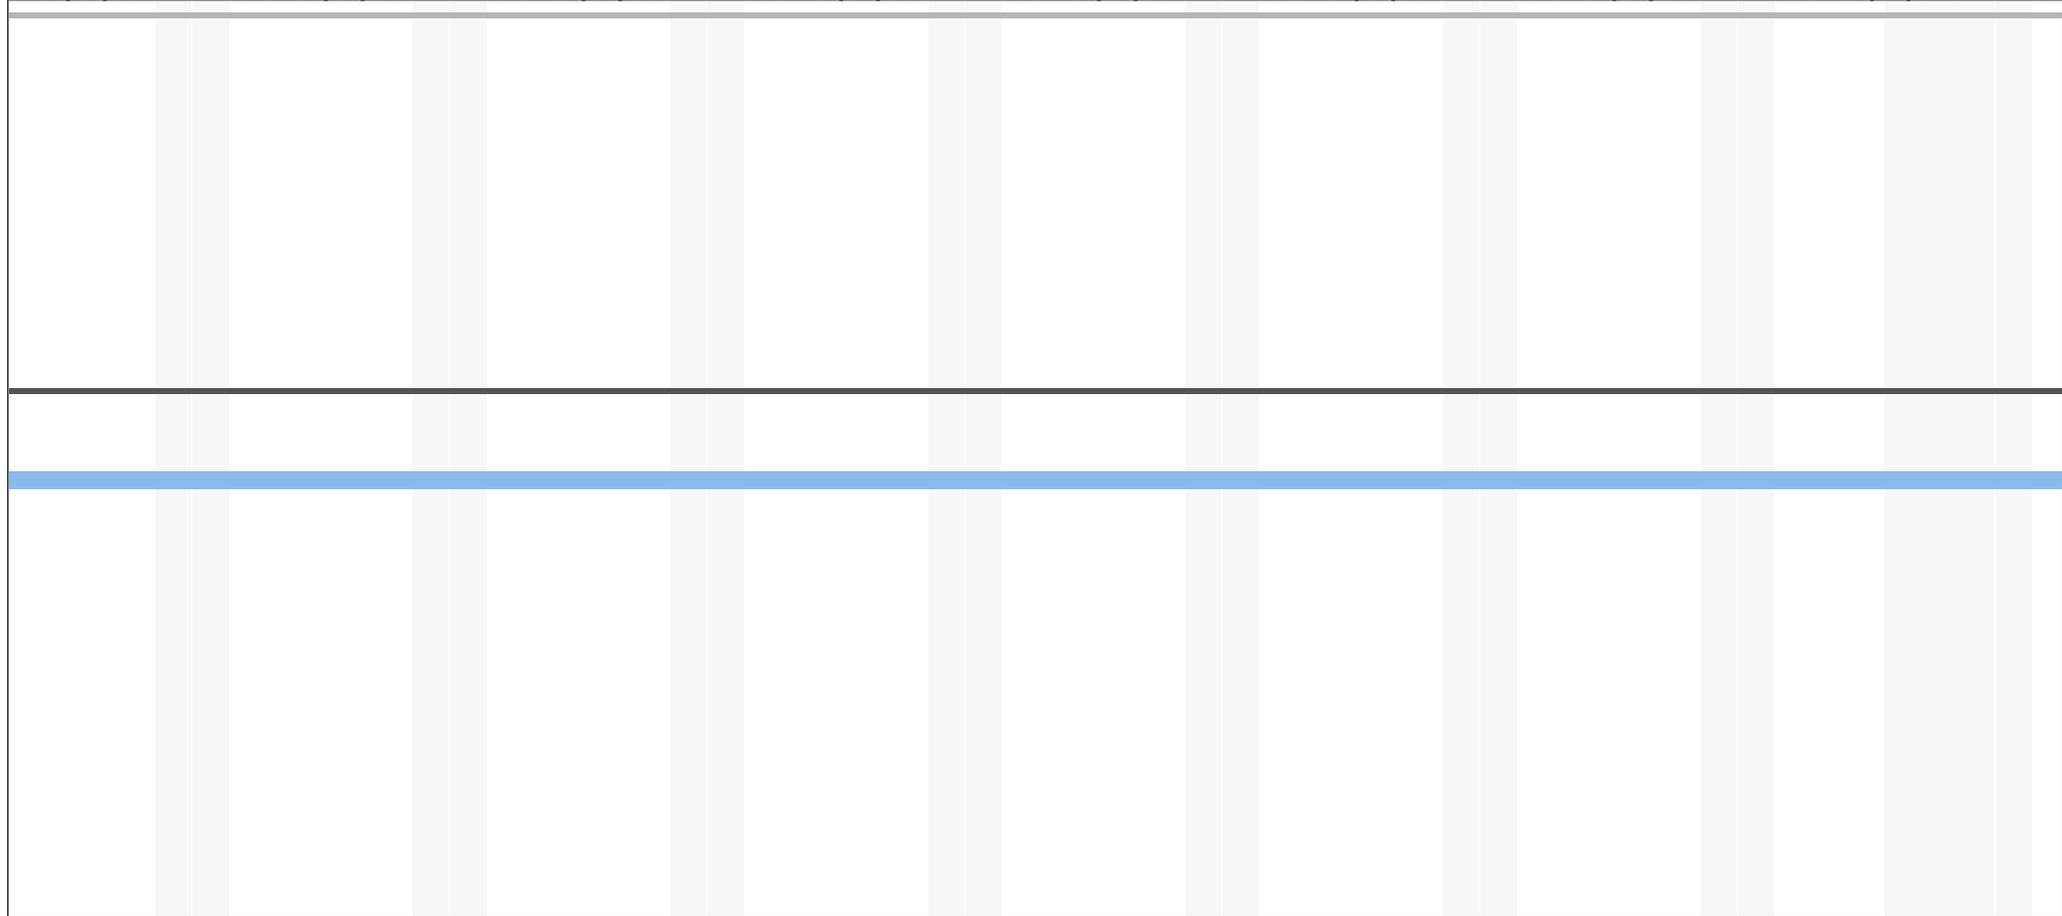


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

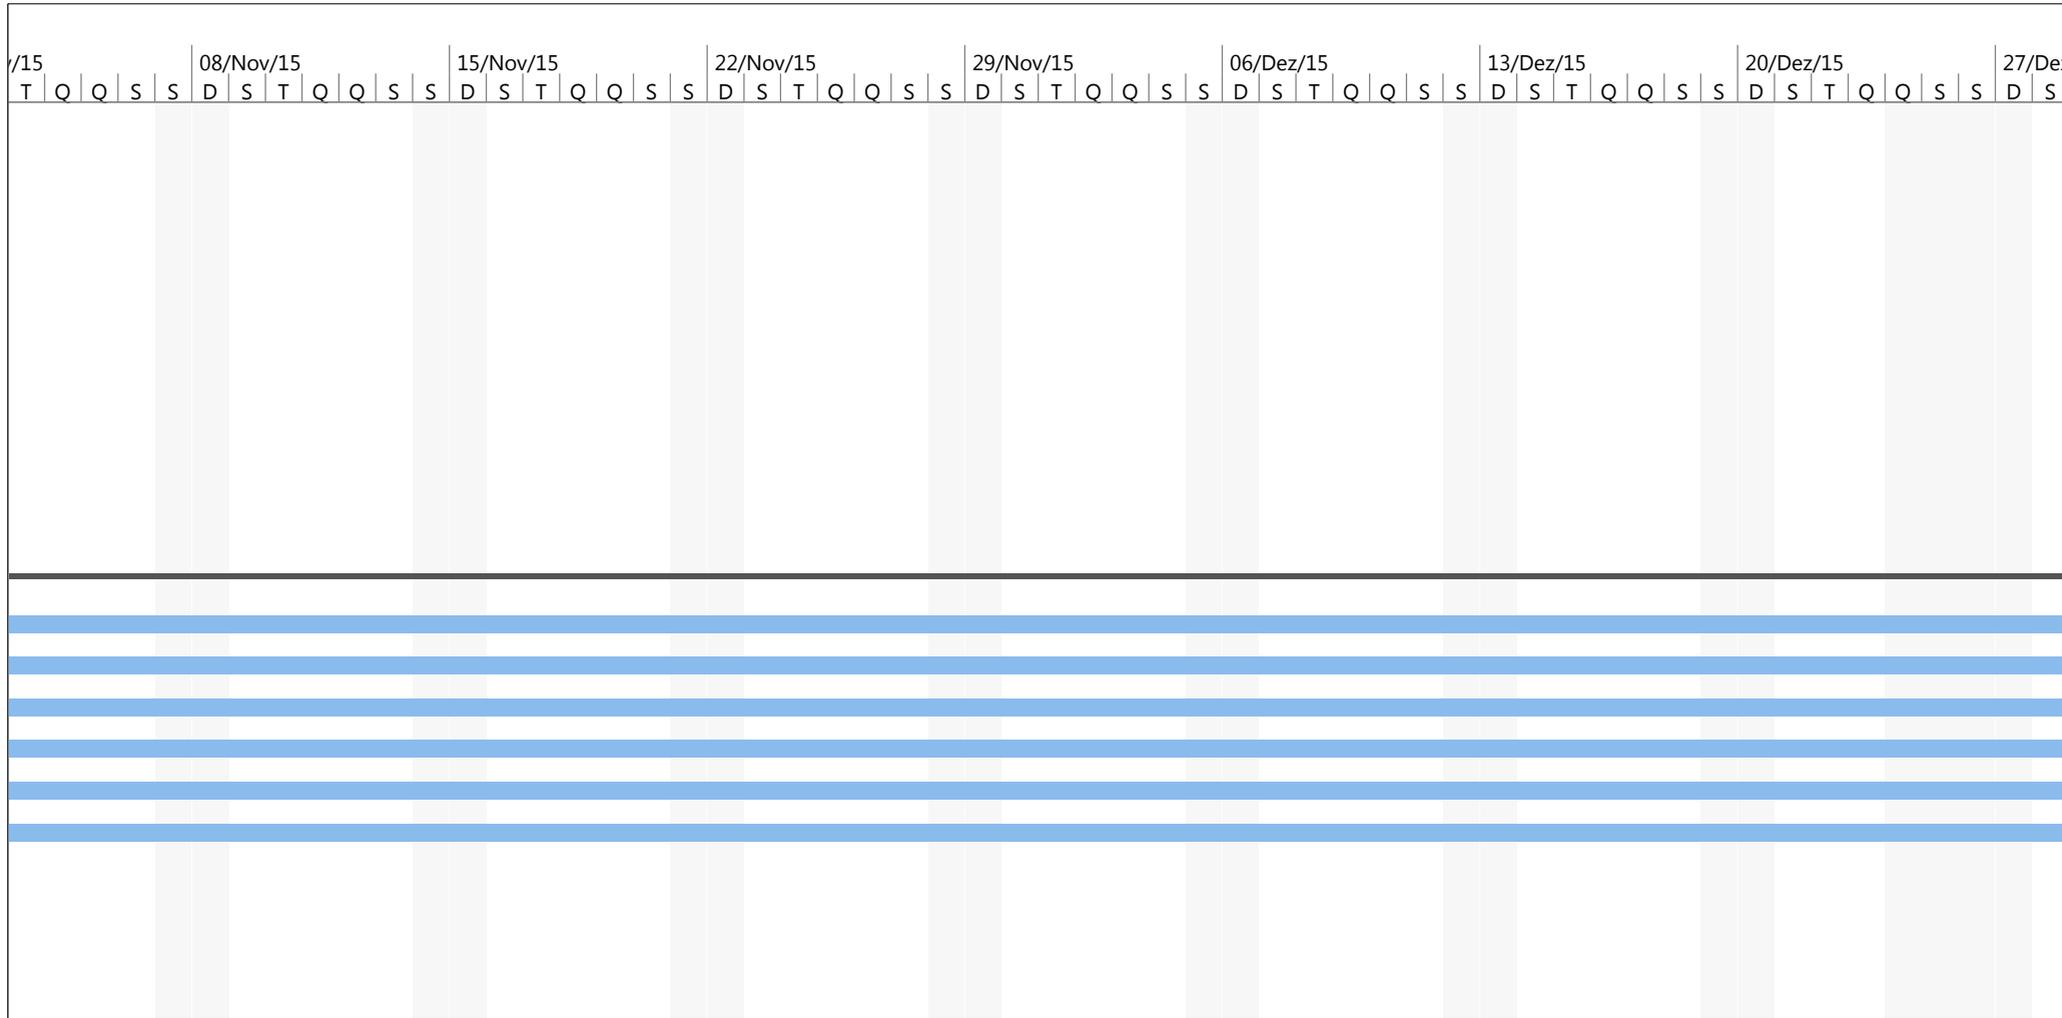

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

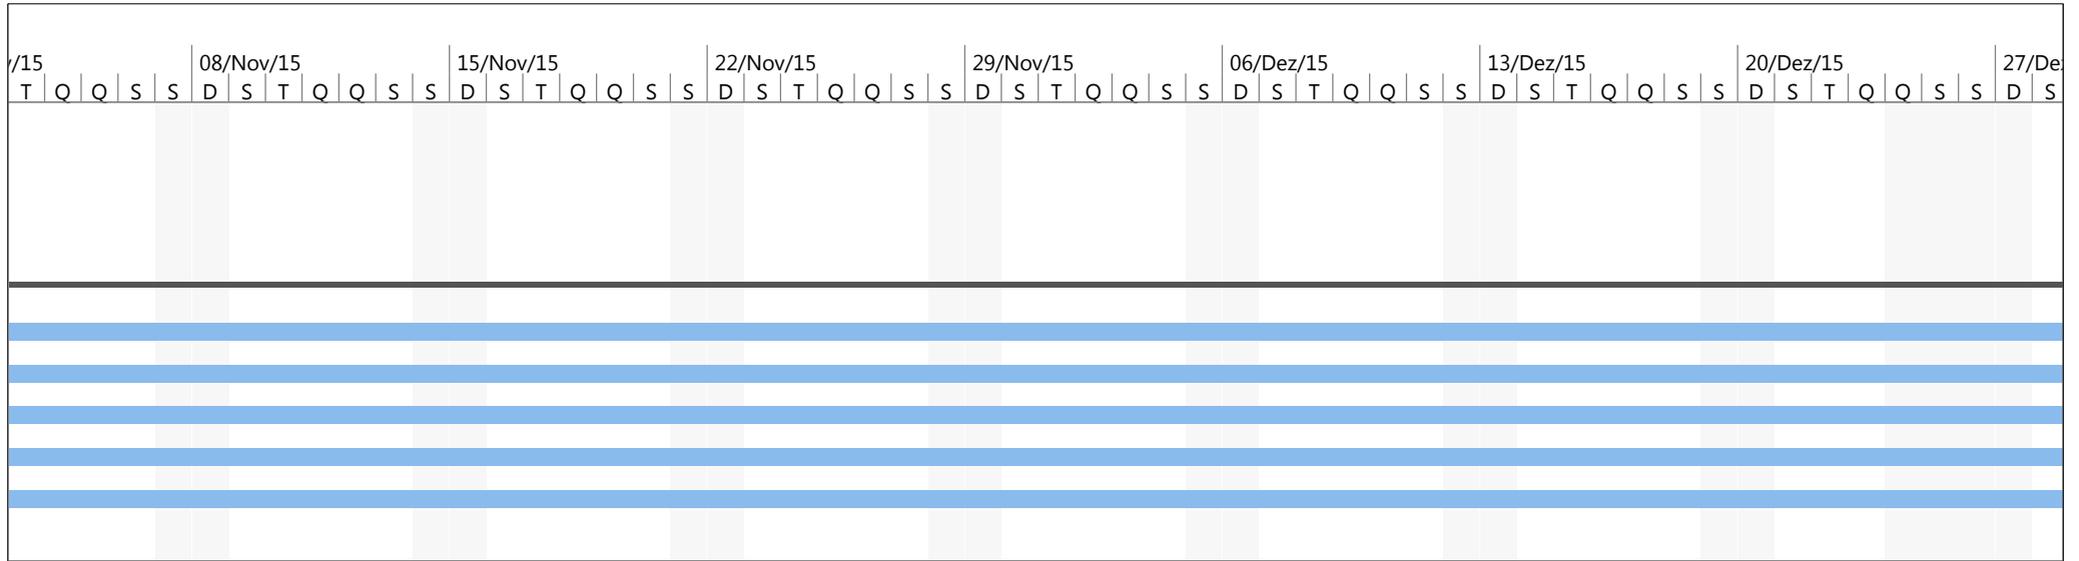


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Dez/15 | 03/Jan/16 | 10/Jan/16 | 17/Jan/16 | 24/Jan/16 | 31/Jan/16 | 07/Fev/16 | 14/Fev/16 | 21

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

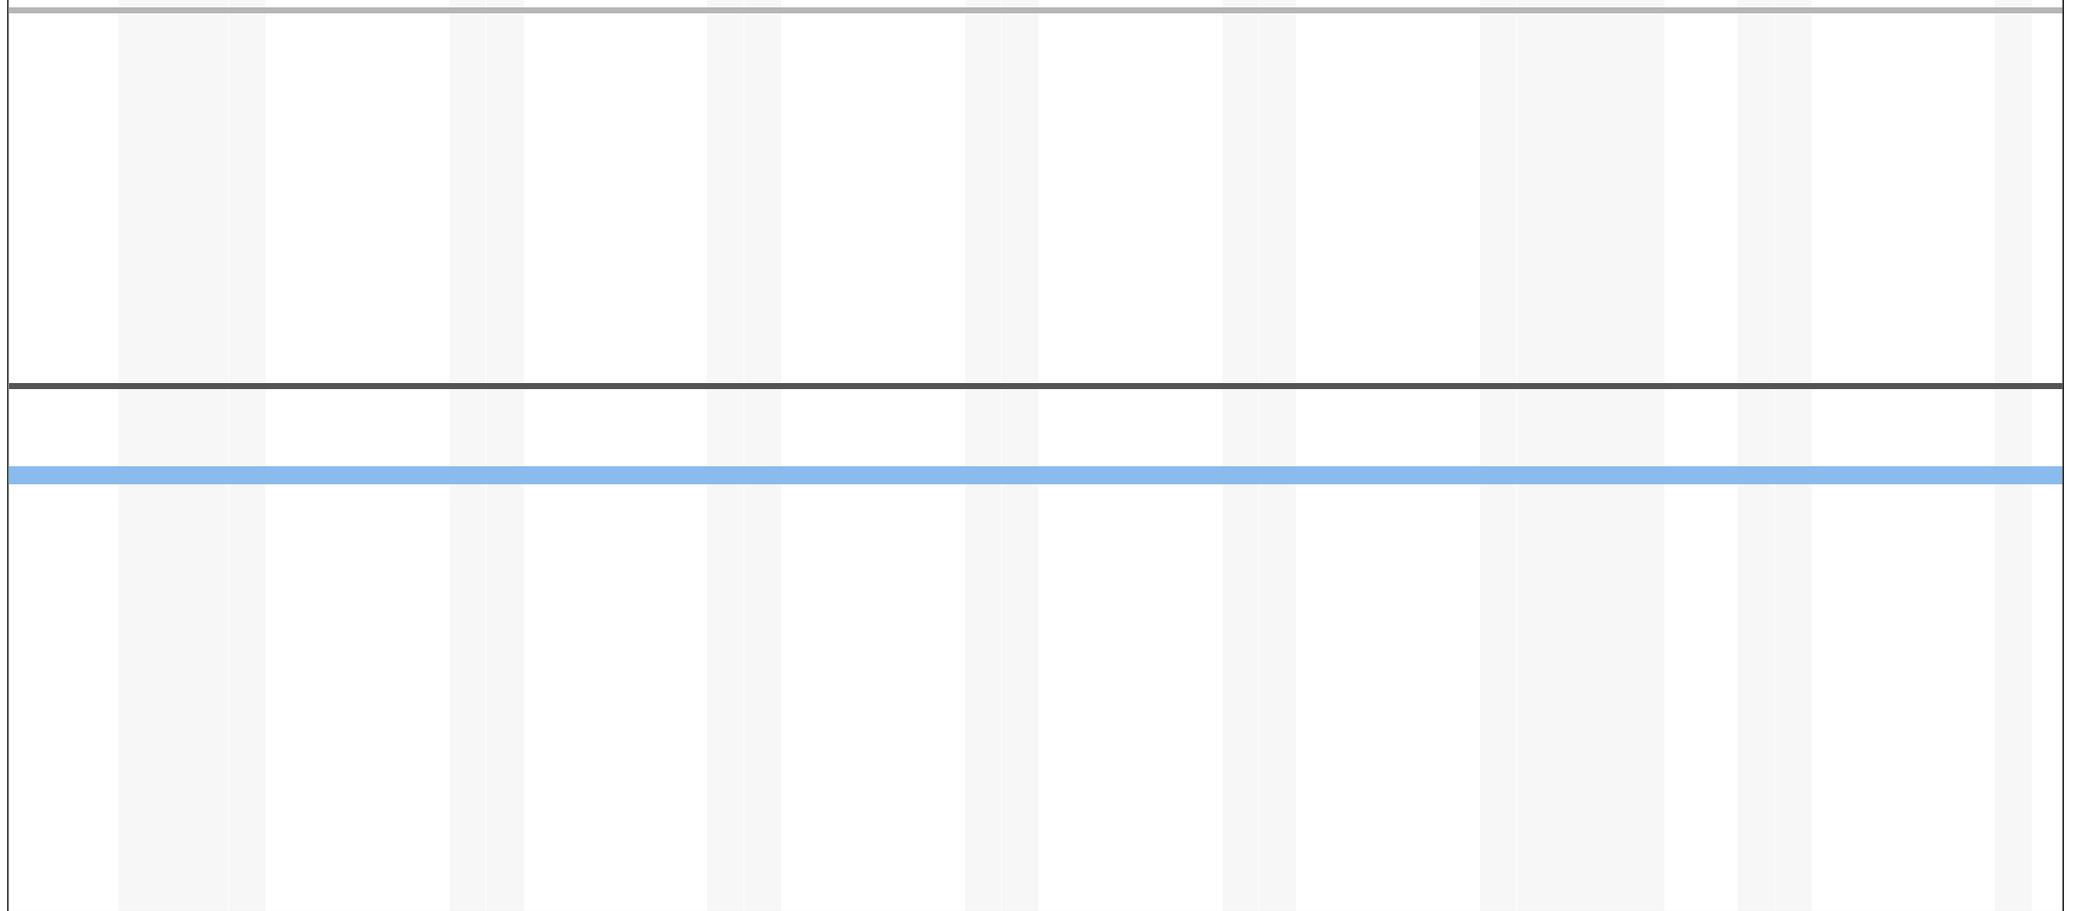


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

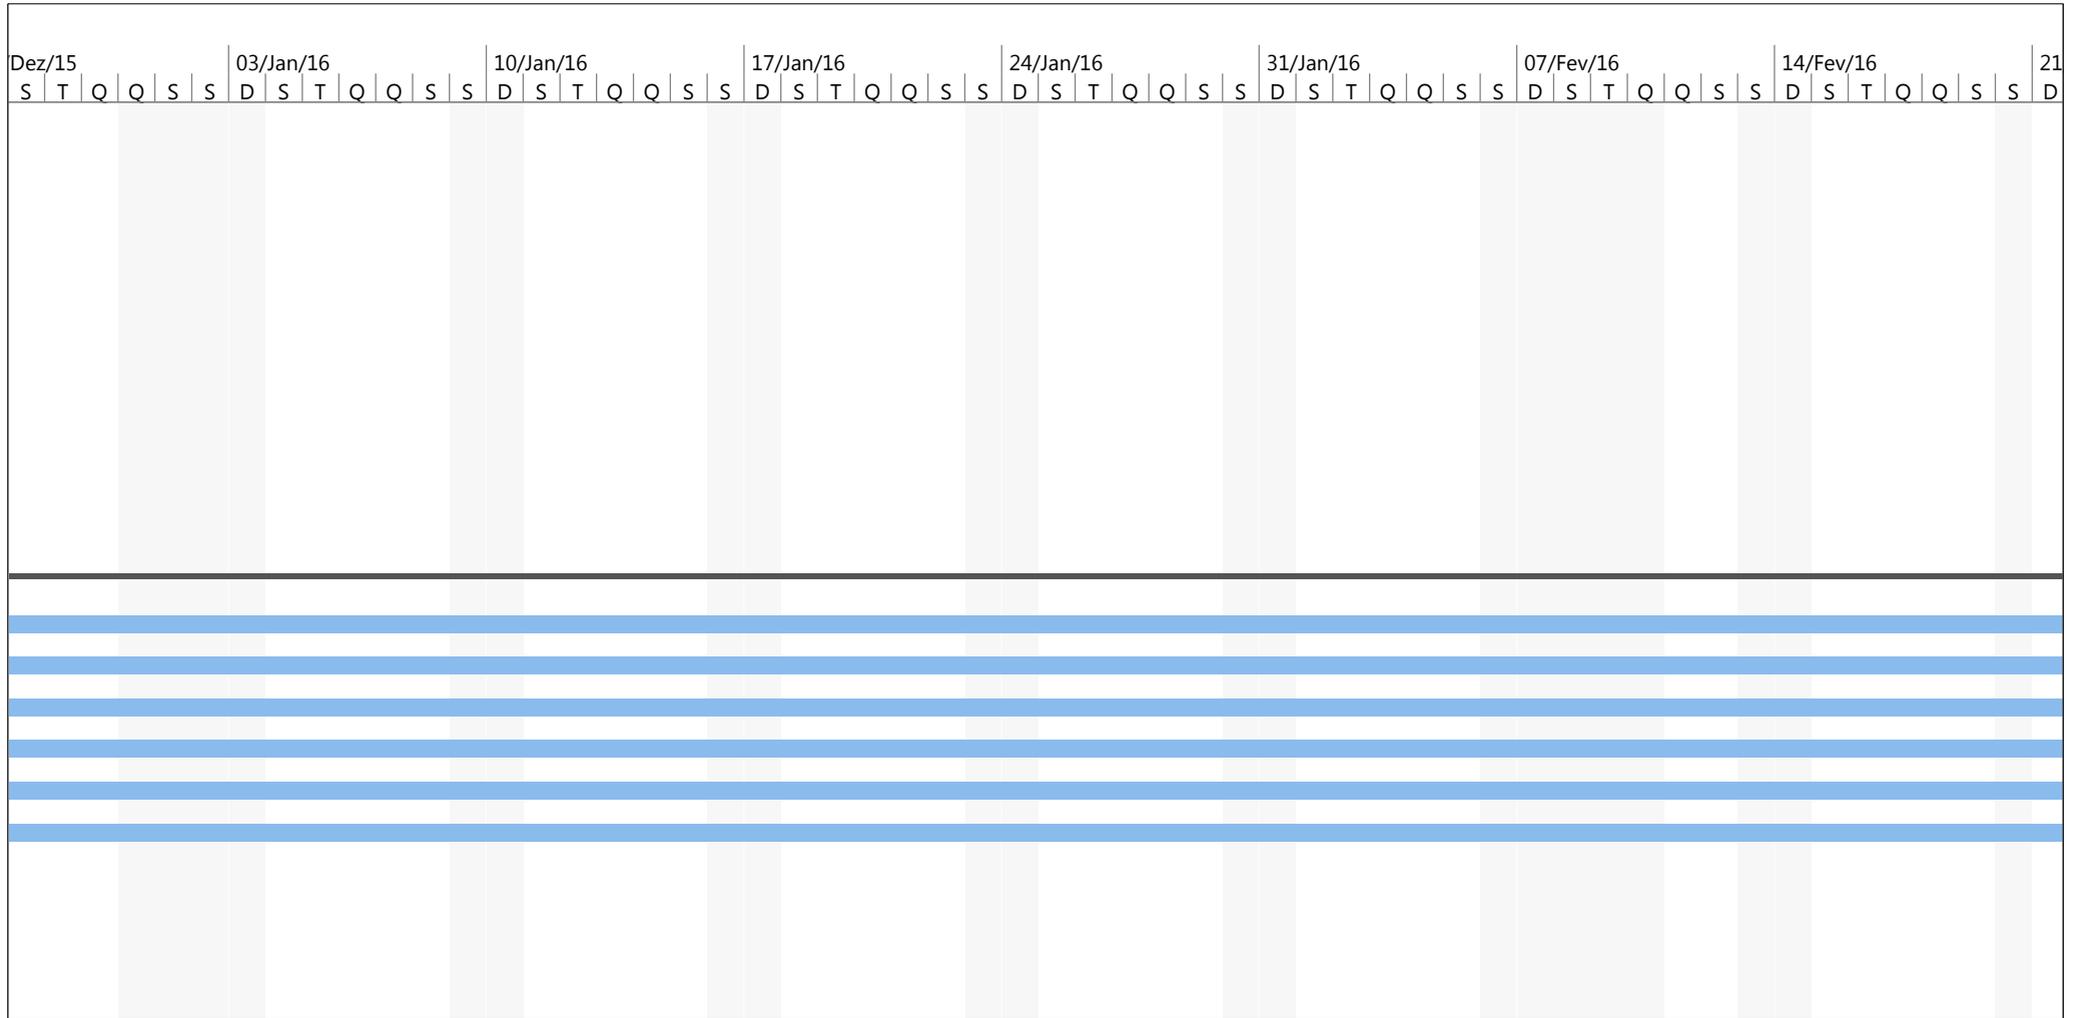

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

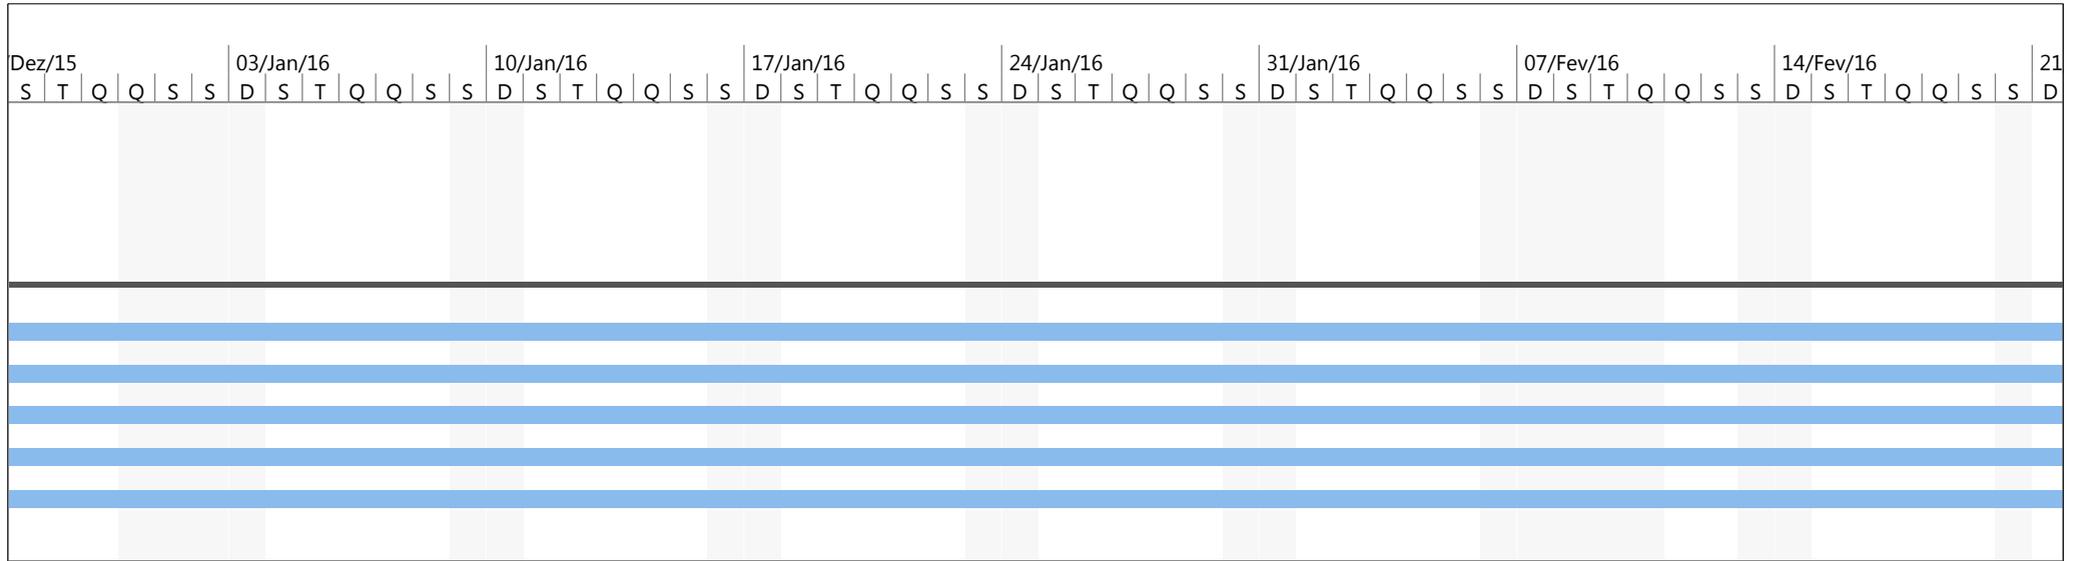

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


21/Fev/16 28/Fev/16 06/Mar/16 13/Mar/16 20/Mar/16 27/Mar/16 03/Abr/16 10/Abr/16  
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

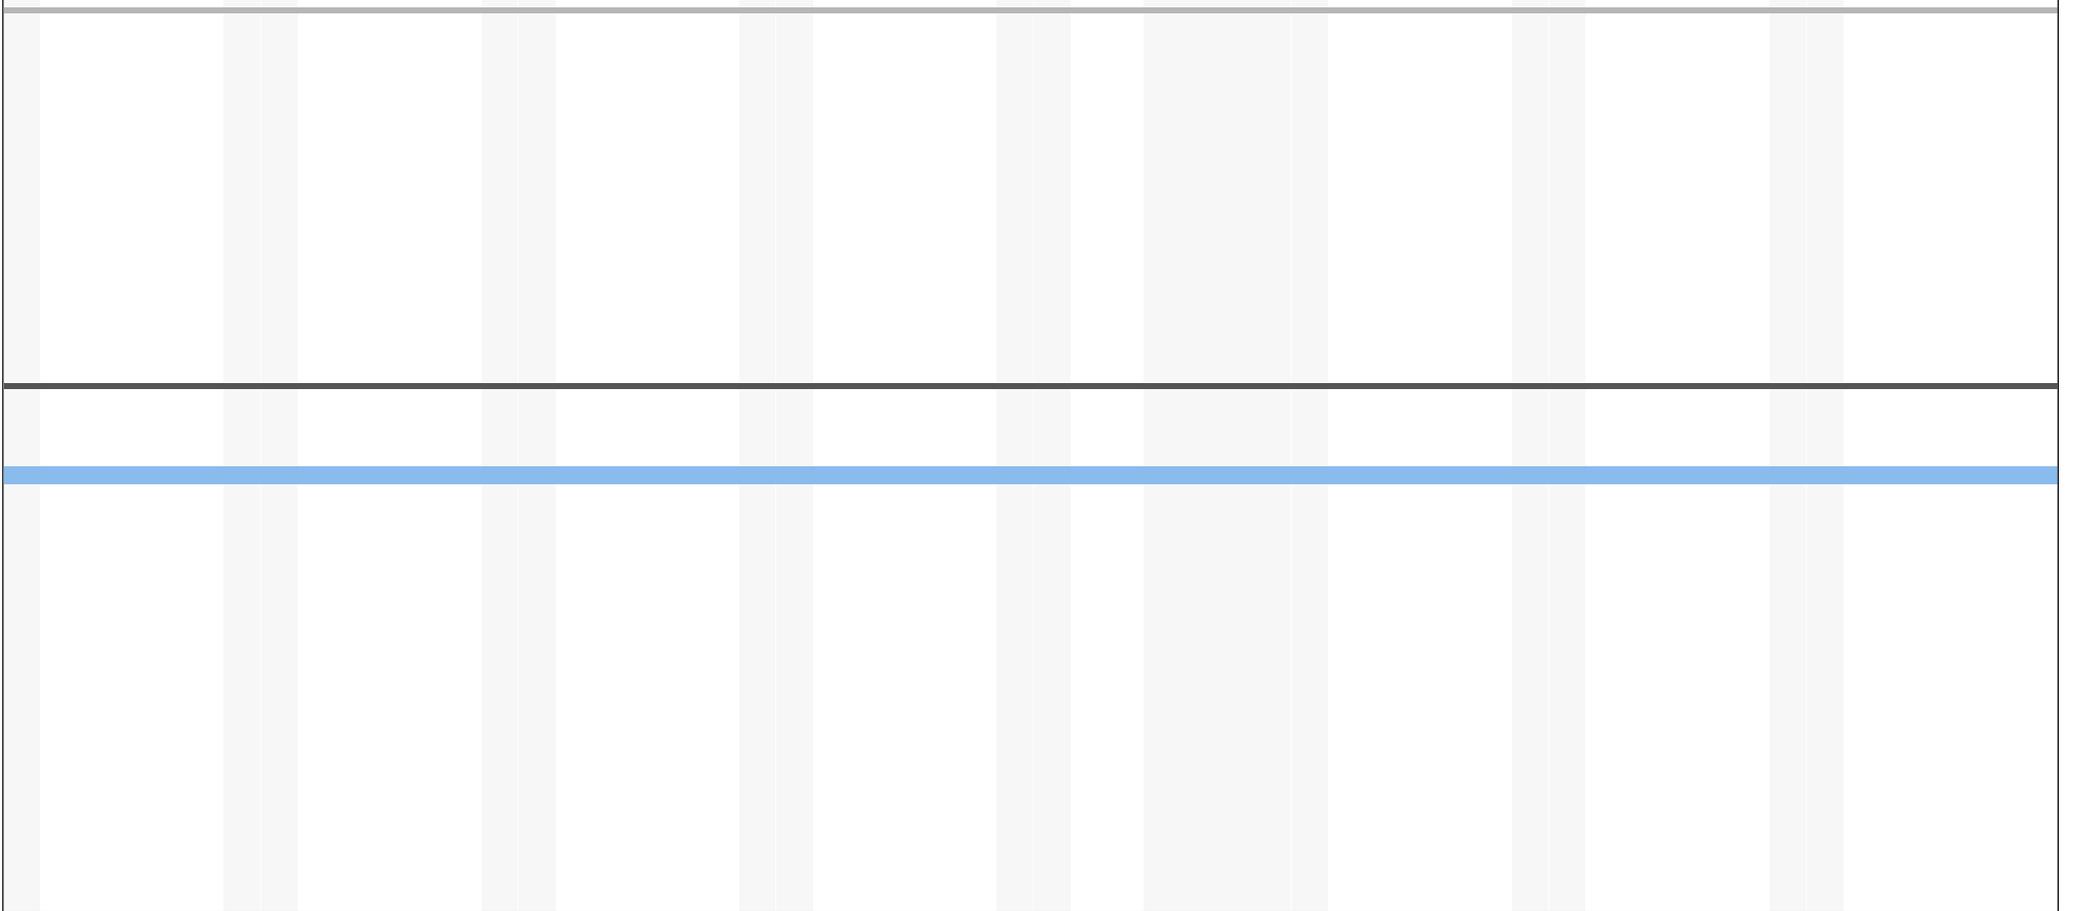

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


21/Fev/16 | 28/Fev/16 | 06/Mar/16 | 13/Mar/16 | 20/Mar/16 | 27/Mar/16 | 03/Abr/16 | 10/Abr/16  
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

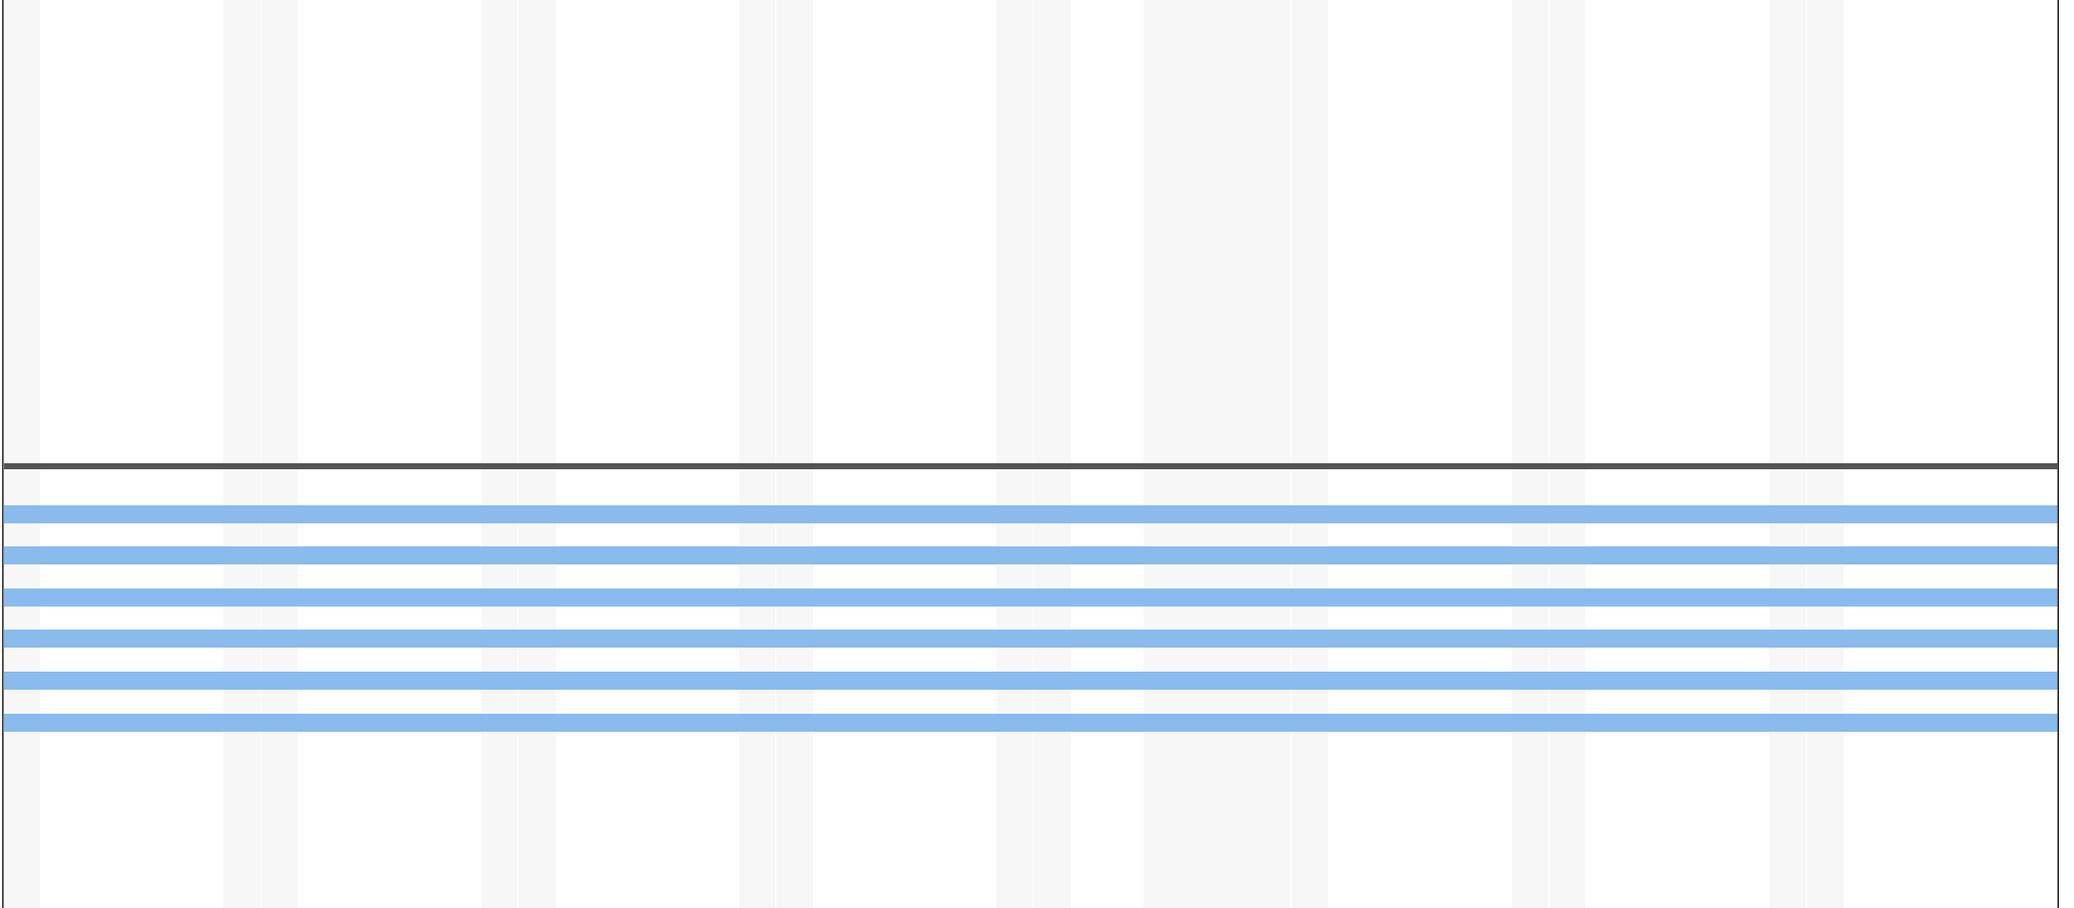

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

21/Fev/16 | 28/Fev/16 | 06/Mar/16 | 13/Mar/16 | 20/Mar/16 | 27/Mar/16 | 03/Abr/16 | 10/Abr/16  
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

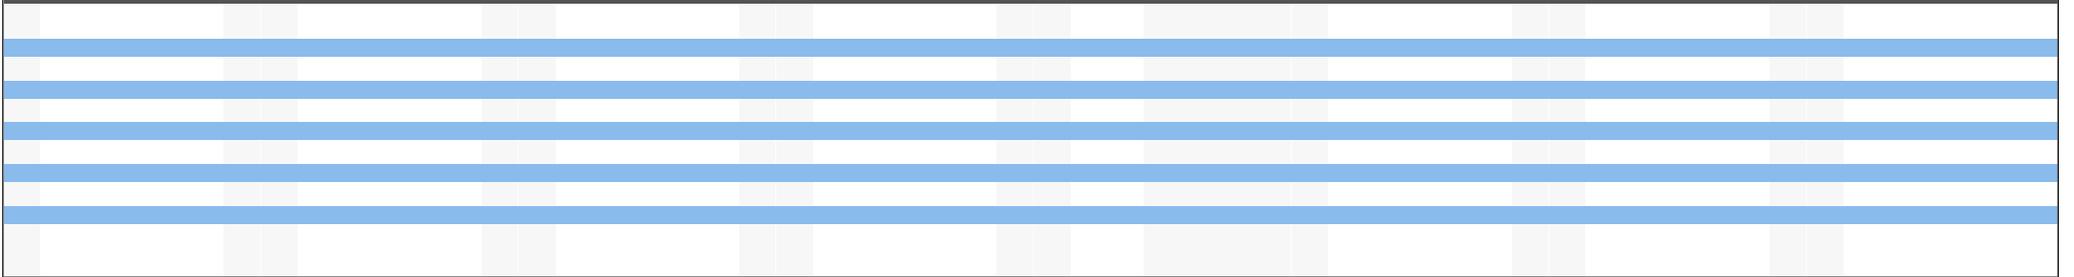


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

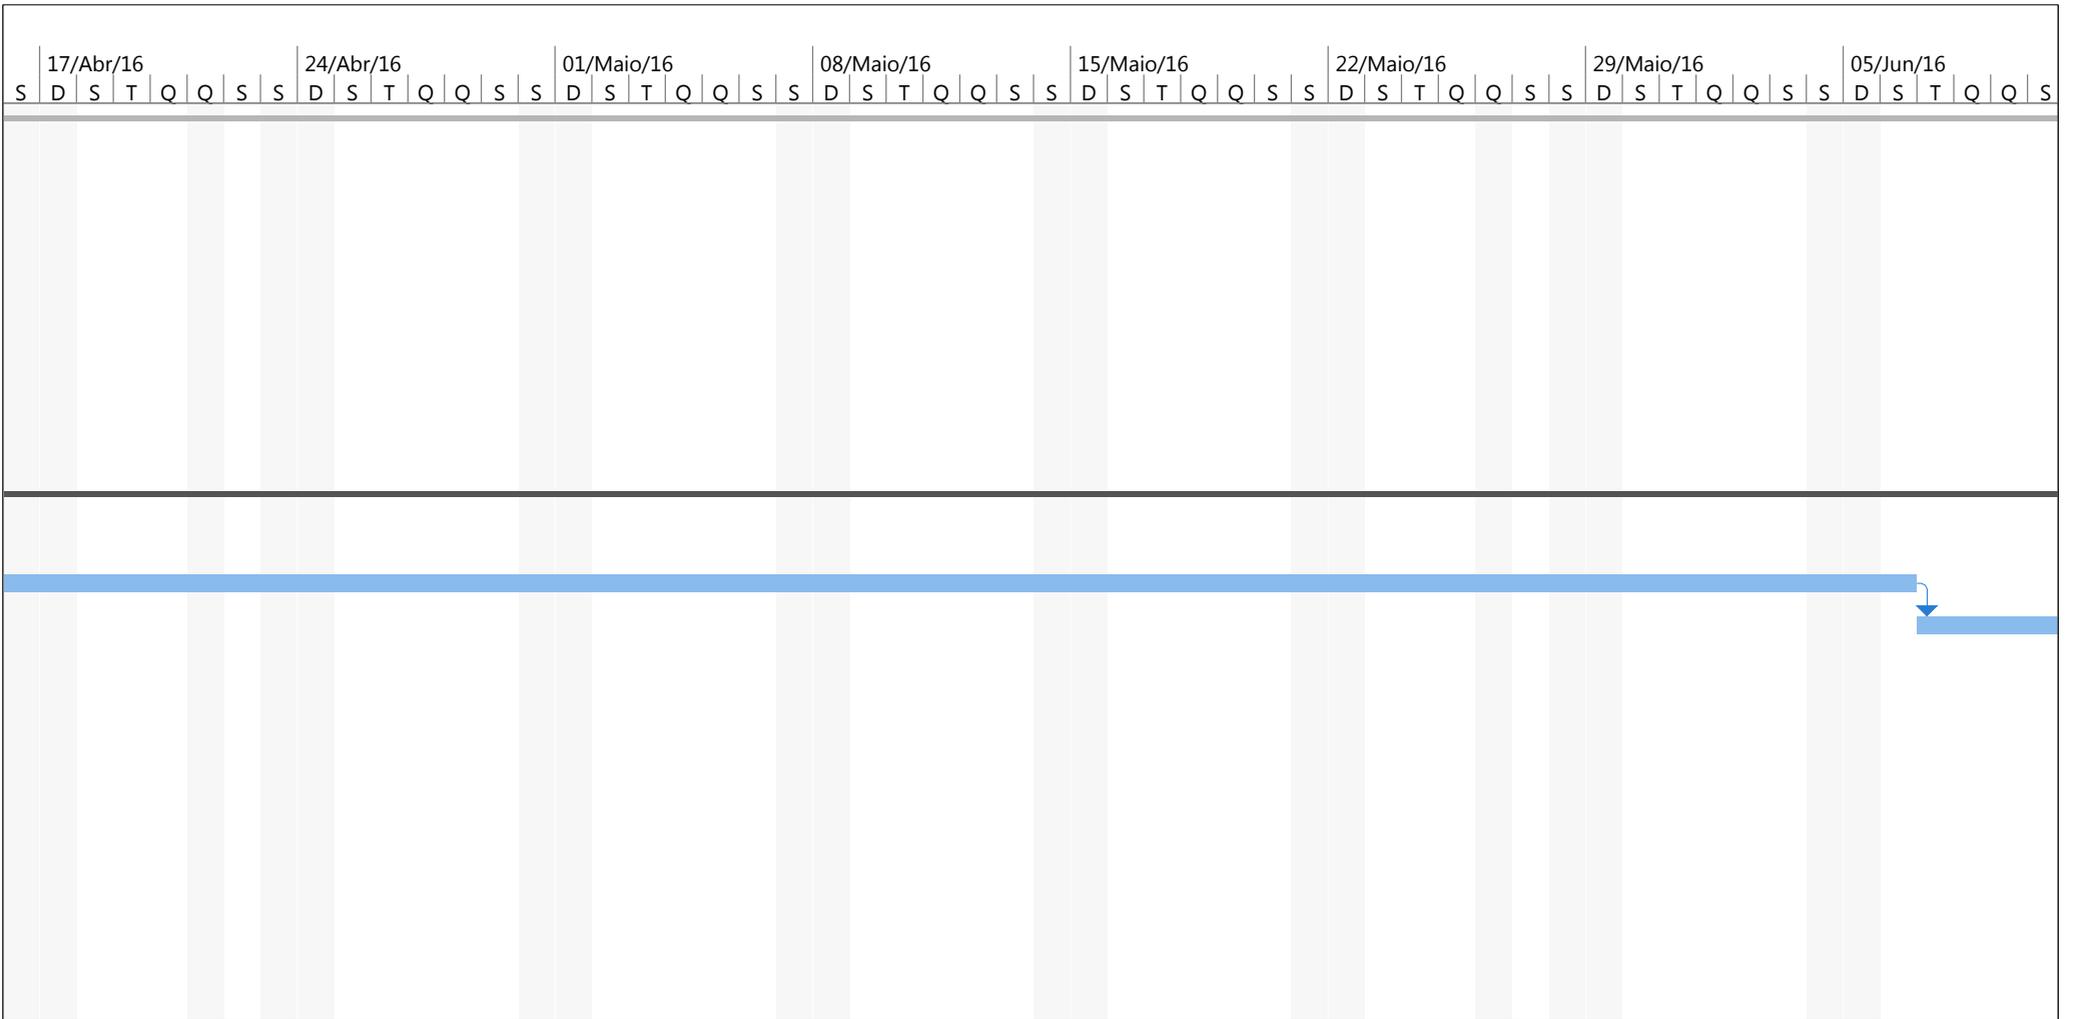


Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

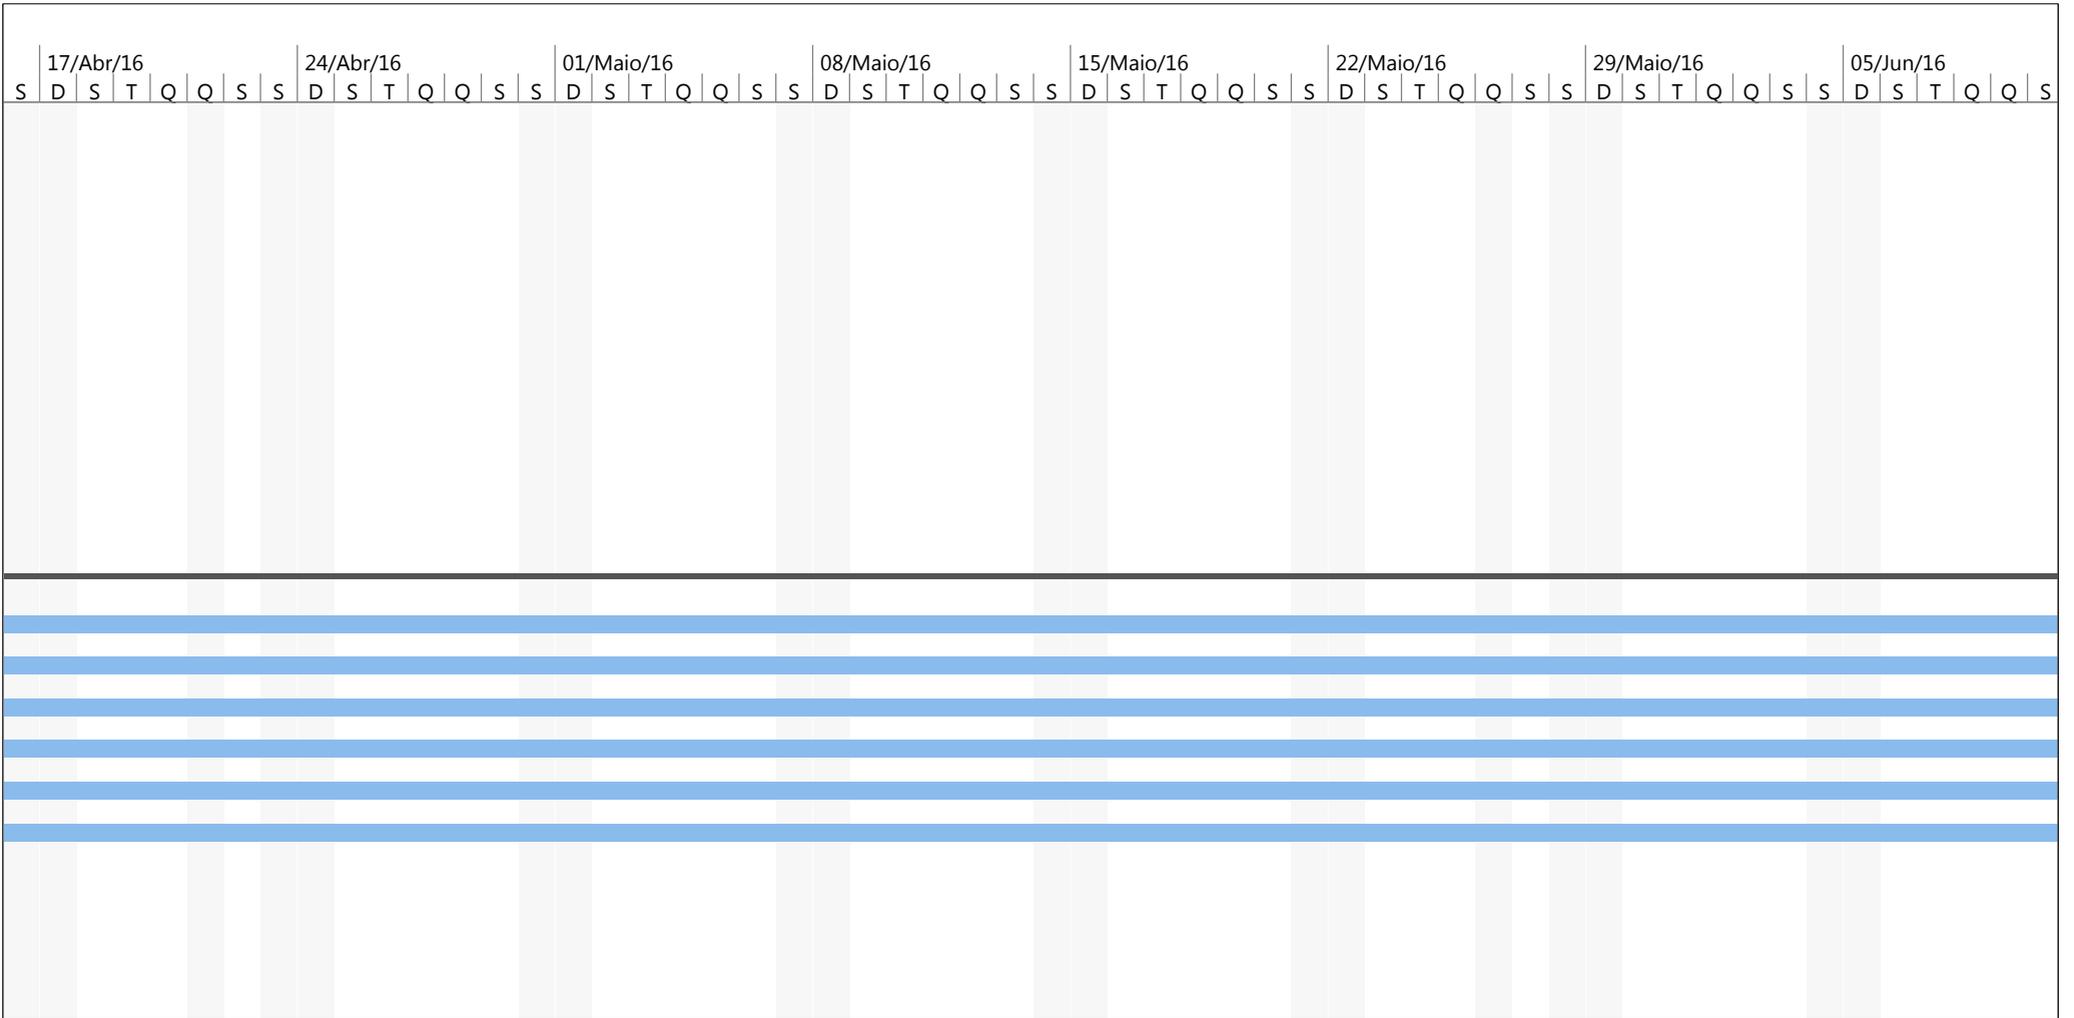


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

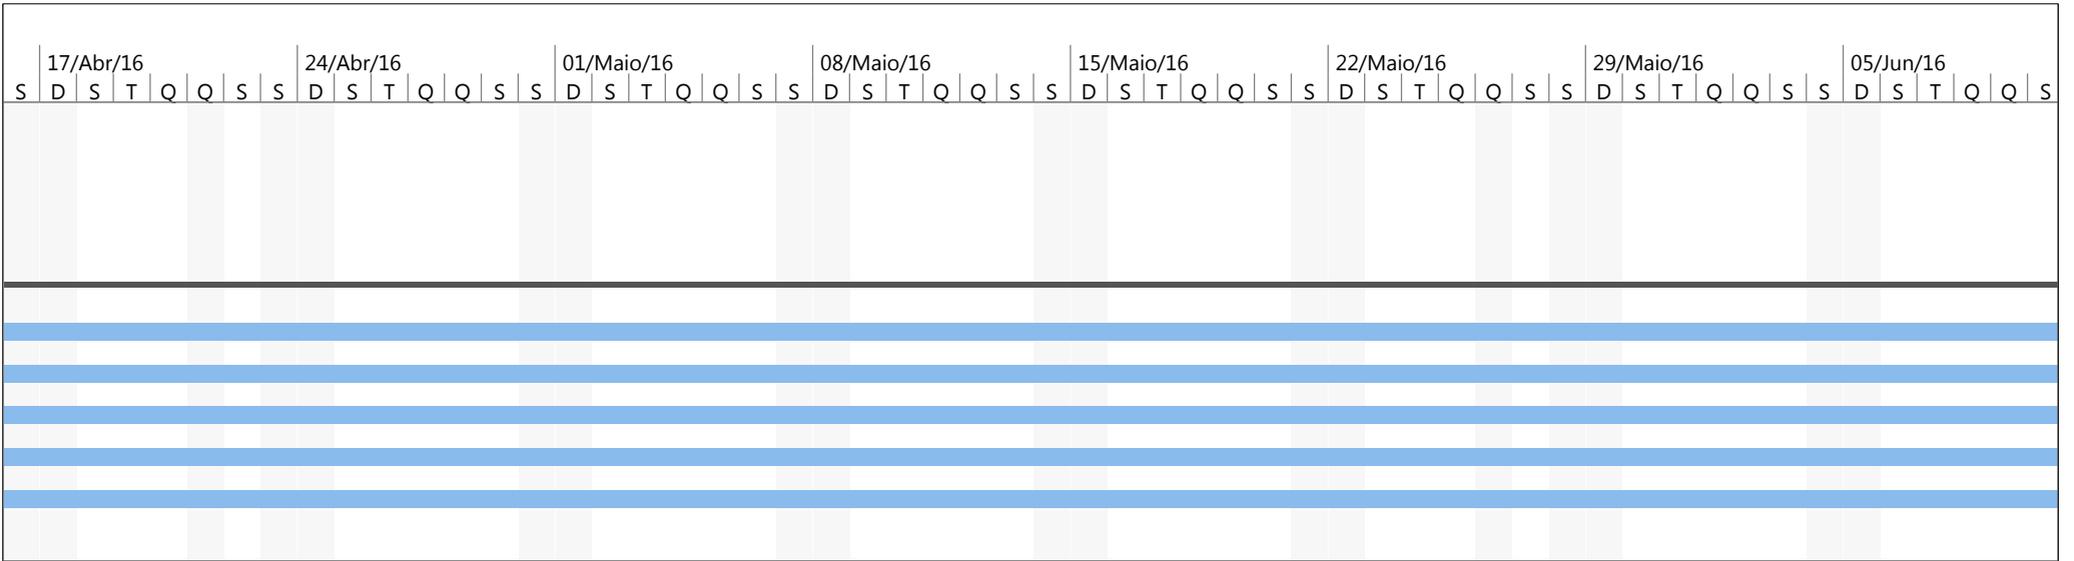


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

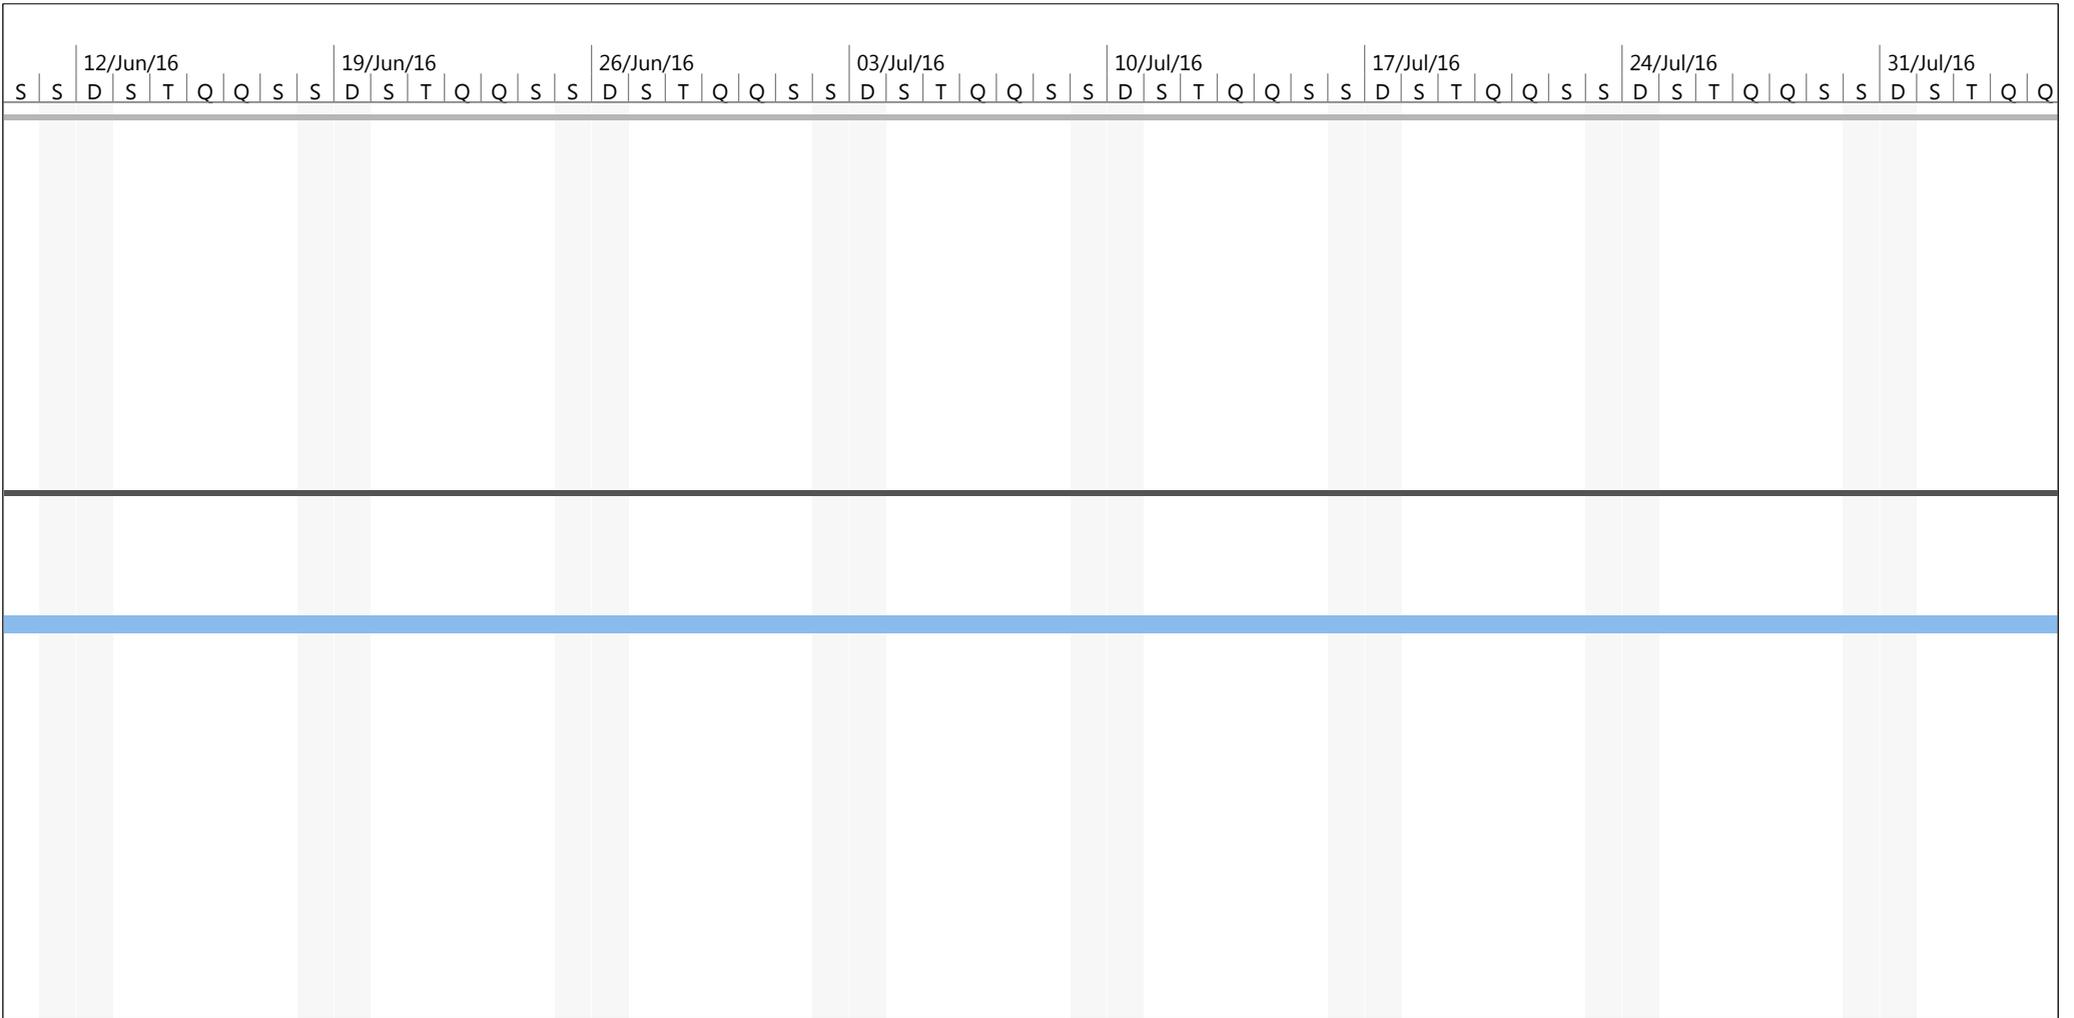


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

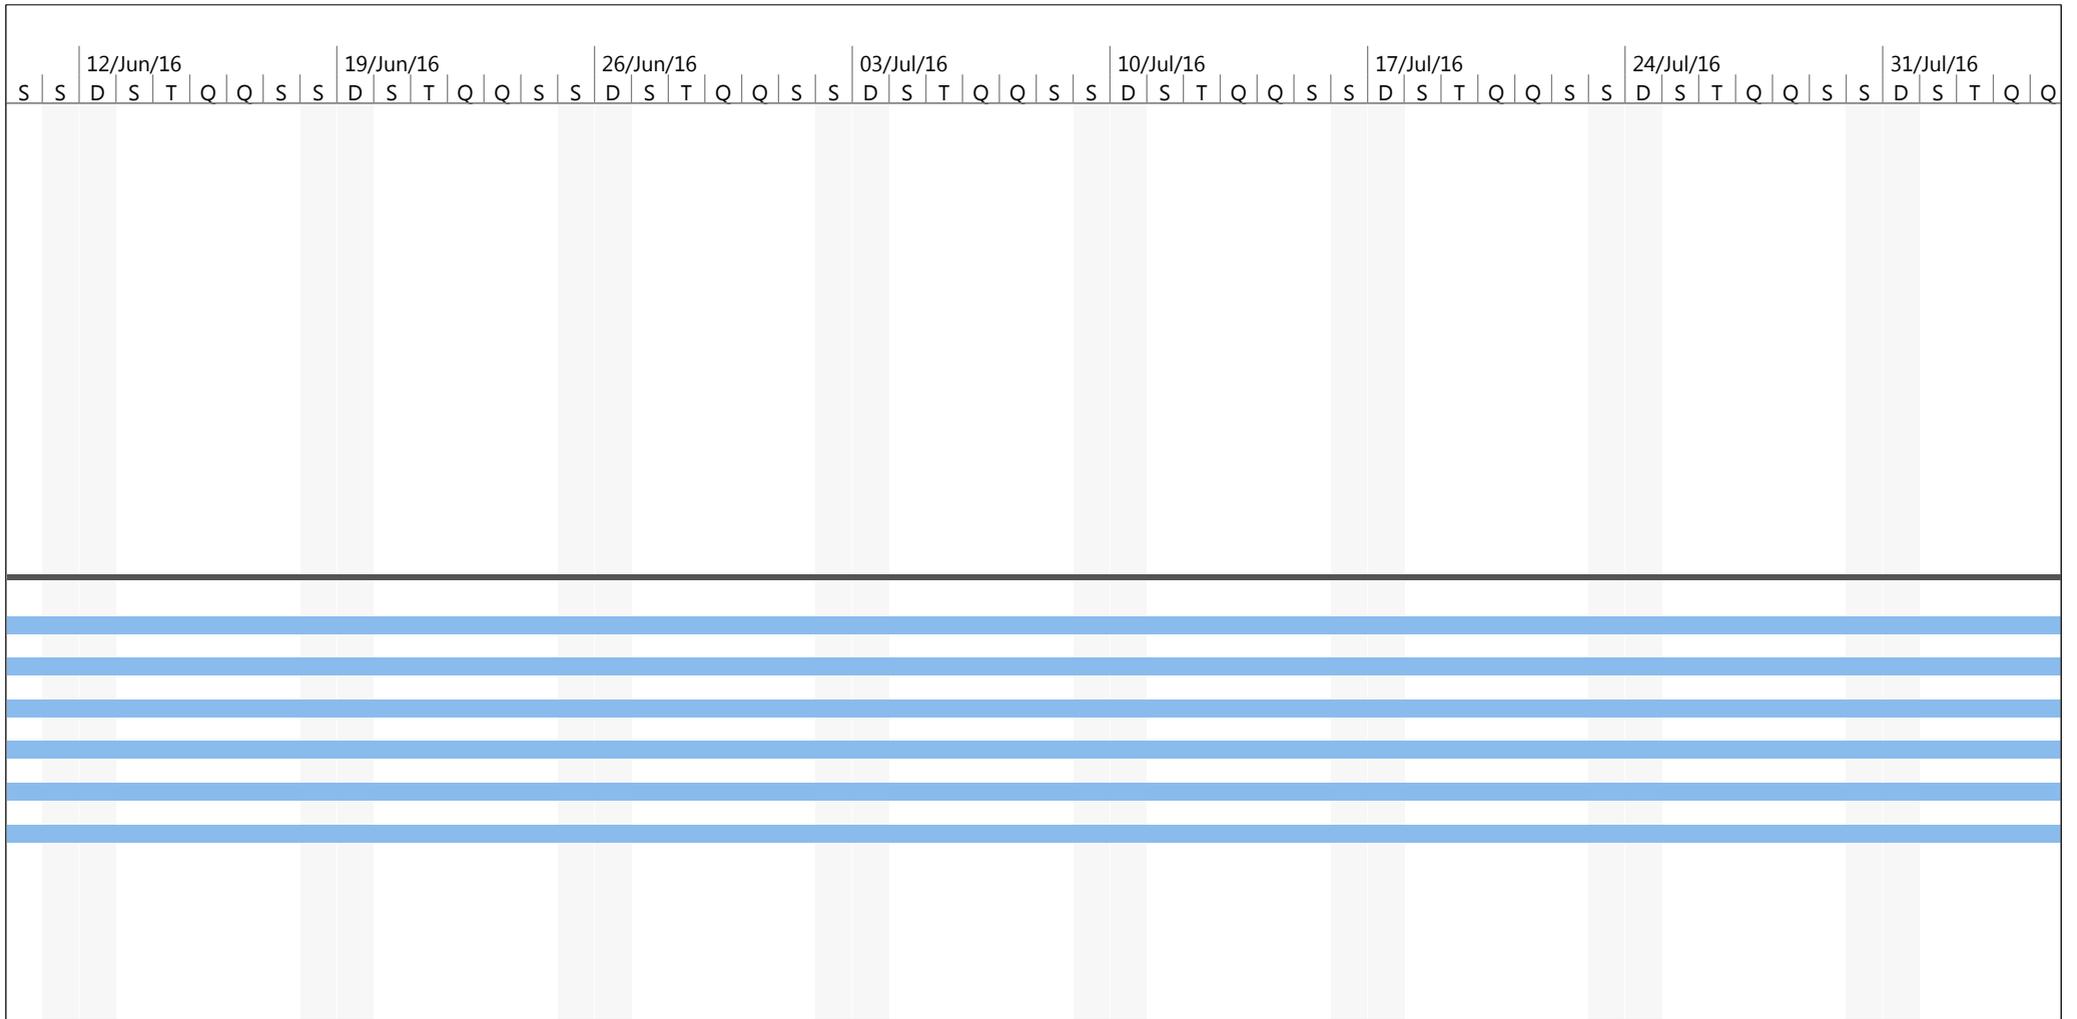


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

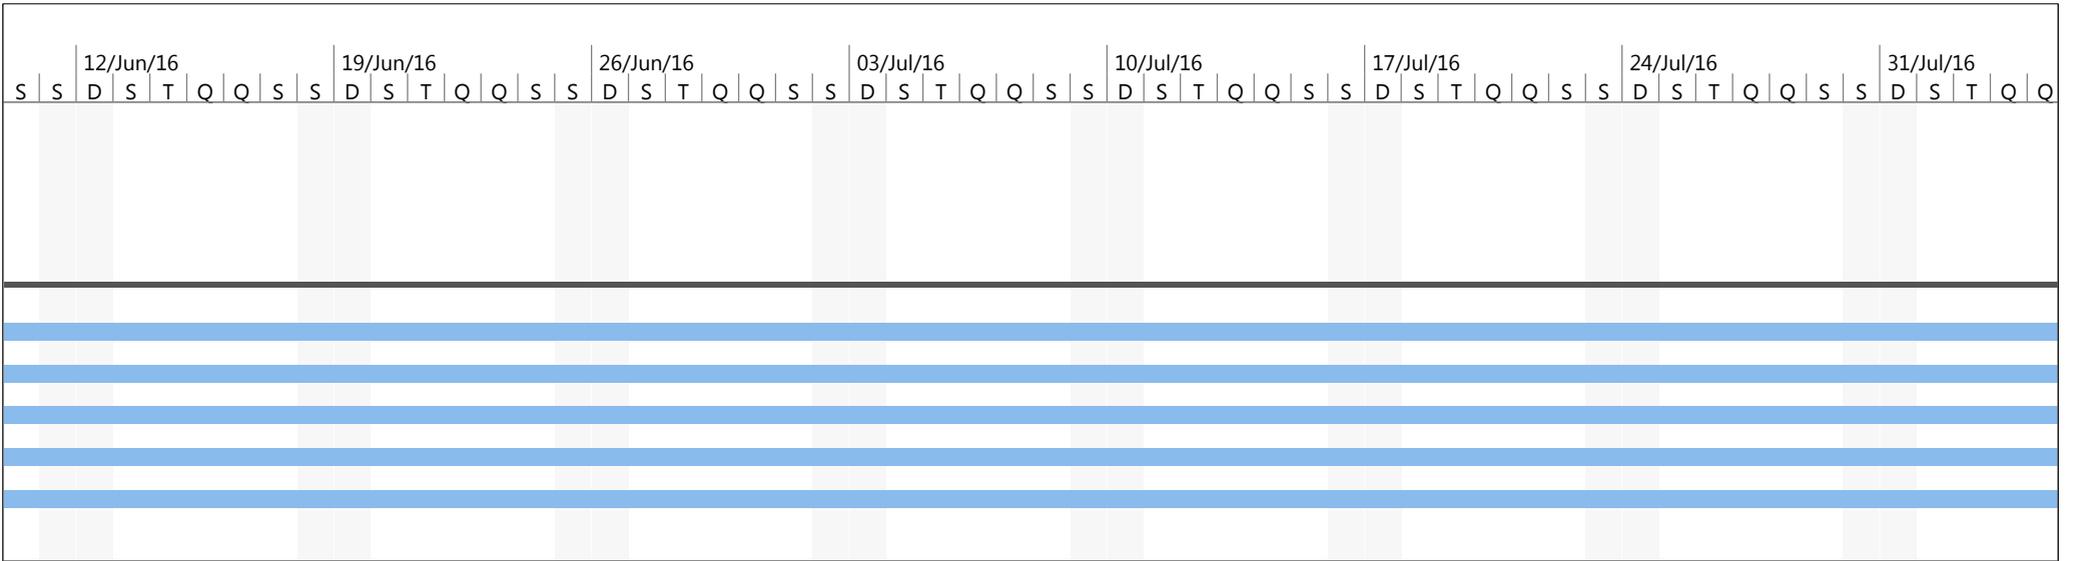


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

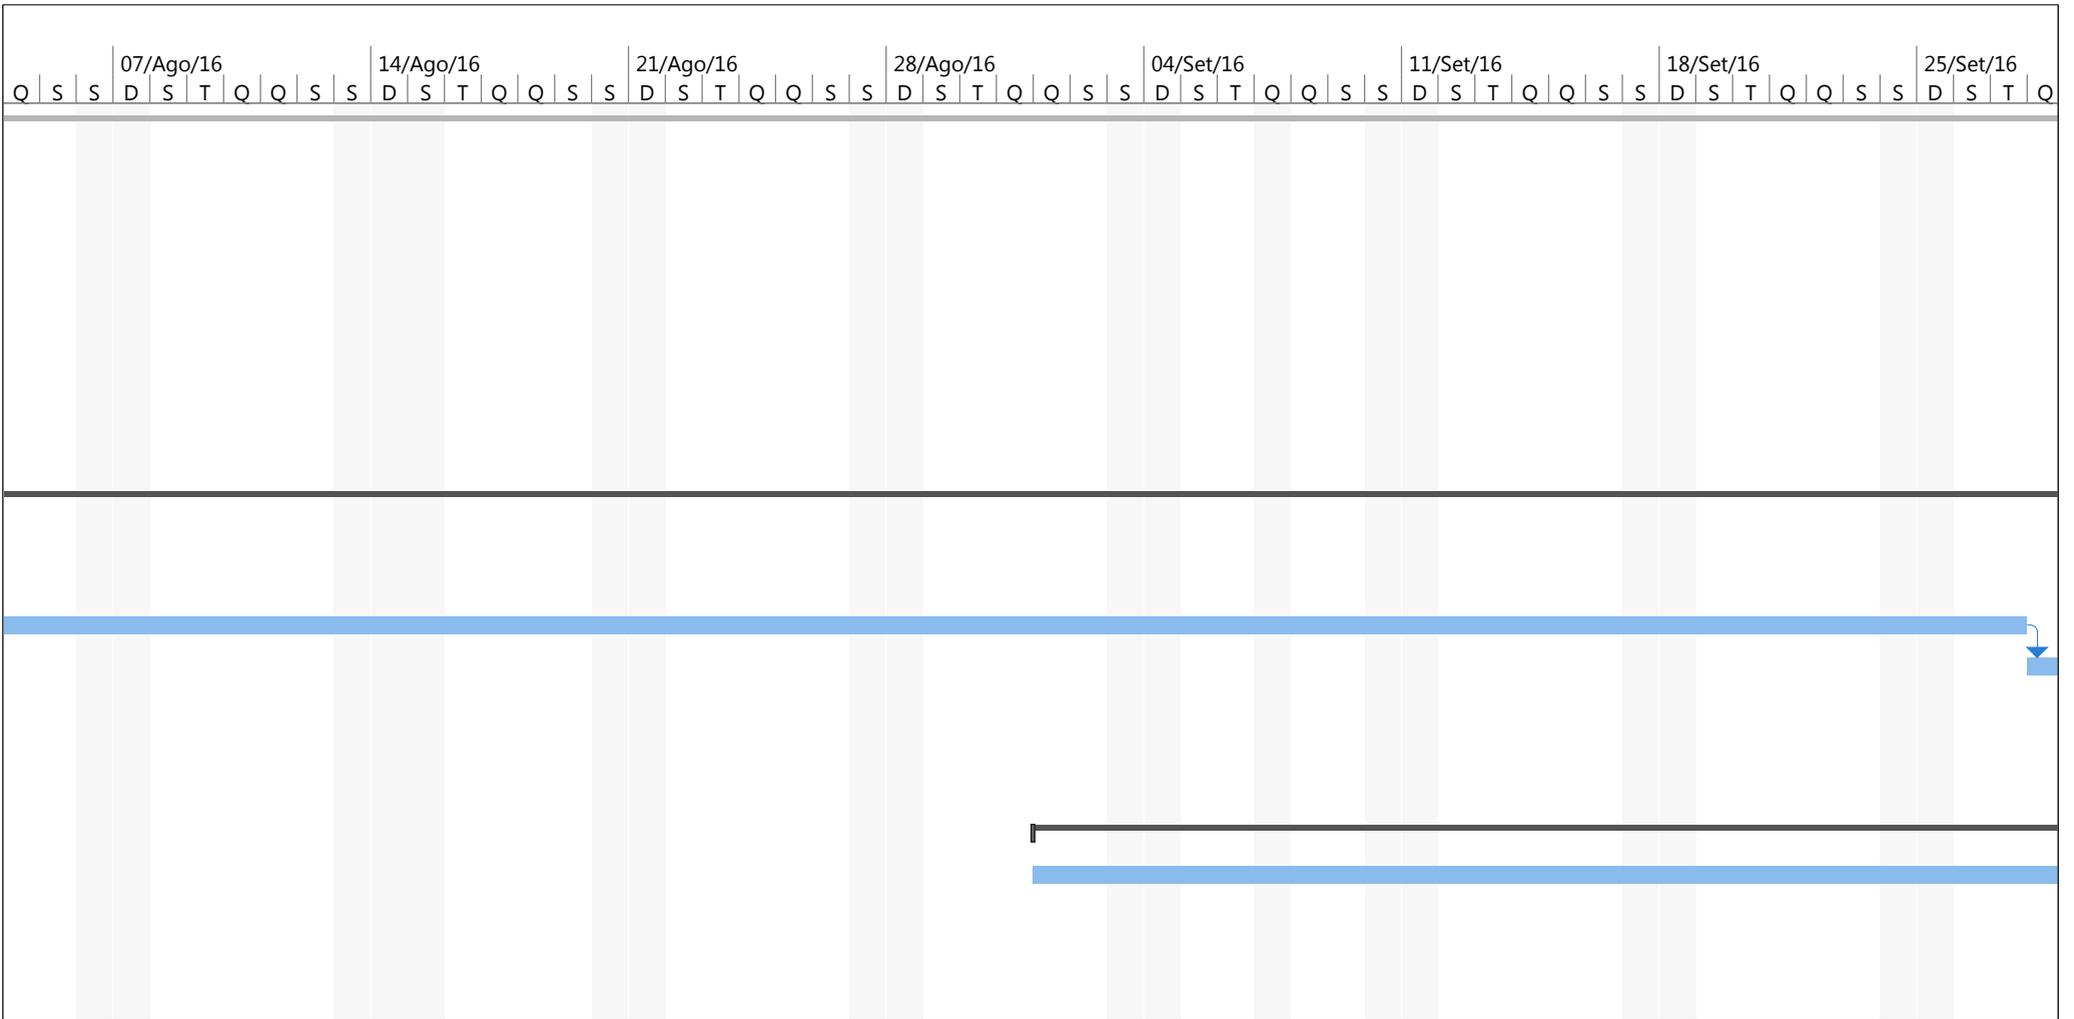


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

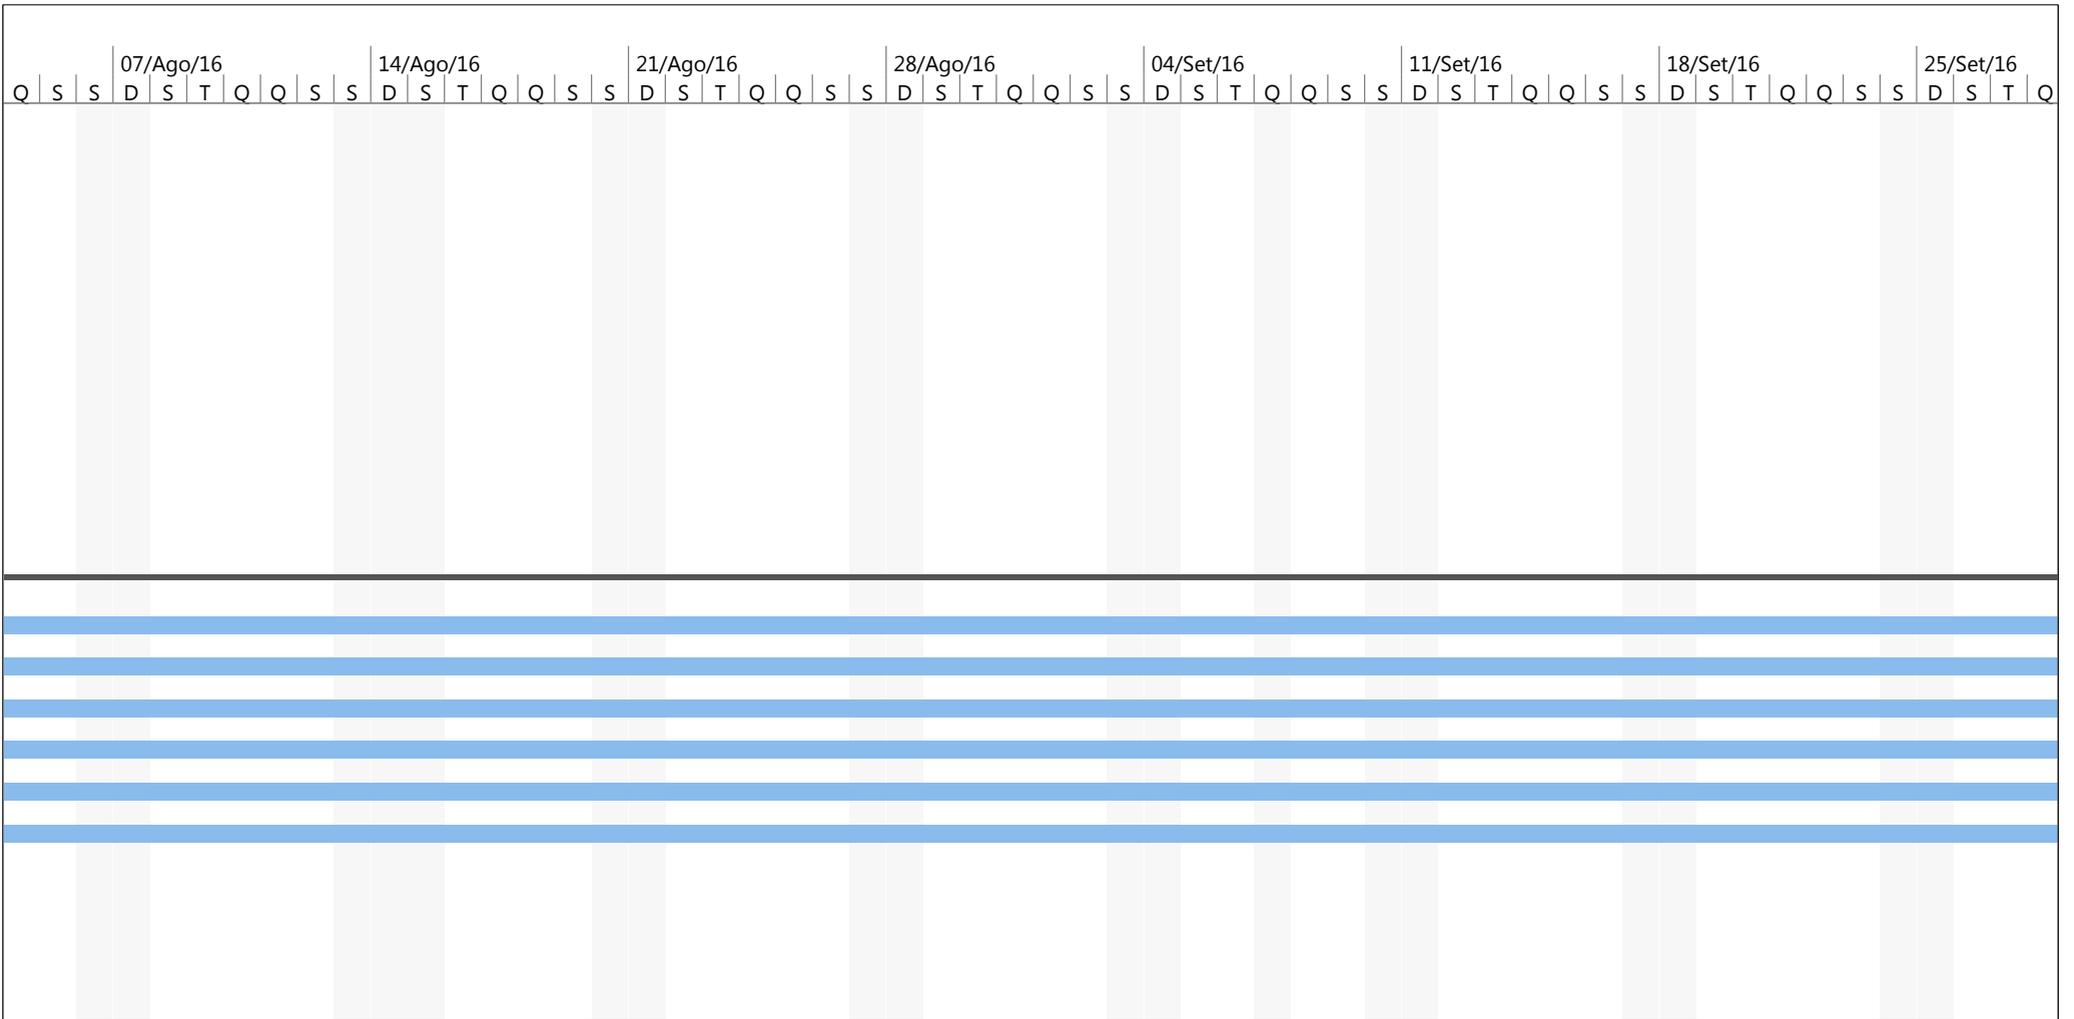

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

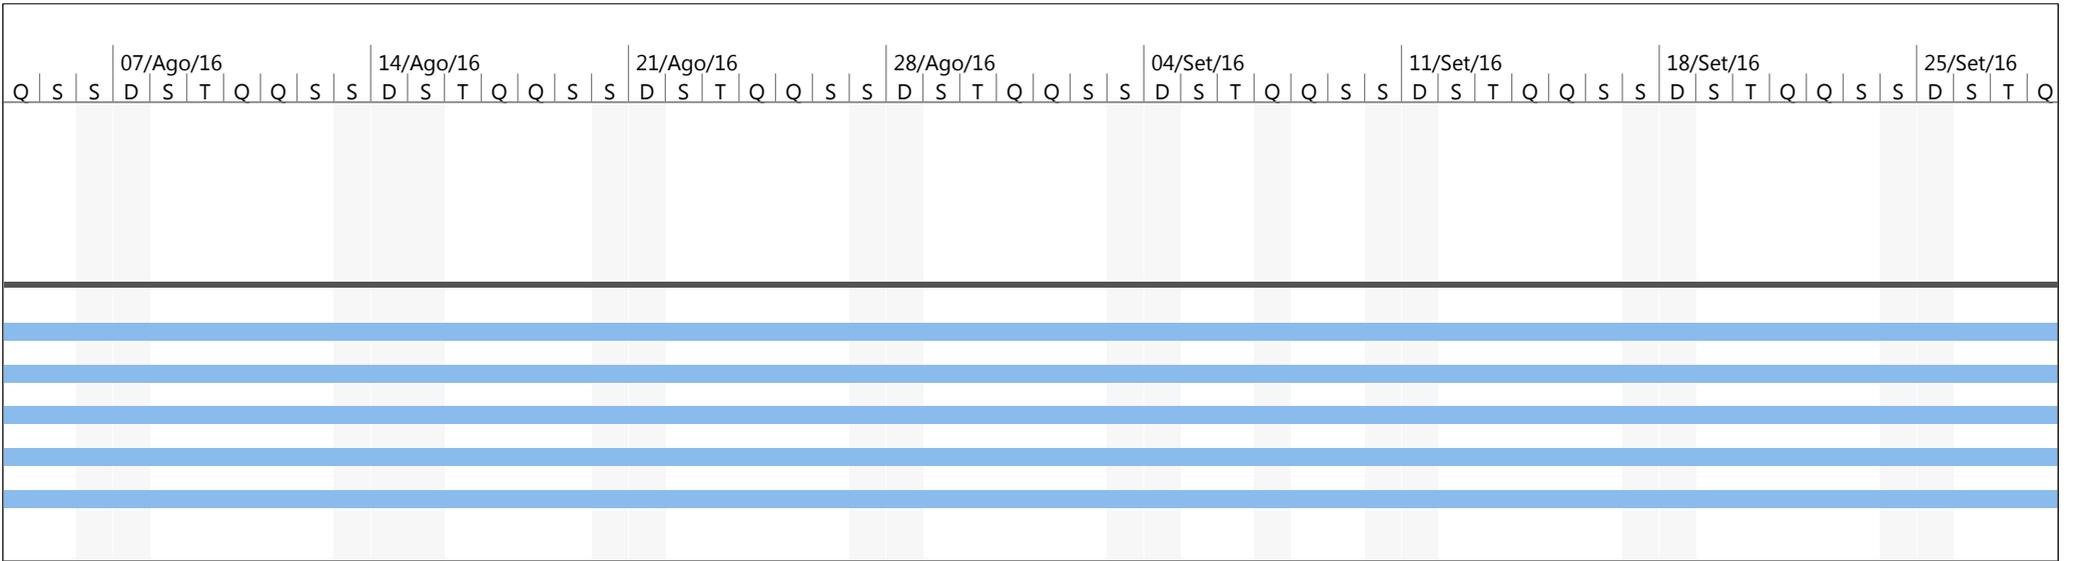


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Q Q S S 02/Out/16 D S T Q Q S S 09/Out/16 D S T Q Q S S 16/Out/16 D S T Q Q S S 23/Out/16 D S T Q Q S S 30/Out/16 D S T Q Q S S 06/Nov/16 D S T Q Q S S 13/Nov/16 D S T Q Q S S 20/Nov/16


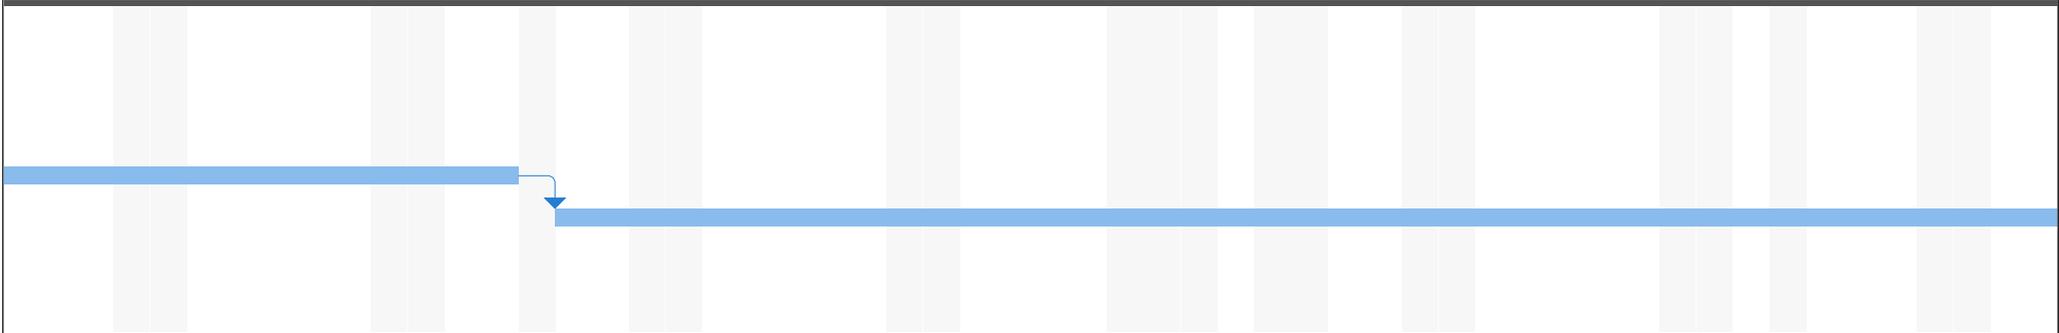


Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

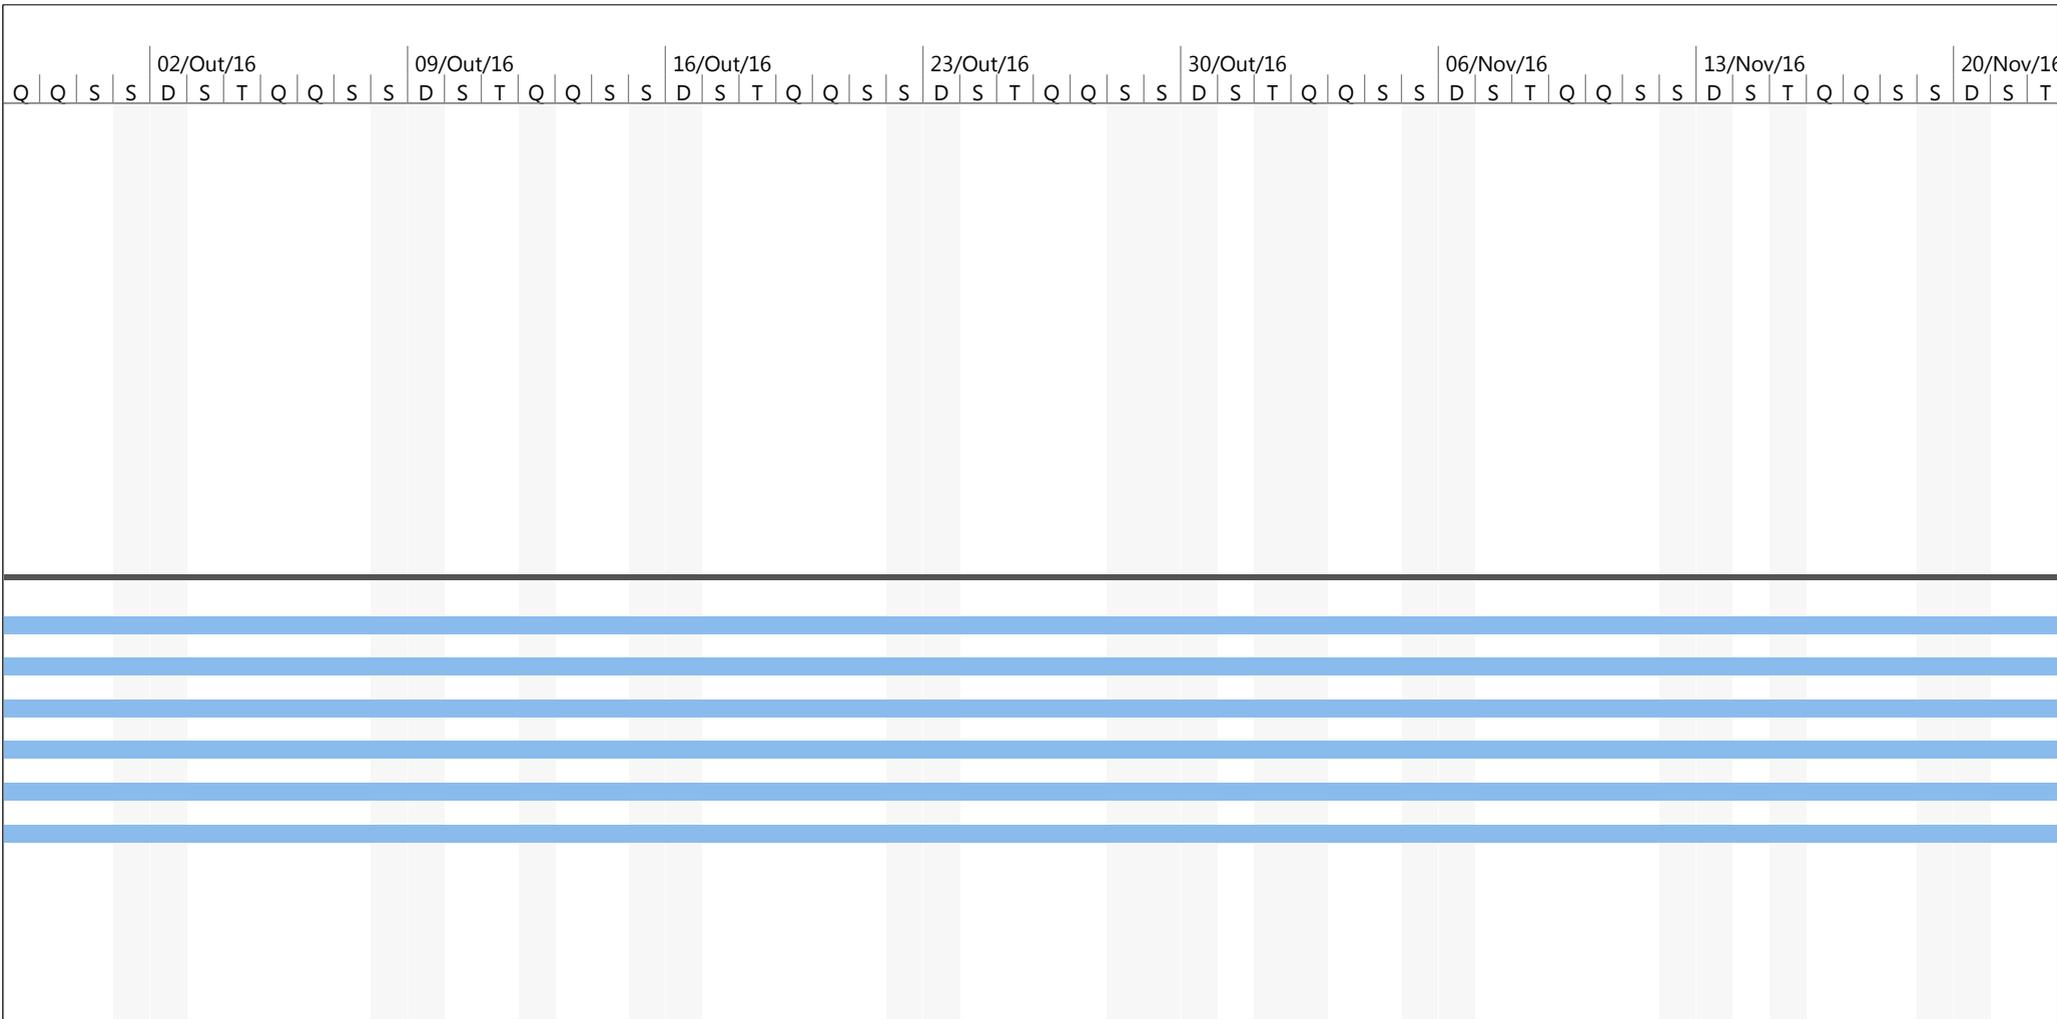

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

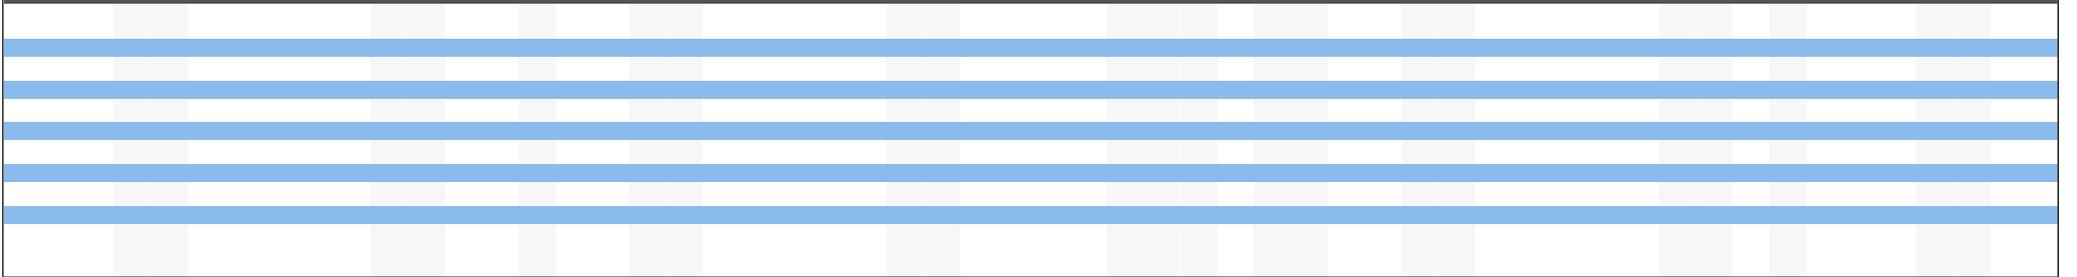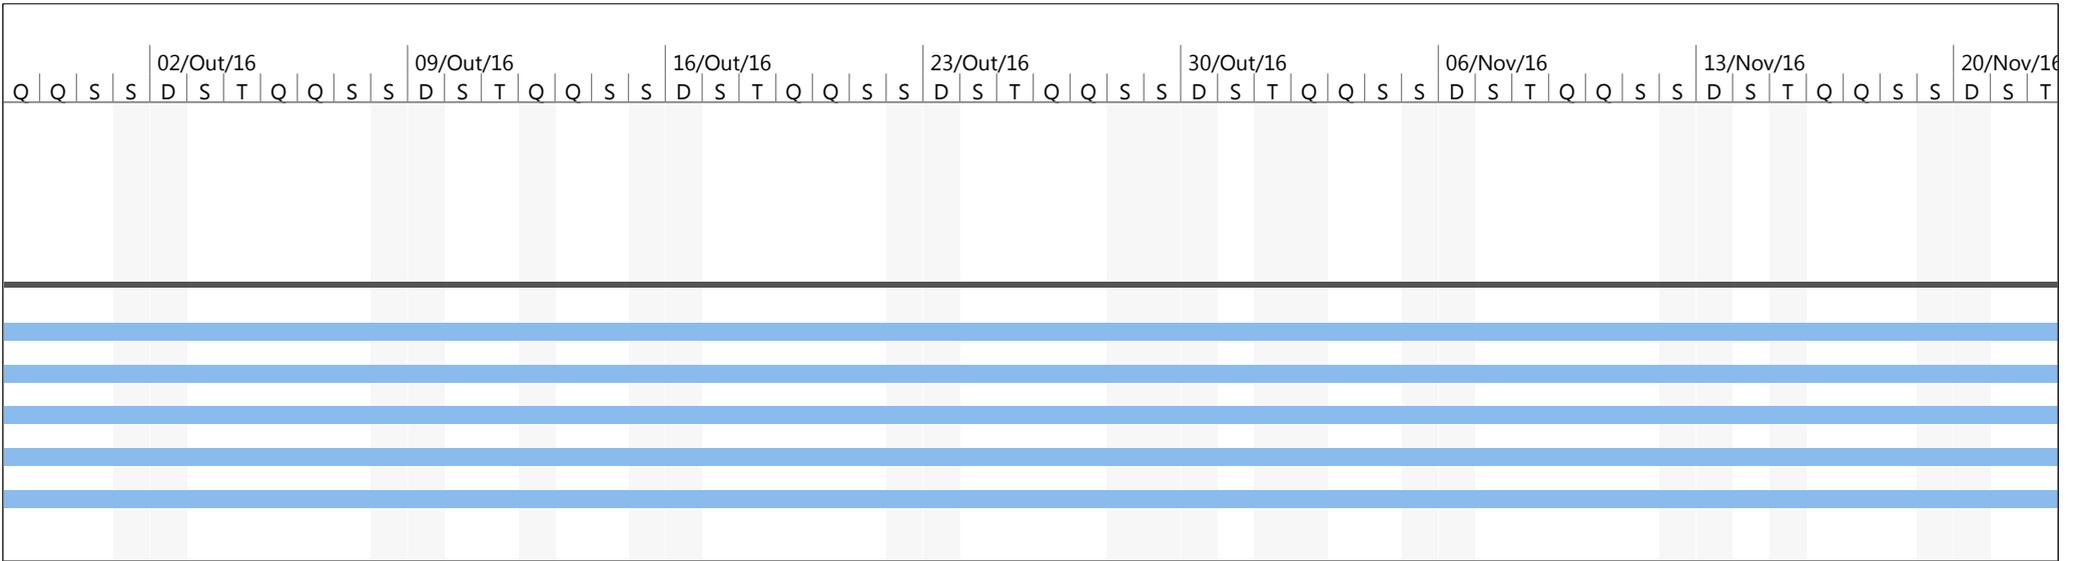

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

/16 | 27/Nov/16 | 04/Dez/16 | 11/Dez/16 | 18/Dez/16 | 25/Dez/16 | 01/Jan/17 | 08/Jan/17 | 15/Jan/17

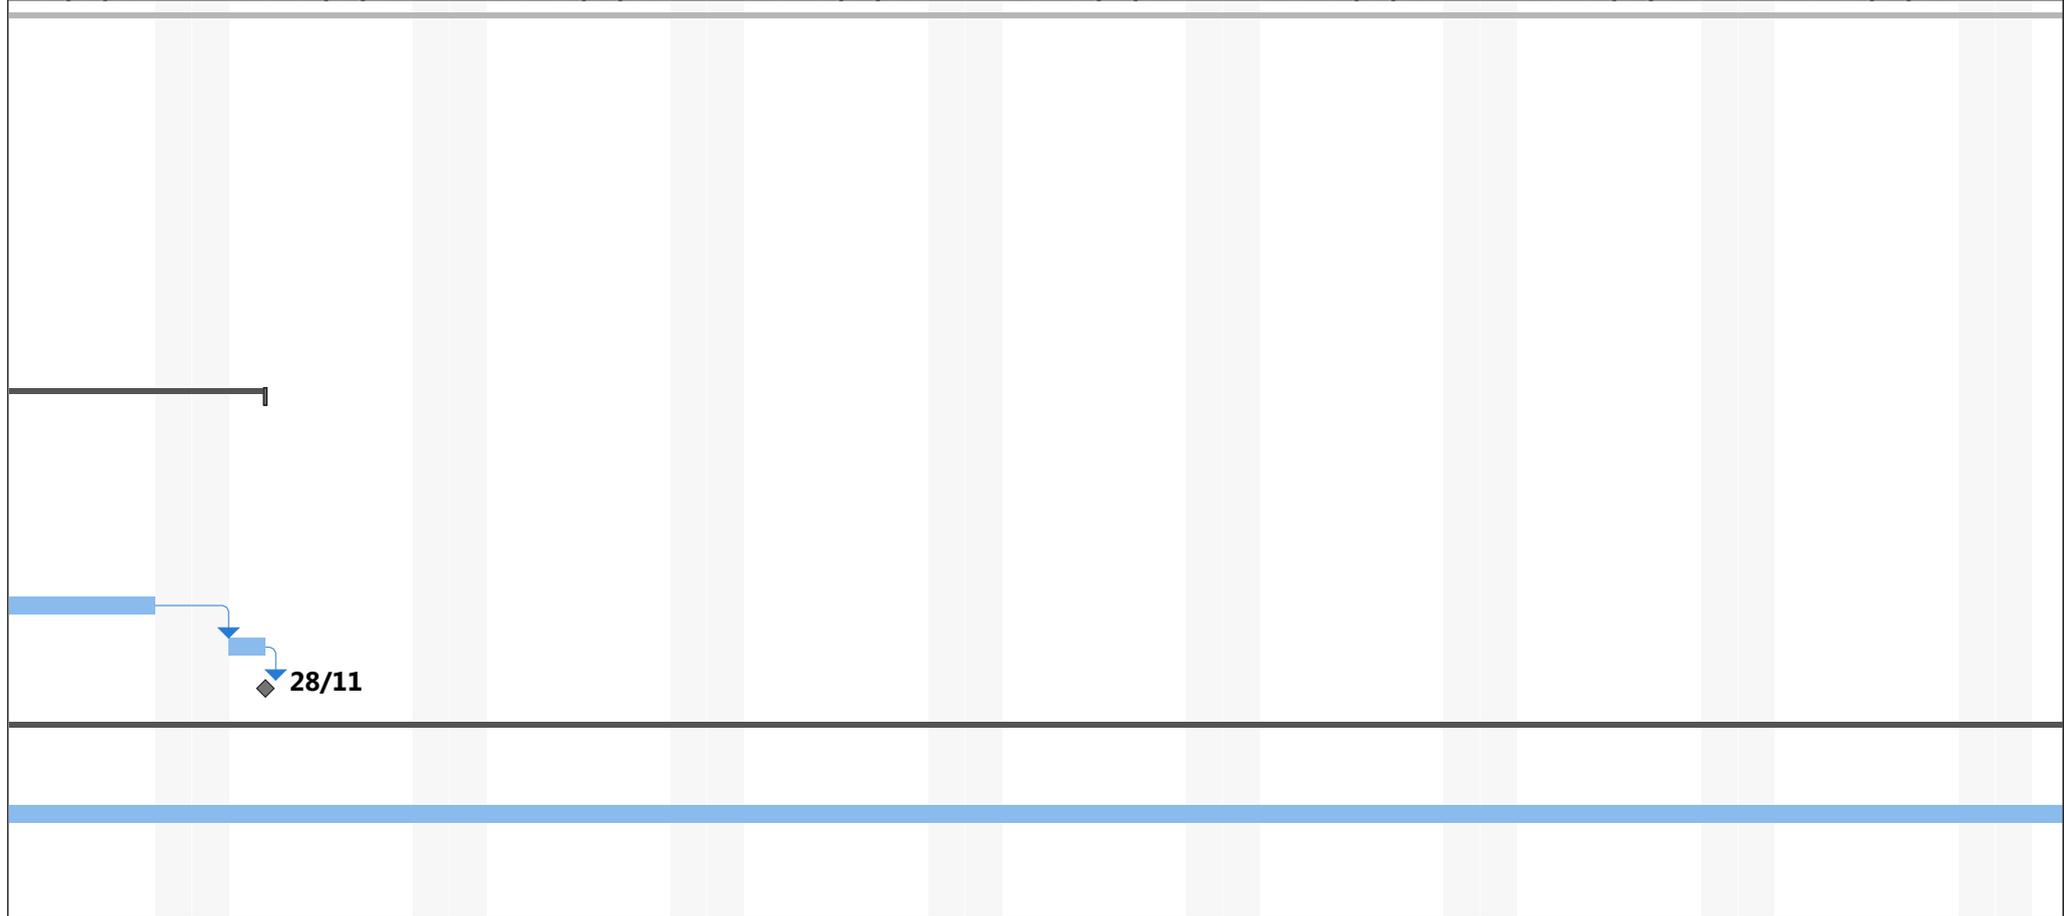


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

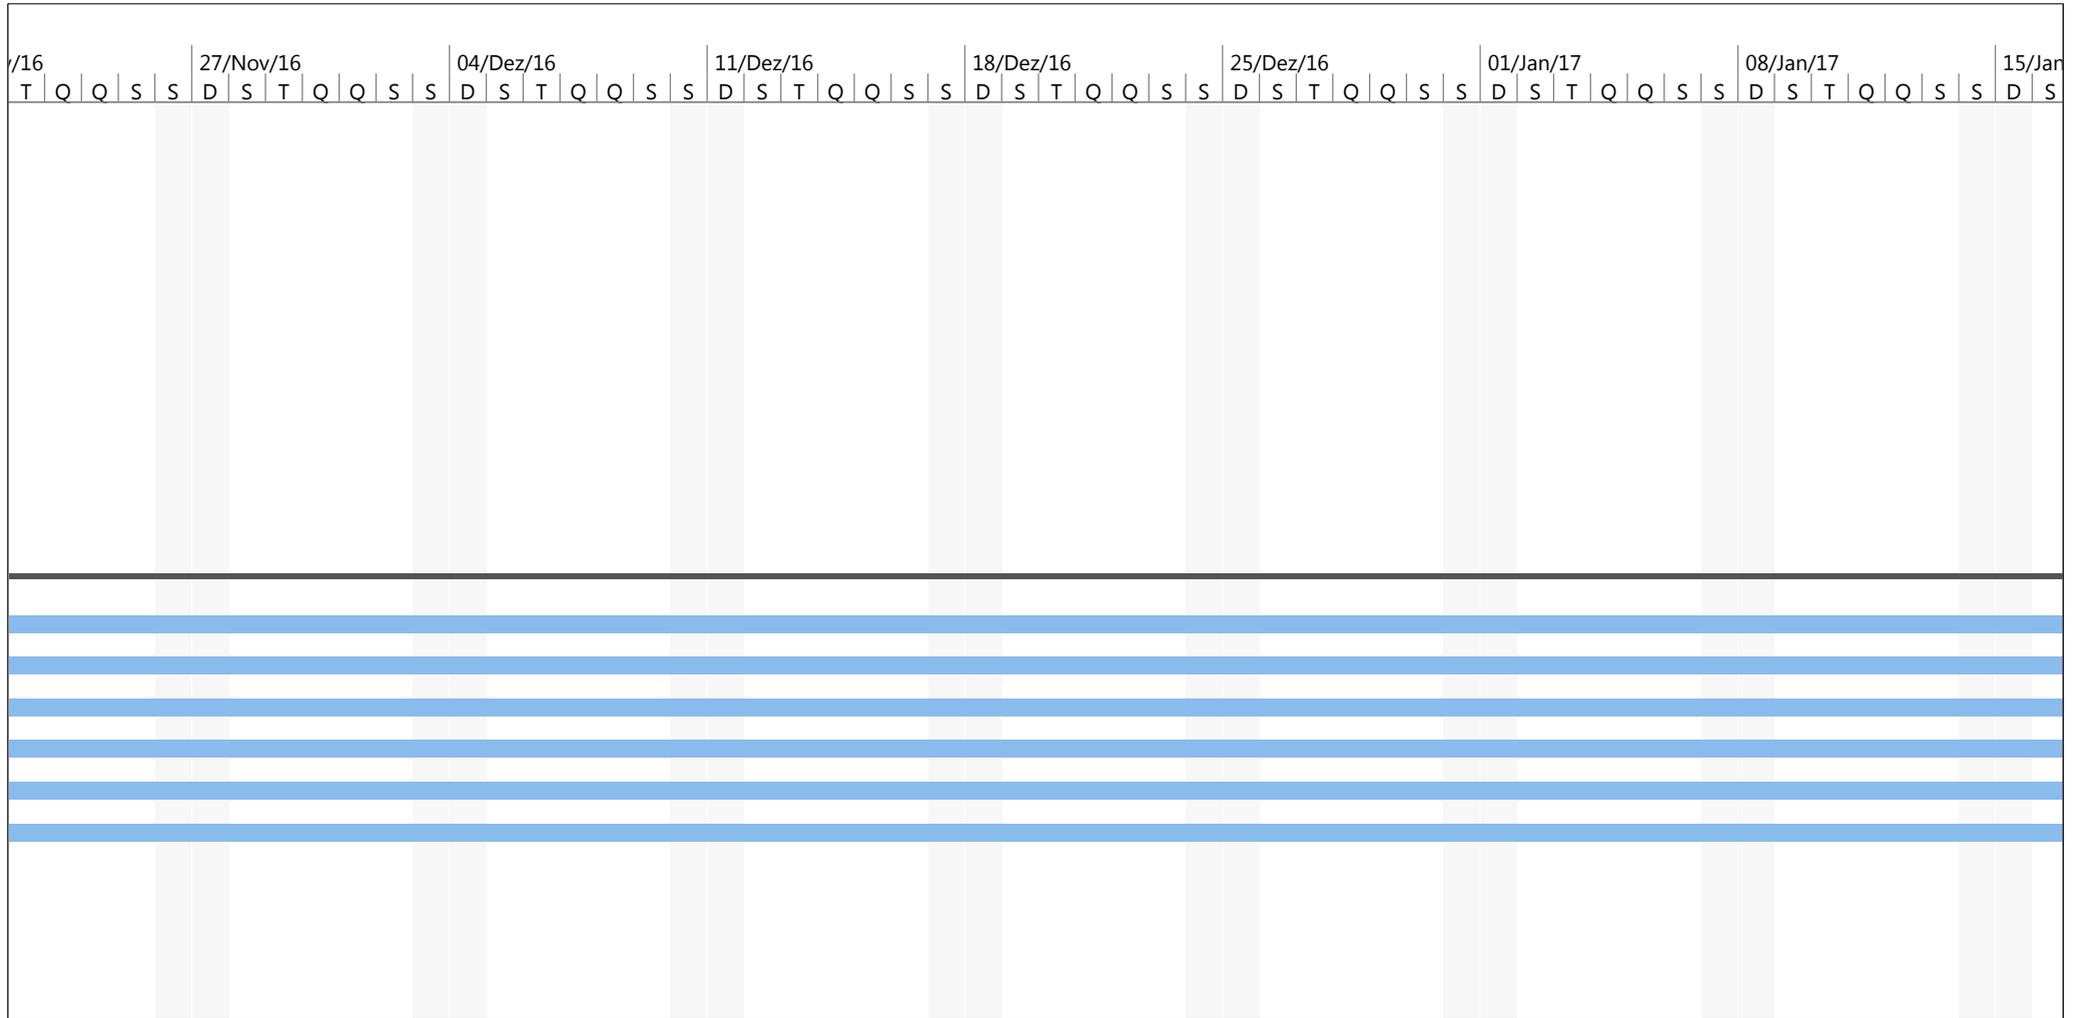

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

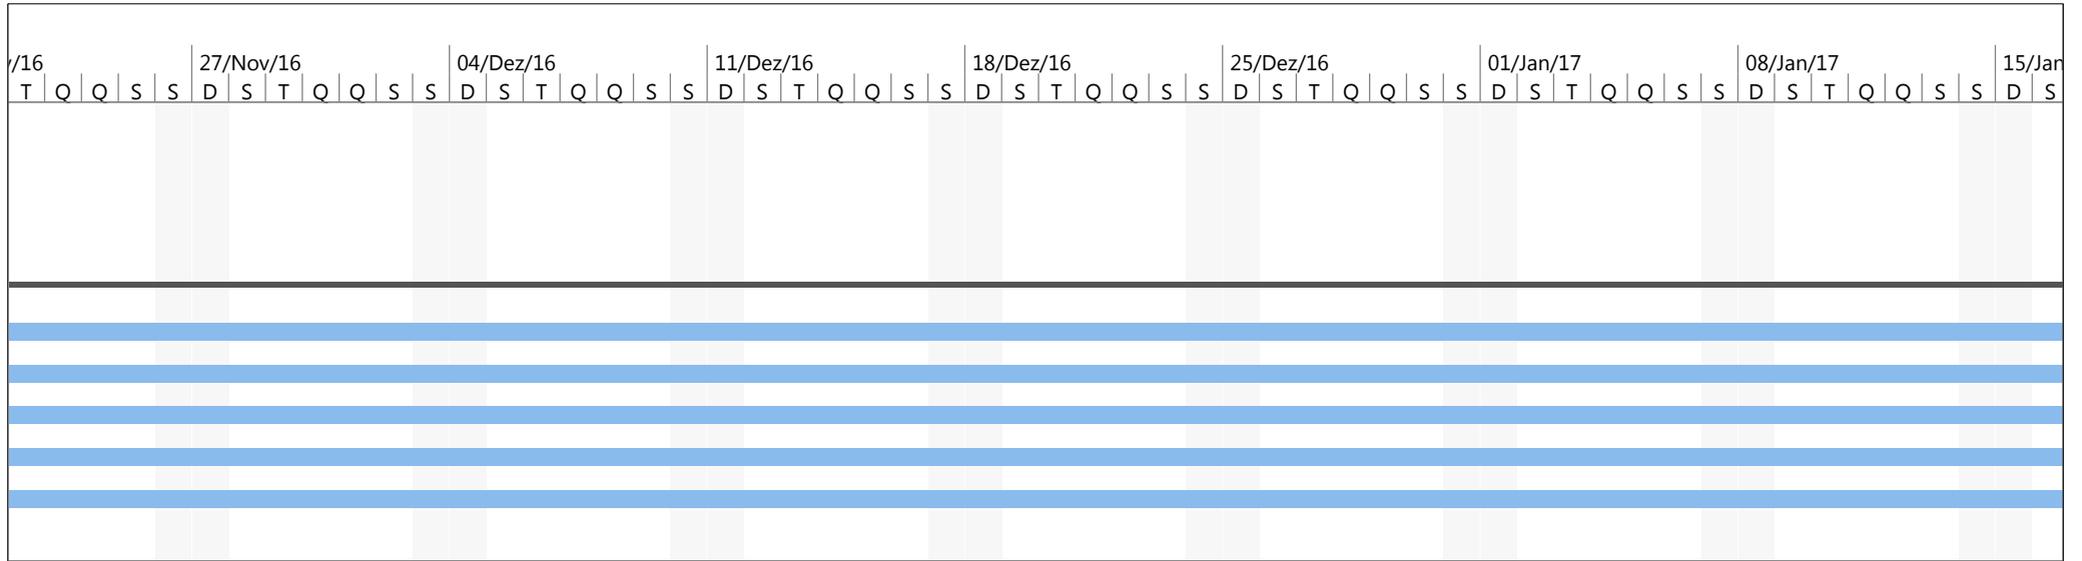


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Jan/17 22/Jan/17 29/Jan/17 05/Fev/17 12/Fev/17 19/Fev/17 26/Fev/17 05/Mar/17 12

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

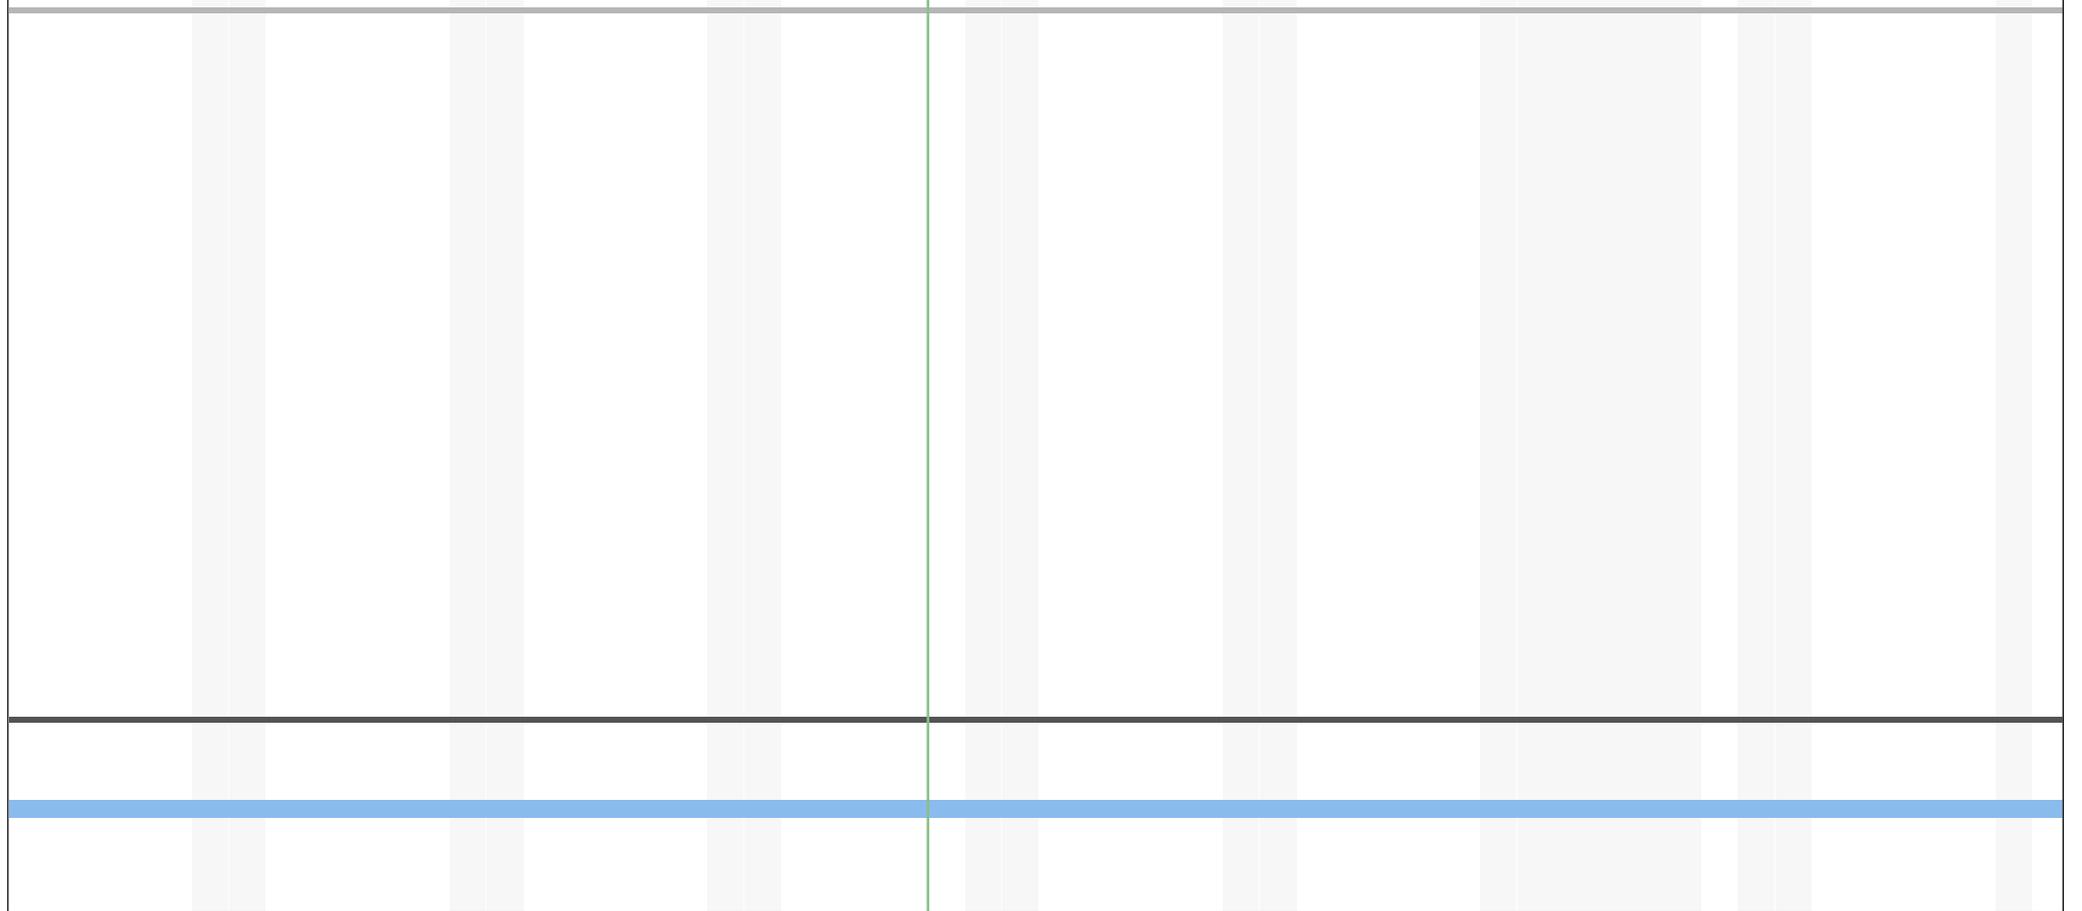


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

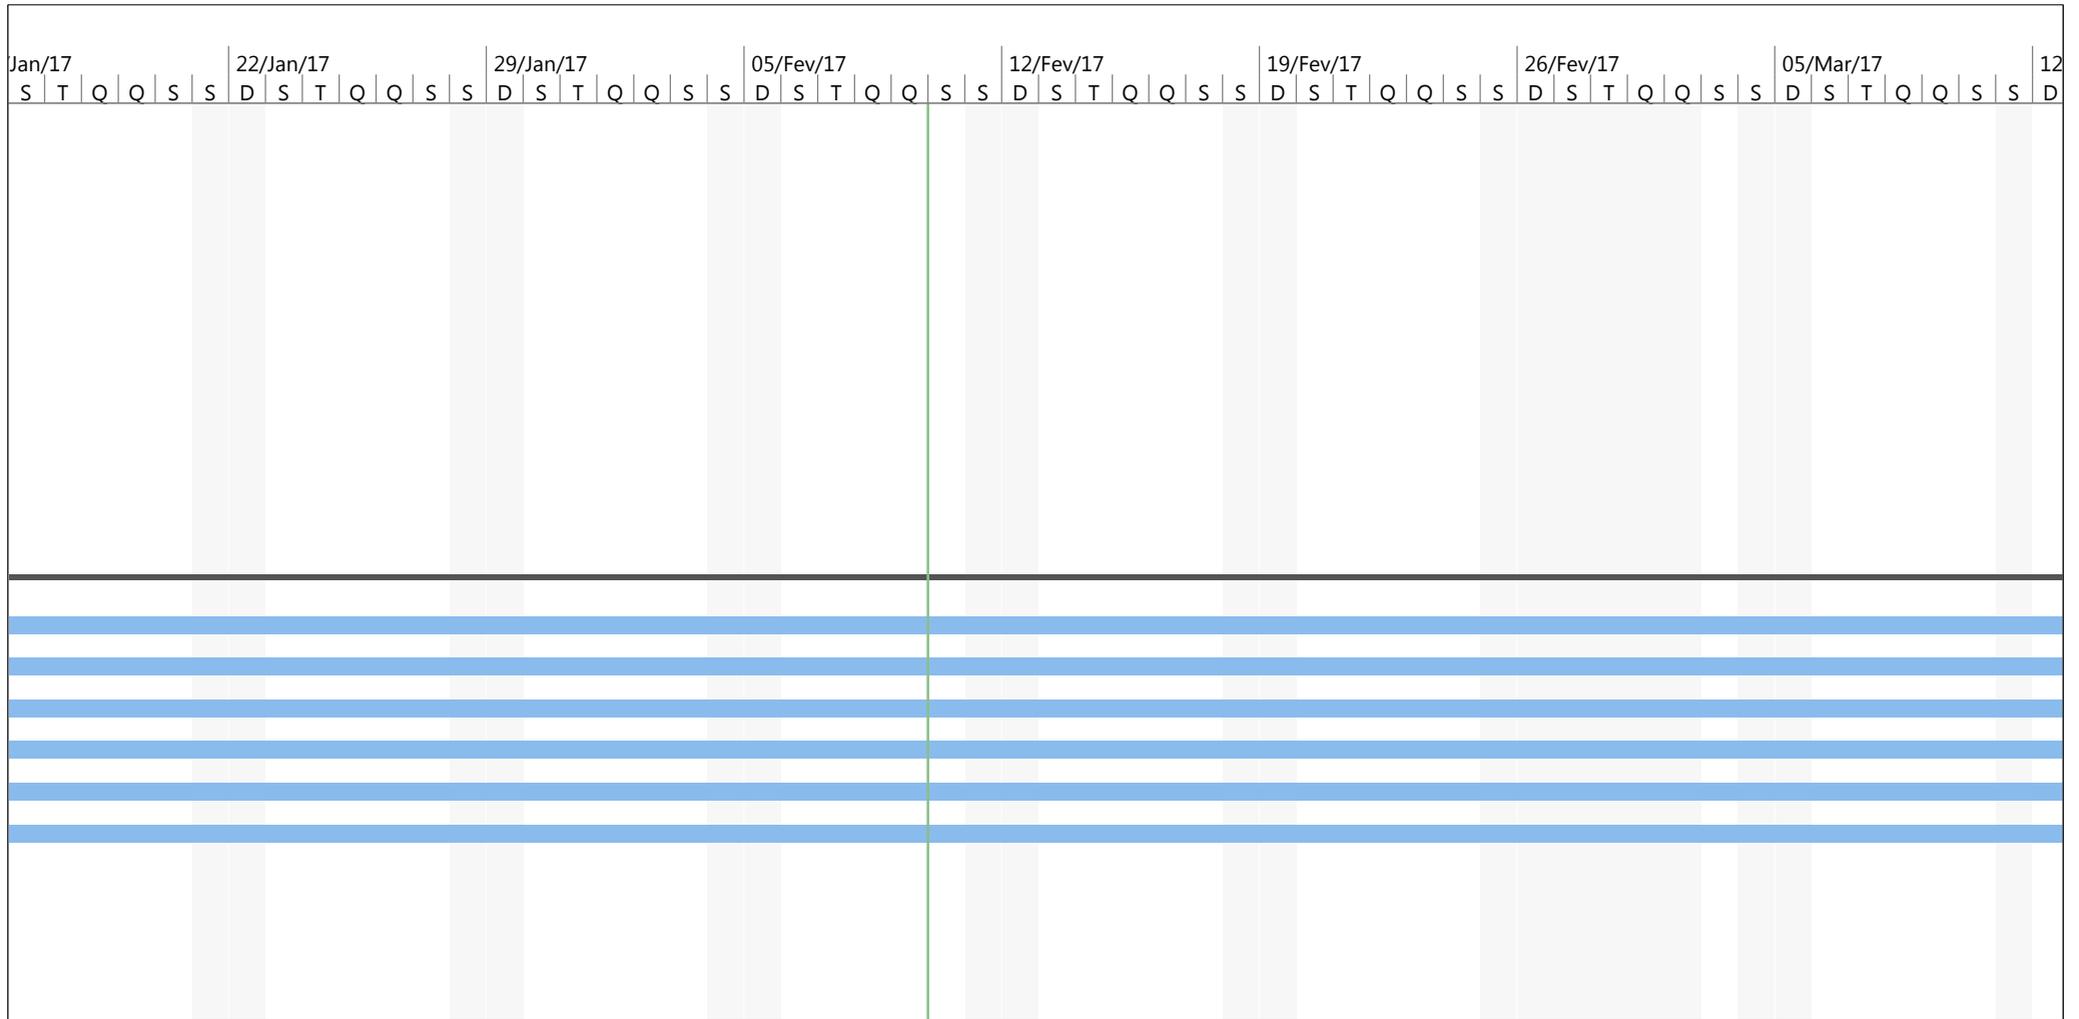


Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

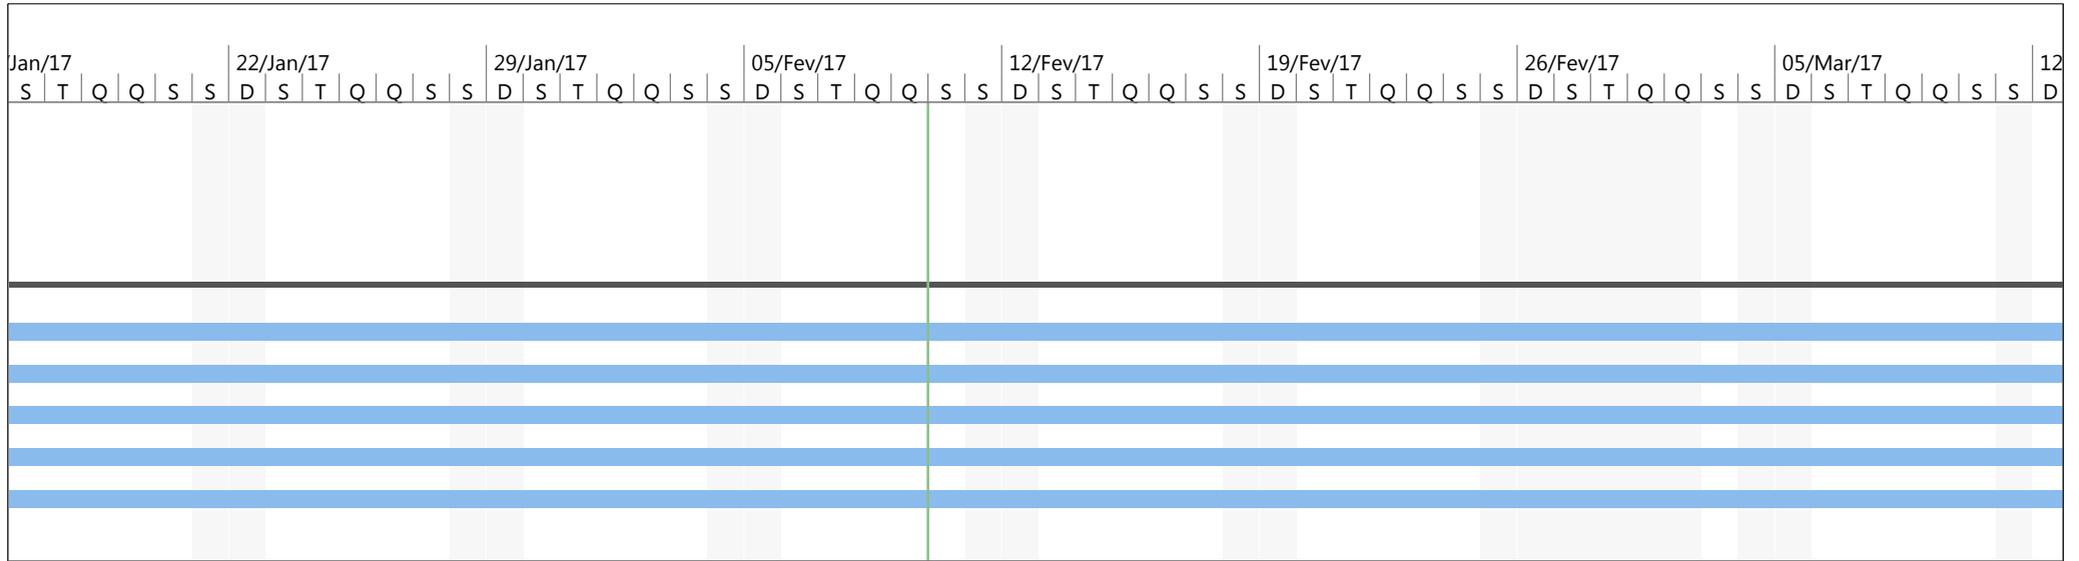

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

12/Mar/17 19/Mar/17 26/Mar/17 02/Abr/17 09/Abr/17 16/Abr/17 23/Abr/17 30/Abr/17  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

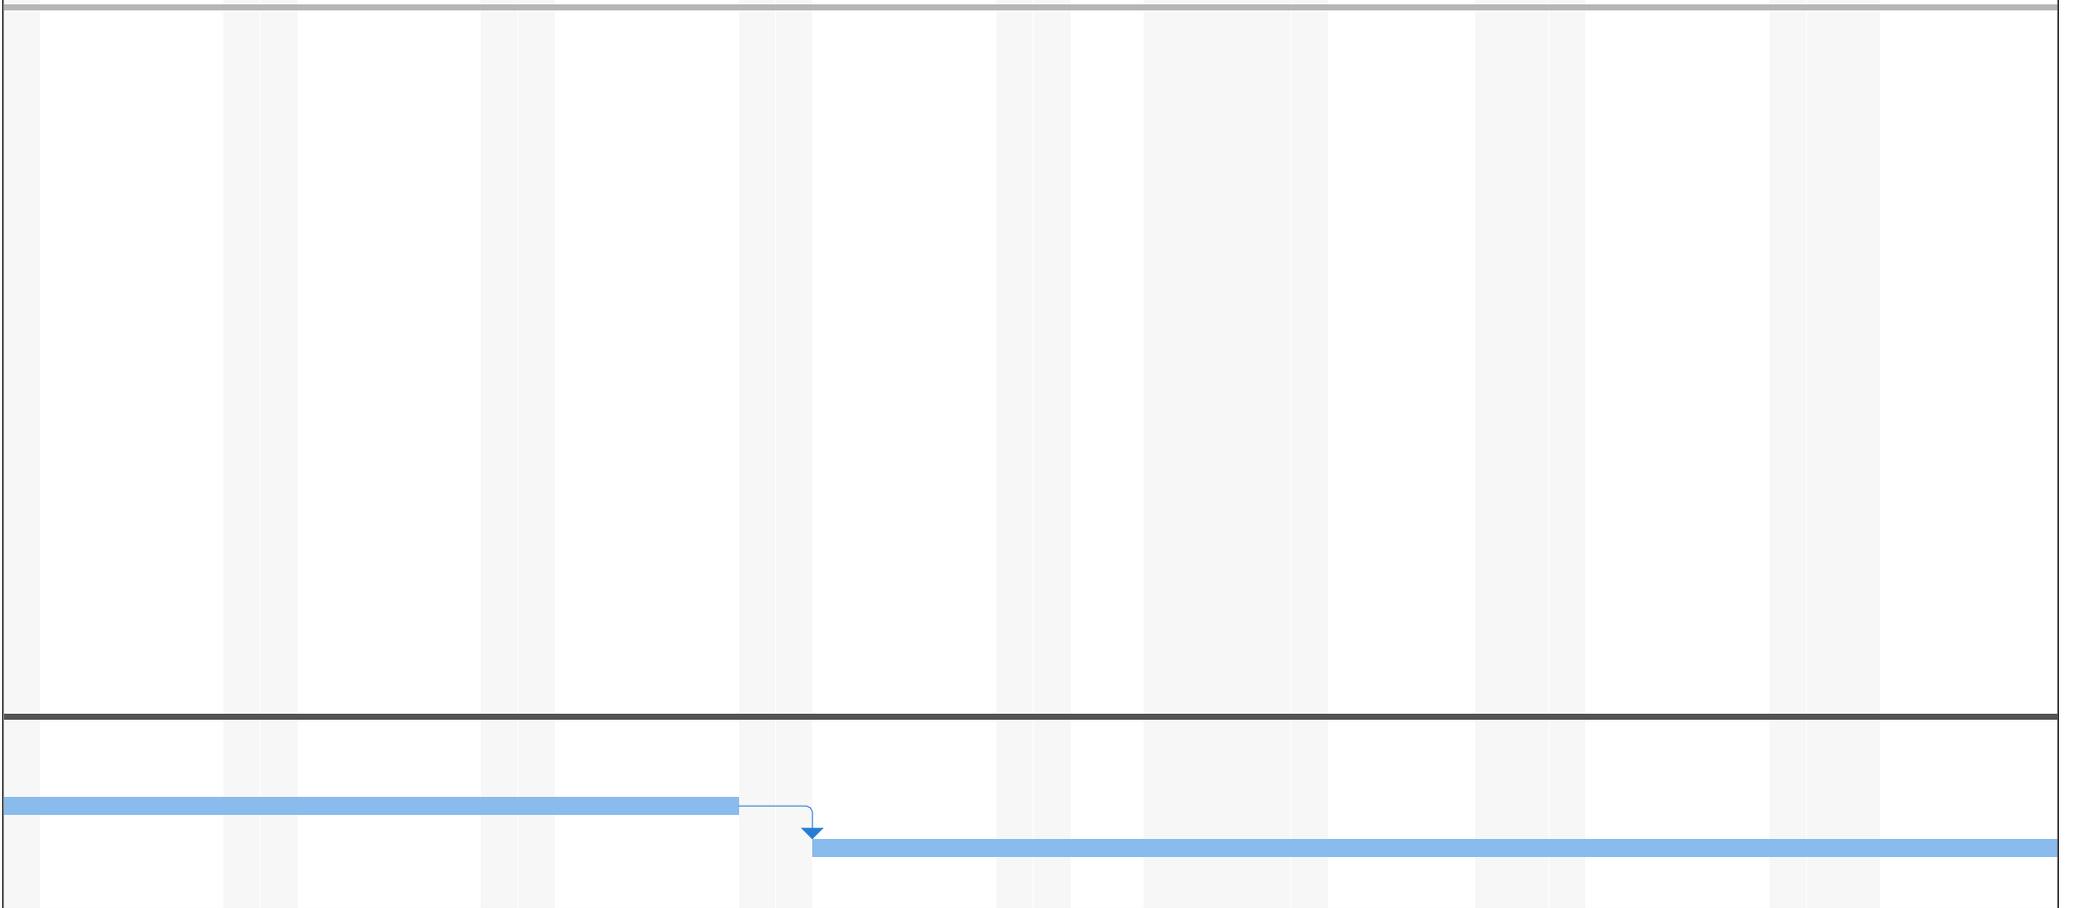

Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				


12/Mar/17 19/Mar/17 26/Mar/17 02/Abr/17 09/Abr/17 16/Abr/17 23/Abr/17 30/Abr/17  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S



Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


12/Mar/17 19/Mar/17 26/Mar/17 02/Abr/17 09/Abr/17 16/Abr/17 23/Abr/17 30/Abr/17  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S



Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

07/Maio/17 14/Maio/17 21/Maio/17 28/Maio/17 04/Jun/17 11/Jun/17 18/Jun/17 25/Jun/17  
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

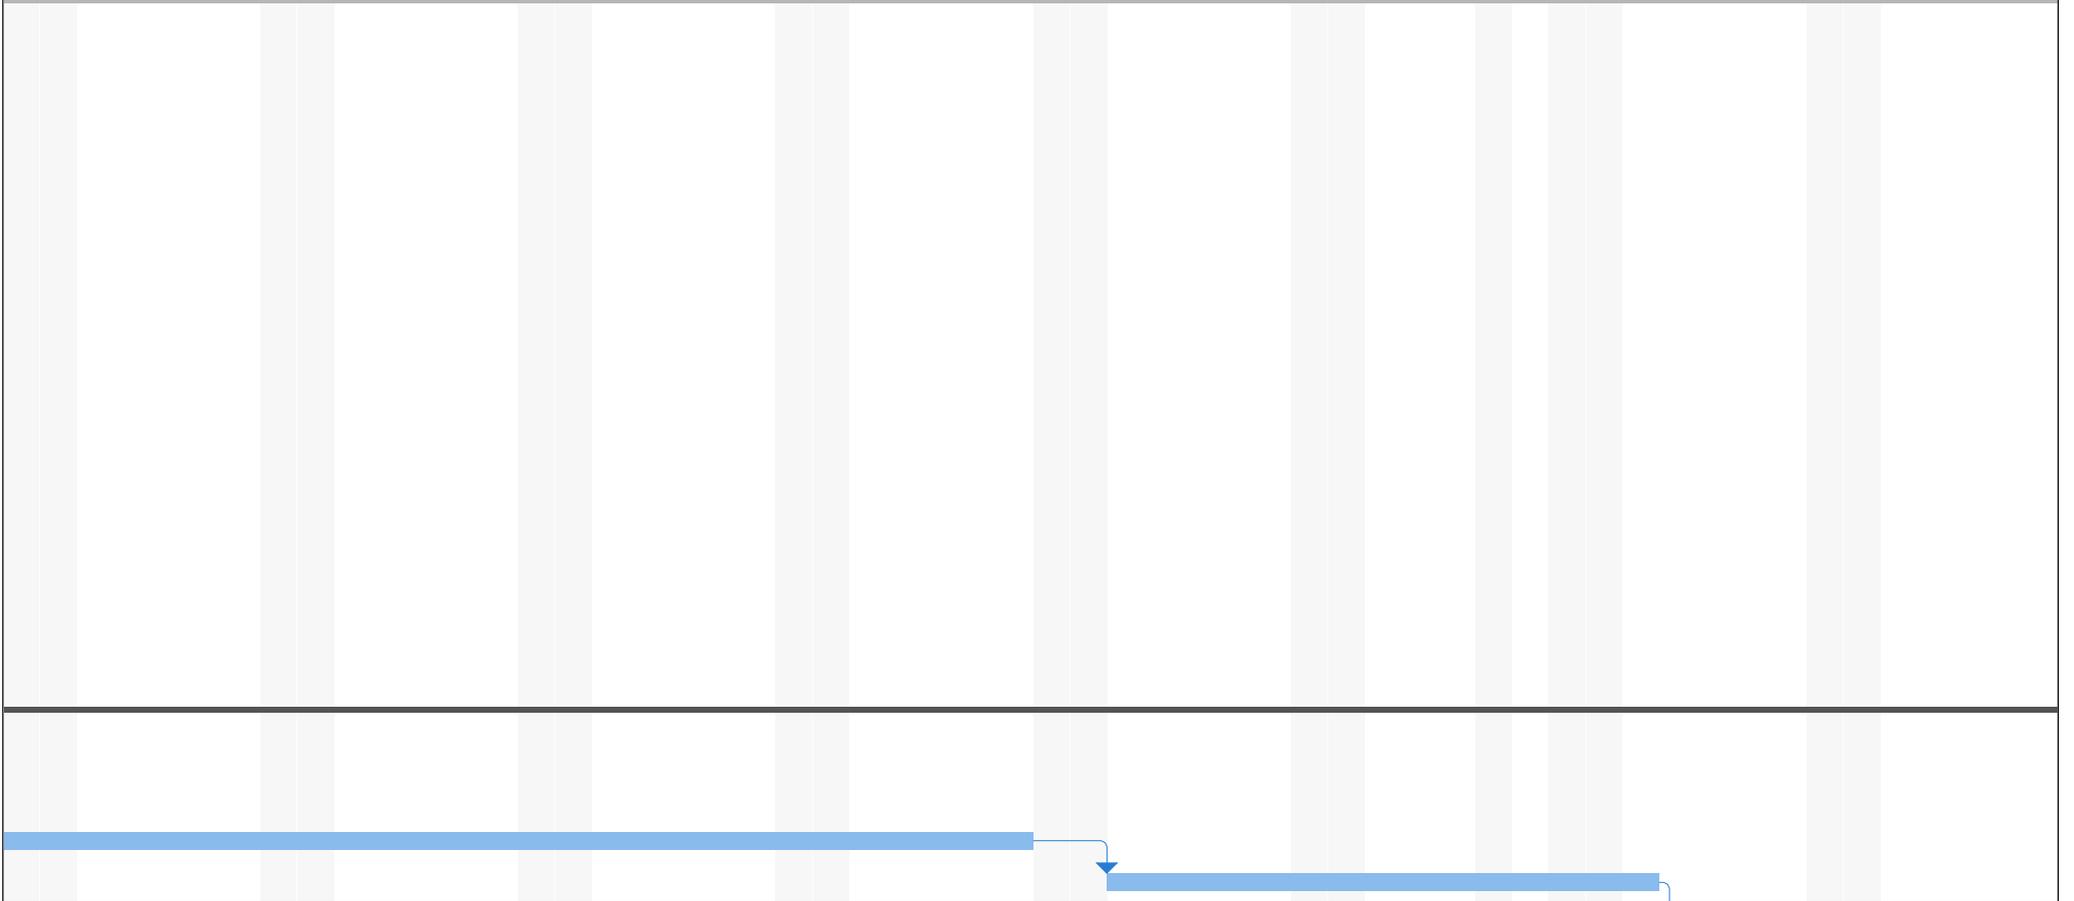


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

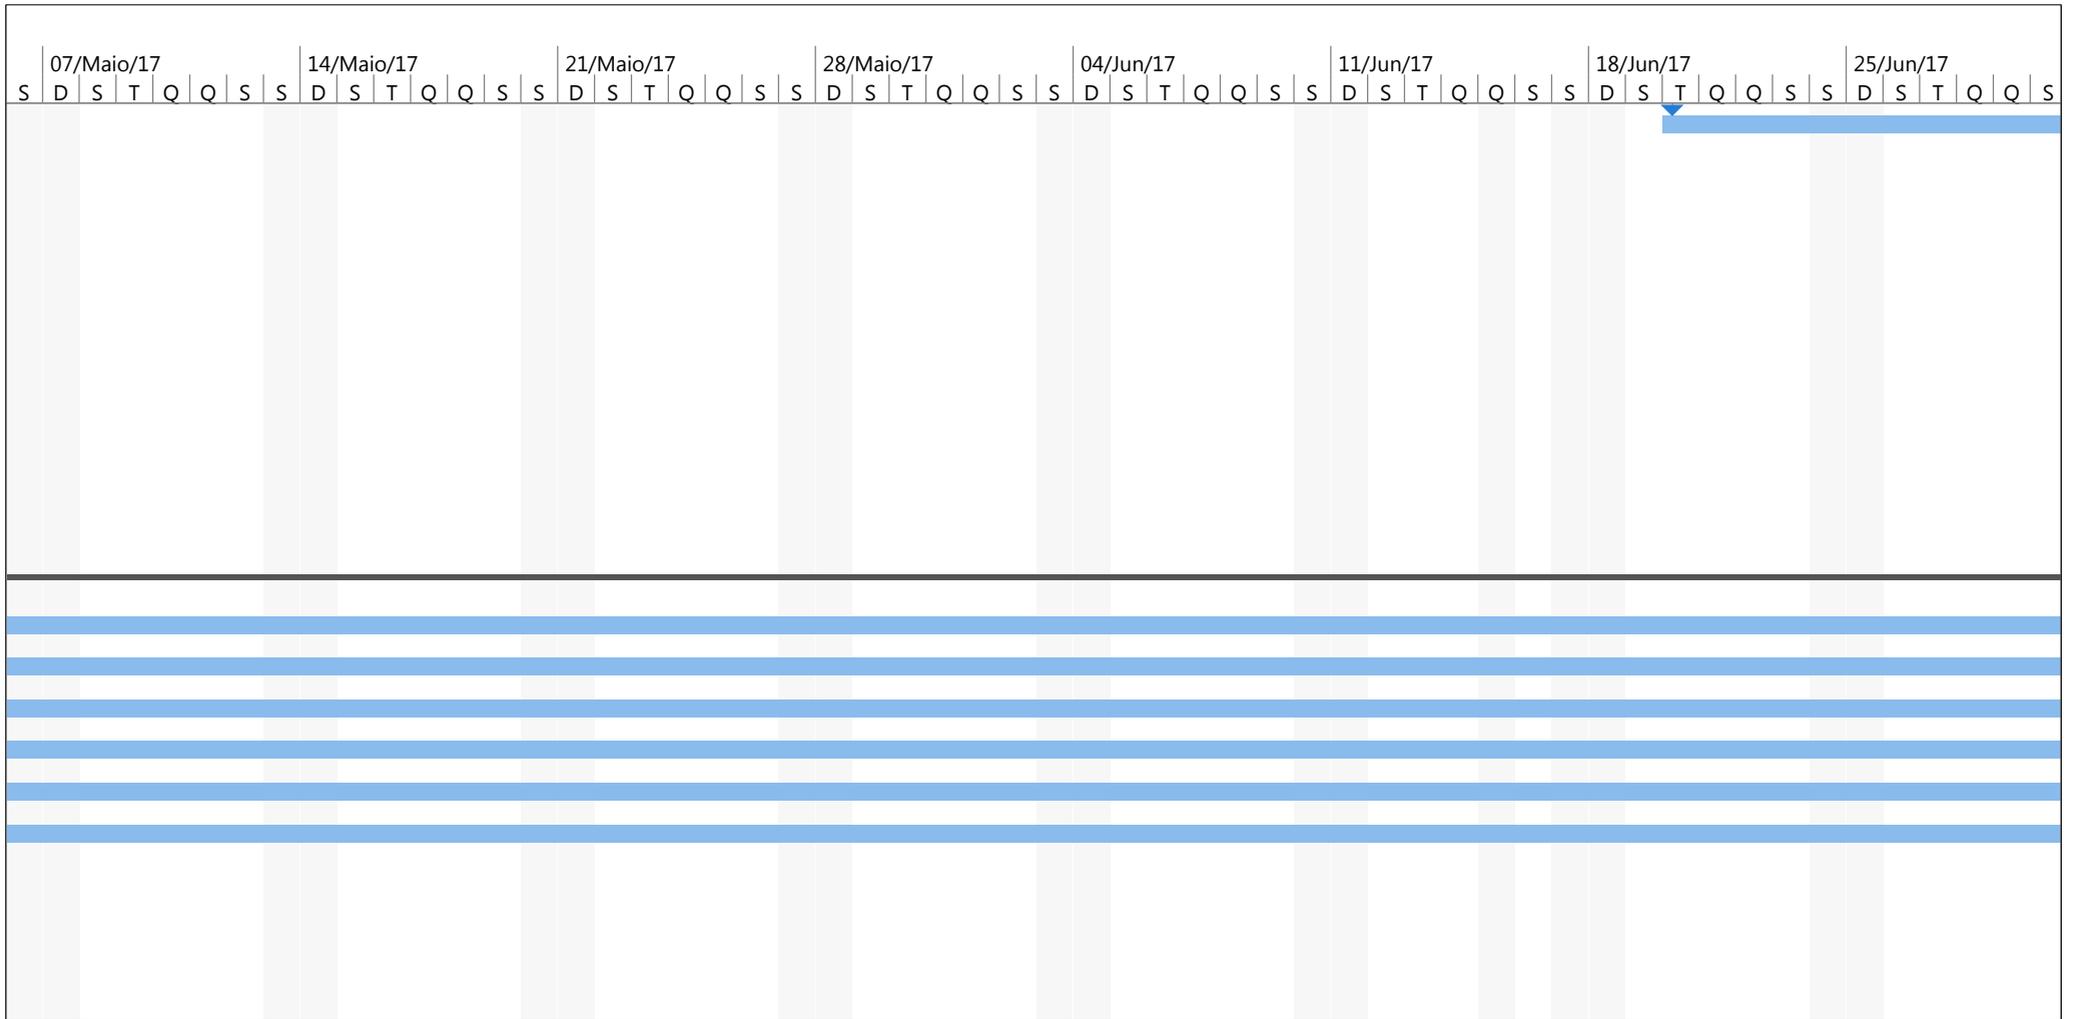


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

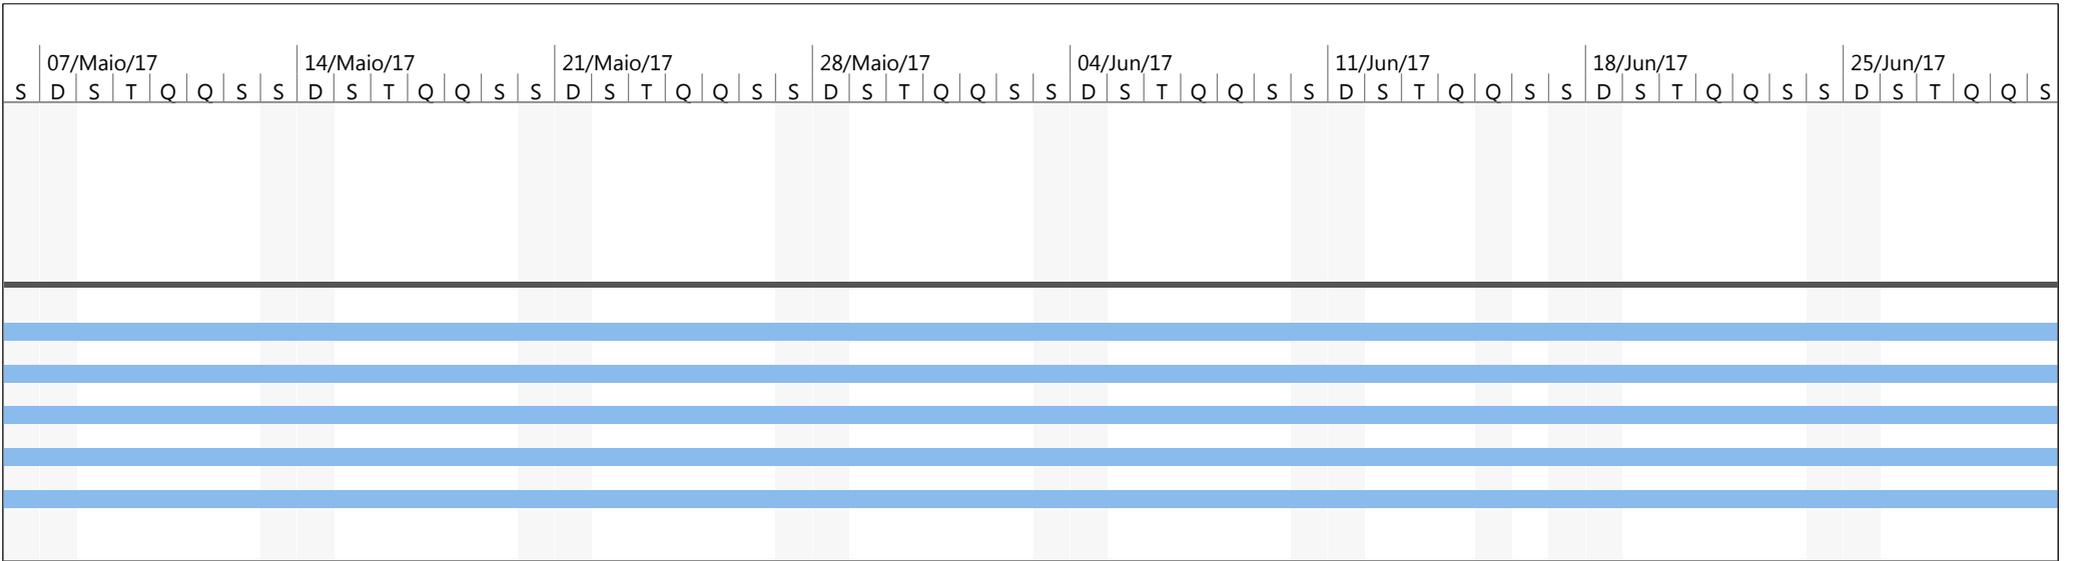


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

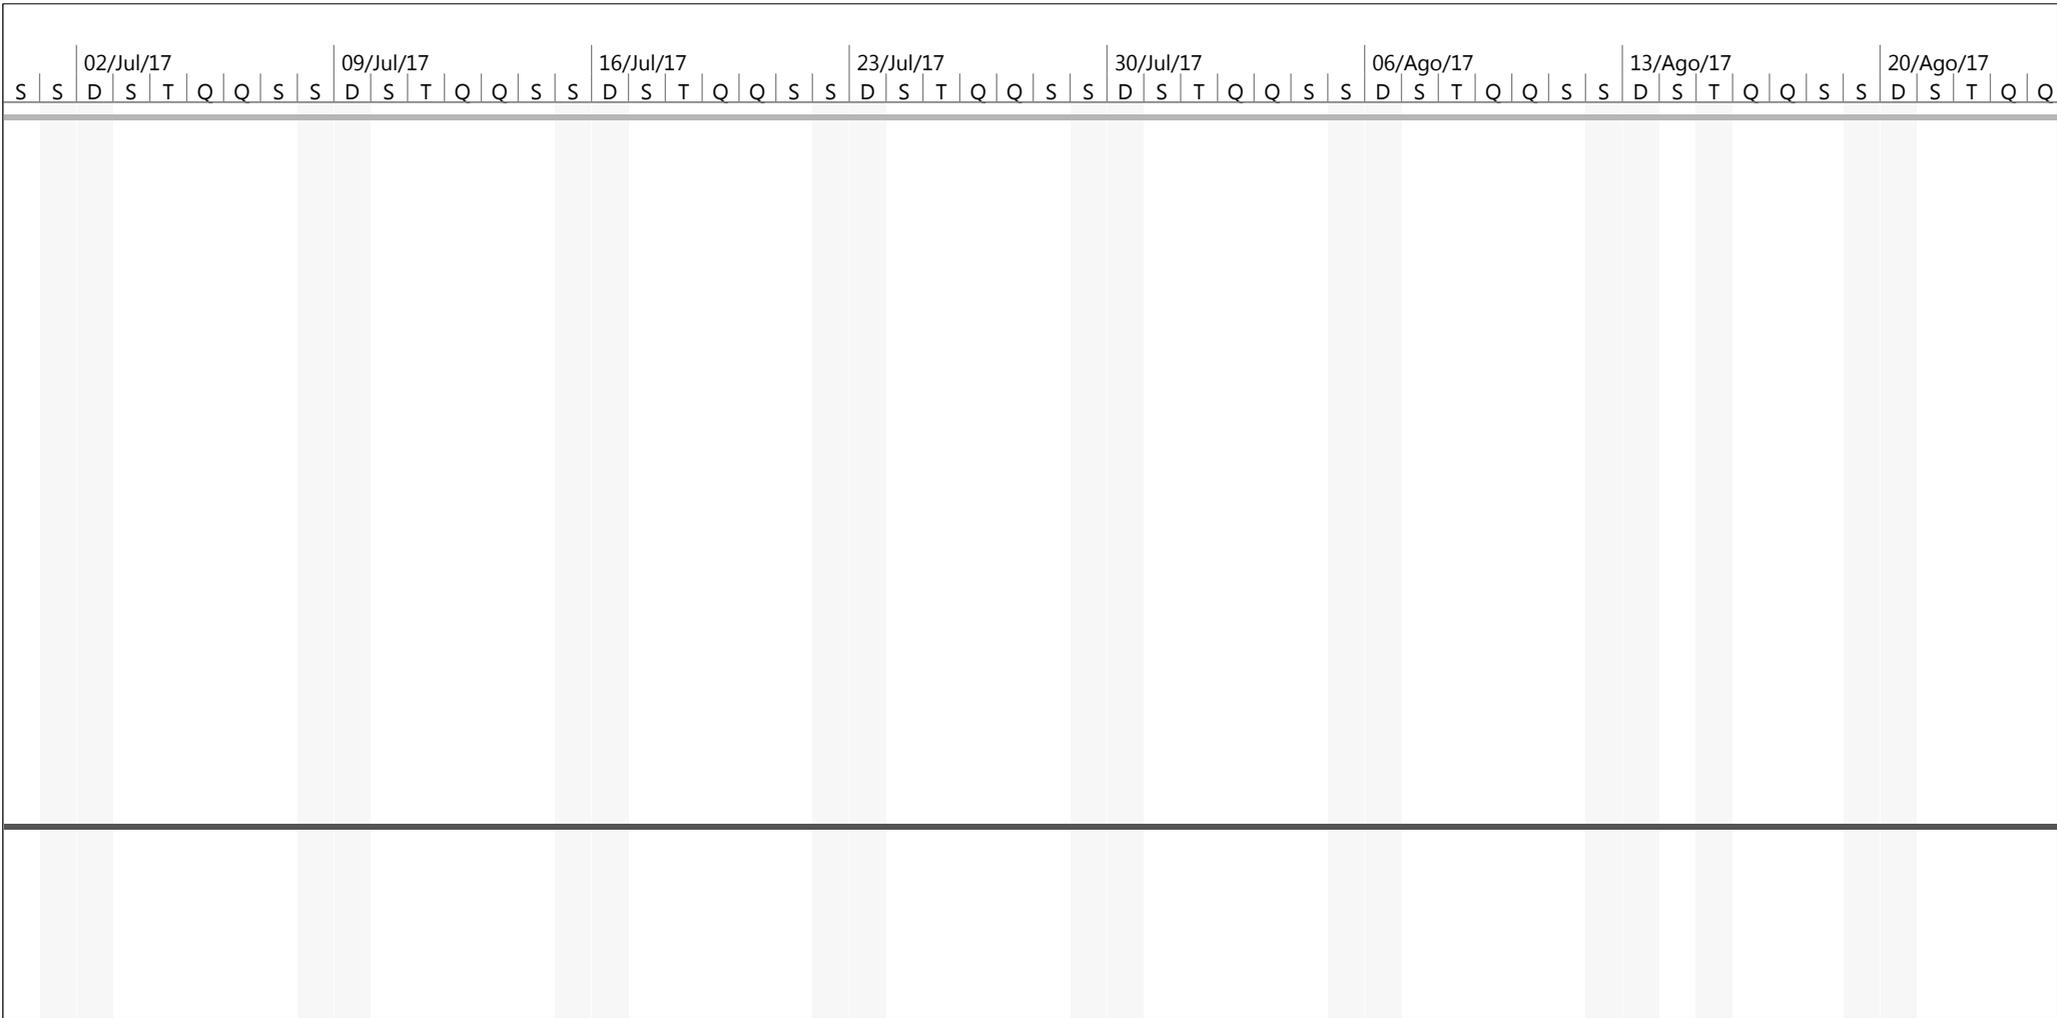


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

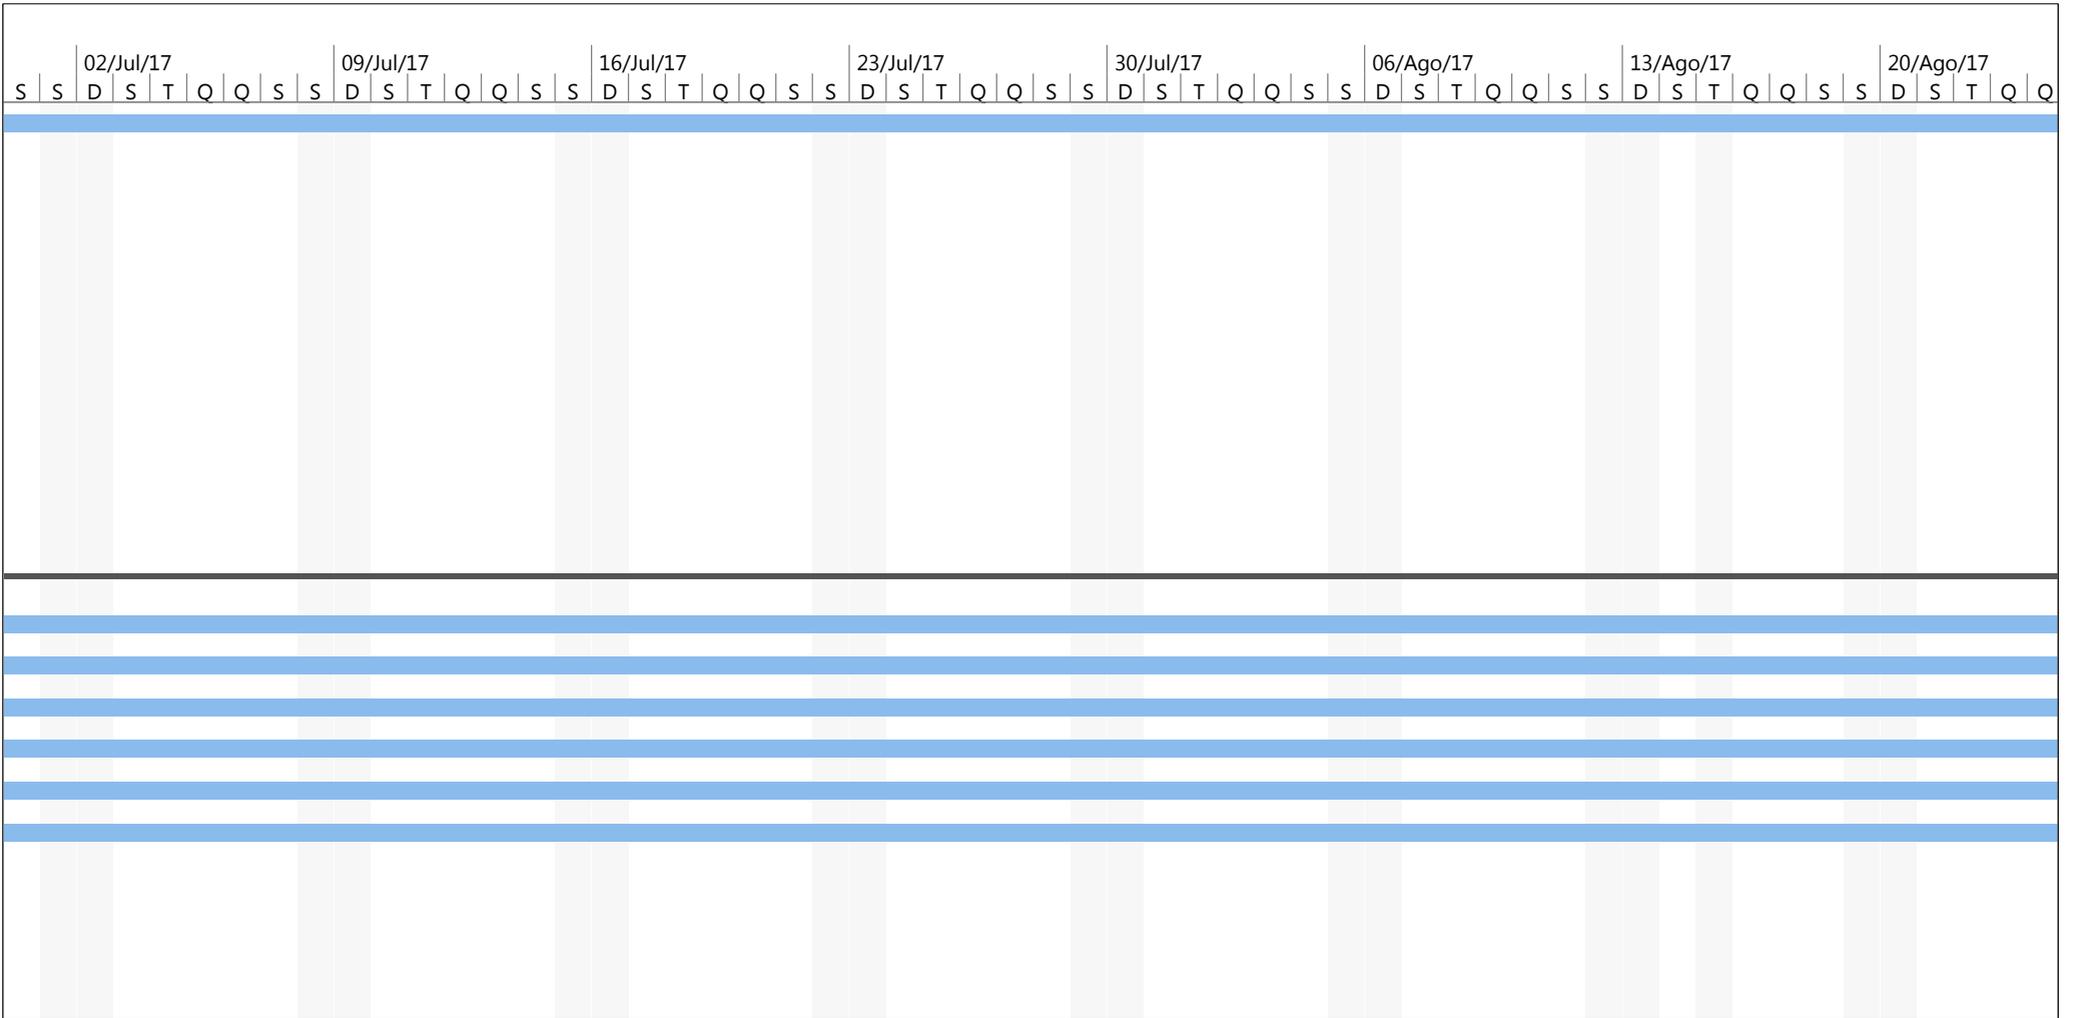

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

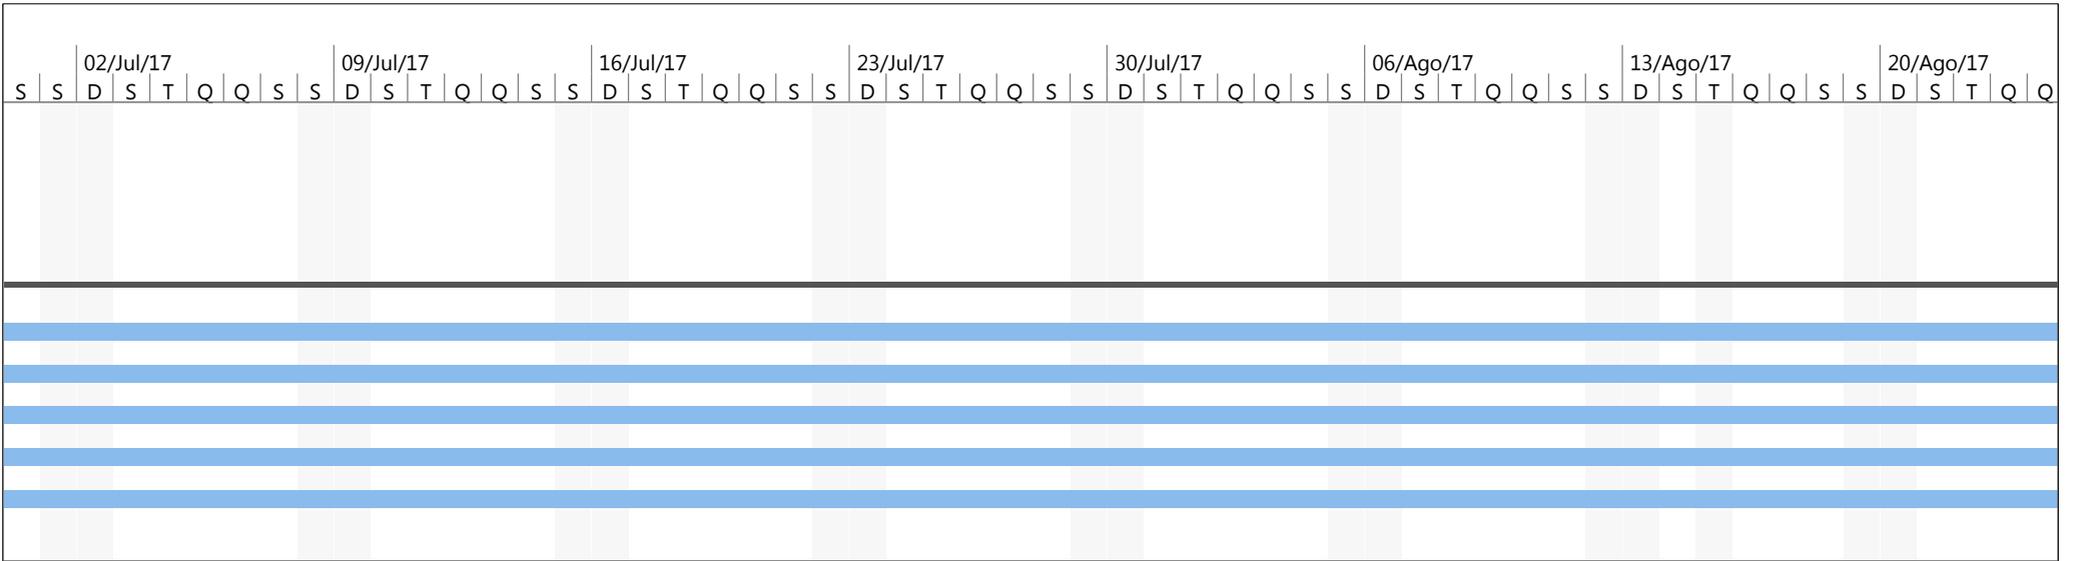

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Q S S 27/Ago/17 D S T Q Q S S 03/Set/17 D S T Q Q S S 10/Set/17 D S T Q Q S S 17/Set/17 D S T Q Q S S 24/Set/17 D S T Q Q S S 01/Out/17 D S T Q Q S S 08/Out/17 D S T Q Q S S 15/Out/17 Q

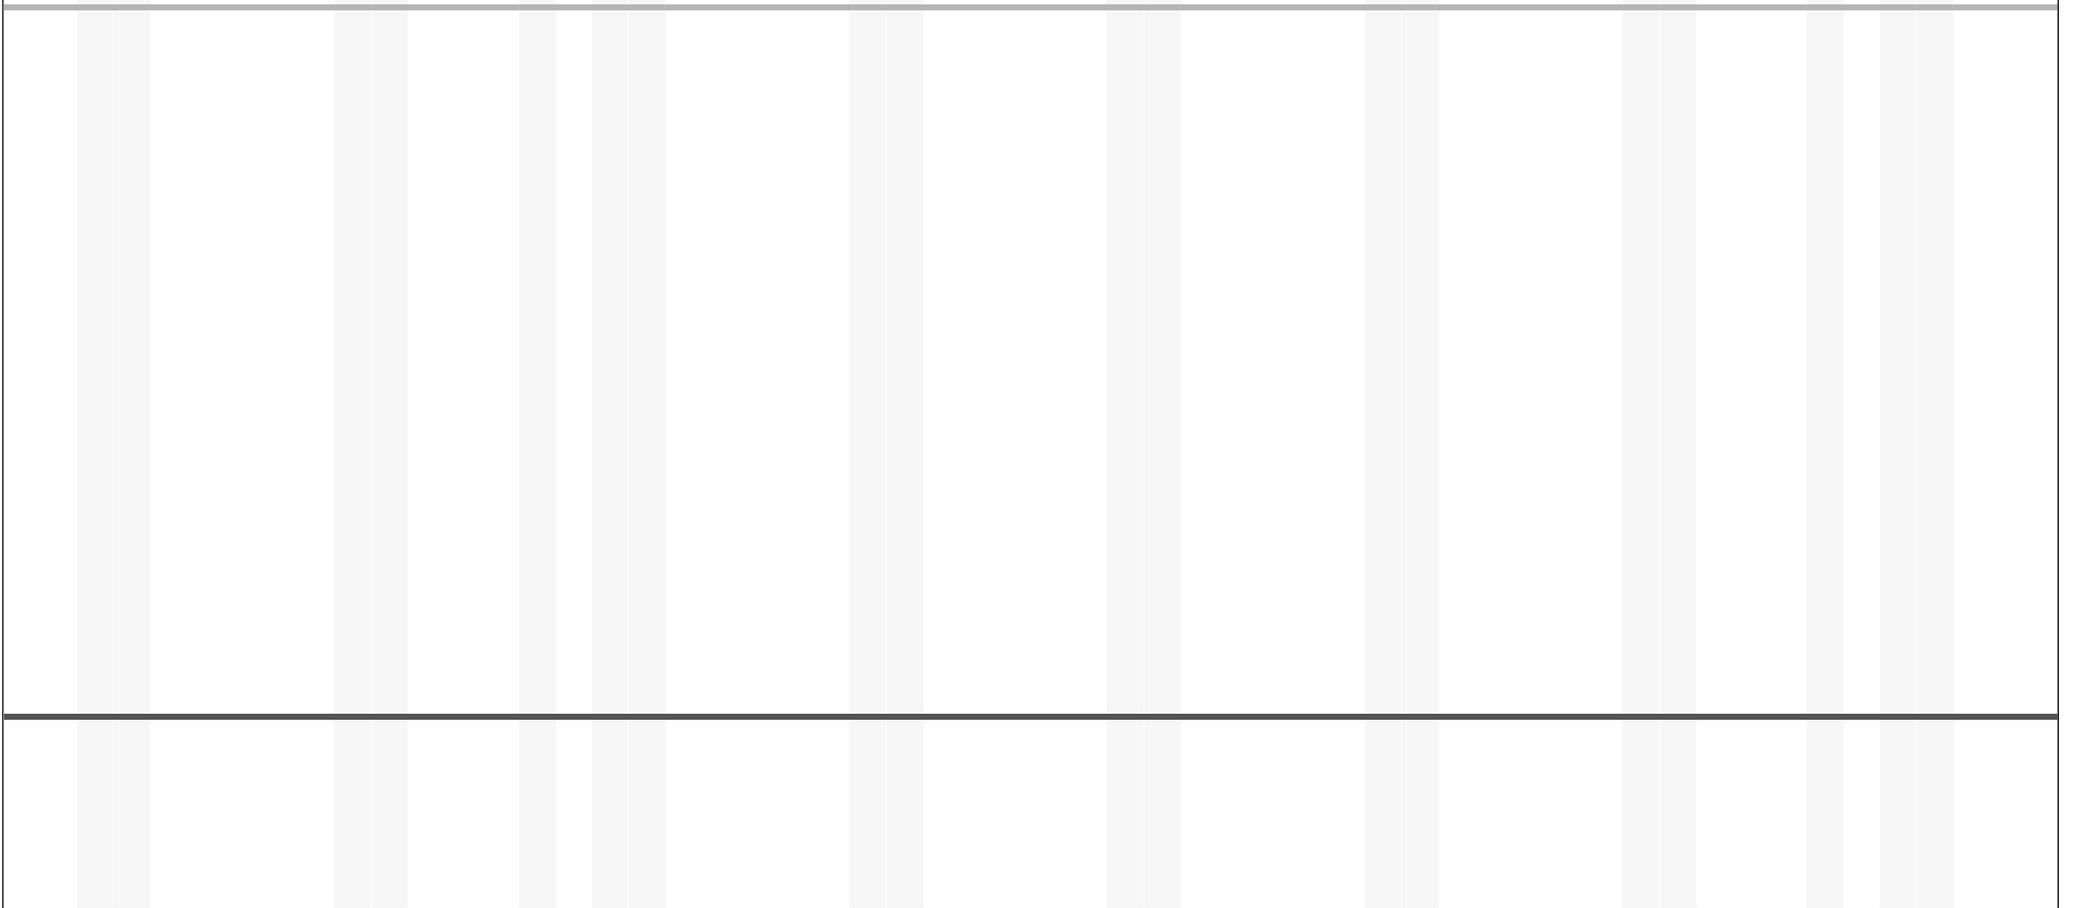

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17



Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Q S S 27/Ago/17 D S T Q Q S S 03/Set/17 D S T Q Q S S 10/Set/17 D S T Q Q S S 17/Set/17 D S T Q Q S S 24/Set/17 D S T Q Q S S 01/Out/17 D S T Q Q S S 08/Out/17 D S T Q Q S S 15/Out/17 Q

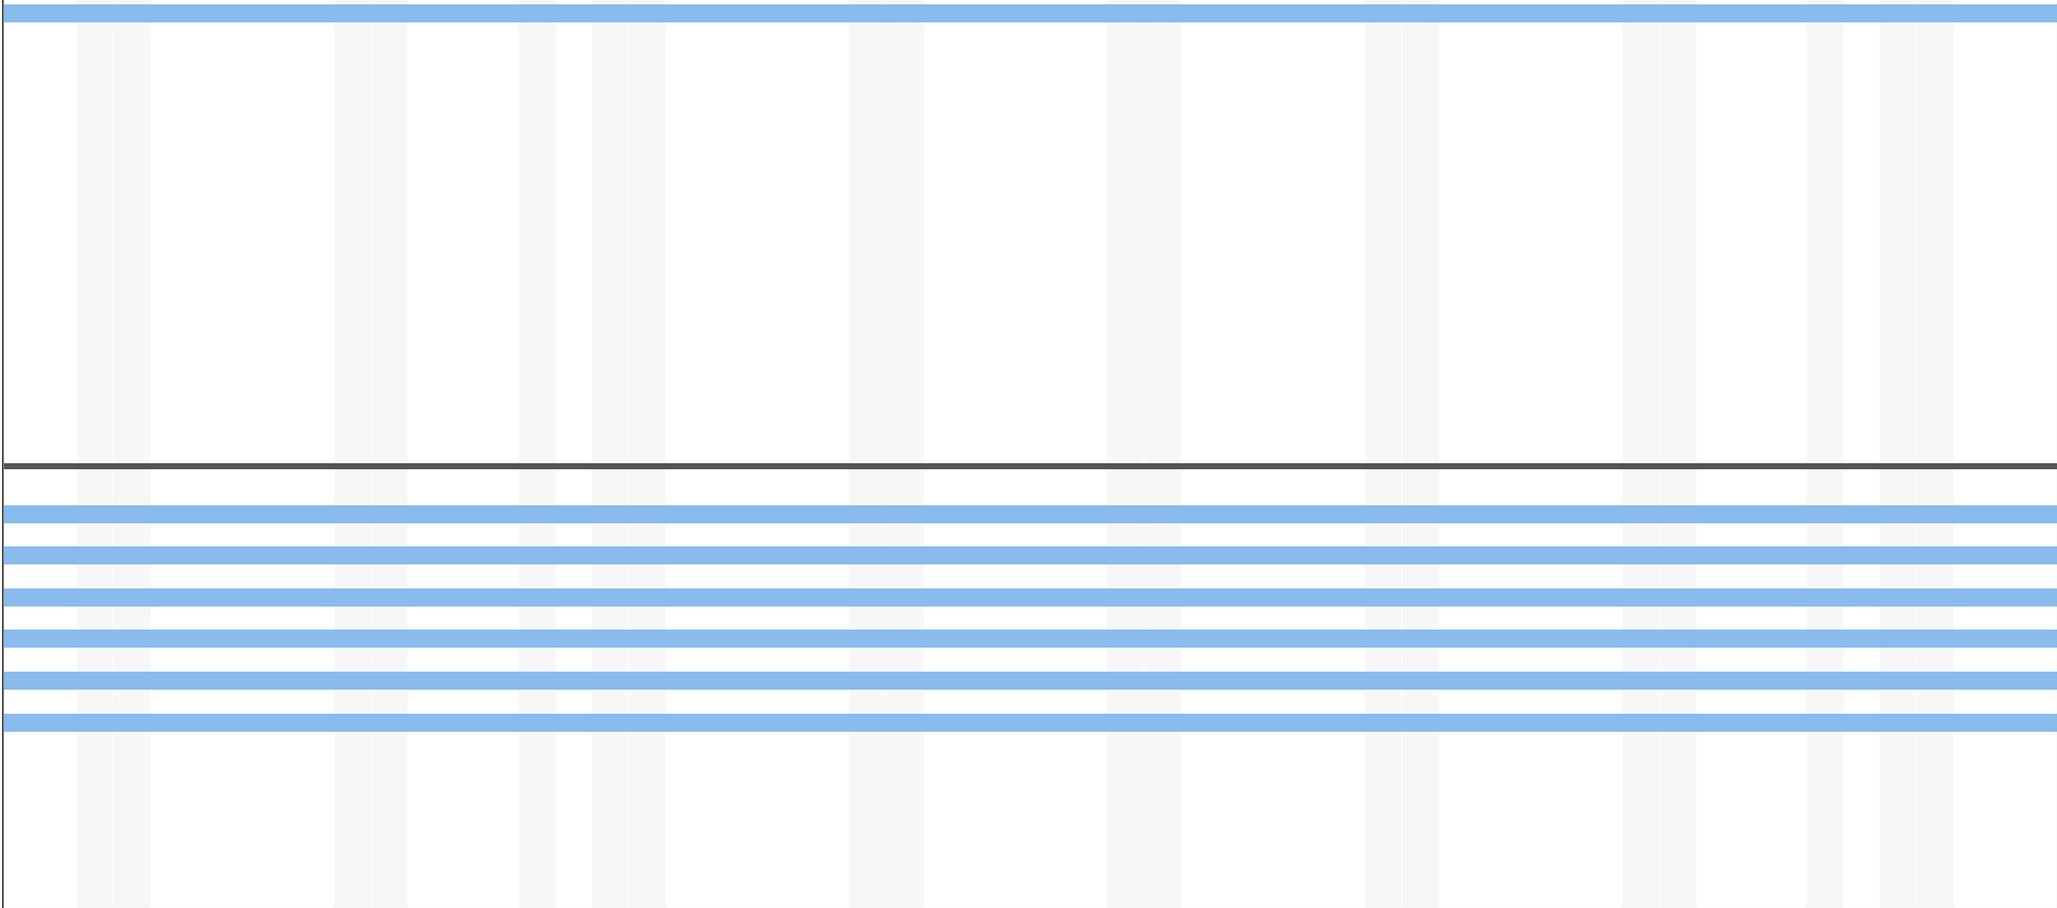


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

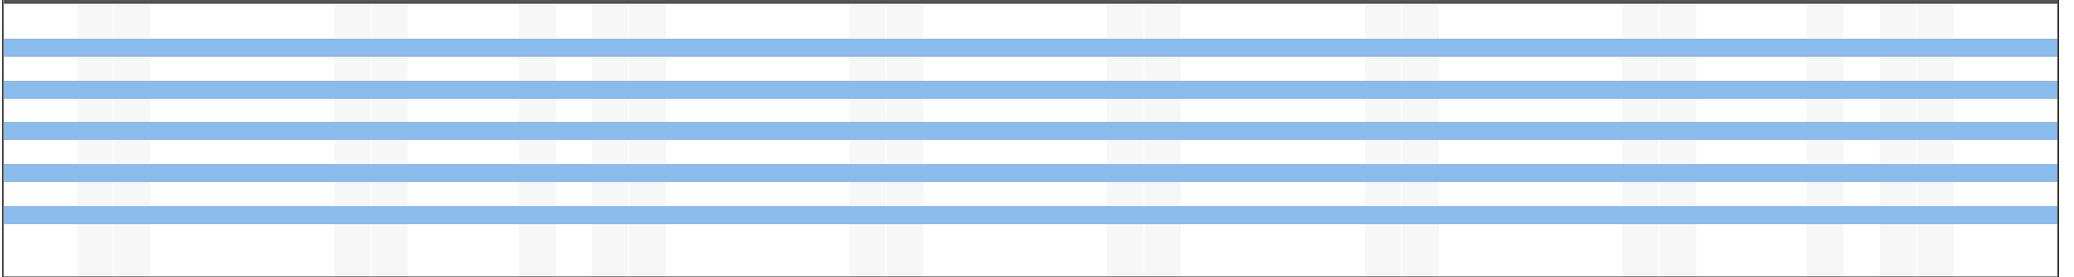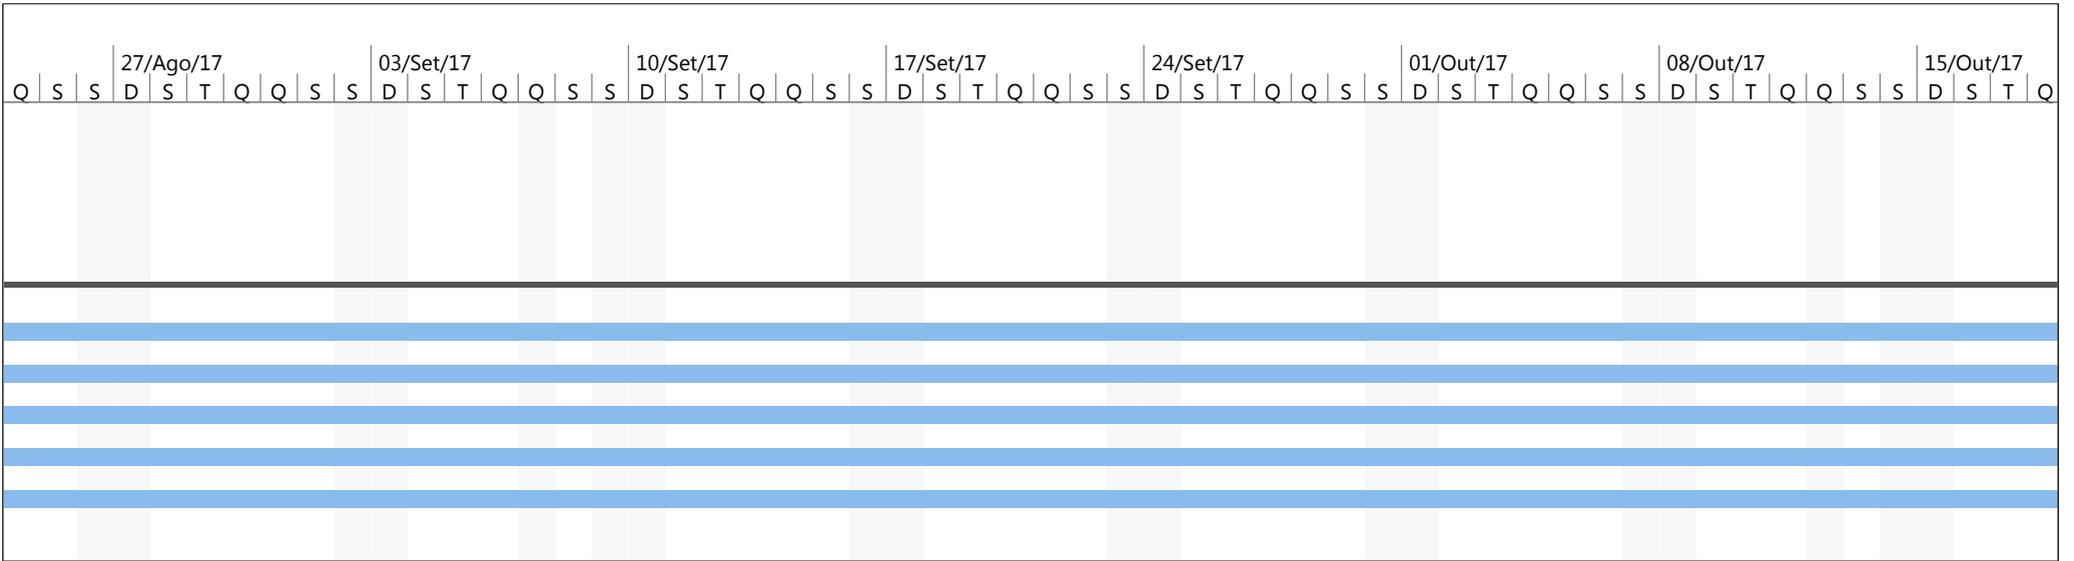


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

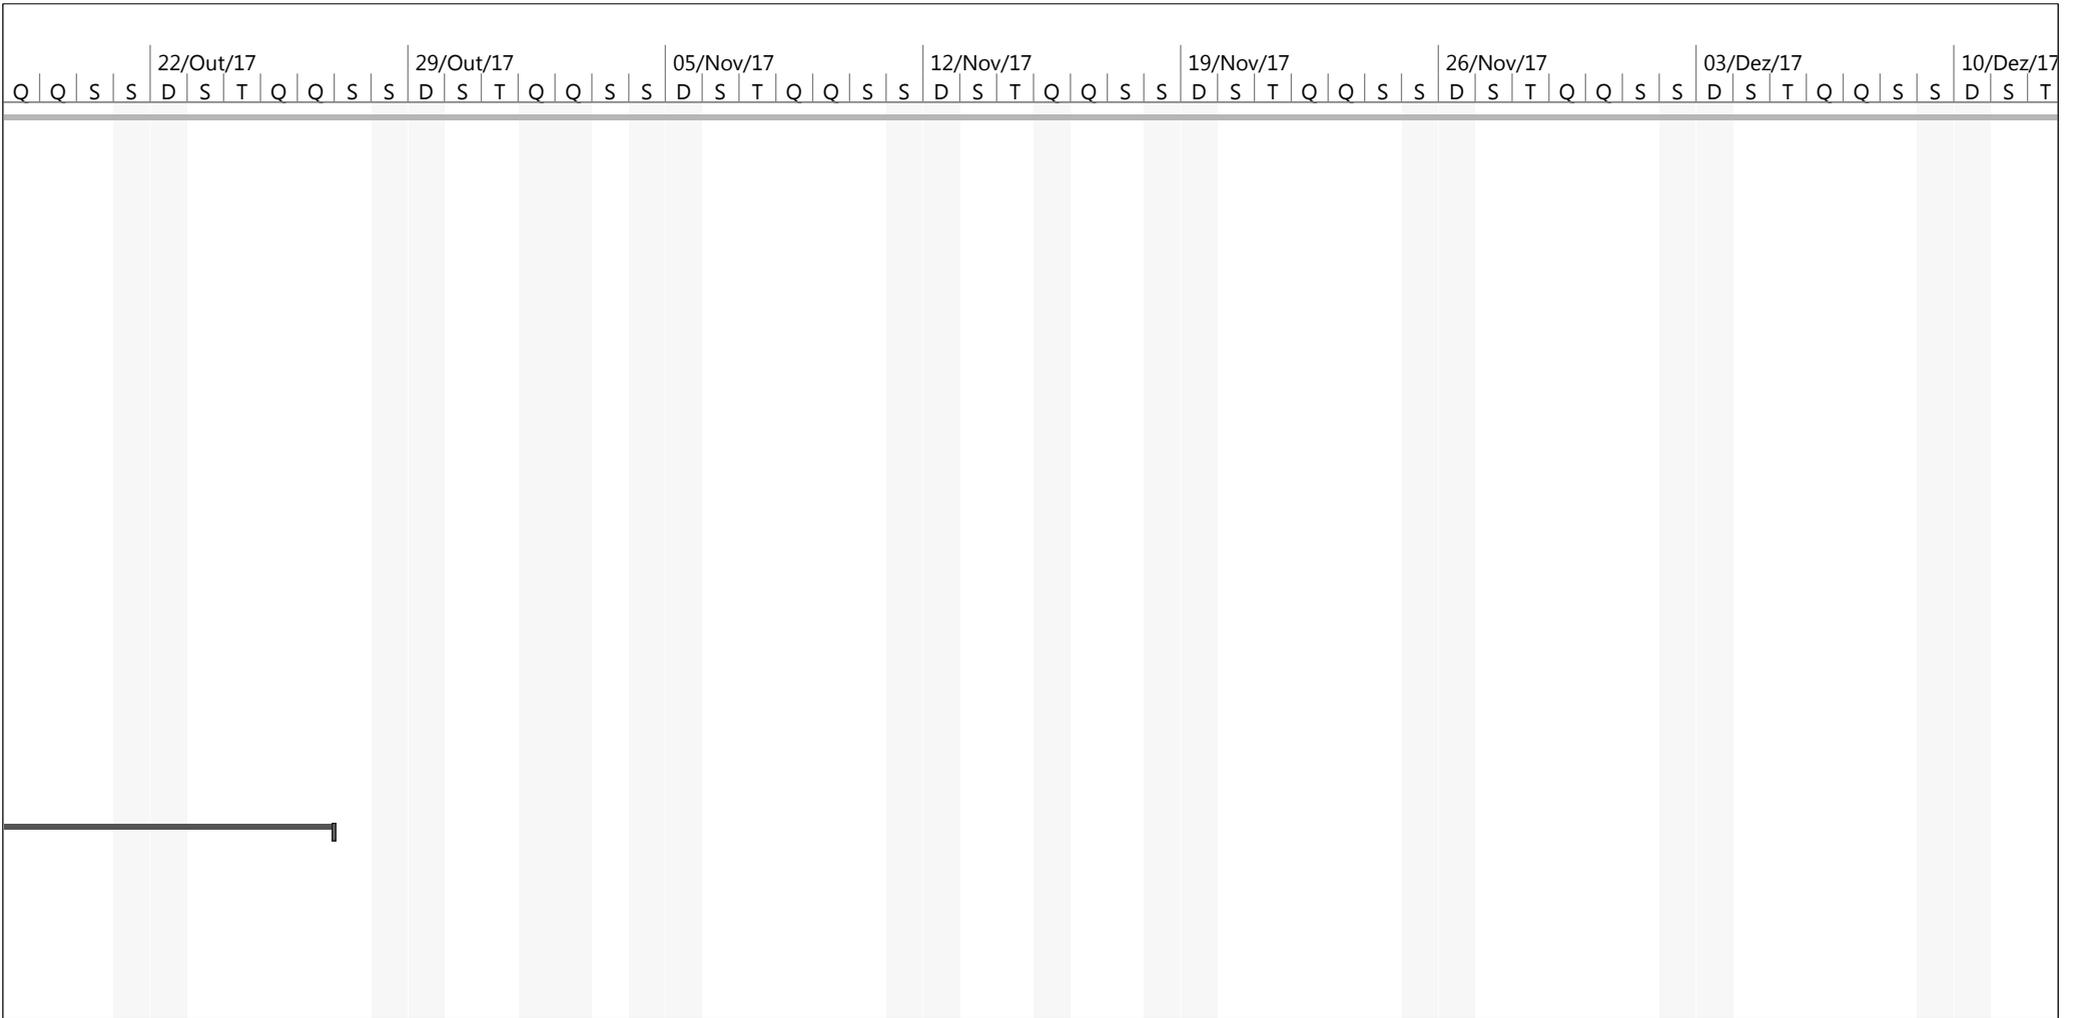


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

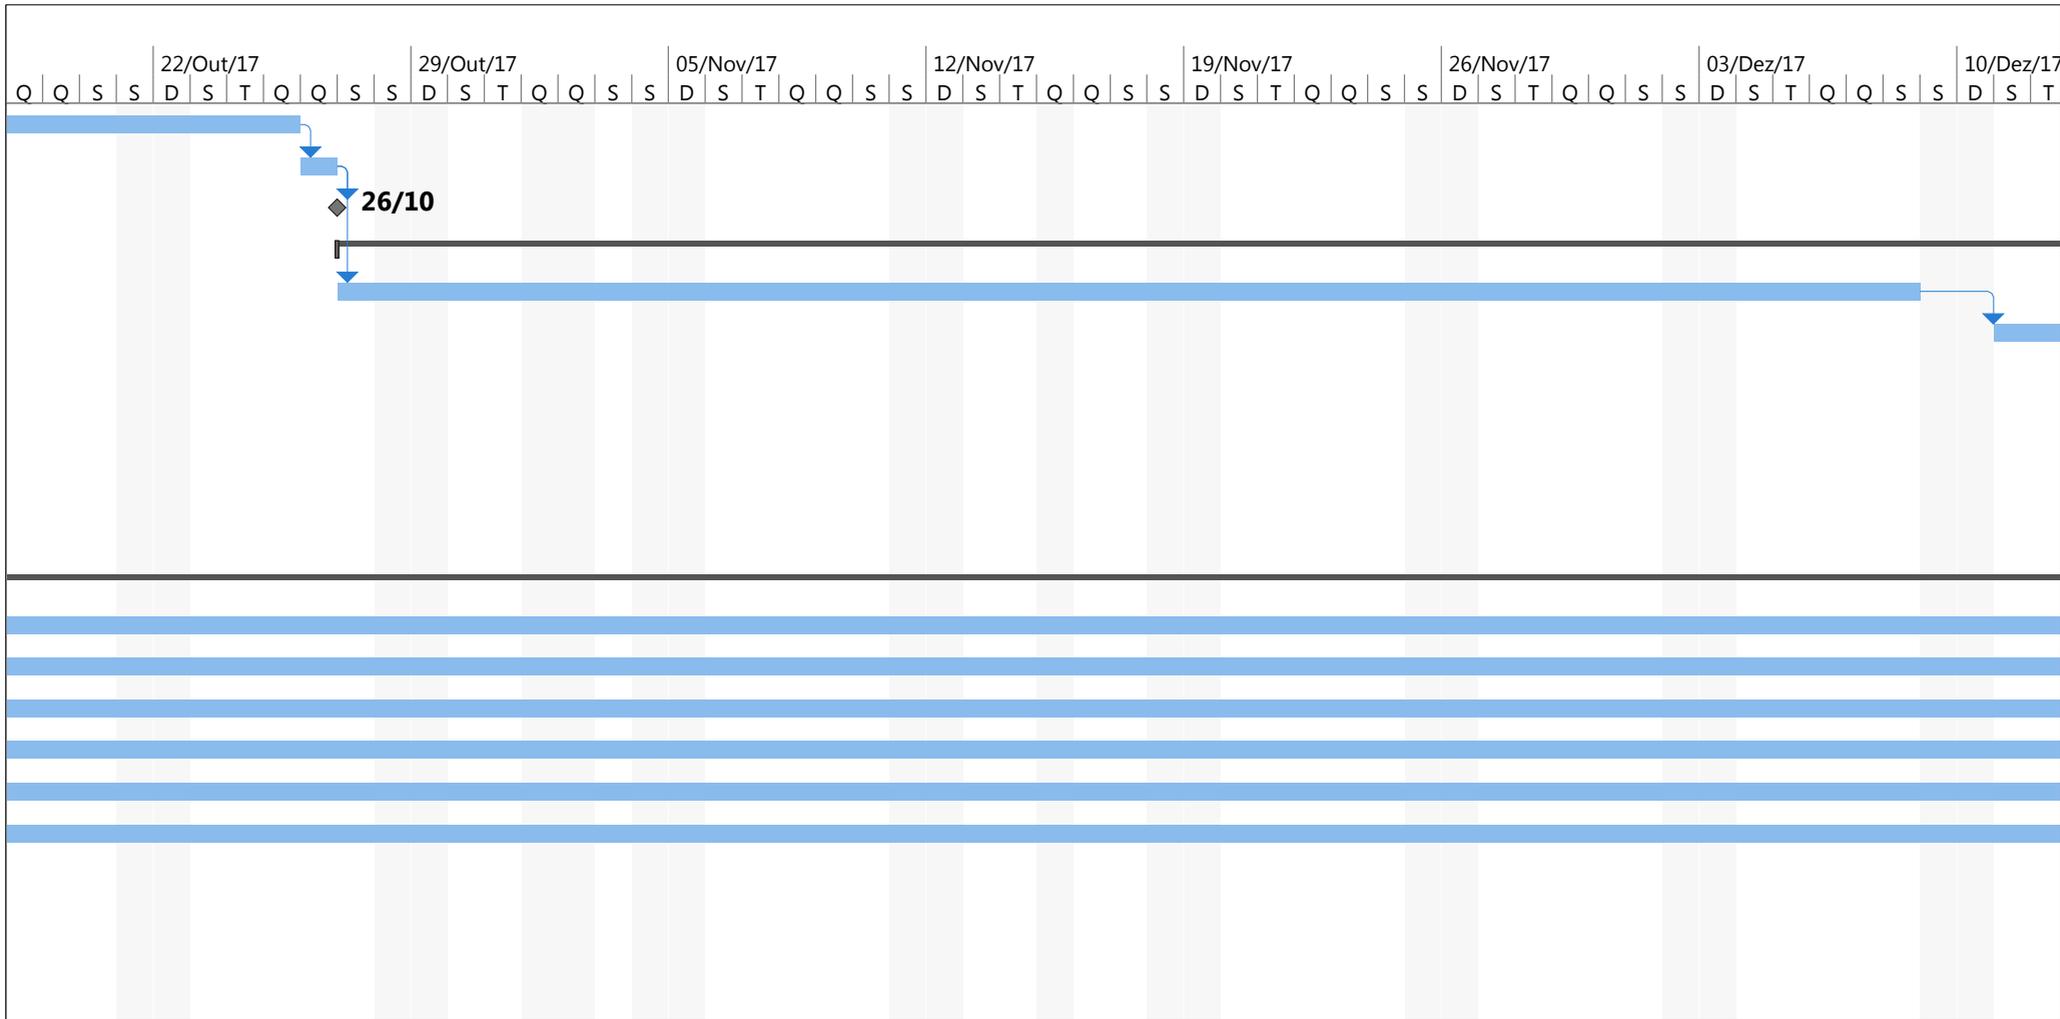

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

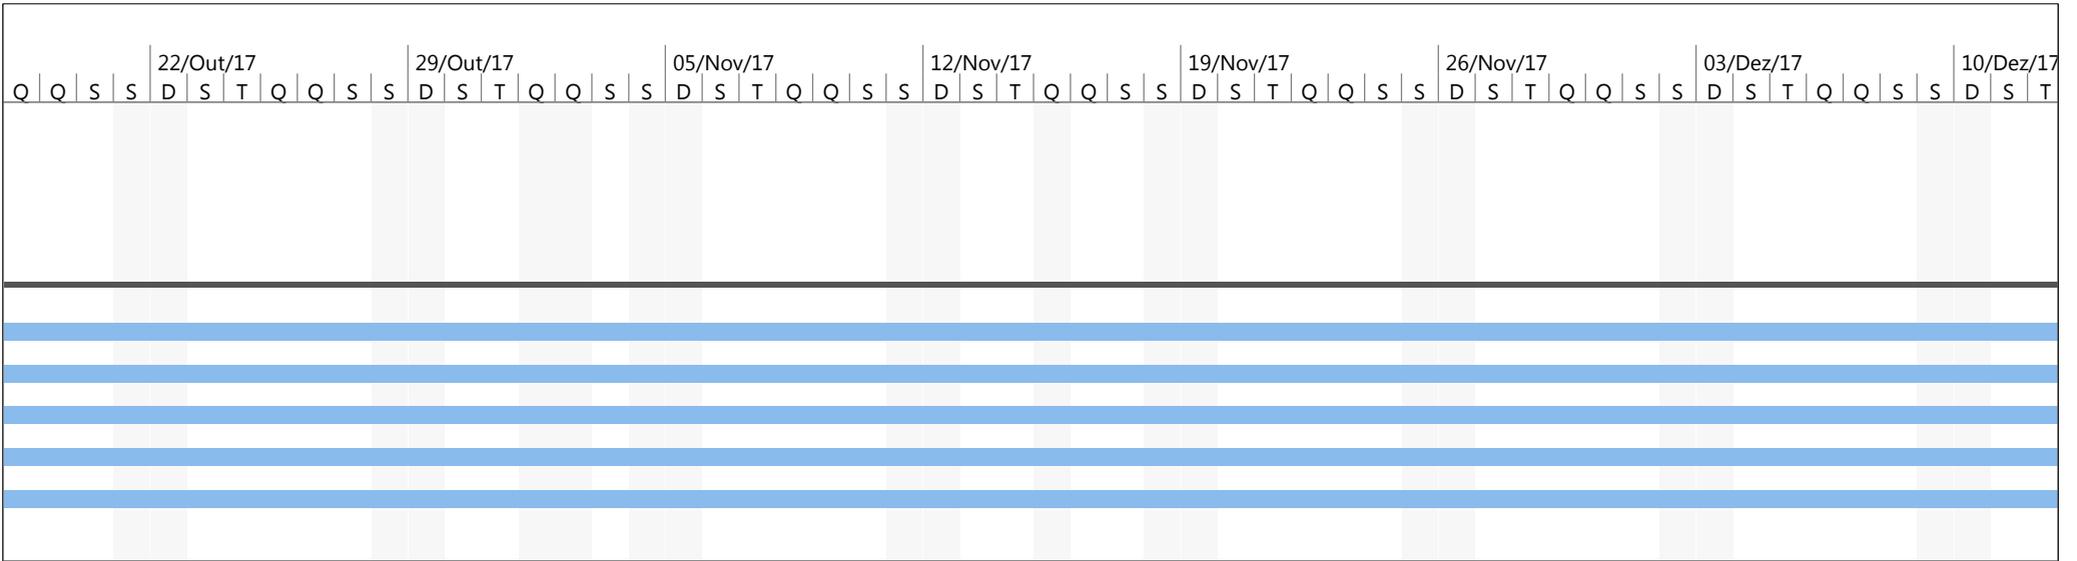

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

/17 | 17/Dez/17 | 24/Dez/17 | 31/Dez/17 | 07/Jan/18 | 14/Jan/18 | 21/Jan/18 | 28/Jan/18 | 04/Fev

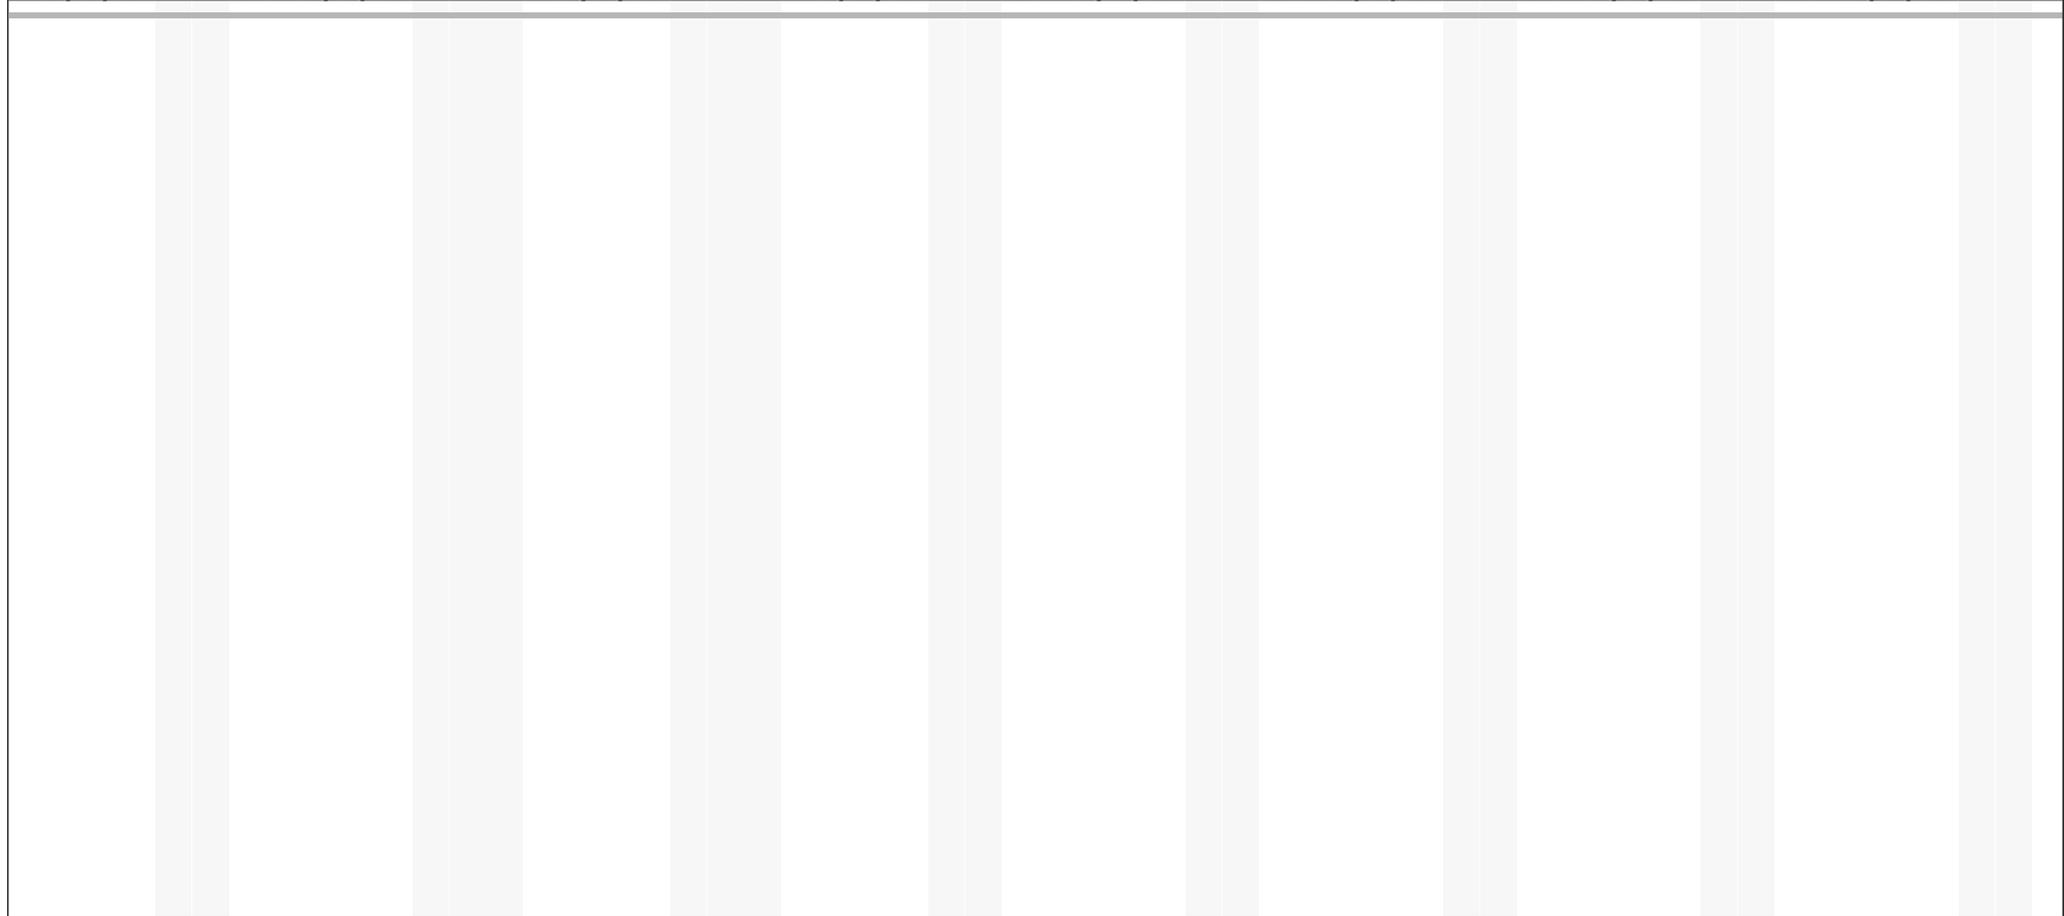


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

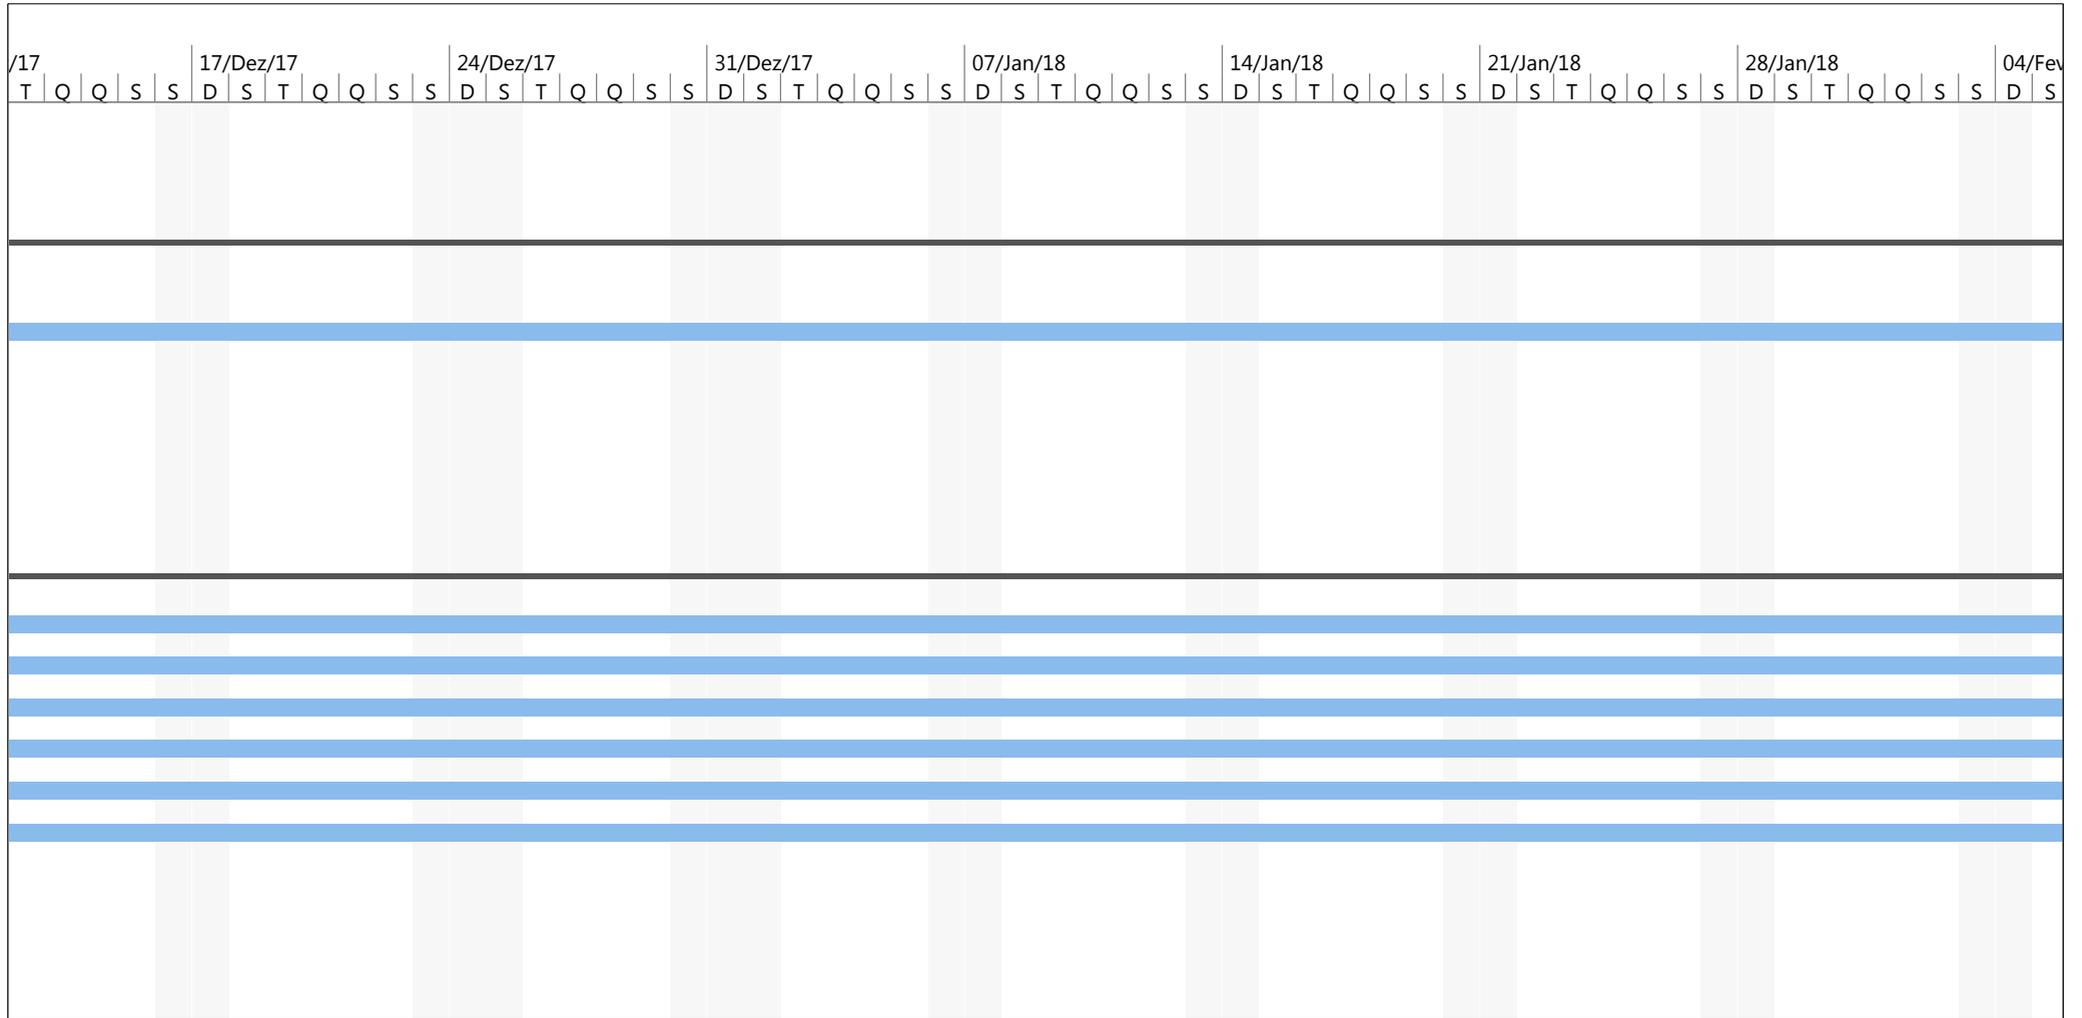

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

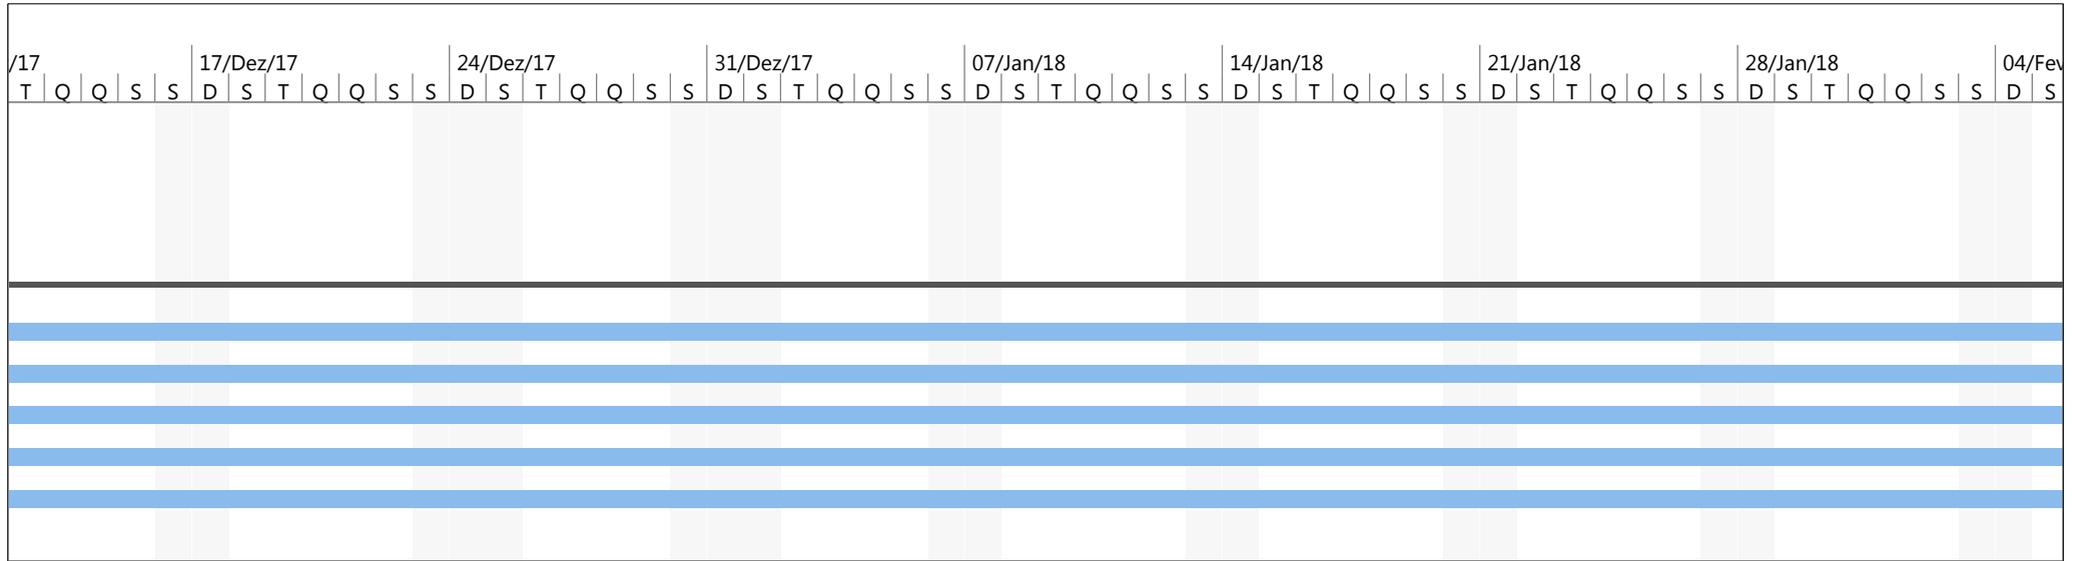

Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Fev/18 11/Fev/18 18/Fev/18 25/Fev/18 04/Mar/18 11/Mar/18 18/Mar/18 25/Mar/18 01


S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

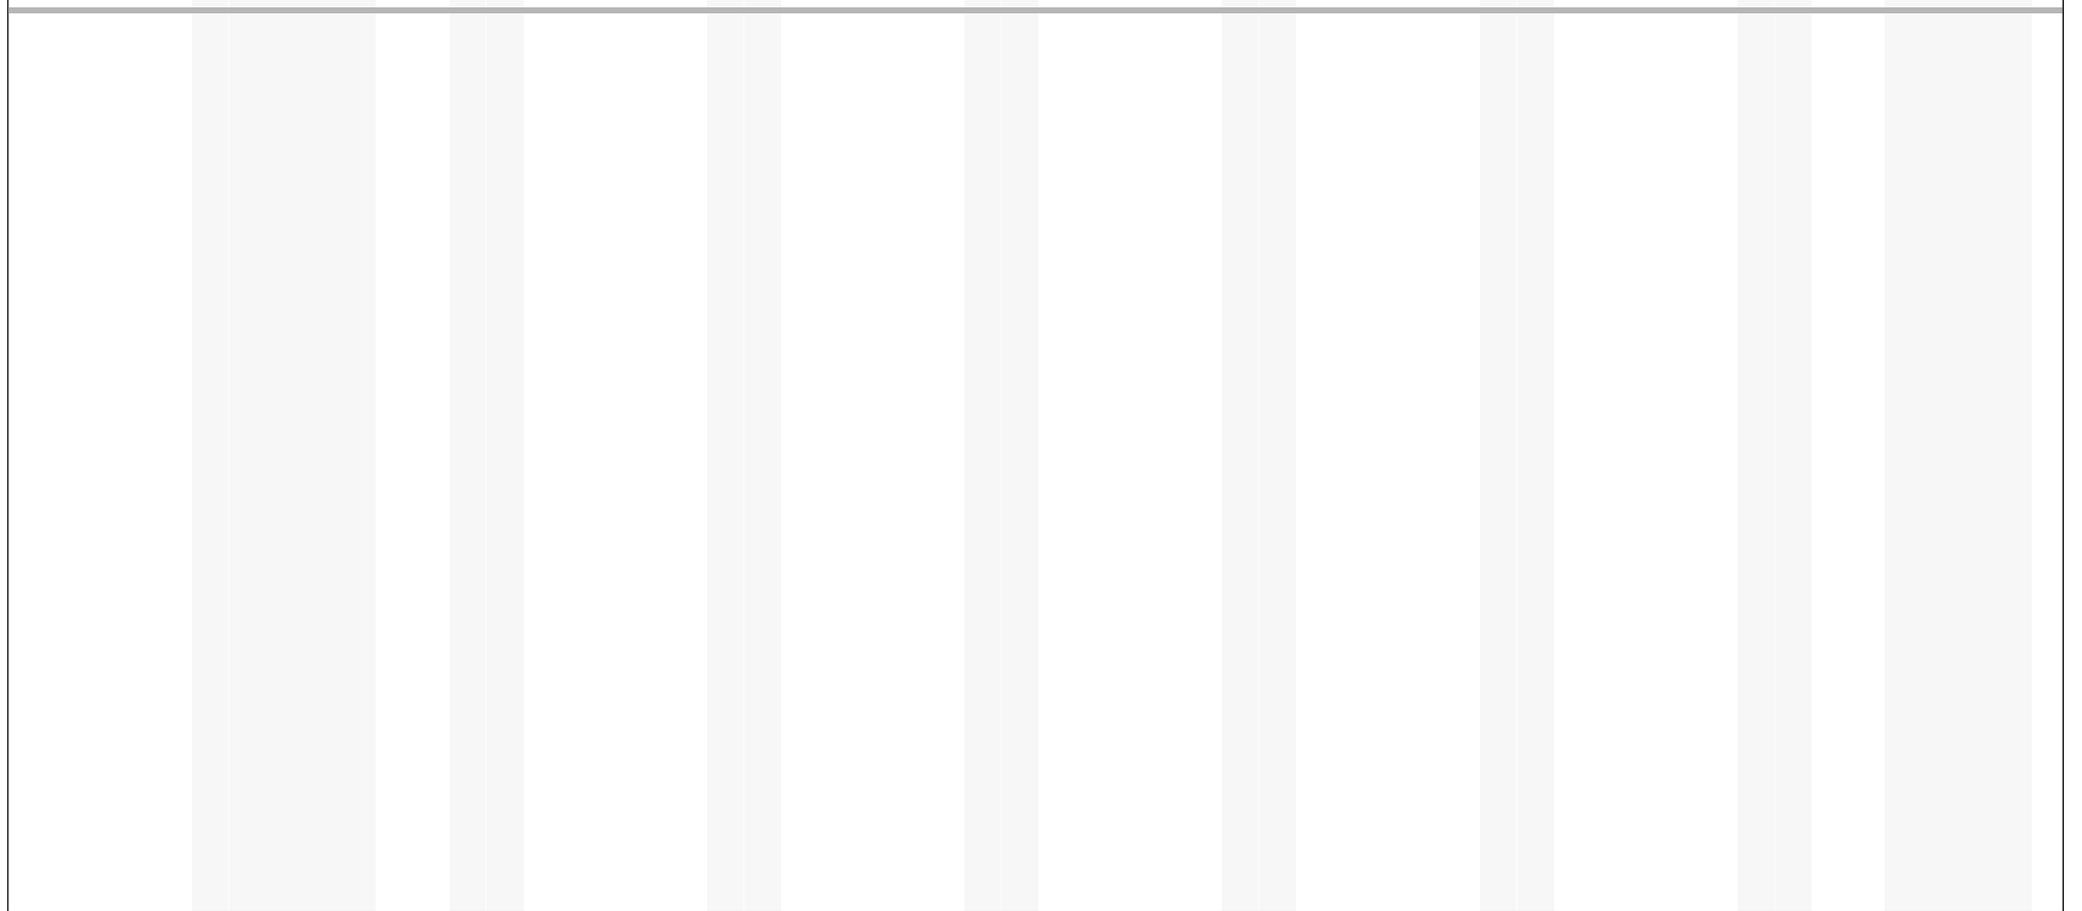

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Fev/18 11/Fev/18 18/Fev/18 25/Fev/18 04/Mar/18 11/Mar/18 18/Mar/18 25/Mar/18 01

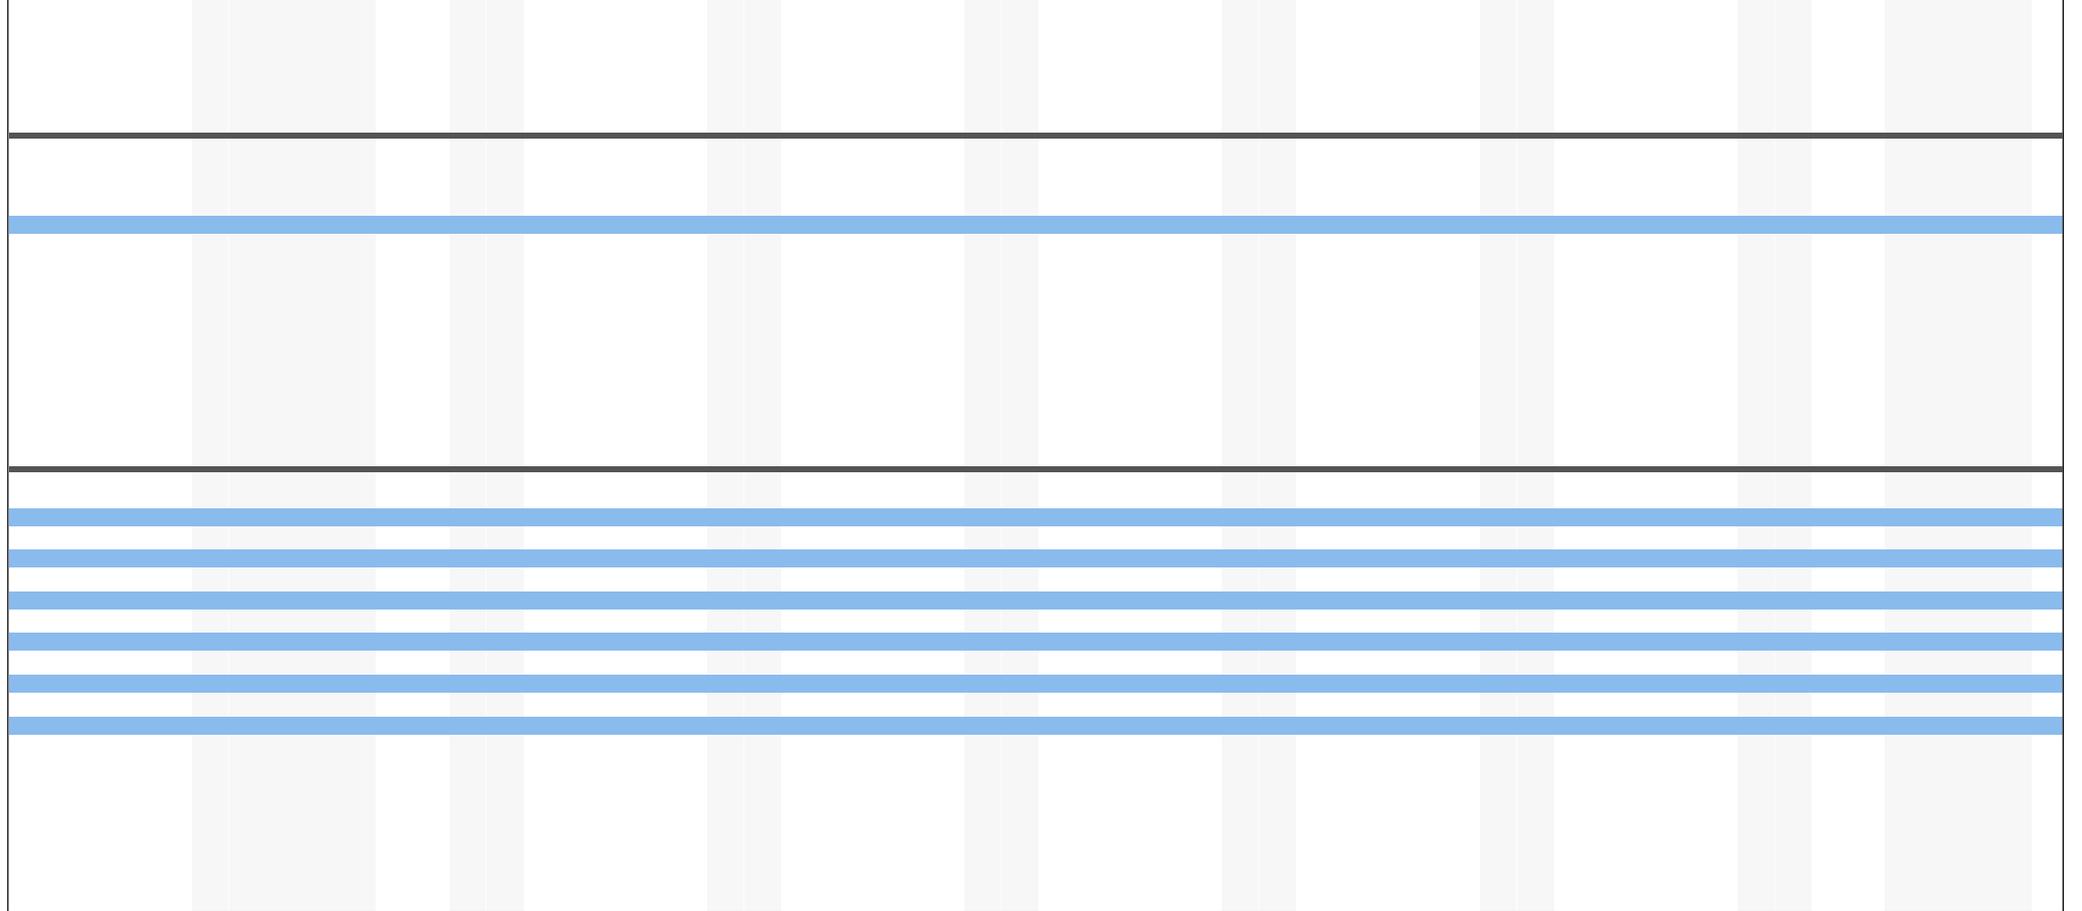

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

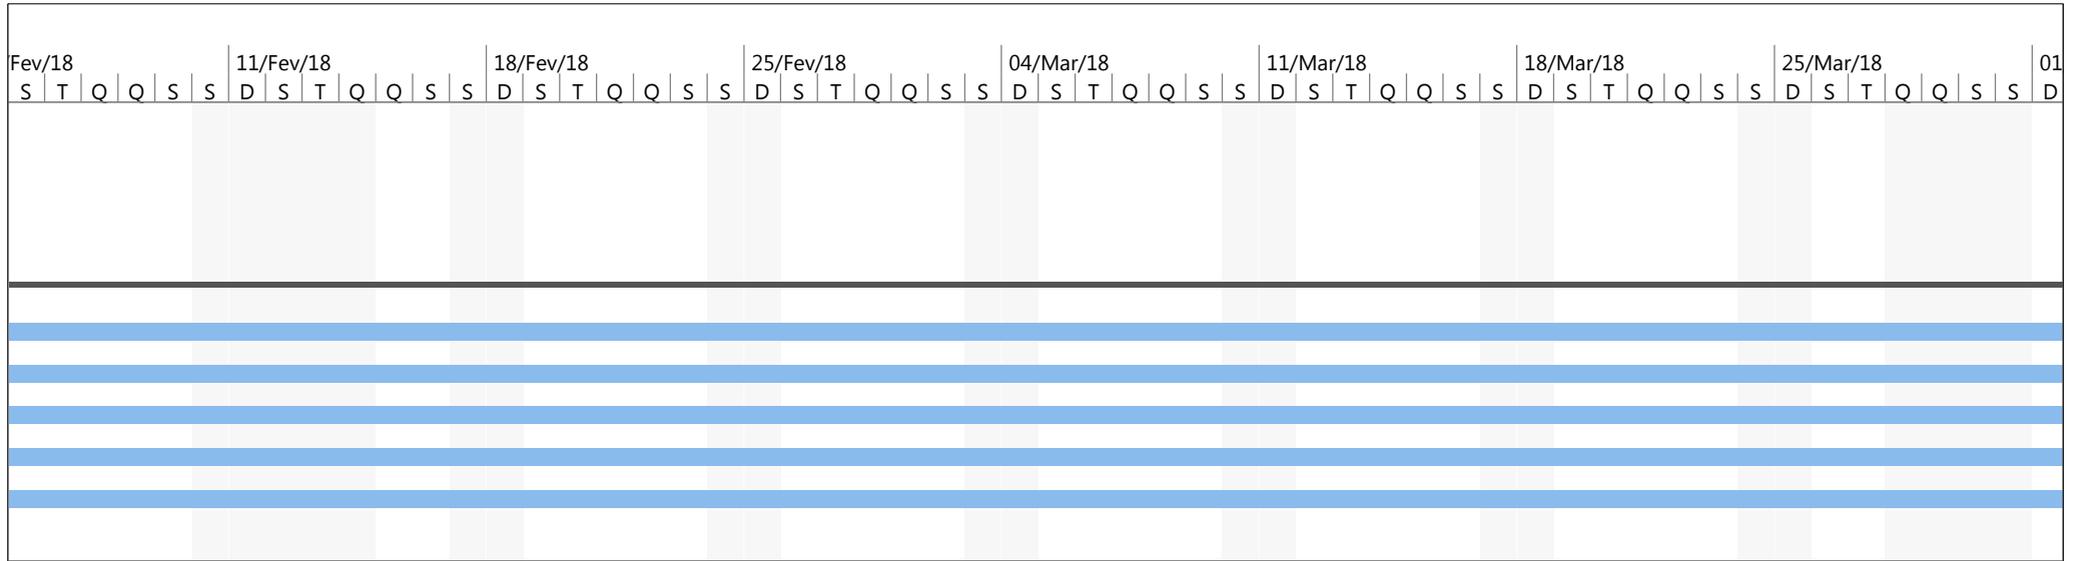


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

01/Abr/18 | 08/Abr/18 | 15/Abr/18 | 22/Abr/18 | 29/Abr/18 | 06/Maio/18 | 13/Maio/18 | 20/Maio/18


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

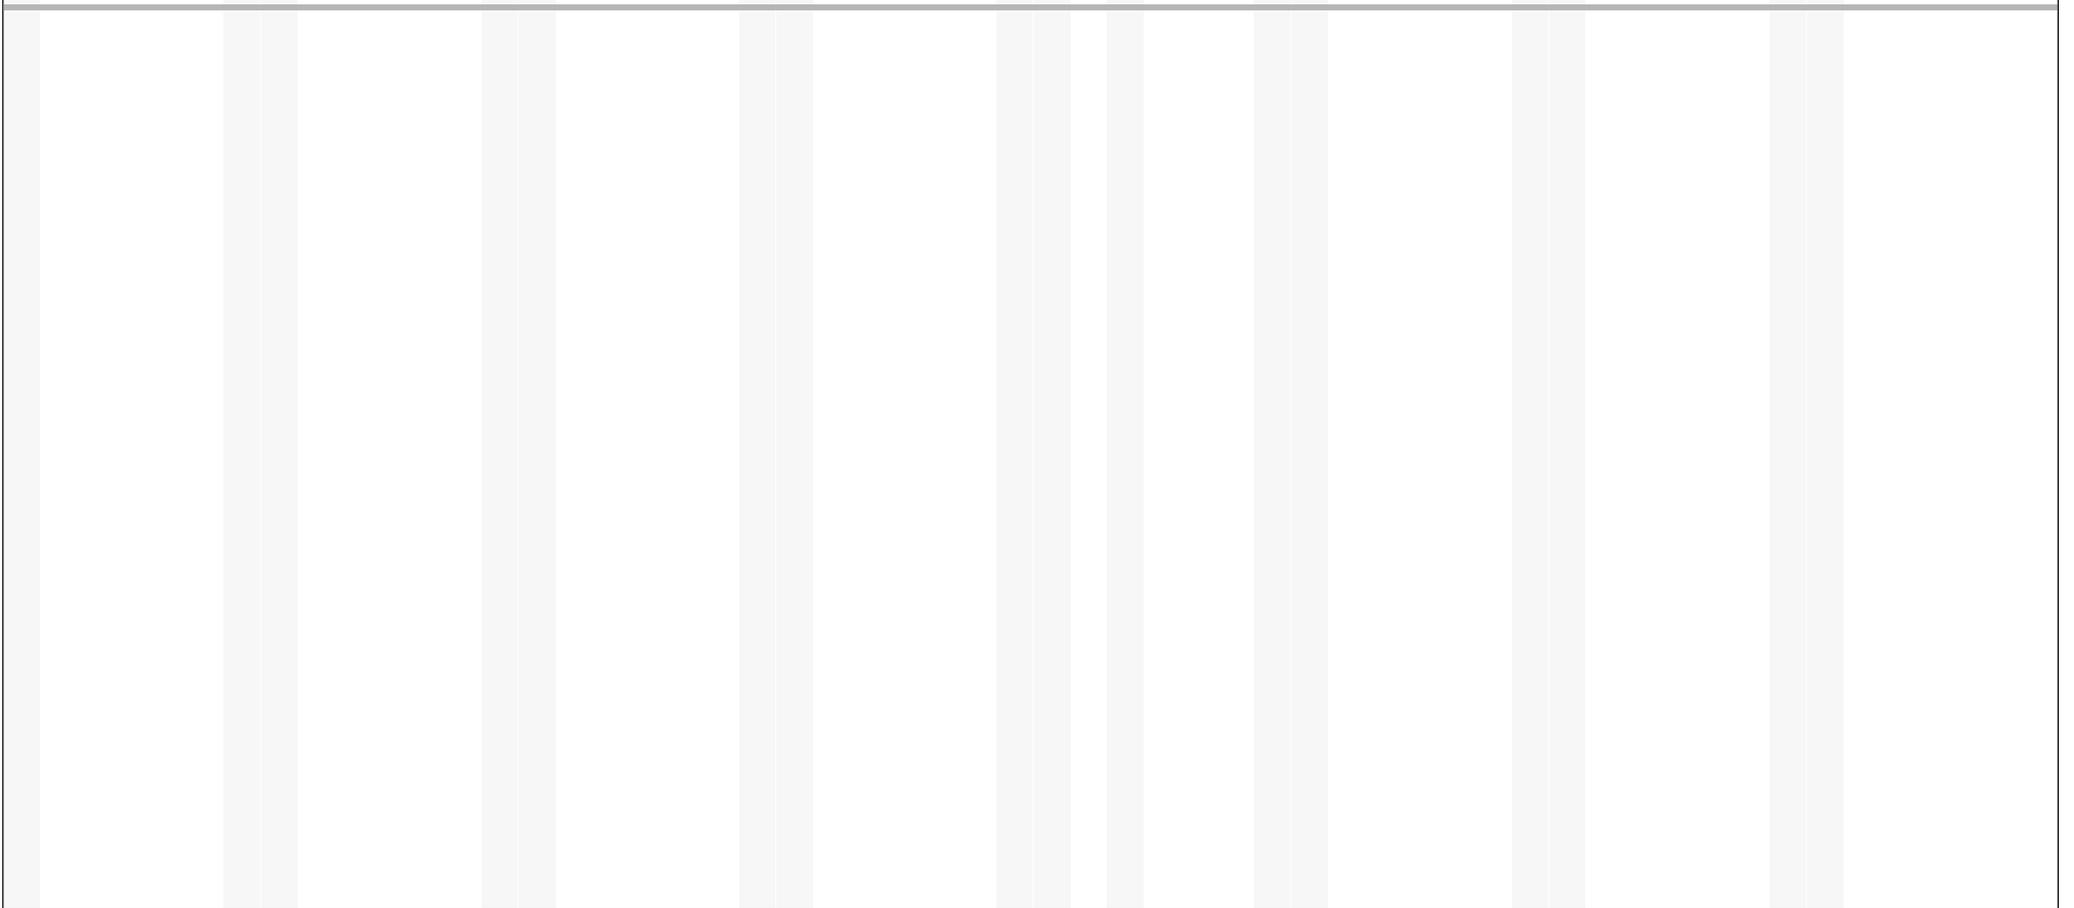

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


01/Abr/18 08/Abr/18 15/Abr/18 22/Abr/18 29/Abr/18 06/Maio/18 13/Maio/18 20/Maio/18  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

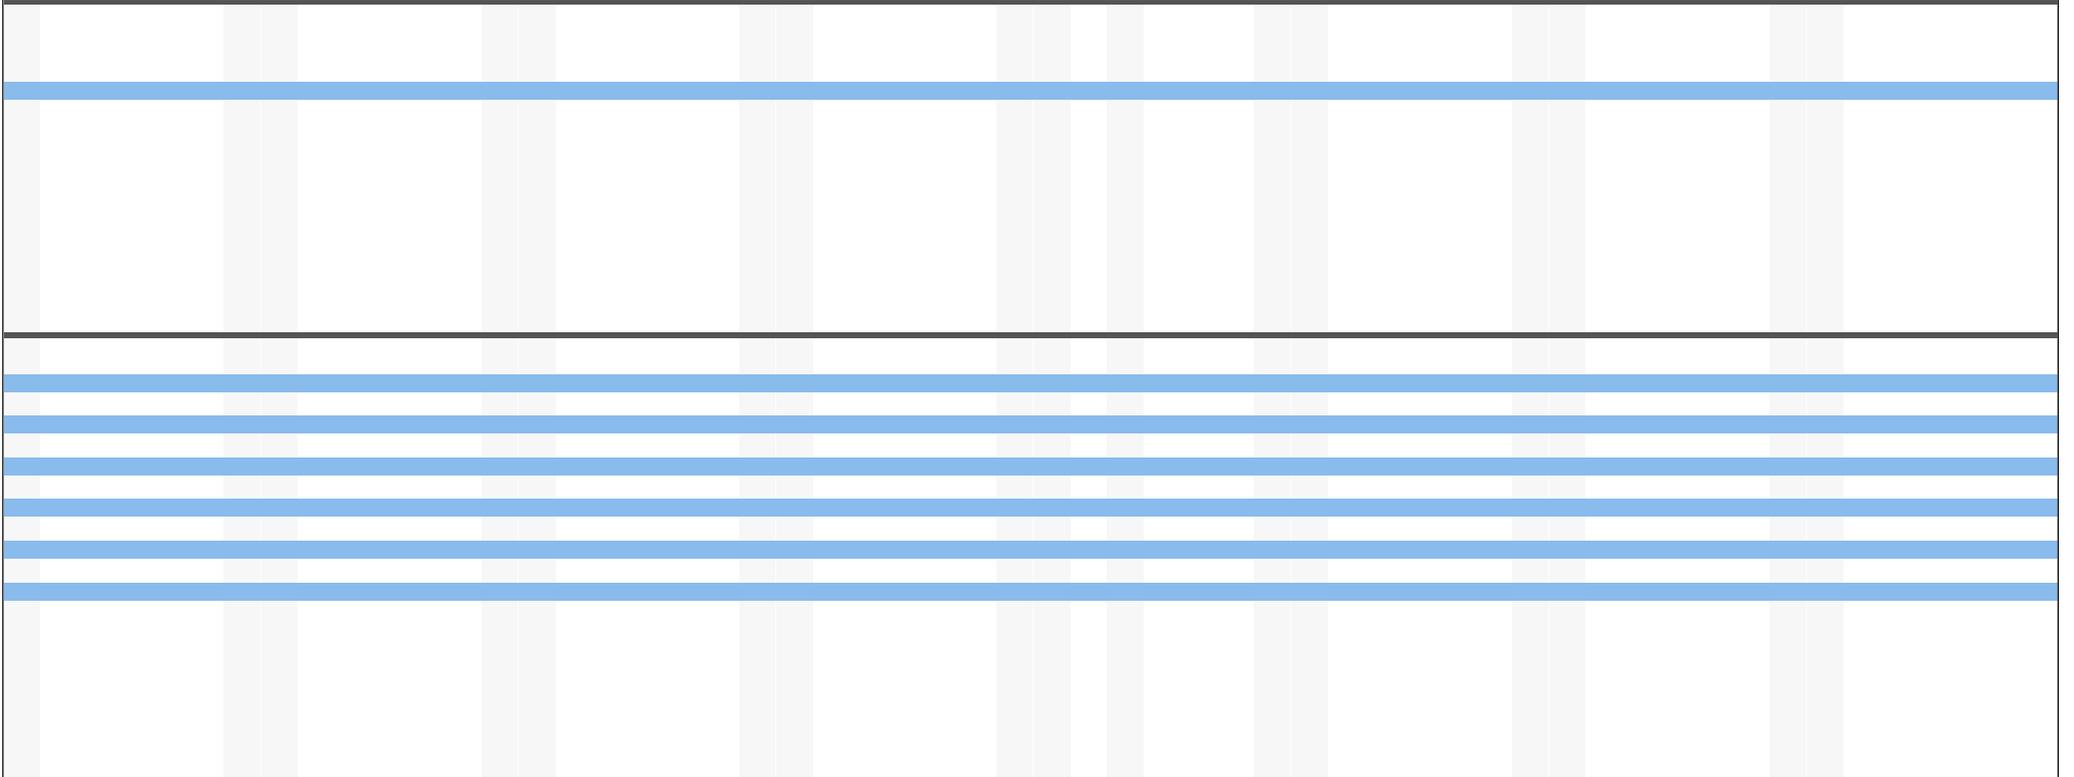

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

01/Abr/18 08/Abr/18 15/Abr/18 22/Abr/18 29/Abr/18 06/Maio/18 13/Maio/18 20/Maio/18  
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

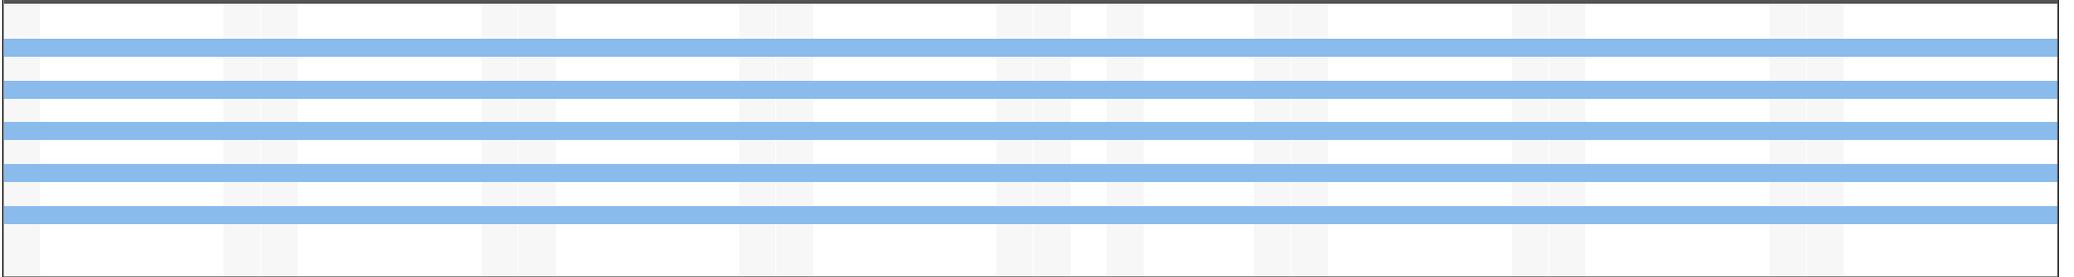


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

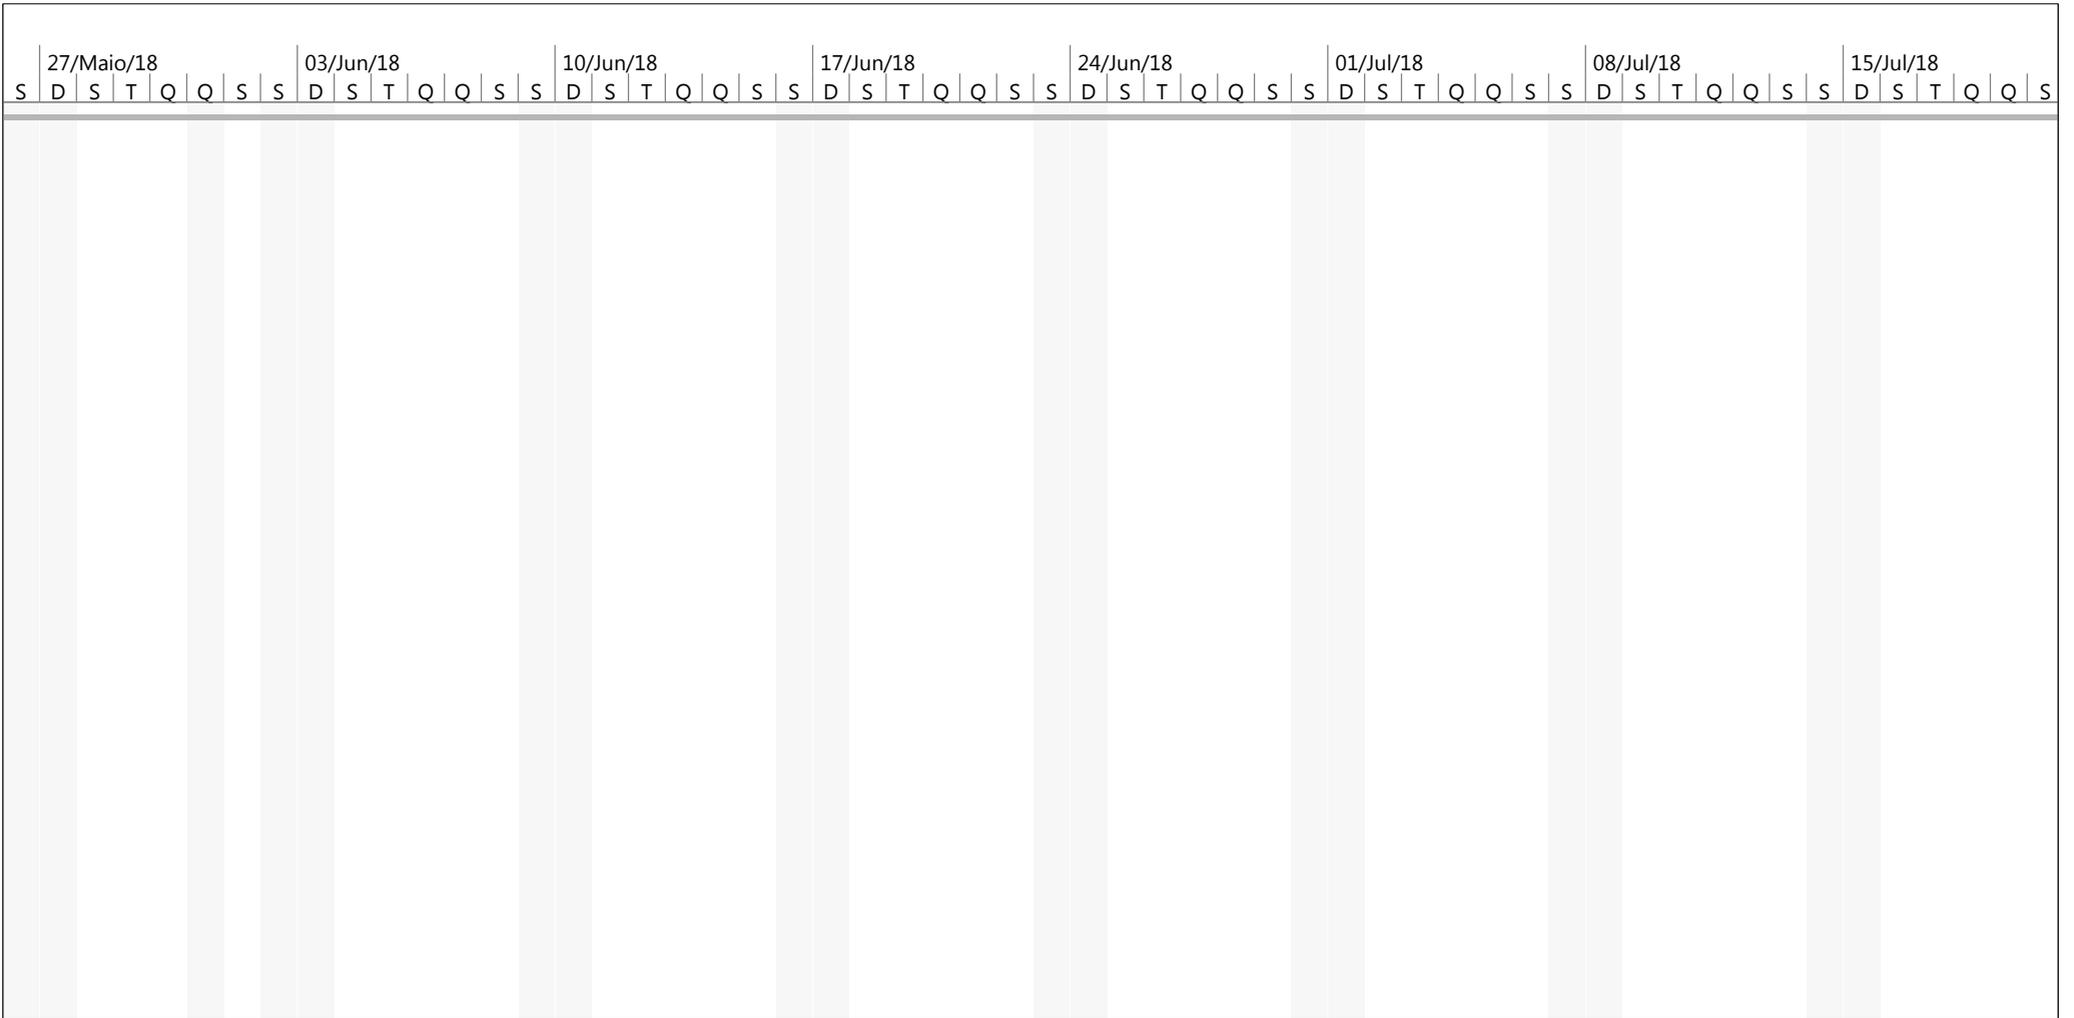


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

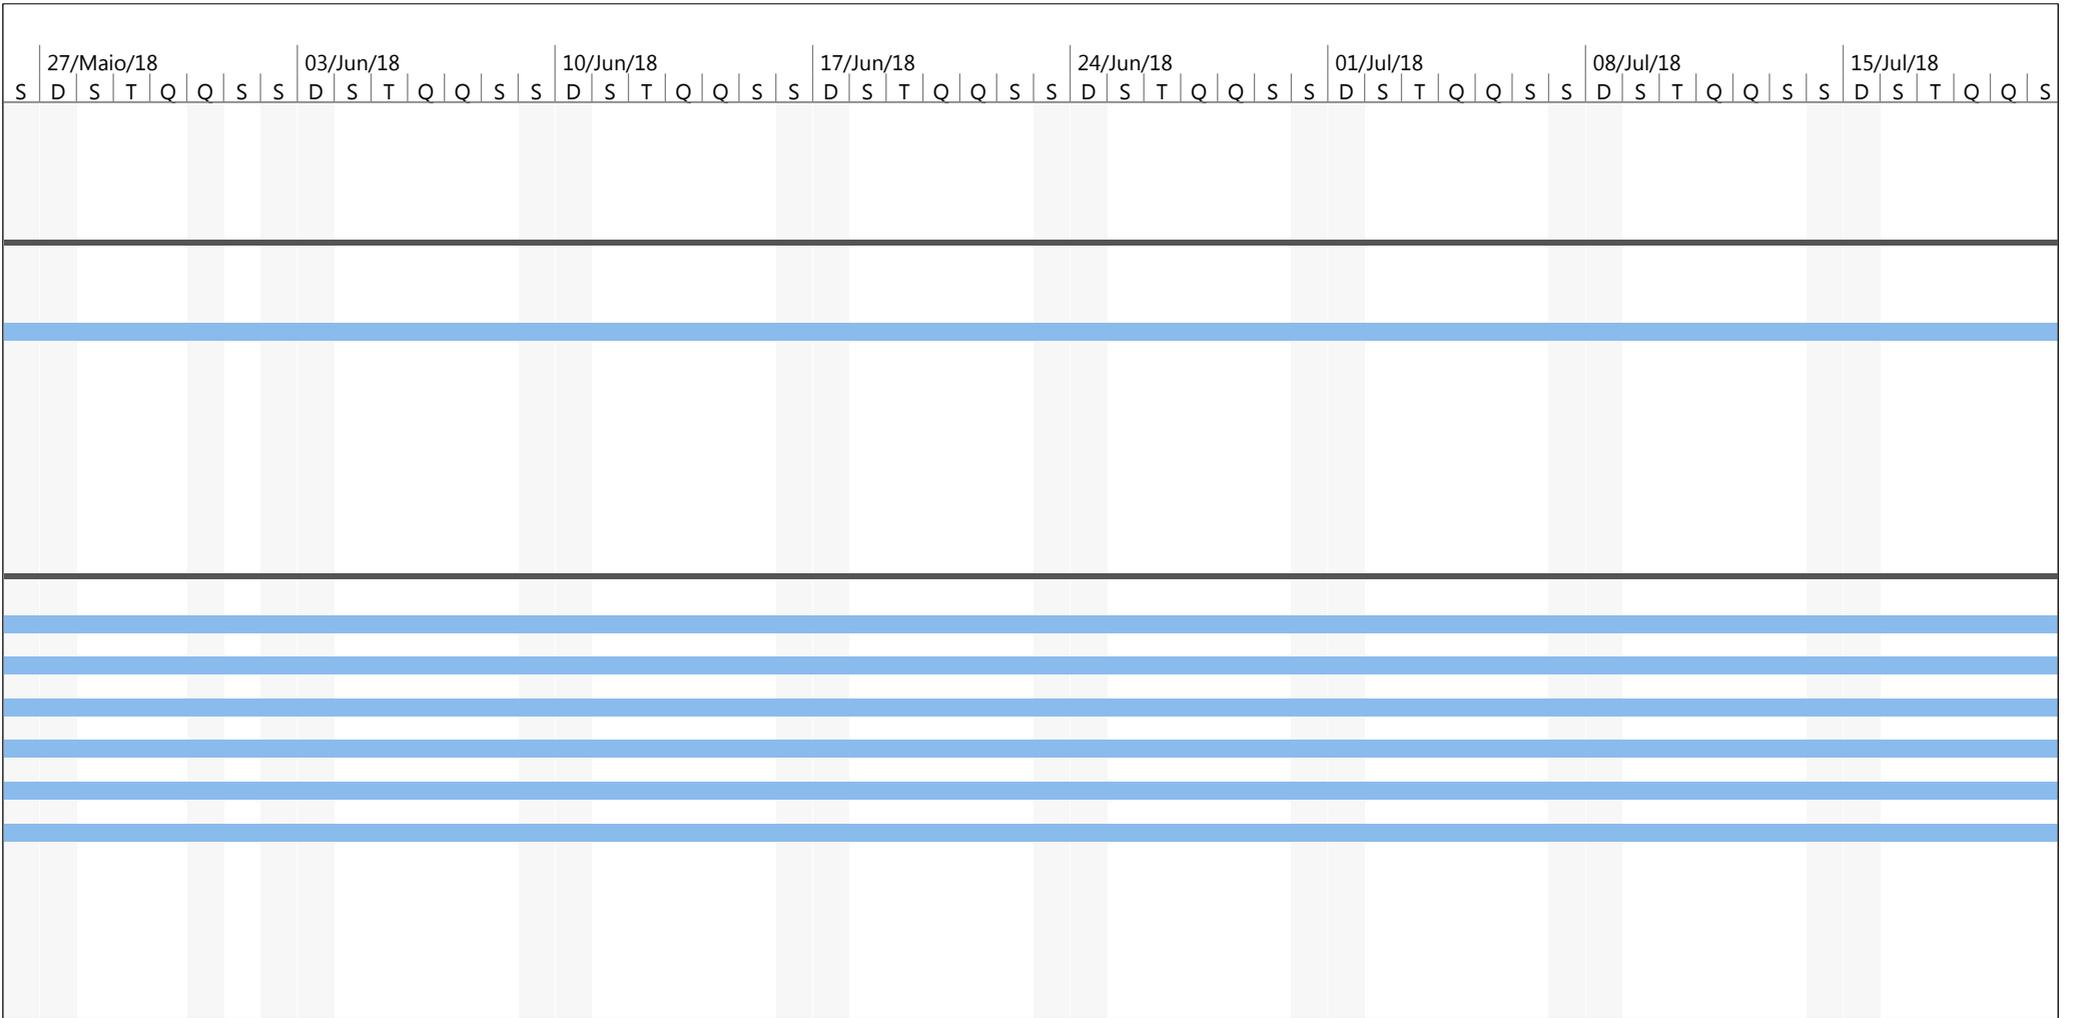


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

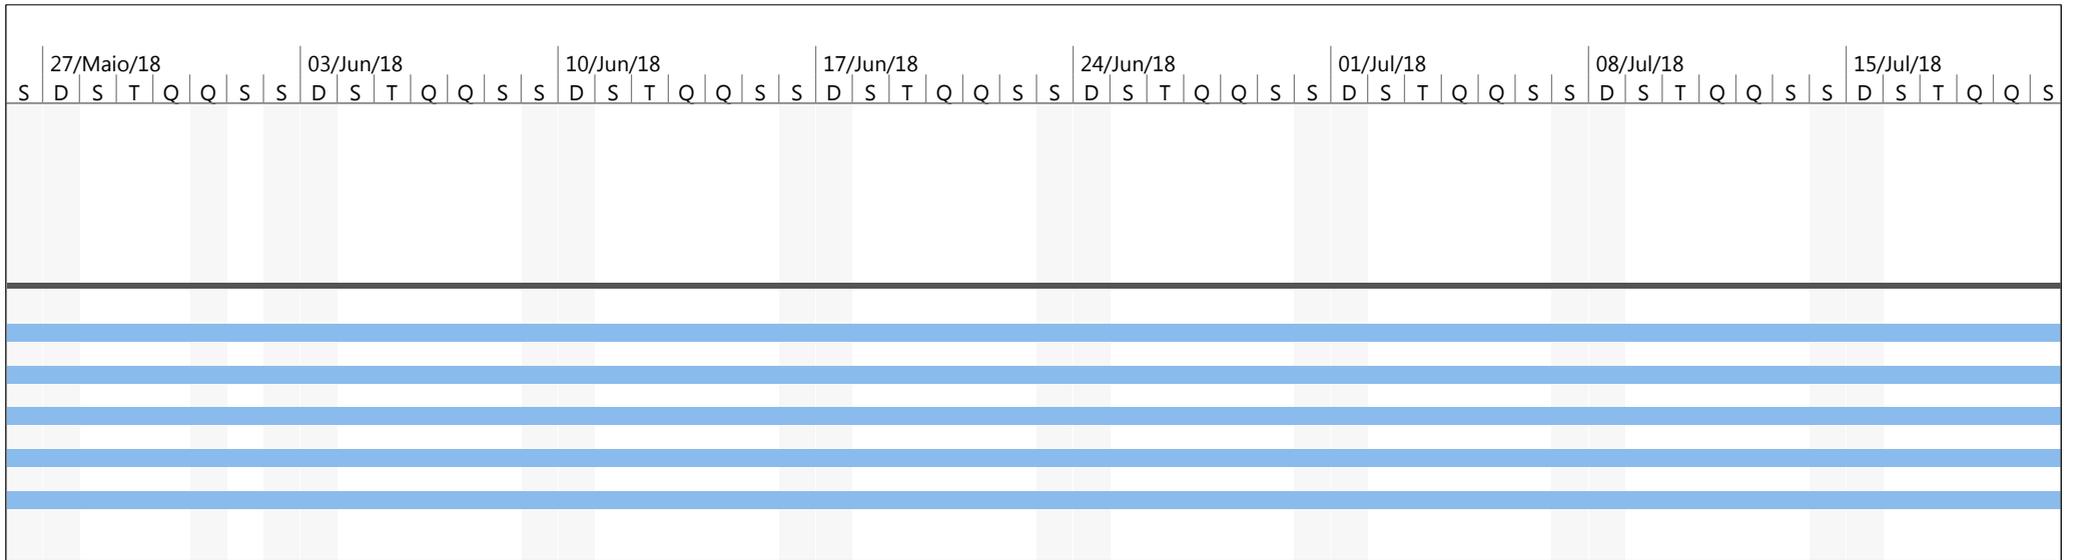


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

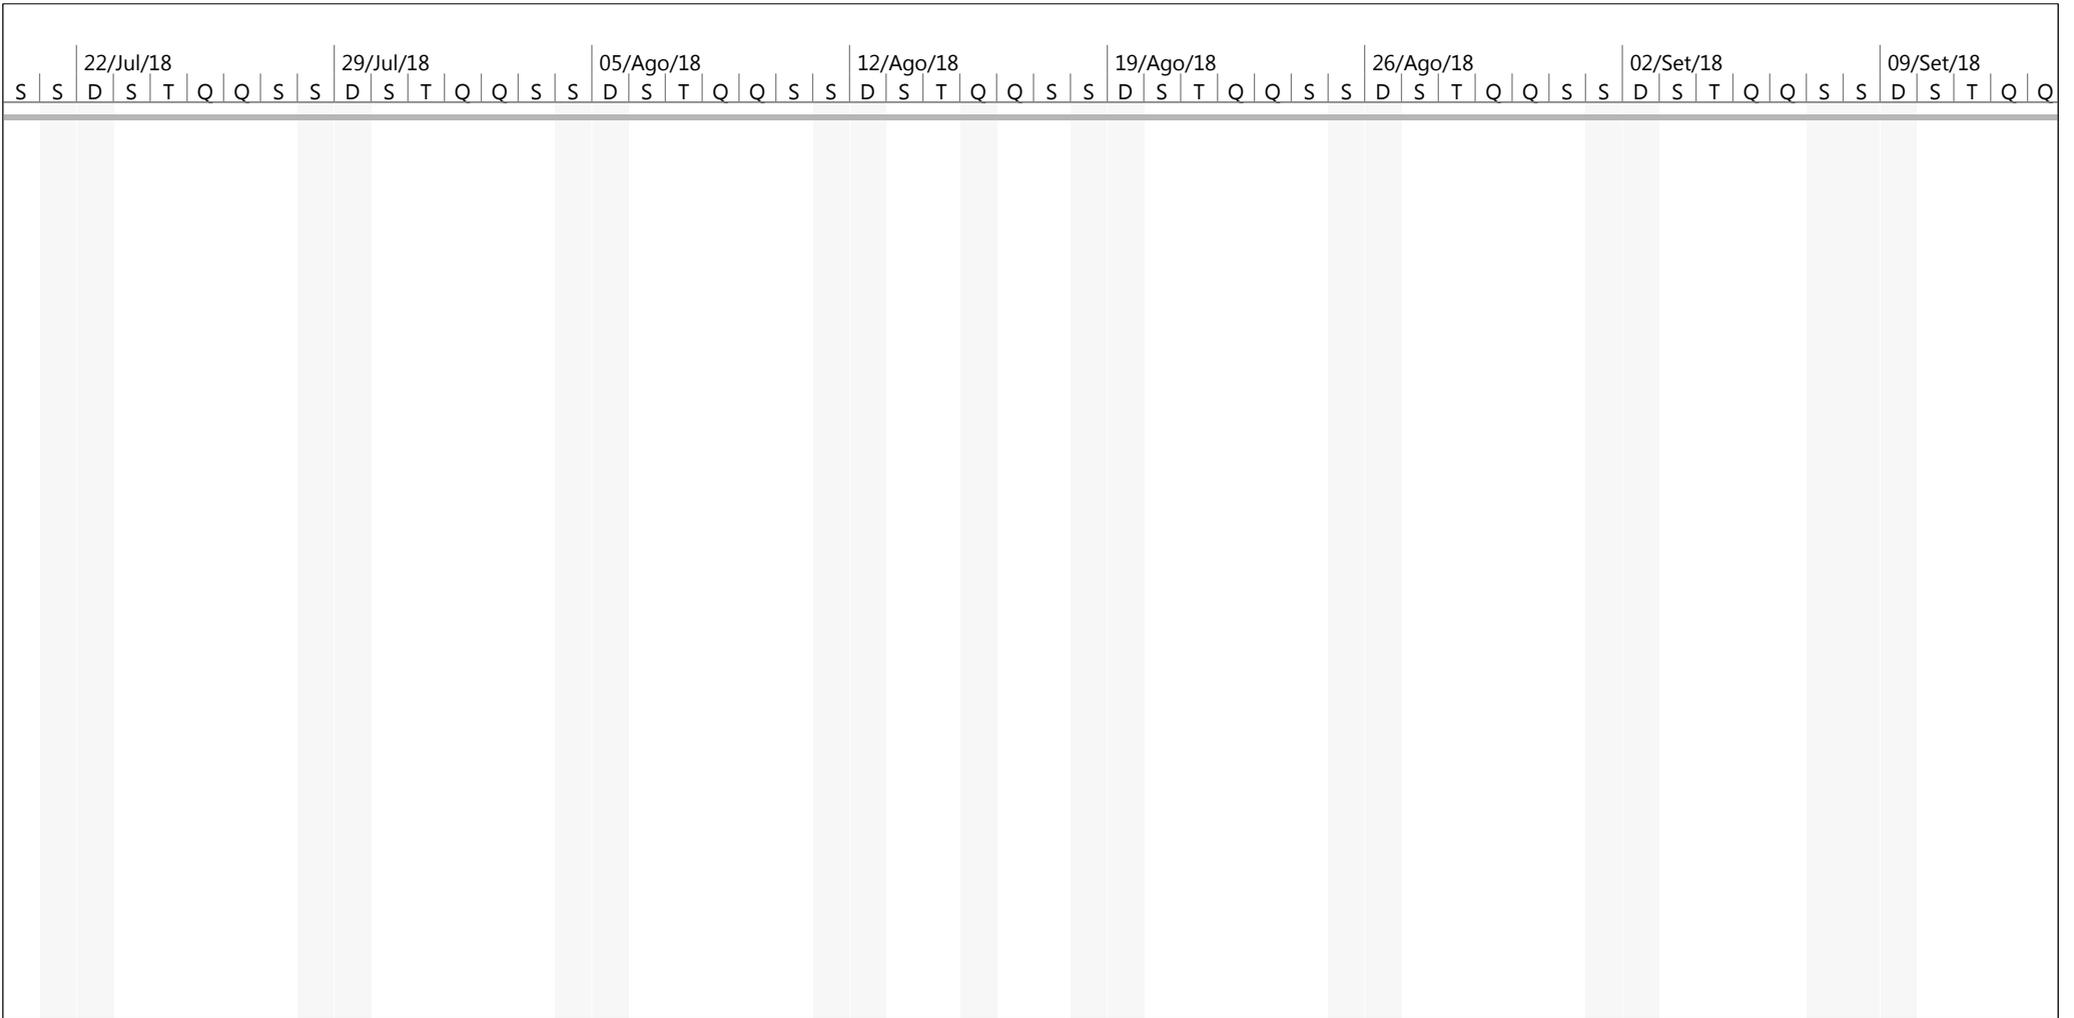


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

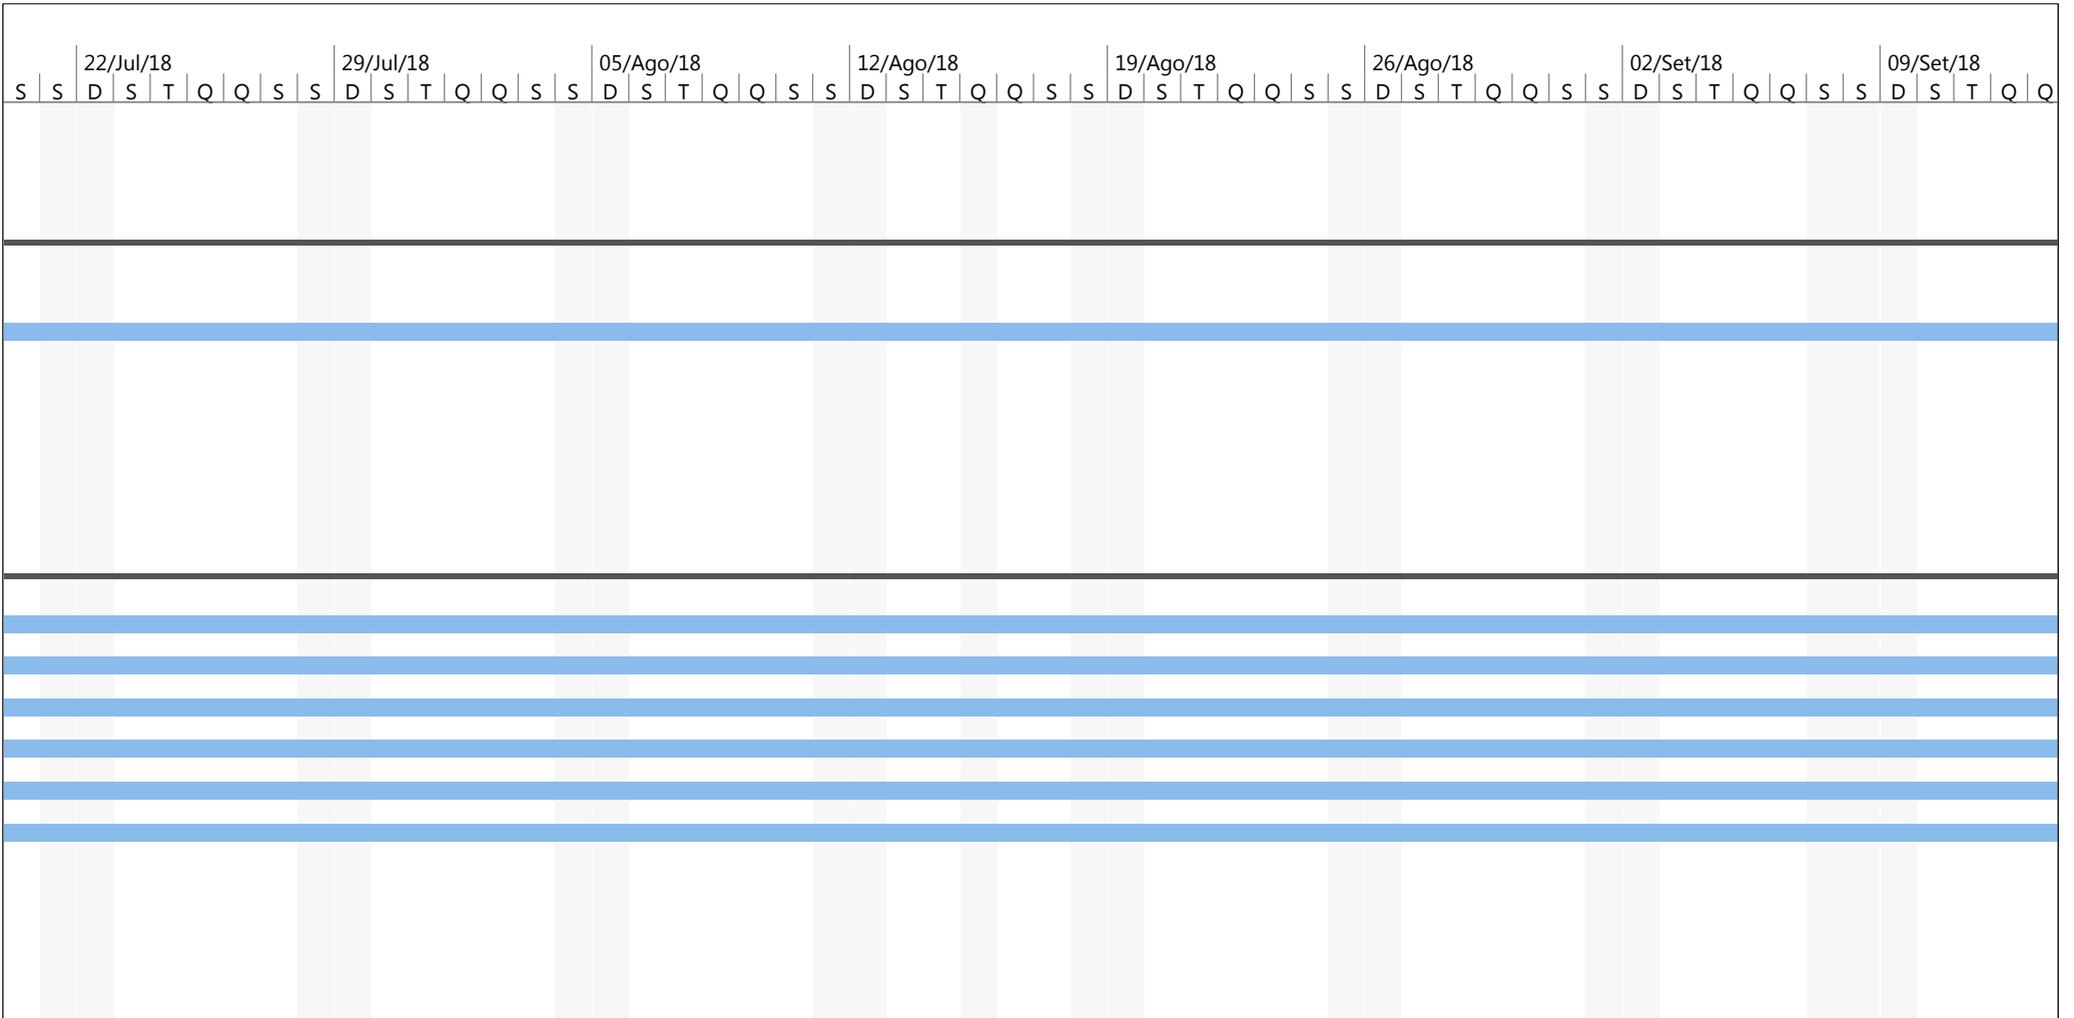

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

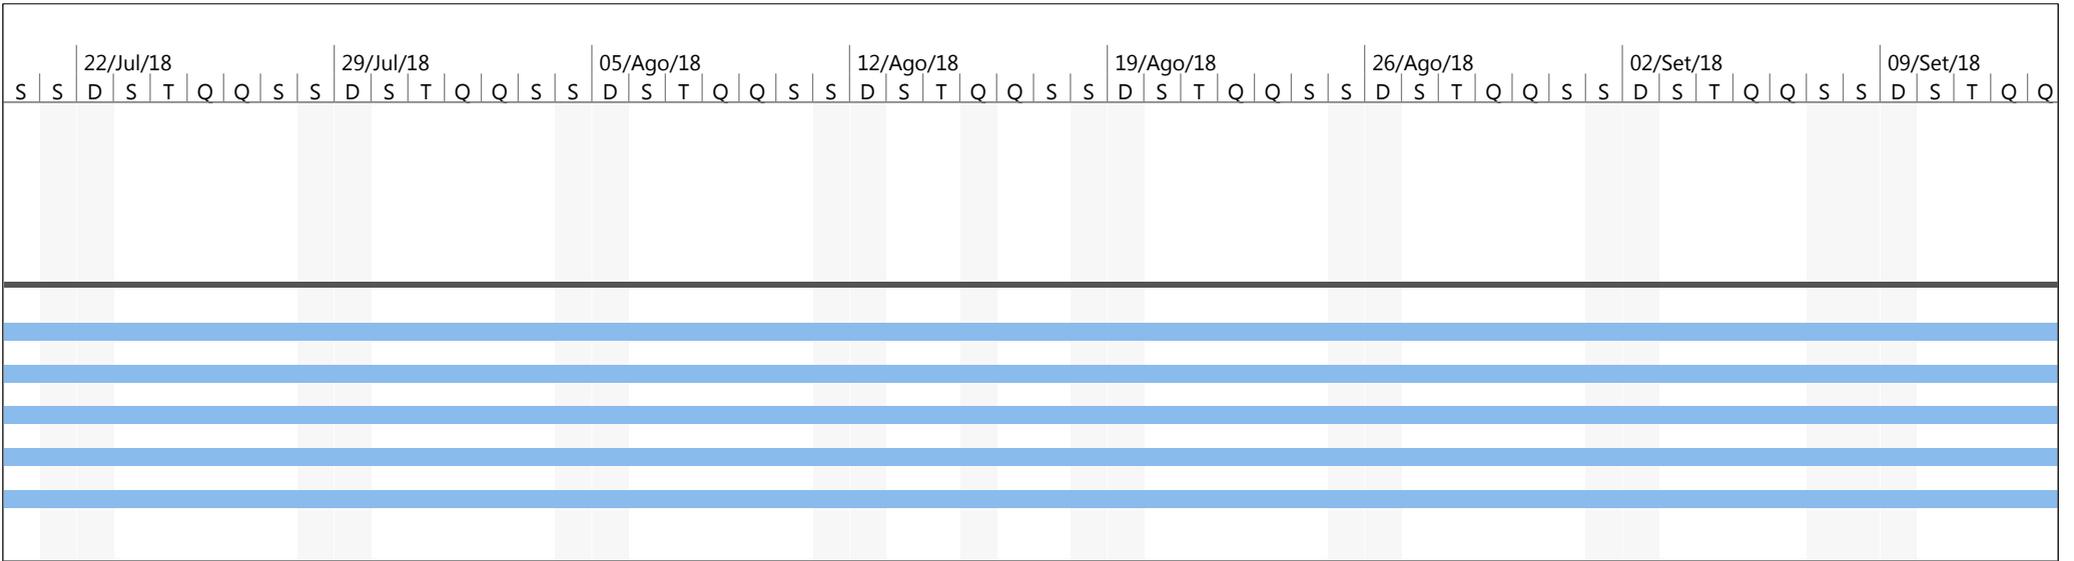

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Q S S 16/Set/18 D S T Q Q S S 23/Set/18 D S T Q Q S S 30/Set/18 D S T Q Q S S 07/Out/18 D S T Q Q S S 14/Out/18 D S T Q Q S S 21/Out/18 D S T Q Q S S 28/Out/18 D S T Q Q S S 04/Nov/18 Q

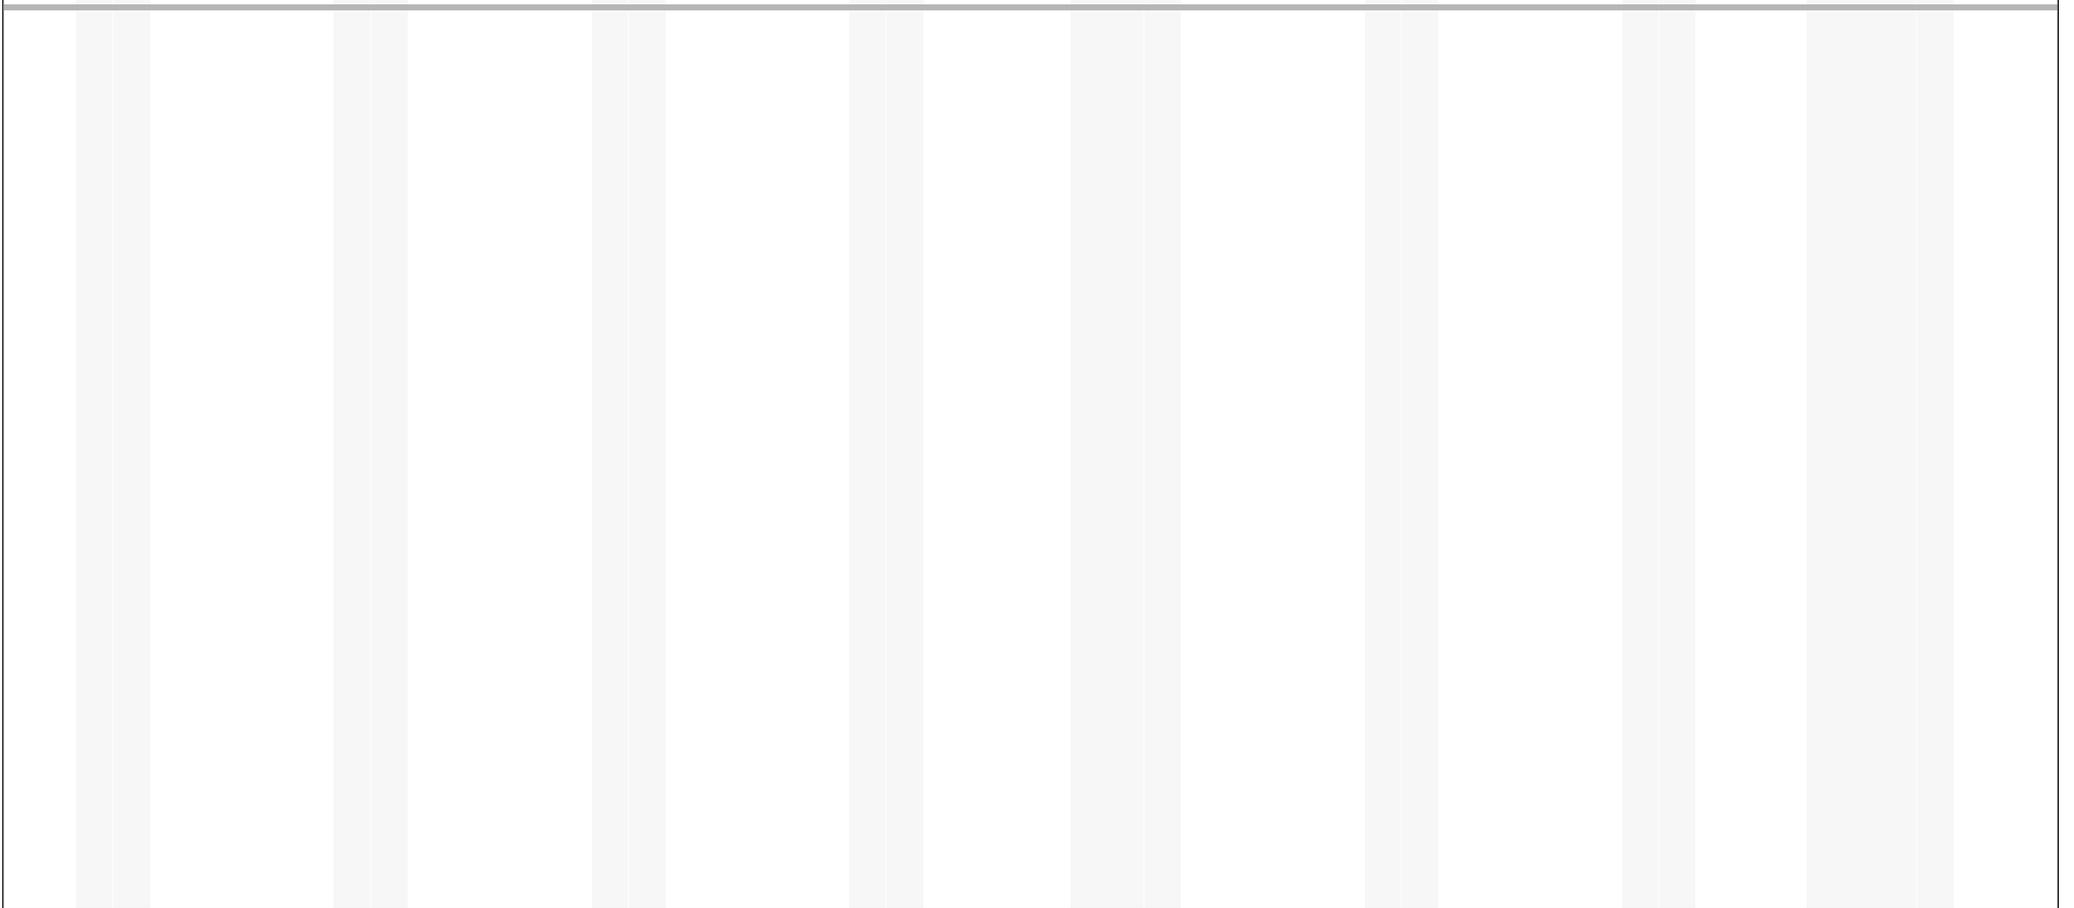



Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

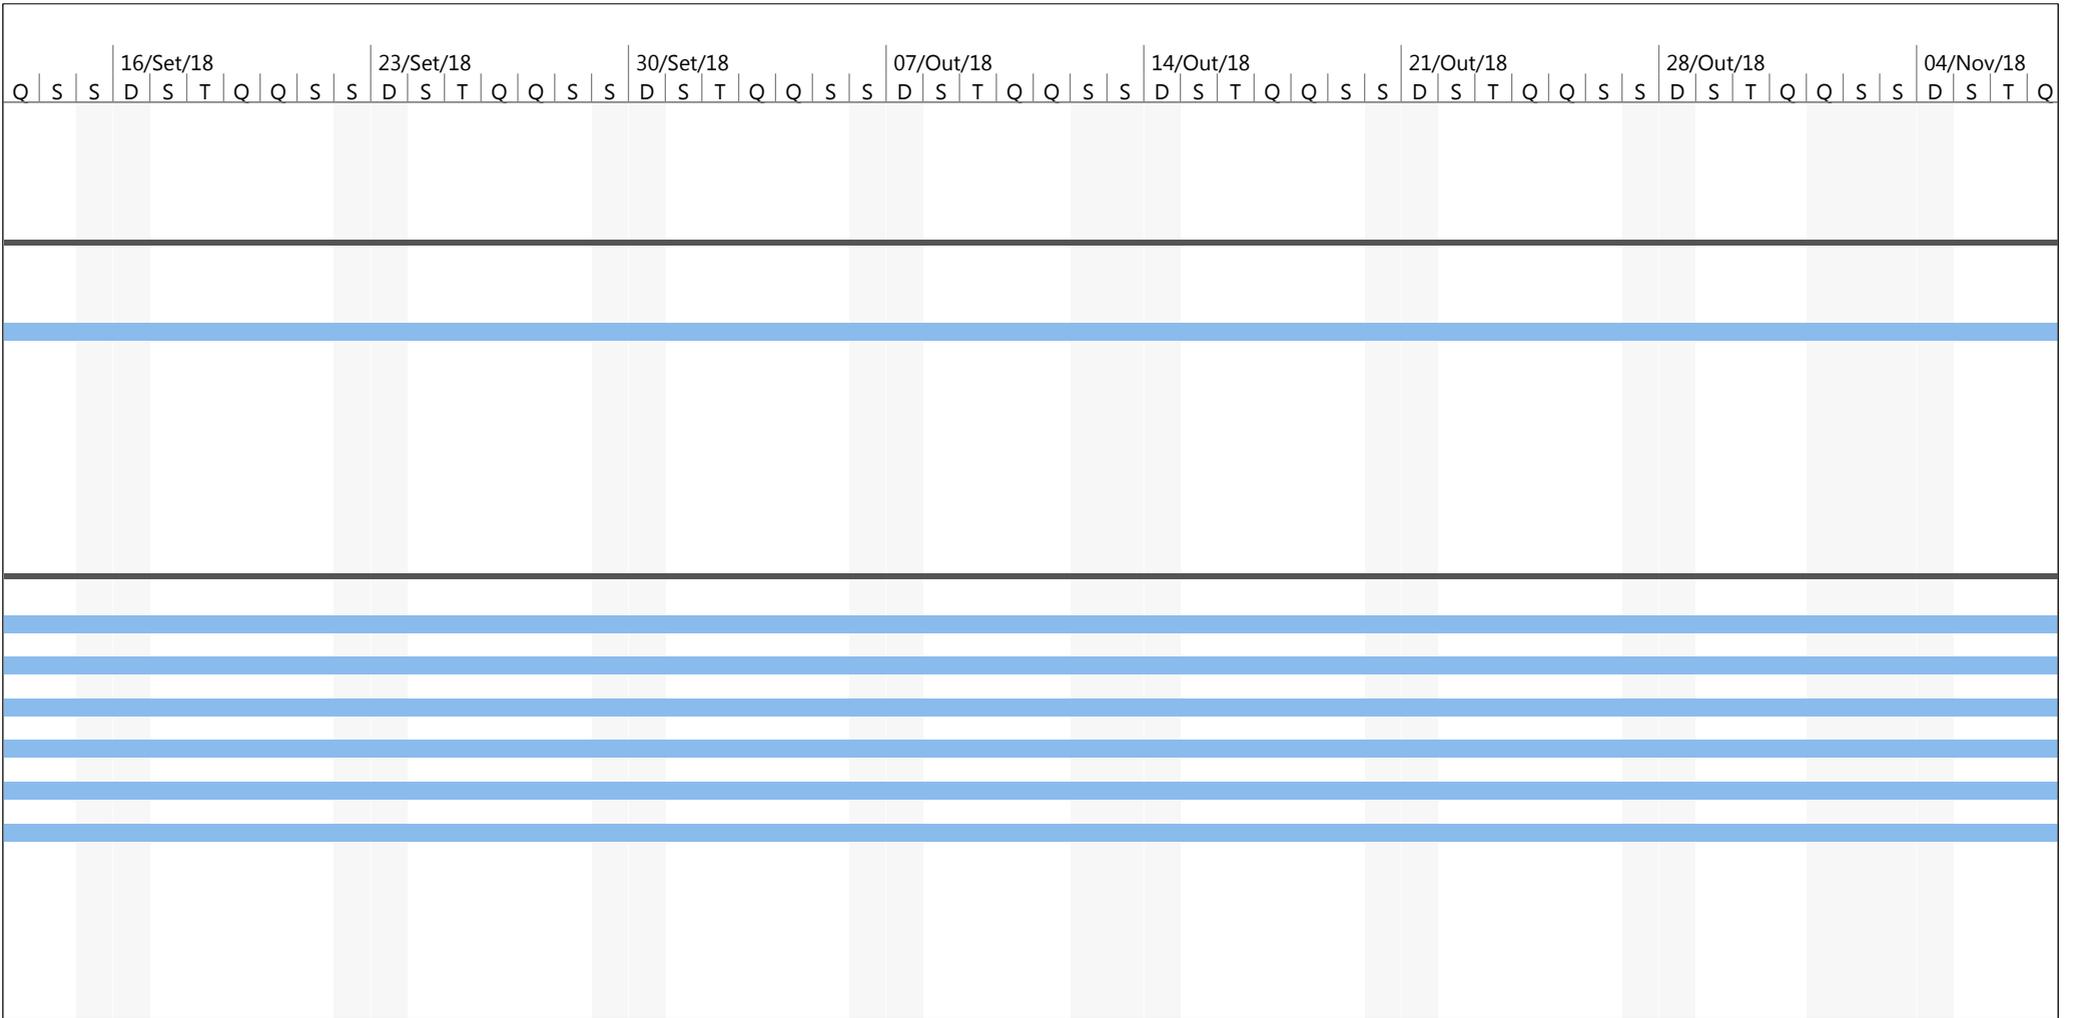

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

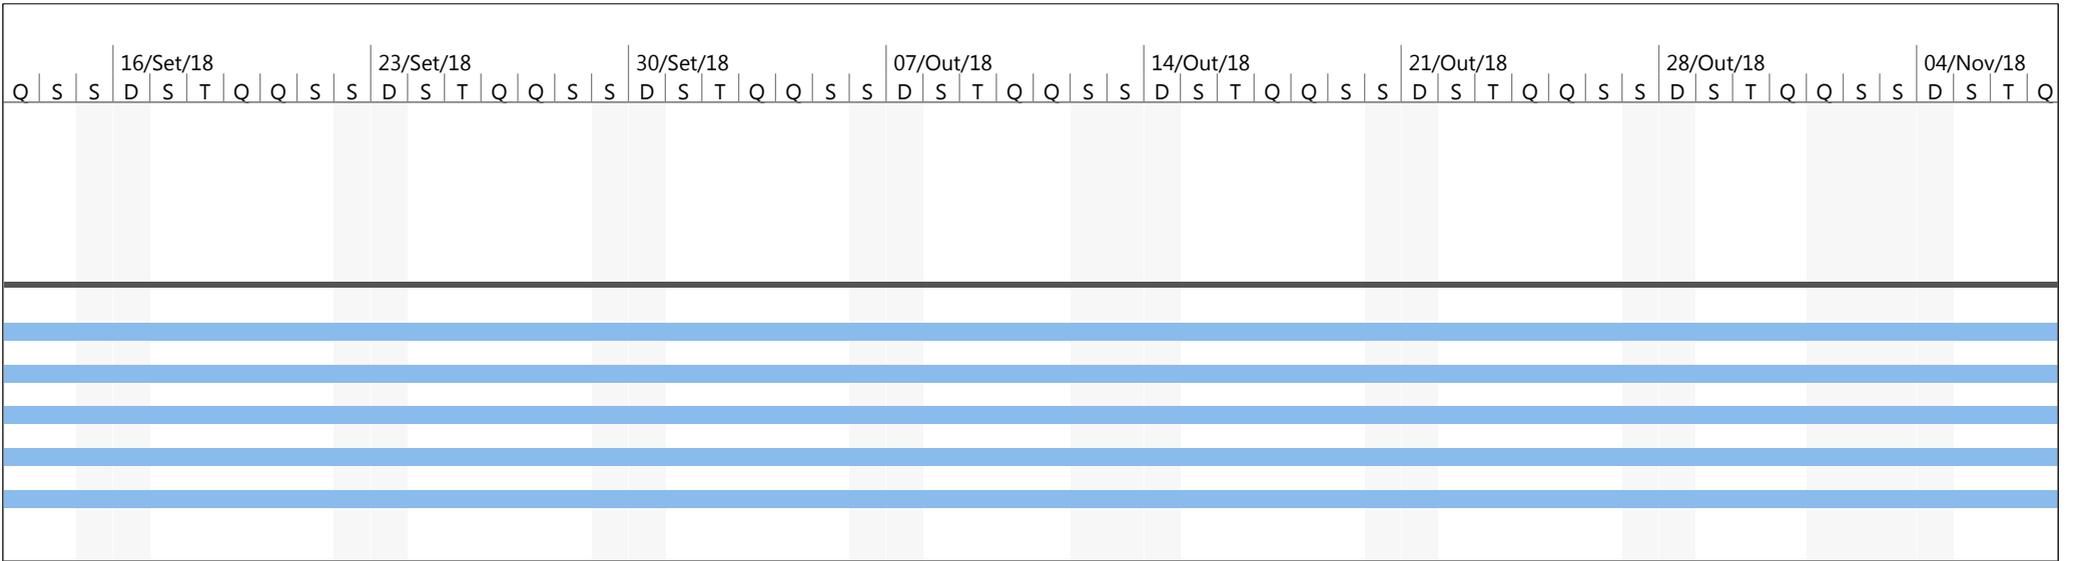

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Q Q S S 11/Nov/18 D S T Q Q S S 18/Nov/18 D S T Q Q S S 25/Nov/18 D S T Q Q S S 02/Dez/18 D S T Q Q S S 09/Dez/18 D S T Q Q S S 16/Dez/18 D S T Q Q S S 23/Dez/18 D S T Q Q S S 30/Dez/18 D S T

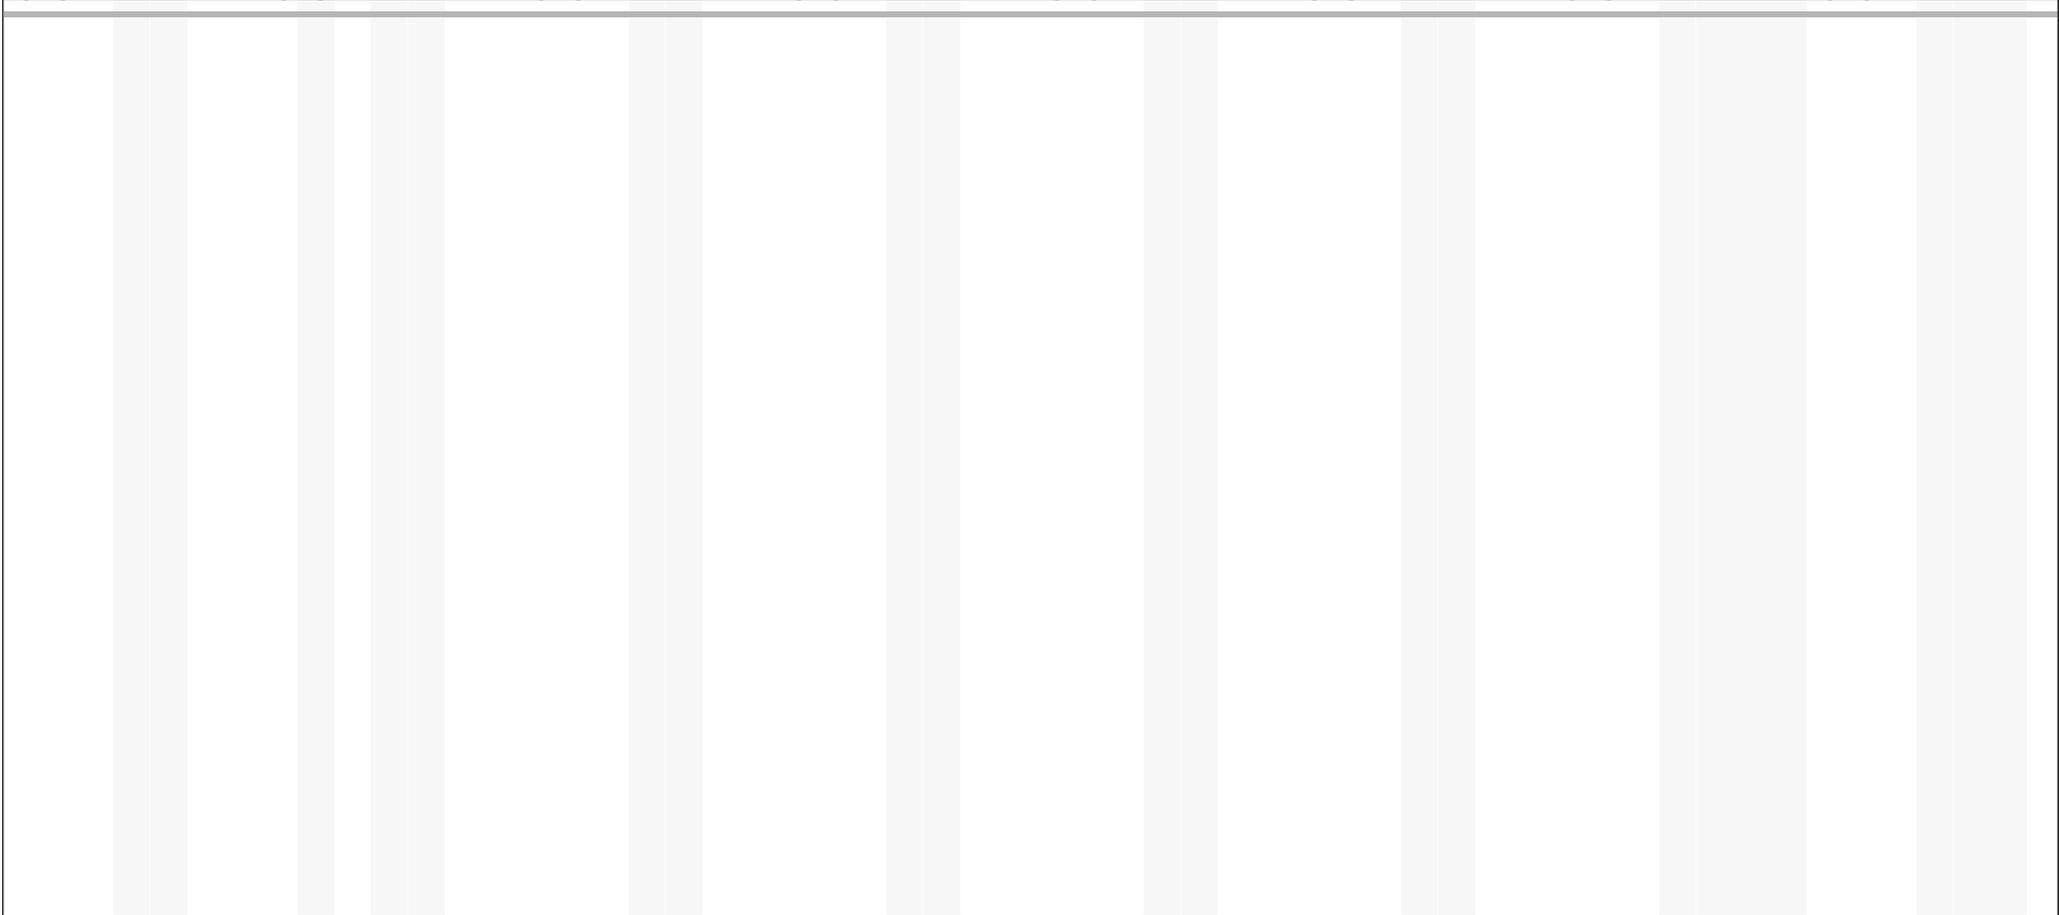


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

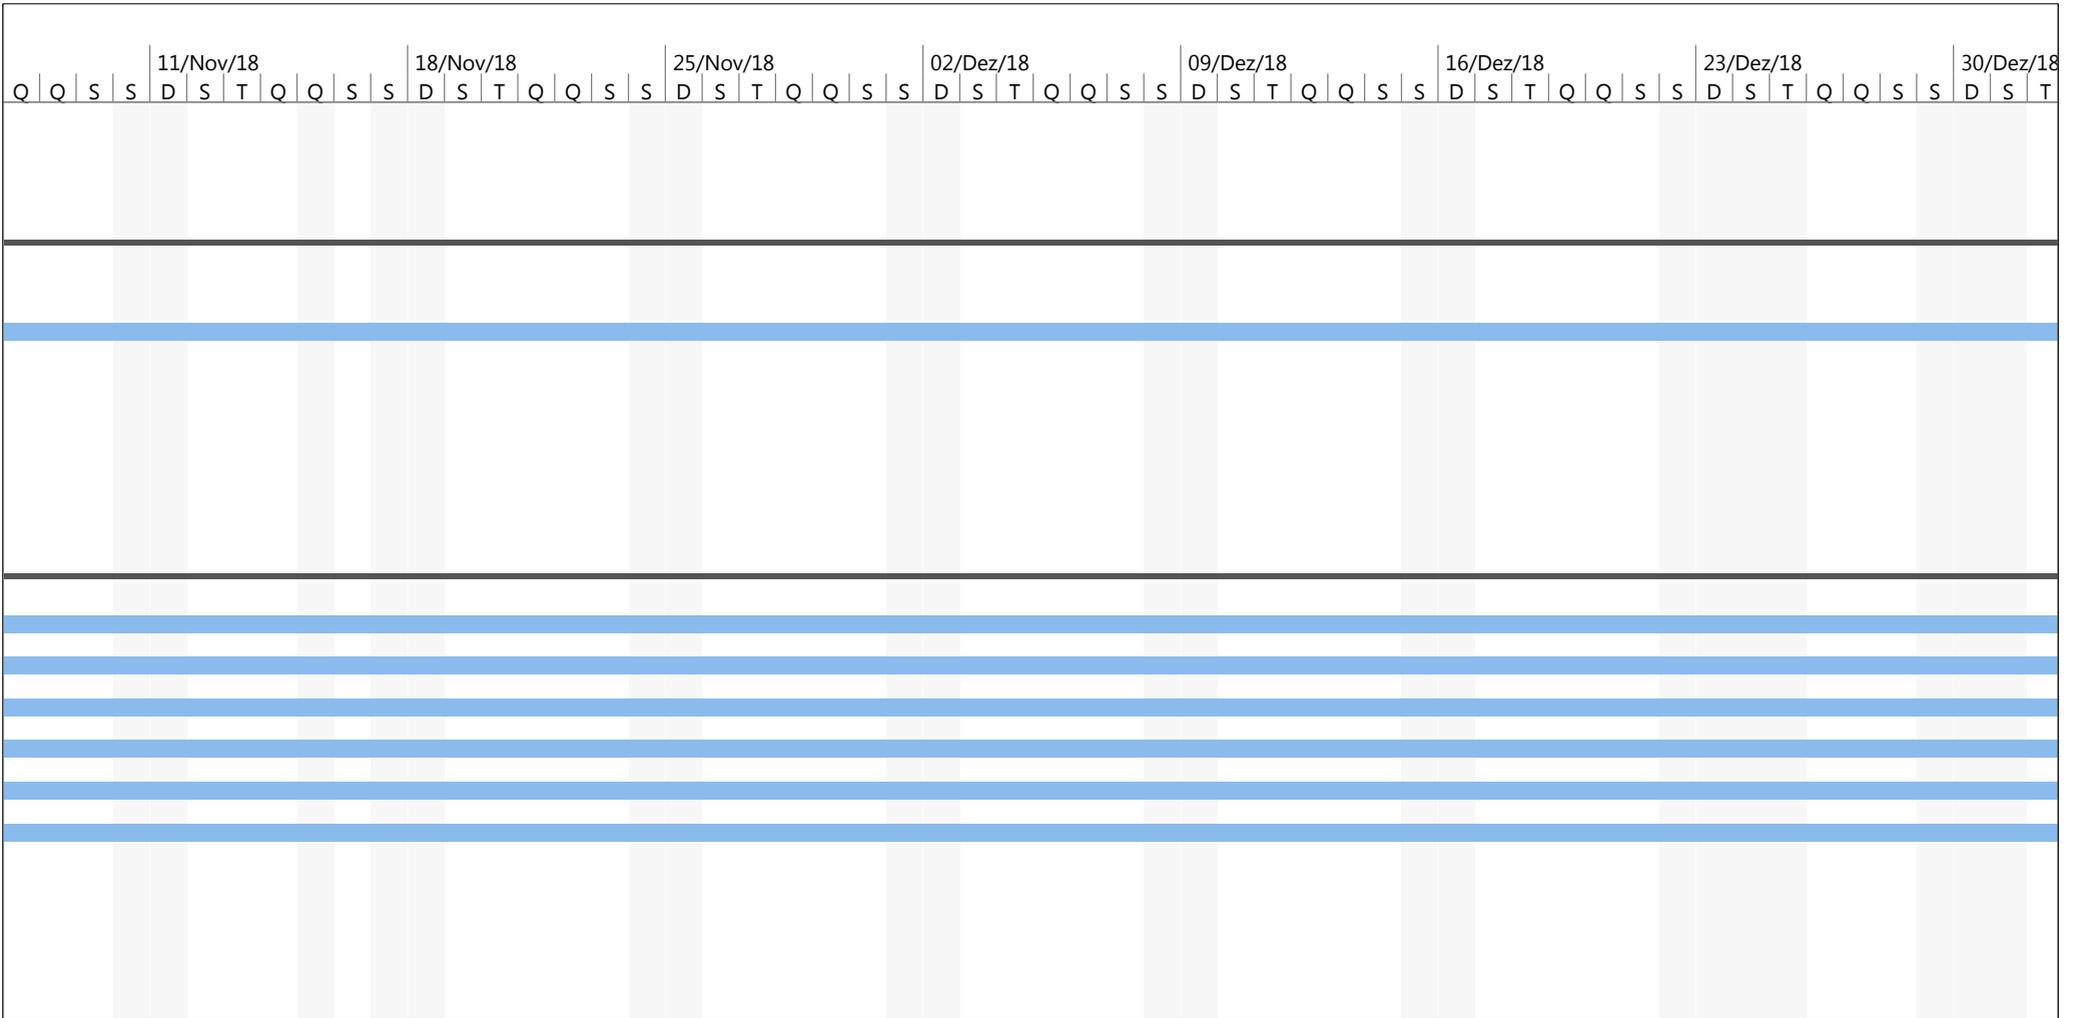

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

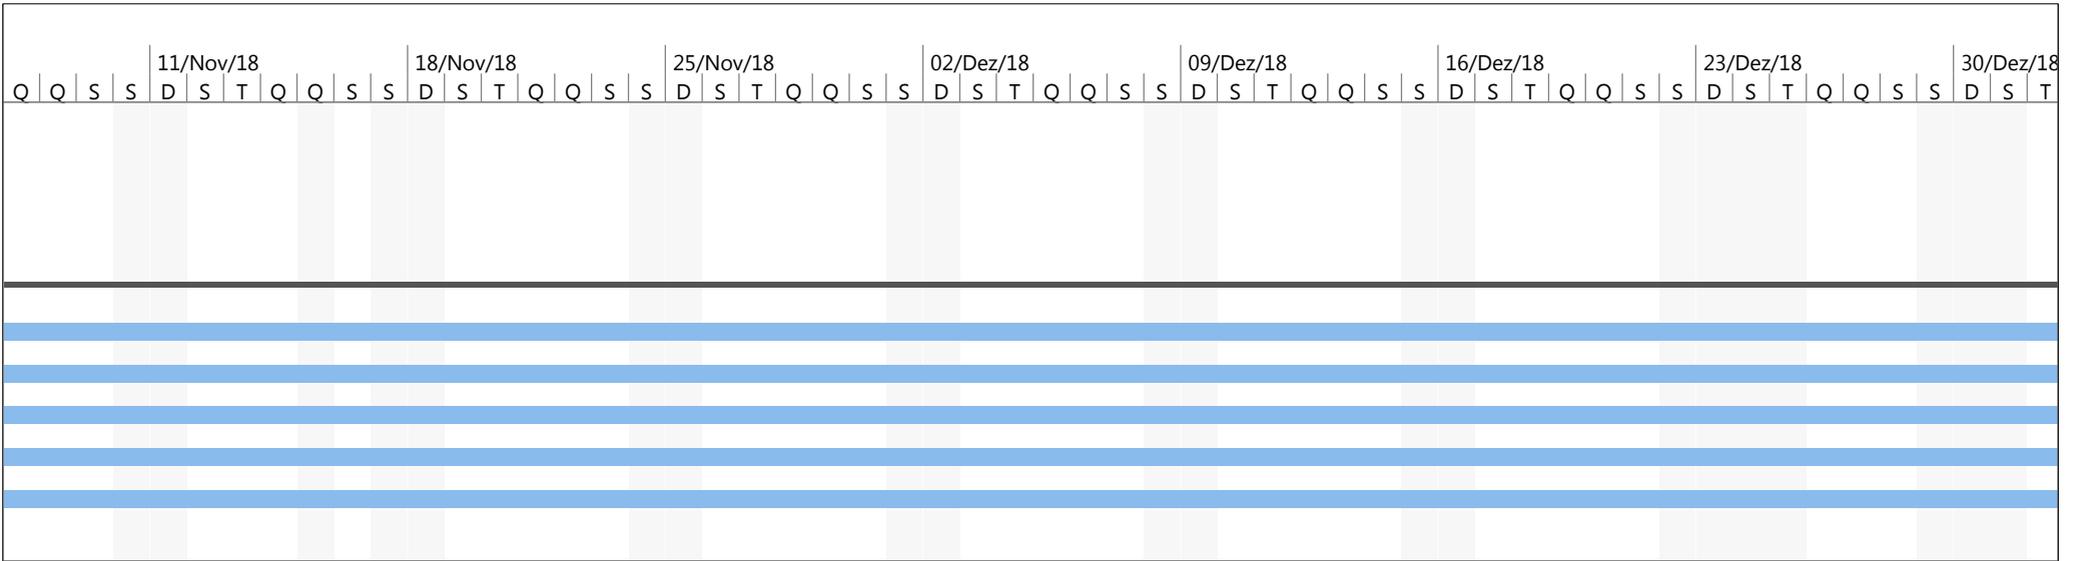

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

/18 | 06/Jan/19 | 13/Jan/19 | 20/Jan/19 | 27/Jan/19 | 03/Fev/19 | 10/Fev/19 | 17/Fev/19 | 24/Fev/19  
 T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

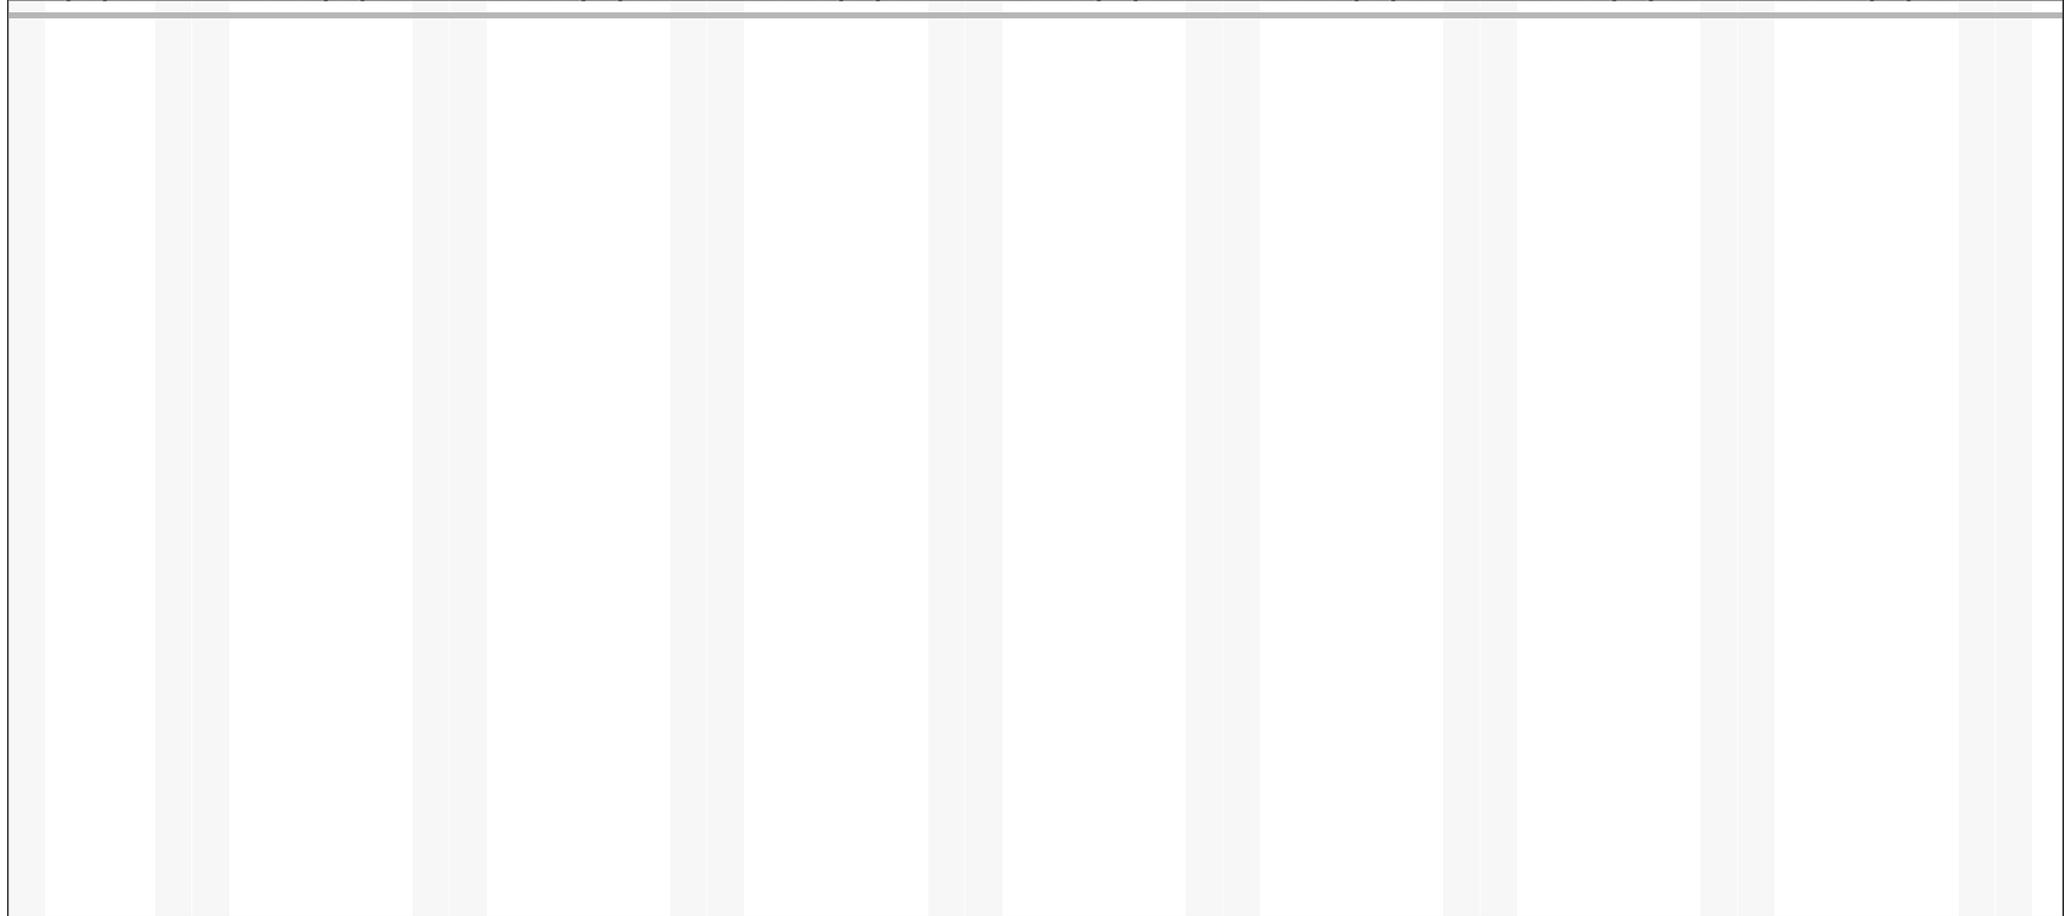


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

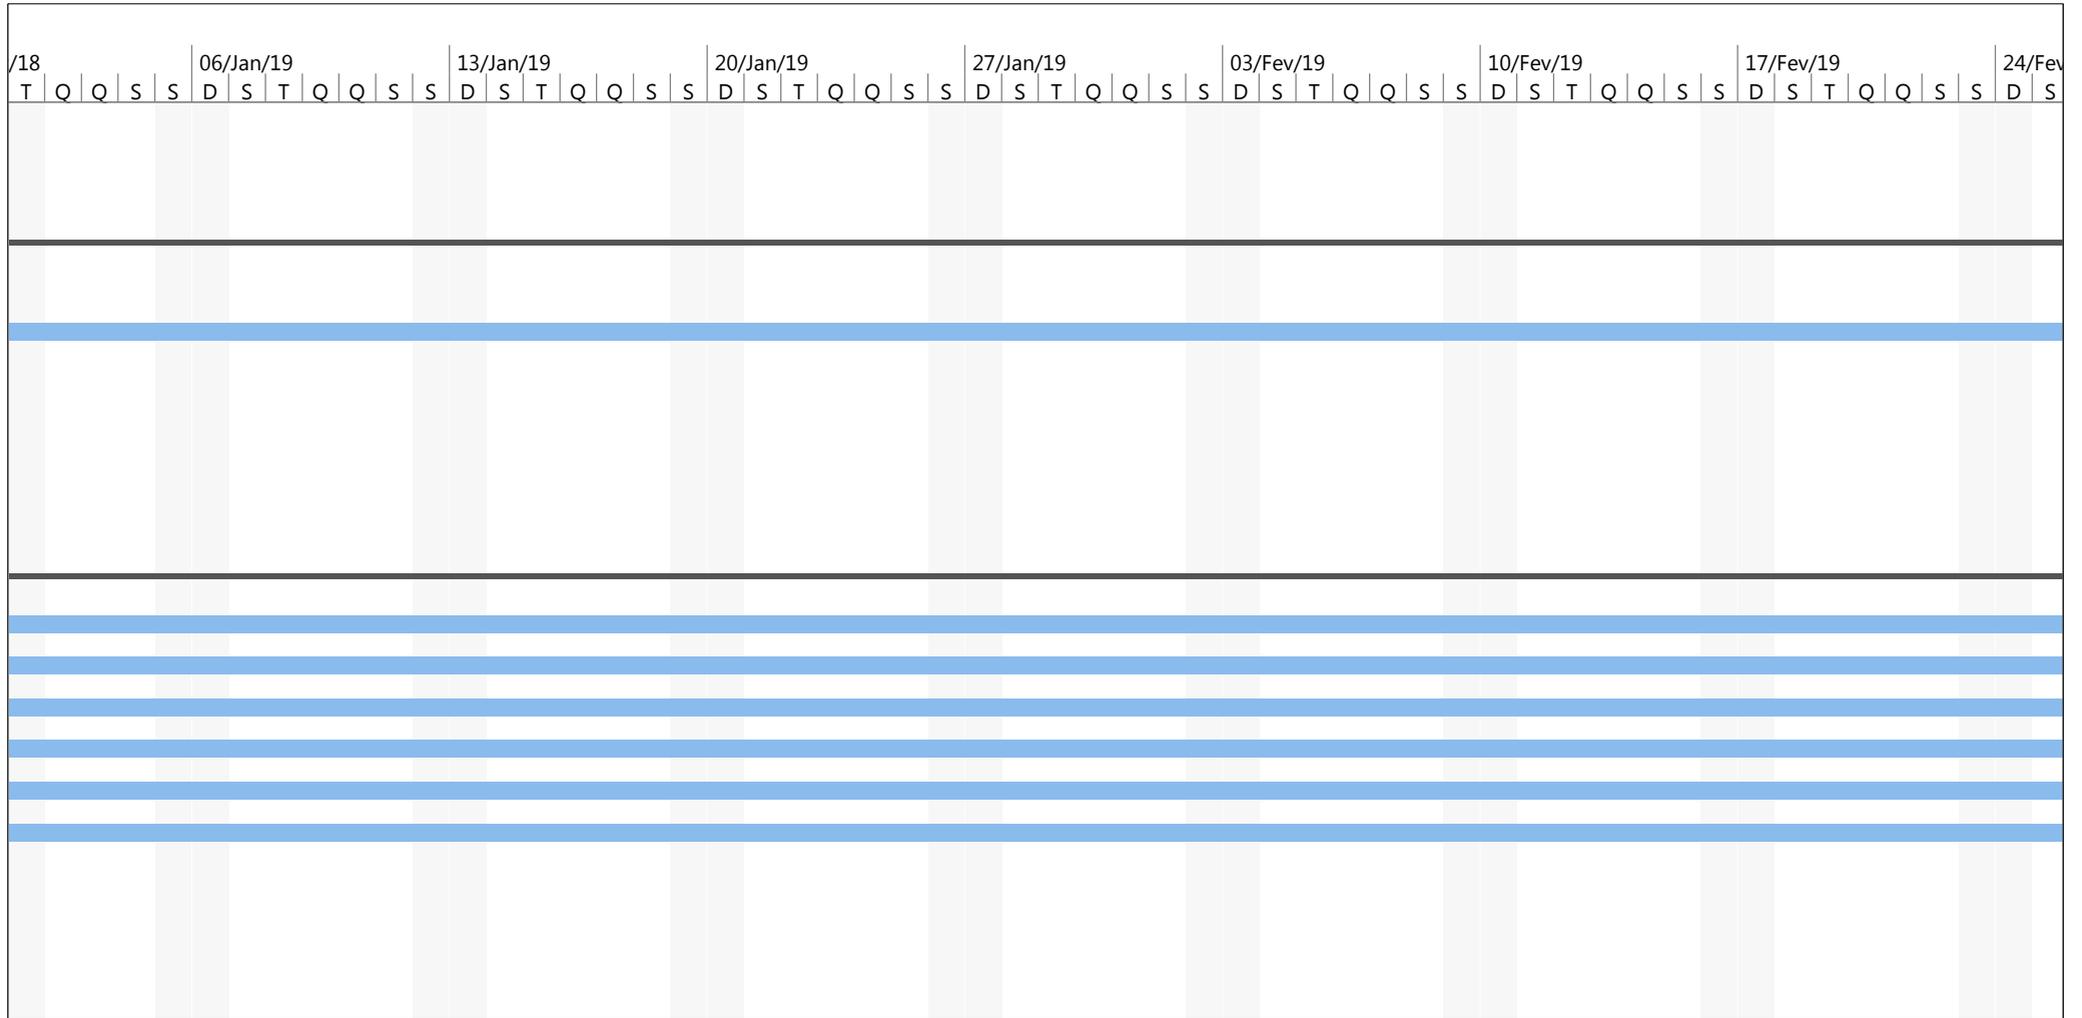

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

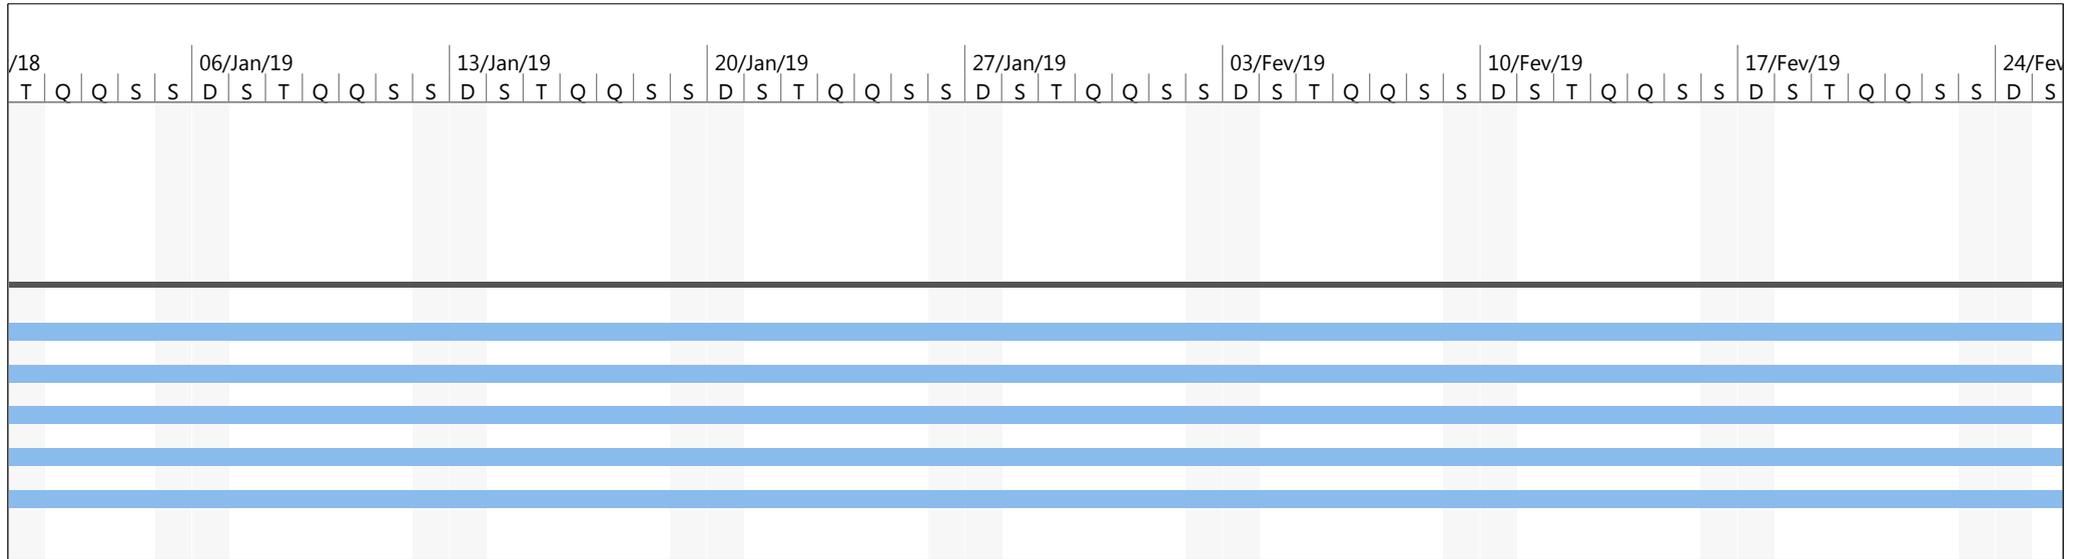

Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Fev/19 03/Mar/19 10/Mar/19 17/Mar/19 24/Mar/19 31/Mar/19 07/Abr/19 14/Abr/19 21

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

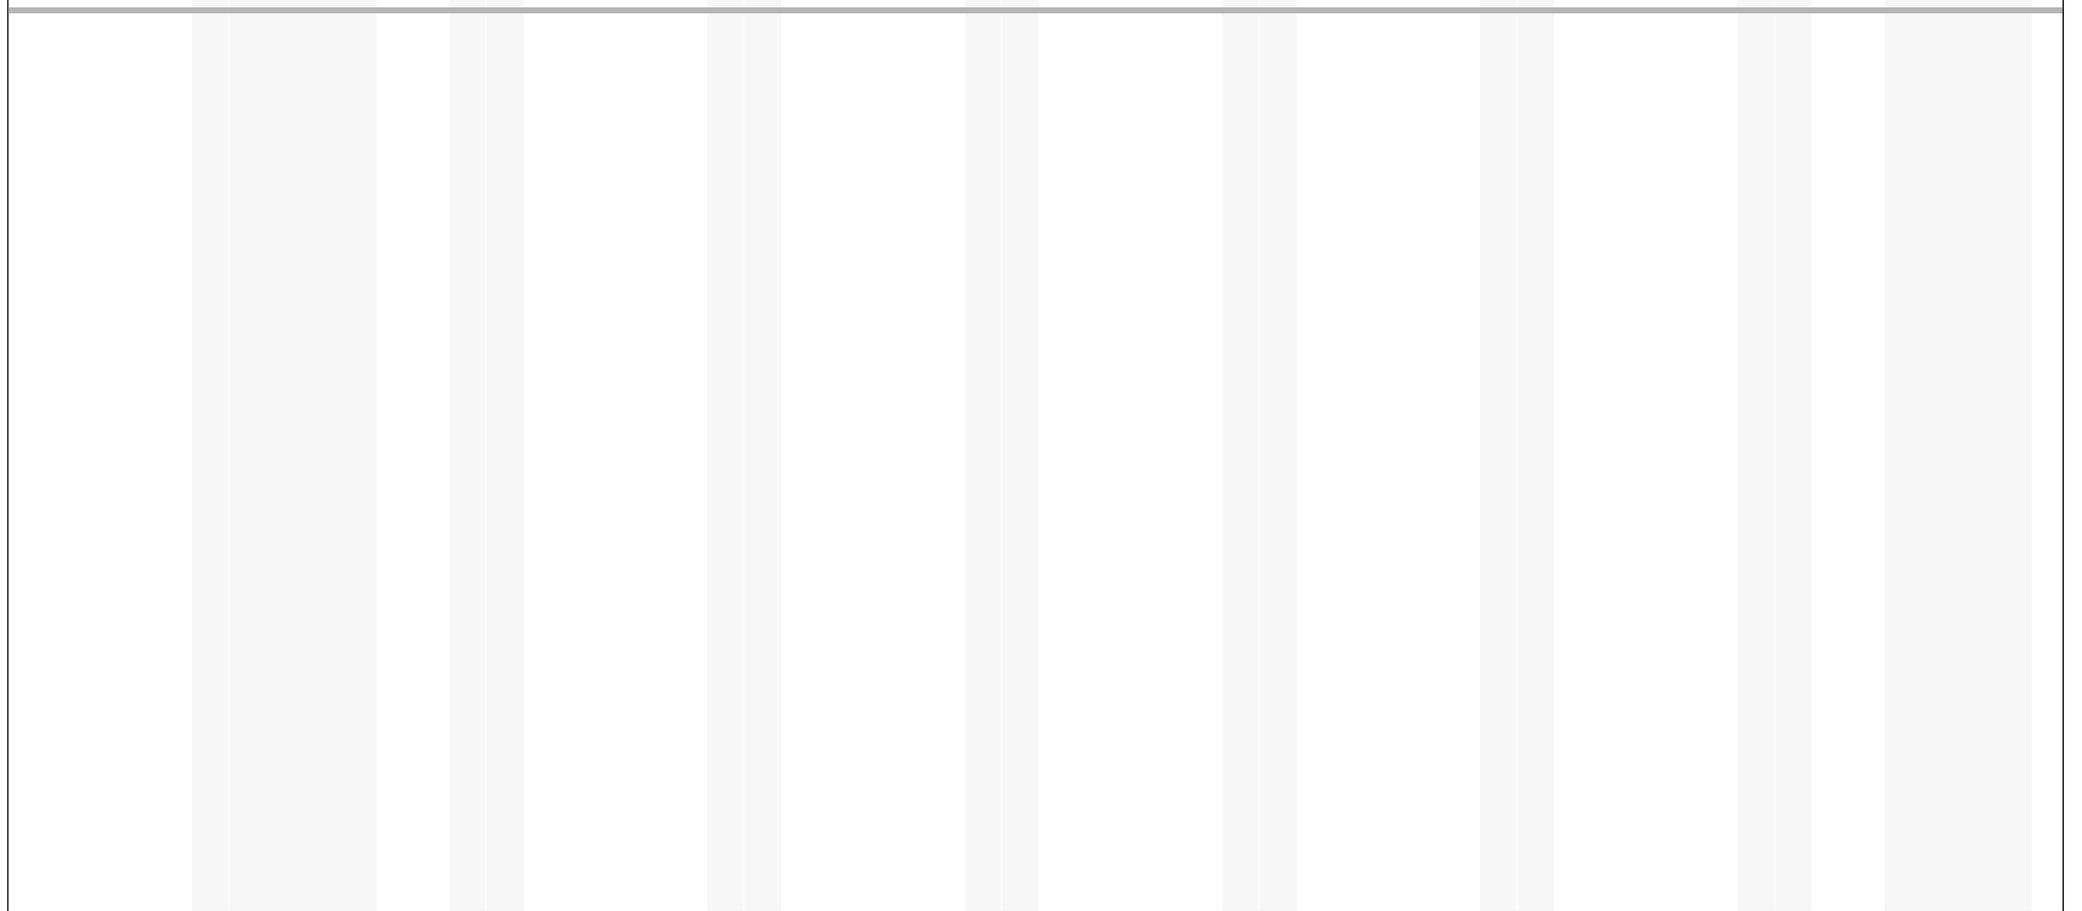


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Fev/19 03/Mar/19 10/Mar/19 17/Mar/19 24/Mar/19 31/Mar/19 07/Abr/19 14/Abr/19 21

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

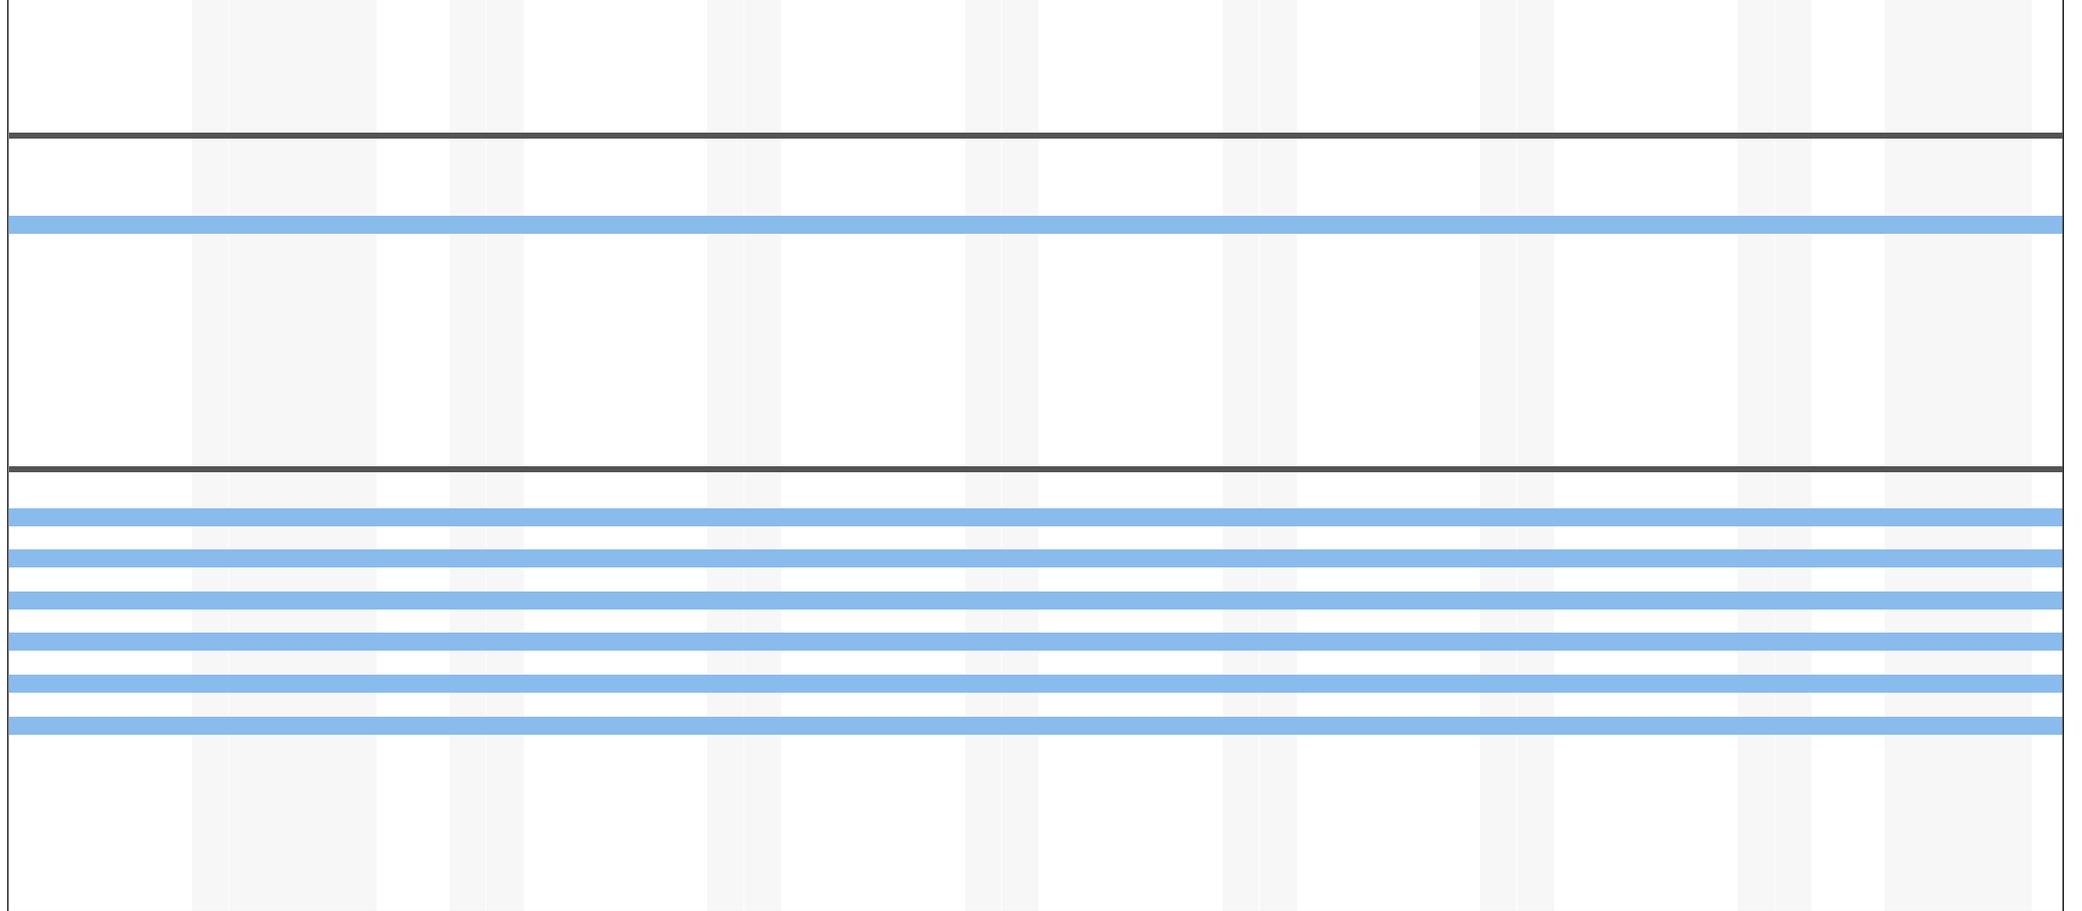

Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

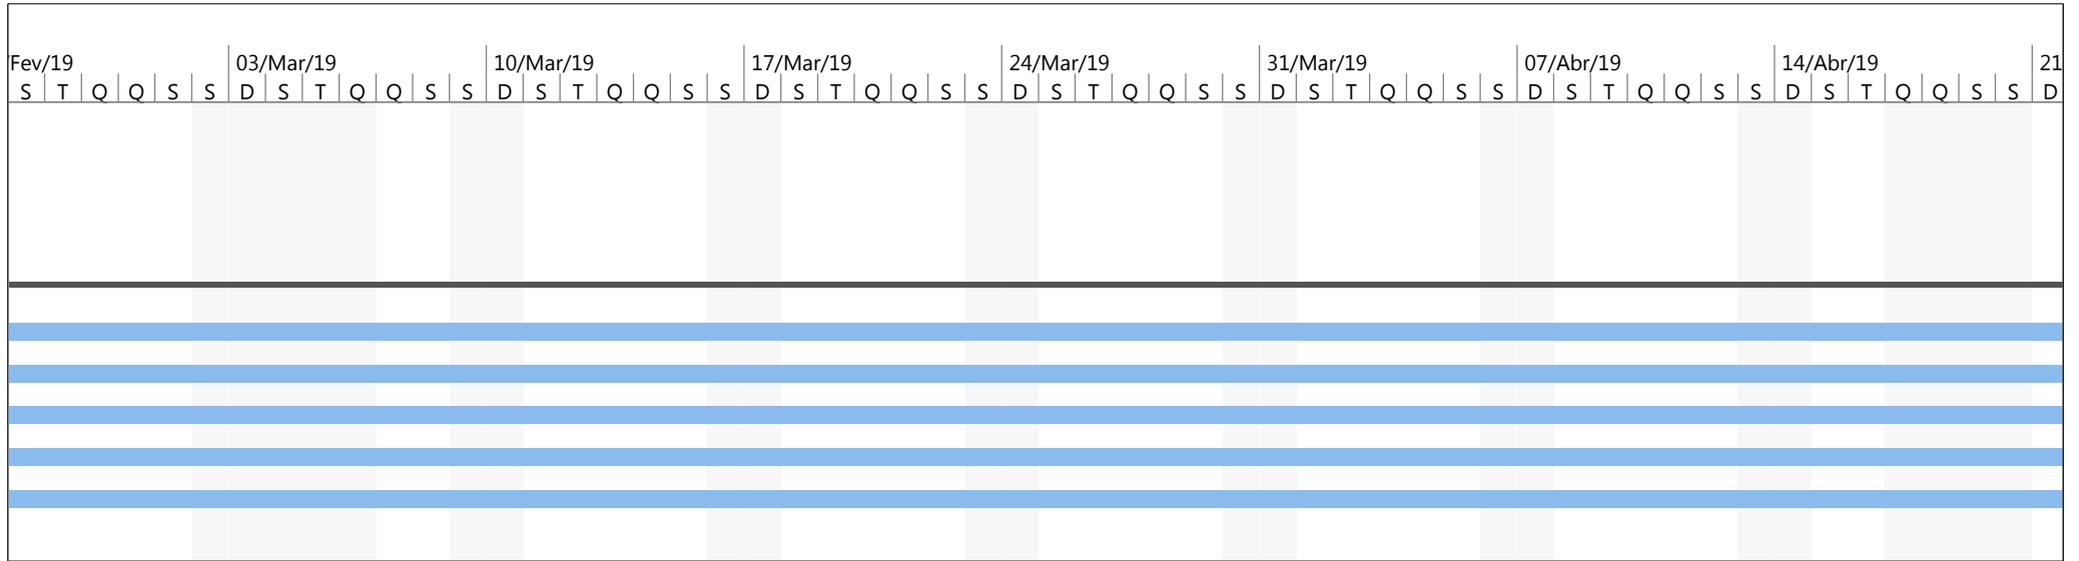

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


21/Abr/19 | 28/Abr/19 | 05/Maio/19 | 12/Maio/19 | 19/Maio/19 | 26/Maio/19 | 02/Jun/19 | 09/Jun/19  
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

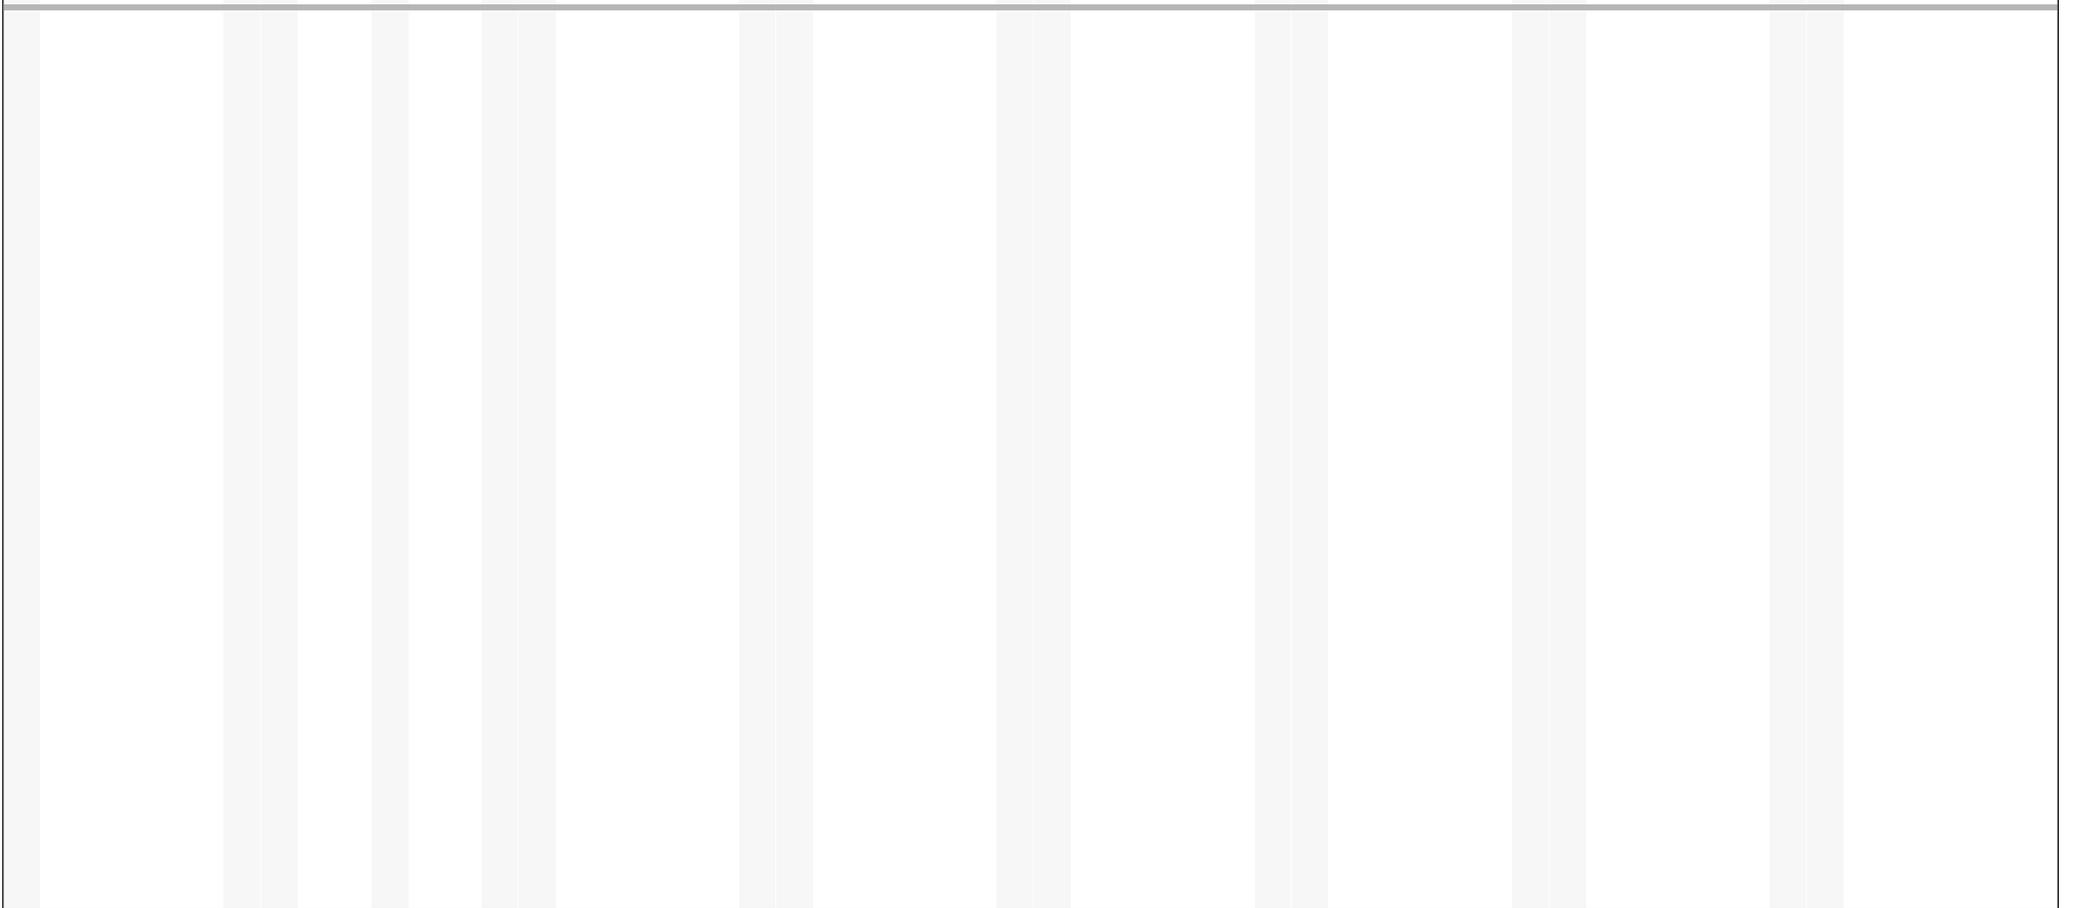

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


21/Abr/19 | 28/Abr/19 | 05/Maio/19 | 12/Maio/19 | 19/Maio/19 | 26/Maio/19 | 02/Jun/19 | 09/Jun/19  
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

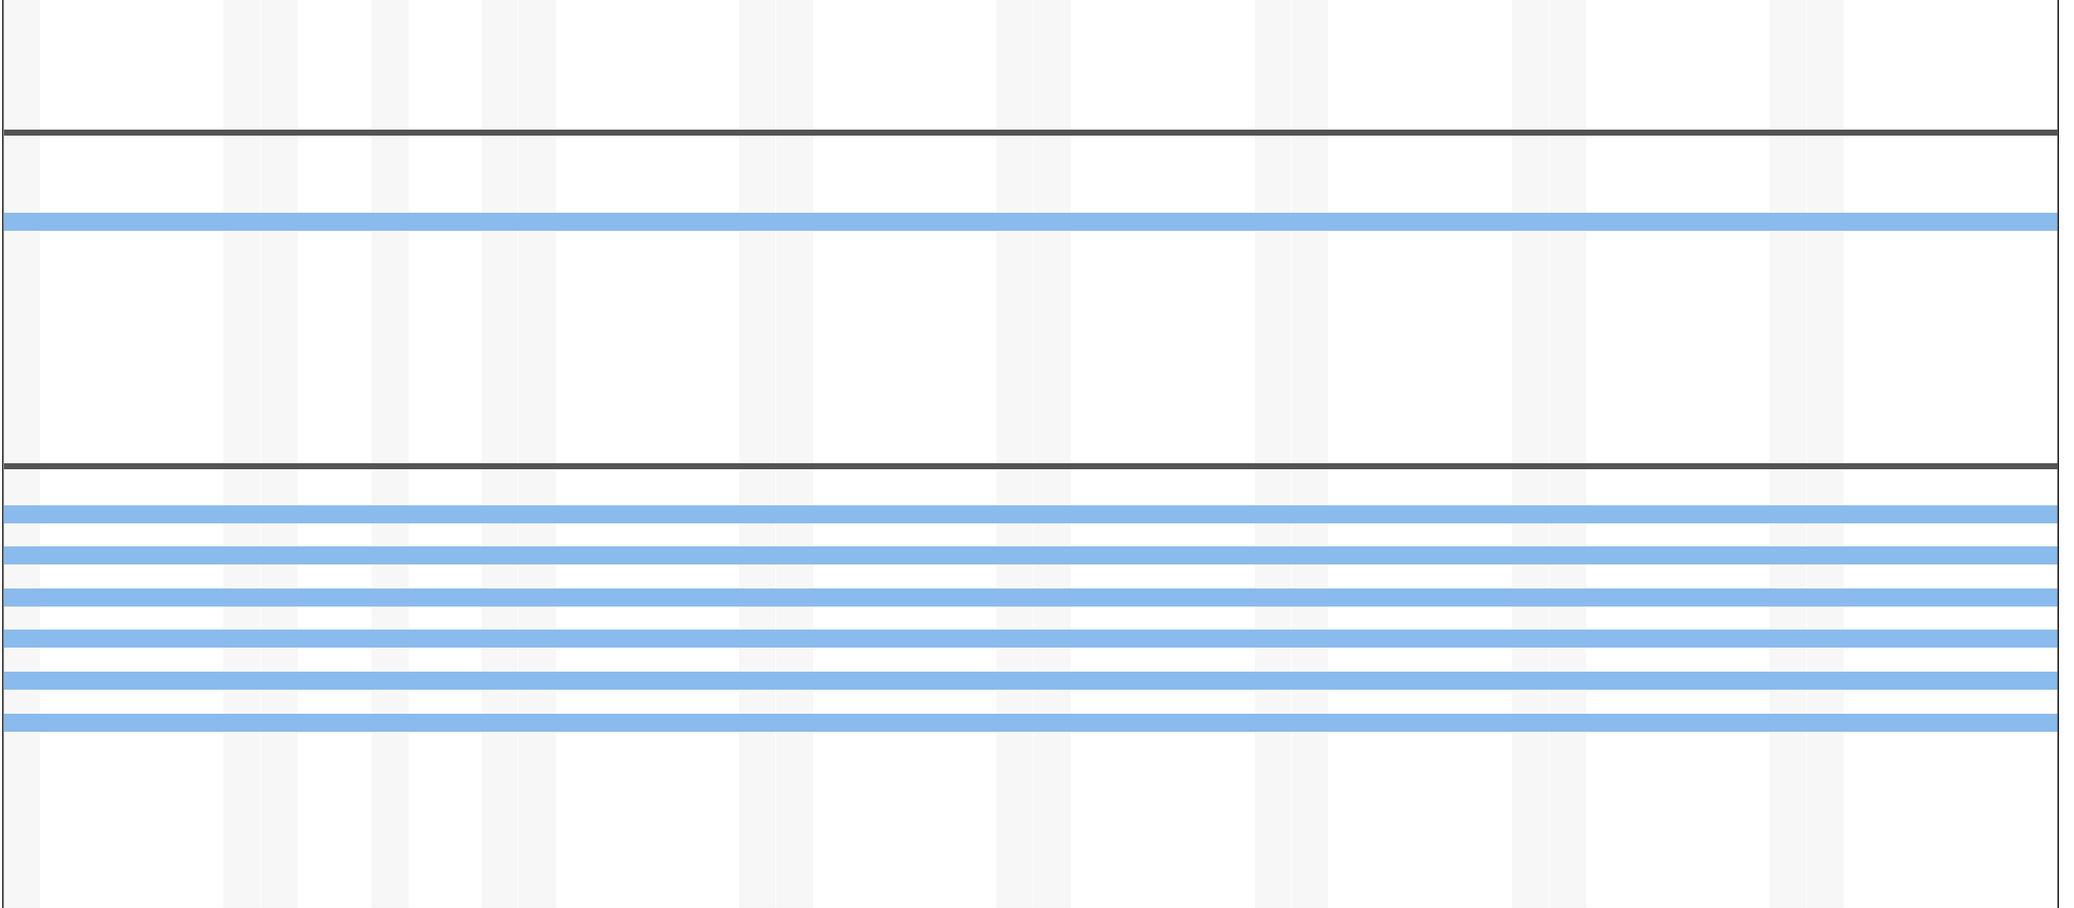

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

21/Abr/19 | 28/Abr/19 | 05/Maio/19 | 12/Maio/19 | 19/Maio/19 | 26/Maio/19 | 02/Jun/19 | 09/Jun/19  
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

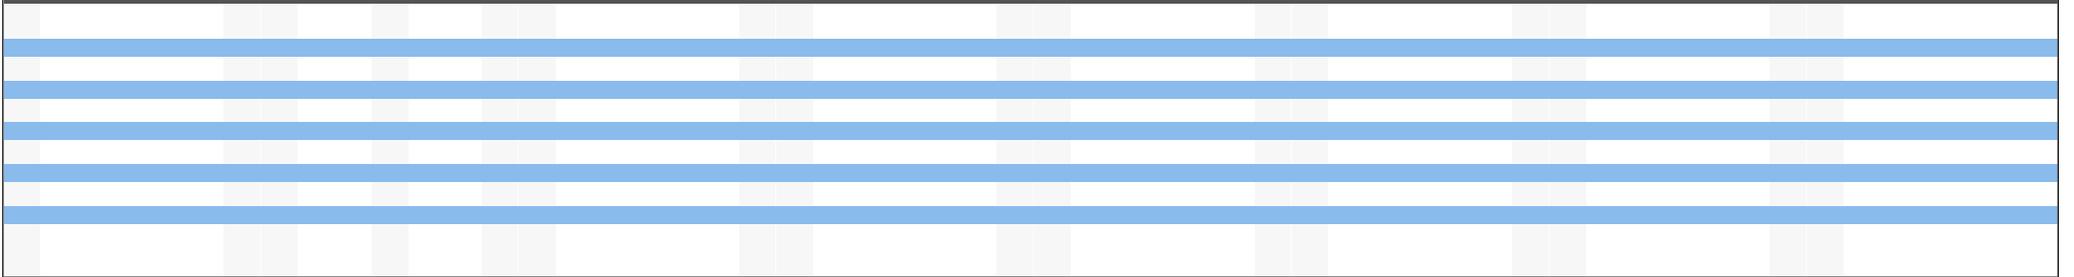


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

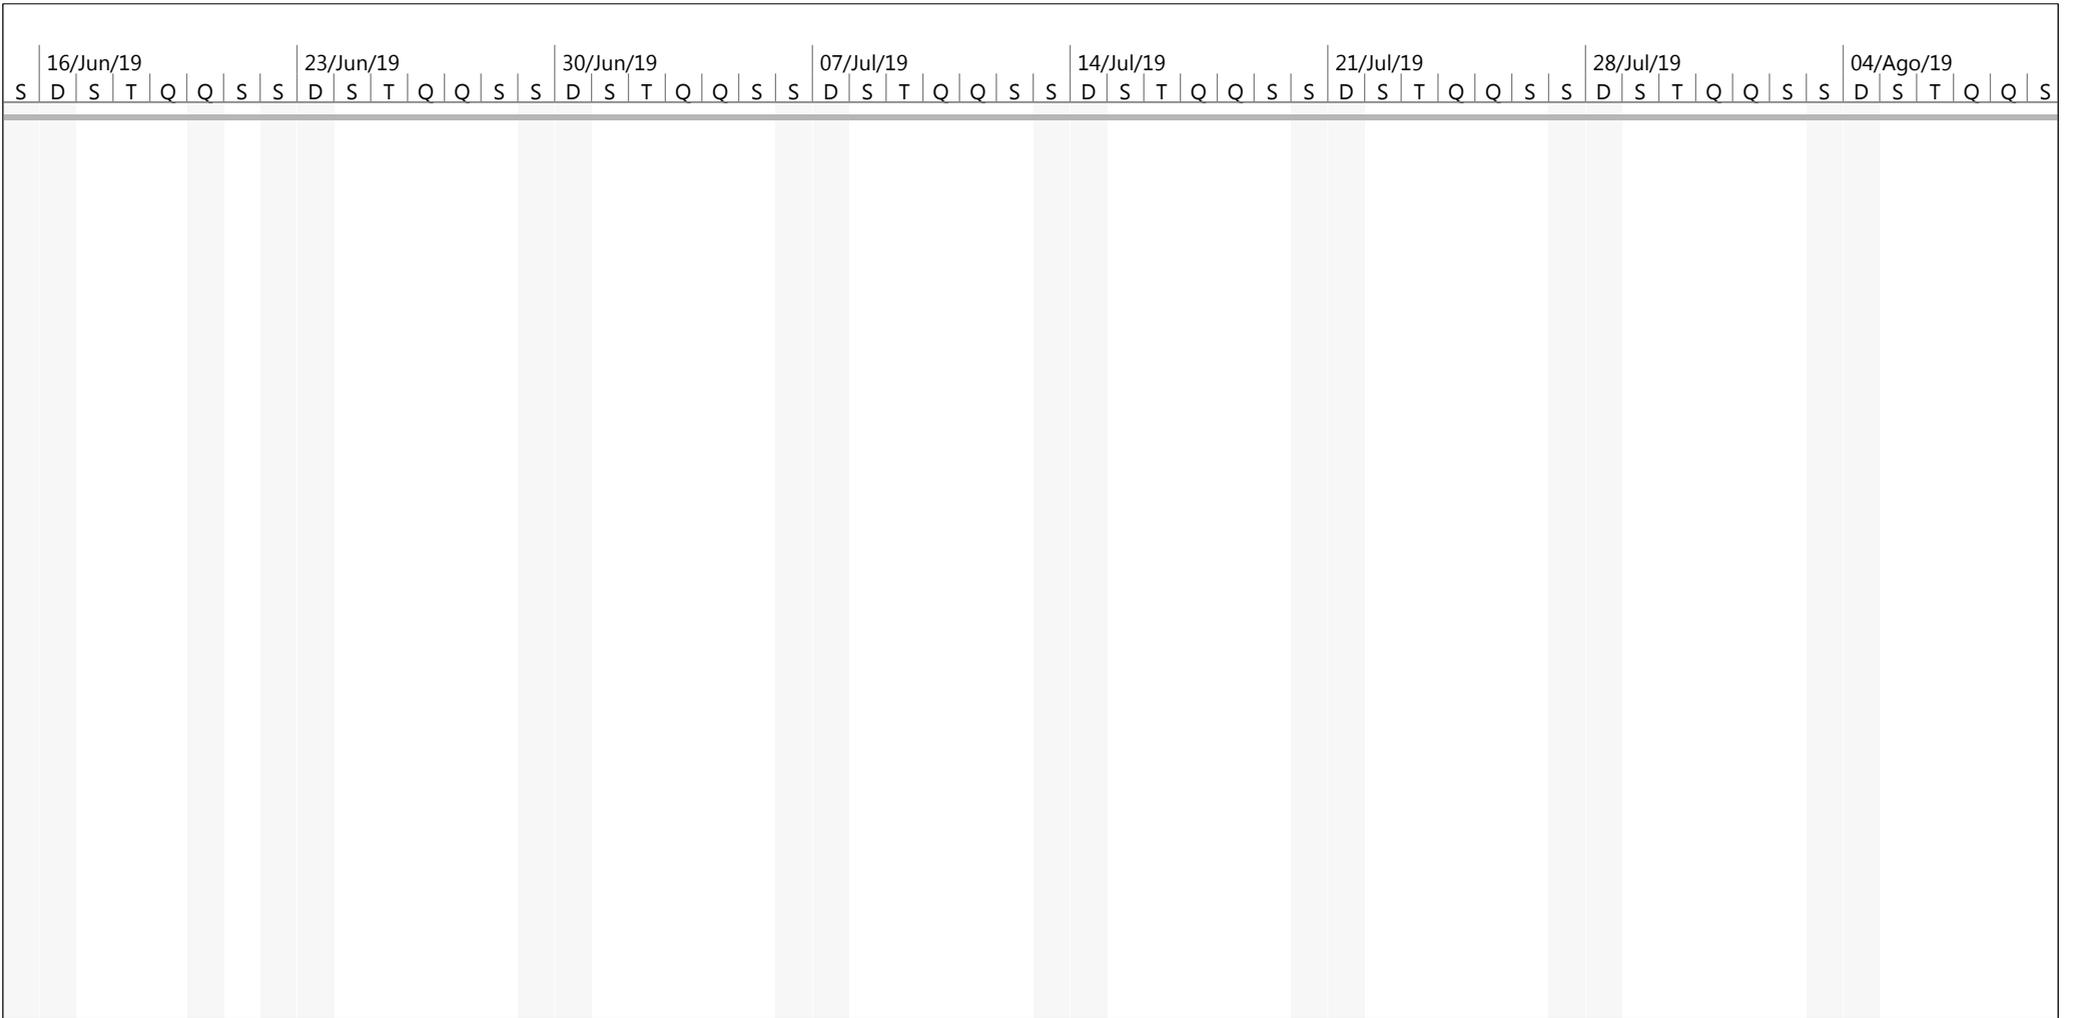


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

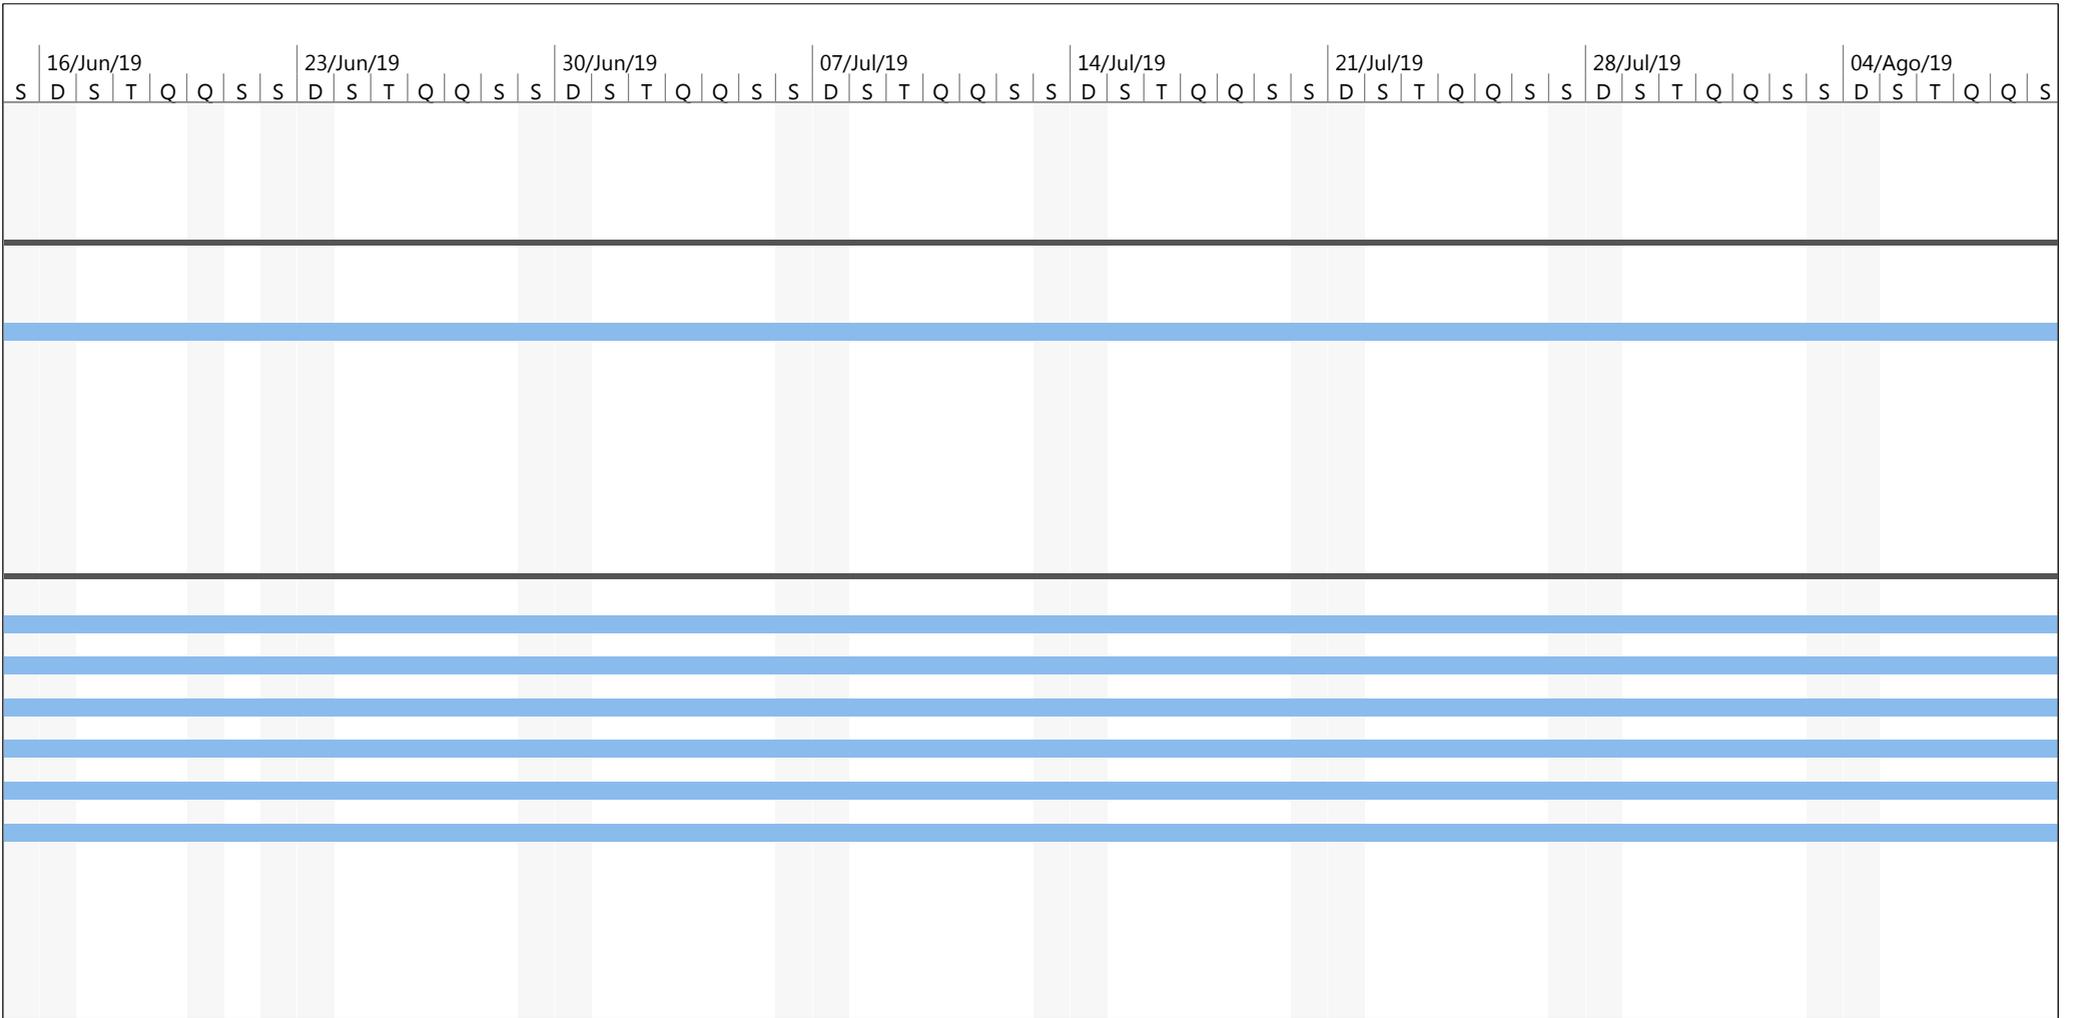


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

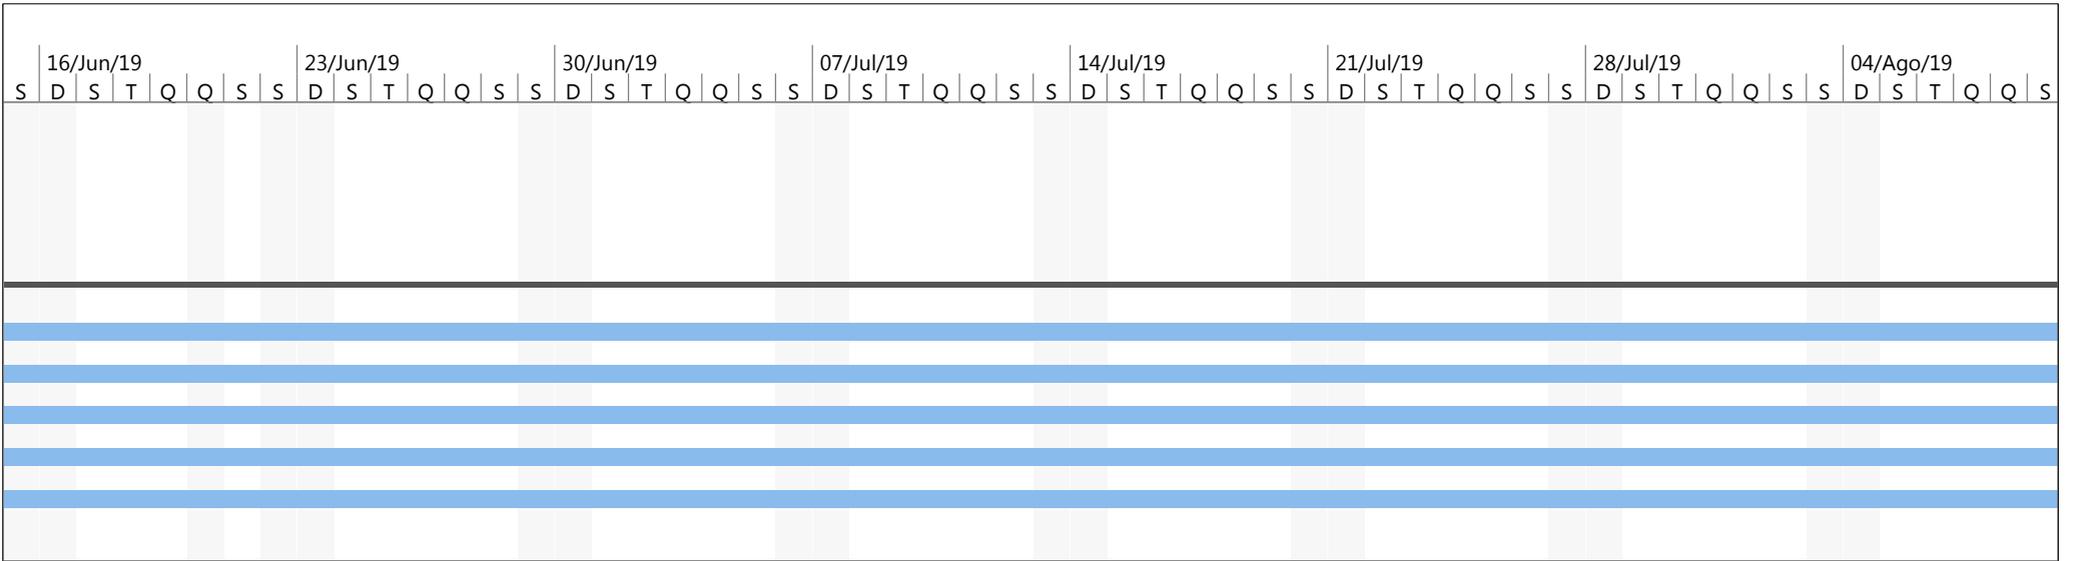


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

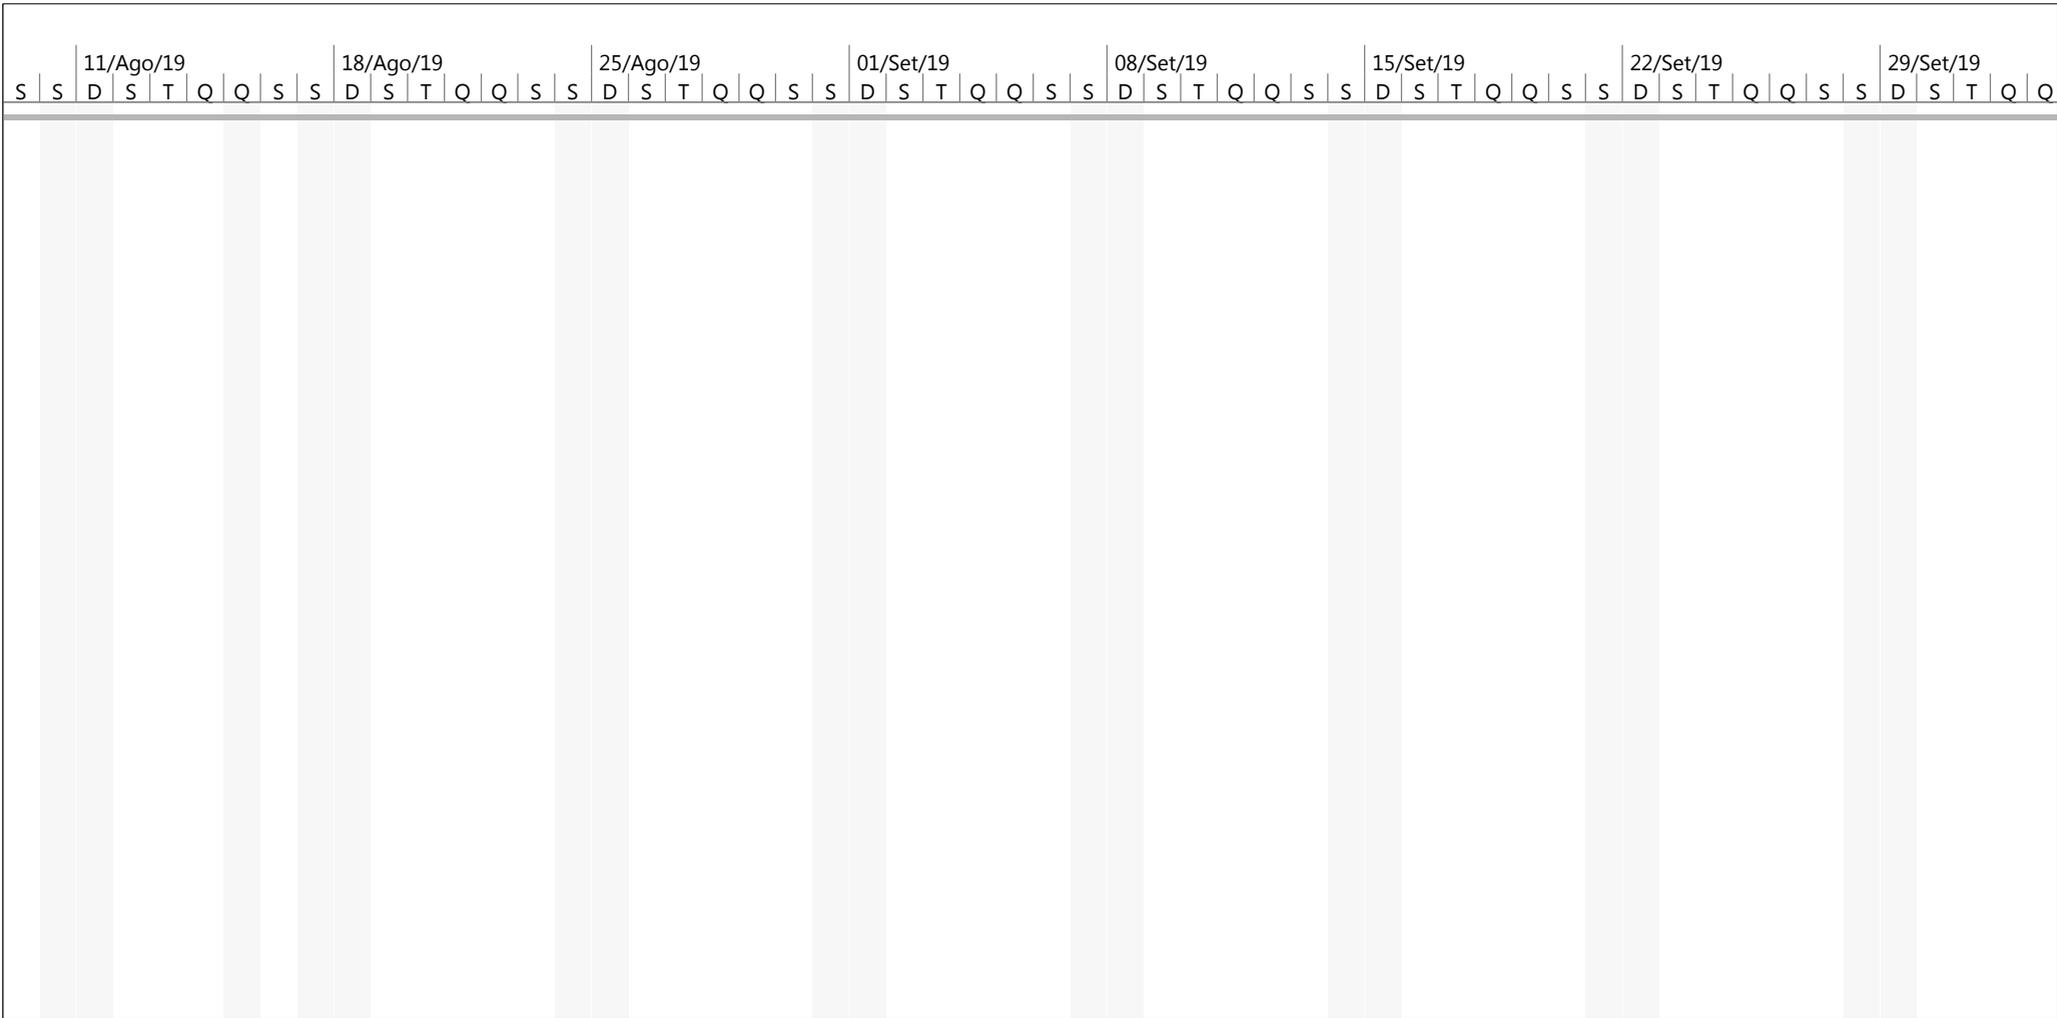



Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

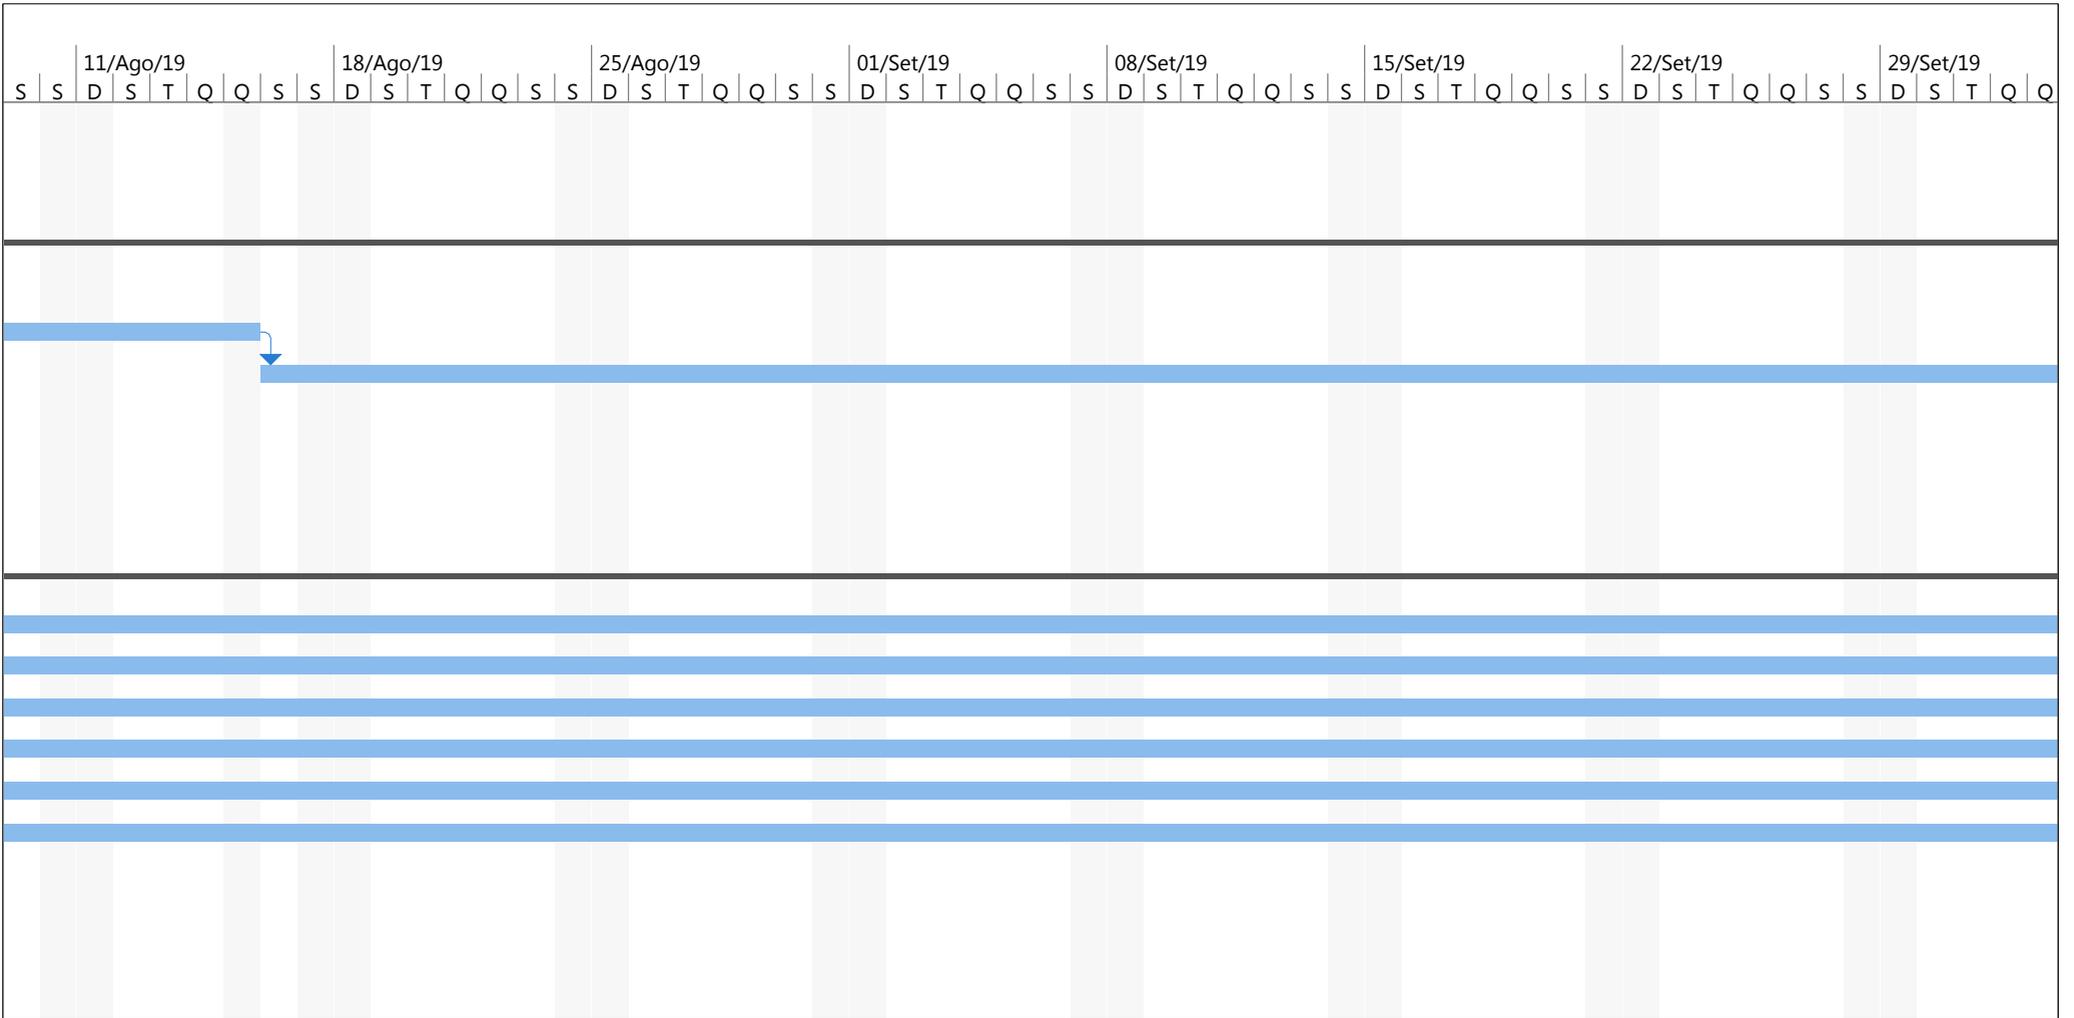


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

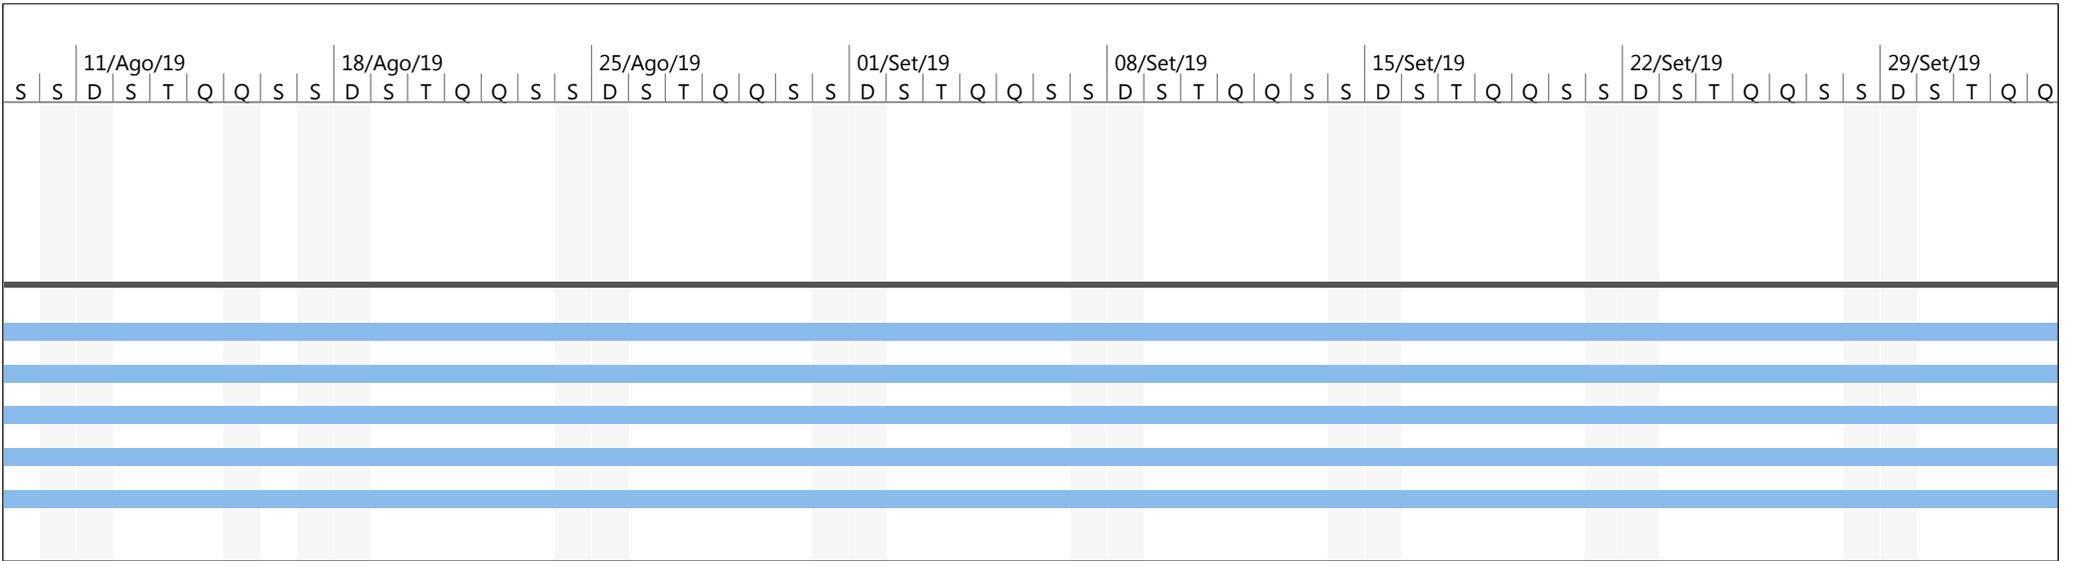


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

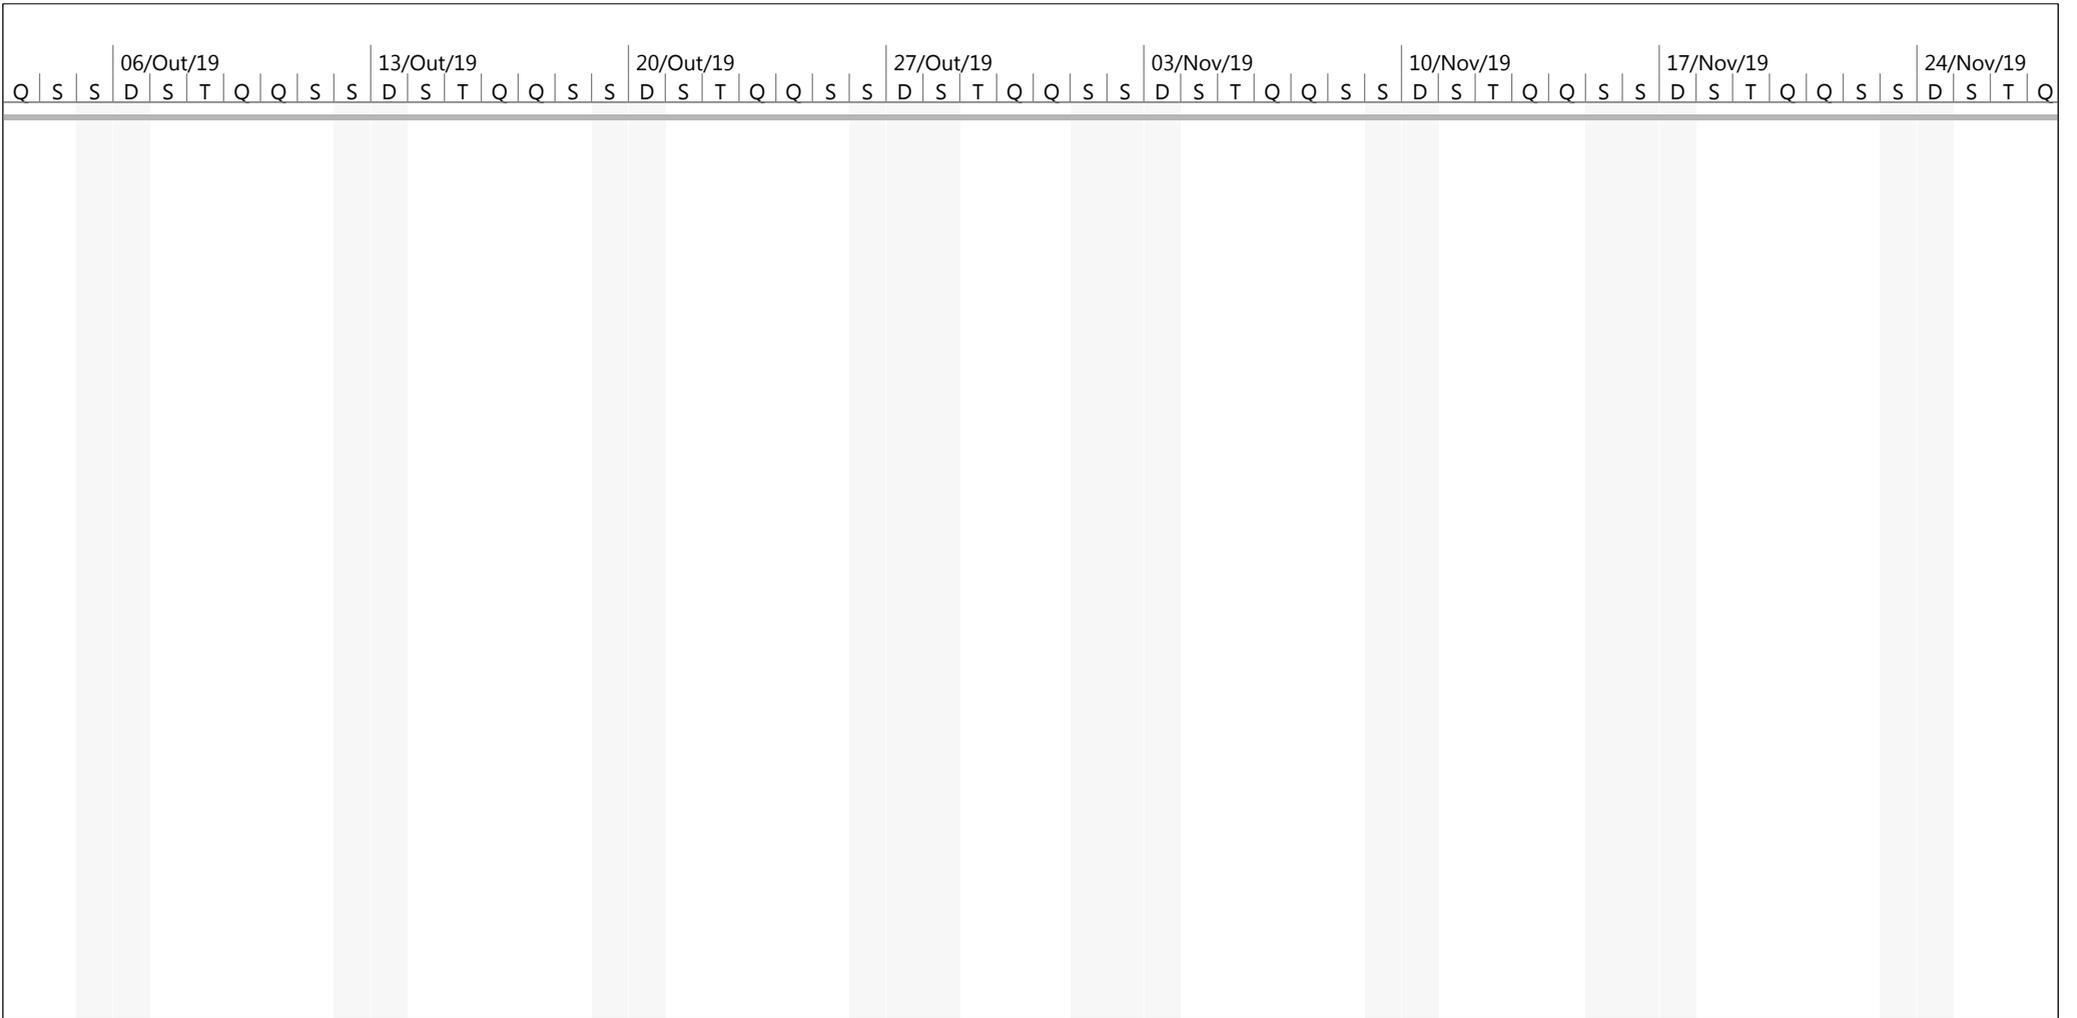


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

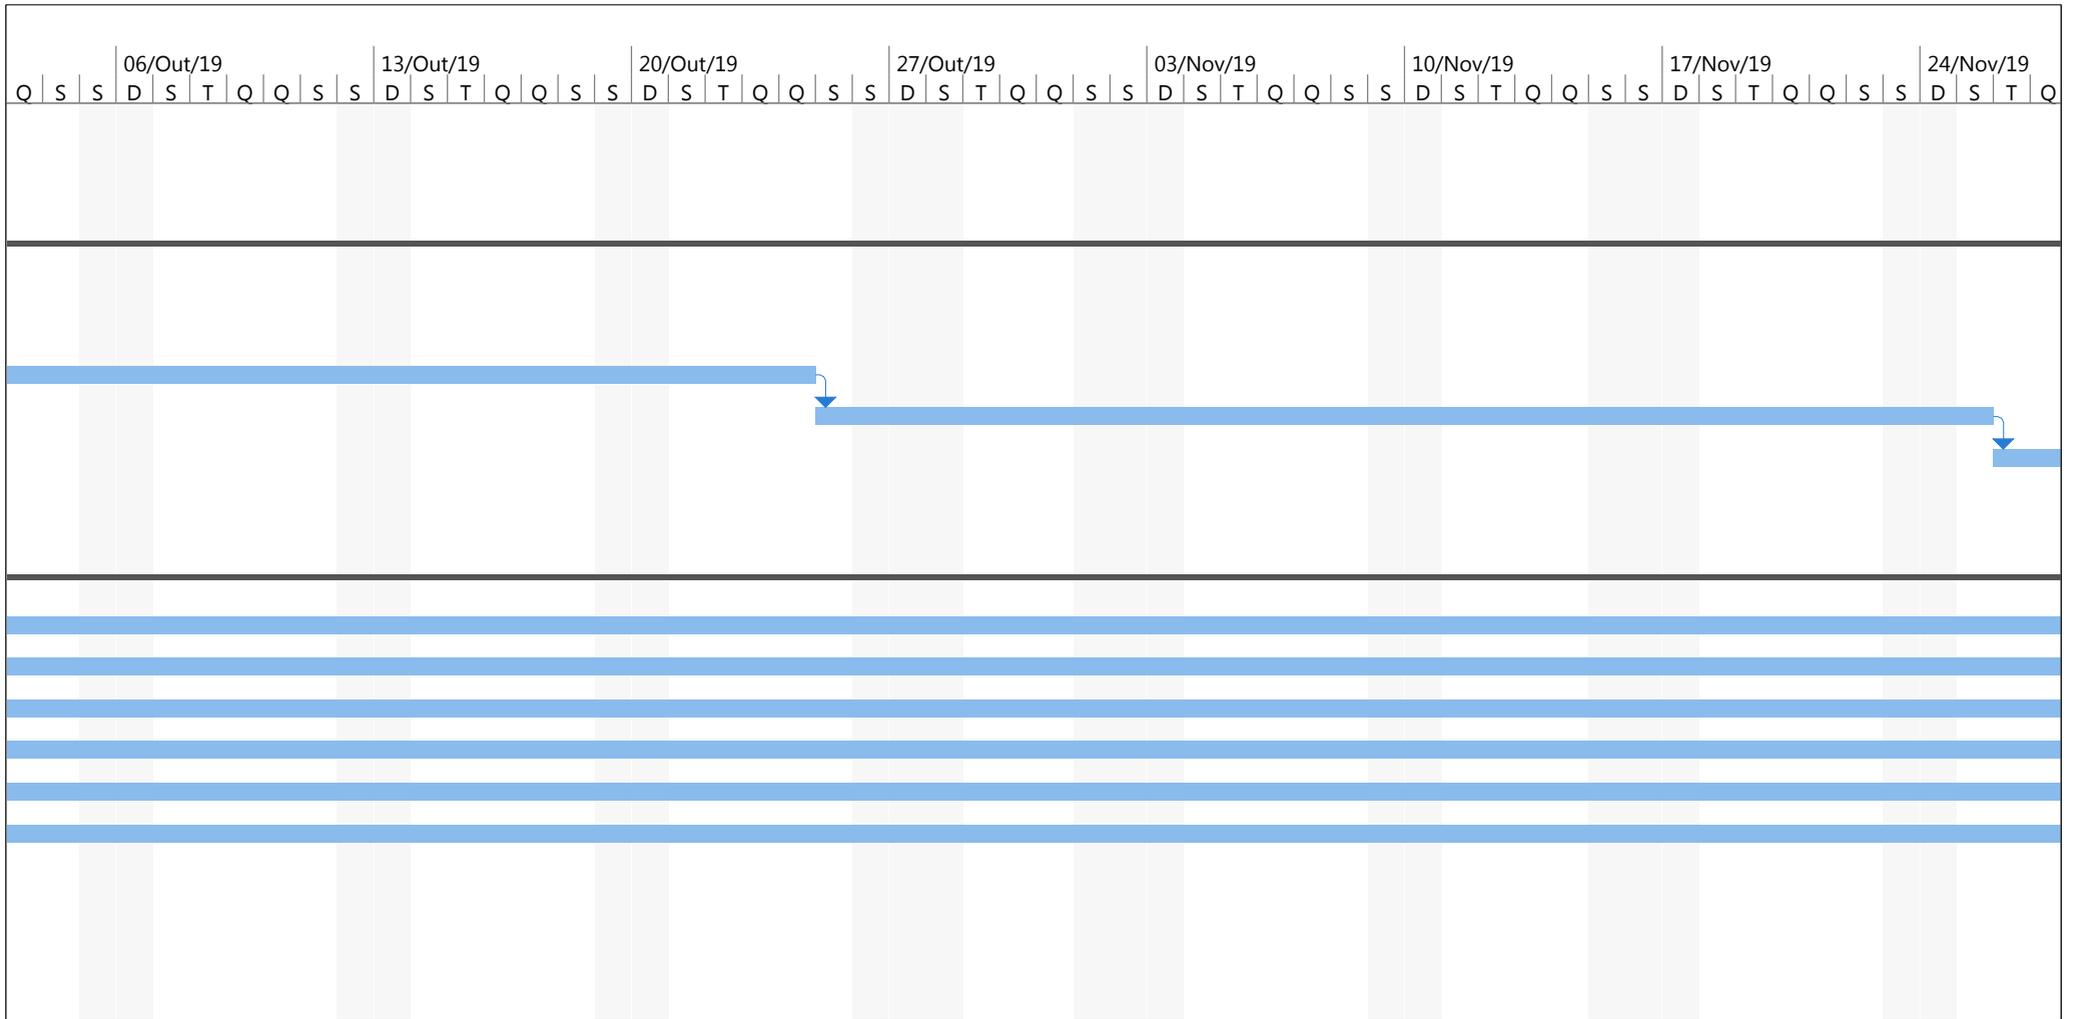


Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

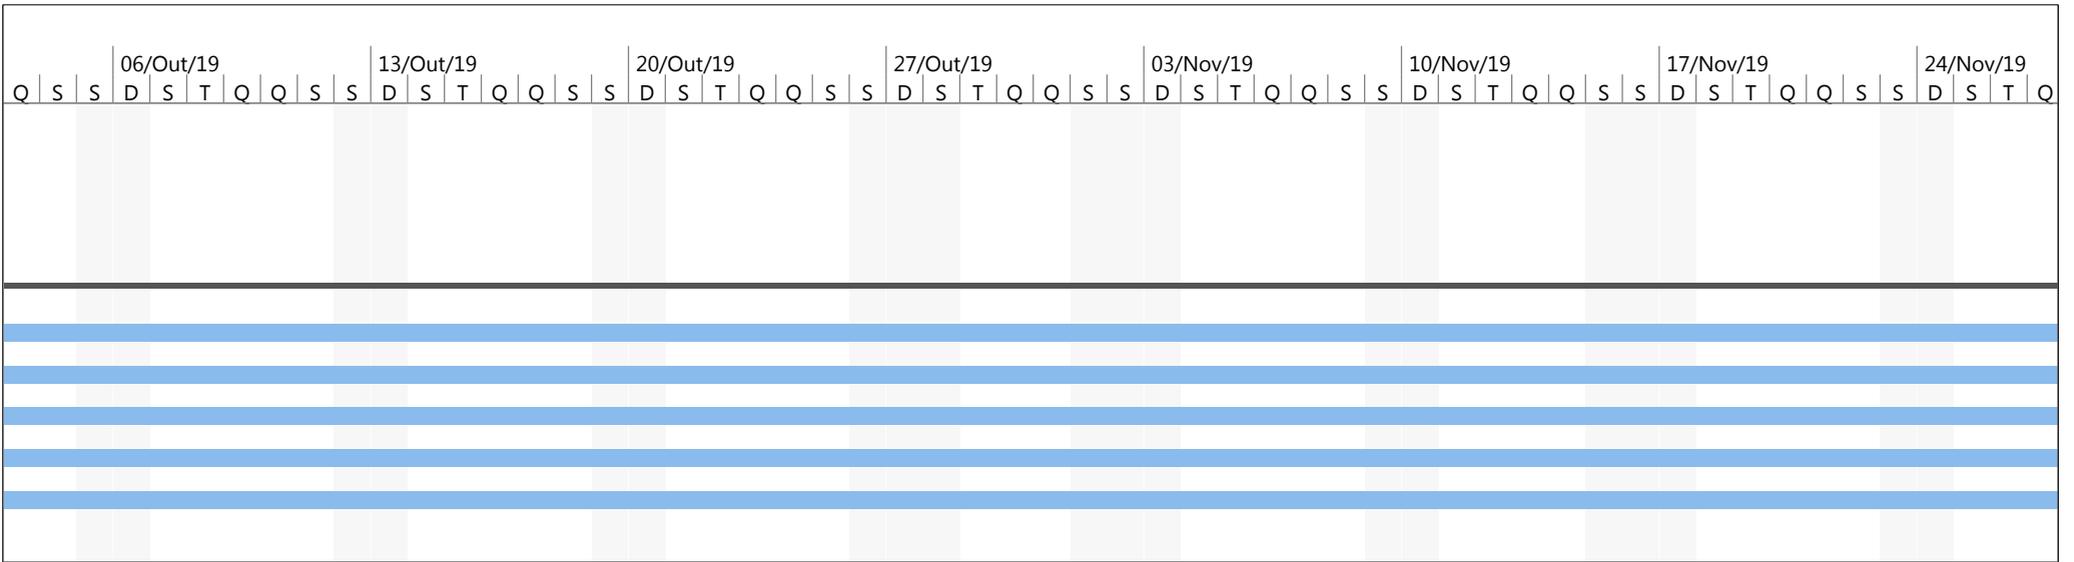


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

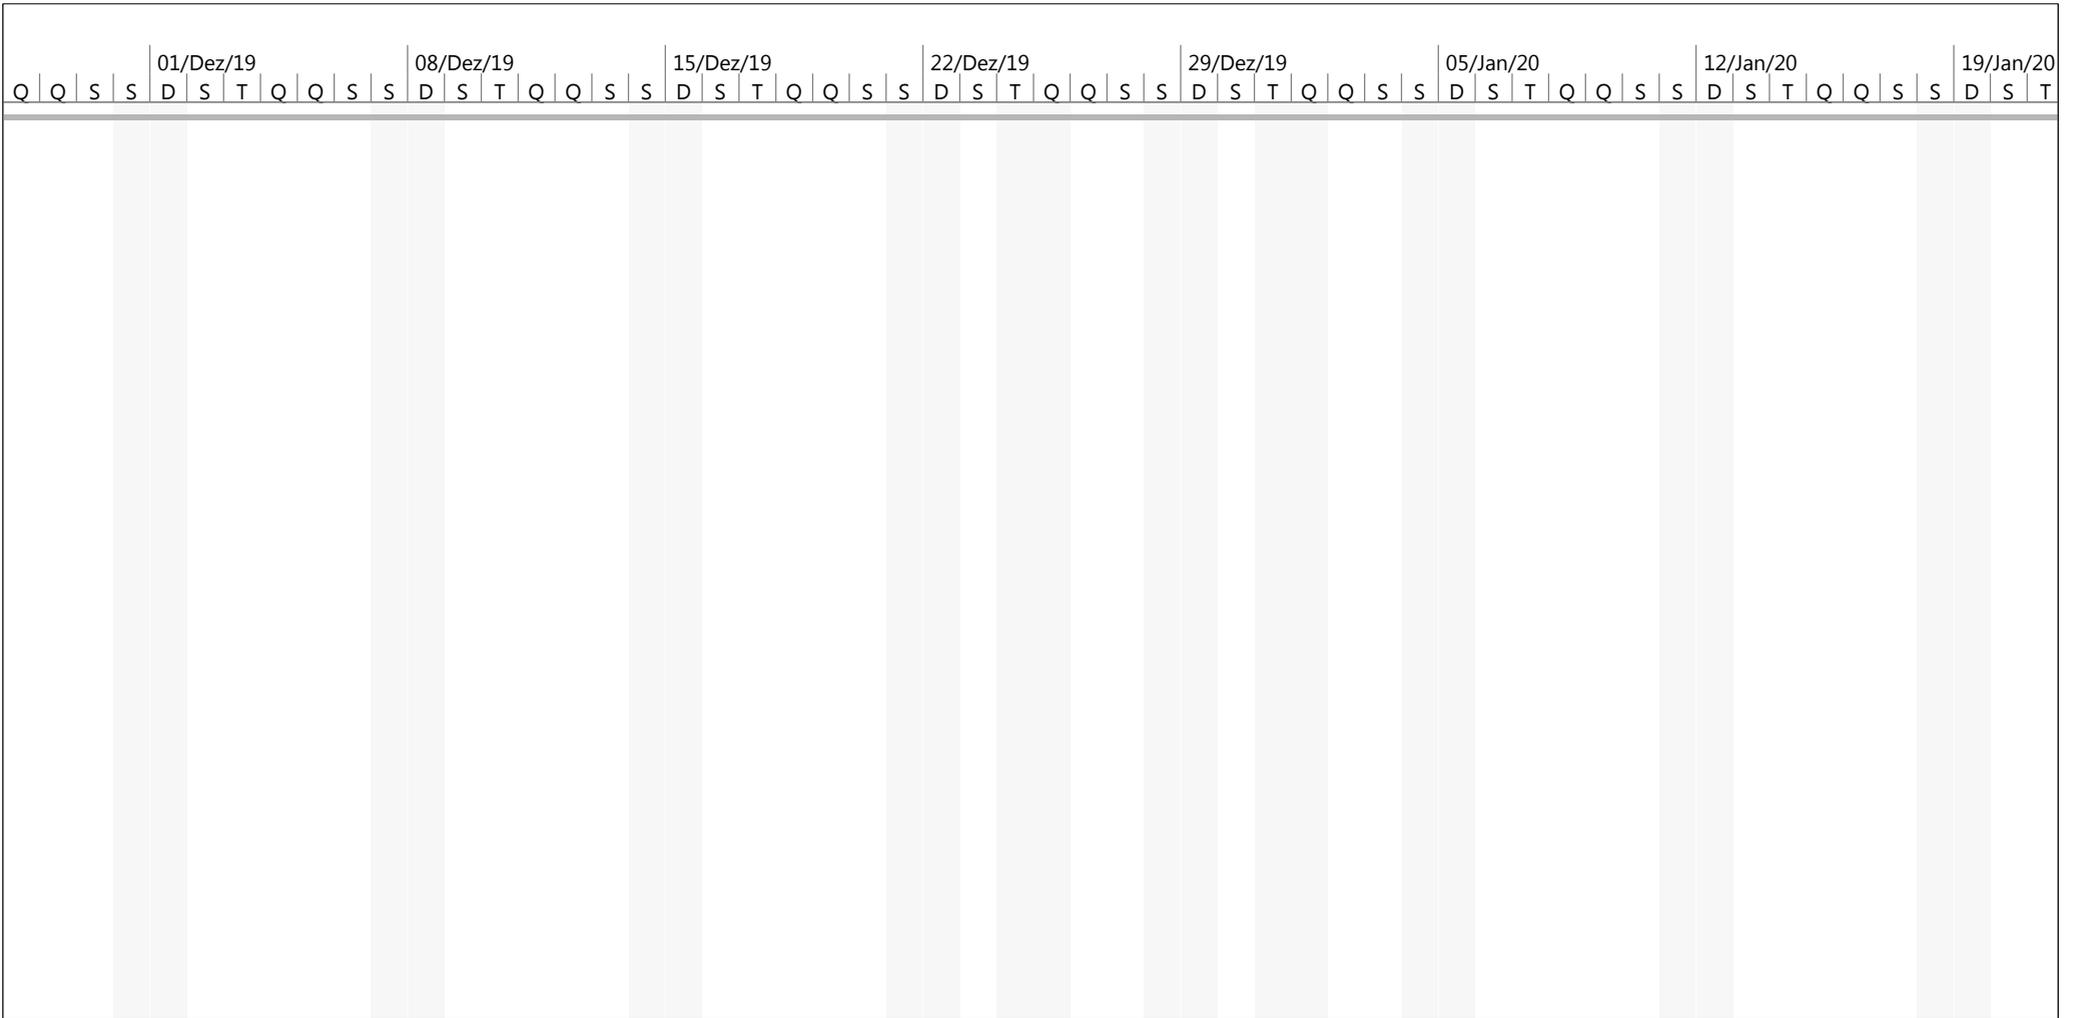


Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

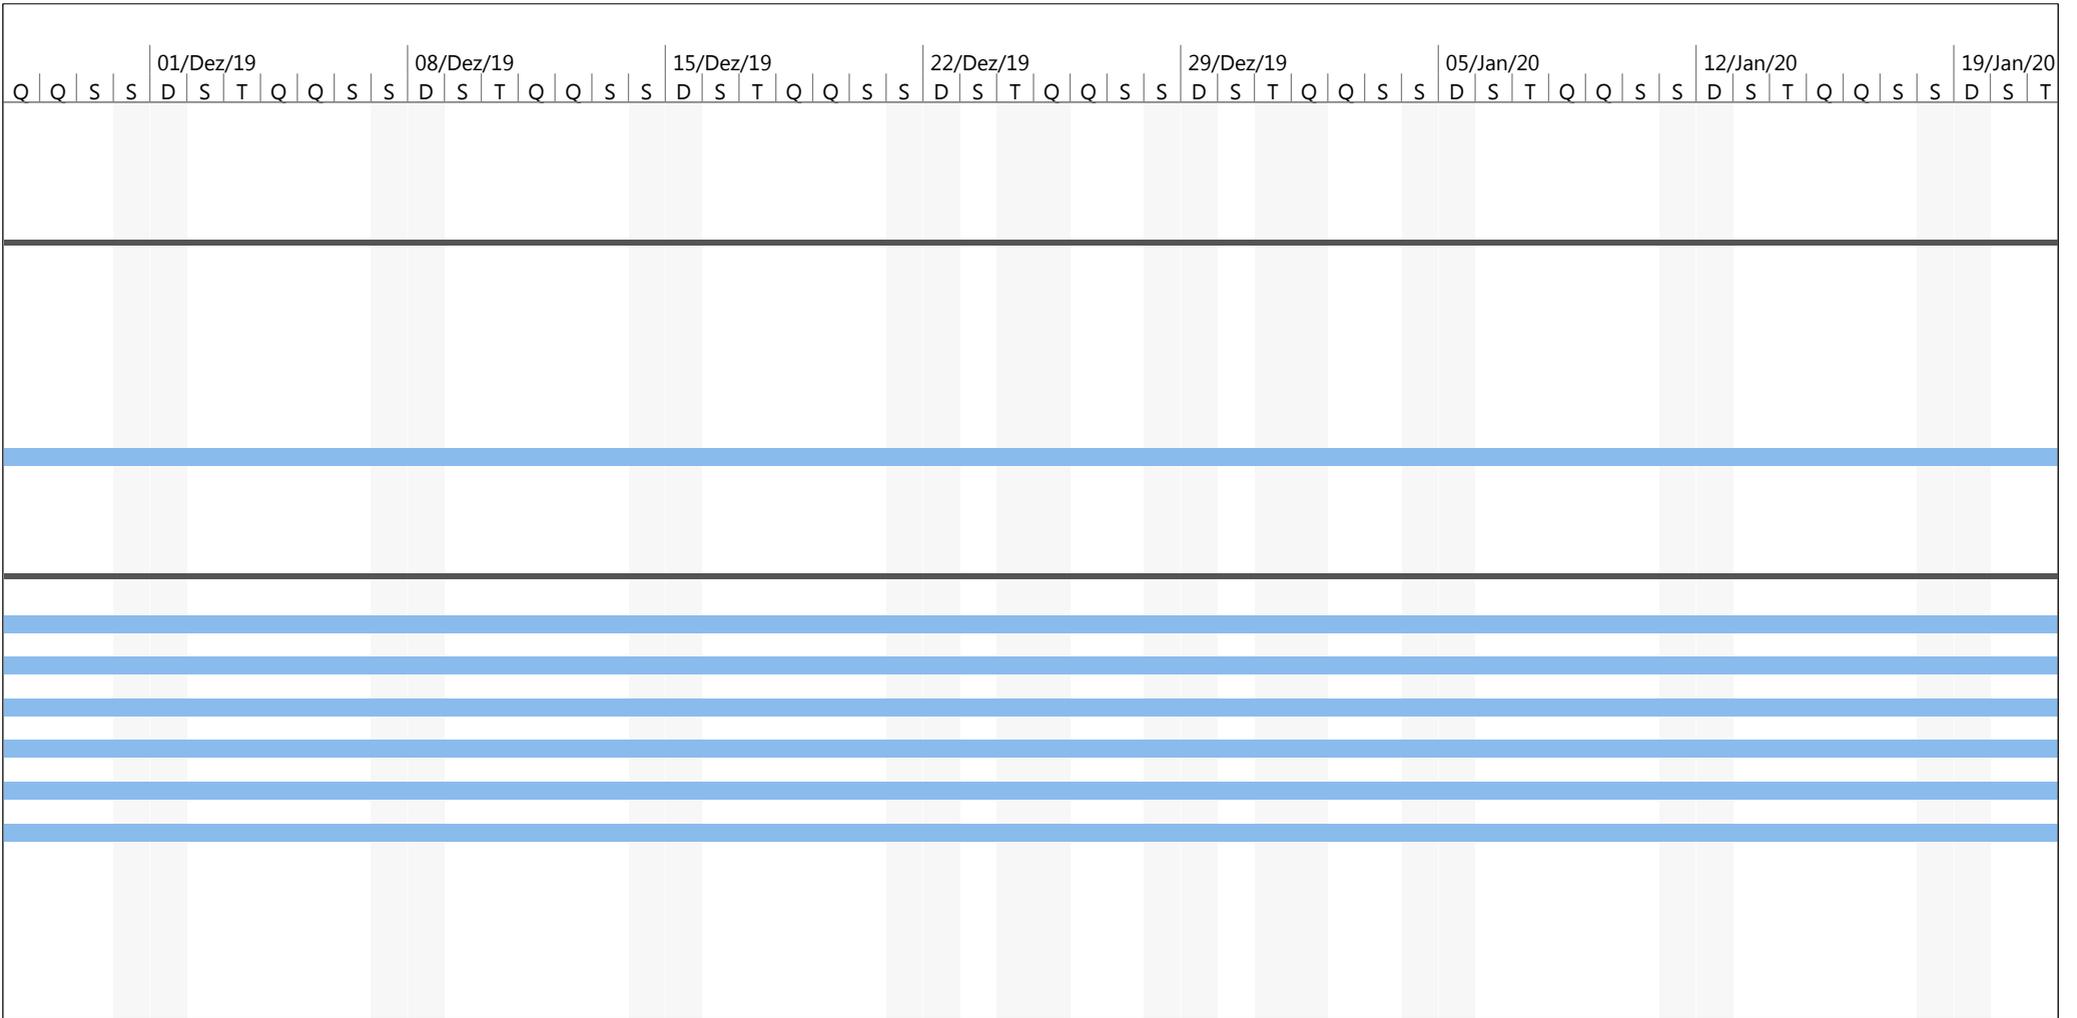

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

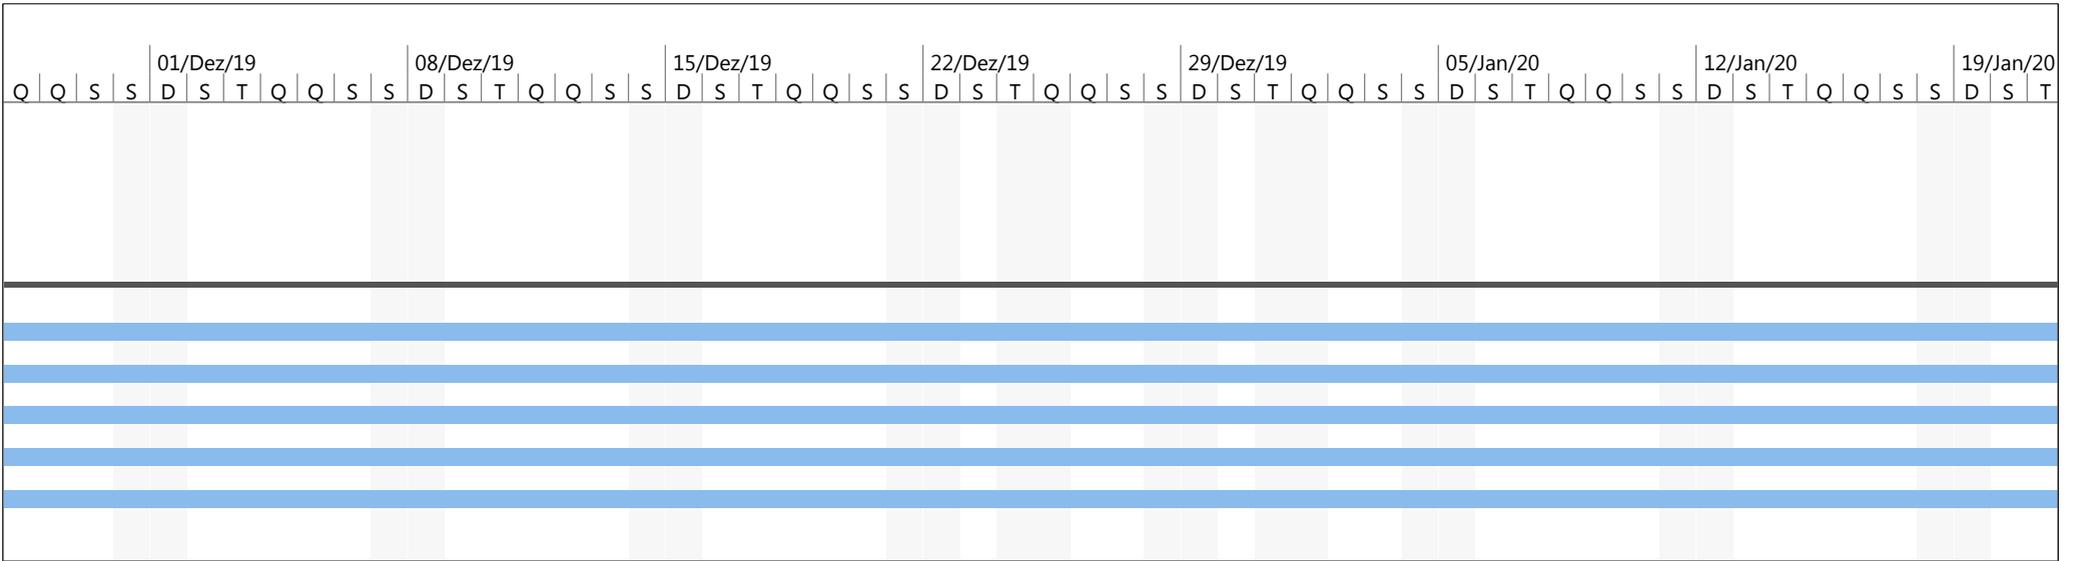

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

20 | T | Q | Q | S | S | 26/Jan/20 | D | S | T | Q | Q | S | S | 02/Fev/20 | D | S | T | Q | Q | S | S | 09/Fev/20 | D | S | T | Q | Q | S | S | 16/Fev/20 | D | S | T | Q | Q | S | S | 23/Fev/20 | D | S | T | Q | Q | S | S | 01/Mar/20 | D | S | T | Q | Q | S | S | 08/Mar/20 | D | S | T | Q | Q | S | S | 15/Ma

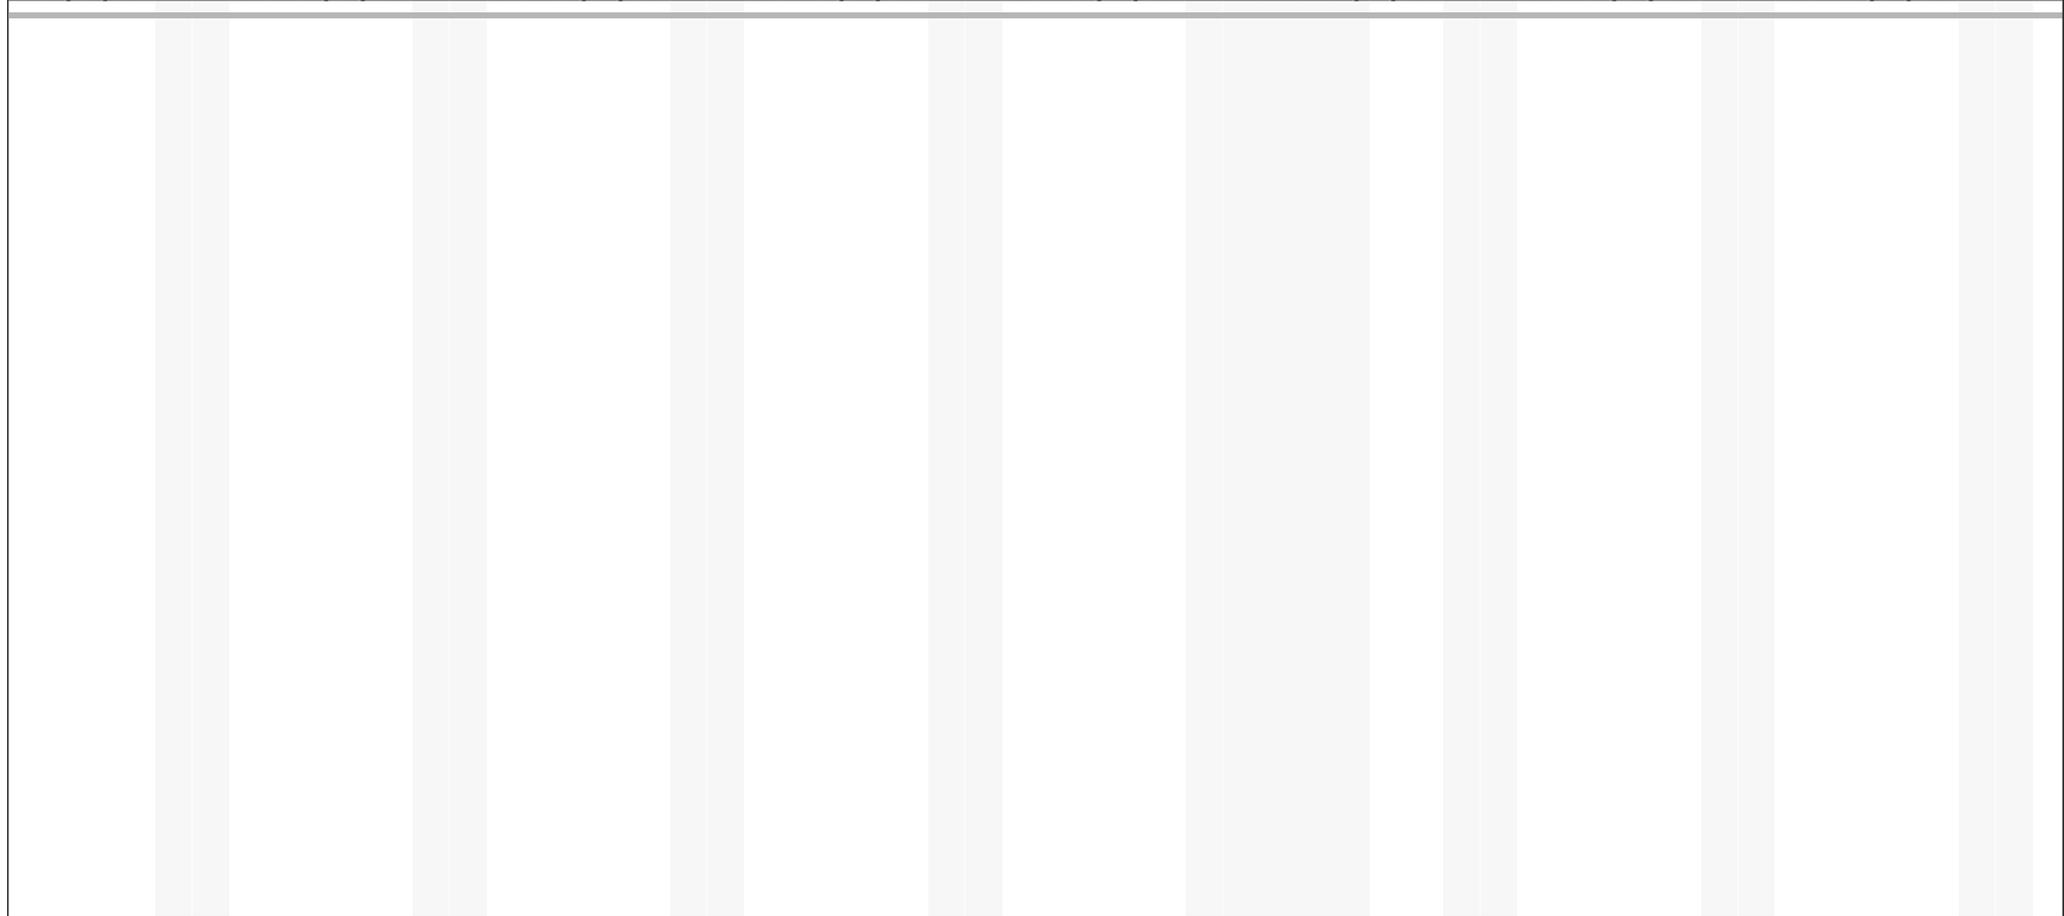


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

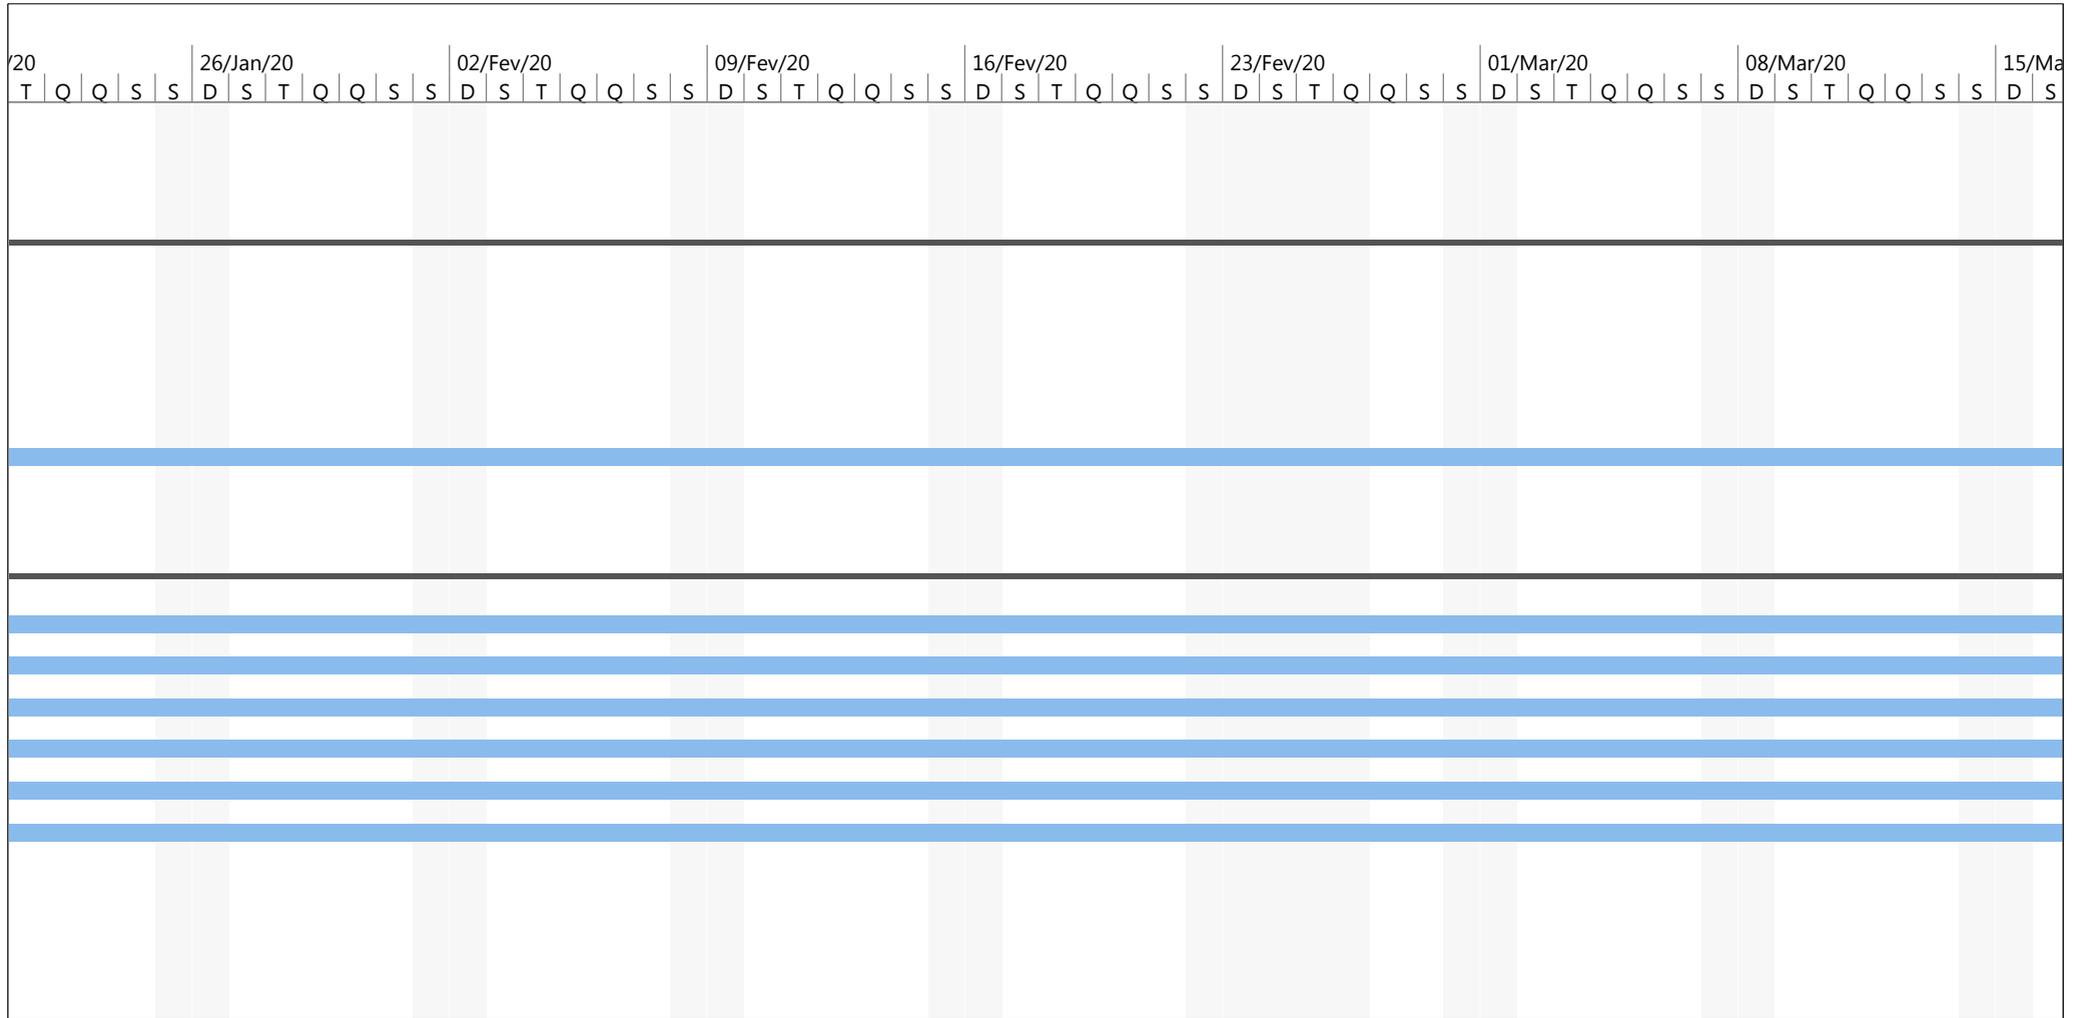

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

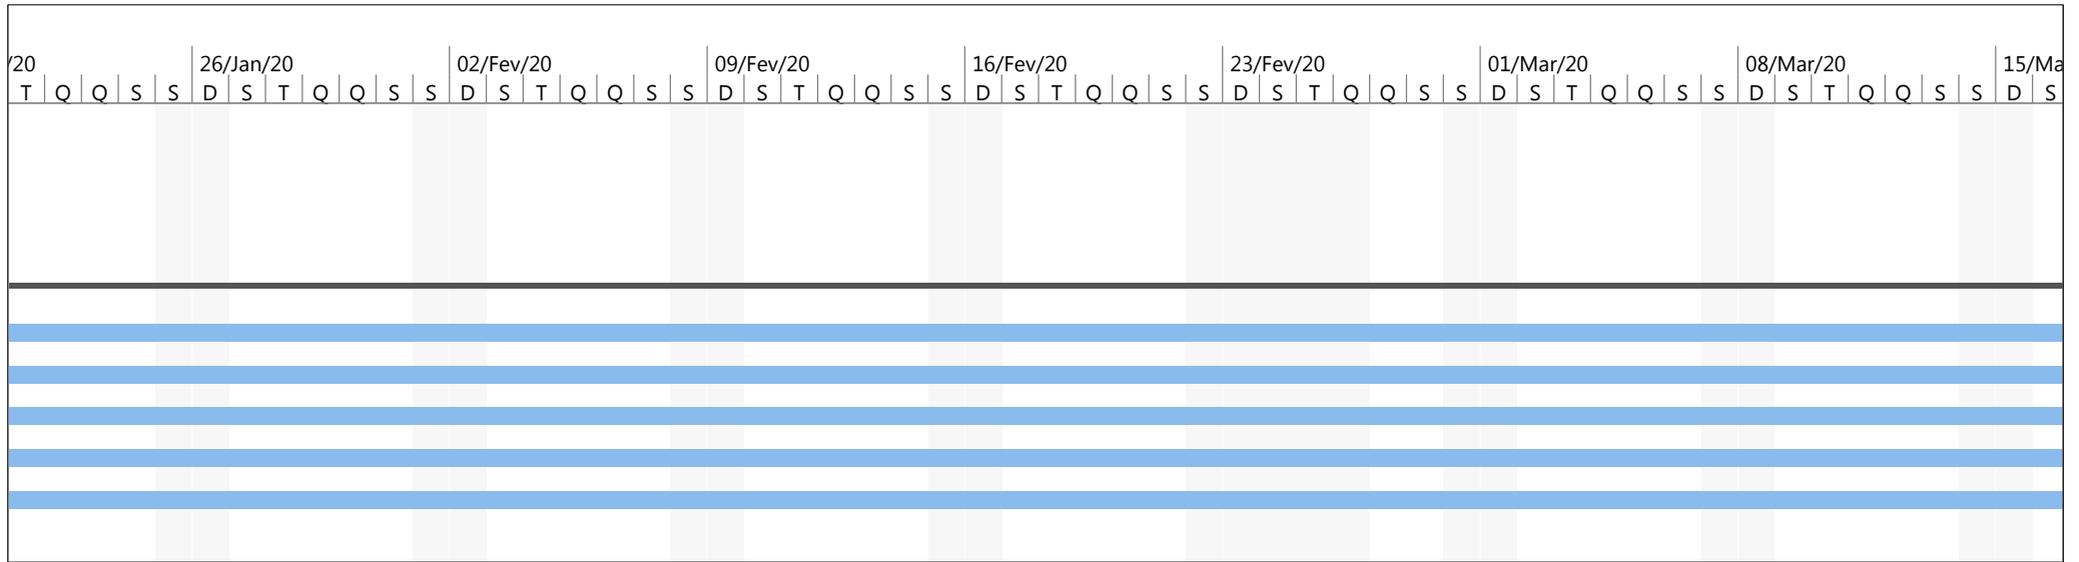


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Mar/20 22/Mar/20 29/Mar/20 05/Abr/20 12/Abr/20 19/Abr/20 26/Abr/20 03/Maio/20 10

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

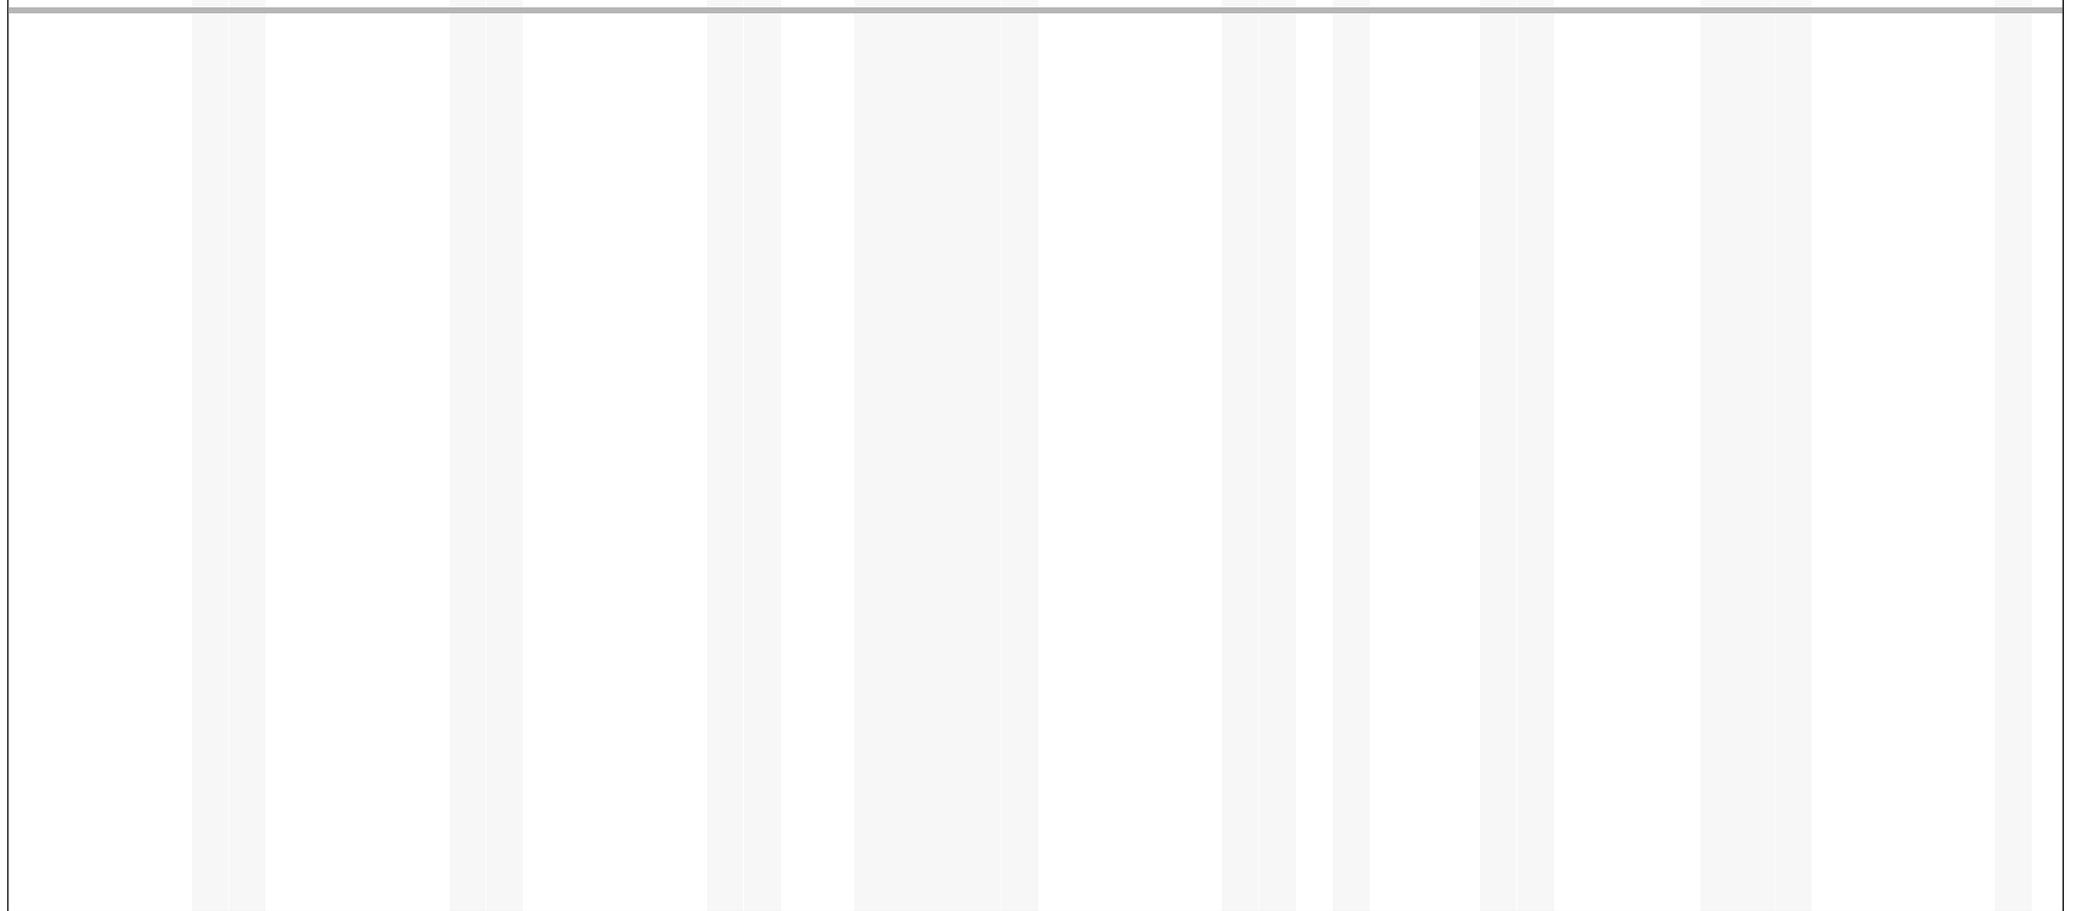


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

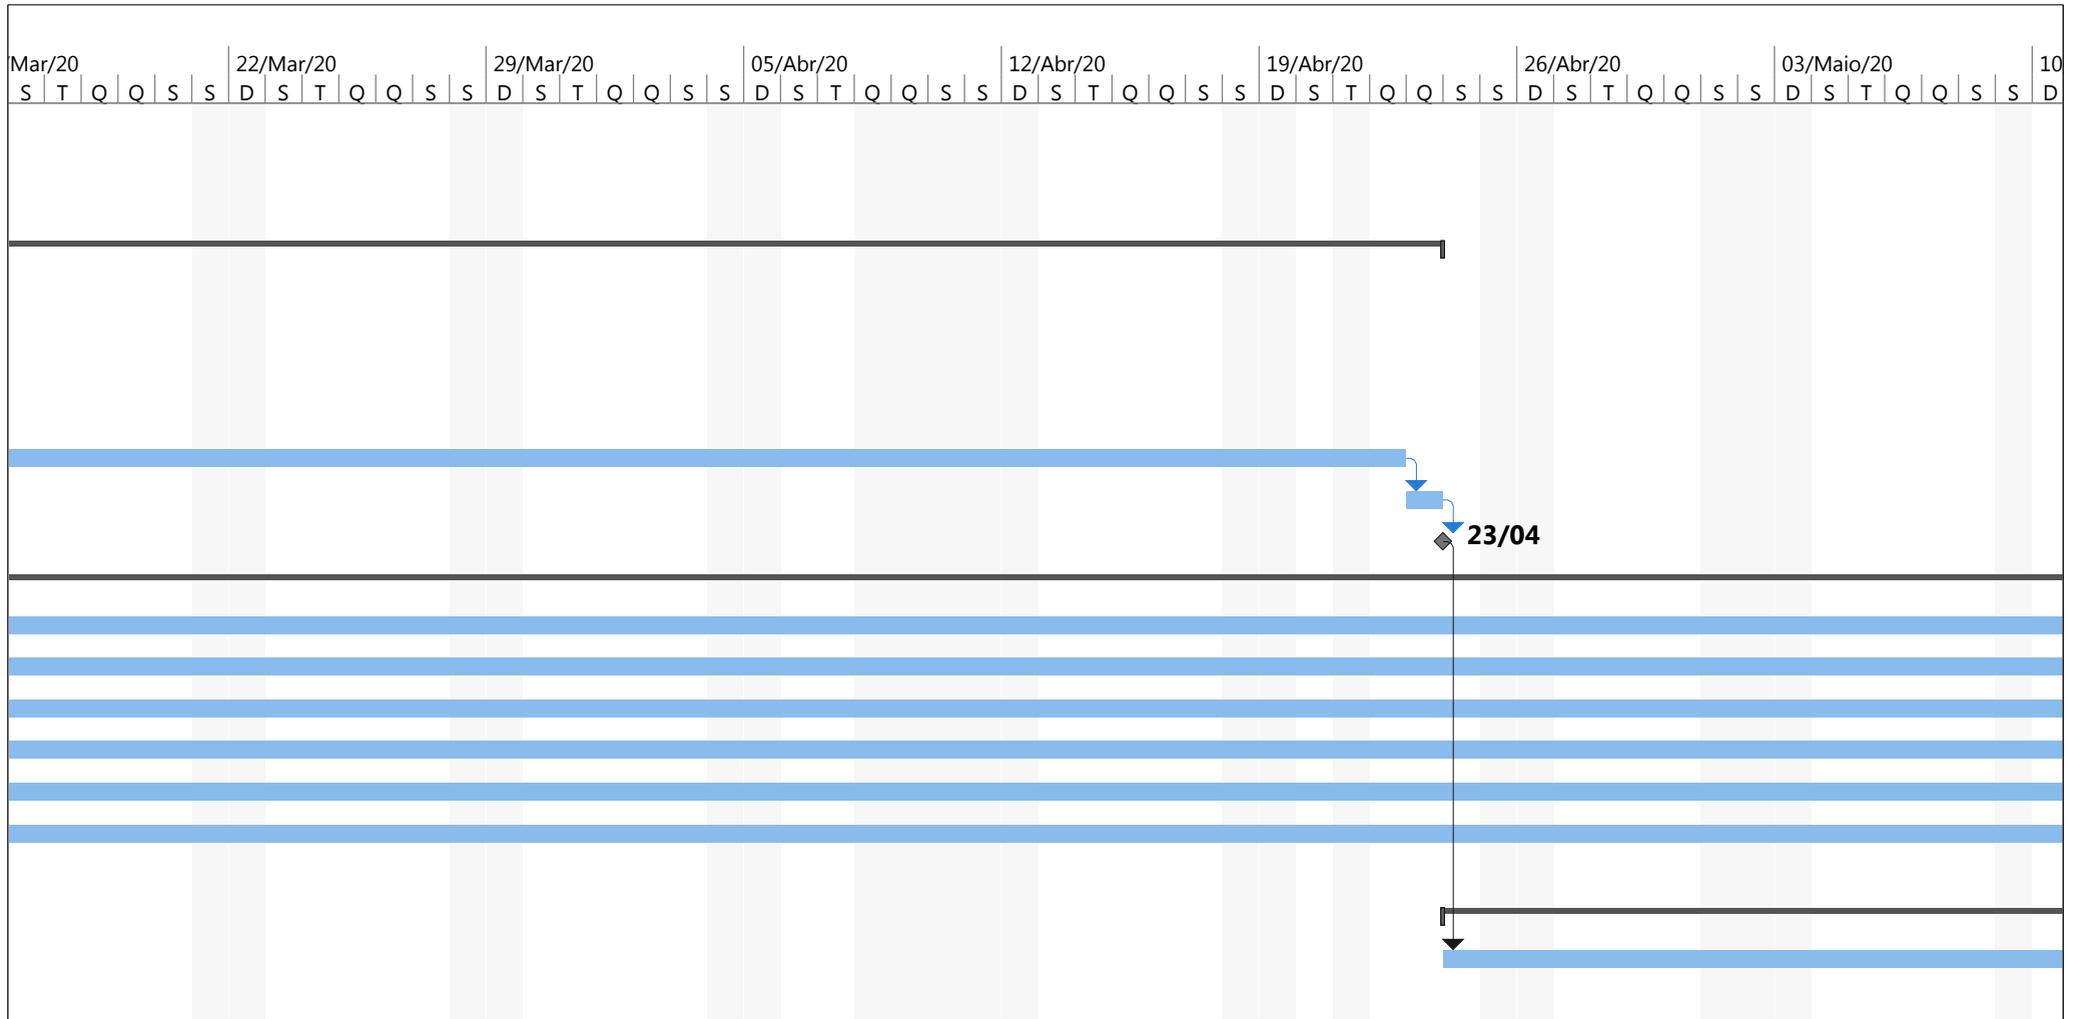

Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

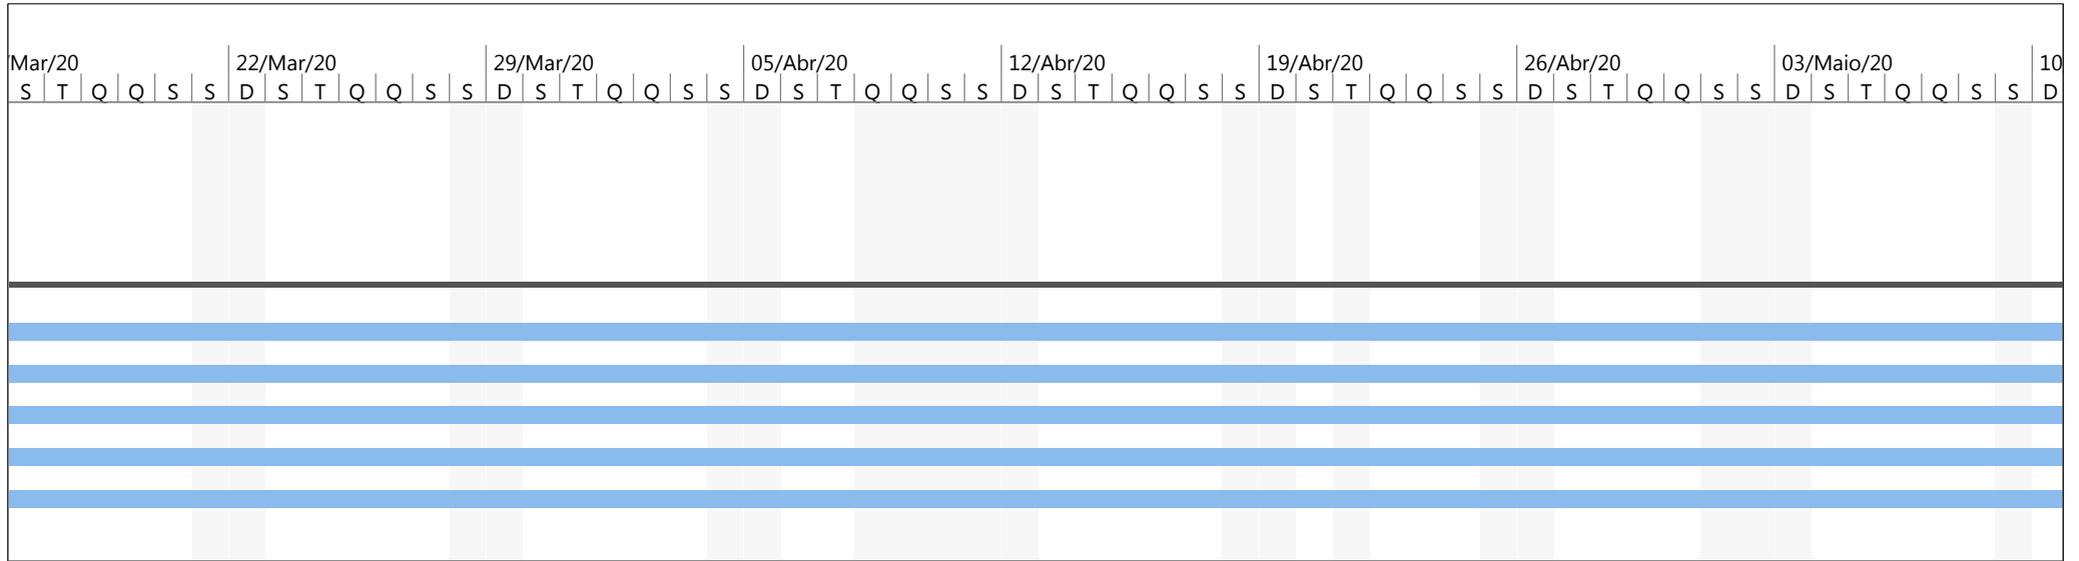


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

10/Maio/20    17/Maio/20    24/Maio/20    31/Maio/20    07/Jun/20    14/Jun/20    21/Jun/20    28/Jun/20


D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S

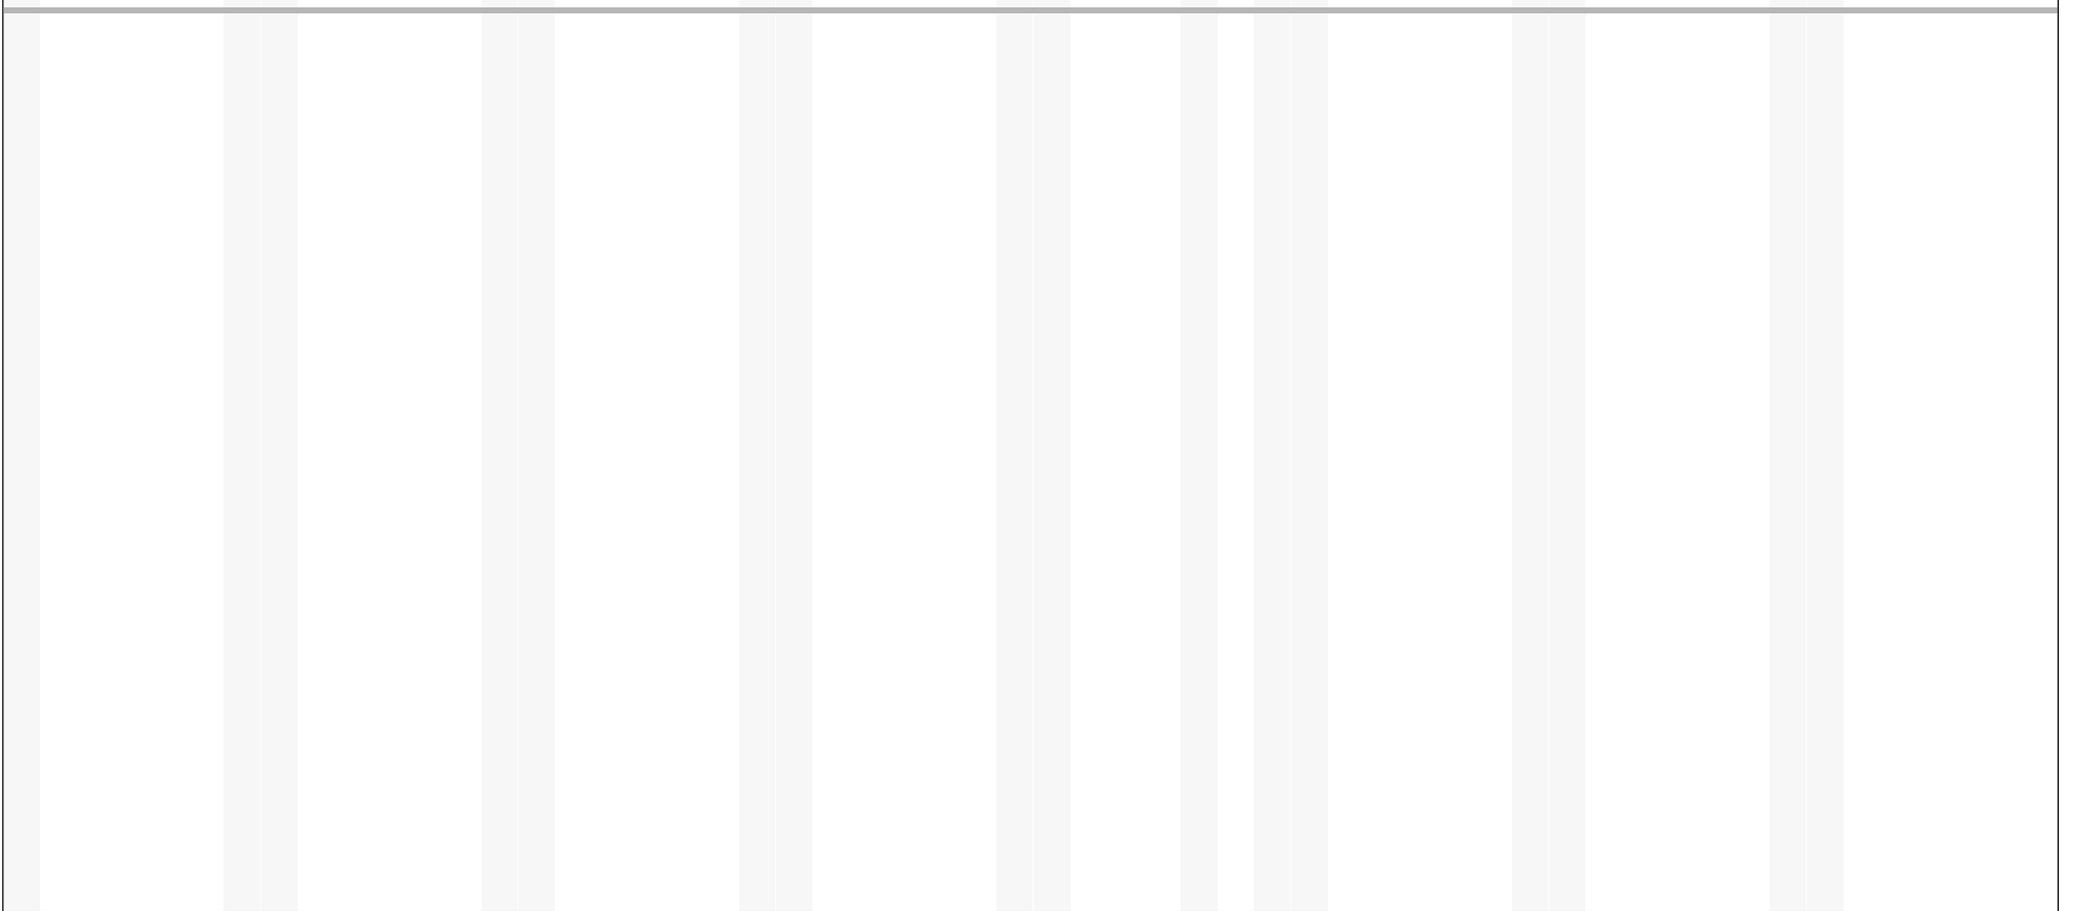

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


10/Maio/20      17/Maio/20      24/Maio/20      31/Maio/20      07/Jun/20      14/Jun/20      21/Jun/20      28/Jun/20  
 D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S    D S T Q Q S S

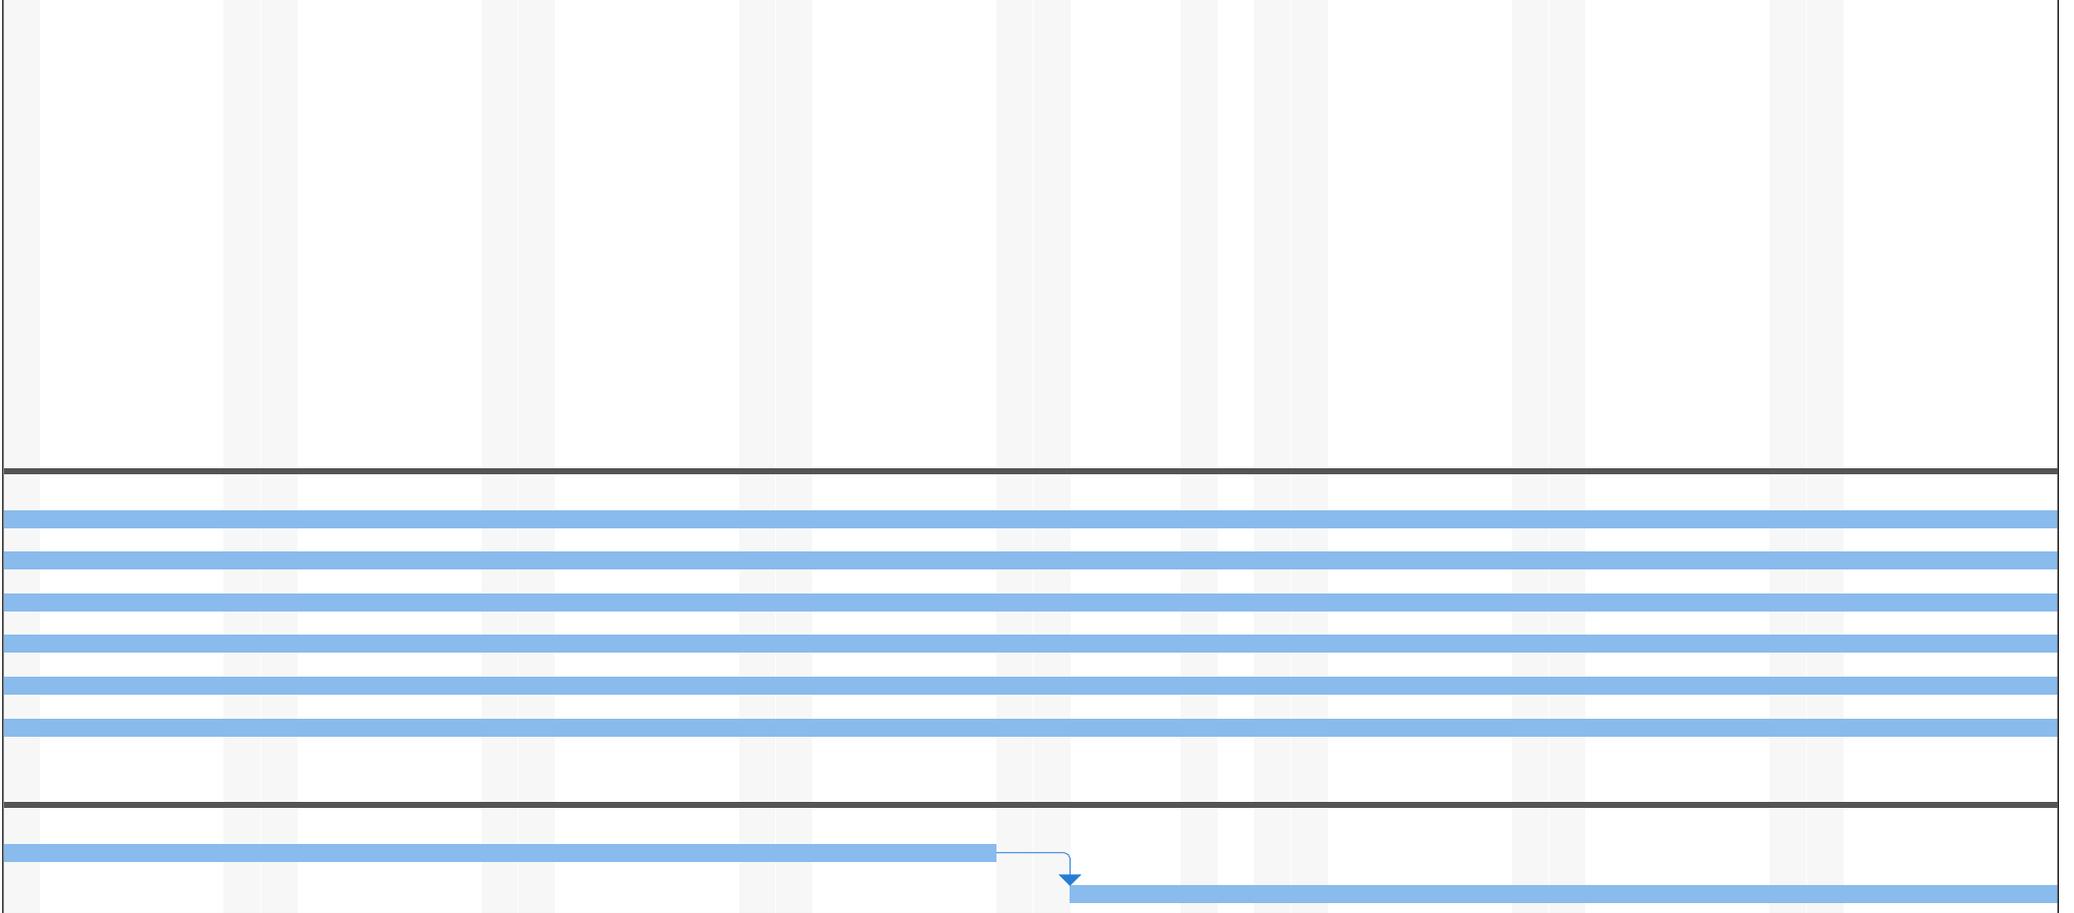

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


10/Maio/20 | 17/Maio/20 | 24/Maio/20 | 31/Maio/20 | 07/Jun/20 | 14/Jun/20 | 21/Jun/20 | 28/Jun/20  
 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

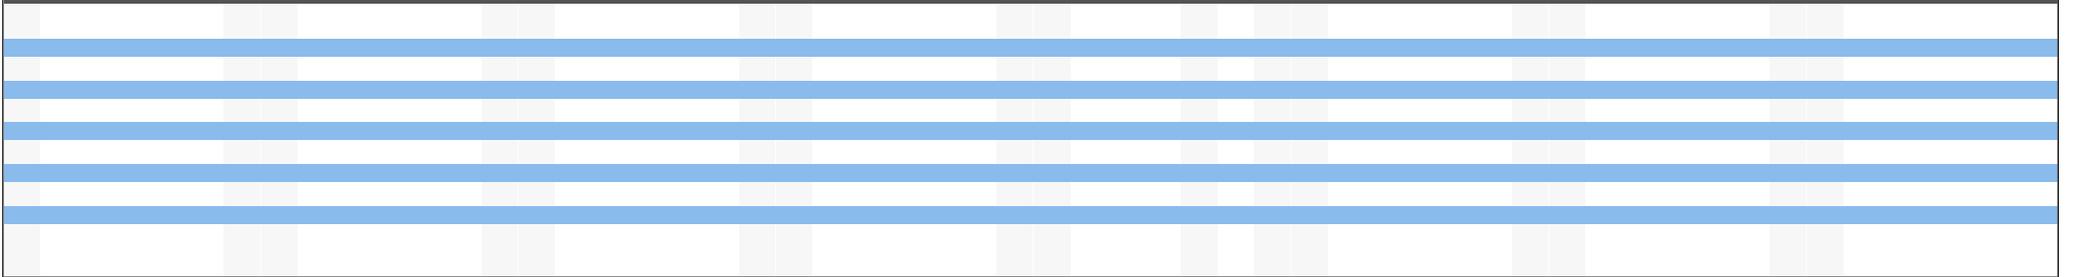

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

05/Jul/20 12/Jul/20 19/Jul/20 26/Jul/20 02/Ago/20 09/Ago/20 16/Ago/20 23/Ago/20  
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

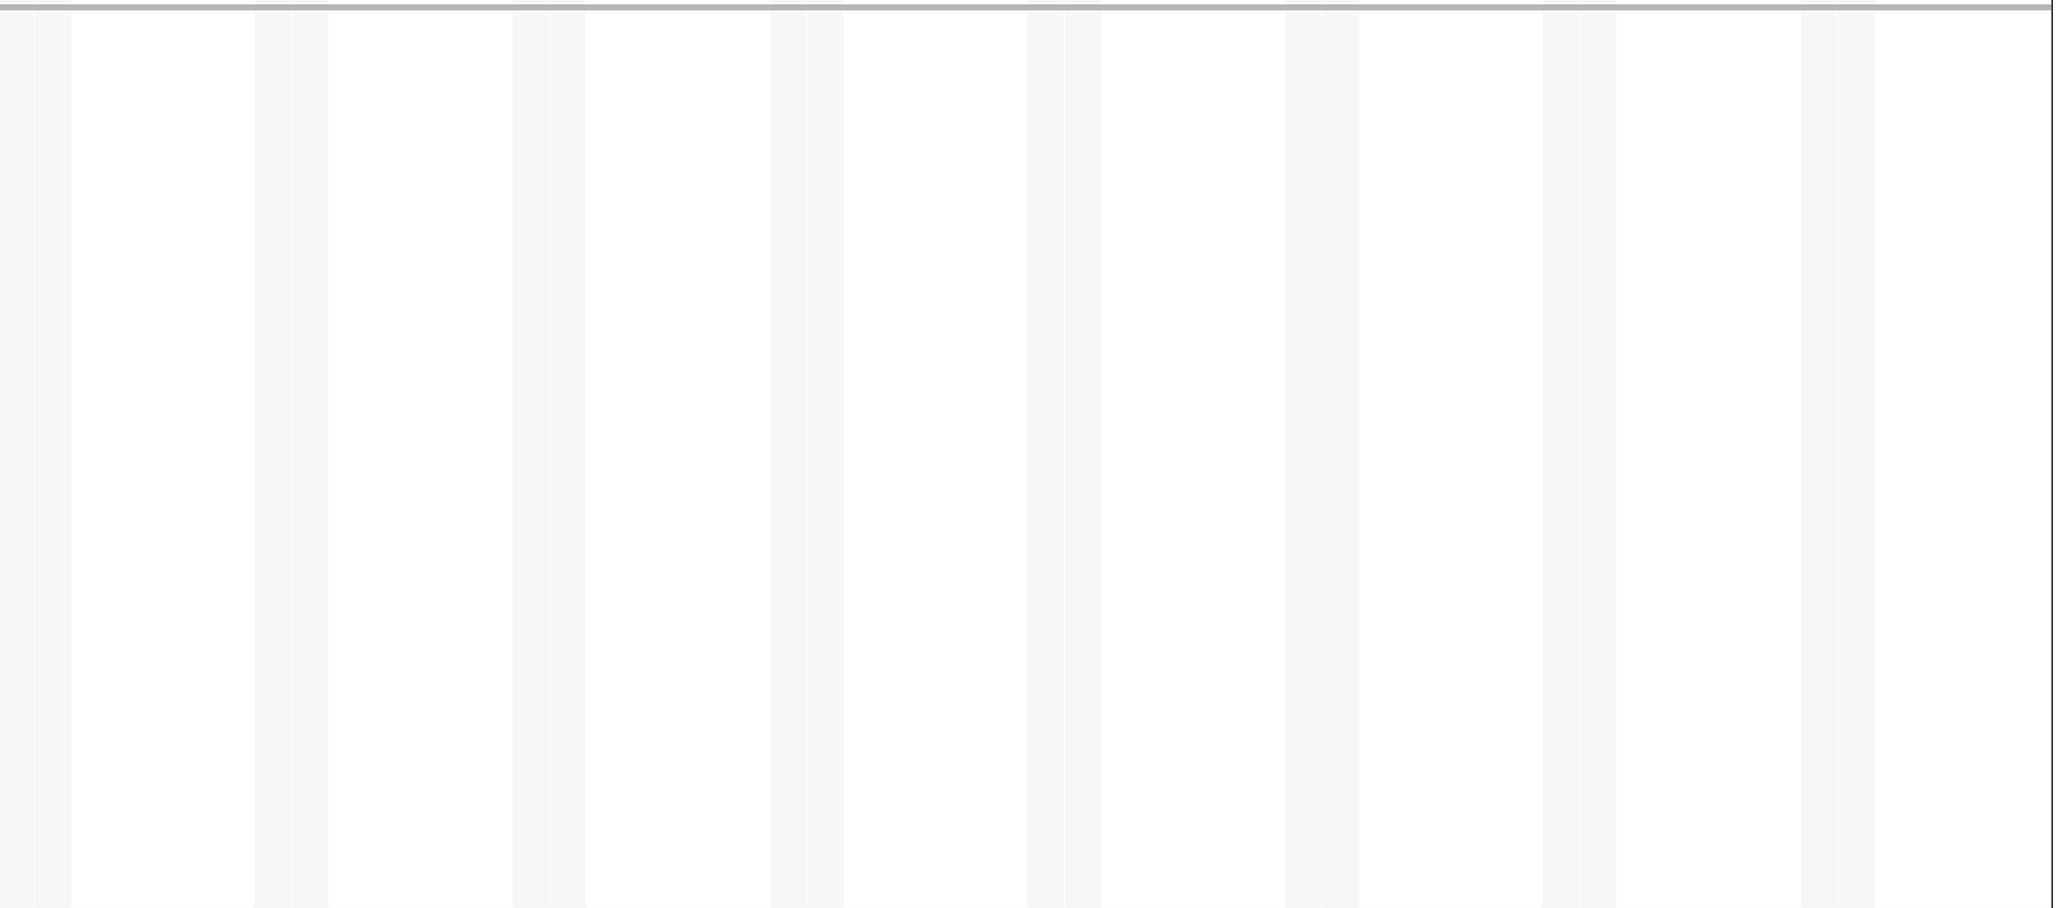


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

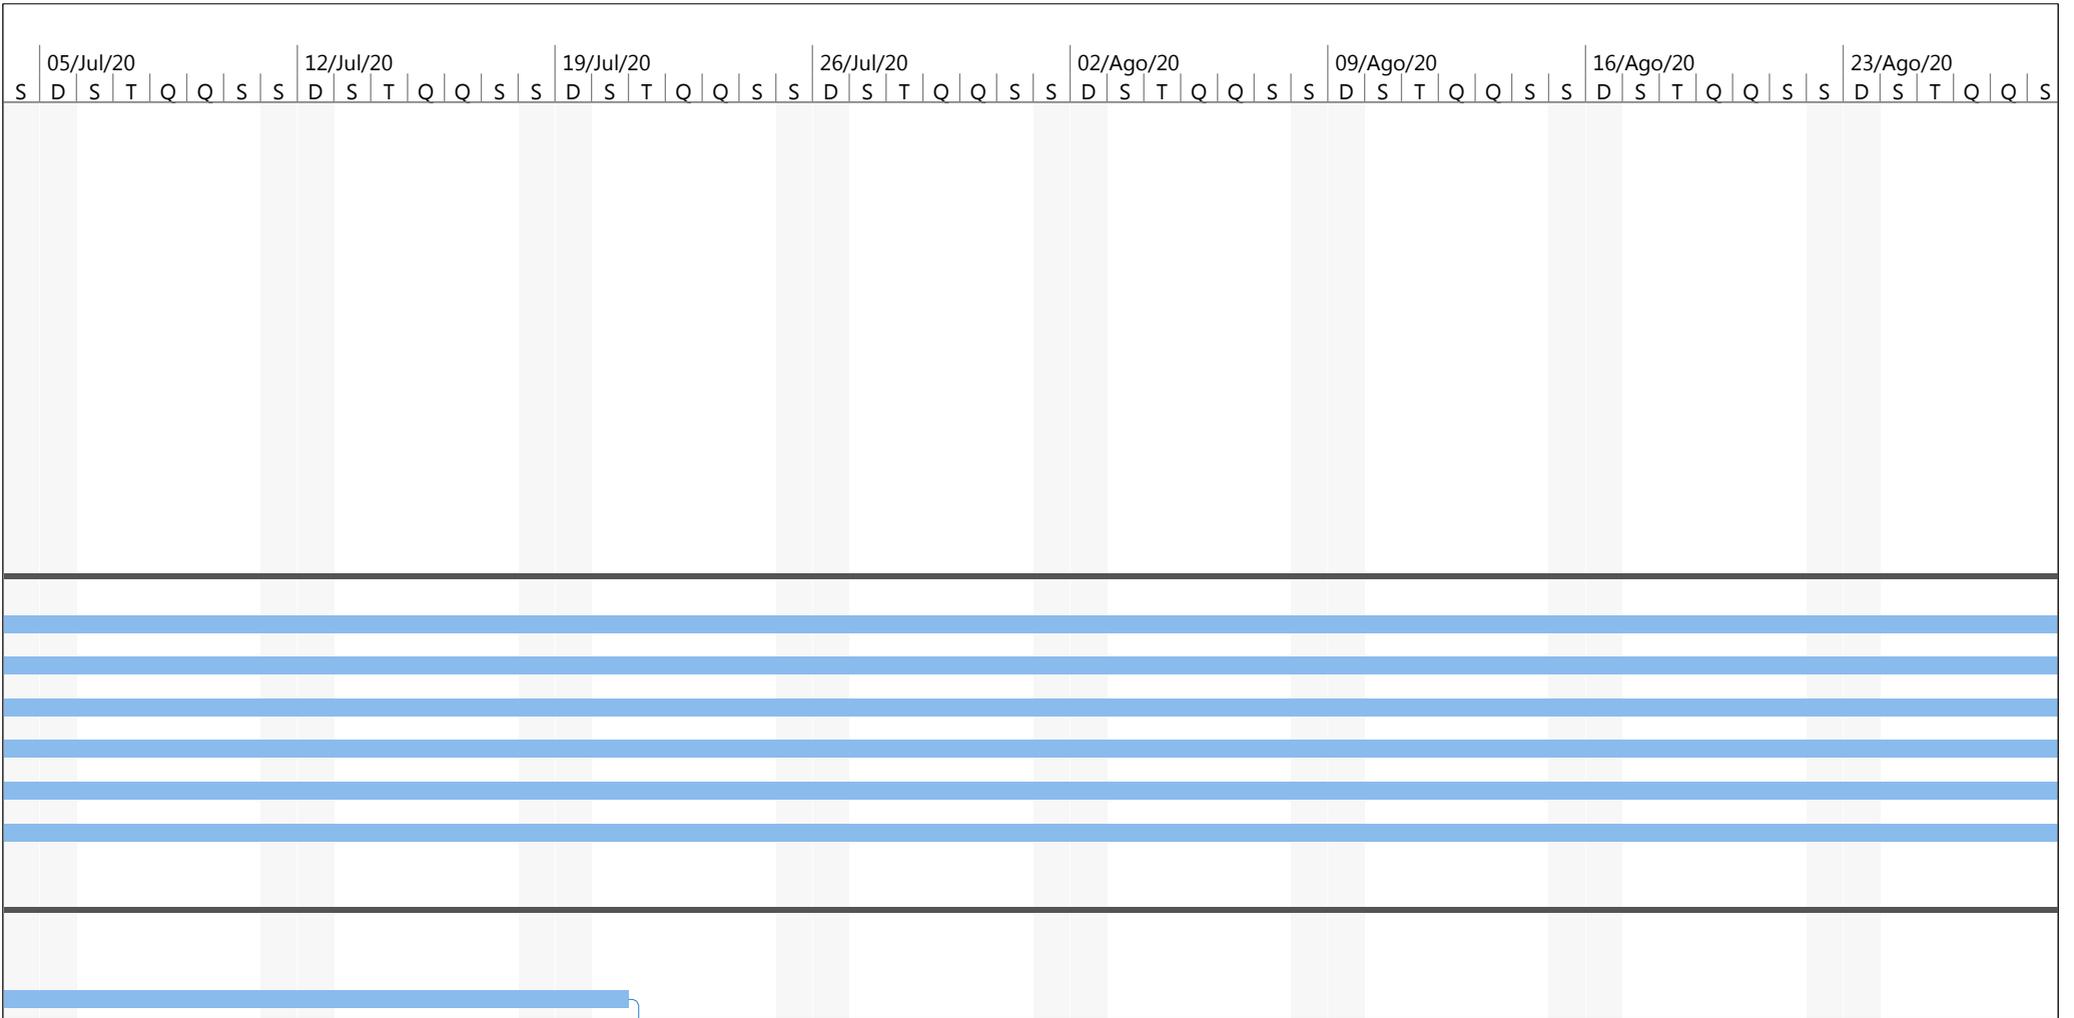


Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

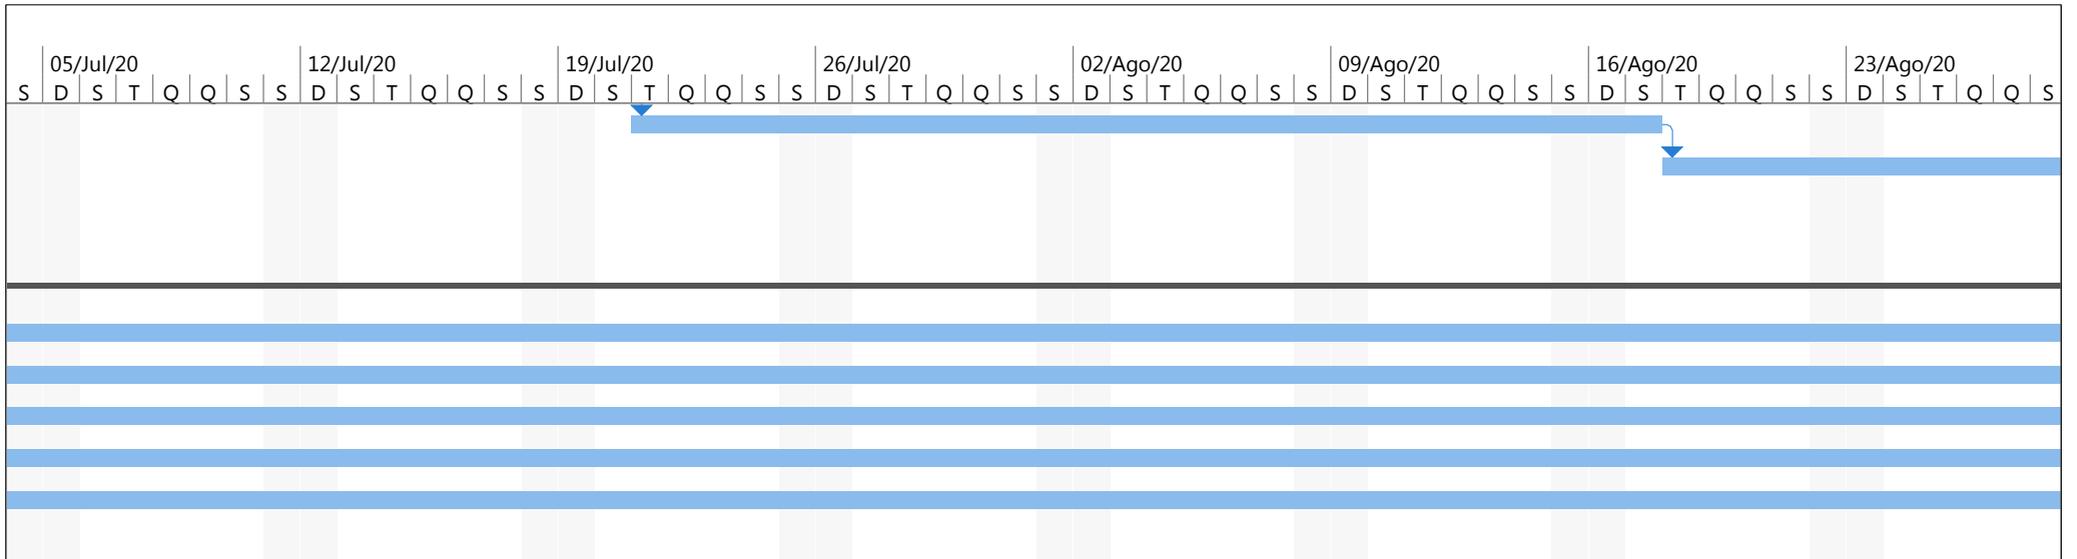


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


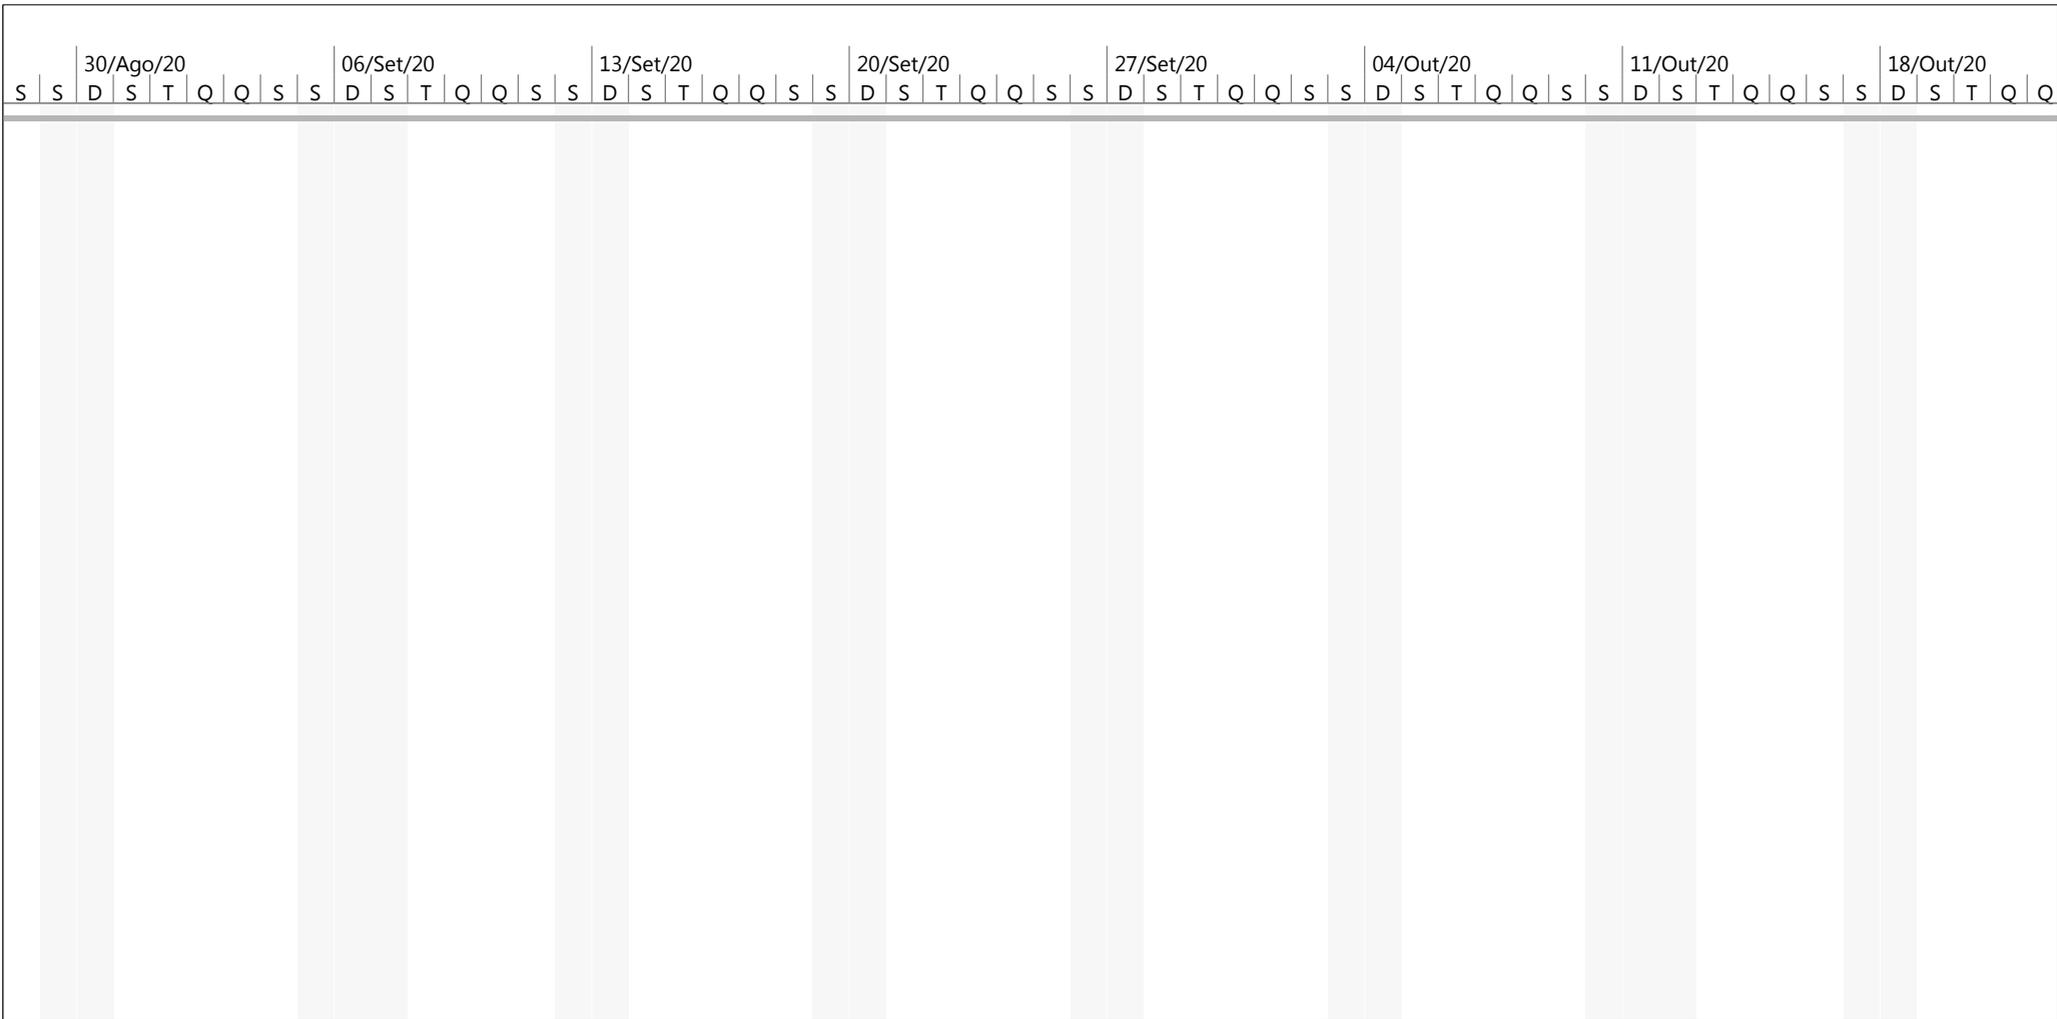


Projeto: SER COMPETENTE Data: Sex 10/02/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

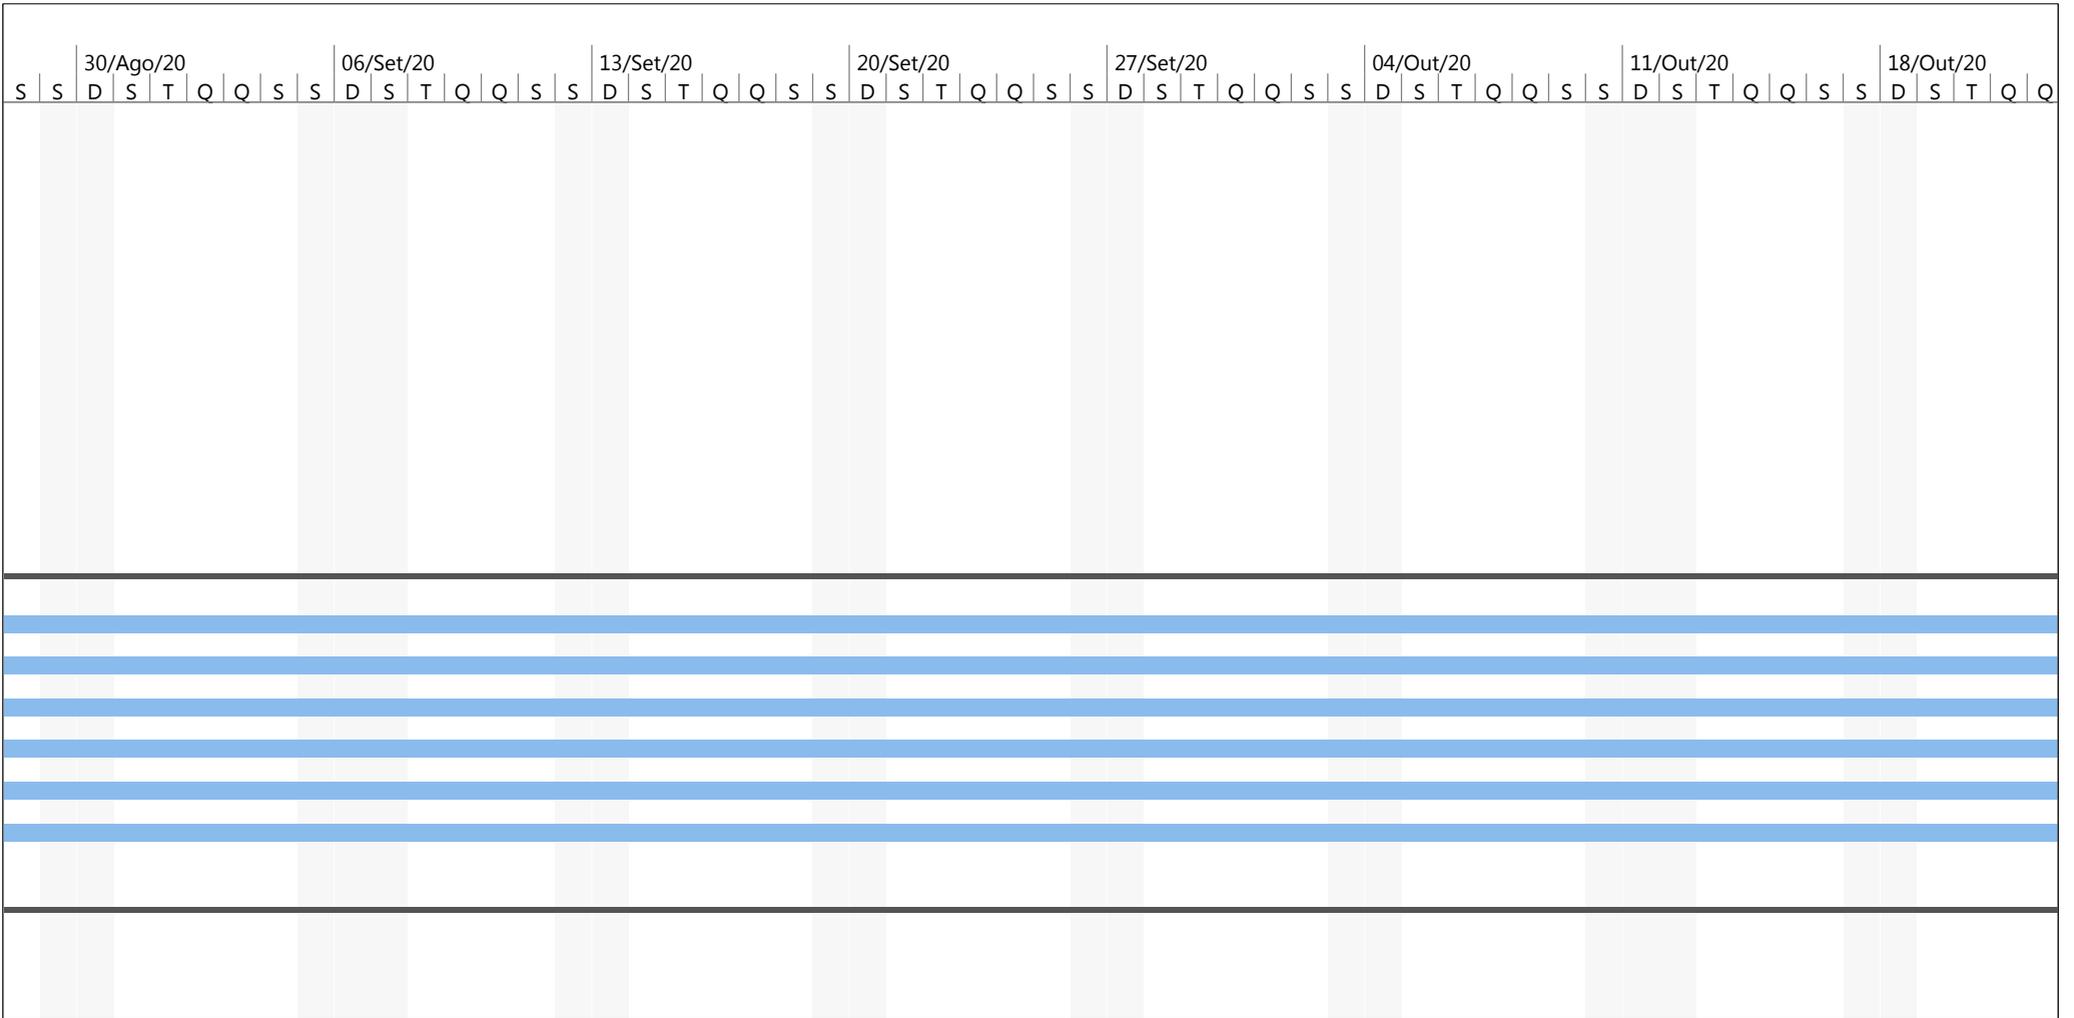


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

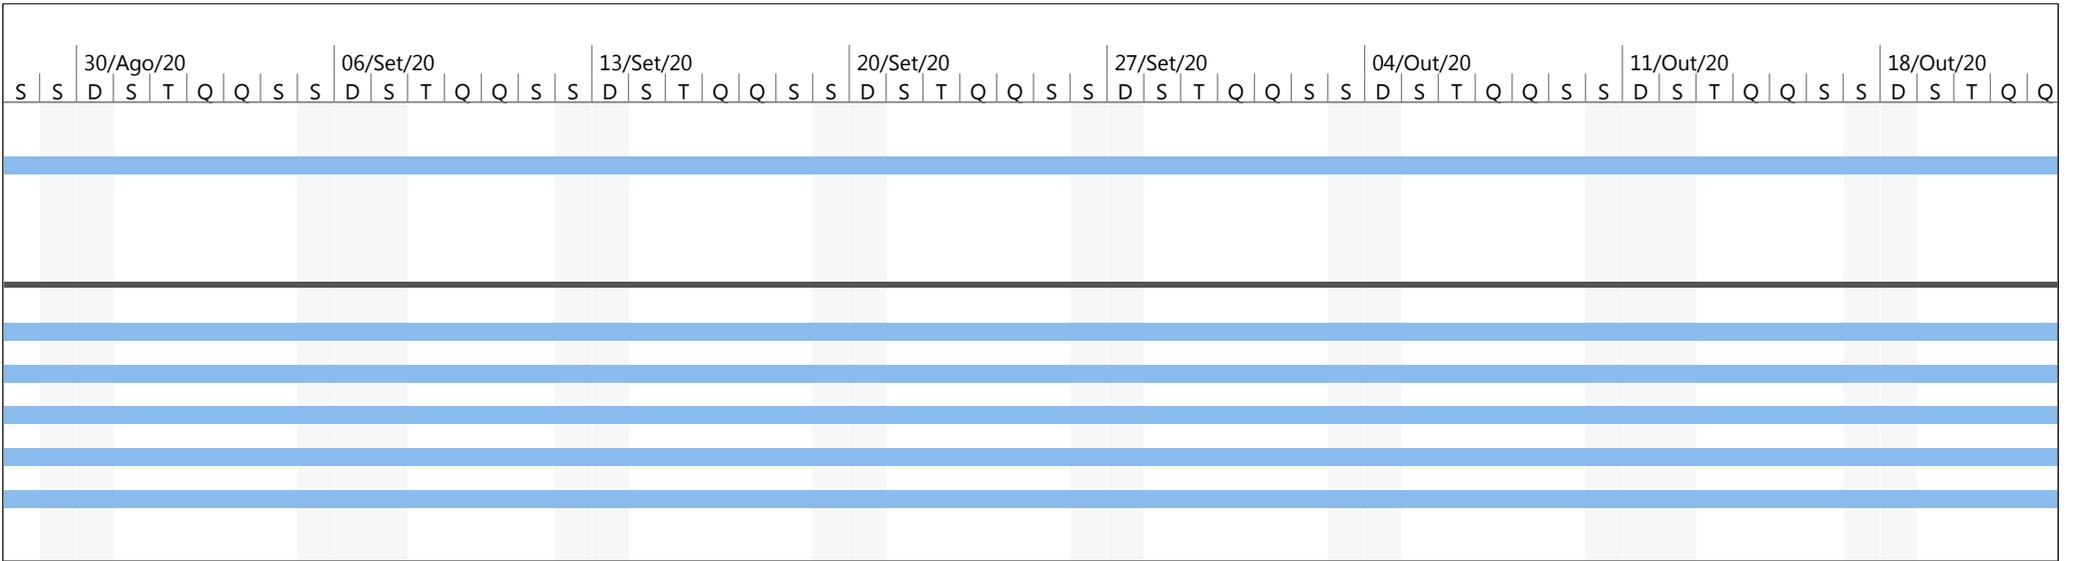


Projeto: SER COMPETENTE  
Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

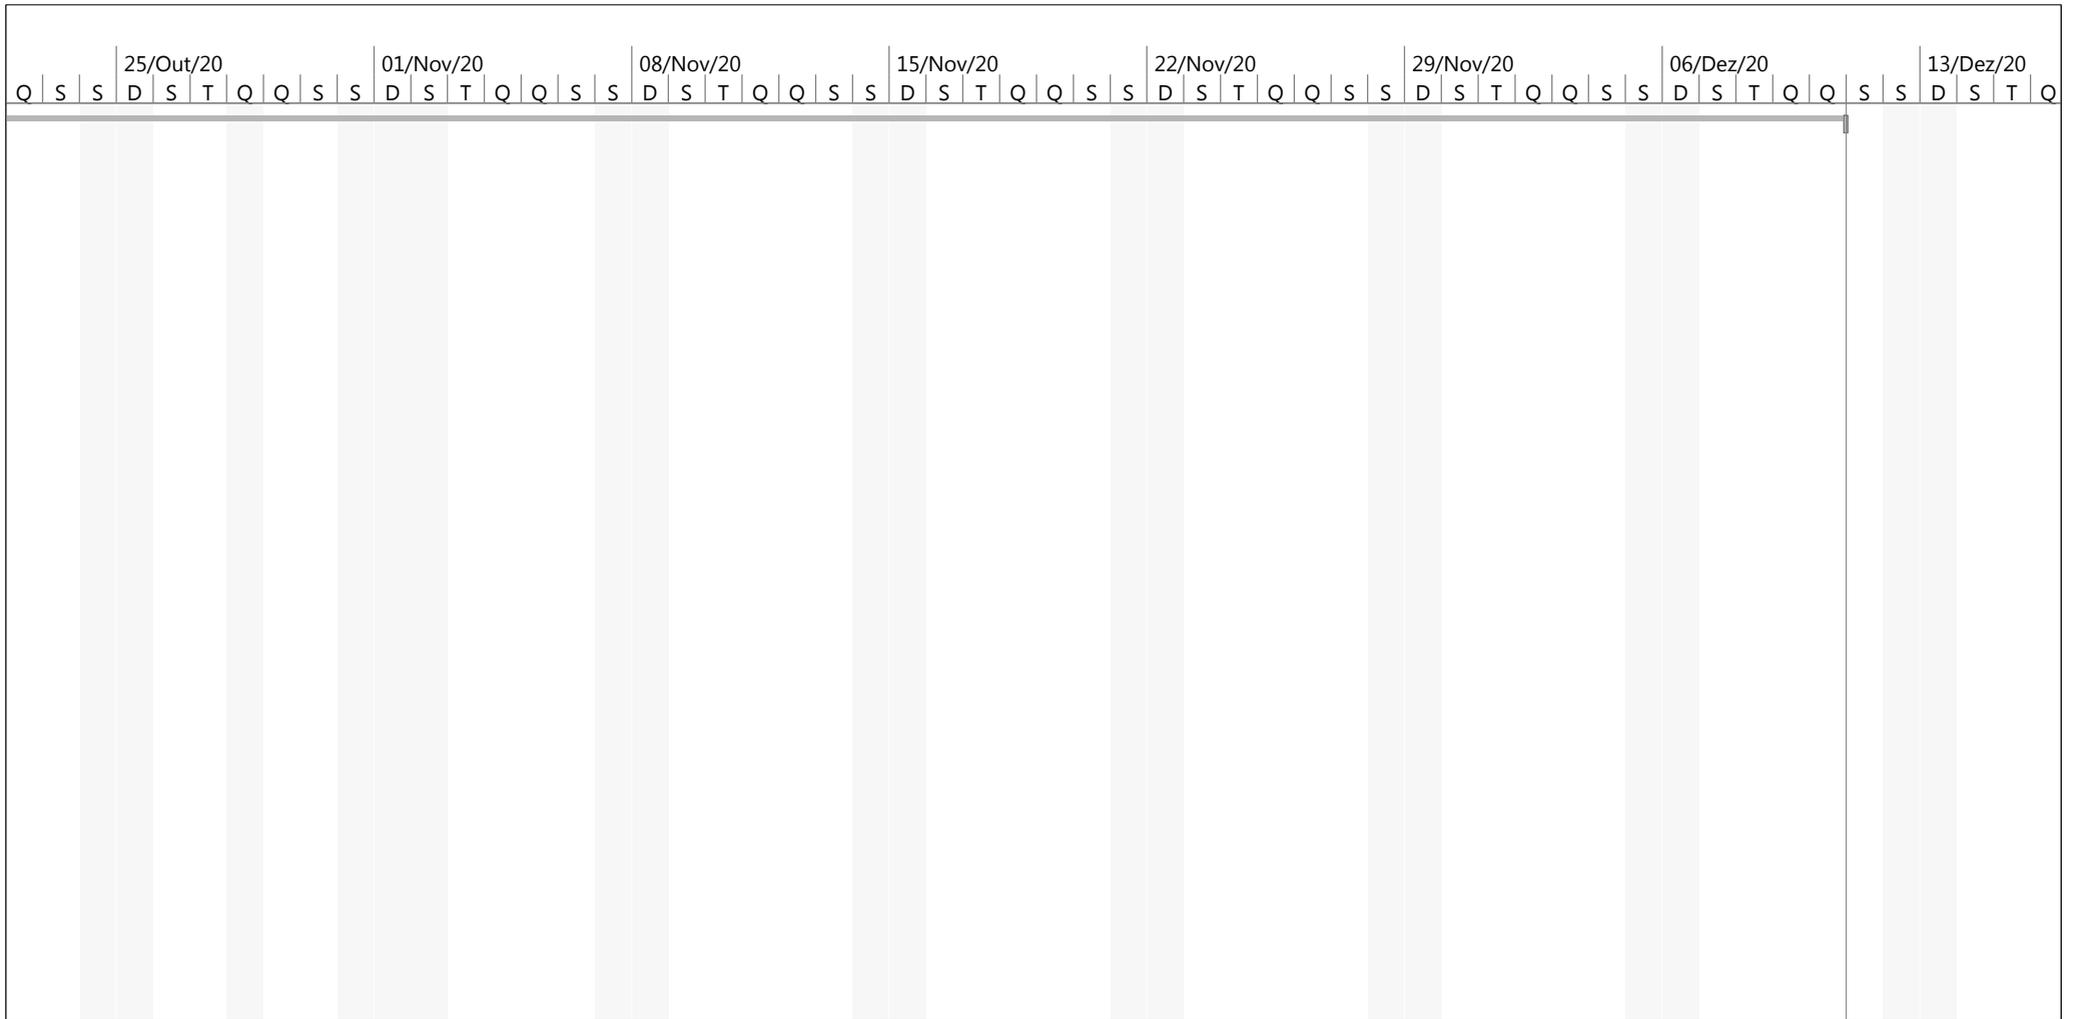


Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

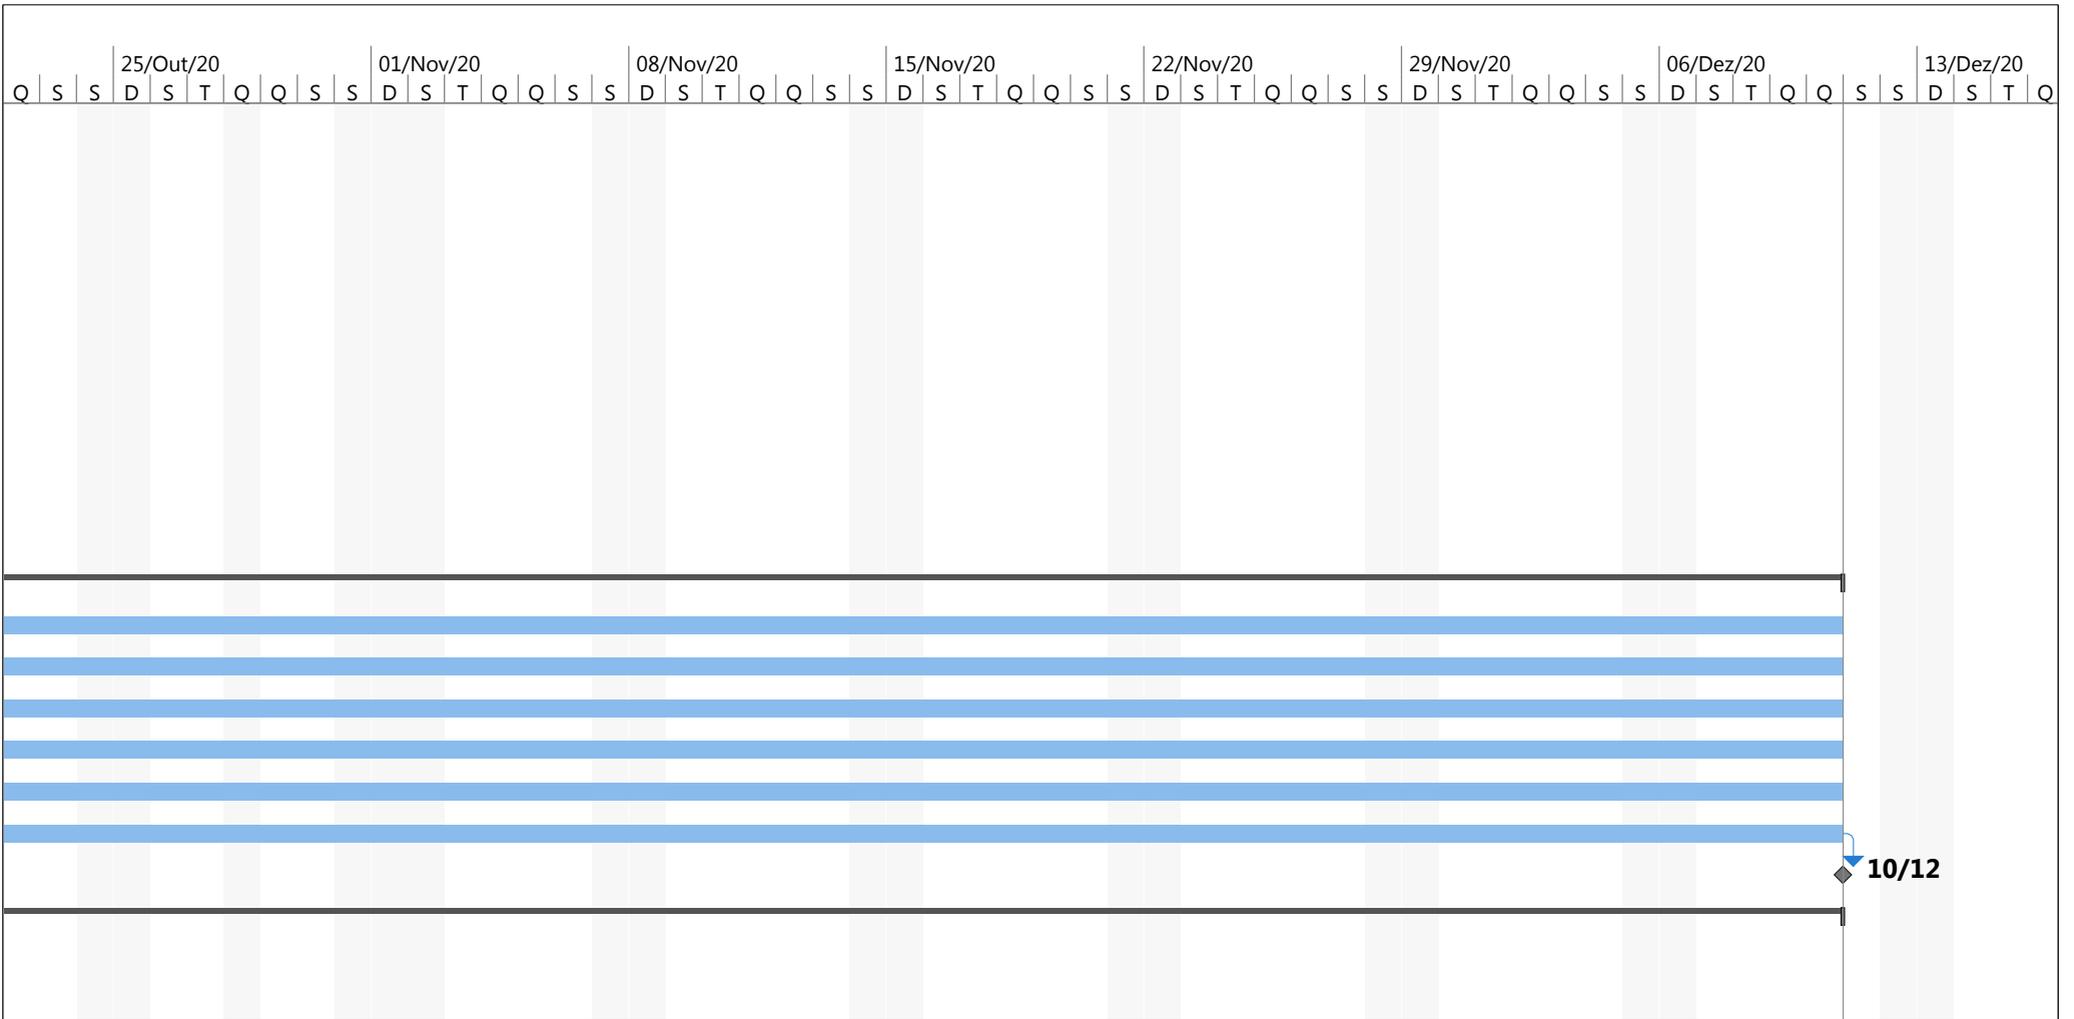

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

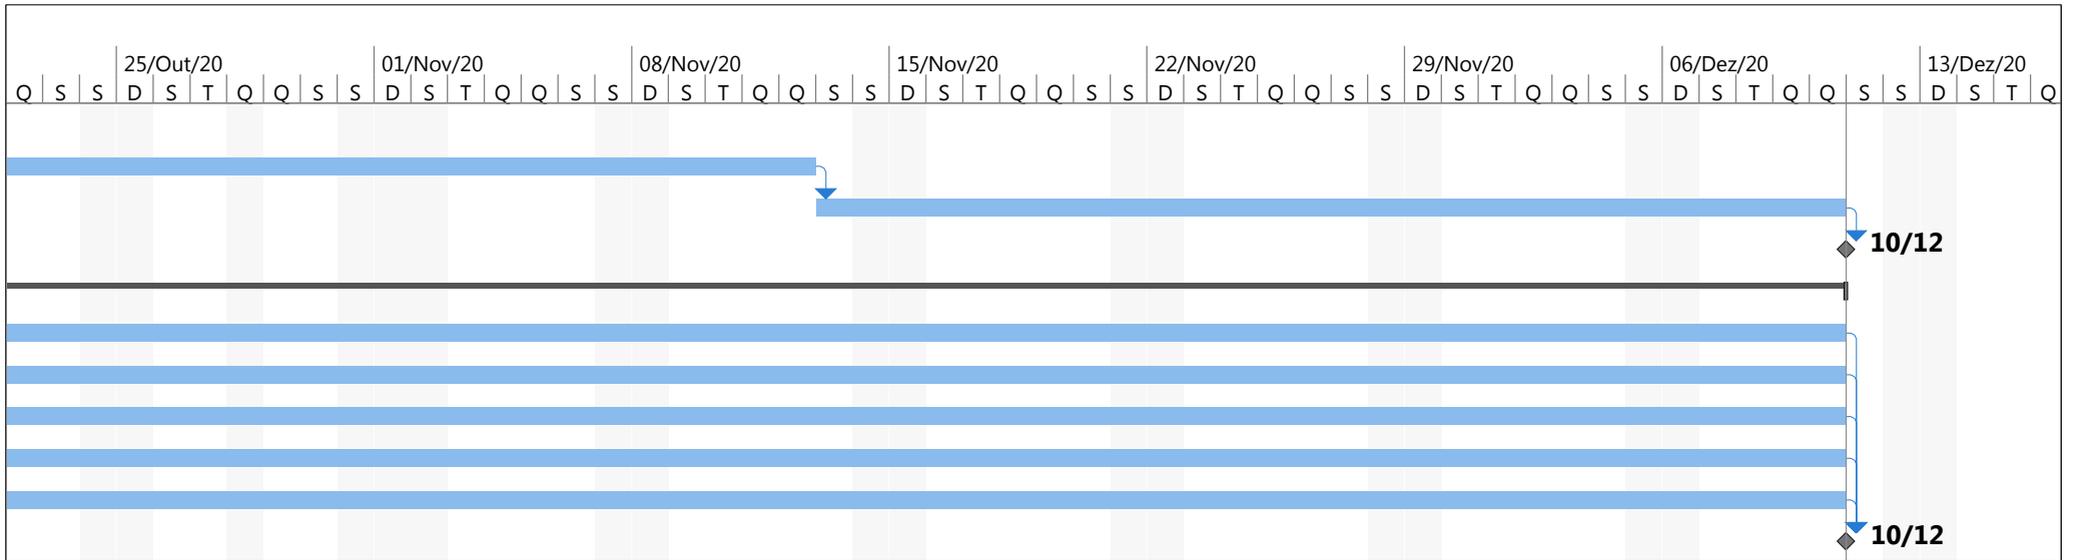

Projeto: SER COMPETENTE  
 Data: Sex 10/02/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
