


Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
0			0	<b>SAUDAVELMENTE</b>		26%	1222 dias	Qui 01/10/15	Sex 02/10/20
1			1	<b>Elaboração das peças para o lançamento do projeto</b>		100%	114 dias	Qui 01/10/15	Qua 06/04/16
2			1.1	Construir o Cronograma de Lançamento do Projeto		100%	45 dias	Qui 01/10/15	Sex 04/12/15
3			1.2	Elaborar o Logotipo do projeto		100%	55 dias	Qui 01/10/15	Sex 18/12/15
4			1.3	Gravar a parte externa do QQIsso		100%	20 dias	Qui 01/10/15	Sex 30/10/15
5			1.4	Criar o endereço eletrônico do projeto		100%	30 dias	Qui 01/10/15	Sex 13/11/15
6			1.5	Elaborar Plano de Comunicação para o Lançamento do		100%	32 dias	Seg 07/12/15	Sex 05/02/16
7			1.6	Elaborar texto de apresentação do projeto para notícia		100%	17 dias	Qui 11/02/16	Sex 04/03/16
8			1.7	Elaborar conteúdos da mala direta e do jornal mural		100%	17 dias	Qui 11/02/16	Sex 04/03/16
9			1.8	Organizar da distribuição de brindes		100%	34 dias	Qui 11/02/16	Sex 01/04/16
10			1.9	Elaborar questões para o Vídeo sobre saúde mental		100%	34 dias	Qui 11/02/16	Sex 01/04/16
11			1.10	Gravar entrevista com a chefia da SAP para o		100%	17 dias	Qui 11/02/16	Sex 04/03/16
12			1.11	Operacionalizar o lançamento do projeto		100%	20 dias	Seg 07/03/16	Qua 06/04/16
13			1.12	<b>PEÇAS PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO</b>		100%	0 dias	Qua 06/04/16	Qua 06/04/16
14			2	<b>Lançamento do projeto</b>		100%	67 dias	Qui 07/04/16	Ter 12/07/16
15			2.1	Publicar texto de apresentação do projeto na intranet		100%	16 dias	Qui 07/04/16	Sex 29/04/16
16			2.2	Veicular mídia QQIsso + Entrevista nas televisões dos		100%	16 dias	Qui 07/04/16	Sex 29/04/16
17			2.3	Promover ações de divulgação da apresentação do		100%	16 dias	Qui 07/04/16	Sex 29/04/16
18			2.4	Promover ação promocional de sorteio de brinde em		100%	5 dias	Seg 02/05/16	Sex 06/05/16
19			2.5	Gerar relatório de acesso às mídias (indicadores de		100%	5 dias	Seg 02/05/16	Sex 06/05/16
20			2.6	Divulgar ganhadores do sorteio		100%	5 dias	Seg 09/05/16	Sex 13/05/16
21			2.7	Disponibilizar vídeo sobre saúde mental com cômputo		100%	24 dias	Seg 16/05/16	Sex 17/06/16

Projeto: SAUDAVELMENTE  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
22	✓		2.8	Avaliar respostas para atribuição de horas de AQ	✓	100%	15 dias	Seg 20/06/16	Sex 08/07/16
23	✓		2.9	Enviar listagem de respondentes para a Escola Judicial	✓	100%	2 dias	Seg 11/07/16	Ter 12/07/16
24	✓		2.10	PROJETO LANÇADO	✓	100%	0 dias	Ter 12/07/16	Ter 12/07/16
25	✓		3	<b>Elaboração do material educativo</b>	✓	100%	80 dias	Qui 07/04/16	Sex 29/07/16
26	✓		3.1	Definir tema a ser trabalhado	✓	100%	16 dias	Qui 07/04/16	Sex 29/04/16
27	✓ 		3.2	Definir materiais educativos a serem utilizados	✓	100%	10 dias	Seg 02/05/16	Sex 13/05/16
28	✓		3.3	Elaborar conteúdo sobre o tema definido	✓	100%	40 dias	Seg 16/05/16	Seg 11/07/16
29	✓		3.4	Operacionalizar o lançamento do material educativo	✓	100%	14 dias	Ter 12/07/16	Sex 29/07/16
30	✓		3.5	MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO	✓	100%	0 dias	Sex 29/07/16	Sex 29/07/16
31			4	<b>Lançamento do material educativo</b>		51%	49 dias	Seg 01/08/16	Sex 07/10/16
32	✓		4.1	Lançar material educativo	✓	100%	25 dias	Seg 01/08/16	Sex 02/09/16
33			4.2	Contatar/Sensibilizar dos multiplicadores do		0%	44 dias	Seg 01/08/16	Sex 30/09/16
34			4.3	Criar comunidade restrita com os representantes do		40%	5 dias	Seg 03/10/16	Sex 07/10/16
35	✓		4.4	Avaliar respostas ou lista de presença para atribuição	✓	100%	19 dias	Seg 05/09/16	Sex 30/09/16
36	✓		4.5	Enviar lista de nomes para a Escola Judicial	✓	100%	2 dias	Seg 03/10/16	Ter 04/10/16
37			4.6	MATERIAL EDUCATIVO LANÇADO		0%	0 dias	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16
38			5	<b>Participação no Dia da Saúde Mental/Semana do</b>		81%	64 dias	Seg 01/08/16	Ter 01/11/16
39	✓		5.1	Definir tema para os dois eventos	✓	100%	10 dias	Seg 01/08/16	Sex 12/08/16
40	✓		5.2	Operacionalizar a participação no Dia Mundial da	✓	100%	39 dias	Seg 15/08/16	Sex 07/10/16
41			5.3	Promover ações em cada unidade organizada em		0%	20 dias	Seg 03/10/16	Ter 01/11/16
42	✓		5.4	Promover na intranet a participação no Dia Mundial da	✓	100%	20 dias	Seg 03/10/16	Ter 01/11/16
43	✓		5.5	Participar do Dia Mundial da Saúde Mental/Semana do	✓	100%	14 dias	Seg 10/10/16	Seg 31/10/16

Projeto: SAUDAVELMENTE  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
44			5.6	<b>PARTICIPAÇÃO NO DIA DA SAÚDE MENTAL/SEMANA</b>		0%	0 dias	Seg 31/10/16	Seg 31/10/16
45			6	<b>Elaboração do material educativo</b>		54%	90 dias	Ter 01/11/16	Sex 31/03/17
46			6.1	Definir tema a ser trabalhado		100%	13 dias	Ter 01/11/16	Sex 18/11/16
47			6.2	Definir materiais educativos a serem utilizados		100%	10 dias	Seg 21/11/16	Sex 02/12/16
48			6.3	Elaborar conteúdo sobre o tema definido		50%	52 dias	Seg 05/12/16	Sex 10/03/17
49			6.4	Operacionalizar o lançamento do material educativo		0%	15 dias	Seg 13/03/17	Sex 31/03/17
50			6.5	<b>MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO</b>		0%	0 dias	Sex 31/03/17	Sex 31/03/17
51			7	<b>Lançamento do material educativo</b>		0%	46 dias	Seg 03/04/17	Seg 12/06/17
52			7.1	Lançar material educativo		0%	25 dias	Seg 03/04/17	Sex 12/05/17
53			7.2	Avaliar respostas ou lista de presença para atribuição		0%	20 dias	Seg 15/05/17	Sex 09/06/17
54			7.3	Enviar lista de nomes para a Escola Judicial		0%	1 dia	Seg 12/06/17	Seg 12/06/17
55			7.4	<b>MATERIAL EDUCATIVO LANÇADO</b>		0%	0 dias	Seg 12/06/17	Seg 12/06/17
56			8	<b>Pesquisa para escolha do tema e de satisfação</b>		0%	74 dias	Seg 03/04/17	Sex 21/07/17
57			8.1	Construir pesquisa interna sobre temas		0%	25 dias	Seg 03/04/17	Sex 12/05/17
58			8.2	Construir pesquisa sobre a satisfação		0%	25 dias	Seg 03/04/17	Sex 12/05/17
59			8.3	Aplicar Votação para escolha do tema		0%	24 dias	Seg 15/05/17	Sex 16/06/17
60			8.4	Aplicar Pesquisa sobre a satisfação		0%	24 dias	Seg 15/05/17	Sex 16/06/17
61			8.5	Tabular resultados da votação		0%	15 dias	Seg 19/06/17	Sex 07/07/17
62			8.6	Tabular resultados da pesquisa de satisfação		0%	15 dias	Seg 19/06/17	Sex 07/07/17
63			8.7	Avaliar internamente os resultados		0%	10 dias	Seg 10/07/17	Sex 21/07/17
64			8.8	<b>PESQUISA TEMA E SATISFAÇÃO FINALIZADA</b>		0%	0 dias	Sex 21/07/17	Sex 21/07/17
65			9	<b>Participação na Semana do Servidor/Dia da Saúde</b>		0%	144 dias	Seg 03/04/17	Ter 31/10/17

Projeto: SAUDAVELMENTE  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
66			9.1	Contratar profissional externo		0%	89 dias	Seg 03/04/17	Sex 11/08/17
67			9.2	Definir tema para os dois eventos		0%	10 dias	Seg 14/08/17	Sex 25/08/17
68			9.3	Operacionalizar a participação no Dia Mundial da		0%	29 dias	Seg 28/08/17	Sex 06/10/17
69			9.4	Operacionalizar a participação na Semana do Servidor		0%	38 dias	Seg 28/08/17	Sex 20/10/17
70			9.5	Promover ações em cada unidade organizada em		0%	16 dias	Seg 09/10/17	Ter 31/10/17
71			9.6	Promover na intranet a participação no Dia Mundial da		0%	5 dias	Seg 09/10/17	Seg 16/10/17
72			9.7	Participar do Dia Mundial da Saúde Mental		0%	5 dias	Seg 09/10/17	Seg 16/10/17
73			9.8	Promover na intranet a participação na Semana do		0%	5 dias	Seg 23/10/17	Sex 27/10/17
74			9.9	Participar da semana do servidor		0%	5 dias	Seg 23/10/17	Sex 27/10/17
75			9.10	<b>PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DO SERVIDOR/DIA DA</b>		0%	0 dias	Sex 27/10/17	Sex 27/10/17
76			10	<b>Elaboração e lançamento do material educativo)</b>		0%	249 dias	Seg 30/10/17	Sex 26/10/18
77			10.1	Elaborar e lançar o material educativo de forma no		0%	249 dias	Seg 30/10/17	Sex 26/10/18
78			10.2	<b>MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO E LANÇADO</b>		0%	0 dias	Sex 26/10/18	Sex 26/10/18
79			11	<b>I Fórum de Saúde Mental</b>		0%	238 dias	Seg 30/10/17	Qua 10/10/18
80			11.1	Elaborar plataforma		0%	235 dias	Seg 30/10/17	Sex 05/10/18
81			11.2	Realizar fórum		0%	3 dias	Seg 08/10/18	Qua 10/10/18
82			11.3	<b>I FÓRUM DE SAÚDE MENTAL REALIZADO</b>		0%	0 dias	Qua 10/10/18	Qua 10/10/18
83			12	<b>Elaboração e lançamento do material educativo)</b>		0%	252 dias	Seg 29/10/18	Ter 29/10/19
84			12.1	Elaborar e lançar o material educativo de forma no		0%	252 dias	Seg 29/10/18	Ter 29/10/19
85			12.2	<b>MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO E LANÇADO</b>		0%	0 dias	Ter 29/10/19	Ter 29/10/19
86			13	<b>Pesquisa para escolha do tema e de satisfação</b>		22%	127 dias	Seg 29/10/18	Sex 03/05/19
87			13.1	Construir pesquisa interna sobre temas		75%	69 dias	Seg 29/10/18	Sex 01/02/19


Projeto: SAUDAVELMENTE  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Linha de base definida?	EDT	Nome da tarefa	Situação	% concluída	Duração	Início	Término
88			13.2	Construir pesquisa sobre a satisfação		0%	69 dias	Seg 29/10/18	Sex 01/02/19
89			13.3	Aplicar Votação para escolha do tema		0%	15 dias	Seg 04/02/19	Sex 22/02/19
90			13.4	Aplicar Pesquisa sobre a satisfação		0%	15 dias	Seg 04/02/19	Sex 22/02/19
91			13.5	Tabular resultados da votação		0%	22 dias	Seg 25/02/19	Sex 29/03/19
92			13.6	Tabular resultados da pesquisa de satisfação		0%	22 dias	Seg 25/02/19	Sex 29/03/19
93			13.7	Avaliar internamente os resultados		0%	21 dias	Seg 01/04/19	Sex 03/05/19
94			13.8	<b>PESQUISA TEMA E SATISFAÇÃO FINALIZADA</b>		0%	0 dias	Sex 03/05/19	Sex 03/05/19
95			14	<b>Elaboração e lançamento do material educativo</b>		0%	255 dias	Seg 29/10/18	Sex 01/11/19
96			14.1	Elaborar e lançar o material educativo de forma no		0%	255 dias	Seg 29/10/18	Sex 01/11/19
97			14.2	<b>MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO E LANÇADO</b>		0%	0 dias	Sex 01/11/19	Sex 01/11/19
98			15	<b>Oficina Promoção em Saúde Mental</b>		0%	224 dias	Seg 04/11/19	Sex 25/09/20
99			15.1	Elaborar da oficina		0%	200 dias	Seg 04/11/19	Sex 21/08/20
100			15.2	Realizar oficina		0%	24 dias	Seg 24/08/20	Sex 25/09/20
101			15.3	<b>OFICINA ELABORADA E REALIZADA</b>		0%	0 dias	Sex 25/09/20	Sex 25/09/20
102			16	<b>Lançamento da página da intranet do projeto</b>		0%	229 dias	Seg 04/11/19	Sex 02/10/20
103			16.1	Elaborar material da página		0%	160 dias	Seg 04/11/19	Sex 26/06/20
104			16.2	Elaborar página da intranet		0%	50 dias	Seg 29/06/20	Sex 04/09/20
105			16.3	Efetuar o lançamento publicitário da página da		0%	19 dias	Ter 08/09/20	Sex 02/10/20
106			16.4	<b>PÁGINA DO PROJETO LANÇADA NA INTRANET</b>		0%	0 dias	Sex 02/10/20	Sex 02/10/20

Projeto: SAUDAVELMENTE  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

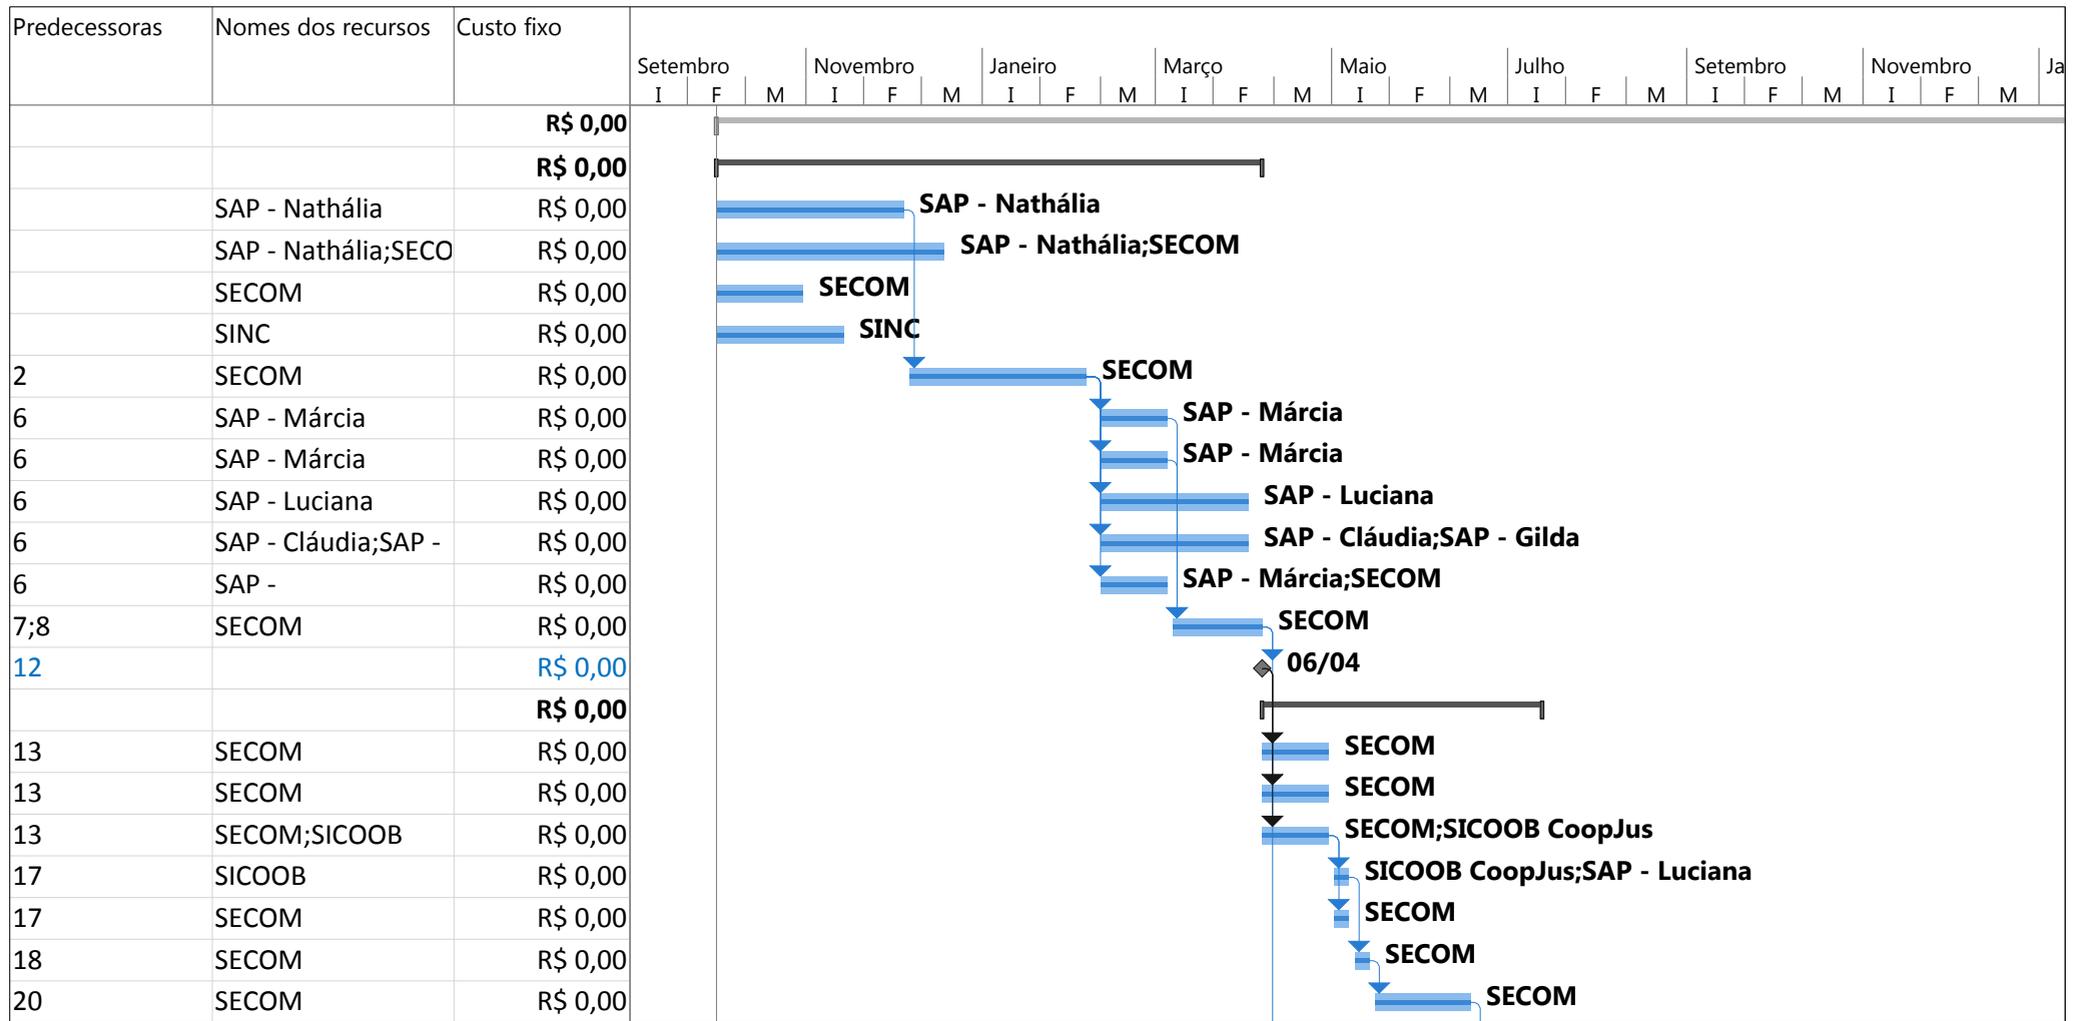

Projeto: SAUDELMENTE  
Data: Seg 30/01/17

Tarefa	[Barra azul]	Resumo Inativo	[Barra cinza]	Tarefas externas	[Barra cinza]
Divisão	[Barra pontilhada]	Tarefa Manual	[Barra verde]	Marco externo	[Losango cinza]
Marco	[Losango cinza]	Somente duração	[Barra verde]	Data limite	[Seta verde]
Resumo	[Barra cinza]	Acúmulo de Resumo Manual	[Barra verde]	Andamento	[Barra azul]
Resumo do projeto	[Barra cinza]	Resumo Manual	[Barra cinza]	Progresso manual	[Barra verde]
Tarefa Inativa	[Barra azul]	Somente início	[Canto superior esquerdo]		
Marco Inativo	[Losango cinza]	Somente término	[Canto inferior direito]		





Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo fixo	Setembro			Novembro			Janeiro			Março			Maio			Julho			Setembro			Novembro			Ja
			I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	
50	SAP	R\$ 0,00																									
66	SAP	R\$ 0,00																									
67	SAP	R\$ 0,00																									
67	SAP	R\$ 0,00																									
68	SAP	R\$ 0,00																									
68	SECOM	R\$ 0,00																									
68	SAP	R\$ 0,00																									
69	SECOM	R\$ 0,00																									
69	SAP	R\$ 0,00																									
74		R\$ 0,00																									
		<b>R\$ 0,00</b>																									
75	SECOM;SAP	R\$ 0,00																									
77		R\$ 0,00																									
		<b>R\$ 0,00</b>																									
75	SAP	R\$ 0,00																									
80	SAP	R\$ 0,00																									
81		R\$ 0,00																									
		<b>R\$ 0,00</b>																									
78	SAP;SECOM	R\$ 0,00																									
84		R\$ 0,00																									
		<b>R\$ 0,00</b>																									
78	SAP	R\$ 0,00																									

Projeto: SAUDELMENTE Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo fixo	Setembro			Novembro			Janeiro			Março			Maio			Julho			Setembro			Novembro			Ja
			I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	I	F	M	
78	SAP	R\$ 0,00																									
87	SECOM	R\$ 0,00																									
88	SECOM	R\$ 0,00																									
89	SAP	R\$ 0,00																									
90	SAP	R\$ 0,00																									
92;91	SAP	R\$ 0,00																									
93		R\$ 0,00																									
		<b>R\$ 0,00</b>																									
78	SAP;SECOM	R\$ 0,00																									
96		R\$ 0,00																									
		<b>R\$ 0,00</b>																									
97	SAP	R\$ 0,00																									
99	SAP	R\$ 0,00																									
100		R\$ 0,00																									
		<b>R\$ 0,00</b>																									
97	SAP	R\$ 0,00																									
103	DTIC	R\$ 0,00																									
104	SECOM	R\$ 0,00																									
105		R\$ 0,00																									

--	--	--	--	--	--

Projeto: SAUDAVELMENTE  
Data: Seg 30/01/17


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Janeiro I F M | Março I F M | Maio I F M | Julho I F M | Setembro I F M | Novembro I F M | Janeiro I F M | Março I F M | Maio I F M | Julho I F M | Setembro I F M | Novembro I F M



- Nathália;SAP - Giuliana;SAP - Margarida

Projeto: SAUDELMENTE Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

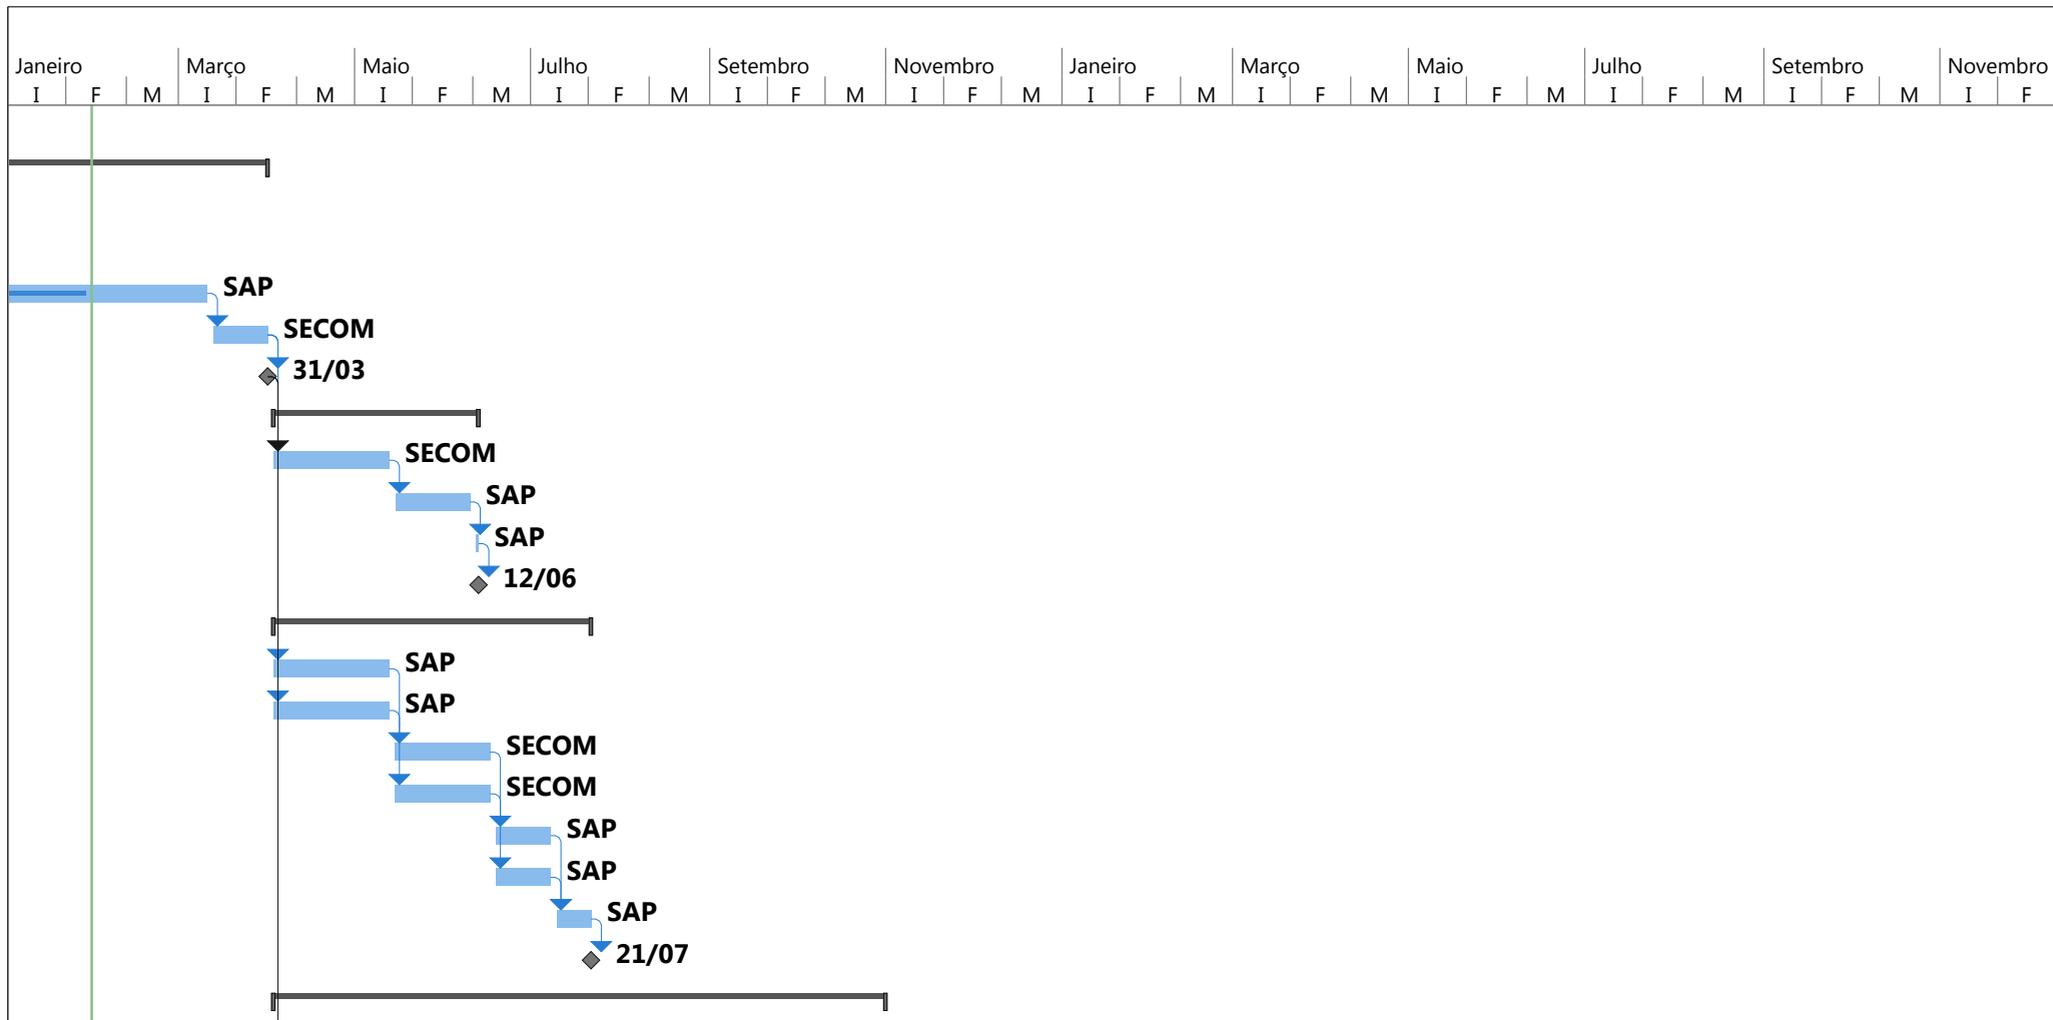


Projeto: SAUDELMENTE Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



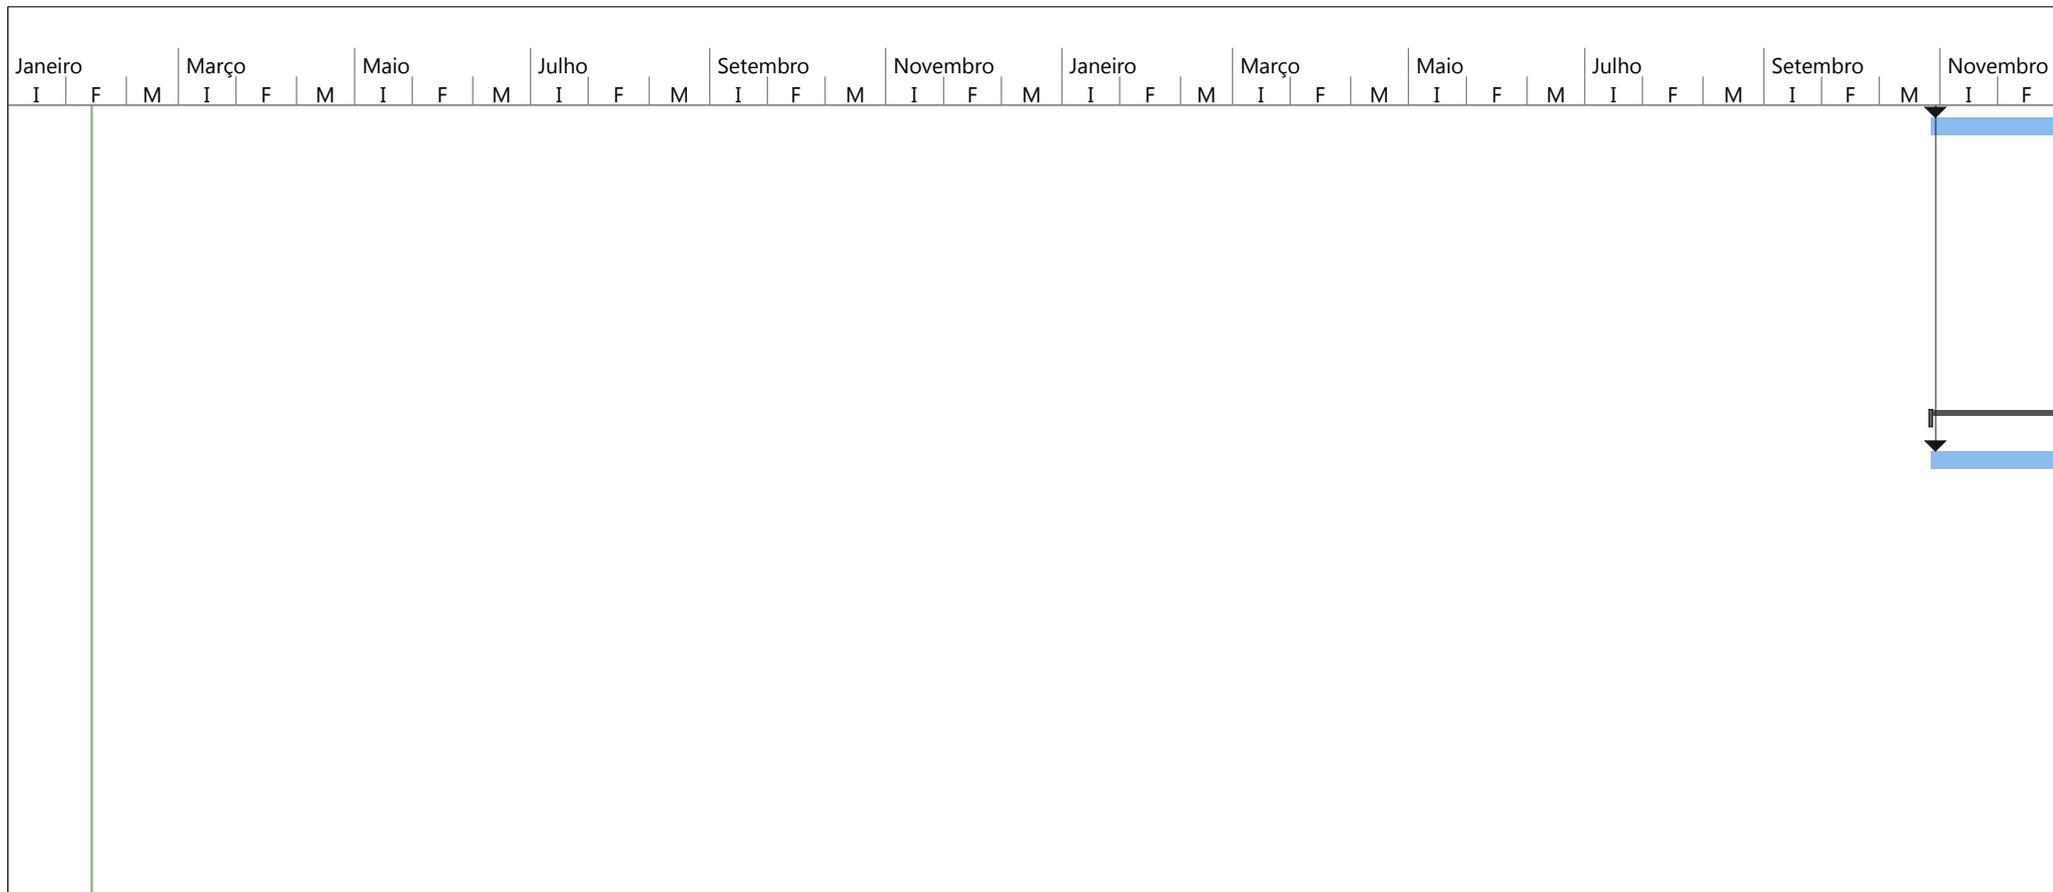

Projeto: SAUDELMENTE Data: Seg 30/01/17	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: SAUDAVELMENTE  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

M | Janeiro | M | Março | Maio | Julho | Setembro | Novembro | Janeiro | Março | Maio | Julho | Setembro | Novembro | M | I


Projeto: SAUDAVELMENTE  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


M | Janeiro | M | Março | Maio | Julho | Setembro | Novembro | Janeiro | Março | Maio | Julho | Setembro | Novembro | M | I

Projeto: SAUDAVELMENTE  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

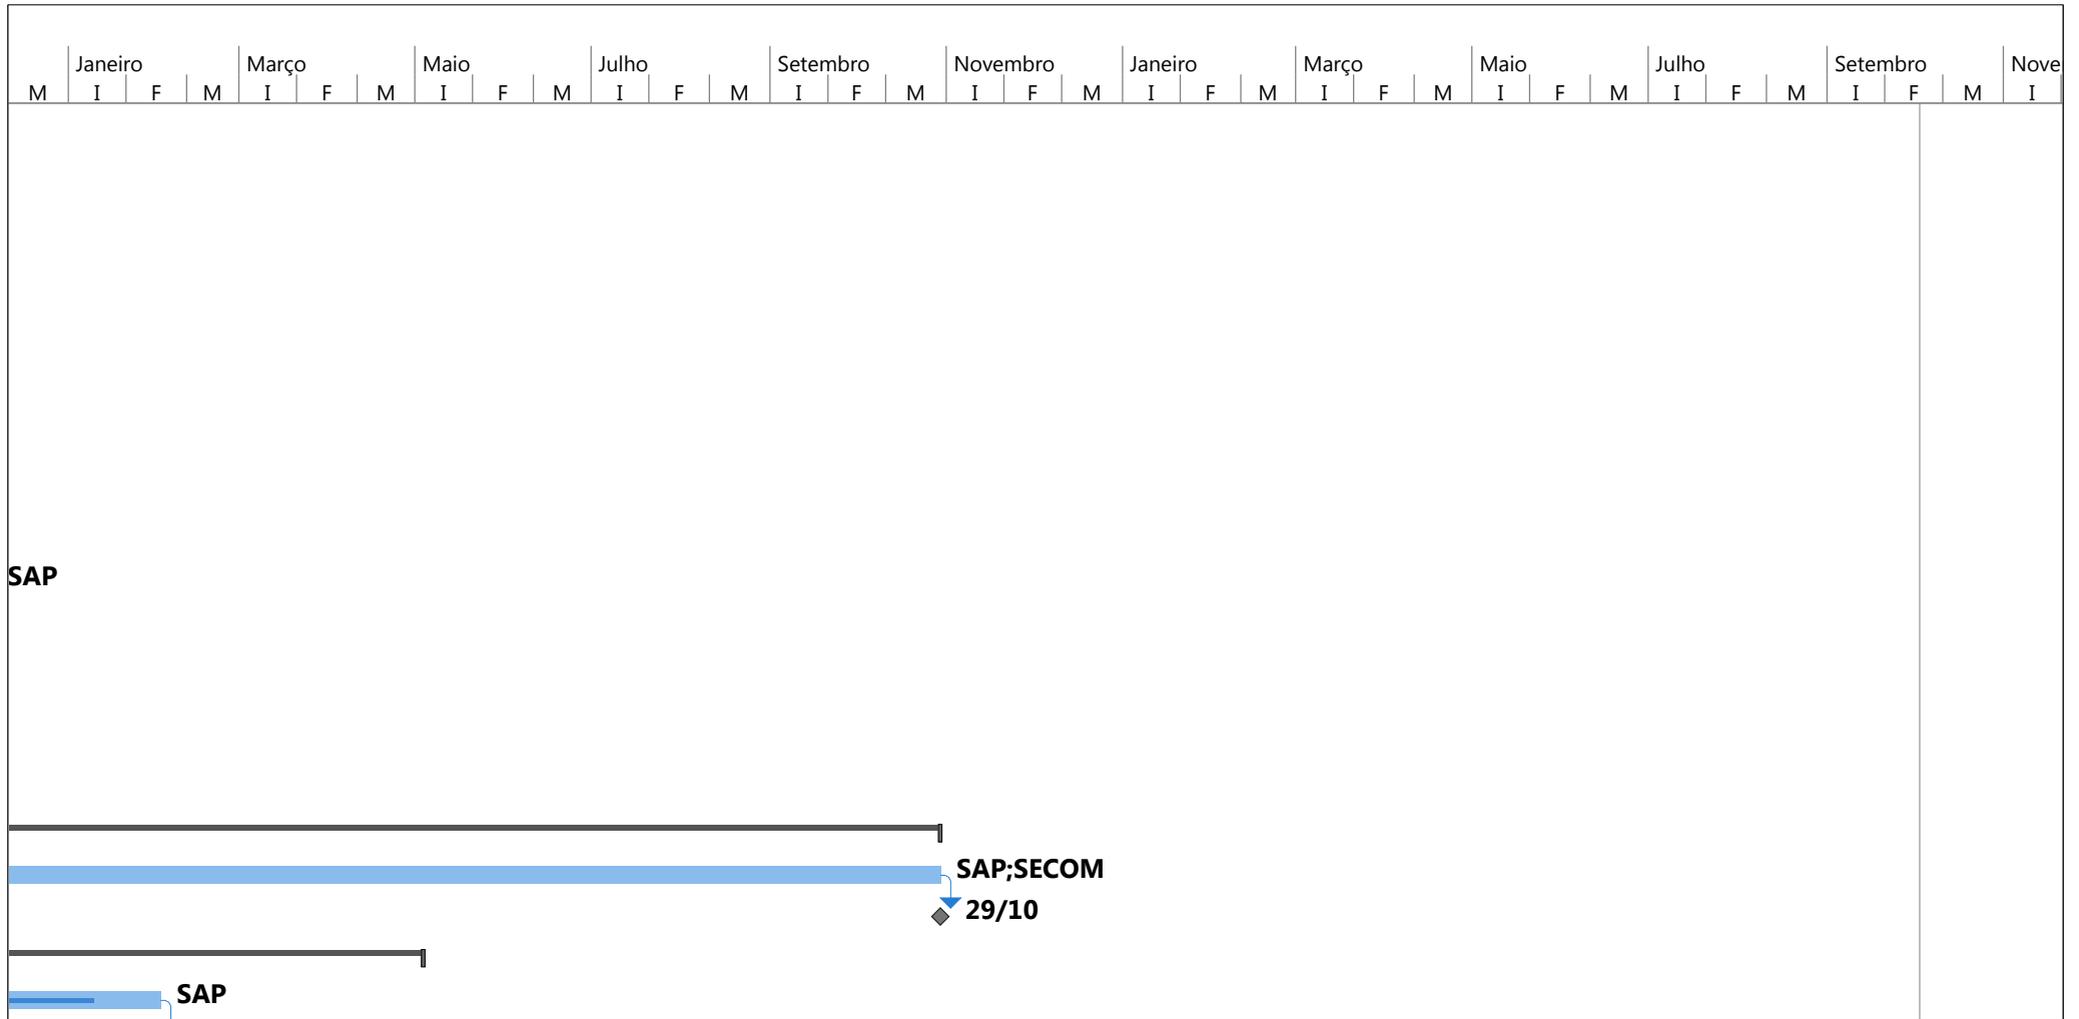

Projeto: SAUDAVELMENTE  
 Data: Seg 30/01/17

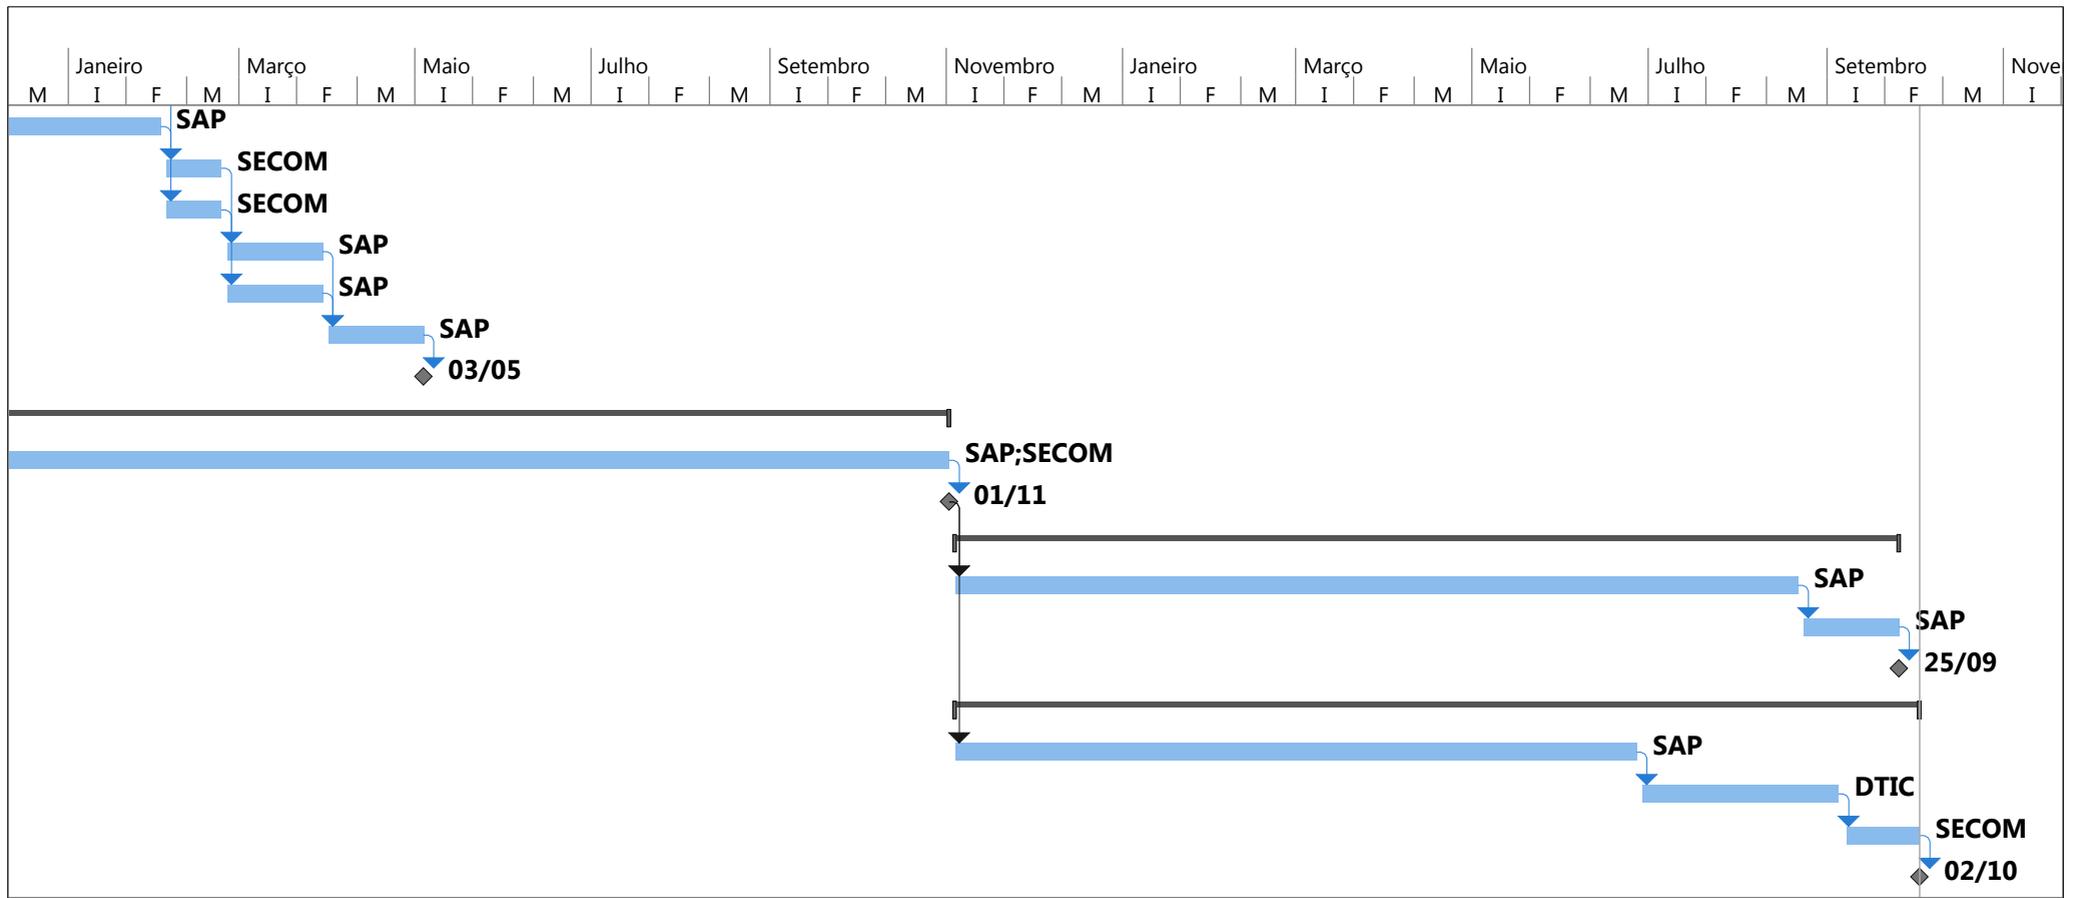

Projeto: SAUDELMENTE  
 Data: Seg 30/01/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
