








































ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
0		✗	0	SIGEP 10.06.2016		65%	956 dias?	Qua 07/01/15
1	✓	✗	1	Formação do Comitê Gestor	✓	100%	8 dias	Seg 09/05/16
2	✓	✗	1.1	Publicar portaria com a indicação dos membros do Comitê	✓	100%	1 dia	Seg 09/05/16
3	✓	✗	1.2	Reunir os membros para início dos trabalhos - Reunião 1	✓	100%	1 dia	Qua 18/05/16
4	✓	✗	1.3	Comitê constituído	✓	100%	1 dia	Seg 09/05/16
5	✓	✗	2	Deliberações do Comitê Gestor	✓	100%	364 dias	Ter 14/06/16
6	✓	✗	2.1	Reunião 2 (fechar TAP)	✓	100%	1 dia	Ter 14/06/16
7	✓	✗	2.2	Reunião 3 (fechar PPE)	✓	100%	1 dia	Seg 26/09/16
8	✓	✗	2.3	Reunião 4 (Progresso e Monitoramento de Riscos)	✓	100%	1 dia	Seg 06/02/17
9	✓	✗	2.4	Reunião (Gestores Executivos)	✓	100%	1 dia	Sex 10/02/17
10	✓	✗	2.5	Reunião 5 (Análise dos riscos)	✓	100%	1 dia	Qui 16/02/17
11	✓	✗	2.6	Reunião 6 (Progresso e Monitoramento de Riscos)	✓	100%	1 dia	Ter 04/07/17
12	✓	✗	2.7	Reunião 7	✓	100%	1 dia	Ter 03/10/17
13	✓	✗	2.8	Reunião 8	✓	100%	1 dia	Qua 08/11/17
14	✓	✗	2.9	Reunião 9	✓	100%	1 dia	Seg 18/12/17
15	✓	✗	3	Gestão do Projeto	✓	100%	632 dias	Qua 17/06/15
16	✓	✗	3.1	Construção do Termo de Abertura do Projeto - TAP	✓	100%	239 dias	Ter 07/07/15
17	✓	✗	3.1.1	Propor escopo e minutar TAP	✓	100%	10 dias	Qui 19/05/16
18	✓	✗	3.1.2	Submeter a minuta do TAP para o Comitê, definindo escopo e equipe do projeto	✓	100%	7 dias	Ter 14/06/16
19	✓	✗	3.1.3	Colher assinatura dos gerentes do projeto e do patrocinador	✓	100%	10 dias	Qui 23/06/16
20	✓	✗	3.1.4	Encaminhar o TAP para Secretaria de Gestão Estratégica	✓	100%	1 dia	Qui 07/07/16
21	✓	✗	3.1.5	TAP construído	✓	100%	1 dia	Ter 07/07/15

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
22	✓	✗	3.2	Construção do Plano de Projeto Estratégico - PPE	✓	100%	46 dias	Qui 01/09/16
23	✓	✗	3.2.1	Minutar o Plano de Projeto	✓	100%	15 dias	Qui 01/09/16
24	✓	✗	3.2.2	Submeter a minuta do PPE para o Comitê	✓	100%	5 dias	Sex 23/09/16
25	✓	✗	3.2.3	Encaminhar o PPE para Secretaria de Gestão Estratégica	✓	100%	25 dias	Sex 30/09/16
26	✓	✗	3.2.4	PPE e cronograma parcial construído	✓	100%	1 dia	Ter 08/11/16
27	✓	✗	3.3	Acompanhamento	✓	100%	632 dias	Qua 17/06/15
28	✓	✗	3.3.1	Cadastrar servidores no redmine	✓	100%	1 dia	Seg 30/05/16
29	✓	✗	3.3.2	Criar lista de e-mail do SIGEP	✓	100%	1 dia	Qui 07/07/16
30	✓	✗	3.3.3	Reunião 1 (Migração Sigep)	✓	100%	1 dia	Seg 30/05/16
31	✓	✗	3.3.4	Reunião 2 (Migração Sigep)	✓	100%	1 dia	Qua 17/06/15
32	✓	✗	3.3.5	Reunião 3 (Migração Sigep)	✓	100%	1 dia	Sex 01/07/16
33	✓	✗	3.3.6	Reunião 4 (Migração Sigep)	✓	100%	1 dia	Qua 20/07/16
34	✓	✗	3.3.7	Reunião 5 (Migração Sigep)	✓	100%	1 dia	Qua 27/07/16
35	✓	✗	3.3.8	Reunião 6 (Migração Sigep)	✓	100%	1 dia	Ter 30/08/16
36	✓	✗	3.3.9	Reunião Plenária	✓	100%	1 dia	Sex 23/09/16
37	✓	✗	3.3.10	Reunião 7 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Qua 28/09/16
38	✓	✗	3.3.11	Reunião 8 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Seg 07/11/16
39	✓	✗	3.3.12	Reunião 9 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Seg 05/12/16
40	✓	✗	3.3.13	Reunião 10 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 17/01/17
41	✓	✗	3.3.14	Reunião 11 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 21/02/17
42	✓	✗	3.3.15	Reunião Plenária	✓	100%	1 dia	Sex 24/02/17
43	✓	✗	3.3.16	Reunião 12 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 14/03/17


















Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
44	✓	✗	3.3.17	Reunião 13 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 18/04/17
45	✓	✗	3.3.18	Reunião 14 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 09/05/17
46	✓	✗	3.3.19	Reunião 15 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Qua 07/06/17
47	✓	✗	3.3.20	Reunião 16 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 11/07/17
48	✓	✗	3.3.21	Reunião 17 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Qua 09/08/17
49	✓	✗	3.3.22	Reunião 18 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 12/09/17
50	✓	✗	3.3.23	Reunião 19 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 17/10/17
51	✓	✗	3.3.24	Reunião 20 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 14/11/17
52	✓	✗	3.3.25	Reunião 21 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 12/12/17
53	✓	✗	3.3.26	Reunião 22 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Ter 16/01/18
54	✓	✗	3.3.27	Reunião 23 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Seg 22/01/18
55	✓	✗	3.3.28	Reunião 24 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Qua 25/01/17
56	✓	✗	3.3.29	Reunião 25 (Migração SIGEP)	✓	100%	1 dia	Qui 01/02/18
57	✓	✗	3.3.30	Reunião 1 (eSocial)	✓	100%	1 dia	Ter 31/10/17
58	✓	✗	3.3.31	Reunião 2 (eSocial)	✓	100%	1 dia	Qua 22/11/17
59	✓	✗	3.3.32	Reunião 3 (eSocial)	✓	100%	1 dia	Seg 11/12/17
60	✓	✗	3.3.33	Reunião 4 (eSocial)	✓	100%	1 dia	Ter 30/01/18
61	✓	✗	4	Instalação do SIGEP	✓	100%	228 dias	Ter 01/12/15
62	✓	✗	4.1	Instalar SIGEP com a criação das bases de dados de desenvolvimento, homologação e	✓	100%	27 dias	Ter 01/12/15
63	✓	✗	4.2	Customizar do SIGEP para o TRT3	✓	100%	27 dias	Ter 01/12/15
64	✓	✗	4.3	Instalação do SIGEP nas máquinas dos usuários de negócio	✓	100%	200 dias	Ter 26/01/16
65	✓	✗	4.4	Instalação concluída	✓	100%	1 dia	Qui 17/11/16


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
66		✗	5	Revisão dos processos de negócio		0%	248 dias	Seg 11/07/16
67	✓	✗	5.1	Disponibilizar base mínima de dados para permitir a realização de testes pelas áreas de	✓	100%	1 dia	Seg 11/07/16
68	✓	✗	5.2	Reunir equipe operacional para alinhar expectativas	✓	100%	1 dia	Sex 23/09/16
69		✗	5.3	Mapeamento dos processos de trabalho no SIGEP		0%	195 dias	Sex 23/09/16
70		✗	5.4	Identificação das adequações dos processos de trabalho do TRT3 necessárias para utilização		0%	195 dias	Sex 23/09/16
71		✗	5.5	Identificação e solicitação de novas funcionalidades para o SIGEP ao Comitê Nacional		0%	195 dias	Sex 23/09/16
72		✗	5.6	Identificação da necessidade de integração de sistemas legados do TRT3 em módulos não		0%	195 dias	Sex 23/09/16
73		✗	5.7	Implementação dos processos de trabalho otimizados		0%	195 dias	Sex 23/09/16
74		✗	5.8	Revisão concluída		0%	195 dias	Sex 23/09/16
75		✗	6	Revisão e/ou edição de normas para padronização dos processos de trabalho		0%	276 dias	Qua 01/06/16
76		✗	6.1	Alinhar as normas internas com as publicações pelo CSJT e CNJ		0%	276 dias	Qua 01/06/16
77		✗	6.2	Republicar as normas revistas		0%	276 dias	Qua 01/06/16
78		✗	6.3	Revisão concluída		0%	276 dias	Qua 01/06/16
79		✗	7	Migração dos dados		92%	798 dias?	Qua 07/01/15
80	✓	✗	7.1	Definir a estratégia de migração	✓	100%	22 dias	Qua 01/06/16
81		✗	7.2	Estudos das funcionalidades do SIGEP		30%	255 dias	Sex 01/07/16
82		✗	7.3	Levantamento dos requisitos para migração das funcionalidades		30%	255 dias	Sex 01/07/16
83		✗	7.4	Validar mapeamento de dados (campos e domínios)		98%	748 dias?	Qua 07/01/15
84	✓	✗	7.4.1	SEXO	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
85	✓	✗	7.4.2	UF	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
86	✓	✗	7.4.3	DEFICIÊNCIA	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
87	✓	✗	7.4.4	ESTADO CIVIL	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
88	✓	✗	7.4.5	NACIONALIDADE	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
89	✓	✗	7.4.6	RAÇA	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
90	✓	✗	7.4.7	TIPO SANGUÍNEO	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
91	✓	✗	7.4.8	DOADOR DE ÓRGÃOS	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
92	✓	✗	7.4.9	ALÉRGICO	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
93	✓	✗	7.4.10	NÚMERO DE PASTA E NÚMERO DE MATRÍCULA	✓	100%	5 dias	Sex 01/07/16
94	✓	✗	7.4.11	ACÚMULO DE CARGO	✓	100%	5 dias	Qua 06/07/16
95	✓	✗	7.4.12	CLASSIFICAÇÃO	✓	100%	5 dias	Qua 06/07/16
96	✓	✗	7.4.13	CONTA BANCÁRIA	✓	100%	5 dias	Qua 06/07/16
97	✓	✗	7.4.14	CONTROLE DE FÉRIAS E TIPO DE FÉRIAS	✓	100%	5 dias	Qui 07/07/16
98	✓	✗	7.4.15	CONTROLE DE FREQUÊNCIA	✓	100%	5 dias	Qui 07/07/16
99	✓	✗	7.4.16	COR DO CABELO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
100	✓	✗	7.4.17	CERTIDÃO DE NASCIMENTO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
101	✓	✗	7.4.18	ANO CHEGADA	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
102	✓	✗	7.4.19	COR DOS OLHOS	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
103	✓	✗	7.4.20	NÚMERO DO CARTÃO DE ACESSO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
104	✓	✗	7.4.21	DATA DA ÚLTIMA VOTAÇÃO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
105	✓	✗	7.4.22	NÚMERO DE REGISTRO VINCULADO A CARTEIRA FUNCIONAL	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
106	✓	✗	7.4.23	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
107	✓	✗	7.4.24	CARTEIRA RESERVISTA	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
108	✓	✗	7.4.25	MATRÍCULA ANTERIOR	✓	100%	5 dias	Seg 11/07/16
109	✓	✗	7.4.26	NÚMERO DO CARTÃO DE PONTO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
110	✓	✗	7.4.27	CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
111	✓	✗	7.4.28	CARTEIRA DE TRABALHO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
112	✓	✗	7.4.29	REGIME DE TRABALHO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
113	✓	✗	7.4.30	NÚMERO DO CRACHÁ	✓	100%	318 dias	Sex 15/07/16
114	✓	✗	7.4.31	DATA DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
115	✓	✗	7.4.32	NÚMERO DA CARTEIRINHA DE SAÚDE	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
116	✓	✗	7.4.33	CADASTRO NACIONAL DE SAÚDE	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
117	✓	✗	7.4.34	DADOS DO TCU	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
118	✓	✗	7.4.35	DATA DE EXERCÍCIO DE FÉRIAS	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
119	✓	✗	7.4.36	PROTOCOLO DA PASTA FUNCIONAL	✓	100%	5 dias	Sex 15/07/16
120	✓	✗	7.4.37	TÍTULO DE ELEITOR	✓	100%	5 dias	Seg 18/07/16
121	✓	✗	7.4.38	REGIME JURÍDICO	✓	100%	5 dias	Seg 18/07/16
122	✓	✗	7.4.39	TIPO DE SERVIDOR	✓	100%	30 dias	Seg 18/07/16
123	✓	✗	7.4.40	TIPOS DE ATOS	✓	100%	5 dias	Qua 20/07/16
124	✓	✗	7.4.41	VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO / 49	✓	100%	5 dias	Qua 20/07/16
125	✓	✗	7.4.42	TIPOS DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS (18350 apagado)	✓	100%	5 dias	Qua 20/07/16
126	✓	✗	7.4.43	ACÚMULO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS	✓	100%	5 dias	Qua 20/07/16
127	✓	✗	7.4.44	MIGRAÇÃO DO CAMPO UF_ID	✓	100%	5 dias	Ter 02/08/16
128	✓	✗	7.4.45	PLANILHA CADASTRO ESTRUTURA FÍSICA ORGANIZACIONAL	✓	100%	196 dias	Seg 01/08/16
129	✓	✗	7.4.46	PLANILHA QUADRO DE VAGAS DE MAGISTRADOS	✓	100%	130 dias	Seg 01/08/16
130	✓	✗	7.4.47	PLANILHA QUADRO DE VAGAS DE SERVIDORES	✓	100%	210 dias	Seg 12/09/16
131	✓	✗	7.4.48	CADASTRO DE LEGISLAÇÃO (afast, apos., averb.)	✓	100%	362 dias	Qua 03/08/16


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
132	✓	✗	7.4.49	ATO DE EXTINÇÃO DE UNIDADE (relação com tarefa 18639)	✓	100%	10 dias	Qua 24/08/16
133	✓	✗	7.4.50	ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADE (relação com tarefa 18639)	✓	100%	10 dias	Qua 24/08/16
134	✓	✗	7.4.51	DADOS DE FUSÃO DE UNIDADE (relação com tarefa 18639)	✓	100%	10 dias	Qua 24/08/16
135	✓	✗	7.4.52	CAMPOS TRUNCADOS	✓	100%	10 dias	Qua 24/08/16
136	✓	✗	7.4.53	SERVIDORES COM EMAIL DUPLICADO	✓	100%	13 dias	Qua 24/08/16
137	✓	✗	7.4.54	ÁREA DE ATIVIDADE	✓	100%	10 dias	Ter 30/08/16
138	✓	✗	7.4.55	CARGOS	✓	100%	110 dias	Ter 30/08/16
139	✓	✗	7.4.56	ESPECIALIDADE	✓	100%	89 dias	Ter 30/08/16
140	✓	✗	7.4.57	SERVIDORES COM CAMPO DE ENDREÇO INCONSISTENTE	✓	100%	112 dias	Qui 01/09/16
141	✓	✗	7.4.58	CAMPOS VALORES NULOS NO TRT MAS OBRIGATÓRIO SIGEP	✓	100%	70 dias	Qui 01/09/16
142	✓	✗	7.4.59	PLANILHA QUADRO DE VAGAS DE COMISSONAMENTOS	✓	100%	153 dias	Qua 31/08/16
143	✓	✗	7.4.60	CADASTRO DE ÓRGÃOS EXTERNOS	✓	100%	10 dias	Sex 02/09/16
144	✓	✗	7.4.61	NÚMERO DO ARMÁRIO	✓	100%	10 dias	Sex 02/09/16
145	✓	✗	7.4.62	ESCOLARIDADE	✓	100%	10 dias	Sex 02/09/16
146	✓	✗	7.4.63	NOME ANTERIOR	✓	100%	10 dias	Sex 02/09/16
147	✓	✗	7.4.64	MAPEAMENTO ÁREA LOTAÇÃO PARA ÁREA UNIDADE ADMINISTRATIVA	✓	100%	200 dias	Qua 09/11/16
148	✓	✗	7.4.65	DATA DE PRORROGAÇÃO DE EXERCÍCIO	✓	100%	10 dias	Qua 21/09/16
149	✓	✗	7.4.66	MAPEAMENTO ORIGEM DOS MAGISTRADOS	✓	100%	10 dias	Sex 23/09/16
150	✓	✗	7.4.67	NÚMERO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS	✓	100%	10 dias	Qua 28/09/16
151	✓	✗	7.4.68	DATA DA POSSE	✓	100%	10 dias	Sex 04/11/16
152	✓	✗	7.4.69	APROVADO ESTÁGIO PROBATÓRIO	✓	100%	10 dias	Sex 04/11/16
153	✓	✗	7.4.70	RESULTADO ESTÁGIO PROBATÓRIO	✓	100%	10 dias	Sex 04/11/16


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
154	✓	✗	7.4.71	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	✓	100%	10 dias	Sex 04/11/16
155	✓	✗	7.4.72	PLANILHA MIGRAÇÃO CADASTRO ÁREAS DE ATIVIDADE E ESPECIALIDADE CARGOS	✓	100%	102 dias	Ter 06/12/16
156	✓	✗	7.4.73	PLANILHA MIGRAÇÃO CADASTRO CARGOS E CARREIRAS	✓	100%	46 dias	Ter 06/12/16
157	✓	✗	7.4.74	Conta bancária	✓	100%	206 dias	Ter 05/07/16
158	✓	✗	7.4.75	DOADOR DE ÓRGÃOS	✓	100%	123 dias	Qui 14/07/16
159	✓	✗	7.4.76	Número do Protocolo, No. (do diário) e No. da Página	✓	100%	26 dias	Sex 20/01/17
160	✓	✗	7.4.77	Preenchimento e-mail institucional magistrados servidores	✓	100%	23 dias	Qui 19/01/17
161	✓	✗	7.4.78	Data de prorrogação da posse /exercício	✓	100%	6 dias	Sex 20/01/17
162	✓	✗	7.4.79	Data do Documento	✓	100%	26 dias	Sex 20/01/17
163	✓	✗	7.4.80	Data Inicial/Fim da Opção, Opção de Comissão e No. do Protocolo	✓	100%	23 dias	Ter 24/01/17
164	✓	✗	7.4.81	Titular da Unidade	✓	100%	88 dias	Ter 24/01/17
165	✓	✗	7.4.82	Data do exercício	✓	100%	5 dias	Sex 24/02/17
166	✓	✗	7.4.83	Planilha de configuração do módulo de dependentes	✓	100%	2 dias	Sex 03/03/17
167	✓	✗	7.4.84	Planilha de configuração do módulo de benefícios	✓	100%	202 dias	Sex 03/03/17
168	✓	✗	7.4.85	Campo Insalubridade	✓	100%	12 dias	Qua 08/03/17
169	✓	✗	7.4.86	Funções comissionadas com nomes e encargos iguais e descrições diferentes	✓	100%	35 dias	Qua 05/04/17
170	✓	✗	7.4.87	Priorização de atributos para cadastro de dependentes	✓	100%	39 dias	Sex 07/04/17
171	✓	✗	7.4.88	Número de documentos referentes às lotações dos servidores maior que 7 caracteres	✓	100%	15 dias	Ter 11/04/17
172	✓	✗	7.4.89	Definição sobre agências pré-inseridas no SGRH	✓	100%	8 dias	Qua 17/05/17
173	✓	✗	7.4.90	Magistrados sem data de exercício cadastrada	✓	100%	4 dias	Qui 18/05/17
174	✓	✗	7.4.91	Magistrados sem data de posse cadastrada	✓	100%	30 dias	Qua 10/05/17
175	✓	✗	7.4.92	Validação do mapeamento de parentesco	✓	100%	30 dias	Qui 10/08/17

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
176	✓	✗	7.4.93	Planilha de configuração do módulo de progressão	✓	100%	7 dias	Qui 25/05/17
177	✓	✗	7.4.94	Servidores com órgão 000	✓	100%	14 dias	Ter 30/05/17
178	✓	✗	7.4.95	Planilha de cadastro de órgãos externos dos módulos de averbação e gestão	✓	100%	26 dias	Sex 02/06/17
179	✓	✗	7.4.96	Revisão da migração do quadro de comissionamentos	✓	100%	30 dias	Qui 01/06/17
180	✓	✗	7.4.97	Dúvidas sobre o campo vinculação de função comissionada no Putty	✓	100%	30 dias	Qui 01/06/17
181	✓	✗	7.4.98	Indicação do campo Cônjuge é um servidor do tribunal	✓	100%	5 dias	Seg 05/06/17
182	✓	✗	7.4.99	Pensionistas sem Tipo de Pensão Cadastrados	✓	100%	5 dias	Qui 08/06/17
183	✓	✗	7.4.100	Pensionistas com data de publicação não cadastrada.	✓	100%	8 dias	Sex 09/06/17
184	✓	✗	7.4.101	Pensionistas com data de publicação maior que a data de cancelamento	✓	100%	6 dias	Seg 19/06/17
185	✓	✗	7.4.102	Lotação vinculada outra não existente atualmente	✓	100%	5 dias	Seg 12/06/17
186	✓	✗	7.4.103	Definição sobre o campo Tipo de Pensão	✓	100%	3 dias	Seg 19/06/17
187	✓	✗	7.4.104	Planilha cadastro de legislação de aposentadoria	✓	100%	2 dias	Ter 27/06/17
188	✓	✗	7.4.105	Planilha cadastro finalidades legislação averbação	✓	100%	56 dias	Ter 27/06/17
189	✓	✗	7.4.106	Definição sobre o preenchimento dos campos No. Do Ato, Data do Ato, Matrícula do	✓	100%	109 dias	Ter 27/06/17
190	✓	✗	7.4.107	Planilha de cadastro de domínios do módulo de afastamentos	✓	100%	148 dias	Ter 27/06/17
191	✓	✗	7.4.108	Validação do mapeamento de tipos de licença	✓	100%	134 dias	Qua 28/06/17
192	✓	✗	7.4.109	Planilha de cadastro de contribuição previdenciária de licenças de um mesmo tipo que	✓	100%	32 dias	Qua 28/06/17
193	✓	✗	7.4.110	Beneficiário de Plano de Saúde com Data de Início e Fim de vigência de inclusão iguai	✓	100%	13 dias	Seg 03/07/17
194	✓	✗	7.4.111	Definição sobre o campo Tipo de Mudança	✓	100%	5 dias	Sex 07/07/17
195	✓	✗	7.4.112	Resolver conciliações duvidosas bases de dependentes	✓	100%	5 dias	Sex 14/07/17
196	✓	✗	7.4.113	Identificar registros conciliados erroneamente pelo sistema EID	✓	100%	86 dias	Sex 14/07/17
197	✓	✗	7.4.114	Identificar registros não conciliados pelo sistema EID	✓	100%	86 dias	Sex 14/07/17


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
198			7.4.115	Mapeamento da funcionalidade [Gestão] Cadastro Corpo Diretivo		100%	2 dias	Qua 19/07/17
199			7.4.116	Mapeamento da funcionalidade [Quintos] Cadastro -> Concessão		100%	83 dias	Qua 19/07/17
200			7.4.117	Planilha de cadastro de averbação de saldo de férias magistrados		100%	3 dias	Qua 19/07/17
201			7.4.118	Planilha de cadastro de alteração saldo de férias magistrados		100%	3 dias	Qua 19/07/17
202			7.4.119	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Benefícios por Servidor - Auxílio		100%	2 dias	Qui 20/07/17
203			7.4.120	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Benefícios por Servidor - Auxílio		100%	122 dias	Qui 20/07/17
204			7.4.121	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Benefícios por Servidor - Auxílio		100%	122 dias	Qui 20/07/17
205			7.4.122	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Benefícios por Servidor - Assist.		100%	2 dias	Qui 20/07/17
206			7.4.123	Mapeamento da funcionalidade [Afastamentos] Cadastro -> Periodos Aquisitivos -		100%	40 dias	Seg 24/07/17
207			7.4.124	Mapeamento da funcionalidade [Afastamentos] Cadastro -> Periodos Aquisitivos -		100%	40 dias	Seg 24/07/17
208			7.4.125	SEP para SEPP demanda Daniela Sandy		100%	4 dias	Seg 31/07/17
209			7.4.126	Migração de dependentes que não são pessoas físicas		100%	8 dias	Sex 28/07/17
210			7.4.127	Mapeamento da funcionalidade [Férias] Magistrados -> Conversão em Pecúnia		100%	53 dias	Sex 28/07/17
211			7.4.128	Mapeamento da funcionalidade [Férias] Magistrados -> Cancelamento da Conversão em		100%	53 dias	Sex 28/07/17
212			7.4.129	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Benefícios por Servidor - PLANO		100%	41 dias	Qui 03/08/17
213			7.4.130	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Benefícios por Servidor - PLANO		100%	41 dias	Qui 03/08/17
214			7.4.131	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Não Acumulação de Benefícios		0%	45 dias	Qui 03/08/17
215			7.4.132	SEP para SES demanda Daniela Sandy		0%	43 dias	Seg 07/08/17
216			7.4.133	Revisar a Planilha de cadastro de legislação do módulo gestão para incluir as legislações		0%	42 dias	Ter 08/08/17
217			7.4.134	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Auxílio Transporte por		100%	43 dias	Seg 07/08/17
218			7.4.135	Definição do campo Código (Licenças Médicas)		100%	9 dias	Seg 07/08/17
219			7.4.136	Mapeamento da funcionalidade [Anuênios] Cadastro -> Tempo de Serviço Externo		100%	5 dias	Seg 07/08/17

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
220	✓	✗	7.4.137	mapeamento da funcionalidade [Anuênios] Cadastro -> Tempo de Serviço no Tribunal	✓	100%	5 dias	Seg 07/08/17
221	✓	✗	7.4.138	Definição do campo Data de Emissão (Cadastro de Licenças Médicas)	✓	100%	9 dias	Seg 07/08/17
222	✓	✗	7.4.139	mapeamento da funcionalidade [Férias] Cadastro -> Marcação -> Saldo -> de Interrupção	✓	100%	8 dias	Ter 08/08/17
223	✓	✗	7.4.140	mapeamento da funcionalidade [Férias] Cadastro -> Marcação -> Saldo -> de Outros Órgão	✓	100%	39 dias	Seg 07/08/17
224	✓	✗	7.4.141	Pensionistas Alimentícios cujo alimentante é pensionista	✓	100%	2 dias	Qui 17/08/17
225	✓	✗	7.4.142	Pensões Alimentícias duplicadas	✓	100%	3 dias	Seg 21/08/17
226	✓	✗	7.4.143	Mapeamento alteração classe/padrão de magistrados	✓	100%	1 dia	Seg 28/08/17
227	✓	✗	7.4.144	Defeito – Lotação Gabinetes	✓	100%	1 dia	Qua 07/01/15
228	✓	✗	7.4.145	Correção planilha de Legislação de afastamentos	✓	100%	96 dias	Ter 29/08/17
229	✓	✗	7.4.146	TIPOS DE ATOS	✓	100%	1 dia	Qua 30/08/17
230	✓	✗	7.4.147	Defeito-Pensão Aliment[icia com data de início não preenchida	✓	100%	23 dias	Sex 18/08/17
231	✓	✗	7.4.148	Defeito-Dependentes de IR com data de inicio não preenchida	✓	100%	18 dias	Sex 25/08/17
232	✓	✗	7.4.149	Defeito-Planilha de cadastro de vagas de FC desatualizada	✓	100%	55 dias	Seg 28/08/17
233	✓	✗	7.4.150	Definir categoria das Licenças Médicas	✓	100%	11 dias	Sex 08/09/17
234	✓	✗	7.4.151	Mapeamento Responsável Acompanhamento	✓	100%	33 dias	Sex 15/09/17
235	✓	✗	7.4.152	Mapeamento da funcionalidade [Dependentes] Dependente -> Finalidade - Auxílio	✓	100%	18 dias	Qui 21/09/17
236	✓	✗	7.4.153	Mapeamento da funcionalidade [Dependentes] Dependente -> Finalidade - Auxílio	✓	100%	18 dias	Qui 21/09/17
237	✓	✗	7.4.154	Mapeamento da funcionalidade [Férias] Cadastro -> Cadastro saldo de dias	✓	100%	49 dias	Sex 22/09/17
238	✓	✗	7.4.155	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Orçamento PAF	✓	100%	1 dia	Seg 25/09/17
239	✓	✗	7.4.156	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> Orçamento PAF - Inativos	✓	100%	1 dia	Seg 25/09/17
240	✓	✗	7.4.157	Mapeamento da funcionalidade [Benefícios] Cadastro -> GRU	✓	100%	9 dias	Seg 25/09/17
241	✓	✗	7.4.158	Mapeamento da funcionalidade [Aposentadoria] Cadastro -> Aposentadoria ->	✓	100%	14 dias	Qui 28/09/17


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
242	✓	✗	7.4.159	Mapeamento da funcionalidade [Aposentadoria] Cadastro -> Vacância Especial ->	✓	100%	14 dias	Qui 28/09/17
243	✓	✗	7.4.160	Mapeamento da funcionalidade [Aposentadoria] Cadastro -> Vacância Especial ->	✓	100%	16 dias	Qui 28/09/17
244	✓	✗	7.4.161	Alterar finalidade de leis para enquadramento de vagas de magistrados	✓	100%	2 dias	Sex 29/09/17
245	✓	✗	7.4.162	Mapeamento da funcionalidade [Lotação] Cadastro -> Vinculação da GAS ao Servidor	✓	100%	30 dias	Qua 04/10/17
246	✓	✗	7.4.163	Mapeamento da funcionalidade [Lotação] Cadastro -> Vinculação da GAE ao Servidor	✓	100%	30 dias	Qua 04/10/17
247	✓	✗	7.4.164	Mapeamento da funcionalidade [Requisição] Cadastro -> Requisição	✓	100%	4 dias	Qua 04/10/17
248	✓	✗	7.4.165	Mapeamento da funcionalidade [Exercício Provisório] Cadastro -> Exercício Provisório ->	✓	100%	13 dias	Qua 04/10/17
249	✓	✗	7.4.166	Mapeamento da funcionalidade [SGROnline] Serviços ao Magistrado/Servidor -> Liberação	✓	100%	2 dias	Qua 04/10/17
250	✓	✗	7.4.167	Mapeamento da funcionalidade [SGROnline] Acompanhamento da Unidade -> Liberação	✓	100%	2 dias	Qua 04/10/17
251	✓	✗	7.4.168	Mapeamento da funcionalidade [Comissionamento] Cadastro -> Unidade Administrativa	✓	100%	13 dias	Qua 04/10/17
252	✓	✗	7.4.169	Mapeamento da funcionalidade [Comissionamento] Cadastro -> Unidade Administrativa	✓	100%	13 dias	Qua 04/10/17
253	✓	✗	7.4.170	Data de Lançamento da Averbação	✓	100%	7 dias	Sex 06/10/17
254	✓	✗	7.4.171	Data operação da migração do Cadastro de Férias de Servidores	✓	100%	3 dias	Sex 06/10/17
255	✓	✗	7.4.172	Mapeamento da funcionalidade [Dependentes] Dependente -> Pensionista ->	✓	100%	7 dias	Seg 09/10/17
256	✓	✗	7.4.173	Mapeamento da funcionalidade [Dependentes] Dependente -> Pensionista ->	✓	100%	7 dias	Seg 09/10/17
257	✓	✗	7.4.174	Mapeamento da funcionalidade [Dependentes] Dependente -> Pensionista ->	✓	100%	7 dias	Seg 09/10/17
258	✓	✗	7.4.175	Mapeamento da funcionalidade [Quadro de Vagas] Cadastro -> Vacância ->	✓	100%	4 dias	Seg 23/10/17
259	✓	✗	7.4.176	Df-Planilha cadastro de estrutura física organizacional	✓	100%	6 dias	Ter 24/10/17
260	✓	✗	7.4.177	Validação do preenchimento do campo AGN - marcação de férias de magistrado	✓	100%	7 dias	Sex 27/10/17
261	✓	✗	7.4.178	Validação do preenchimento dos campos período e dias utilizados - marcação de	✓	100%	6 dias	Seg 30/10/17
262	✓	✗	7.4.179	Validação do preenchimento do campo Remunerado - marcação de férias de	✓	100%	6 dias	Seg 30/10/17
263	✓	✗	7.4.180	Definição sobre os campos de Portaria de nomeação ([Quadro de Vagas]	✓	100%	29 dias	Ter 07/11/17


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
264	✓	✗	7.4.181	Definição sobre os campos de Dados da Publicação [[Comissionamento] ->	✓	100%	20 dias	Ter 07/11/17
265	✓	✗	7.4.182	Mapeamento da funcionalidade [Aposentadoria] Cadastro -> Aposentadoria ->	✓	100%	15 dias	Seg 07/11/16
266	✓	✗	7.4.183	Mapeamento da funcionalidade [Aposentadoria] Cadastro -> Vacância Especial ->	✓	100%	15 dias	Seg 07/11/16
267	✓	✗	7.4.184	Mapeamento da funcionalidade [Aposentadoria] Cadastro -> Vacância Especial ->	✓	100%	15 dias	Seg 07/11/16
268	✓	✗	7.4.185	Validação do domínio Cargos dos PJ's	✓	100%	7 dias	Ter 07/11/17
269	✓	✗	7.4.186	Validação do domínio de Causas Determinantes	✓	100%	7 dias	Ter 07/11/17
270	✓	✗	7.4.187	Mapeamento das funcionalidades [Requisição] Tabelas -> Responsável e [Exercício	✓	100%	14 dias	Seg 13/11/17
271	✓	✗	7.4.188	Validação do preenchimento do campo Remunerado - marcação de férias de mag	✓	100%	8 dias	Ter 14/11/17
272	✓	✗	7.4.189	Preencher a Planilha de Cadastro de Requisitados	✓	100%	44 dias	Sex 17/11/17
273	✓	✗	7.4.190	Planilha de pensão alimentícia-determinações judiciais	✓	100%	56 dias	Sex 17/11/17
274	✓	✗	7.4.191	Definição Data de Posse e Exercício de Servidores	✓	100%	23 dias	Sex 17/11/17
275		✗	7.4.192	Preencher a planilha de cadastro de concessões de quintos	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
276	✓	✗	7.4.193	Preencher planilha de vinculação de GAE aos servidores	✓	100%	34 dias	Sex 17/11/17
277		✗	7.4.194	Preencher a planilha cadastro saldo e marcação de férias outros órgãos para os se	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
278	✓	✗	7.4.195	Preencher planilha de vinculação de GAS aos servidores	✓	100%	6 dias	Ter 21/11/17
279	✓	✗	7.4.196	Preencher planilha de vinculação de GAE e GAS às unidades administrativas	✓	100%	7 dias	Qui 23/11/17
280	✓	✗	7.4.197	Definição sobre o Número de documentos referentes às lotações dos servidores	✓	100%	15 dias	Sex 24/11/17
281	✓	✗	7.4.198	Planilha de cadastro de concessões de quintos - servidores com mais de cinco qui	✓	100%	4 dias	Ter 12/12/17
282	✓	✗	7.4.199	Planilha de cadastro de domínios de benefícios	✓	100%	1 dia	Qua 13/12/17
283	✓	✗	7.4.200	Mapeamento da funcionalidade [Lotação] Cadastro -> Lotação - Magistrados	✓	100%	17 dias	Sex 15/12/17
284	✓	✗	7.4.201	Domínio tipo formação	✓	100%	22 dias	Sex 15/12/17
285		✗	7.4.202	Mapeamento funcionalidade formação acadêmica	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15

















Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
286		✗	7.4.203	Mapeamento funcionalidade curso de formação	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
287		✗	7.4.204	mapeamento da funcionalidade [Gestão] Cadastro -> Carga Horária	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
288	✓	✗	7.4.205	mapeamento da funcionalidade [Designação de Magistrados] Designação -> Desig	✓	100%	1 dia	Qua 24/01/18
289	✓	✗	7.4.206	mapeamento da funcionalidade [Designação de Magistrados] Designação -> Desig	✓	100%	1 dia	Qua 24/01/18
290	✓	✗	7.4.207	mapeamento da funcionalidade [Designação de Magistrados] Designação -> Emitti	✓	100%	1 dia	Qua 24/01/18
291	✓	✗	7.4.208	mapeamento da funcionalidade [Designação de Magistrados] Designação -> Desig	✓	100%	1 dia	Qua 24/01/18
292	✓	✗	7.4.209	mapeamento da funcionalidade [Designação de Magistrados] Designação -> Desig	✓	100%	1 dia	Qua 24/01/18
293		✗	7.4.210	mapeamento da funcionalidade [Designação de Magistrados] Designação -> Cesse	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
294	✓	✗	7.4.211	mapeamento da funcionalidade [SGRHOnline] Serviços ao Magistrado/Servidor ->	✓	100%	2 dias	Qua 24/01/18
295	✓	✗	7.4.212	mapeamento da funcionalidade [Auxílio] Cadastro -> Auxílio Natalidade	✓	100%	16 dias	Qua 24/01/18
296	✓	✗	7.4.213	Mapeamento da funcionalidade [Remoção] Cadastro -> Remoção para este Tribur	✓	100%	1 dia	Qui 25/01/18
297		✗	7.4.214	Planilha de Servidores Aposentados	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
298		✗	7.4.215	Planilha de Magistrados Aposentados	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
299	✓	✗	7.4.216	Definição sobre migração do Cadastro do Responsável Acompanhamento	✓	100%	2 dias	Ter 30/01/18
300	✓	✗	7.4.217	Definição de valores para os campos que não existem no ZIM.	✓	100%	11 dias	Qua 31/01/18
301	✓	✗	7.4.218	Planilha cadastro de removidos para este Tribunal	✓	100%	1 dia	Seg 05/02/18
302	✓	✗	7.4.219	preenchimento de campo - Pensão alimentícia	✓	100%	6 dias	Qua 07/02/18
303		✗	7.4.220	planilha de cadastro de concessões de aposentadoria	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
304		✗	7.4.221	mapeamento da funcionalidade [Dependentes] Dependente -> Finalidade - Plano	☹	0%	1 dia?	Qua 07/01/15
305	✓	✗	7.4.222	planilha de cadastro de concessões de aposentadoria - magistrados	✓	100%	4 dias	Qui 15/02/18
306		✗	7.5	Fornecimento das informações necessárias para a migração que não existem nos sistemas do	☹	0%	1 dia?	Qua 01/06/16
307		✗	7.6	Elaboração e construção de transformações e componentes para a migração	☹	0%	1 dia?	Qua 01/06/16





























Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
308		✗	7.7	Testes de validação da migração		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
309		✗	7.8	Homologação dos dados migrados		77%	342 dias	Seg 28/11/16
310	✓	✗	7.8.1	Homologação 1	✓	100%	16 dias	Seg 28/11/16
311	✓	✗	7.8.2	Homologação 2	✓	100%	15 dias	Seg 30/01/17
312	✓	✗	7.8.3	Homologação 3	✓	100%	14 dias	Seg 29/05/17
313	✓	✗	7.8.4	Homologação 4	✓	100%	16 dias	Seg 24/07/17
314	✓	✗	7.8.5	Homologação 5	✓	100%	15 dias	Seg 21/08/17
315	✓	✗	7.8.6	Homologação 6	✓	100%	15 dias	Seg 25/09/17
316	✓	✗	7.8.7	Homologação 7	✓	100%	10 dias	Ter 31/10/17
317	✓	✗	7.8.8	Homologação 8	✓	100%	16 dias	Qui 23/11/17
318	✓	✗	7.8.9	Homologação 9	✓	100%	16 dias	Ter 16/01/18
319	✓	✗	7.8.10	Homologação 10	✓	100%	2 dias	Qui 22/02/18
320		✗	7.8.11	Homologação 10.1		0%	13 dias	Qui 22/02/18
321		✗	7.8.12	Homologação 11		0%	13 dias	Seg 19/03/18
322		✗	7.8.13	Homologação 12		0%	15 dias	Seg 16/04/18
323		✗	7.9	Homologação		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
324		✗	8	Integração dos sistemas legados ao SIGEP		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
325		✗	8.1	Definição da estratégia de integração		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
326		✗	8.2	Priorização dos sistemas a serem integrados		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
327		✗	8.3	Definição da arquitetura de integração		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
328		✗	8.4	Análise dos requisitos da integração		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
329		✗	8.5	Construção dos componentes de integração		0%	1 dia?	Qua 01/06/16









Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
330		✗	8.6	Testes de validação da integração		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
331		✗	8.7	Homologação dos sistemas legados integrados		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
332		✗	8.8	Integração dos sistemas legados concluída		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
333		✗	9	Implantação de novos módulos do SIGEP		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
334		✗	9.1	Definição da estratégia de implantação		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
335		✗	9.2	Implantação do sistema folhaweab (folha de pagamento)		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
336		✗	9.3	Implantação do sistema eSocial		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
337		✗	9.4	Testes de validação da implantação		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
338		✗	9.5	Homologação dos novos implantados		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
339		✗	10	Implantação do SIGEP em ambiente de produção		0%	442 dias?	Qua 01/06/16
340		✗	10.1	Homologação da implantação em ambiente de produção		0%	18 dias?	Seg 05/03/18
341		✗	10.1.1	Produção 1		0%	1 dia?	Seg 05/03/18
342		✗	10.1.2	Produção 1.1		0%	1 dia?	Seg 26/03/18
343		✗	10.1.3	Produção 2		0%	1 dia?	Seg 02/04/18
344		✗	10.2	Criação da política de gerenciamento de liberações no TRT3		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
345		✗	10.3	Criação da política de controle de acesso e autorização do SIGEP		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
346		✗	10.4	Criação das equipes de sustentação		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
347		✗	10.5	Disponibilização final do sistema SIGEP		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
348		✗	10.6	Implantação concluída		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
349		✗	11	Treinamento de usuários		0%	542 dias	Seg 26/09/16
350		✗	11.1	Construção de manual com os processos de trabalho do TRT3 no SIGEP		0%	194 dias	Seg 26/09/16
351		✗	11.2	Treinamento virtual os usuários finais		0%	542 dias	Seg 26/09/16

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início
352			11.3	Construção tutorial		0%	194 dias	Seg 26/09/16
353			12	Divulgar Central e orientações gerais		0%	1 dia?	Qua 01/06/16
354			12.1	Divulgação realizada e usuários externos treinados		0%	1 dia?	Qua 01/06/16

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18



















Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Timeline																																											
			Jan '15	S	T	Q	Q	S	S	11 Jan '15	D	S	T	Q	Q	S	S	18 Jan '15	D	S	T	Q	Q	S	S	25 Jan '15	D	S	T	Q	Q	S	S	01 Fev '15	D	S	T	Q	Q	S	S	08 Fev '15	D	S	T	Q
Qua 19/12/18			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qua 18/05/16			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Seg 09/05/16			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qua 18/05/16	2CI+6 dias		[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Seg 09/05/16			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Seg 18/12/17			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Ter 14/06/16			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Seg 26/09/16			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Seg 06/02/17			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Sex 10/02/17			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qui 16/02/17			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Ter 04/07/17			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Ter 03/10/17			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qua 08/11/17			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Seg 18/12/17			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qui 01/02/18			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qui 07/07/16			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qui 02/06/16	3		[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qua 22/06/16	17CI+7 dias		[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qua 06/07/16	18		[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Qui 07/07/16	19		[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											
Ter 07/07/15			[Task bar spanning from Jan 19 to Feb 19, 2015]																																											



















Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15							11 Jan '15							18 Jan '15							25 Jan '15							01 Fev '15							08 Fev '15						
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S								
Ter 08/11/16																																												
Qui 22/09/16																																												
Qui 29/09/16	23																																											
Seg 07/11/16	24																																											
Ter 08/11/16	25																																											
Qui 01/02/18																																												
Seg 30/05/16																																												
Qui 07/07/16																																												
Seg 30/05/16																																												
Qua 17/06/15																																												
Sex 01/07/16																																												
Qua 20/07/16																																												
Qua 27/07/16																																												
Ter 30/08/16																																												
Sex 23/09/16																																												
Qua 28/09/16																																												
Seg 07/11/16																																												
Seg 05/12/16																																												
Ter 17/01/17																																												
Ter 21/02/17																																												
Sex 24/02/17																																												
Ter 14/03/17																																												

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



















Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15			11 Jan '15			18 Jan '15			25 Jan '15			01 Feb '15			08 Feb '15																		
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S							
Seg 31/07/17																																				
Seg 11/07/16																																				
Sex 23/09/16																																				
Seg 31/07/17	68II																																			
Seg 31/07/17	68II																																			
Seg 31/07/17	68II																																			
Seg 31/07/17	68II																																			
Seg 31/07/17	68II																																			
Seg 31/07/17	68II																																			
Seg 31/07/17	80II																																			
Seg 31/07/17																																				
Seg 31/07/17																																				
Seg 31/07/17																																				
Seg 07/05/18																																				
Qui 30/06/16																																				
Ter 01/08/17	80																																			
Ter 01/08/17	81II																																			
Ter 20/02/18																																				
Qui 07/07/16																																				
Qui 07/07/16																																				
Qui 07/07/16																																				
Qui 07/07/16																																				

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15		11 Jan '15		18 Jan '15		25 Jan '15		01 Feb '15		08 Feb '15													
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
Qui 07/07/16																										
Qui 07/07/16																										
Qui 07/07/16																										
Qui 07/07/16																										
Qui 07/07/16																										
Ter 12/07/16																										
Ter 12/07/16																										
Ter 12/07/16																										
Qua 13/07/16																										
Qua 13/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Qui 21/07/16																										
Sex 15/07/16																										
Qui 21/07/16																										

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15		11 Jan '15				18 Jan '15				25 Jan '15				01 Feb '15				08 Feb '15								
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
Qui 21/07/16																													
Qui 21/07/16																													
Qui 21/07/16																													
Ter 14/11/17																													
Qui 21/07/16																													
Qui 21/07/16																													
Qui 21/07/16																													
Qui 21/07/16																													
Qui 21/07/16																													
Sex 22/07/16																													
Sex 22/07/16																													
Sex 26/08/16																													
Ter 26/07/16																													
Ter 26/07/16																													
Ter 26/07/16																													
Ter 26/07/16																													
Seg 08/08/16																													
Qua 07/06/17																													
Qua 22/02/17																													
Ter 08/08/17																													
Sex 02/02/18																													

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15							11 Jan '15							18 Jan '15							25 Jan '15							01 Fev '15							08 Fev '15						
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S								
Ter 06/09/16																																												
Ter 06/09/16																																												
Ter 06/09/16																																												
Ter 06/09/16																																												
Seg 12/09/16																																												
Ter 13/09/16																																												
Qui 23/02/17																																												
Qua 25/01/17																																												
Ter 07/03/17																																												
Ter 13/12/16																																												
Ter 09/05/17																																												
Sex 16/09/16																																												
Sex 16/09/16																																												
Sex 16/09/16																																												
Sex 16/09/16																																												
Qua 20/09/17																																												
Ter 04/10/16																																												
Qui 06/10/16																																												
Ter 11/10/16																																												
Sex 18/11/16																																												
Sex 18/11/16																																												
Sex 18/11/16																																												

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15		11 Jan '15		18 Jan '15		25 Jan '15		01 Fev '15		08 Fev '15						
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
Sex 18/11/16																			
Seg 29/05/17																			
Sex 03/03/17																			
Qui 25/05/17																			
Qui 26/01/17																			
Sex 24/02/17																			
Seg 20/02/17																			
Sex 27/01/17																			
Sex 24/02/17																			
Qui 23/02/17																			
Qua 07/06/17																			
Qua 08/03/17																			
Seg 06/03/17																			
Sex 22/12/17																			
Qui 23/03/17																			
Ter 30/05/17																			
Qua 07/06/17																			
Seg 08/05/17																			
Sex 26/05/17																			
Ter 23/05/17																			
Qua 21/06/17																			
Qui 21/09/17																			

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15		11 Jan '15				18 Jan '15				25 Jan '15				01 Feb '15				08 Feb '15							
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
Sex 02/06/17																												
Seg 19/06/17																												
Seg 10/07/17																												
Qui 13/07/17																												
Qui 13/07/17																												
Sex 09/06/17																												
Qua 14/06/17																												
Qua 21/06/17																												
Seg 26/06/17																												
Seg 19/06/17																												
Qua 21/06/17																												
Qua 28/06/17																												
Qua 13/09/17																												
Qua 29/11/17																												
Ter 23/01/18																												
Qui 04/01/18																												
Qui 10/08/17																												
Qua 19/07/17																												
Qui 13/07/17																												
Qui 20/07/17																												
Ter 14/11/17																												
Ter 14/11/17																												



















Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Timeline (Jan '15 to Feb '15)																																		
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	
Qui 20/07/17																																					
Ter 14/11/17																																					
Sex 21/07/17																																					
Sex 21/07/17																																					
Sex 21/07/17																																					
Qua 10/01/18																																					
Qua 10/01/18																																					
Sex 21/07/17																																					
Seg 18/09/17																																					
Seg 18/09/17																																					
Qui 03/08/17																																					
Ter 08/08/17																																					
Qua 11/10/17																																					
Qua 11/10/17																																					
Sex 29/09/17																																					
Sex 29/09/17																																					
Qui 05/10/17																																					
Qui 05/10/17																																					
Qui 05/10/17																																					
Qui 05/10/17																																					
Qui 17/08/17																																					
Sex 11/08/17																																					



















Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15		11 Jan '15		18 Jan '15		25 Jan '15		01 Fev '15		08 Fev '15						
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
Sex 11/08/17																			
Qui 17/08/17																			
Qui 17/08/17																			
Sex 29/09/17																			
Sex 18/08/17																			
Qua 23/08/17																			
Seg 28/08/17																			
Qua 07/01/15																			
Sex 12/01/18																			
Qua 30/08/17																			
Qua 20/09/17																			
Qua 20/09/17																			
Ter 14/11/17																			
Sex 22/09/17																			
Qua 01/11/17																			
Ter 17/10/17	231																		
Ter 17/10/17																			
Sex 01/12/17																			
Seg 25/09/17																			
Seg 25/09/17																			
Qui 05/10/17																			
Qua 18/10/17																			

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15		11 Jan '15		18 Jan '15		25 Jan '15		01 Fev '15		08 Fev '15									
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
Qua 18/10/17																						
Sex 20/10/17																						
Seg 02/10/17																						
Qui 16/11/17																						
Qui 16/11/17																						
Seg 09/10/17																						
Seg 23/10/17																						
Qui 05/10/17																						
Qui 05/10/17																						
Seg 23/10/17																						
Seg 23/10/17																						
Ter 17/10/17	244																					
Ter 10/10/17																						
Qua 18/10/17																						
Qua 18/10/17																						
Qua 18/10/17																						
Qui 26/10/17																						
Ter 31/10/17																						
Seg 06/11/17																						
Seg 06/11/17																						
Seg 06/11/17																						
Seg 18/12/17																						



















Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15							11 Jan '15							18 Jan '15							25 Jan '15							01 Fev '15							08 Fev '15						
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S								
Qua 07/01/15																																												
Qua 07/01/15																																												
Qua 24/01/18																																												
Qua 24/01/18																																												
Qua 24/01/18																																												
Qua 24/01/18																																												
Qua 24/01/18																																												
Qua 07/01/15																																												
Qui 25/01/18																																												
Seg 19/02/18																																												
Qui 25/01/18																																												
Qua 07/01/15																																												
Qua 07/01/15																																												
Qua 31/01/18																																												
Seg 19/02/18																																												
Seg 05/02/18																																												
Seg 19/02/18																																												
Qua 07/01/15																																												
Qua 07/01/15																																												
Ter 20/02/18																																												
Qua 01/06/16	80II																																											
Qua 01/06/16	80II																																											

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15							11 Jan '15							18 Jan '15							25 Jan '15							01 Fev '15							08 Fev '15						
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S								
Qua 01/06/16	80II																																											
Seg 07/05/18	80II																																											
Seg 19/12/16																																												
Sex 17/02/17																																												
Sex 16/06/17																																												
Seg 14/08/17																																												
Seg 11/09/17																																												
Seg 16/10/17																																												
Seg 13/11/17																																												
Qui 14/12/17																																												
Ter 06/02/18																																												
Sex 23/02/18																																												
Seg 12/03/18																																												
Seg 09/04/18																																												
Seg 07/05/18																																												
Qua 01/06/16	80II																																											
Qua 01/06/16																																												
Qua 01/06/16	80II																																											
Qua 01/06/16	80II																																											
Qua 01/06/16	80II																																											
Qua 01/06/16	80II																																											
Qua 01/06/16	80II																																											

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Jan '15		11 Jan '15		18 Jan '15		25 Jan '15		01 Fev '15		08 Fev '15						
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16																			
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Seg 02/04/18	80II																		
Seg 02/04/18	80II																		
Seg 05/03/18																			
Seg 26/03/18																			
Seg 02/04/18																			
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 01/06/16	80II																		
Qua 19/12/18	80II																		
Seg 31/07/17	80II																		
Qua 19/12/18	80II																		

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Jan '15 11 Jan '15 18 Jan '15 25 Jan '15 01 Fev '15 08 Fev '15 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S </div>																																	
Seg 31/07/17	80II																																			
Qua 01/06/16	80II																																			
Qua 01/06/16	80II																																			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


15 Fev '15 | 22 Fev '15 | 01 Mar '15 | 08 Mar '15 | 15 Mar '15 | 22 Mar '15 | 29 Mar '15 | 05 Abr '15 | 12 Abr '15
 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

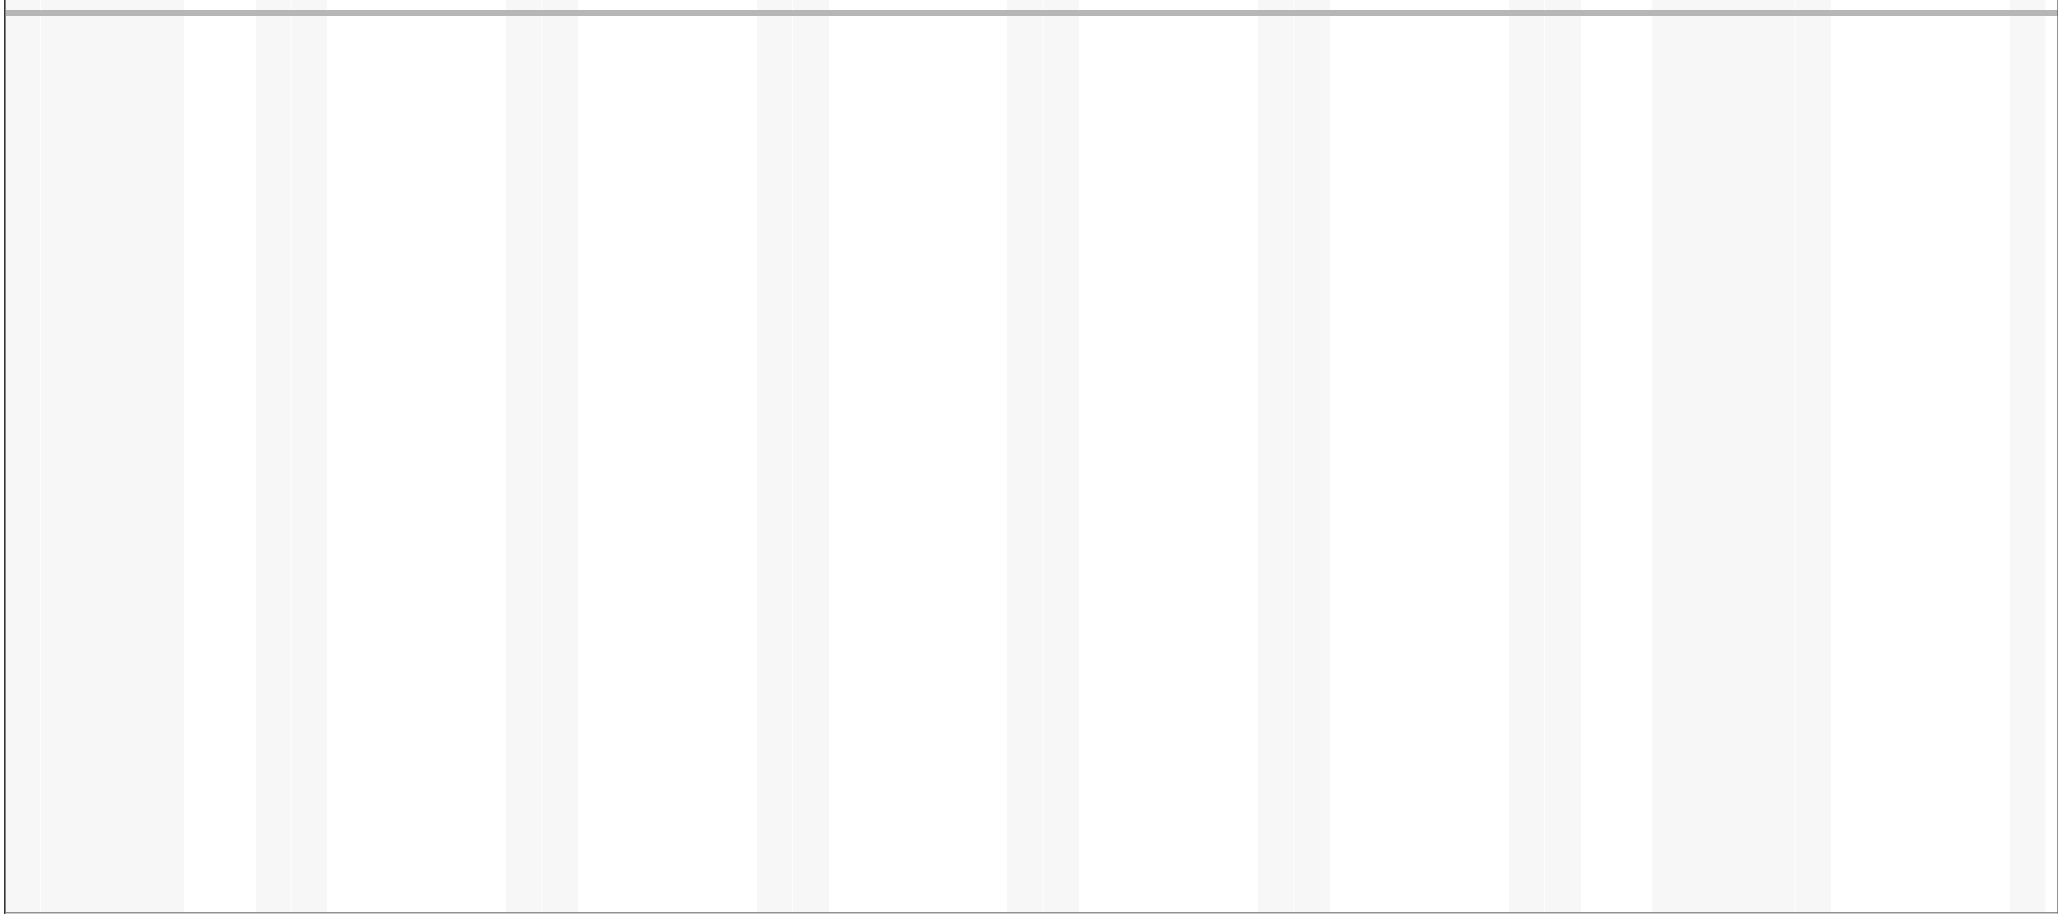


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

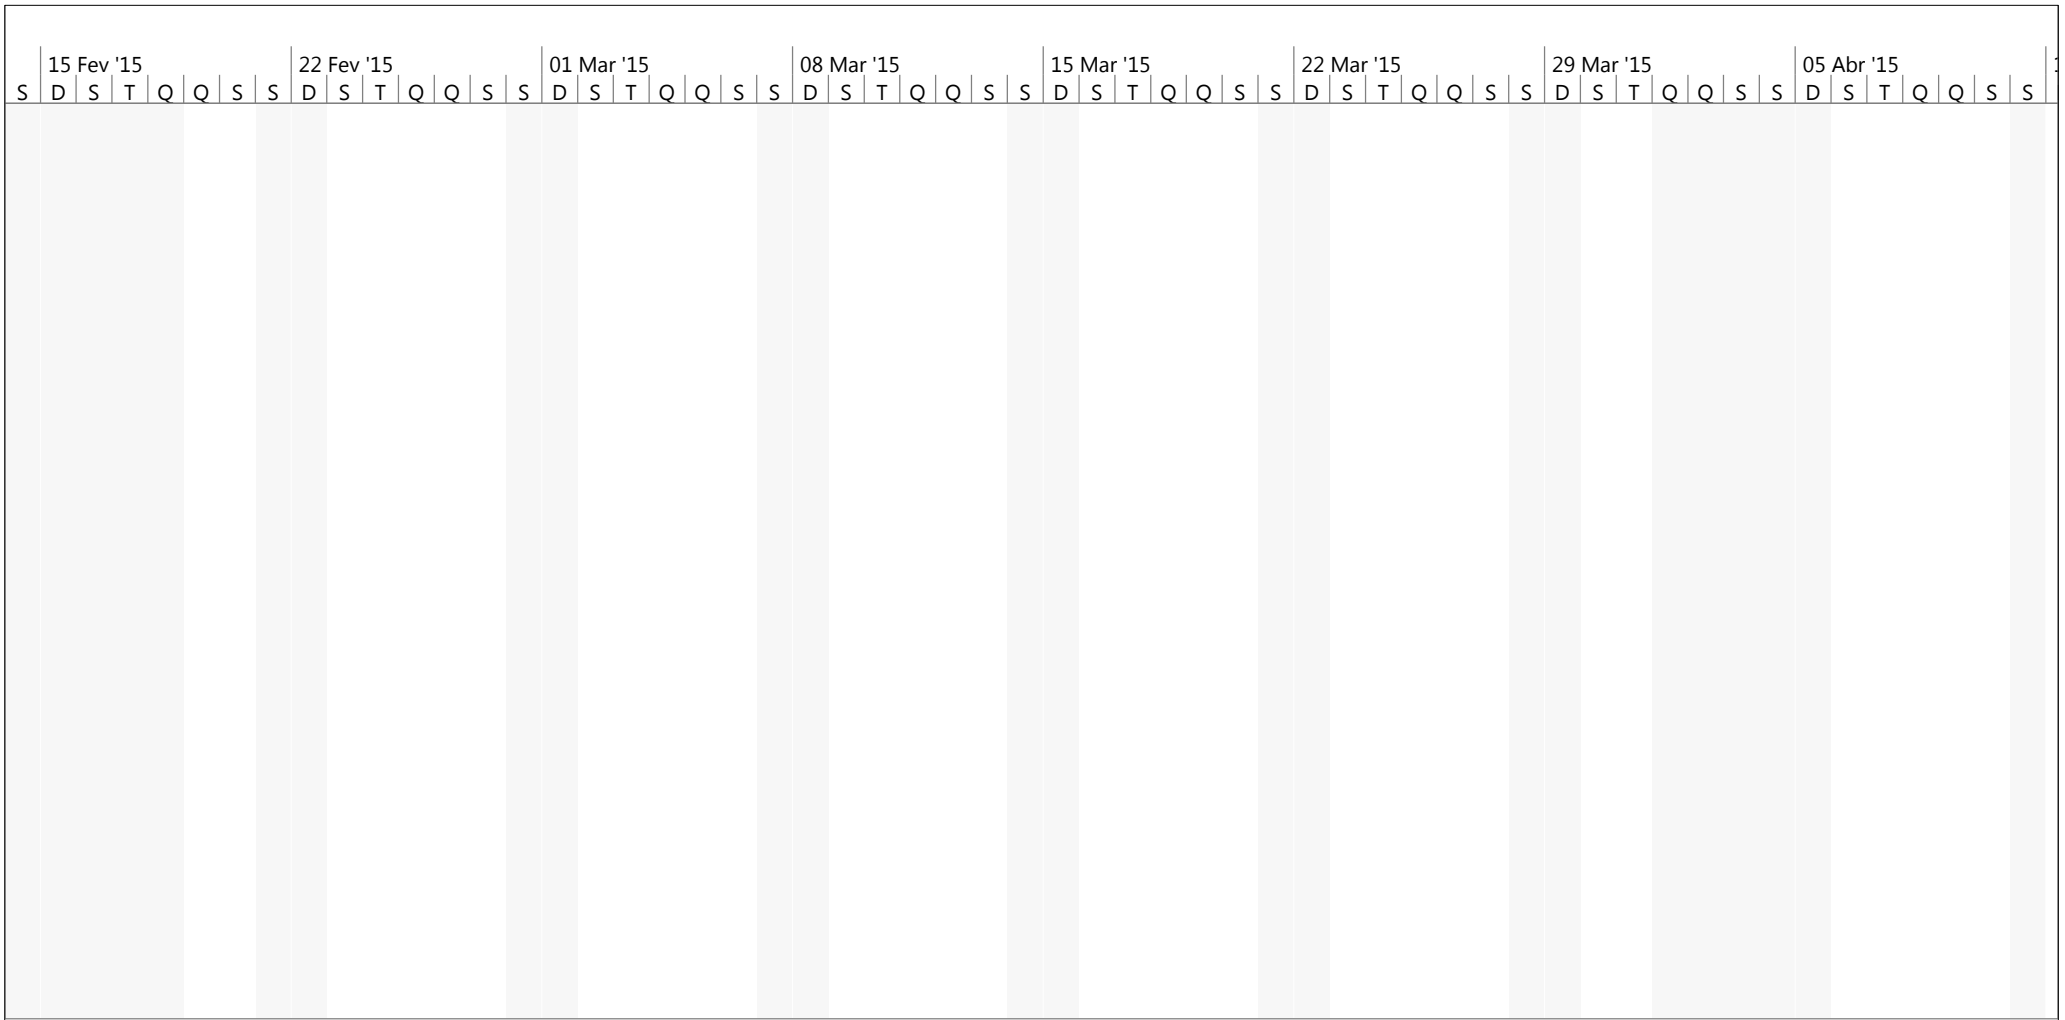


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

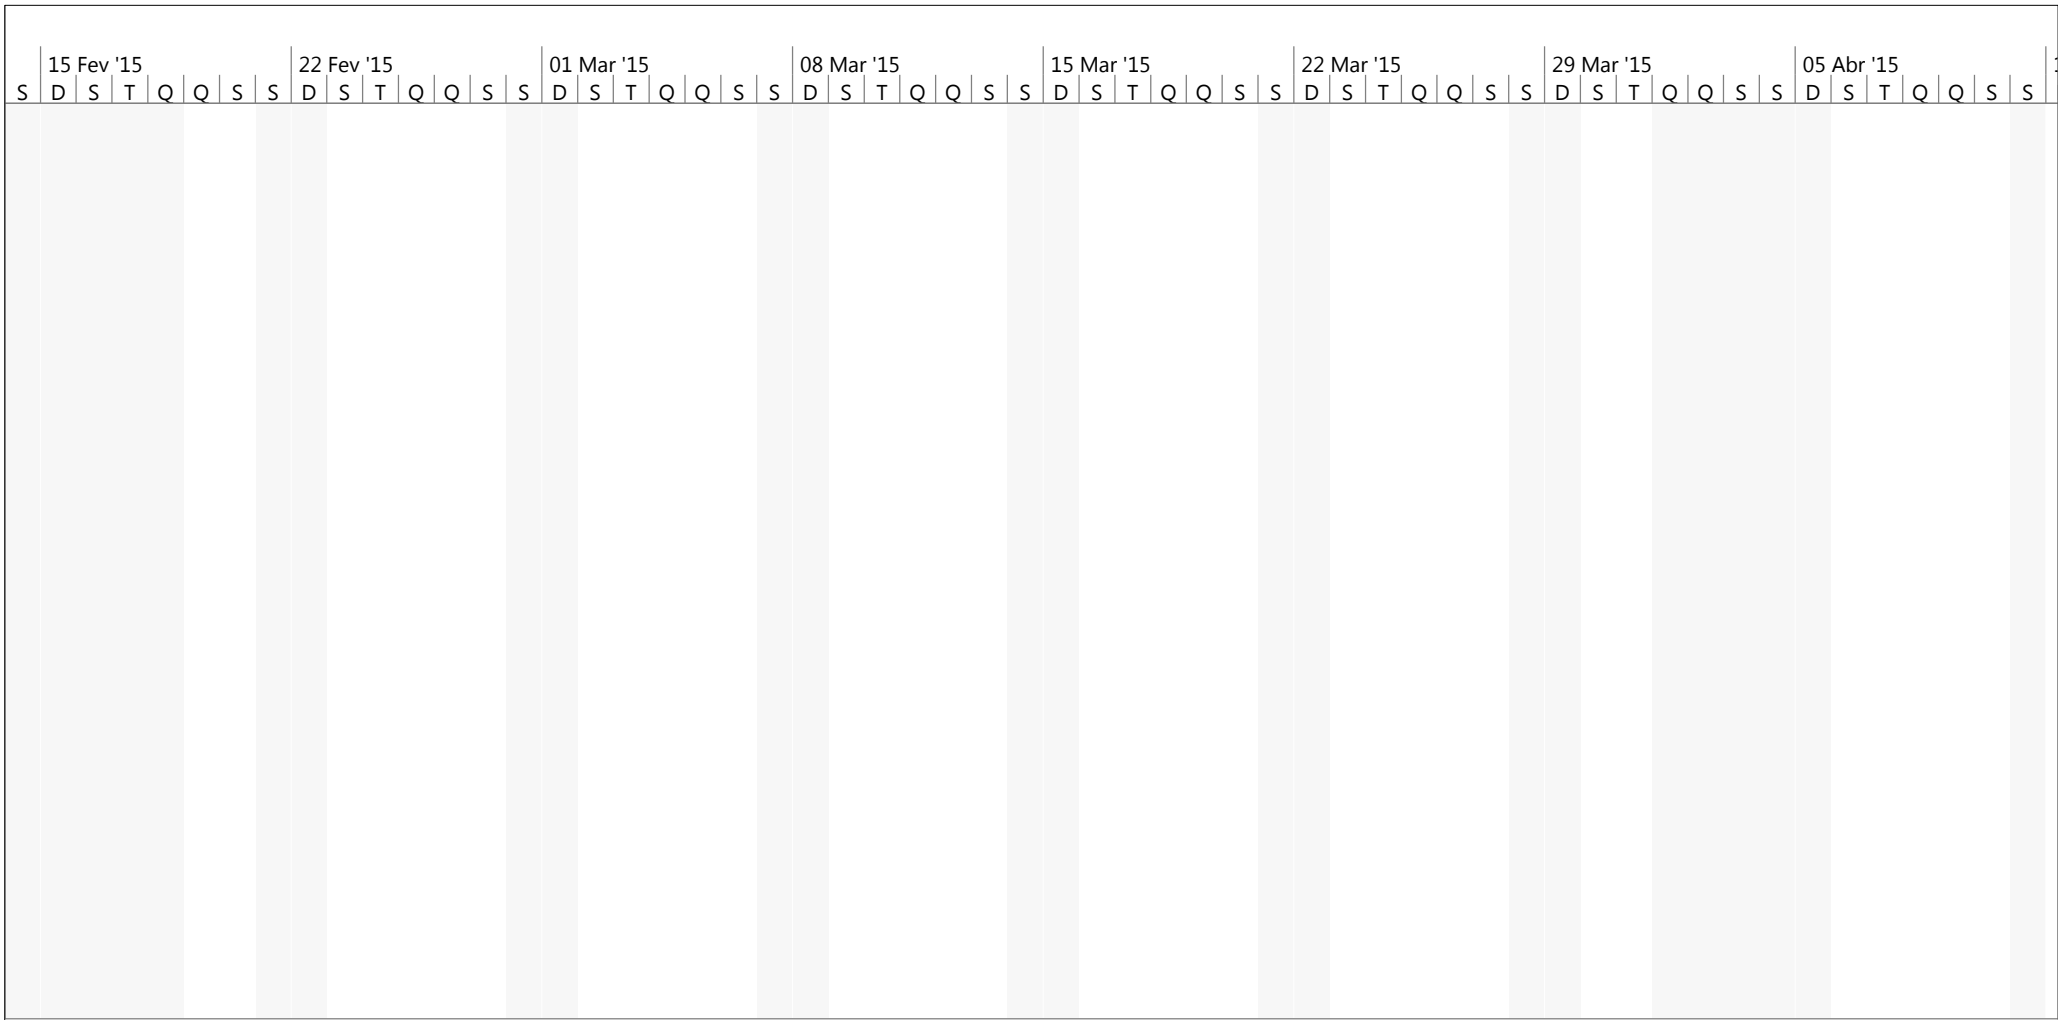


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

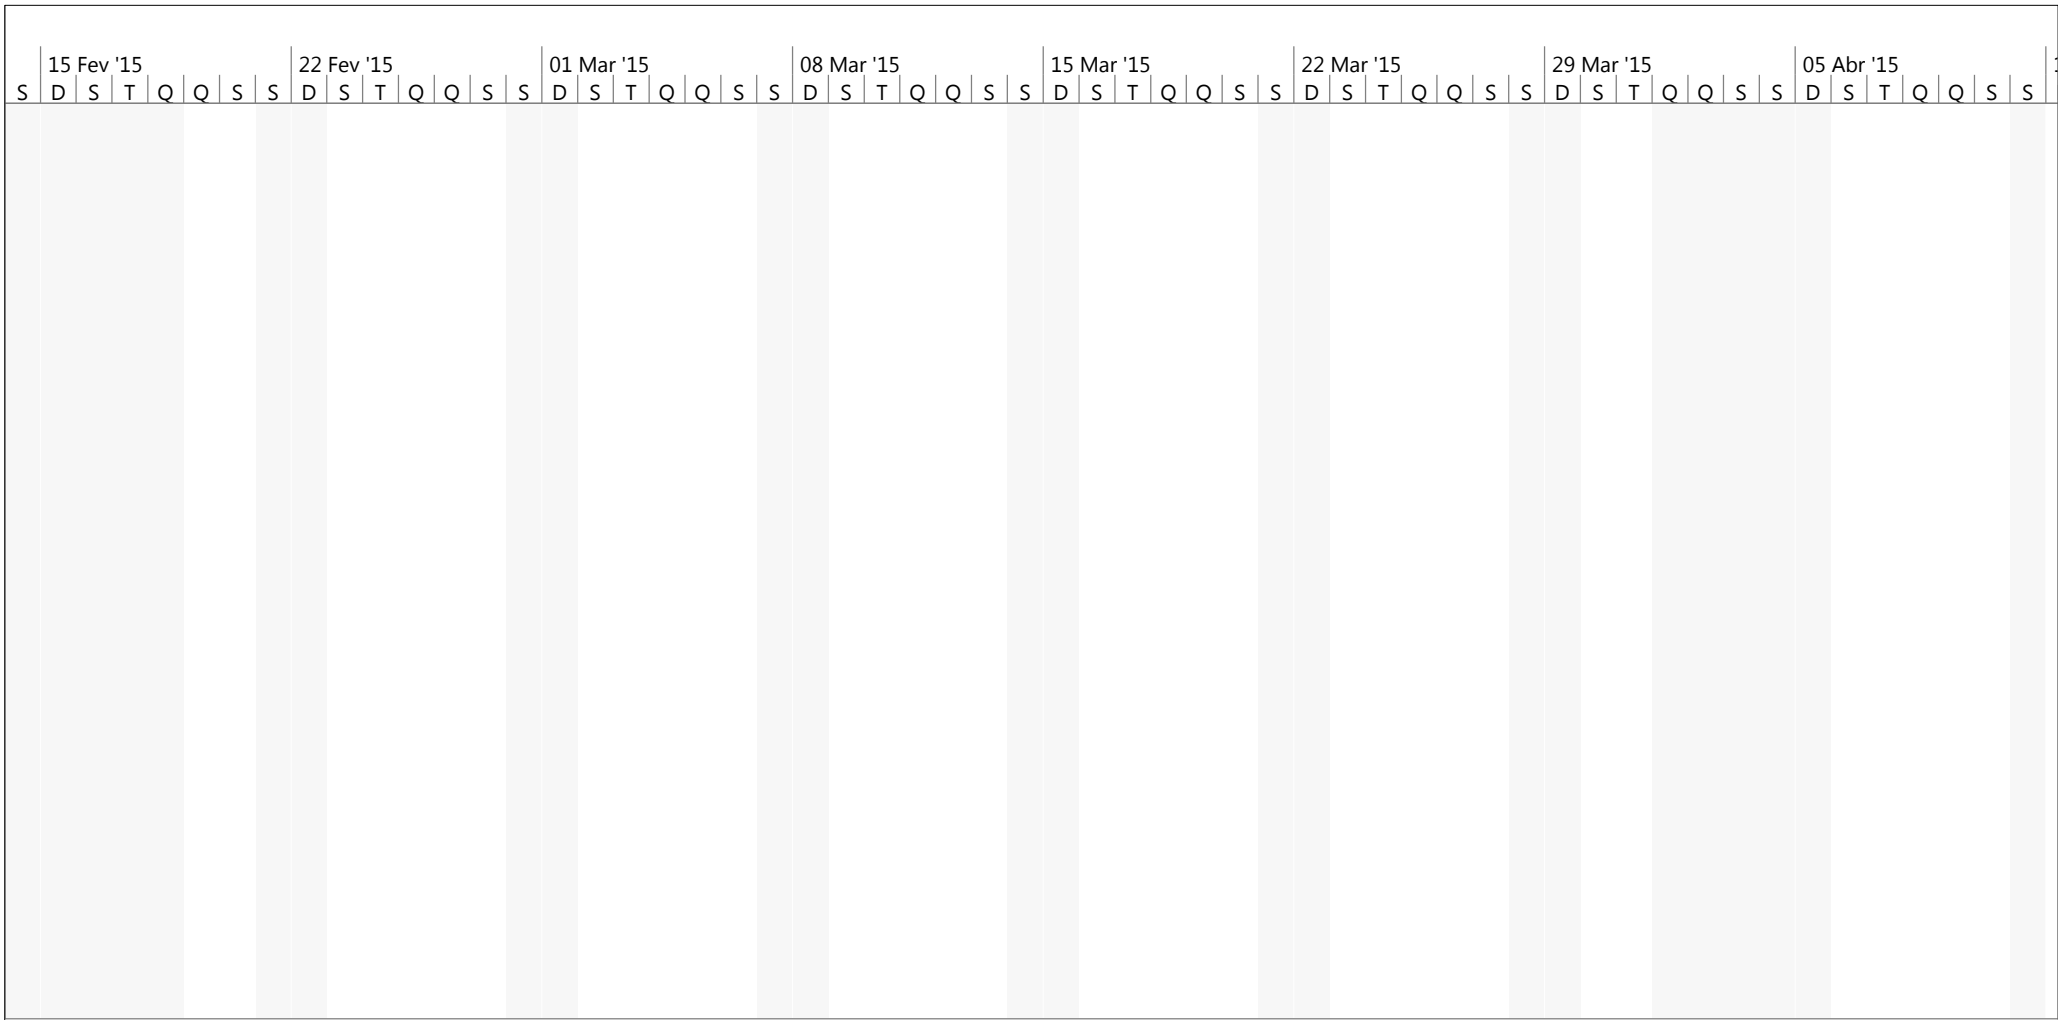


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

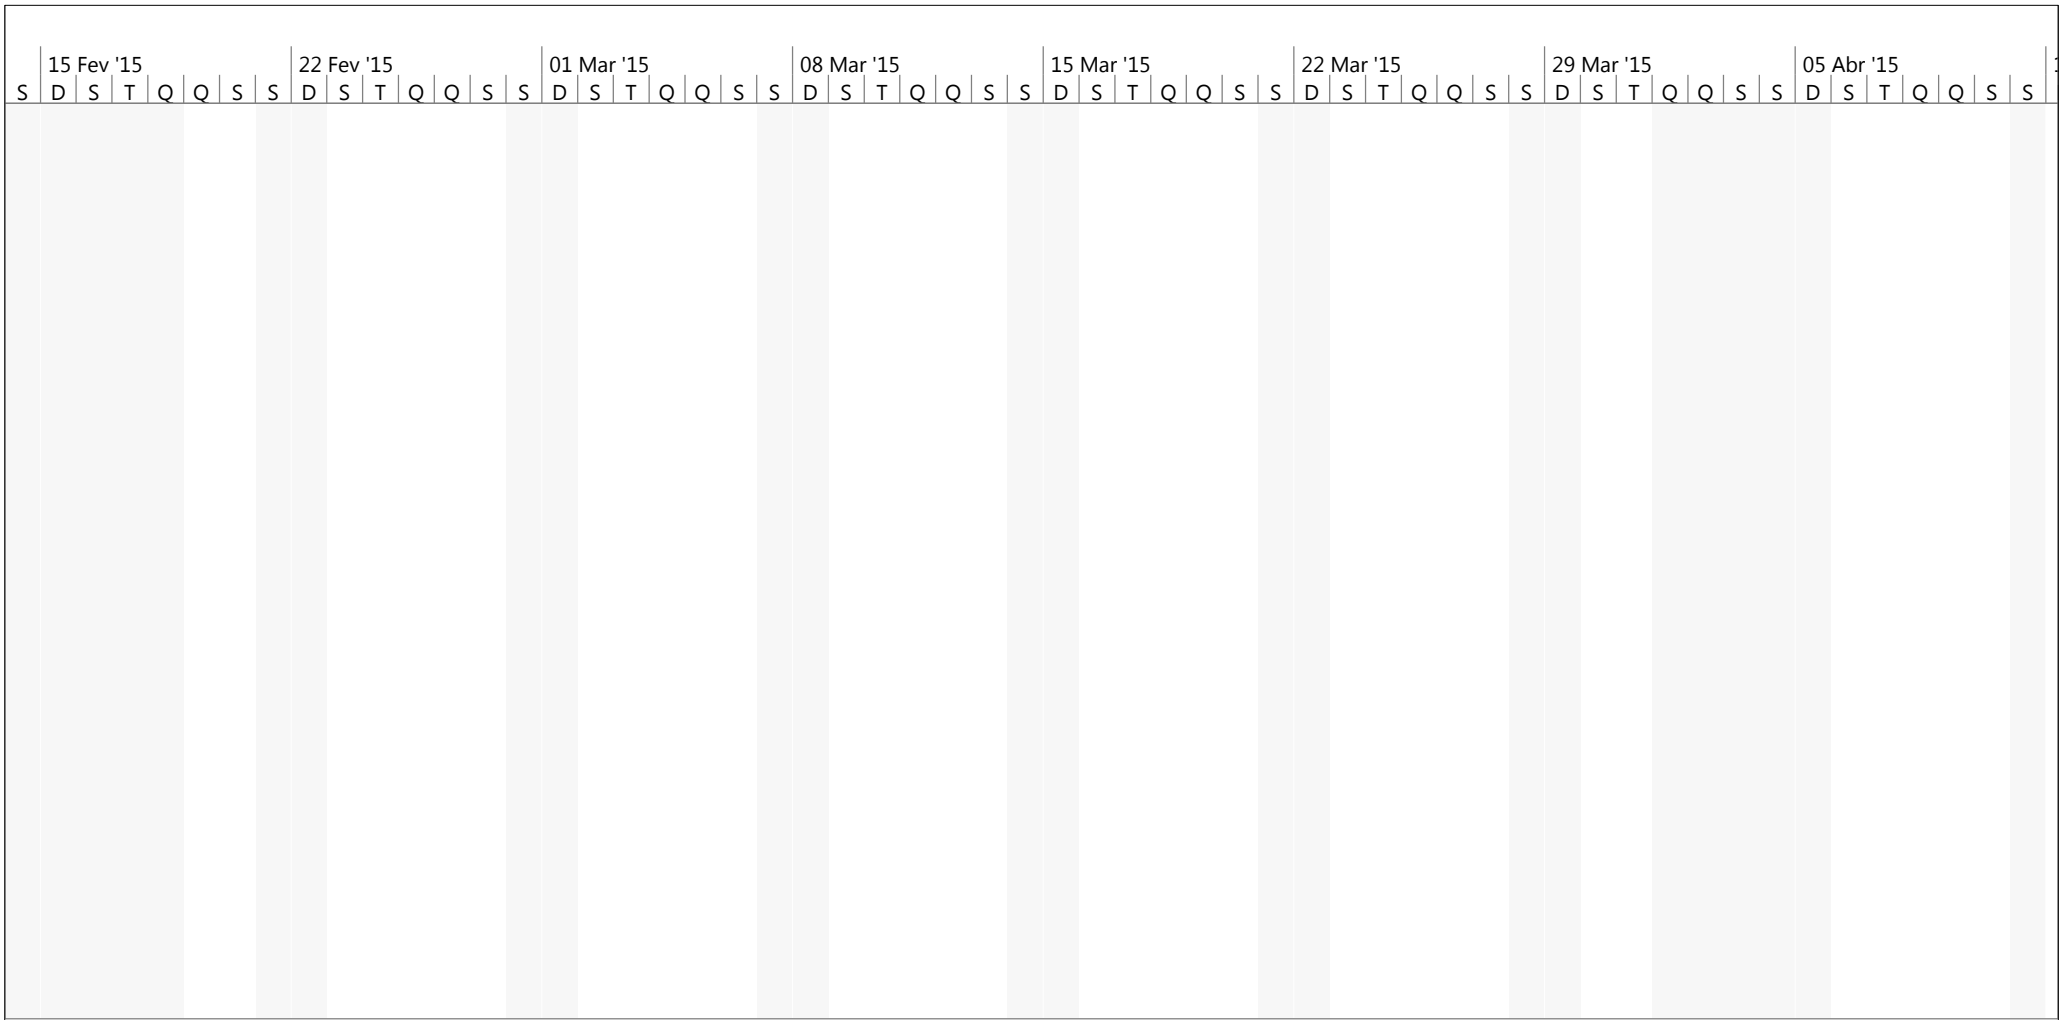


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

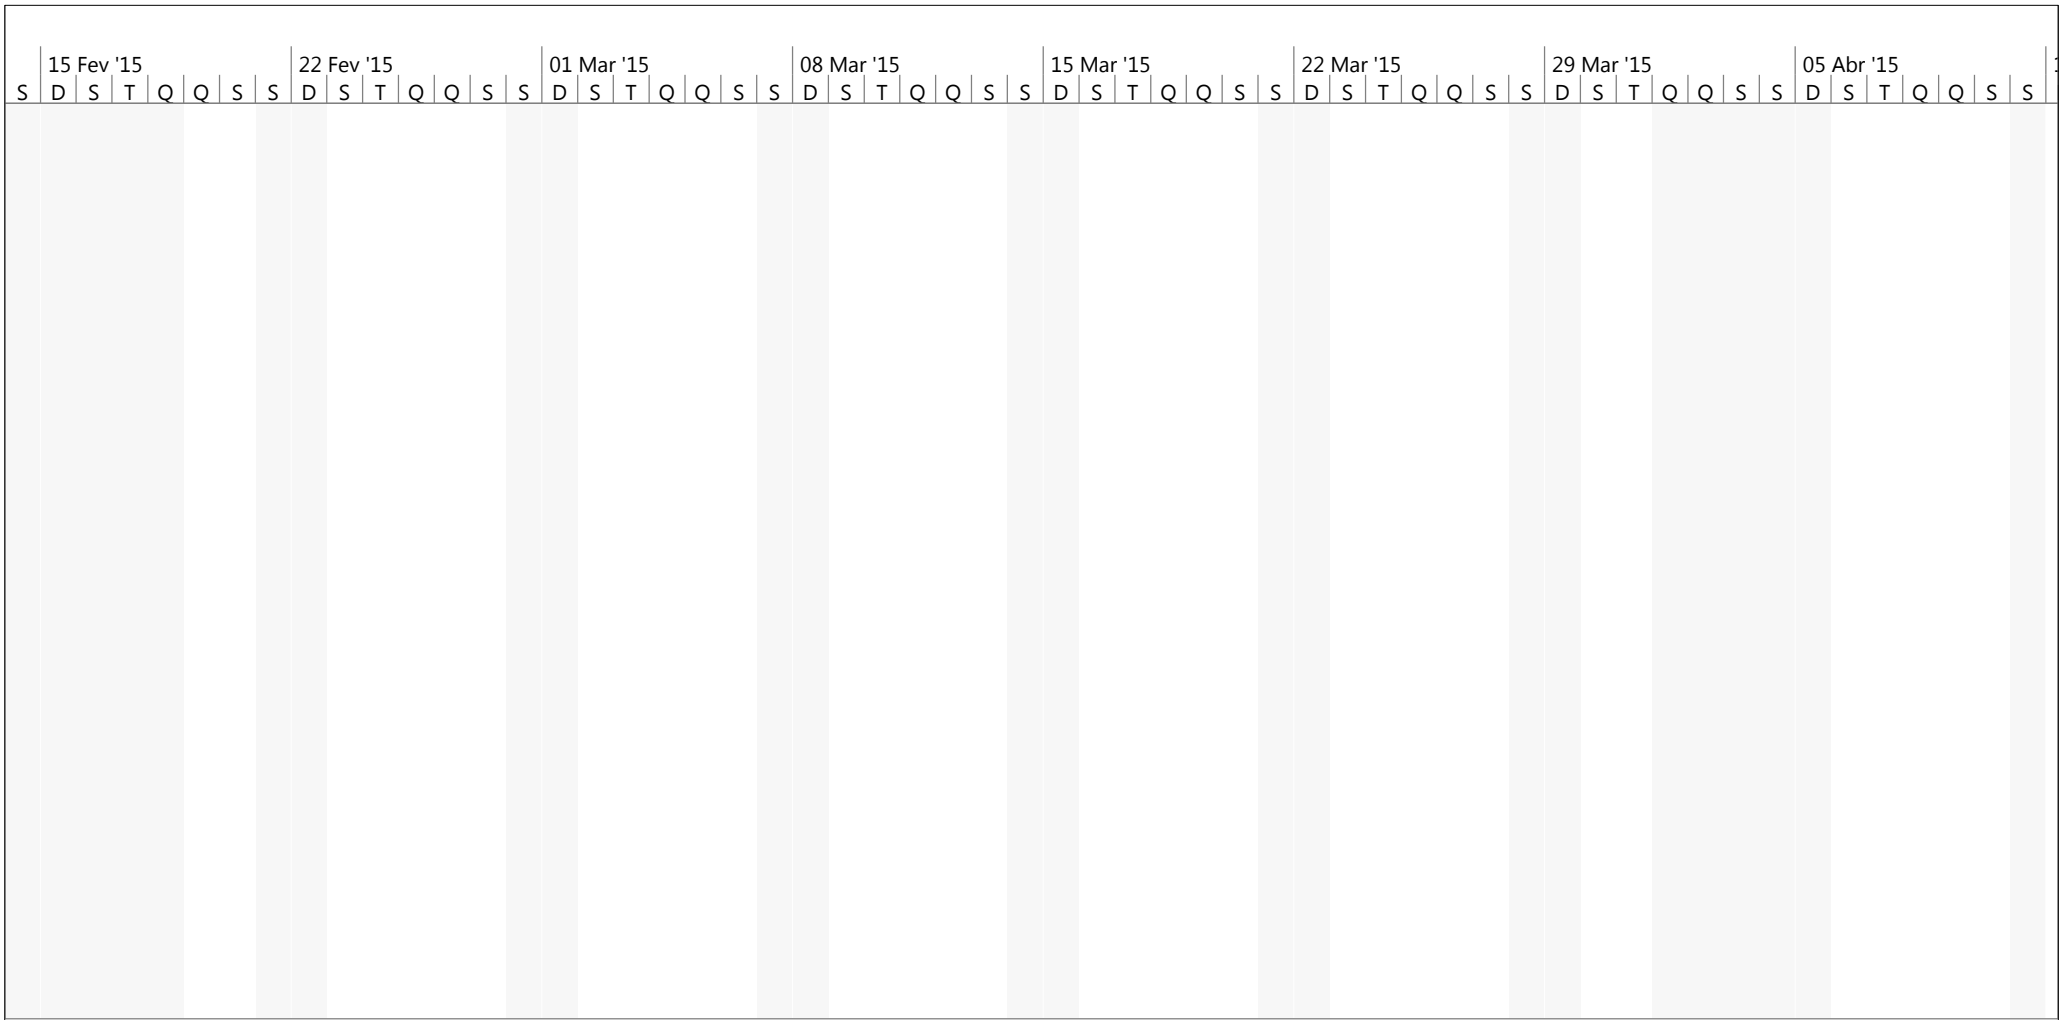


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

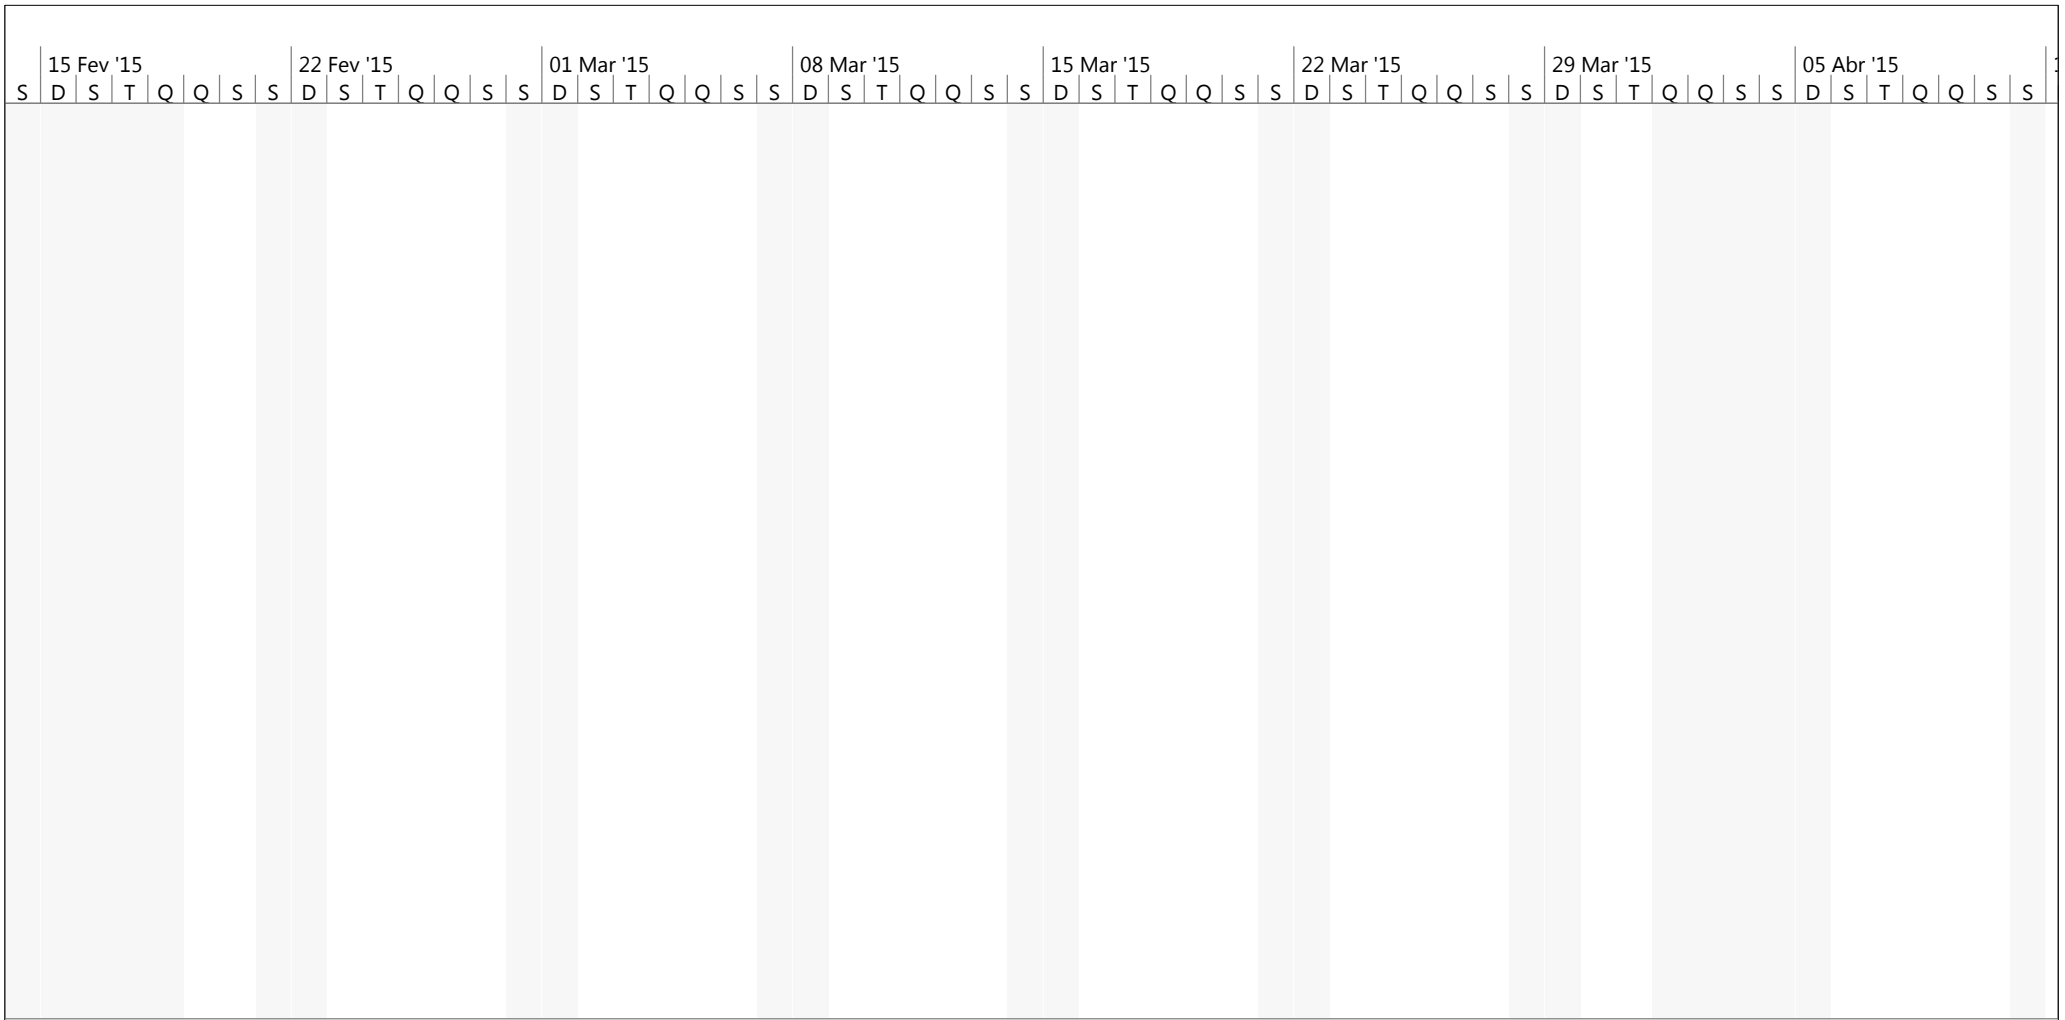


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

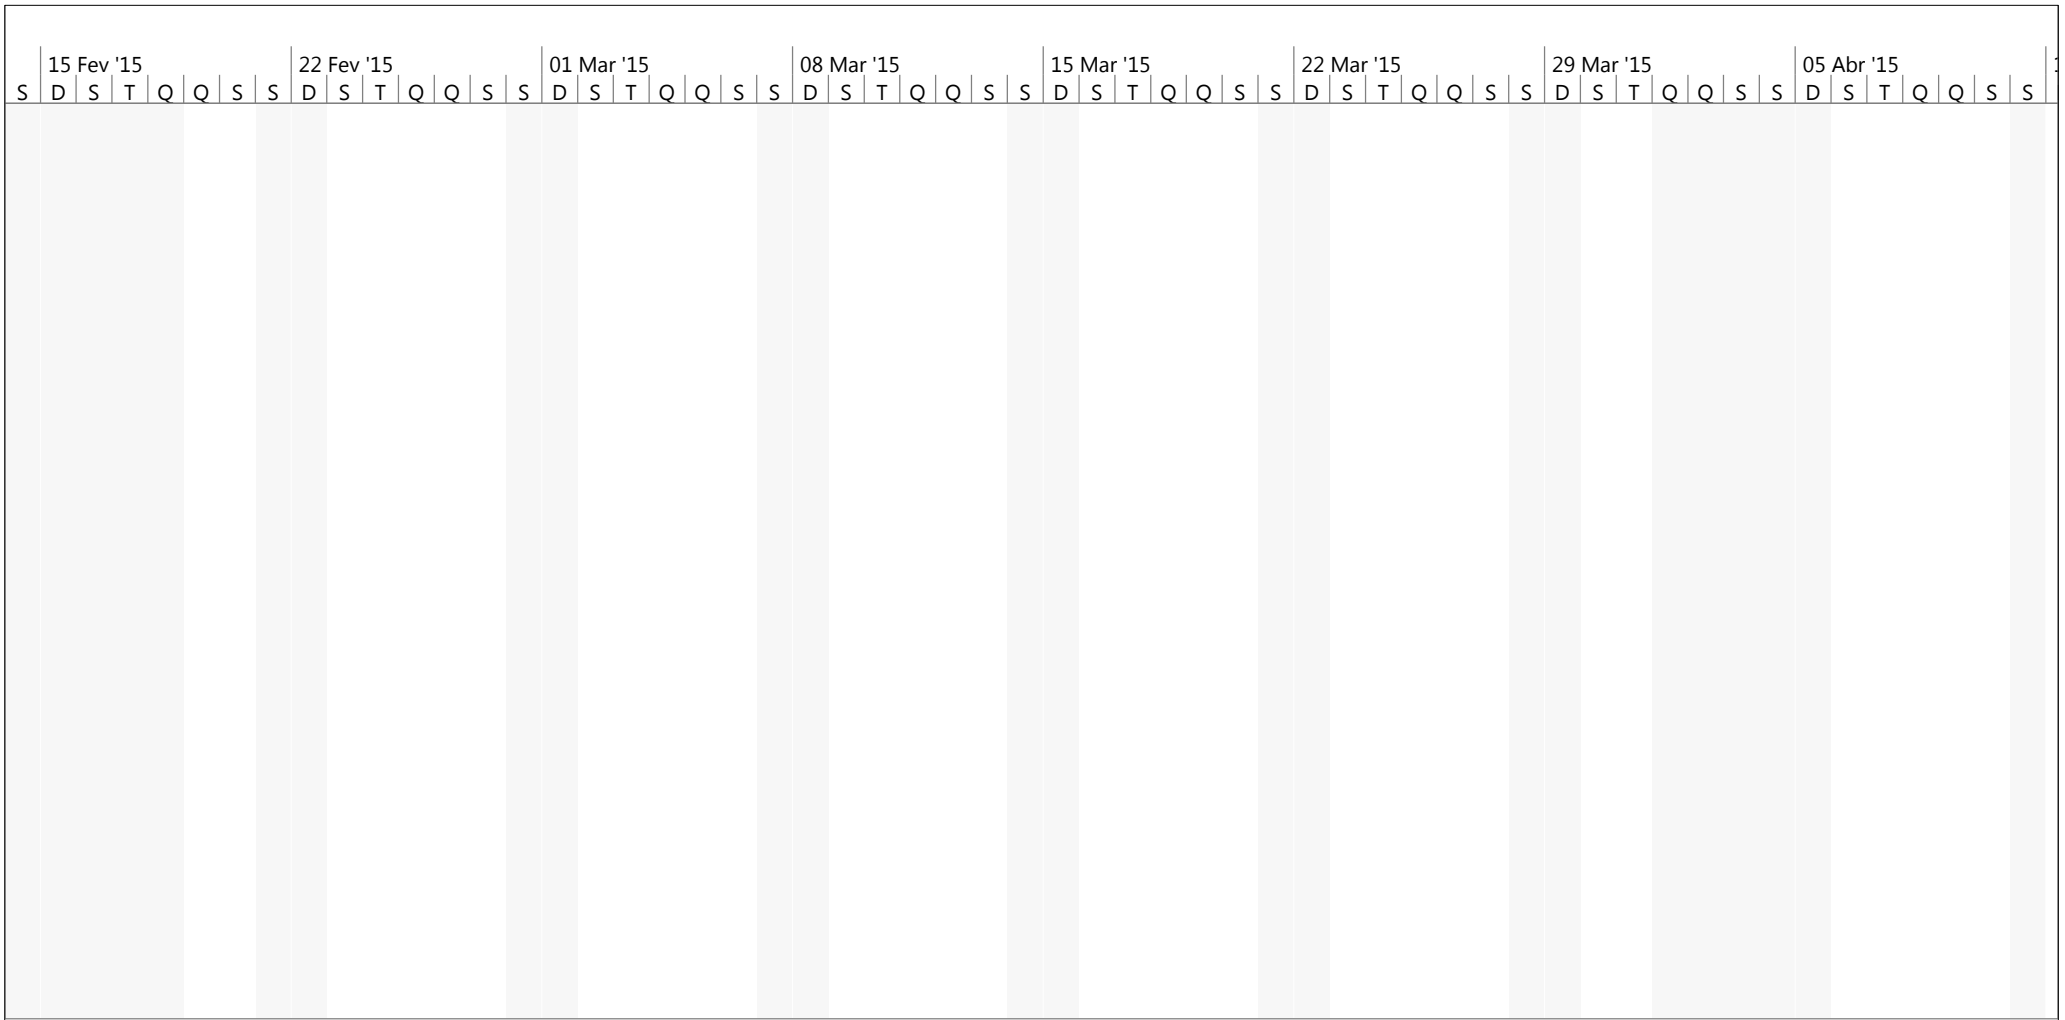


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

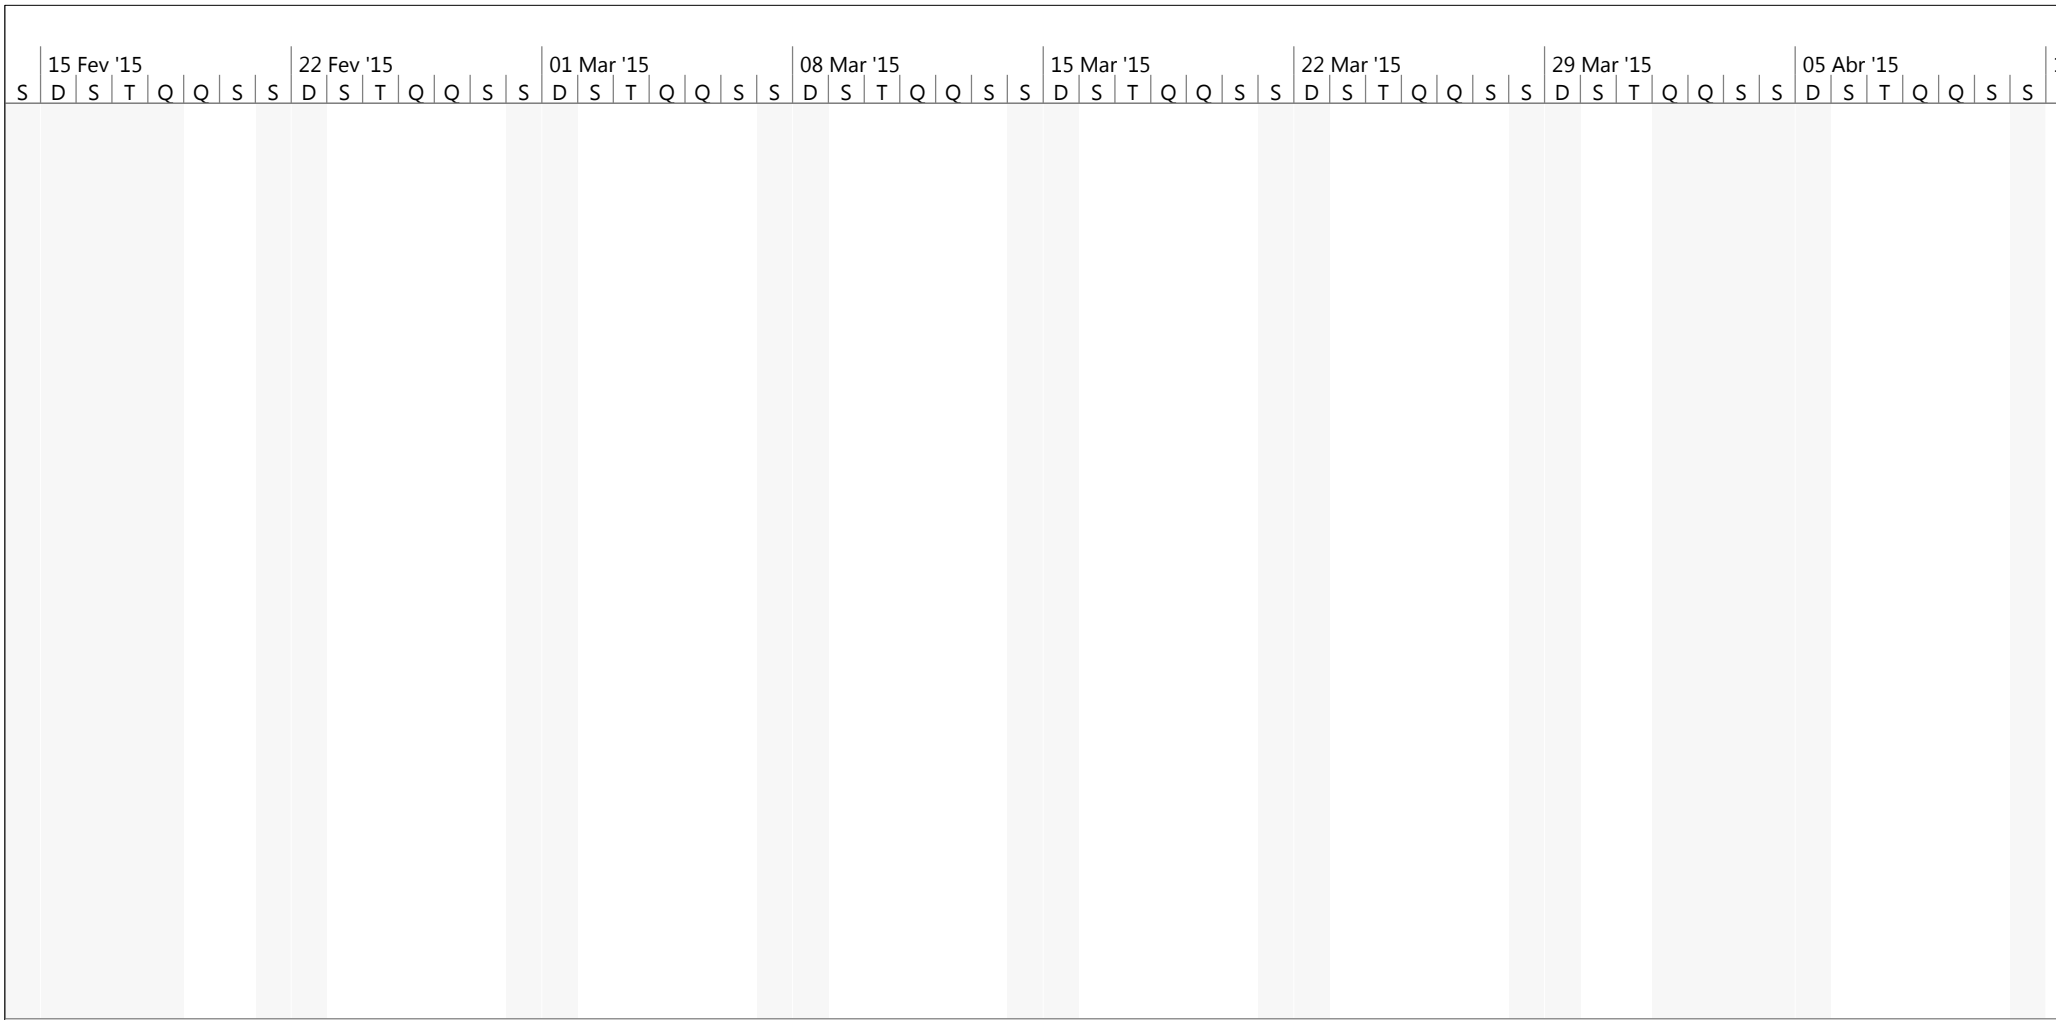


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

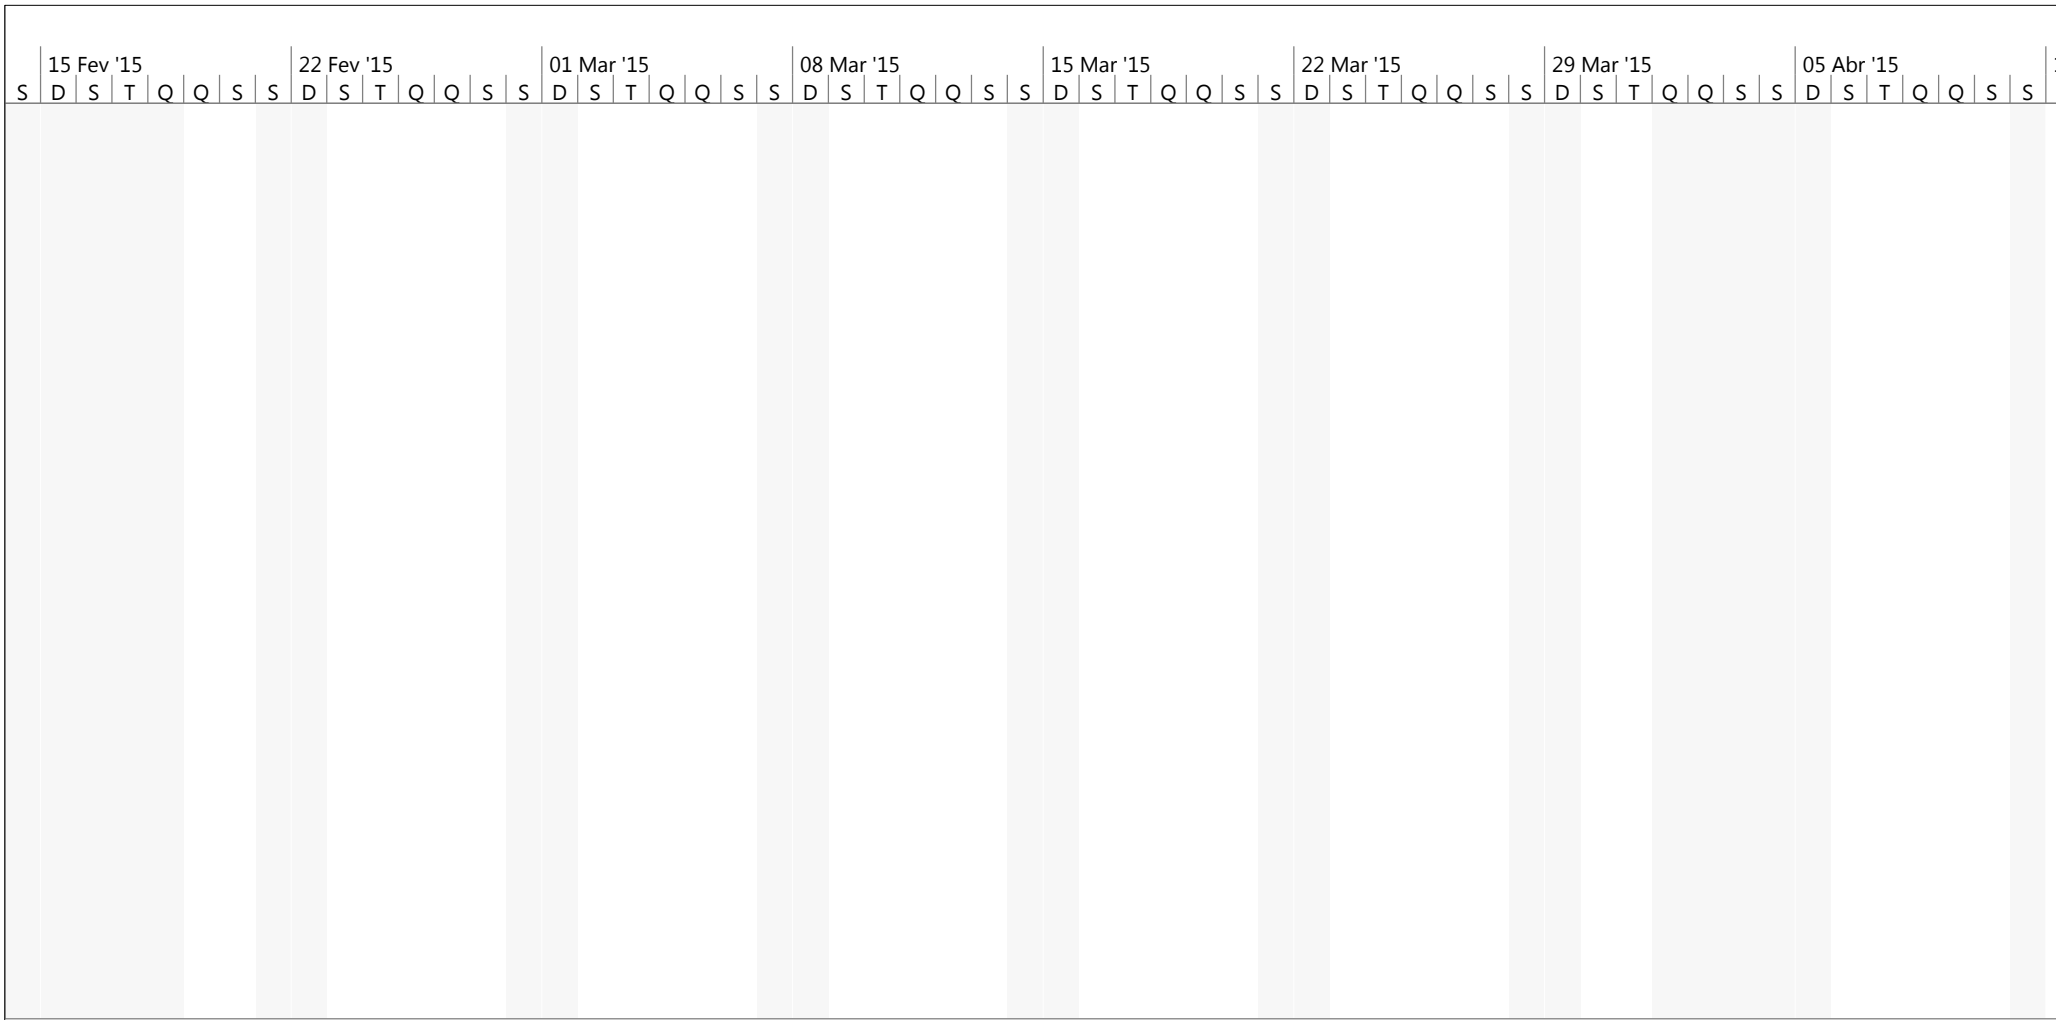


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

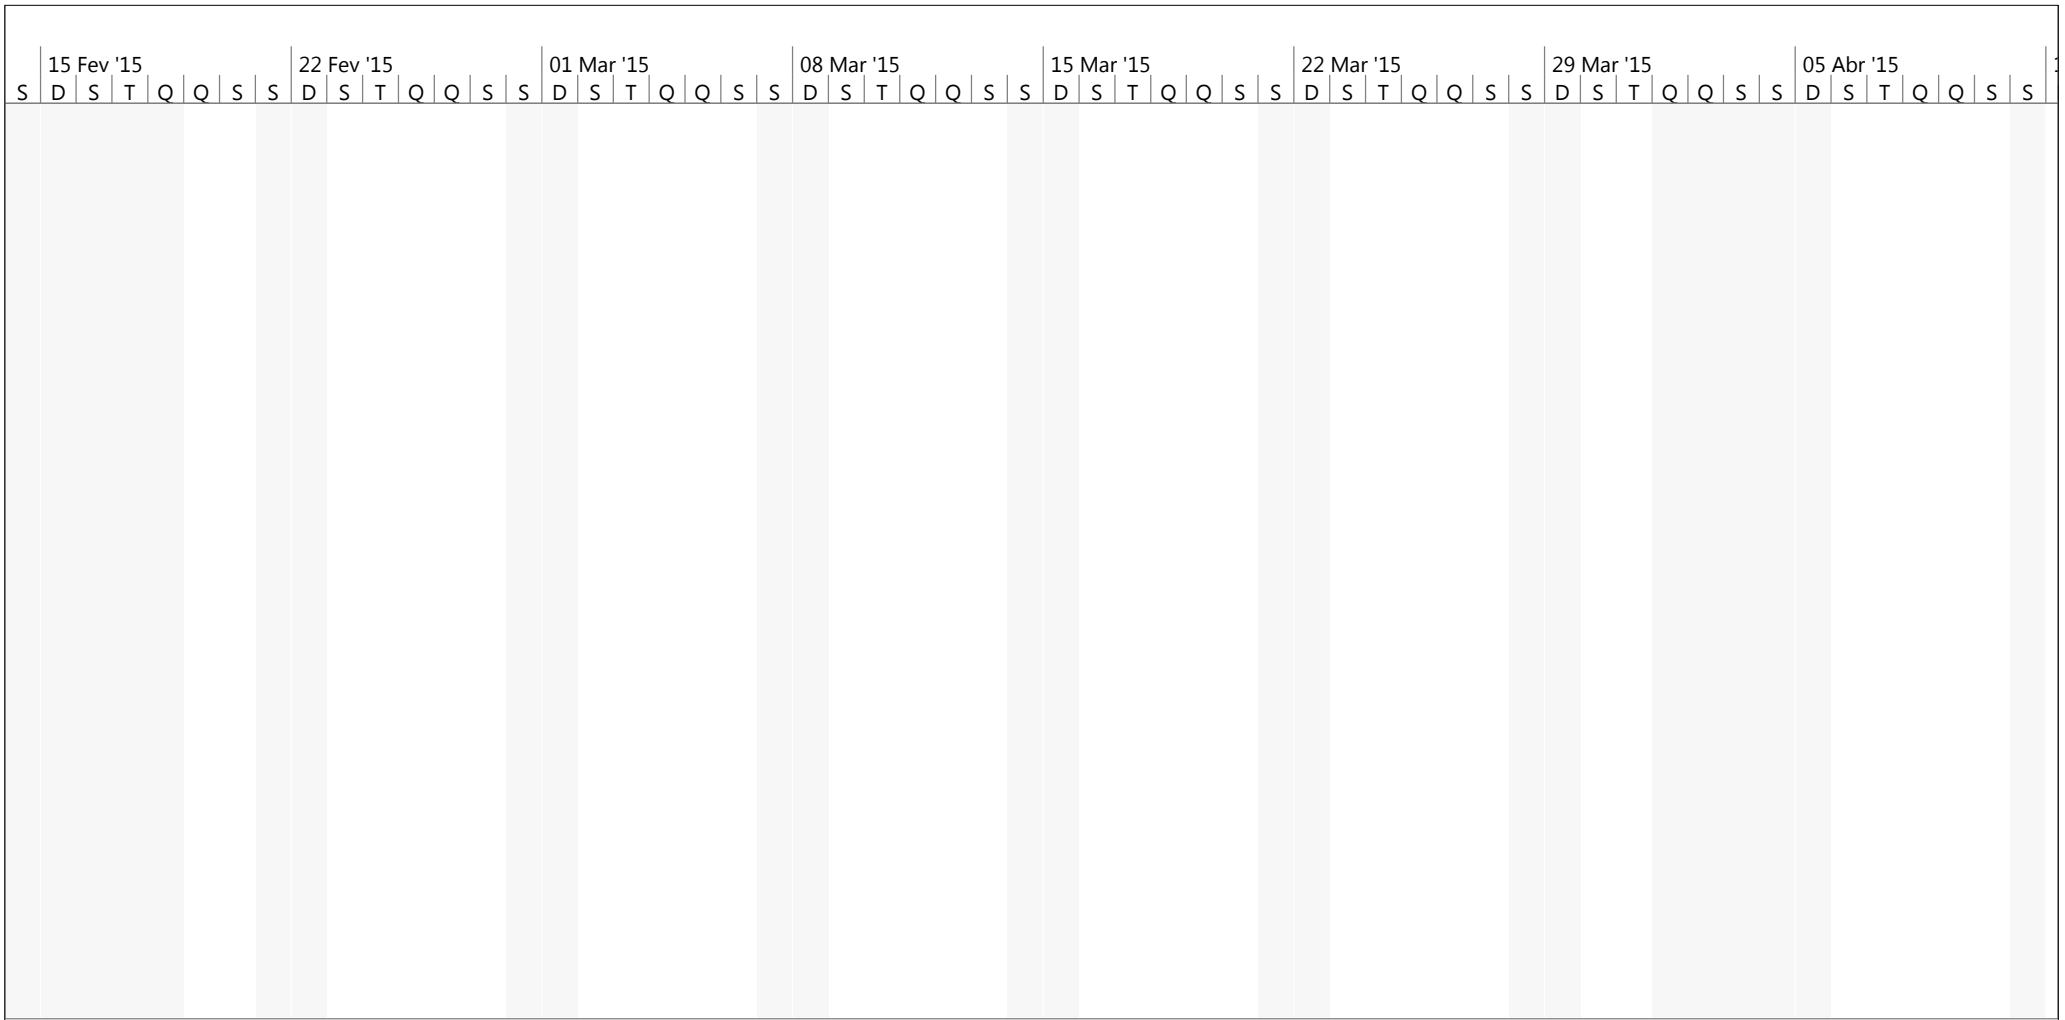


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

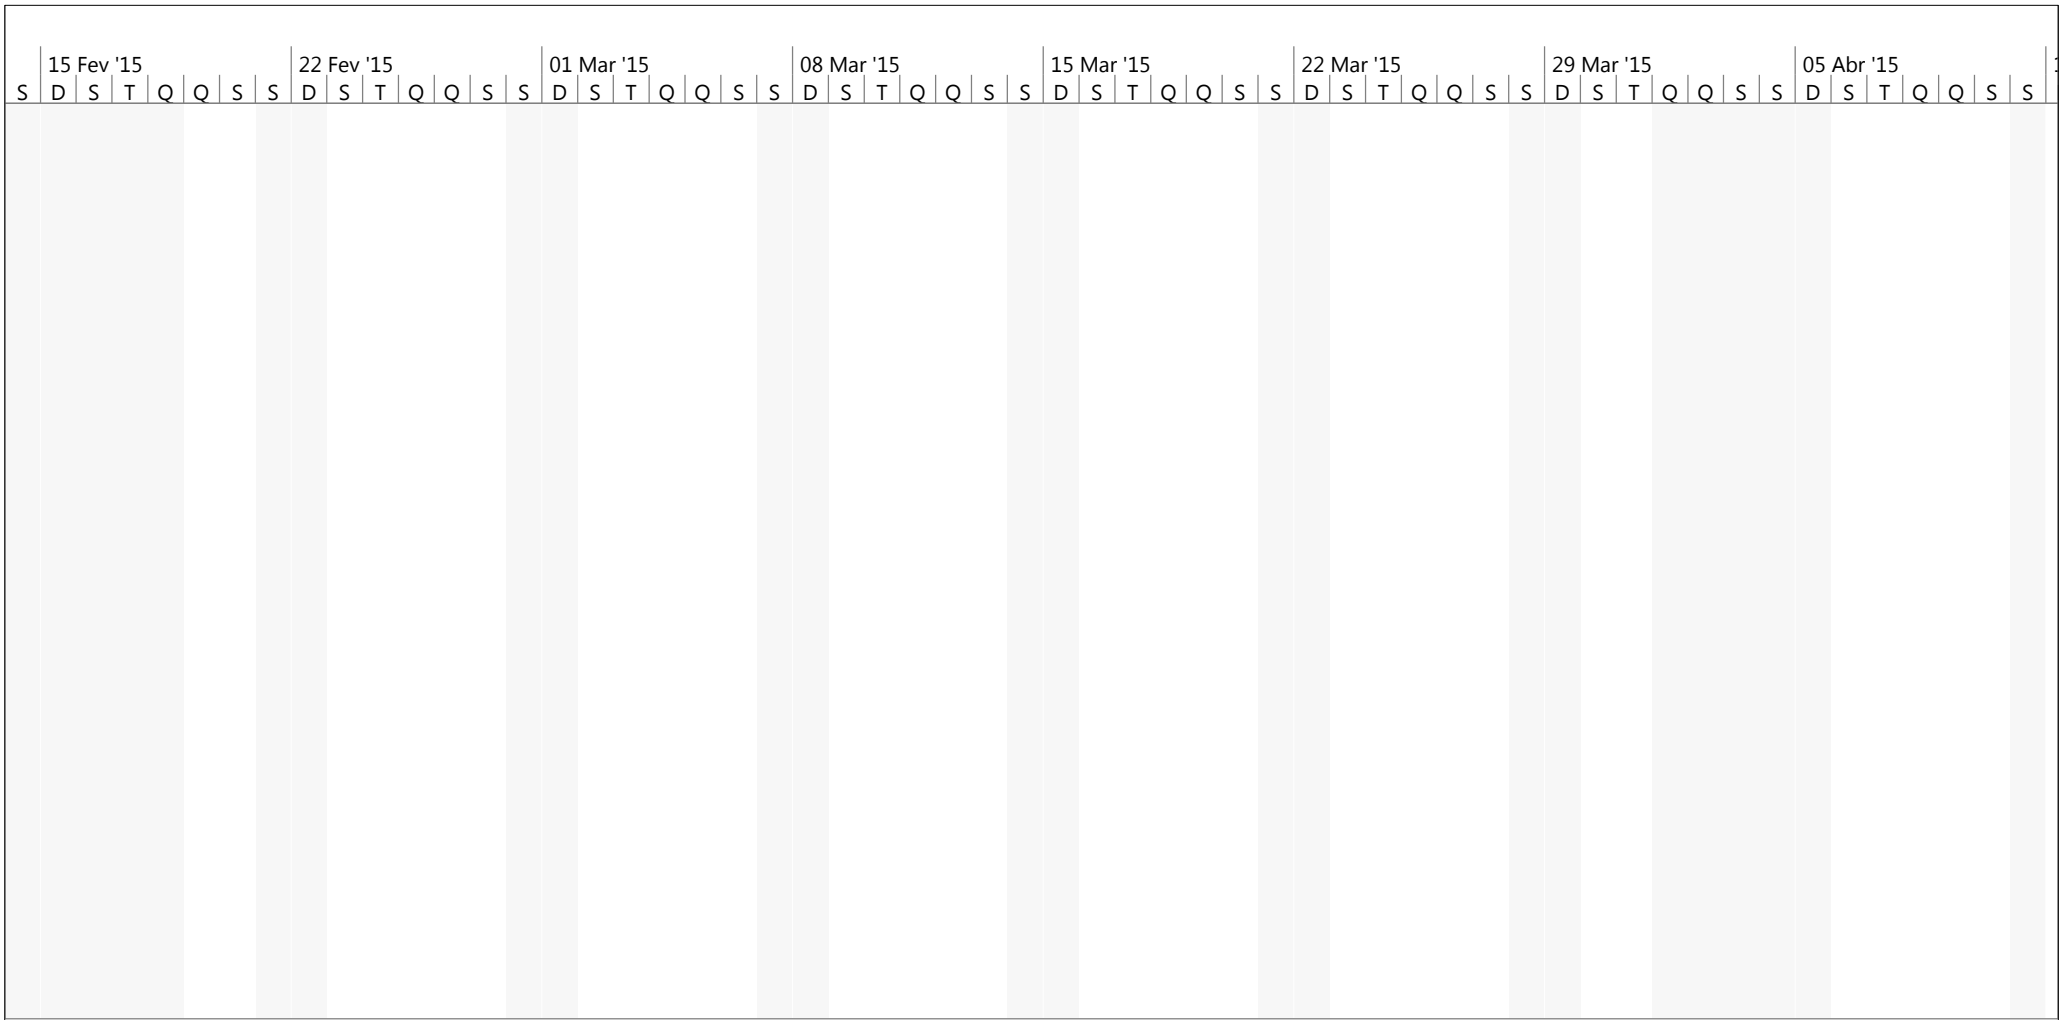


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

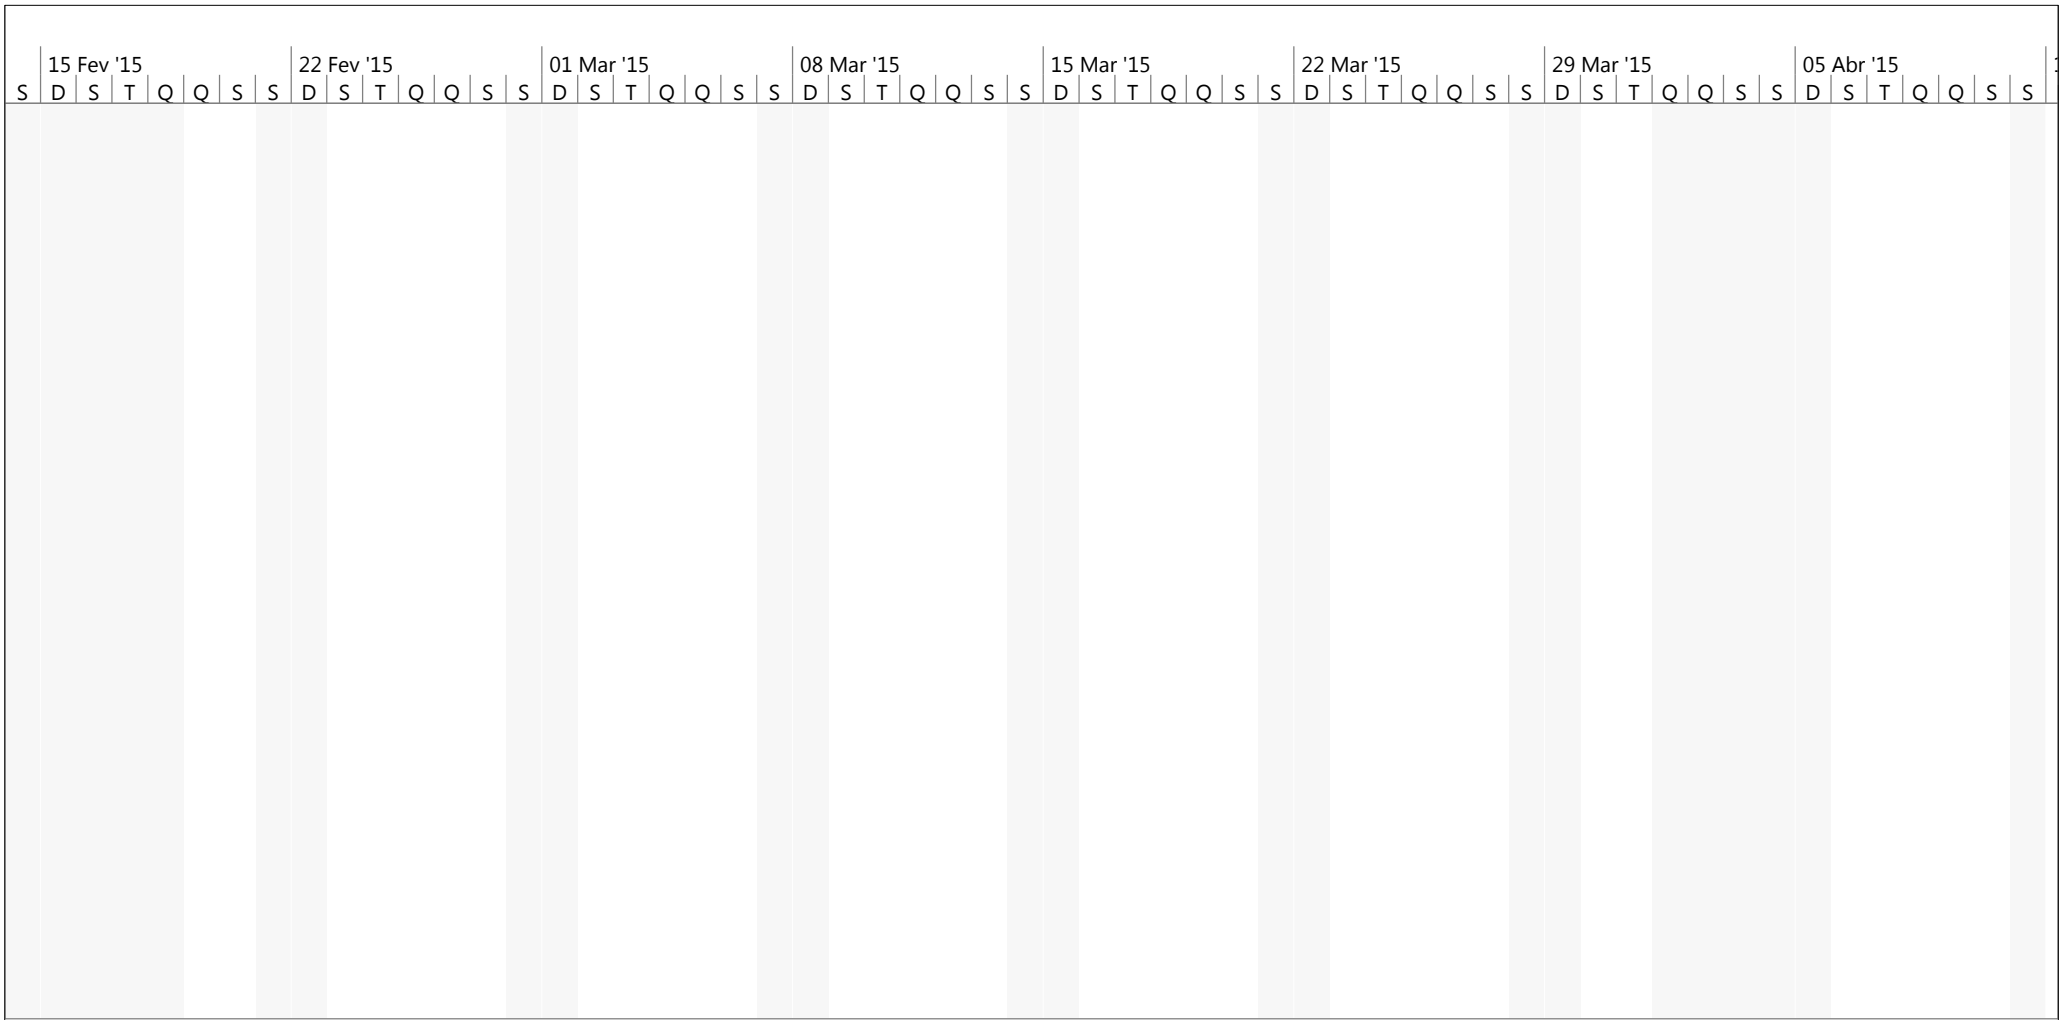

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

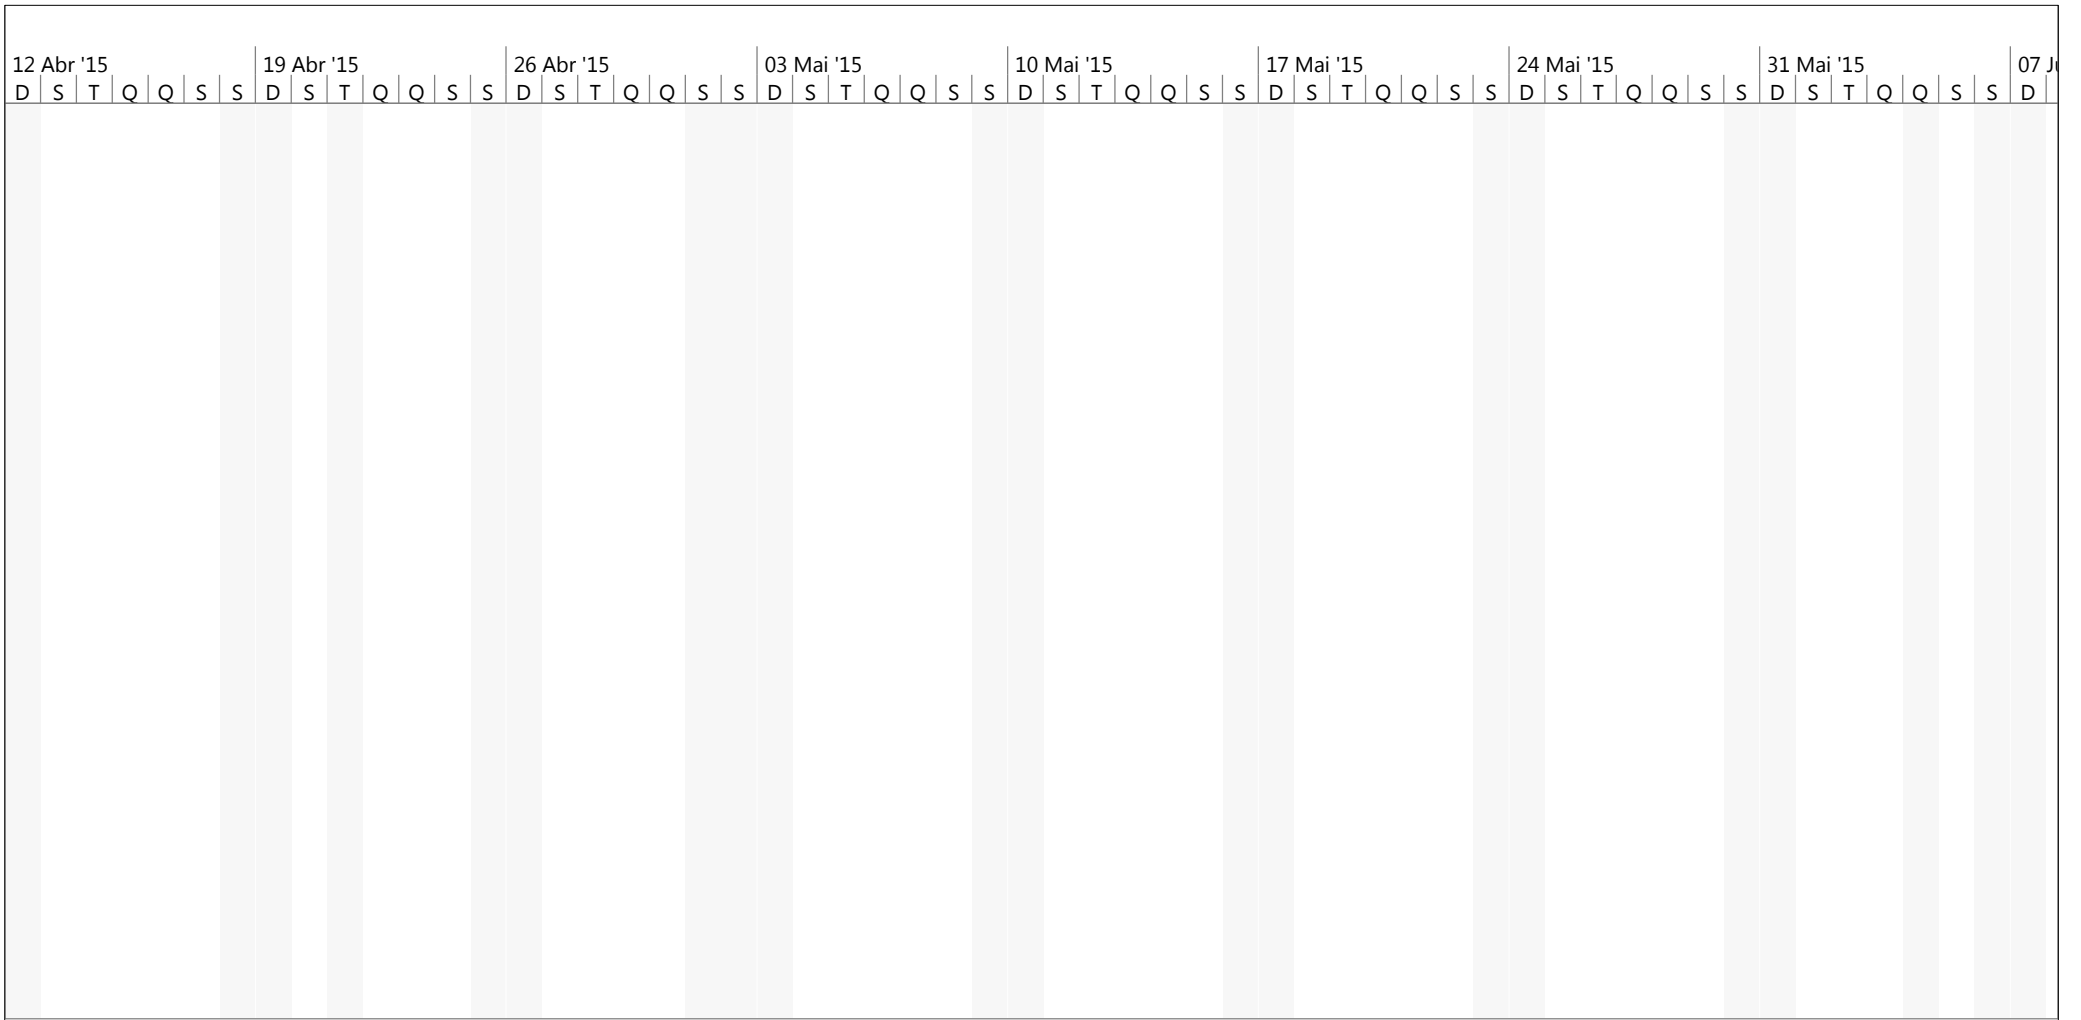

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

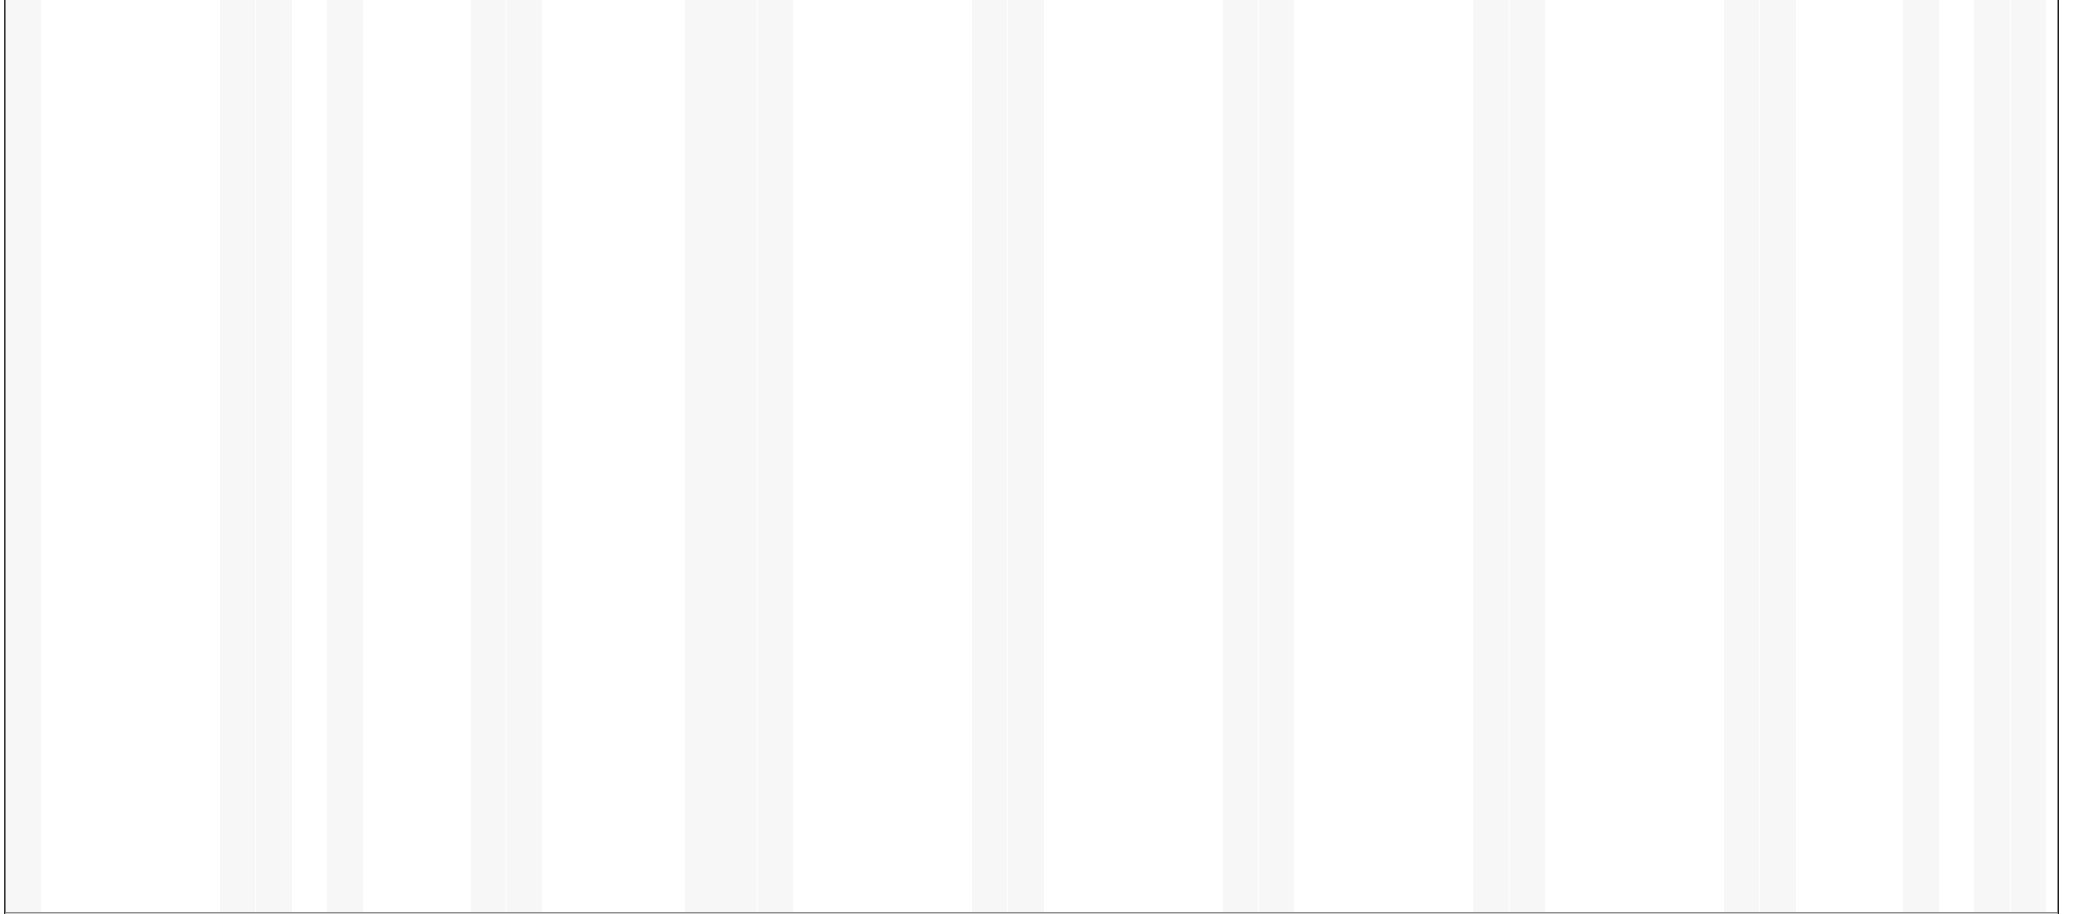


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

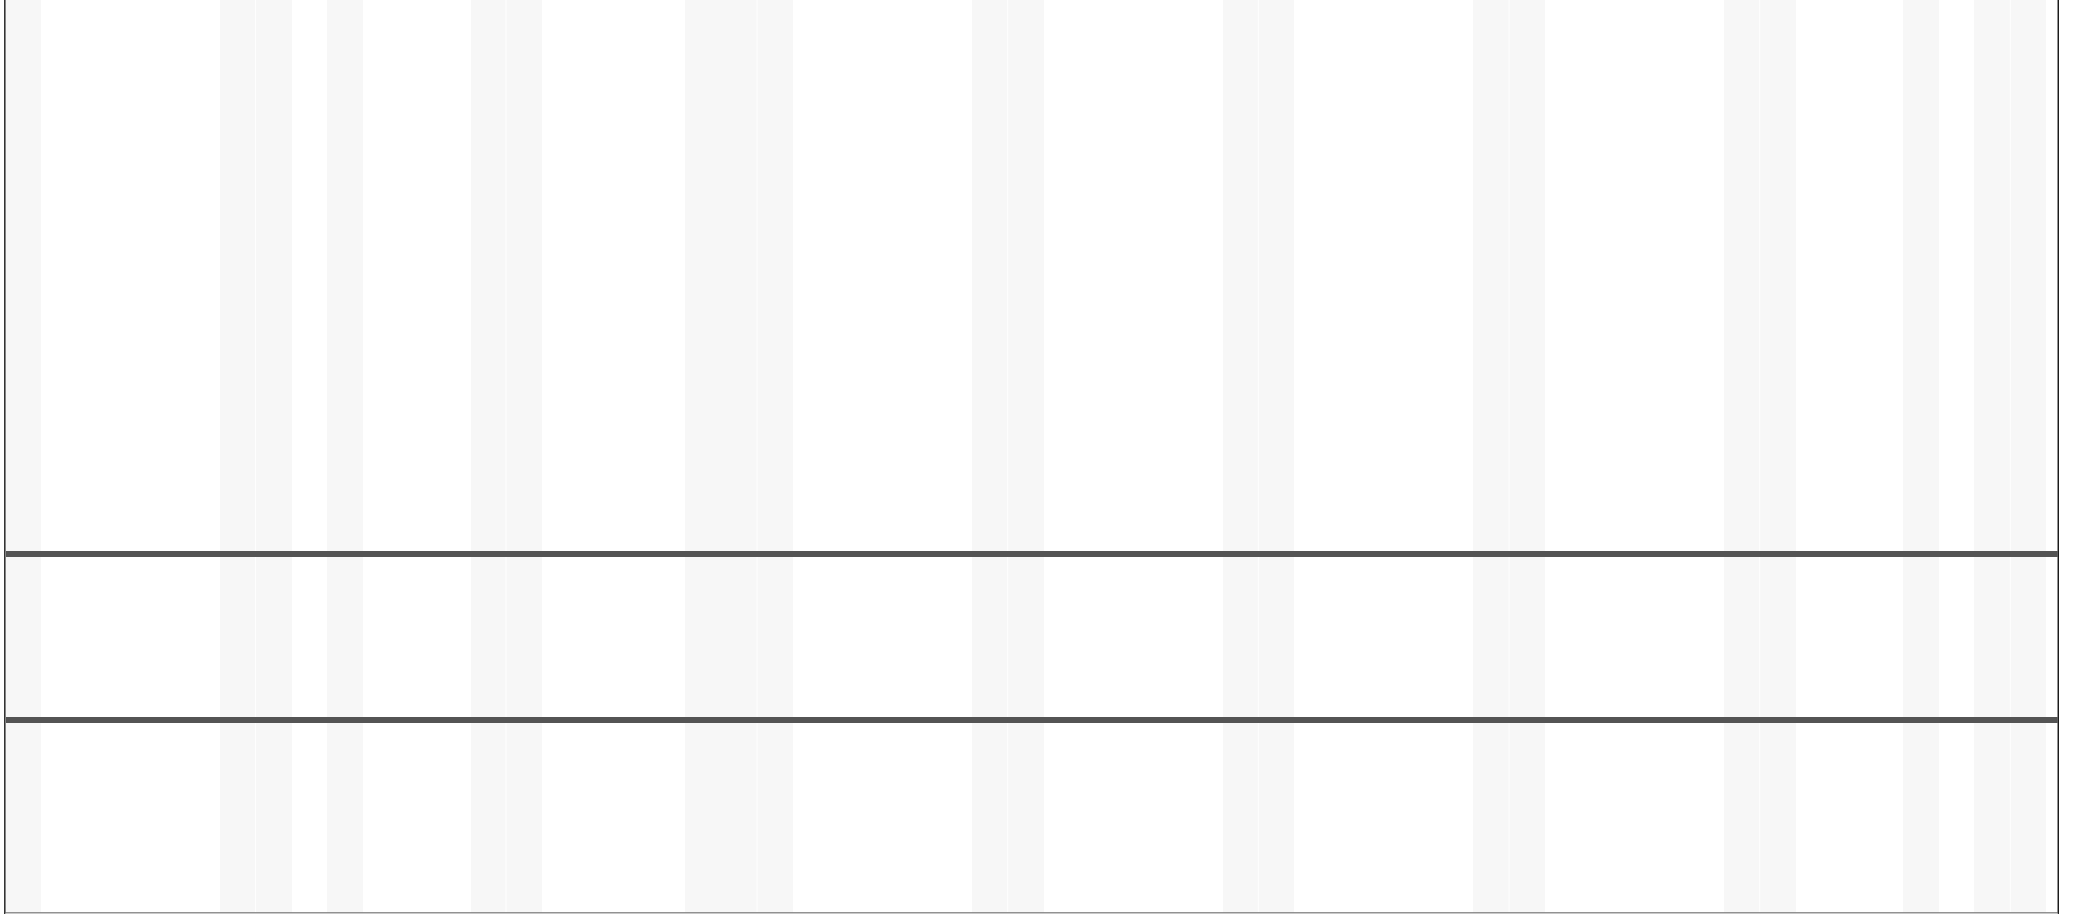


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

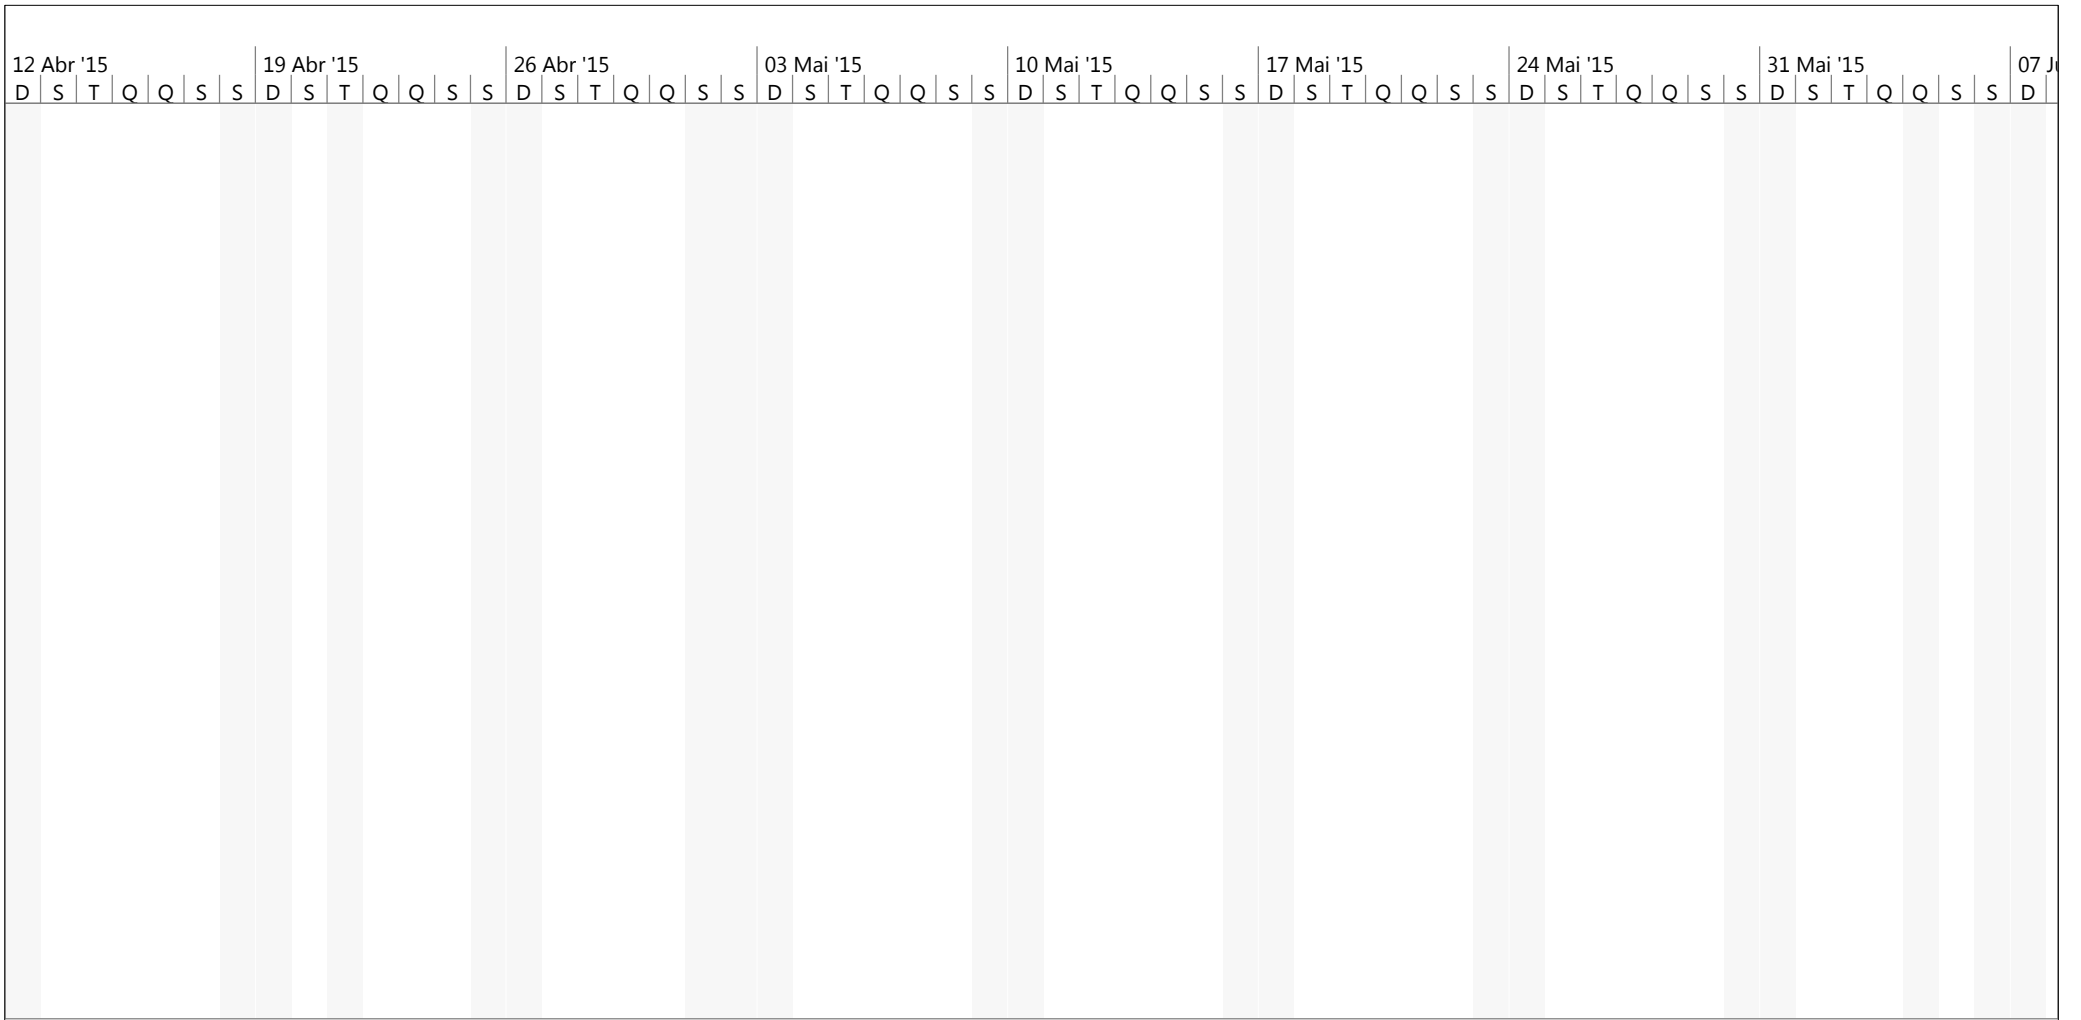

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

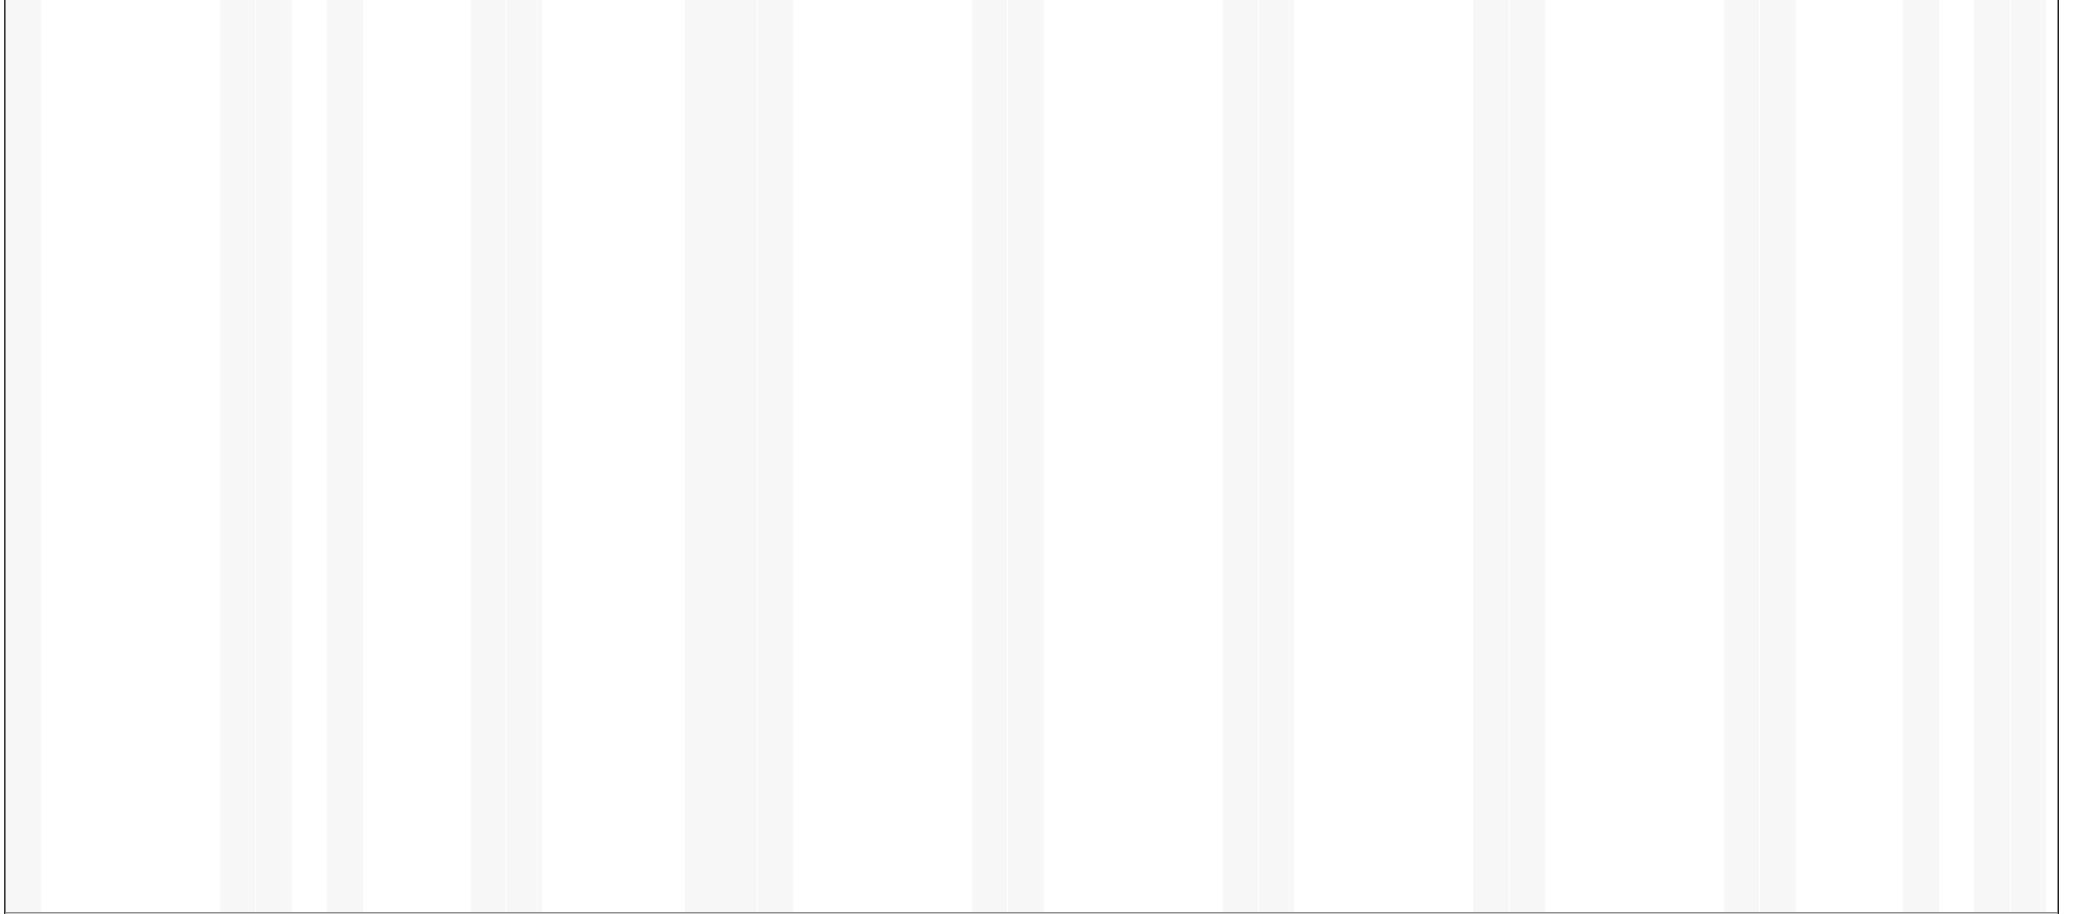

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

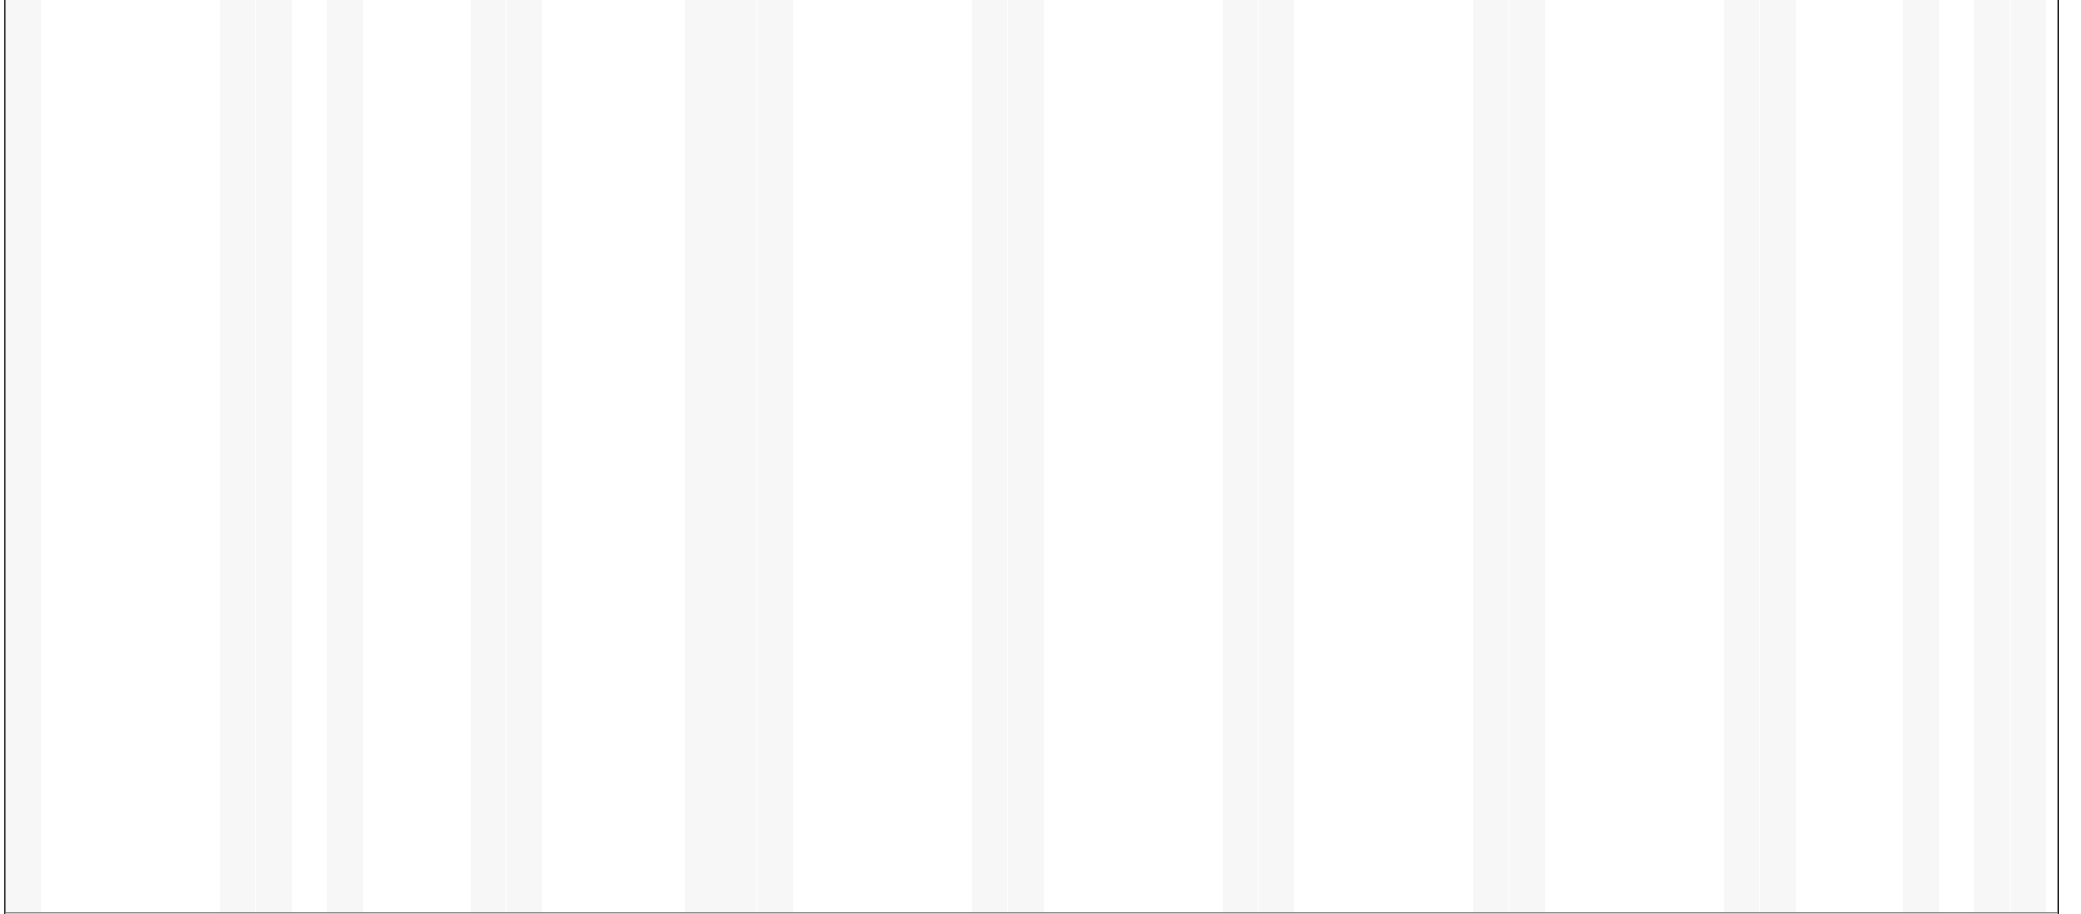


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

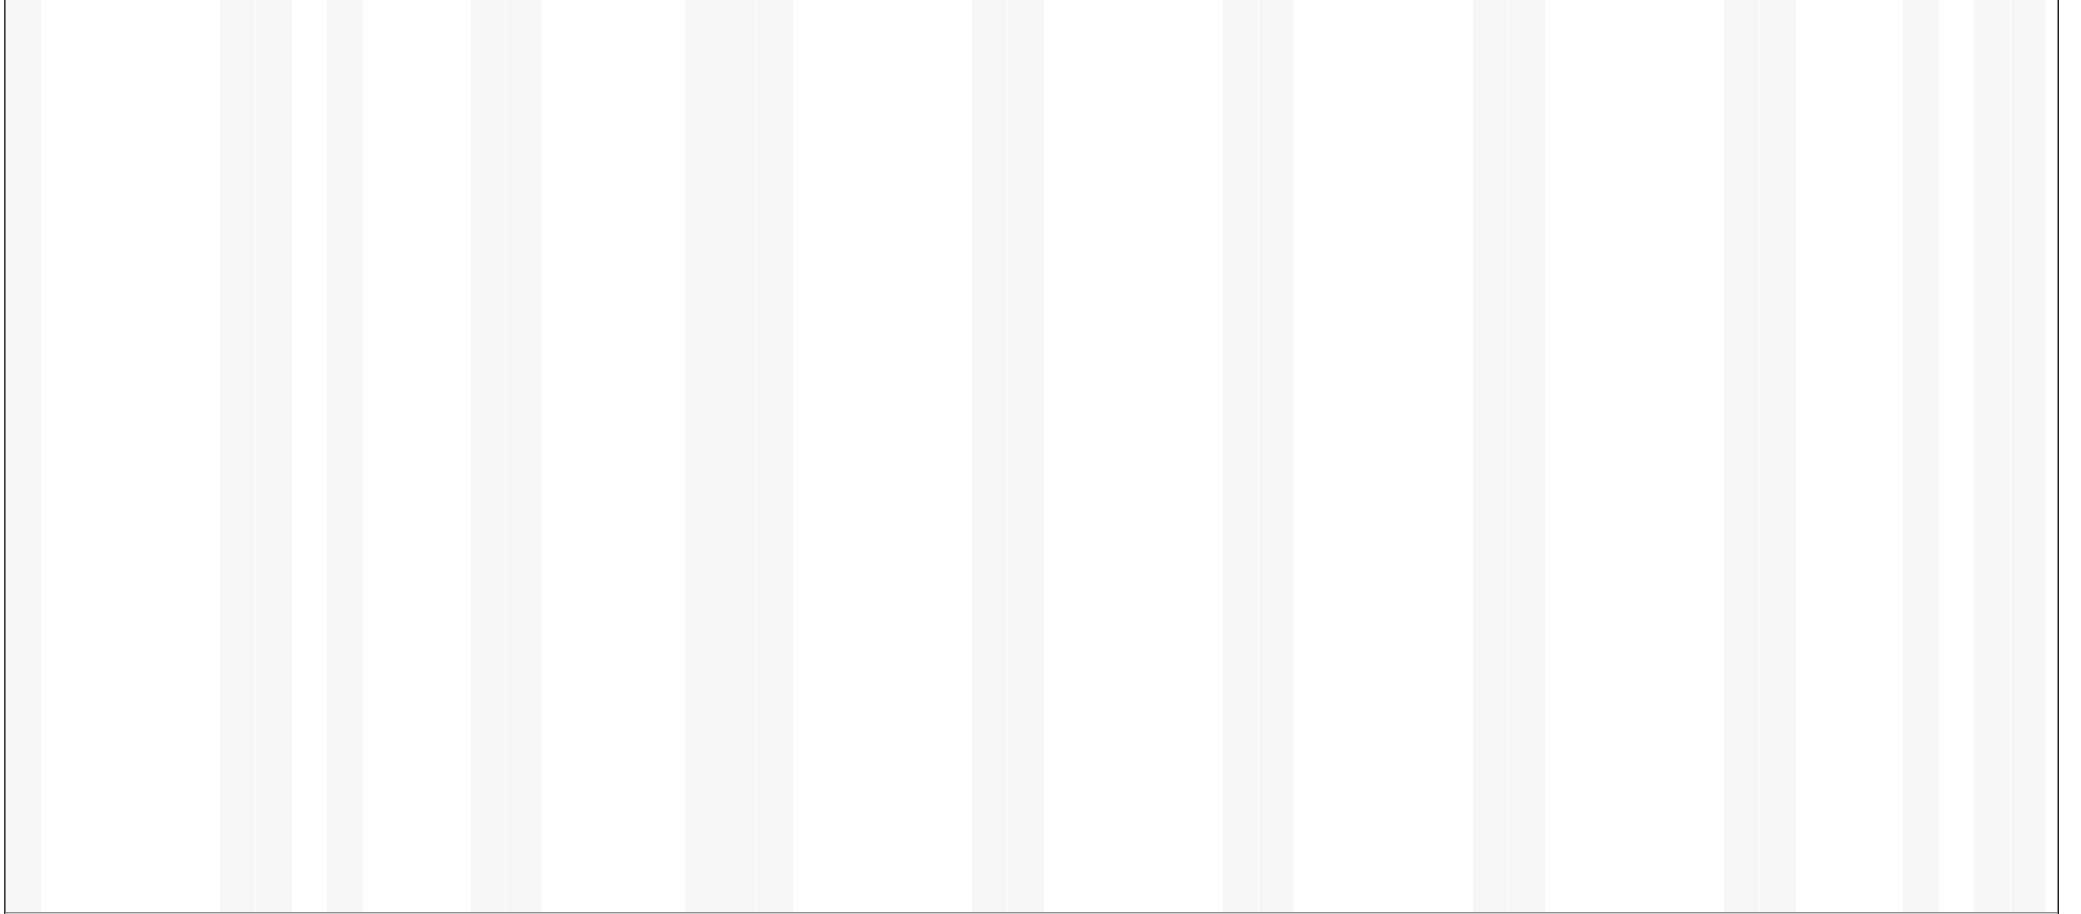

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

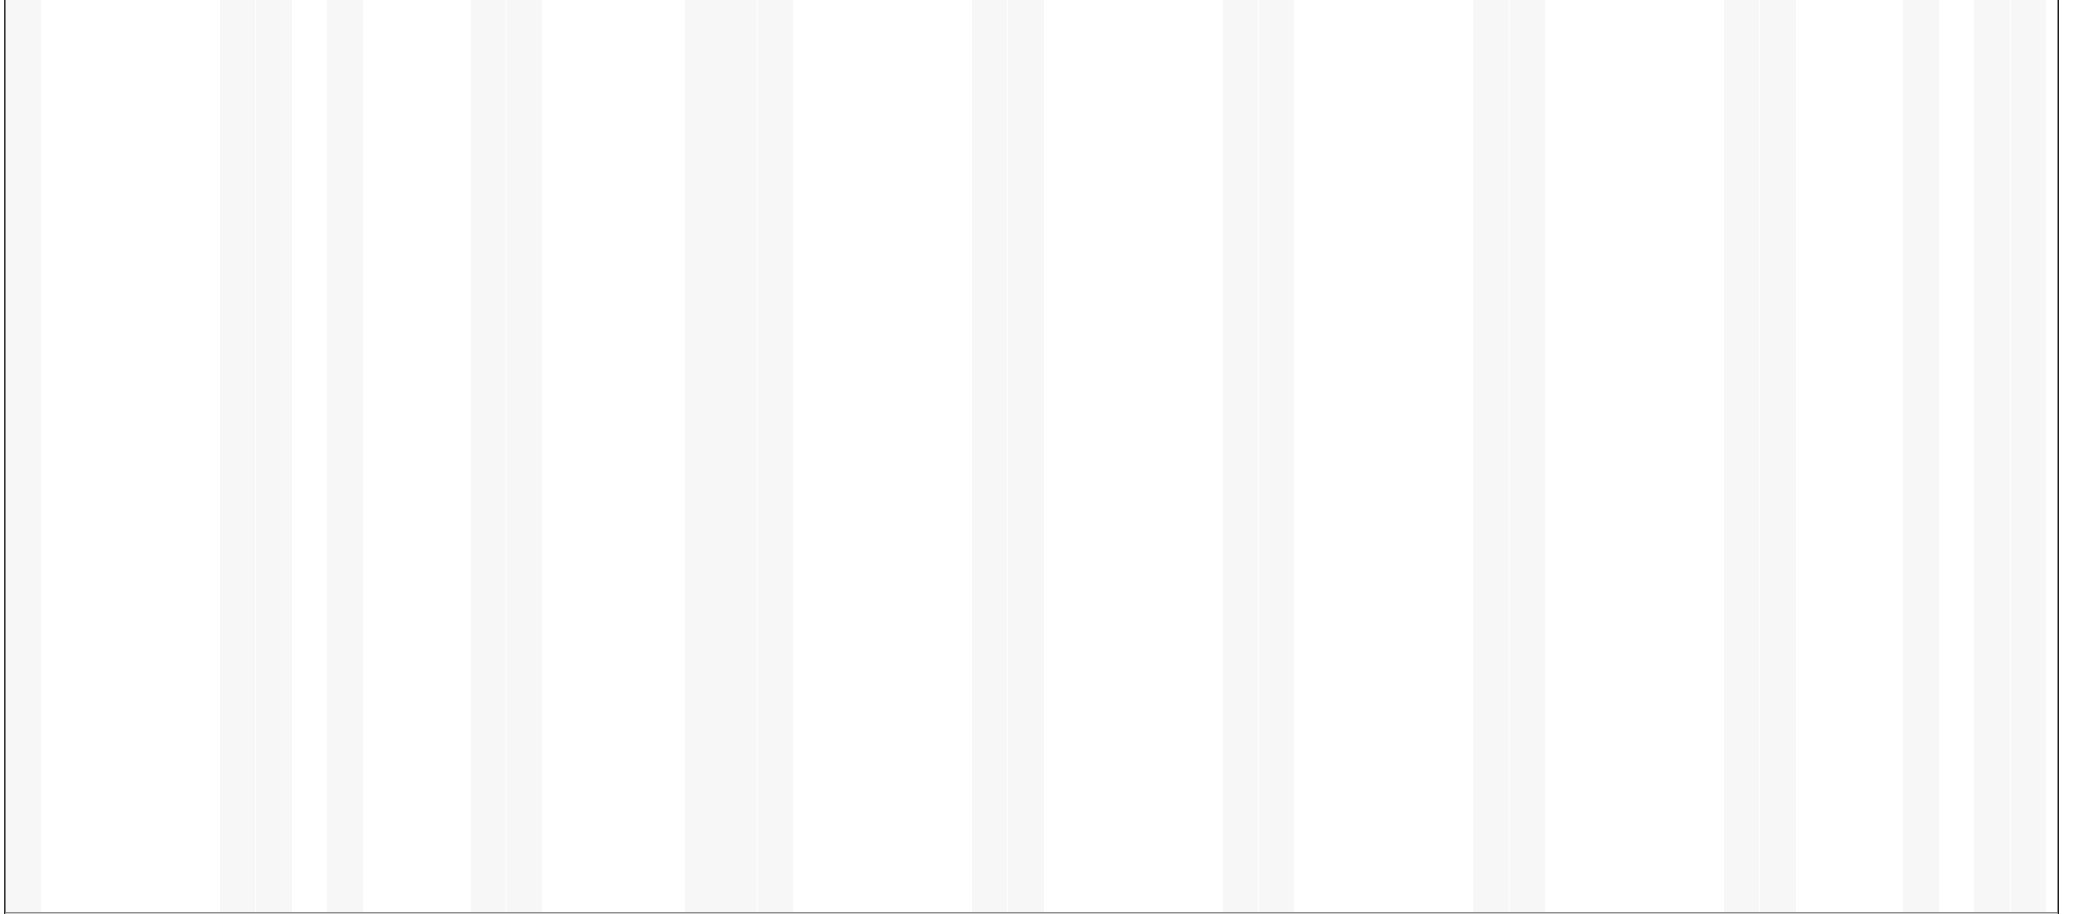

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

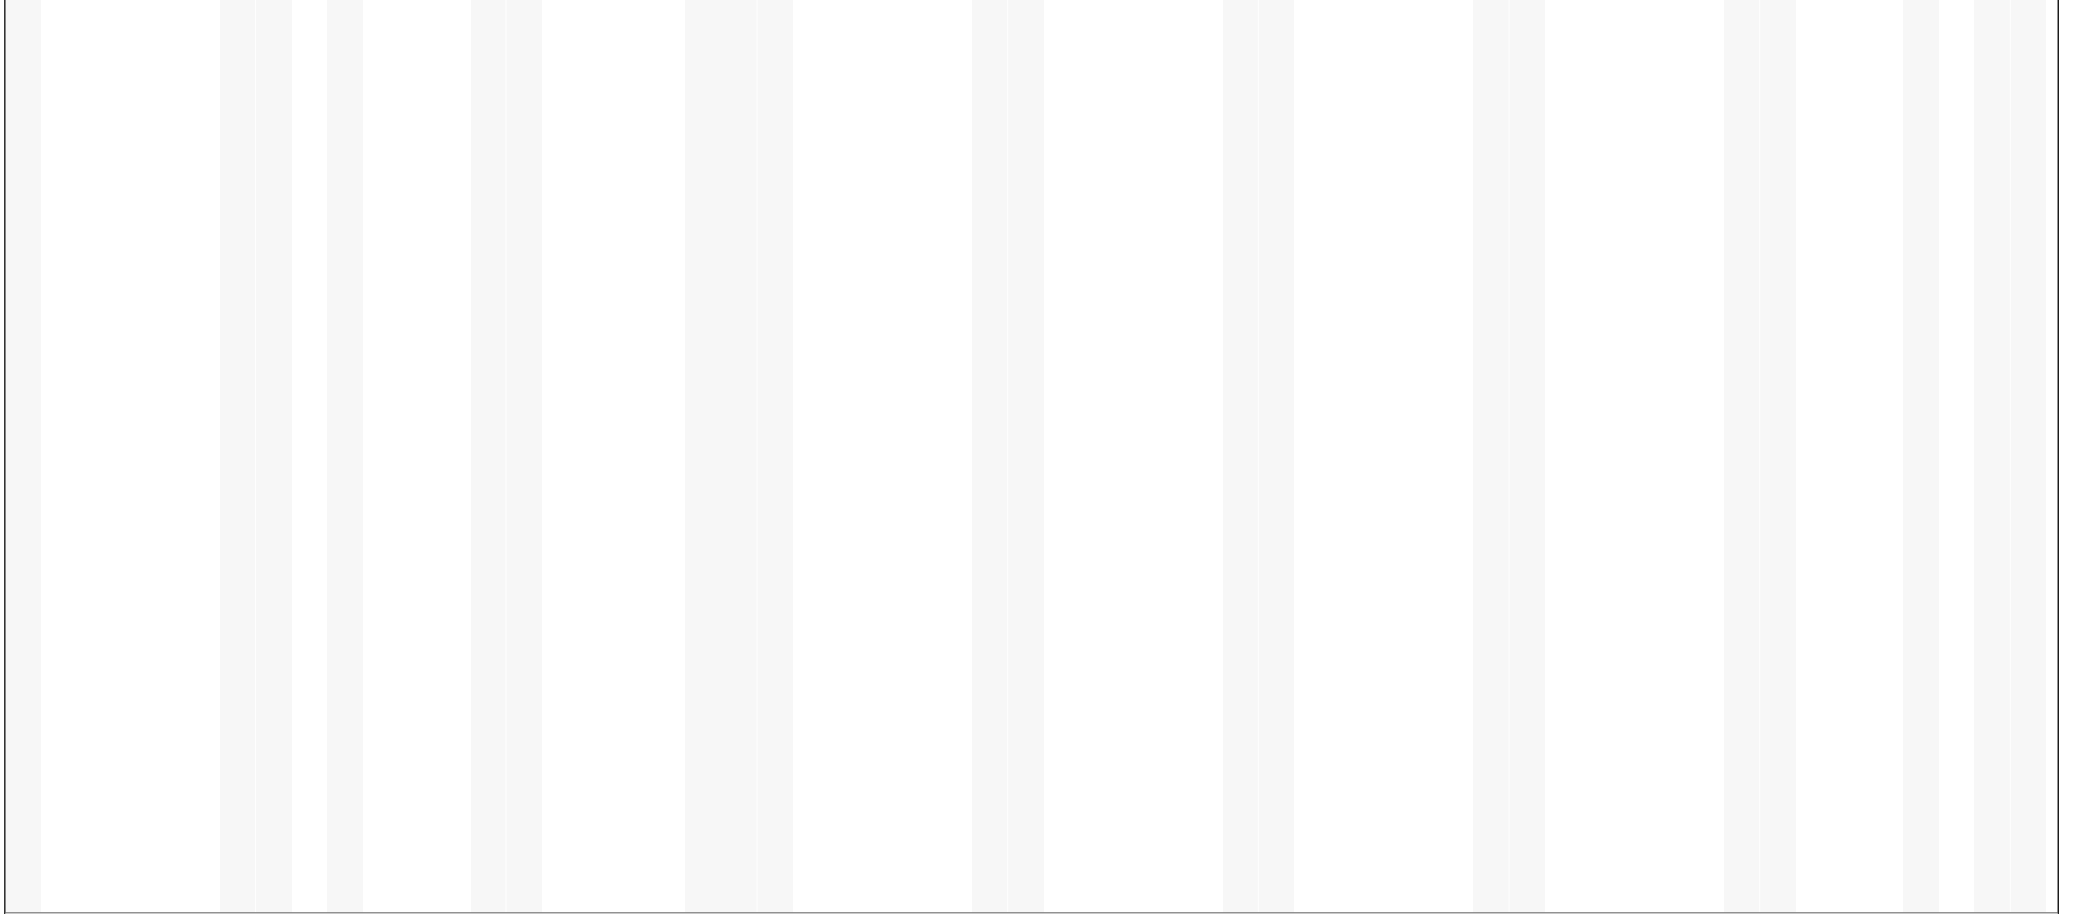


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

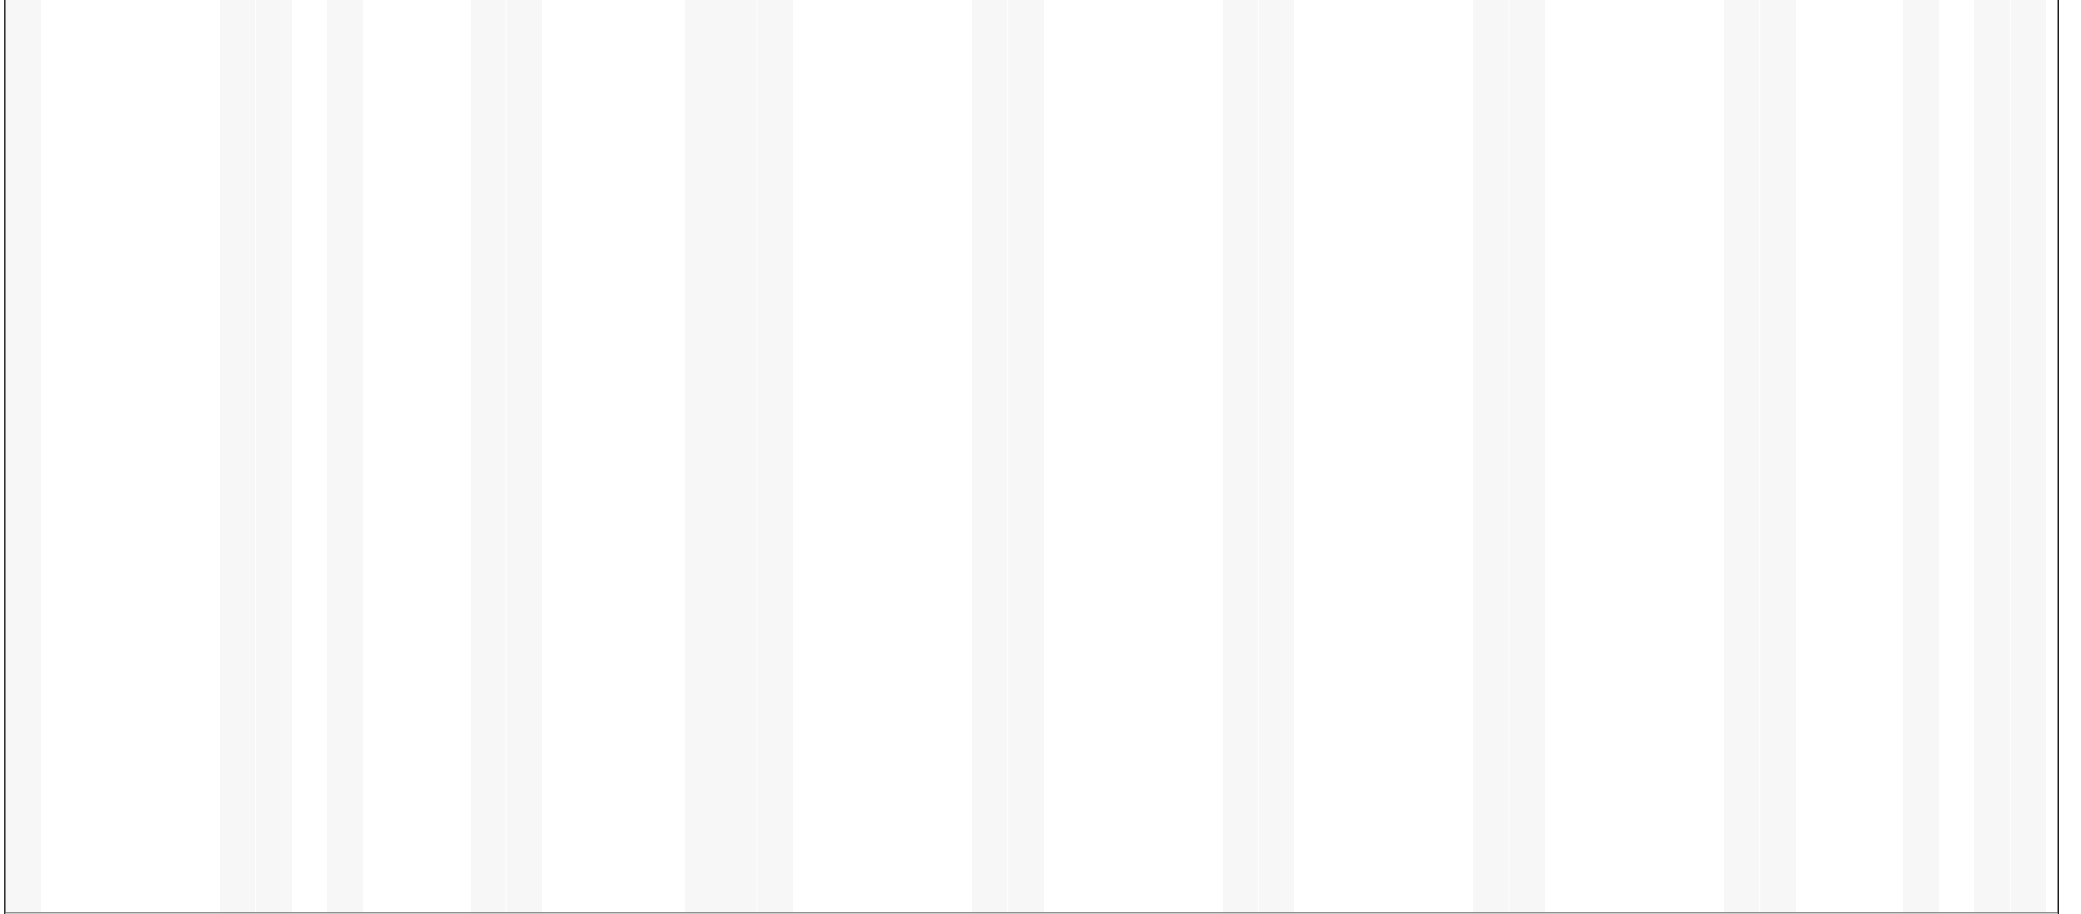


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

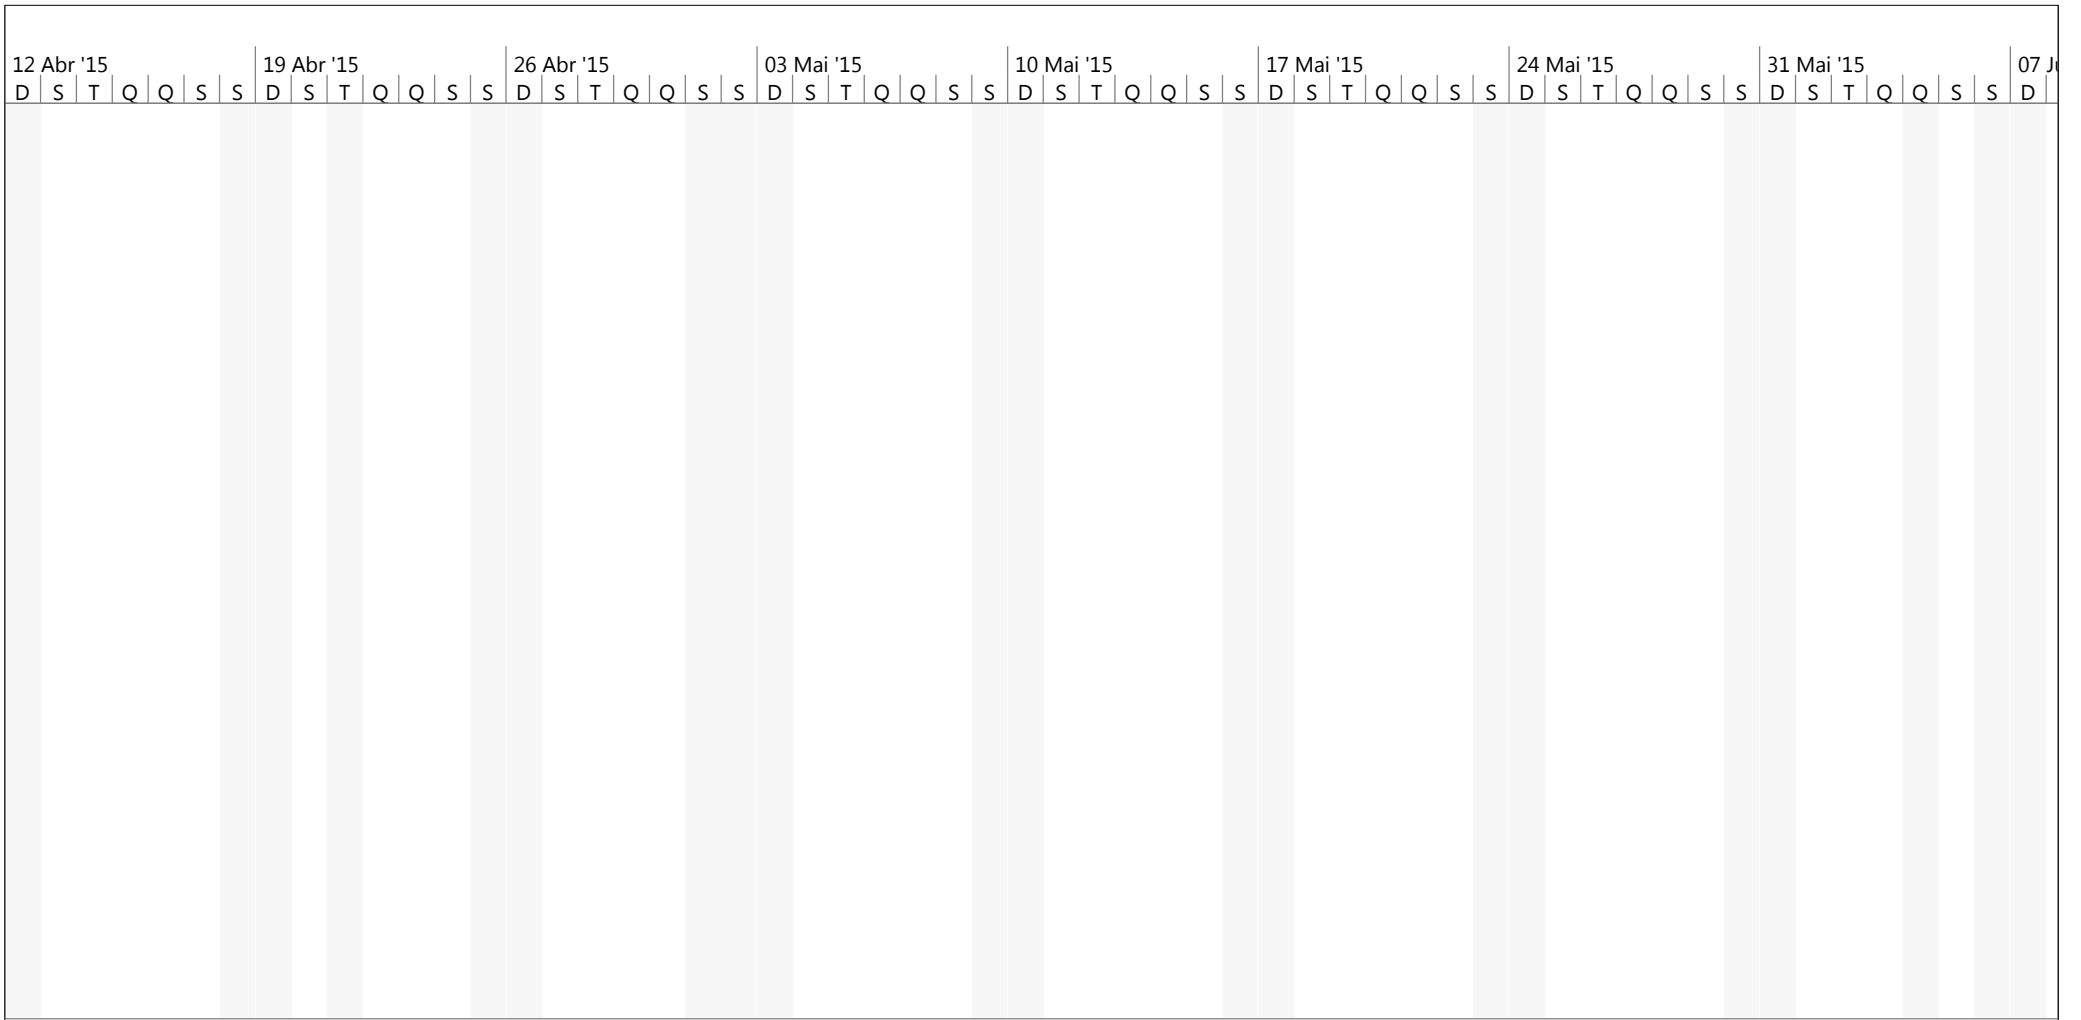

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

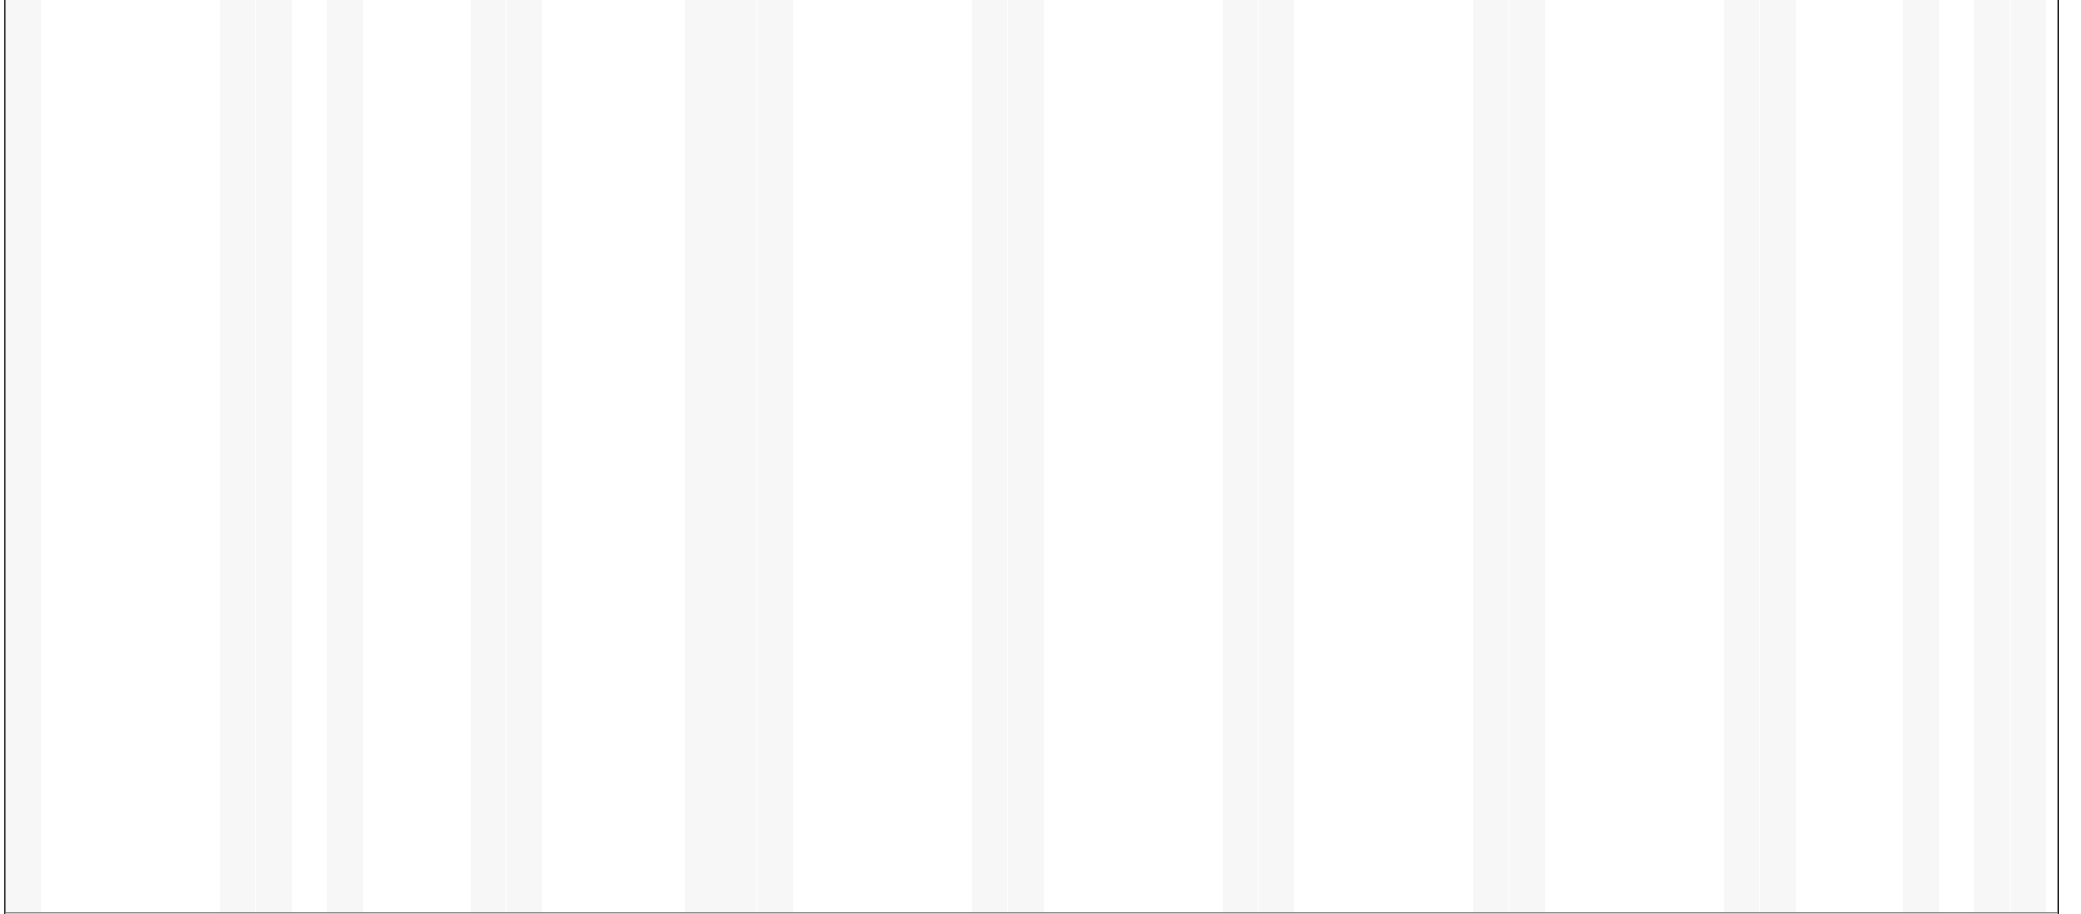

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

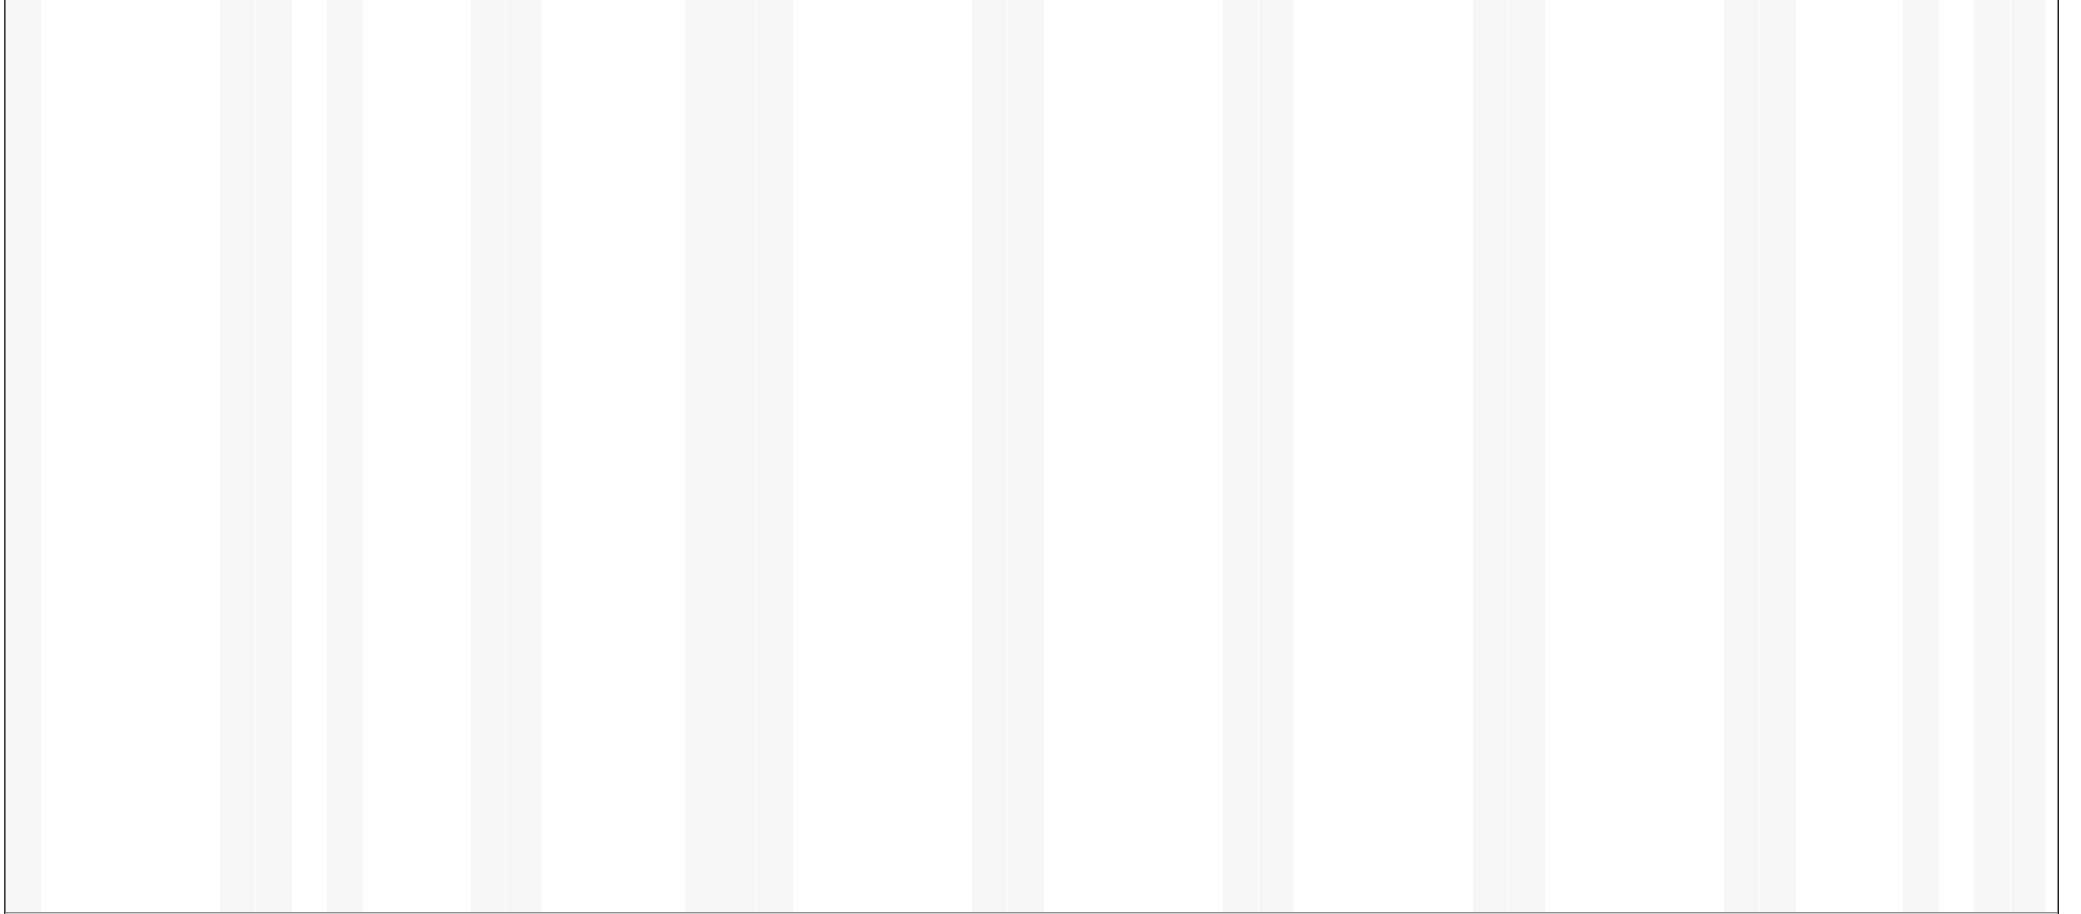

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

12 Abr '15 | 19 Abr '15 | 26 Abr '15 | 03 Mai '15 | 10 Mai '15 | 17 Mai '15 | 24 Mai '15 | 31 Mai '15 | 07 Jun '15



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Jun '15 14 Jun '15 21 Jun '15 28 Jun '15 05 Jul '15 12 Jul '15 19 Jul '15 26 Jul '15 02 Ago


S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S




...

Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

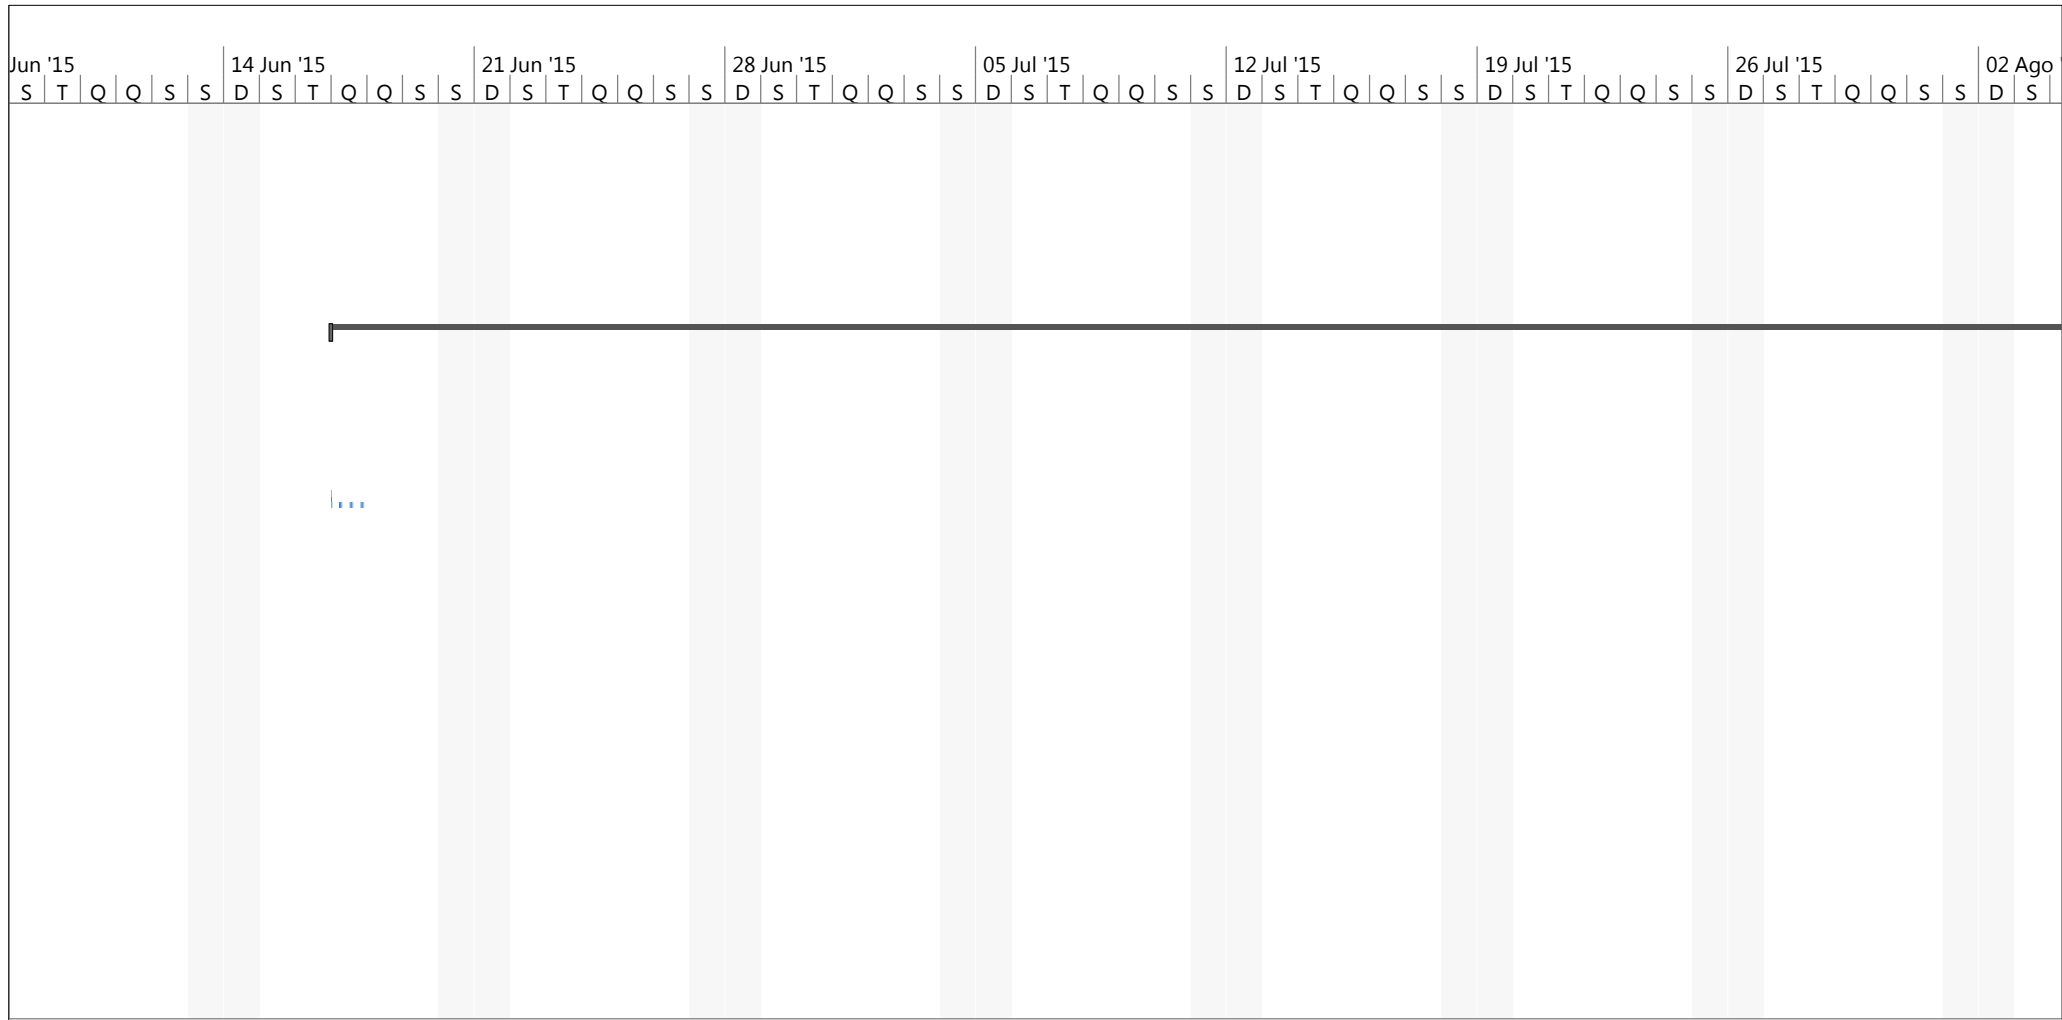


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

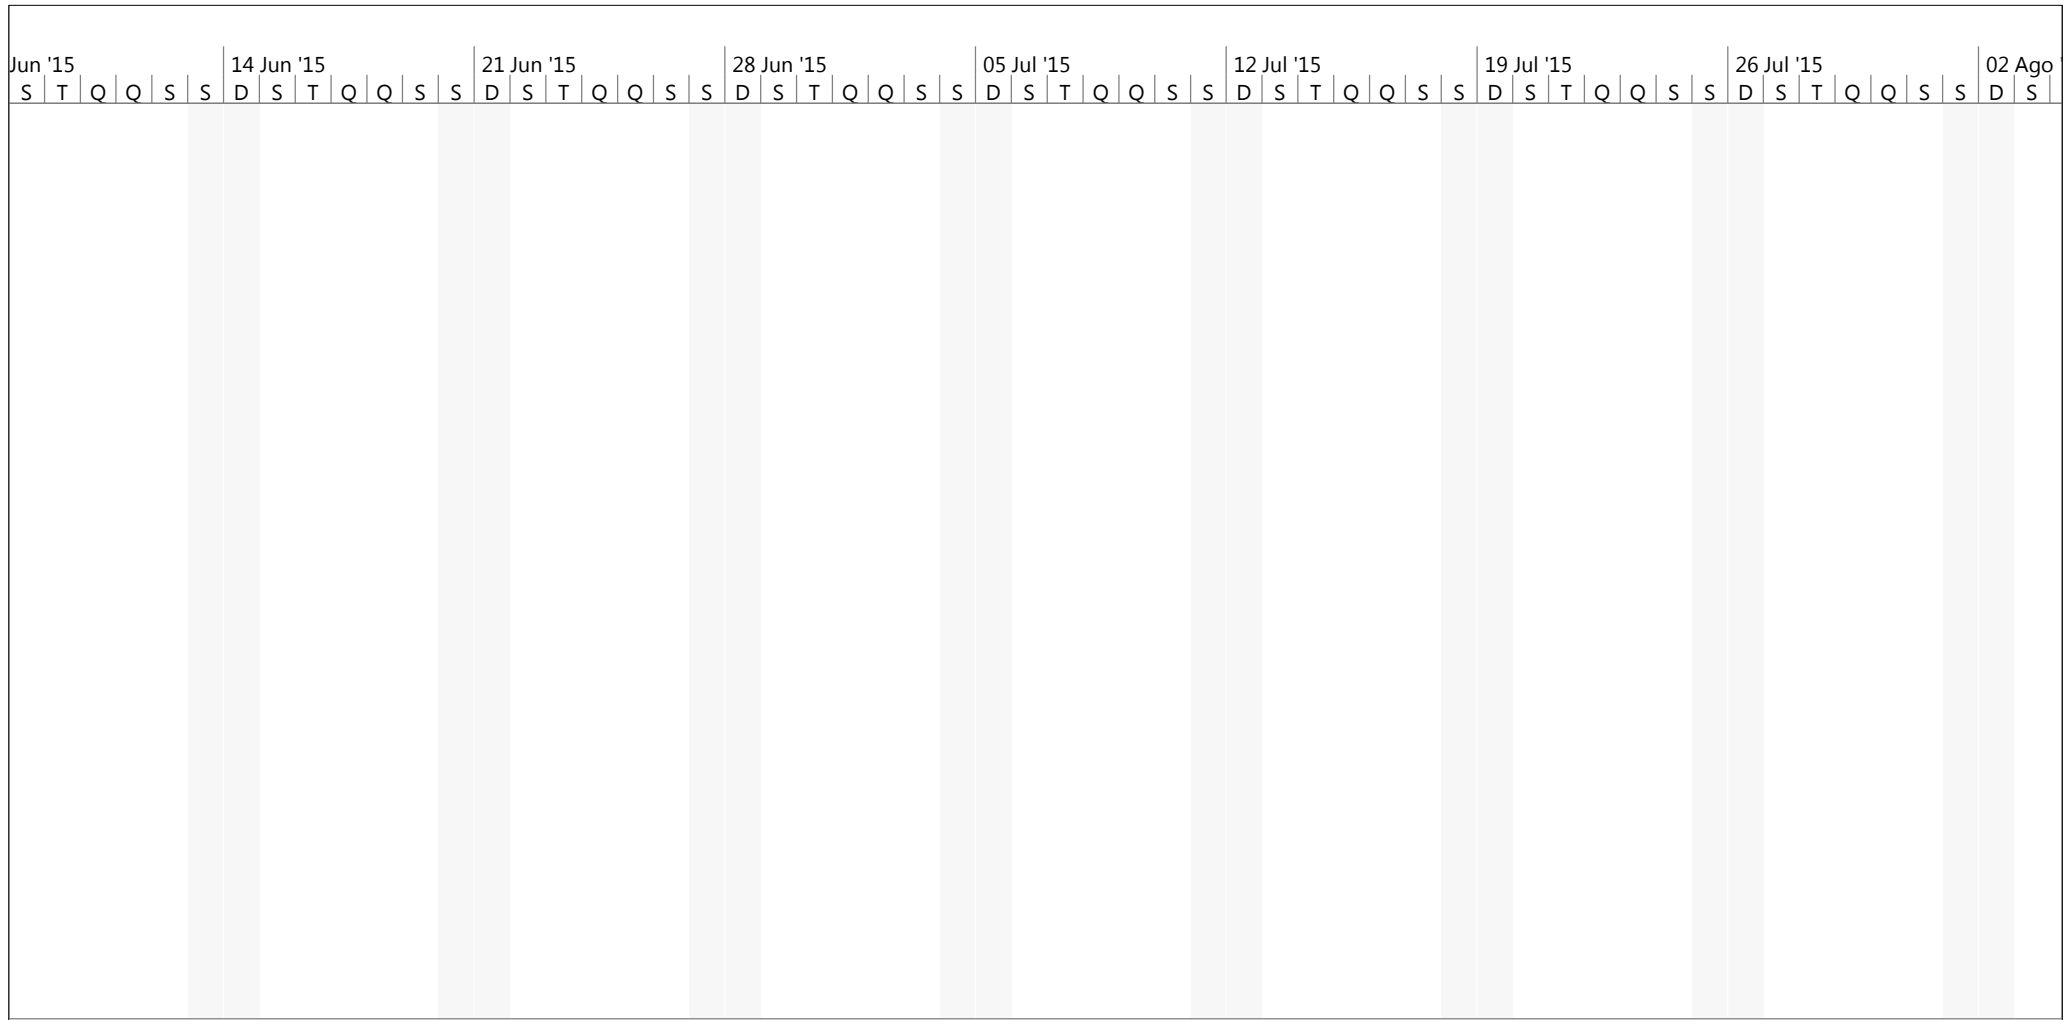

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

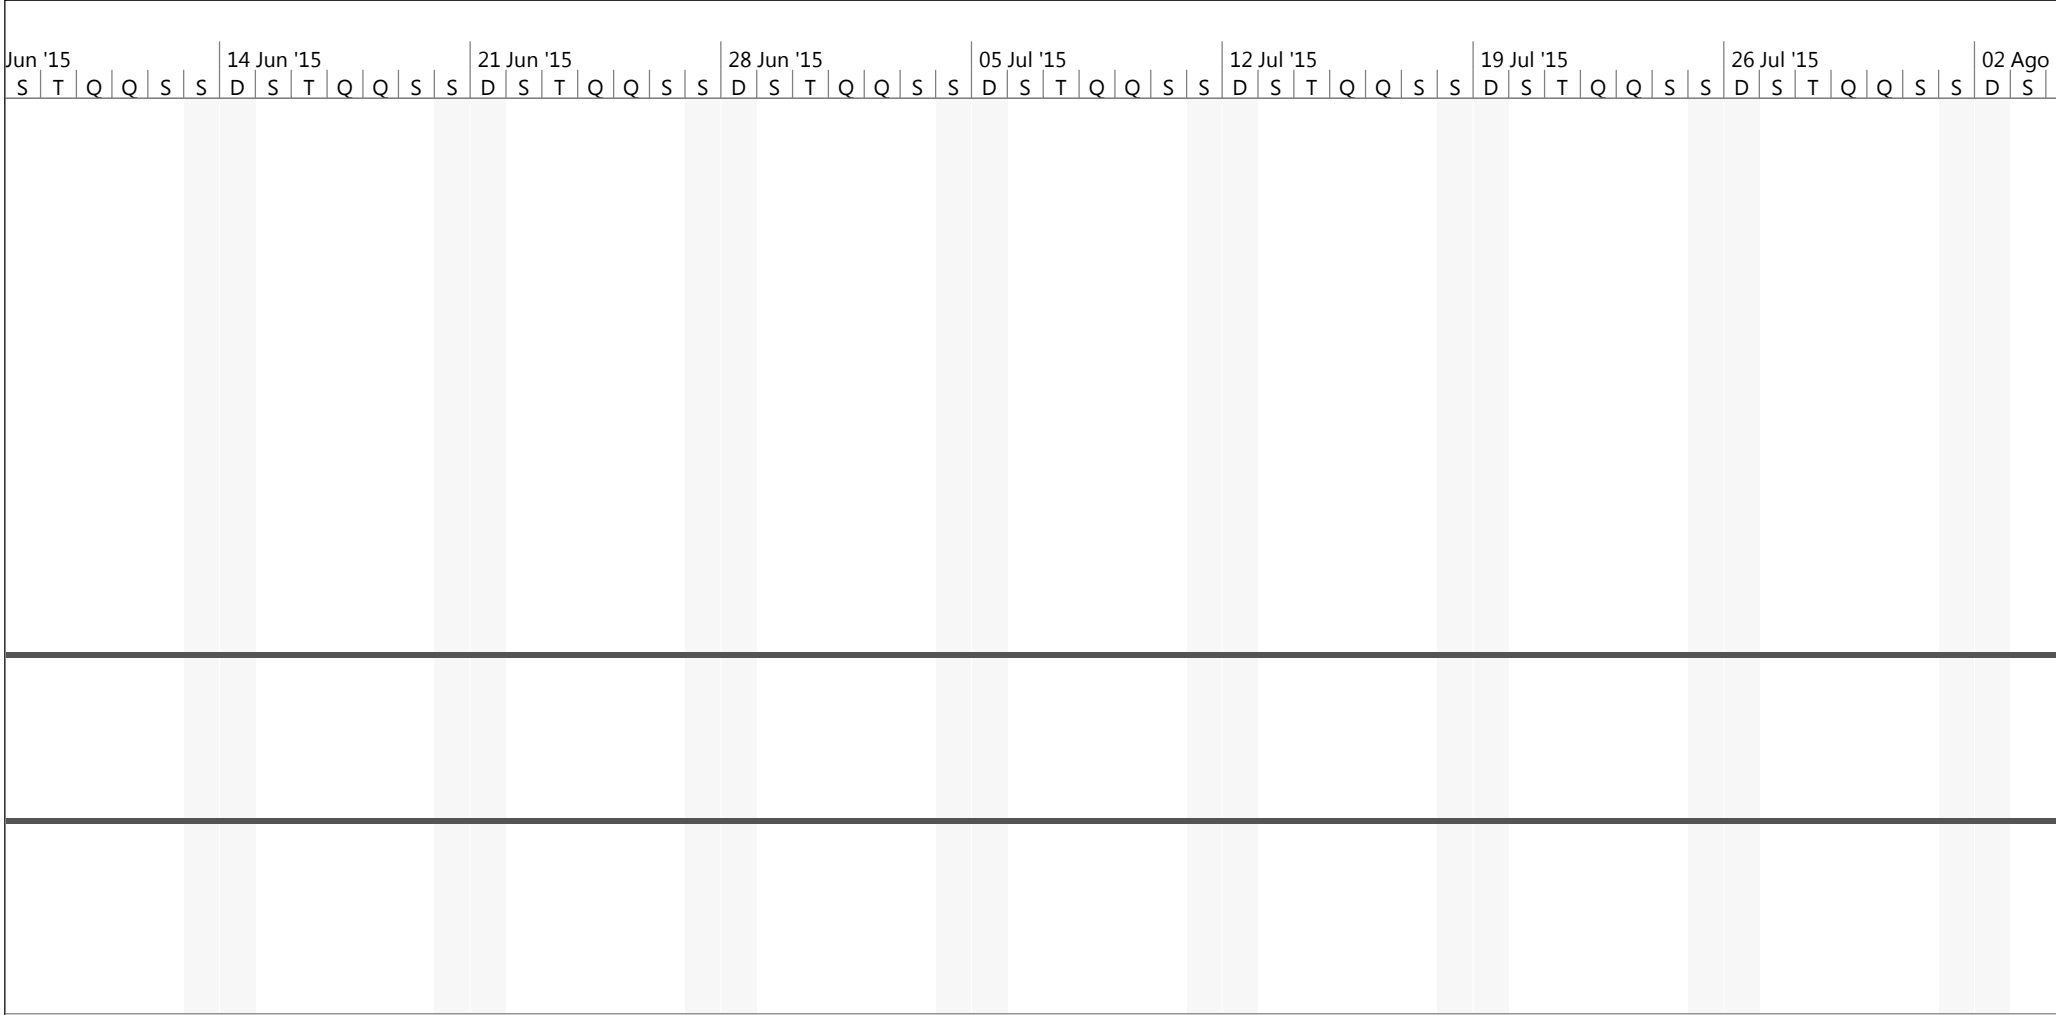


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

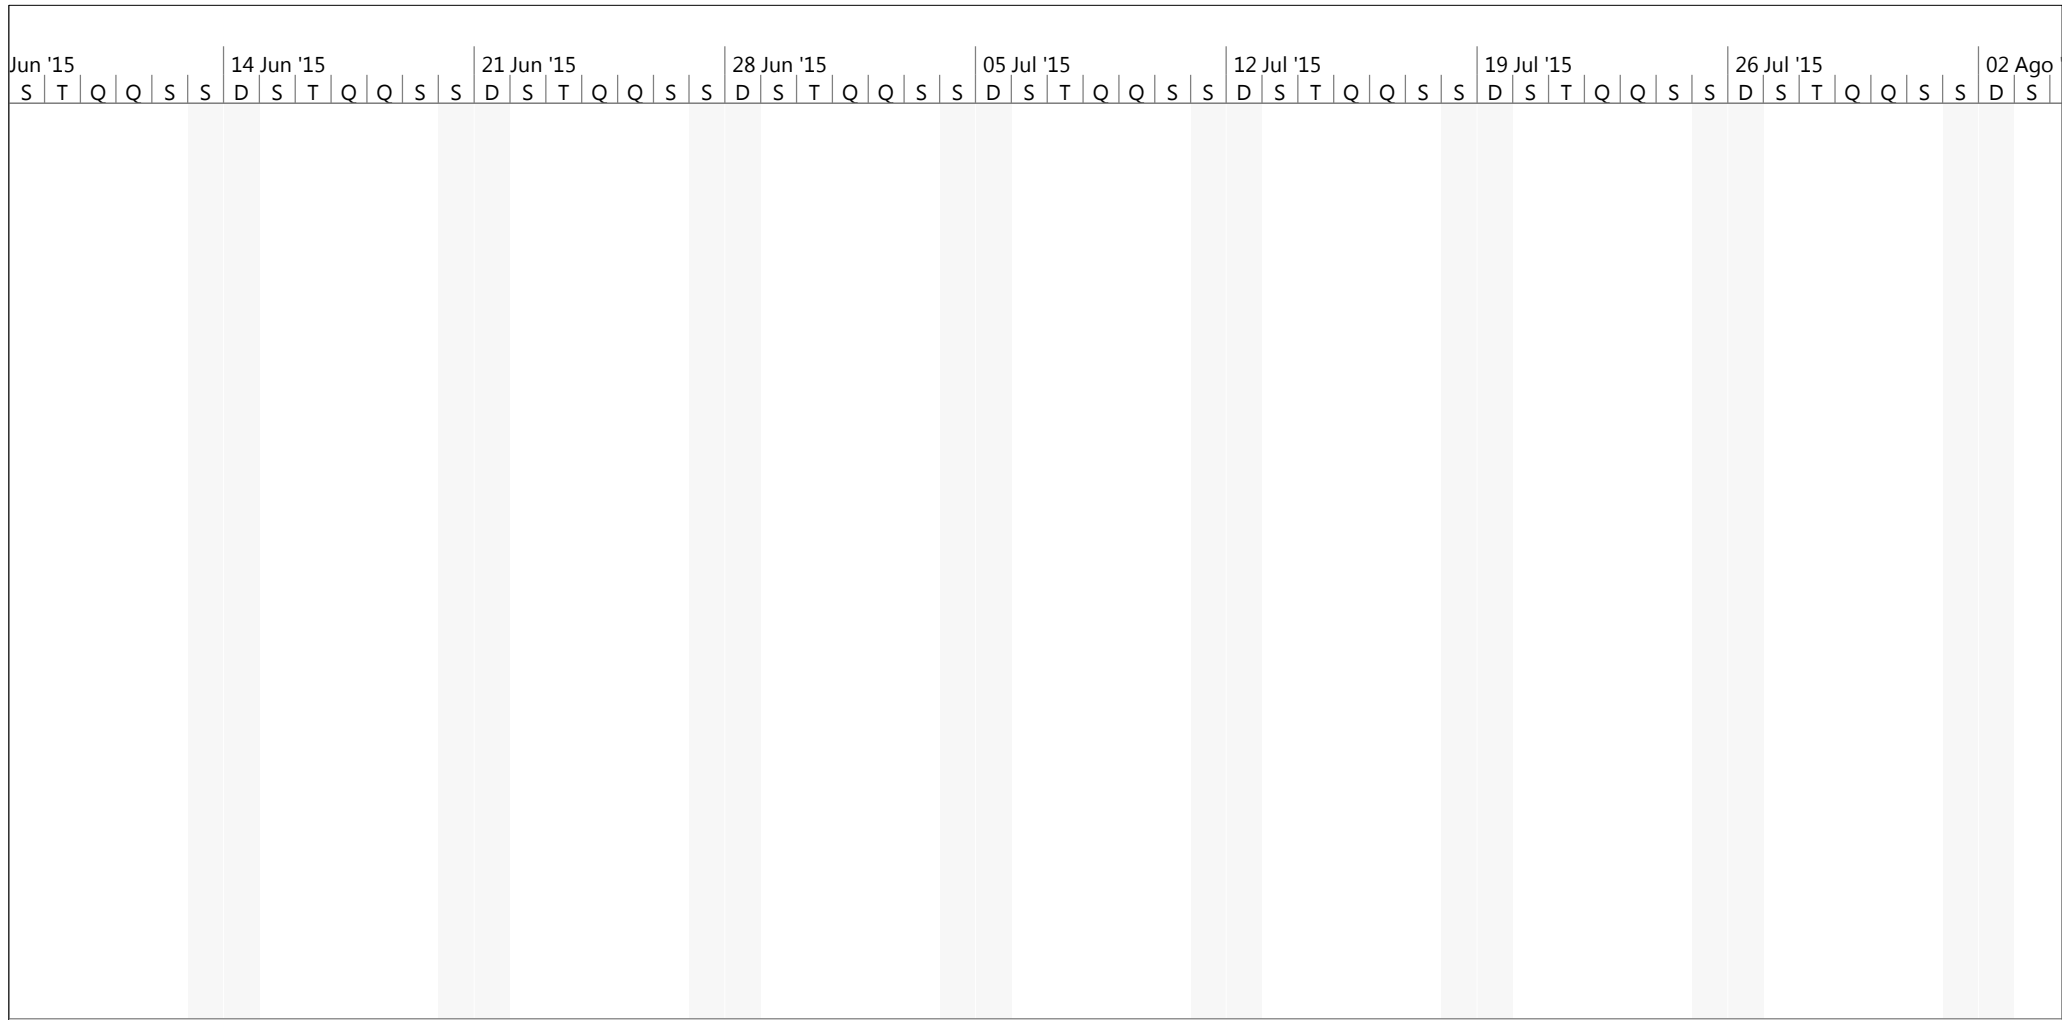


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

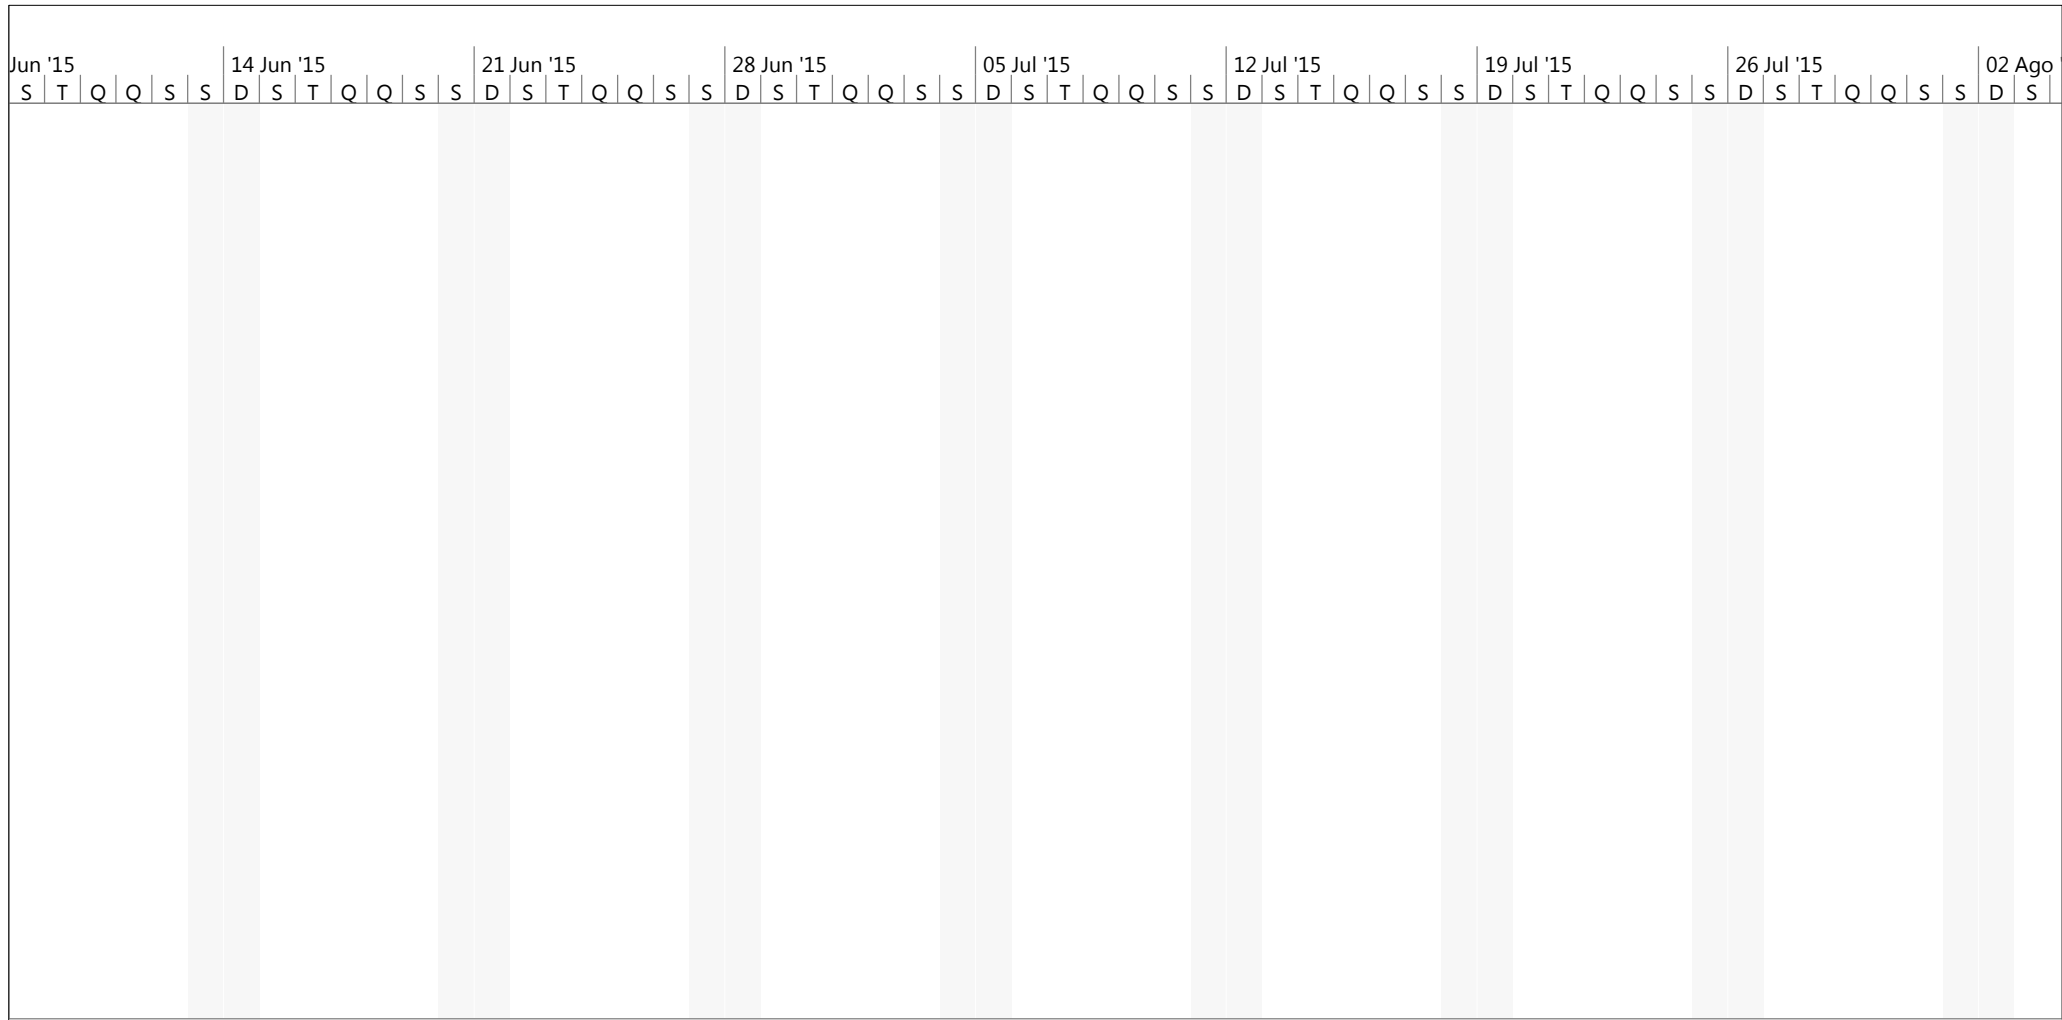


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

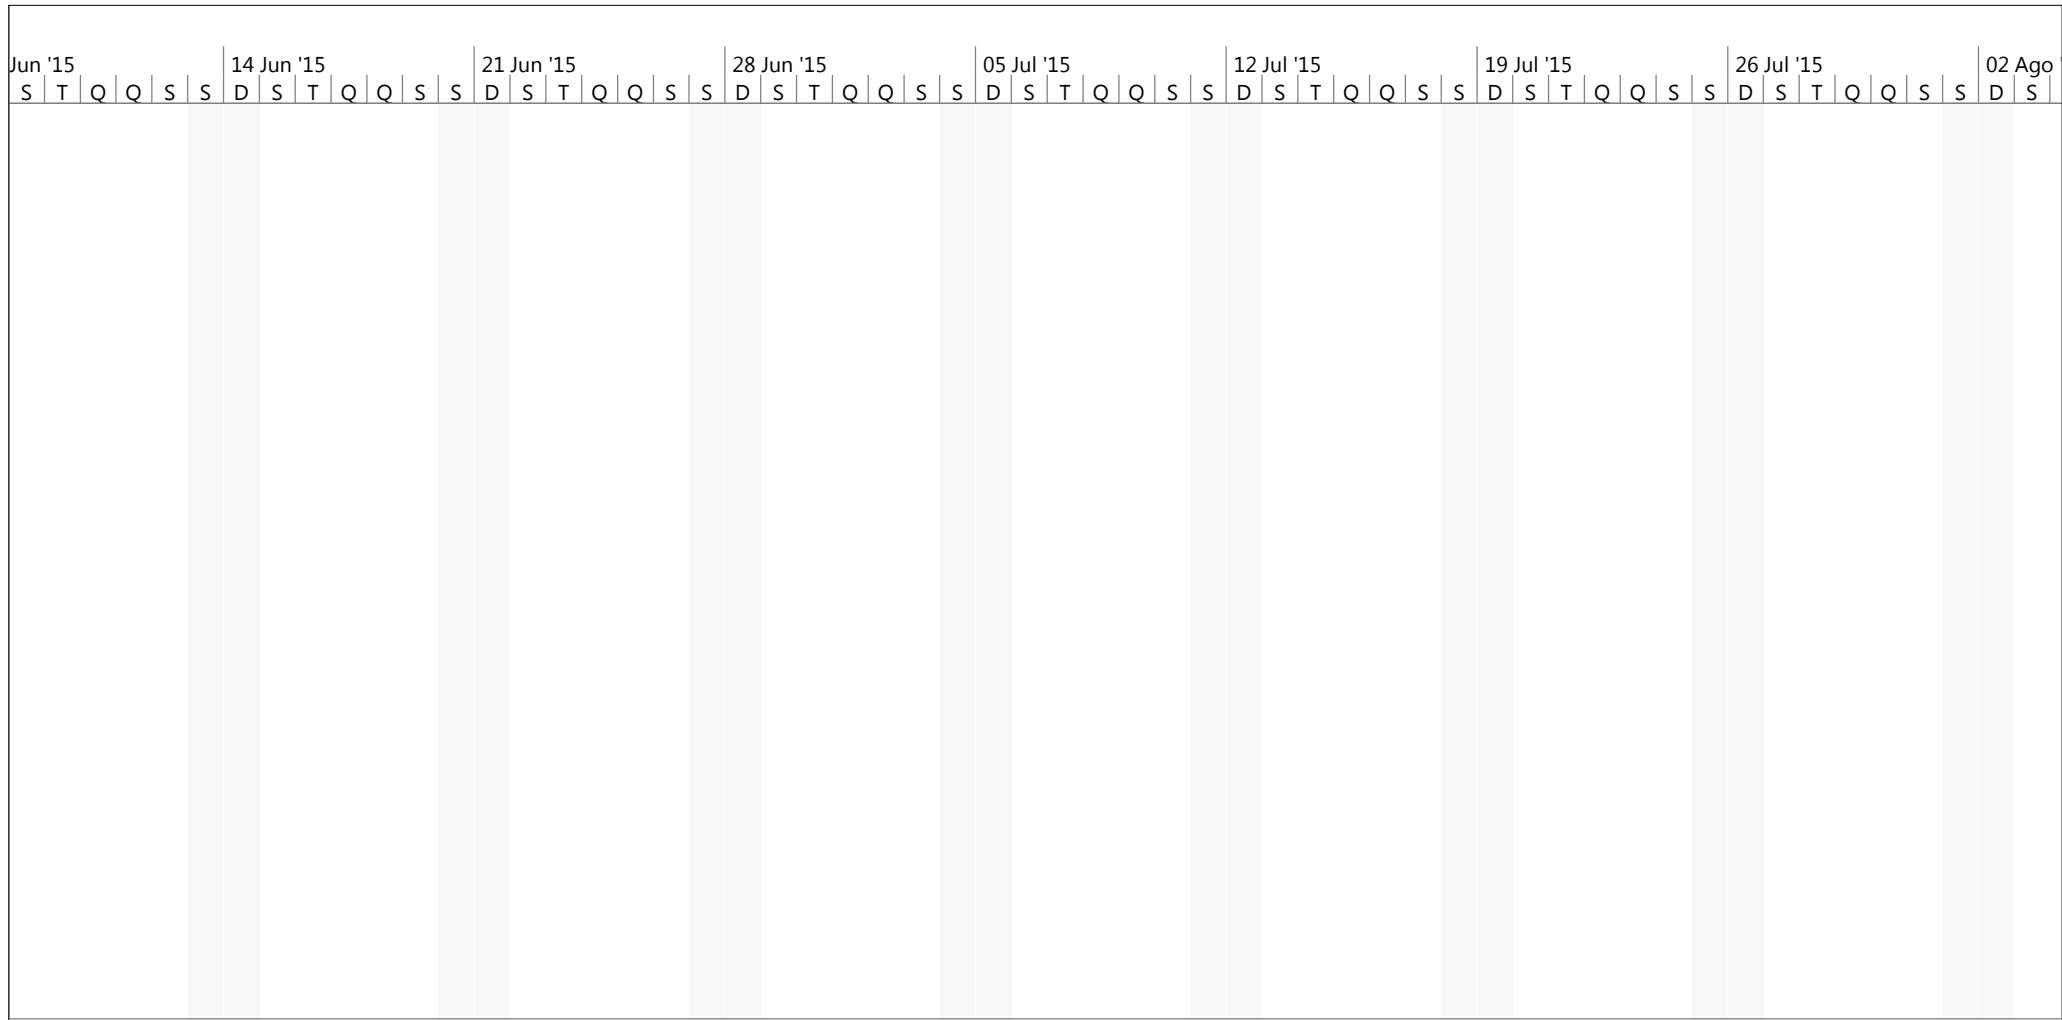


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

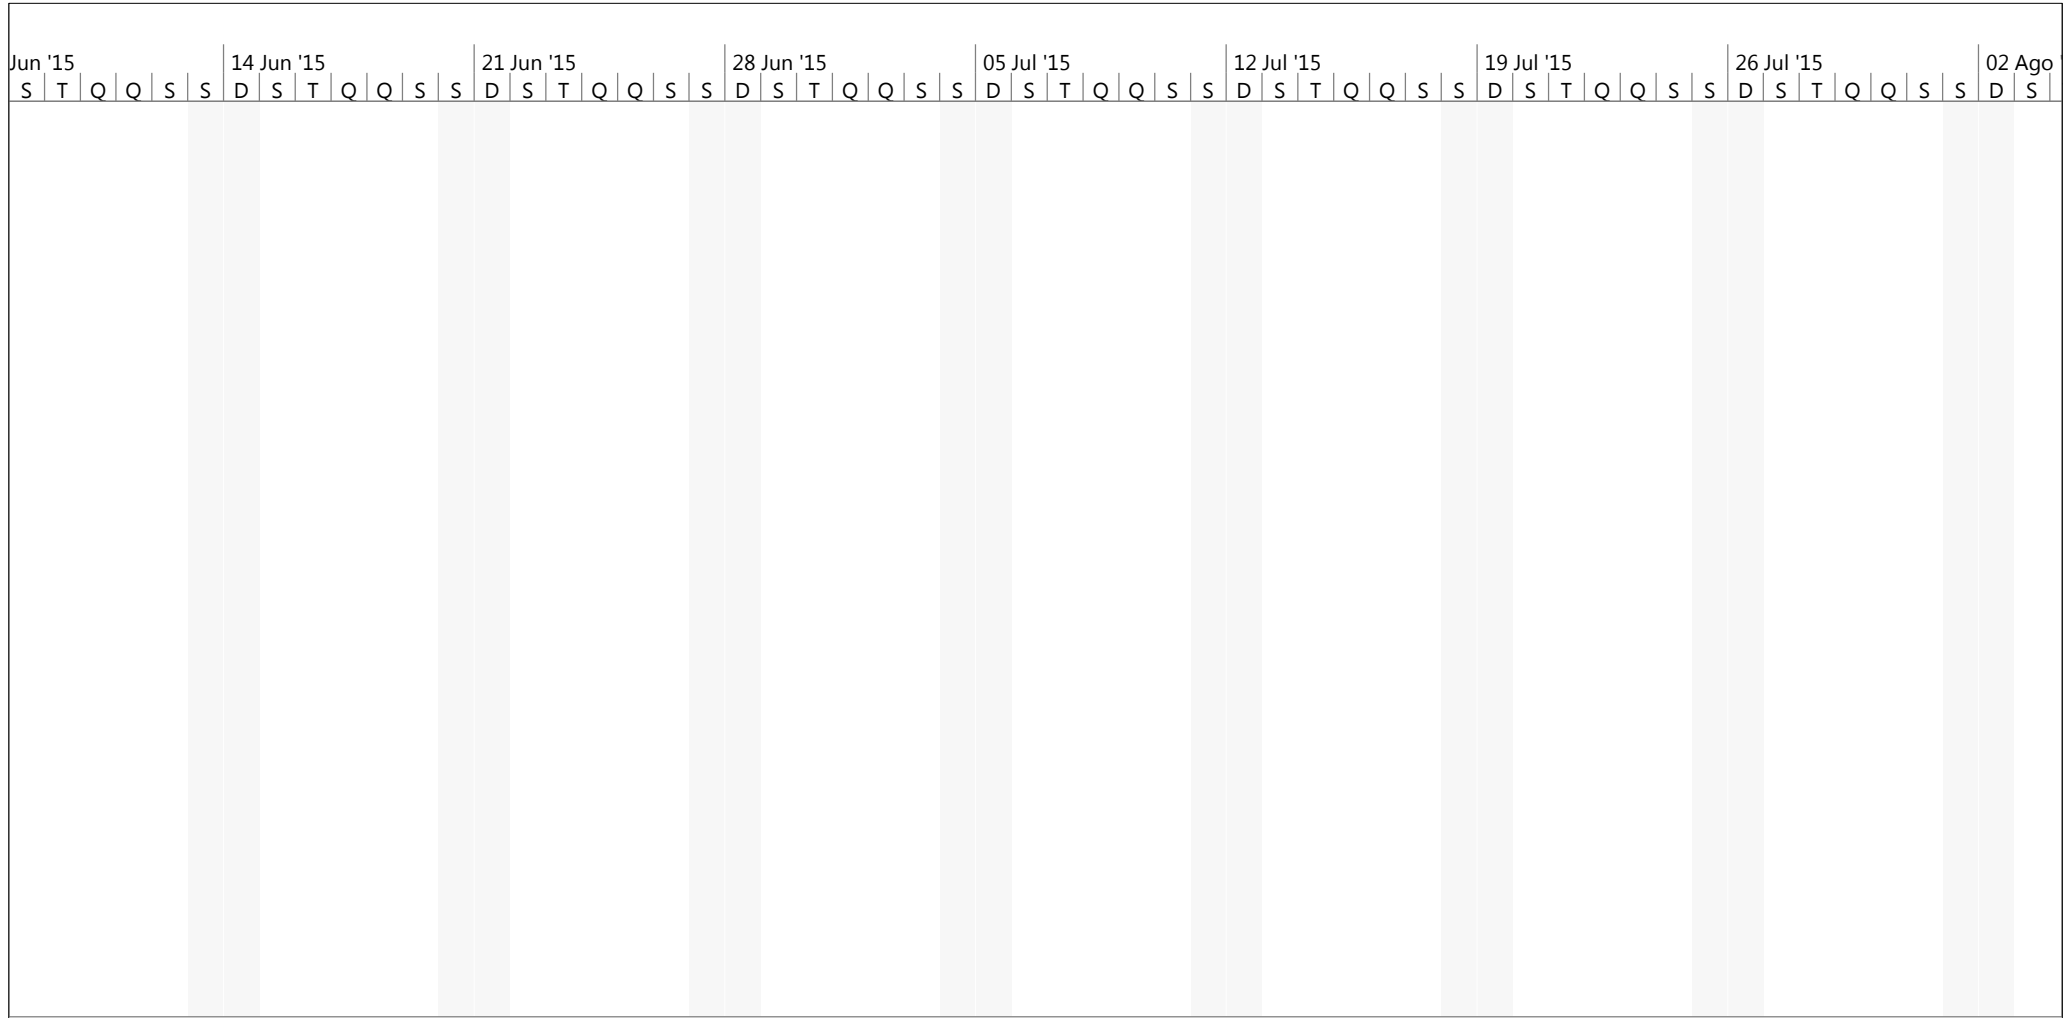


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

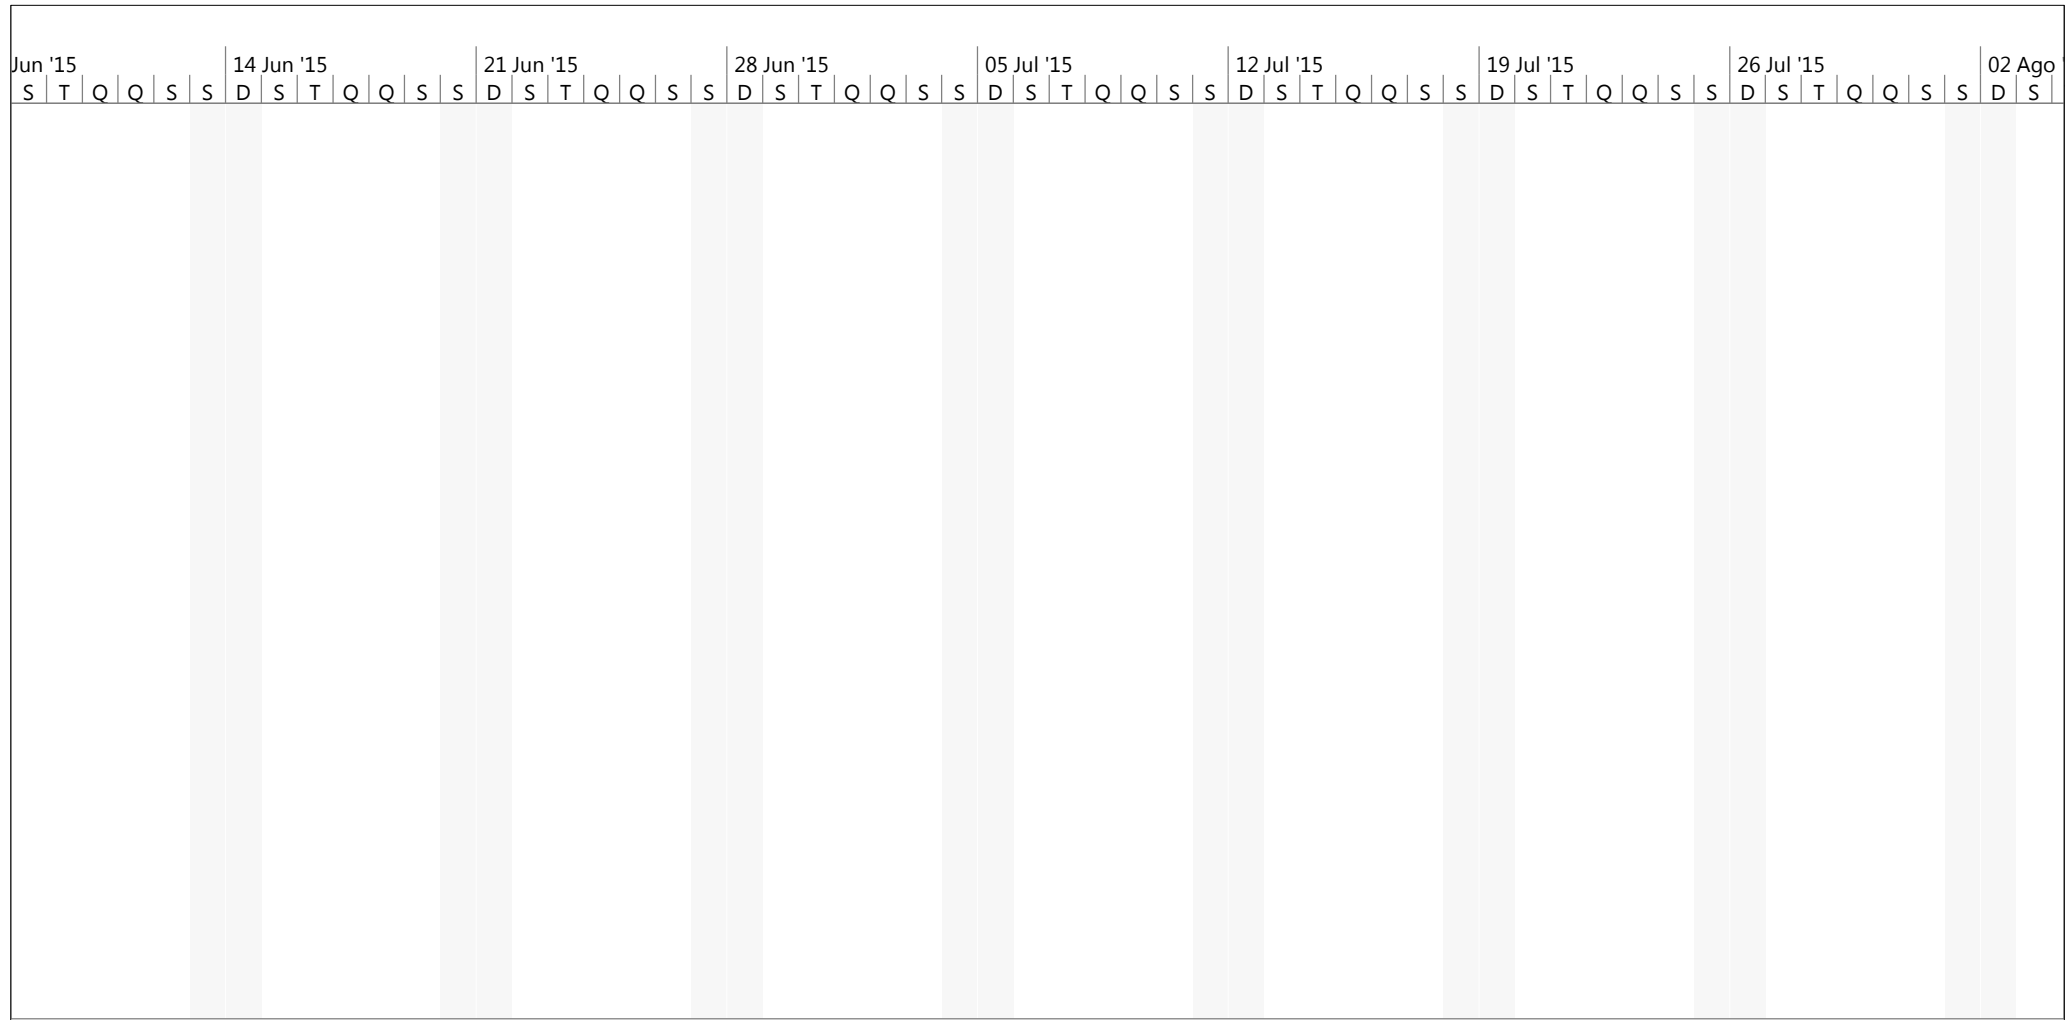


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

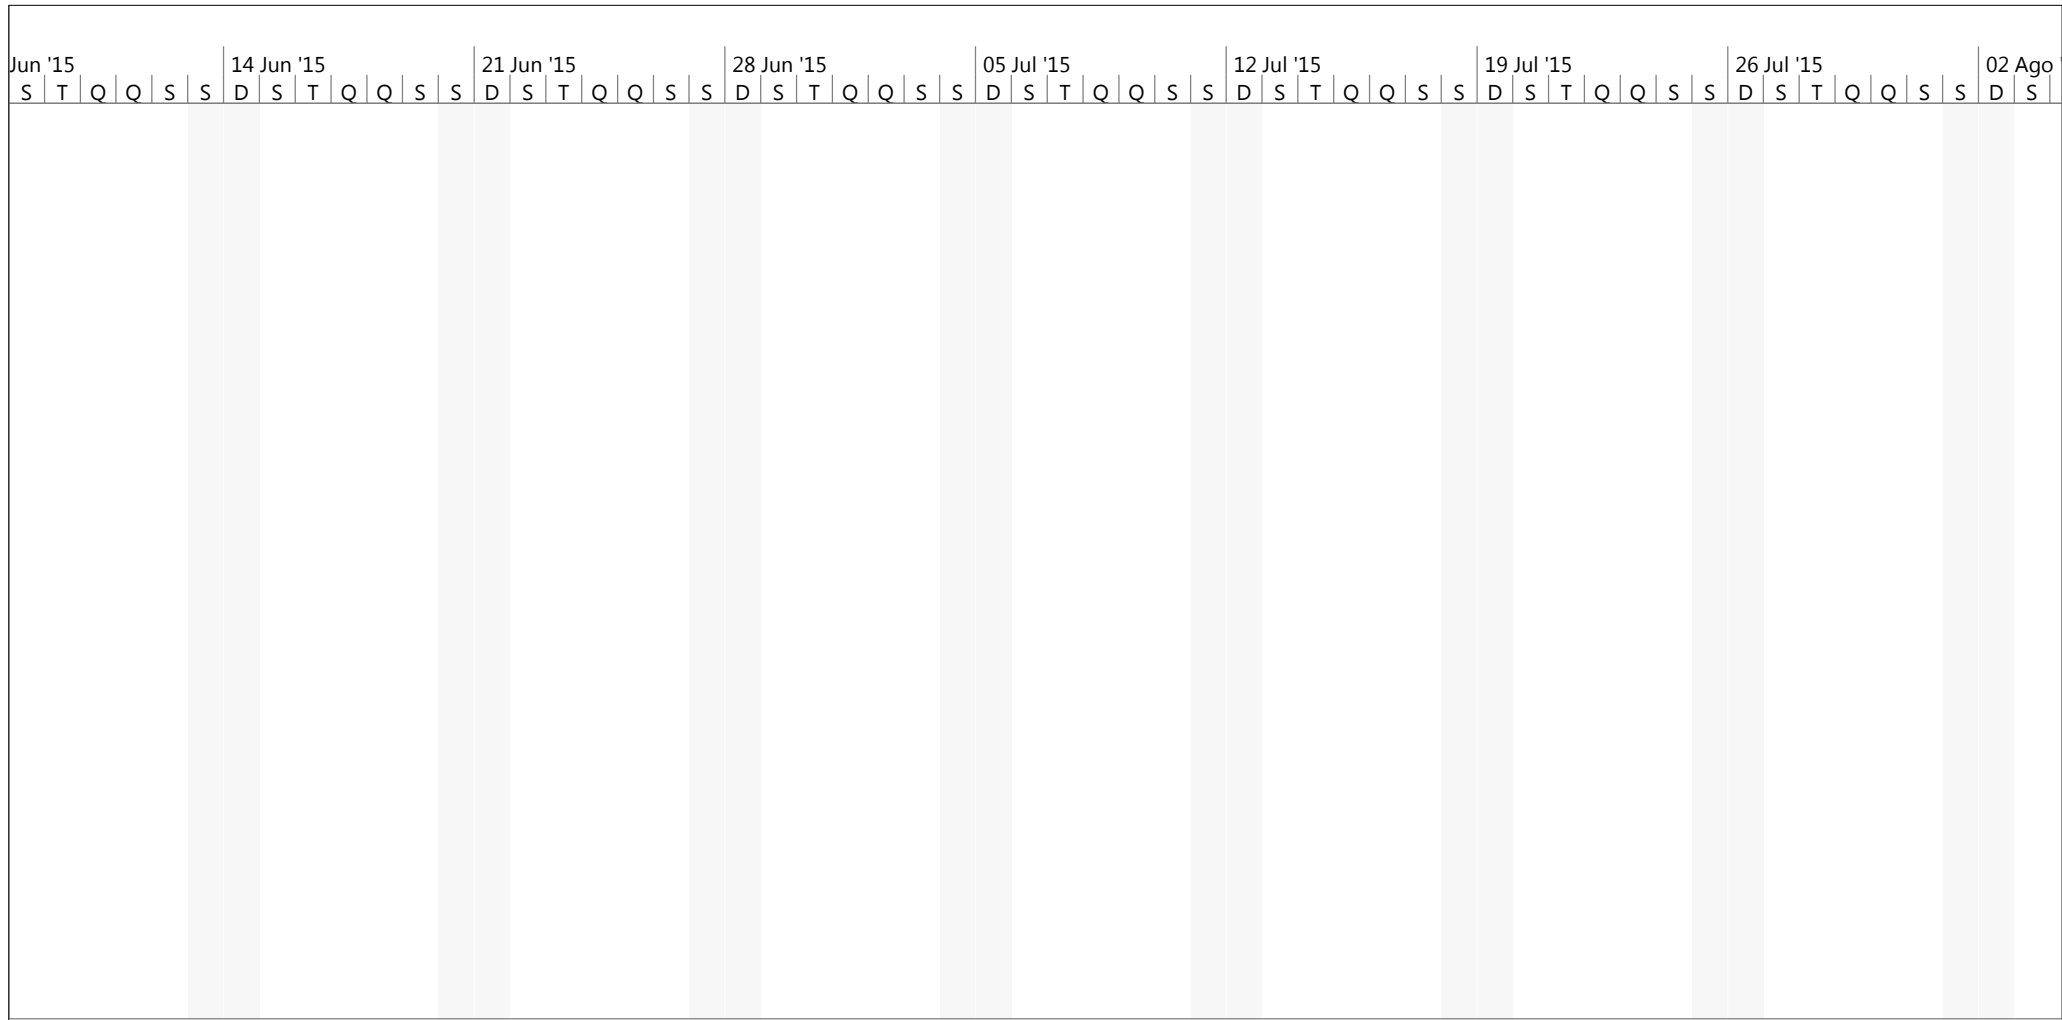


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

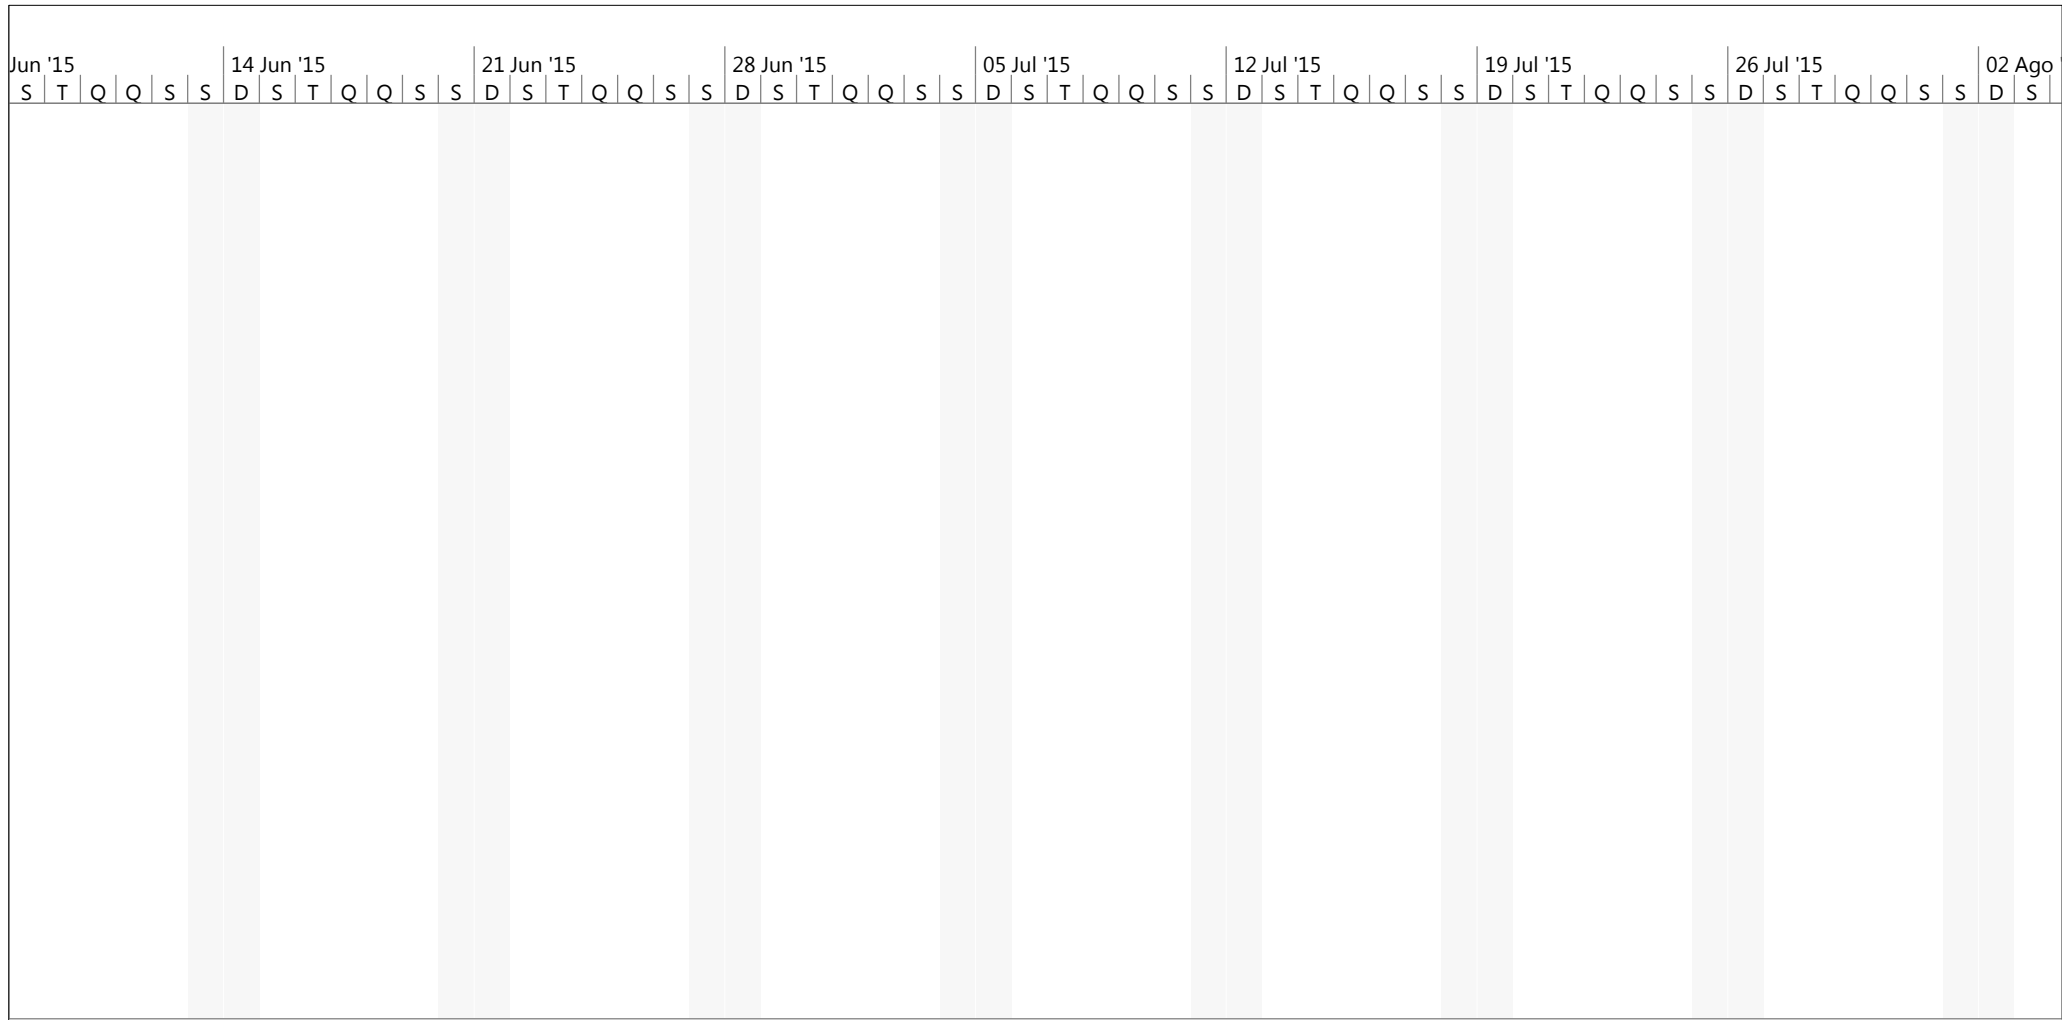


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

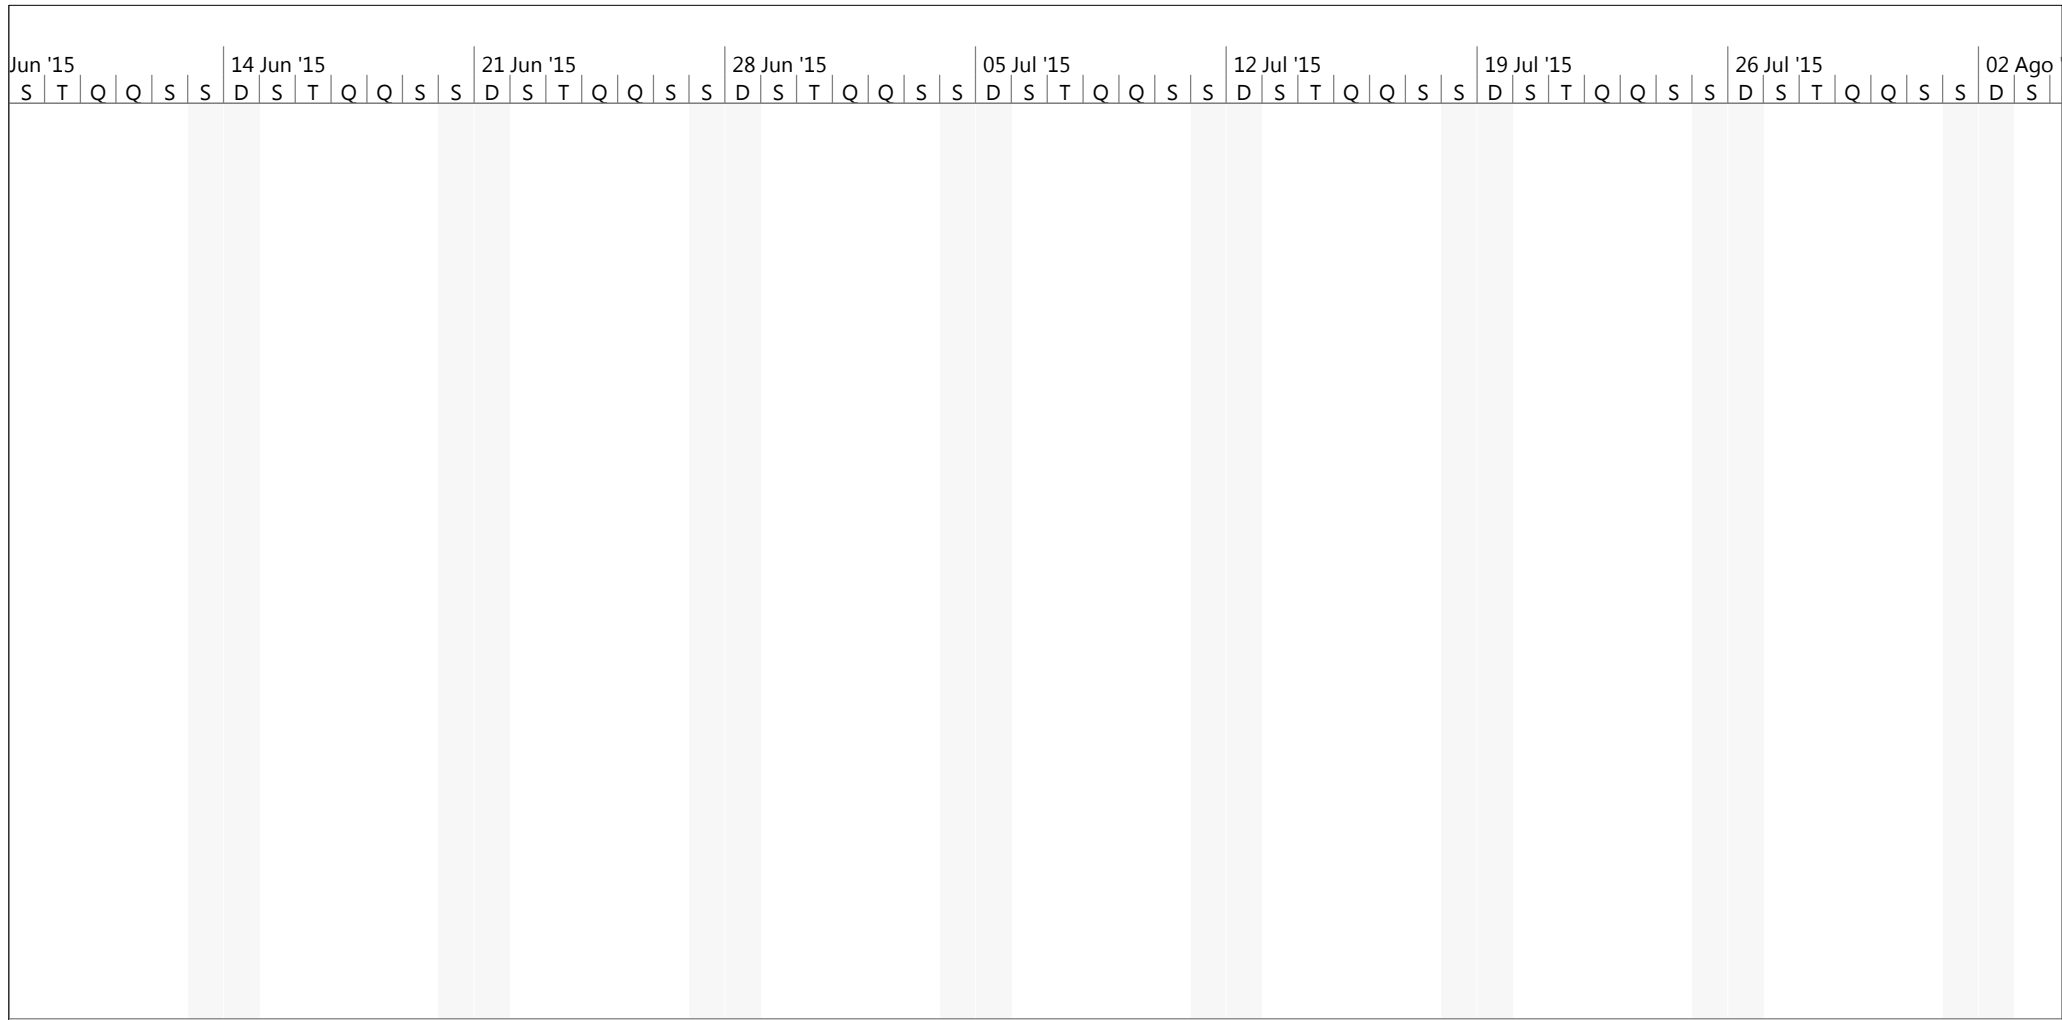


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

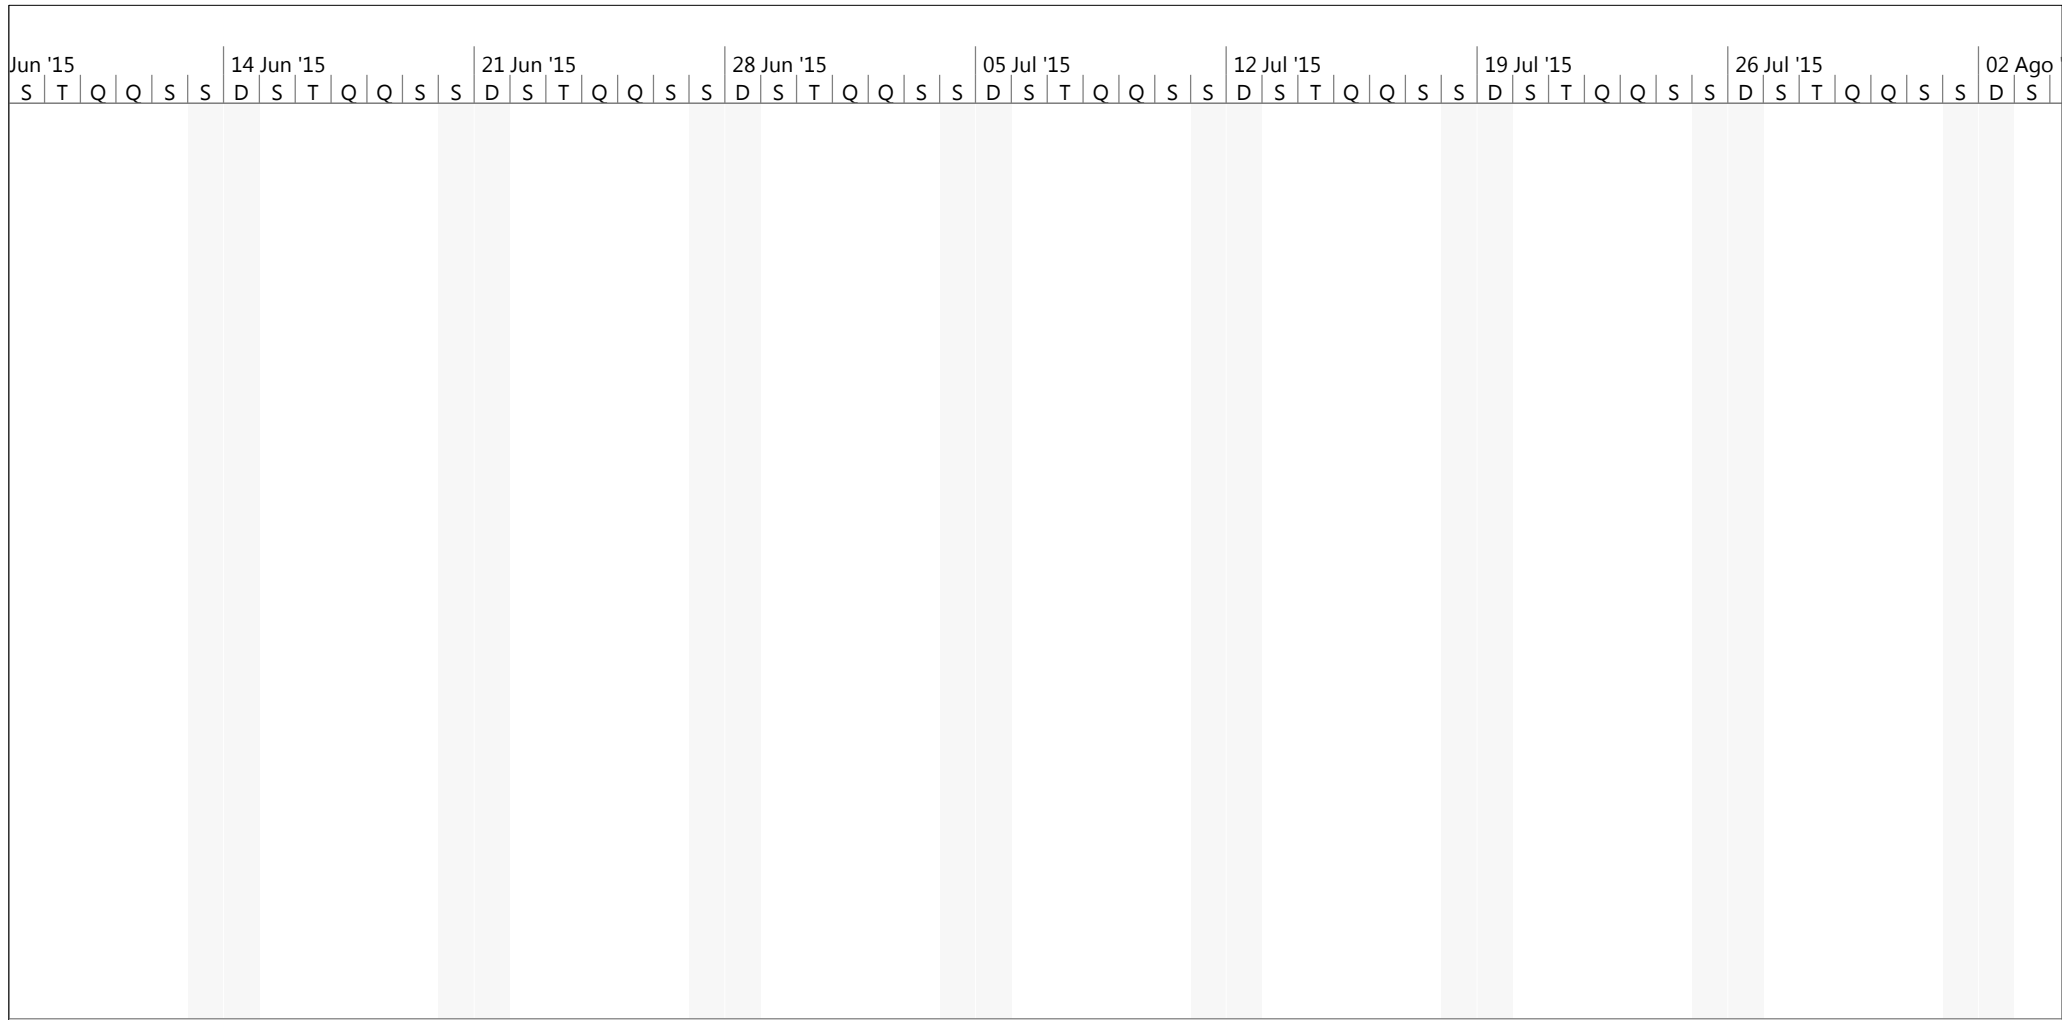


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

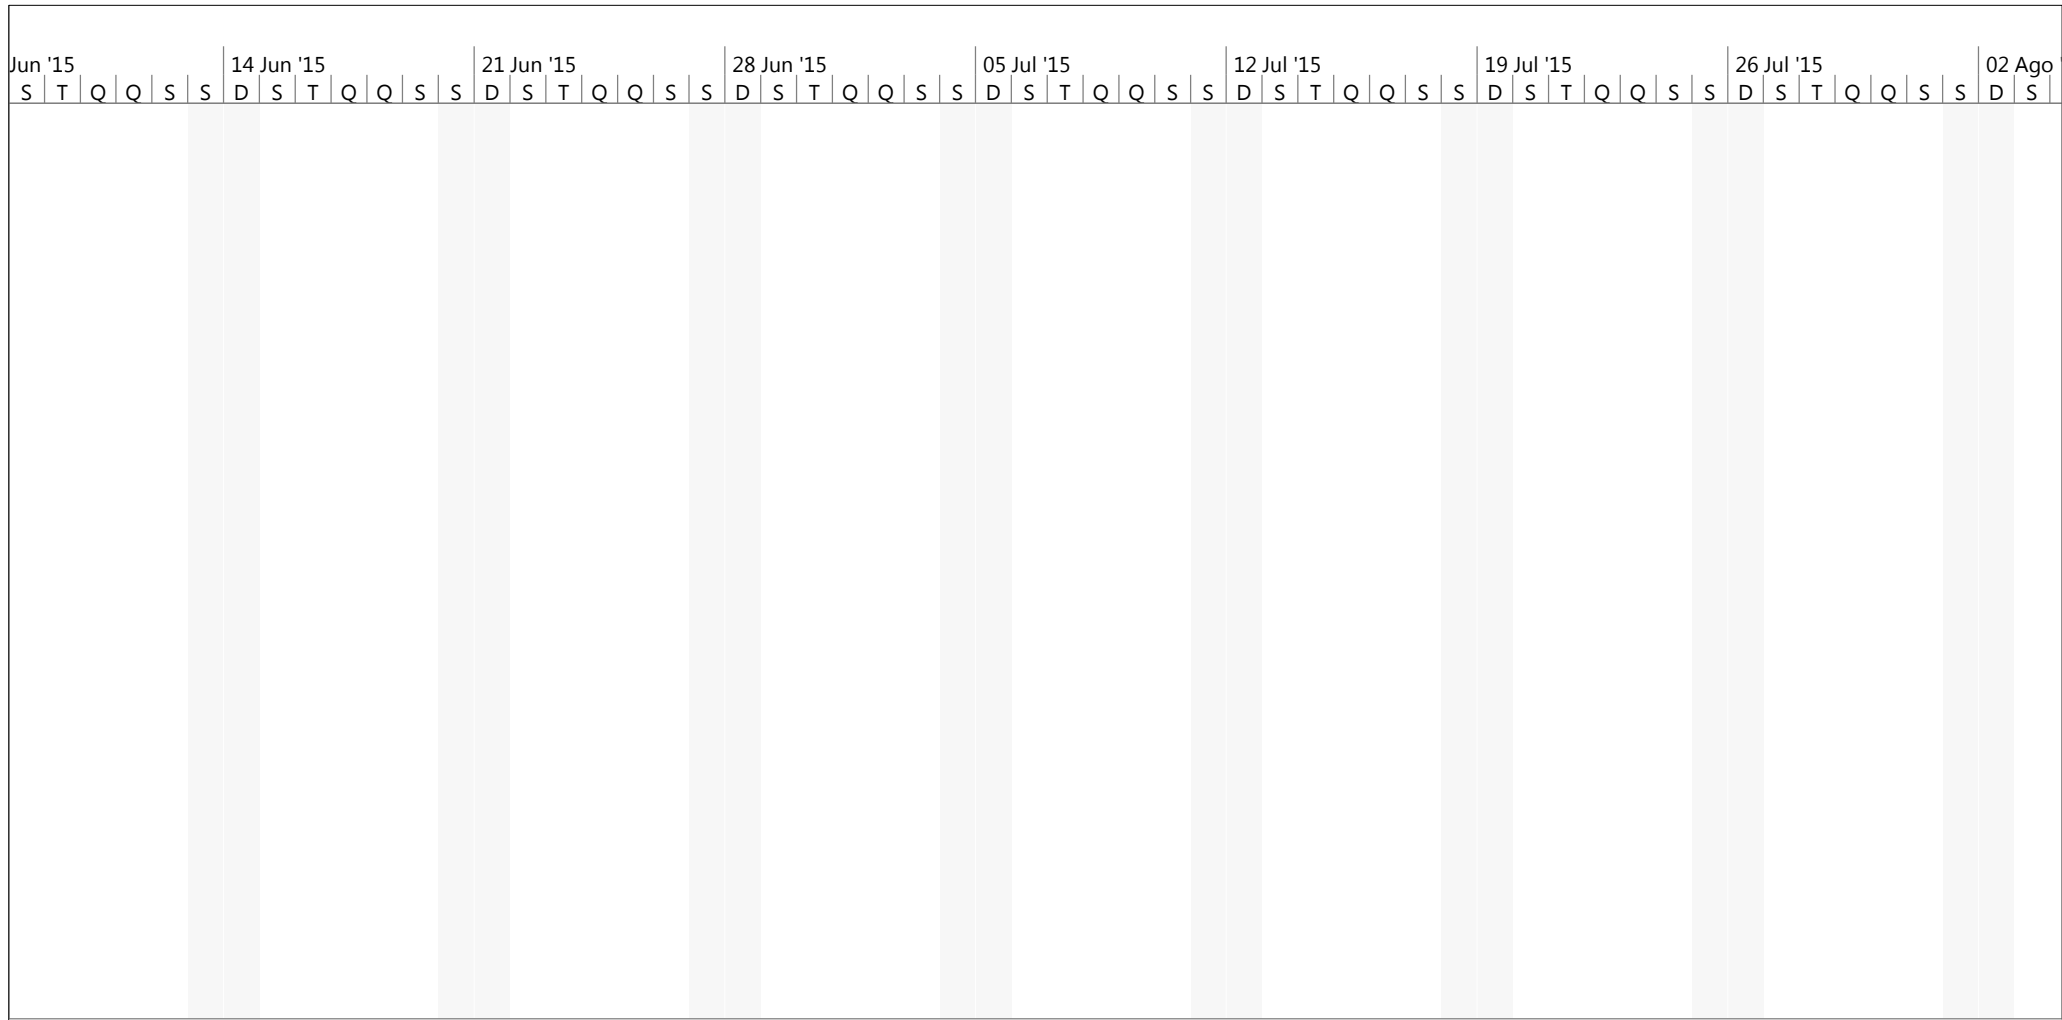

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

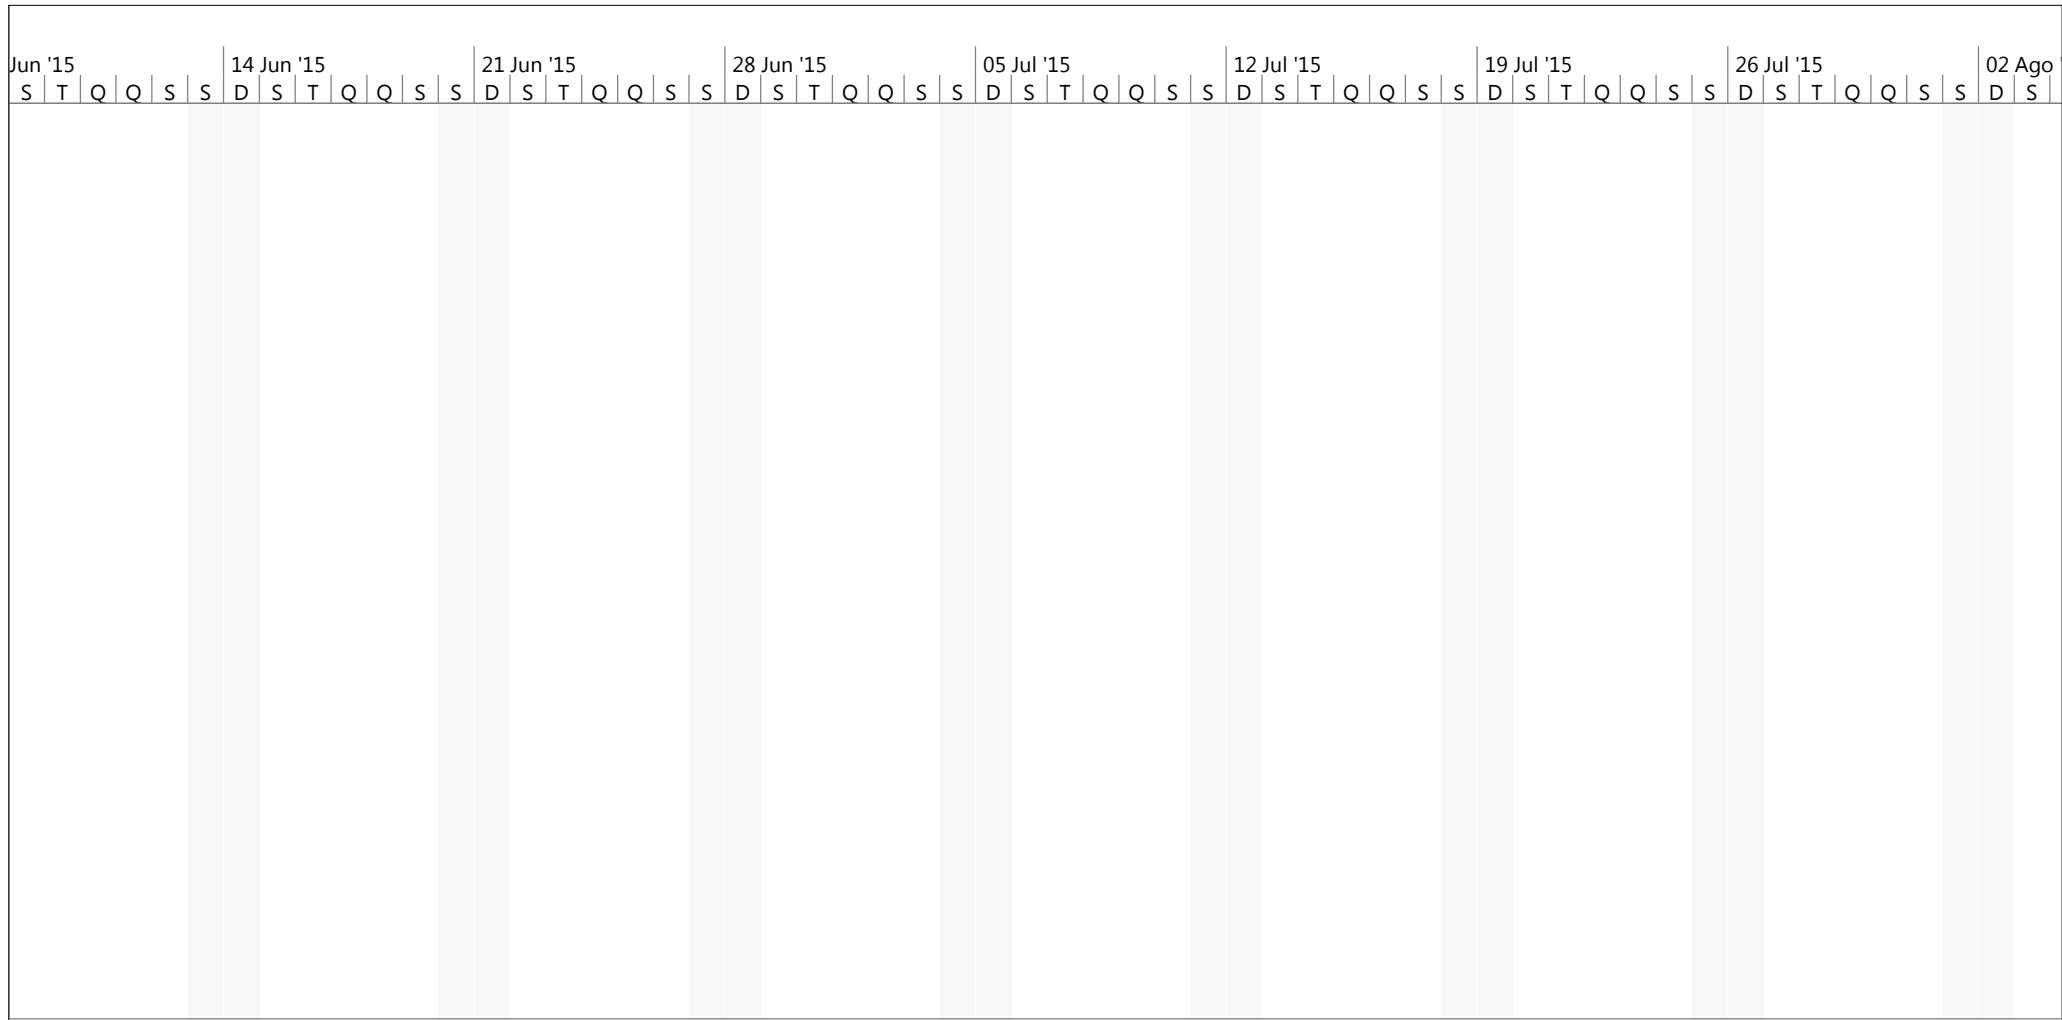


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

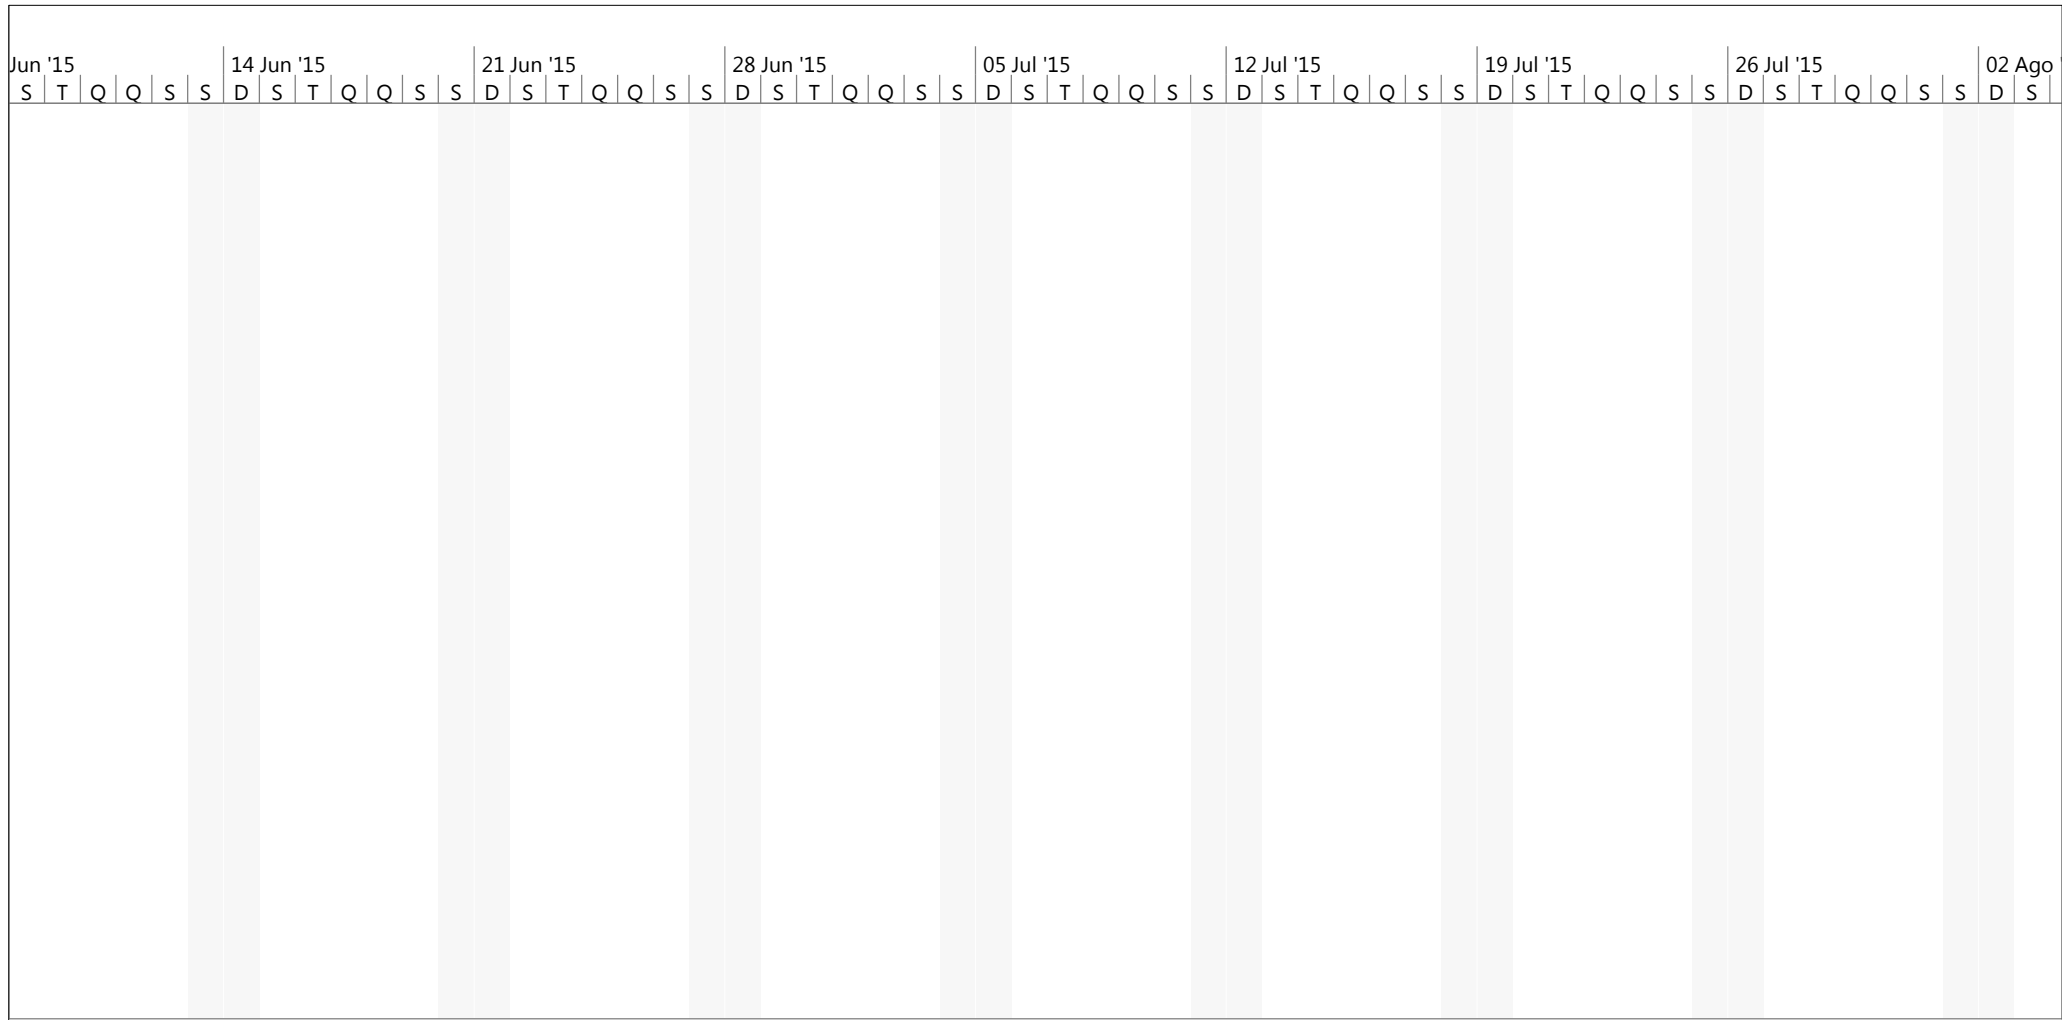


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

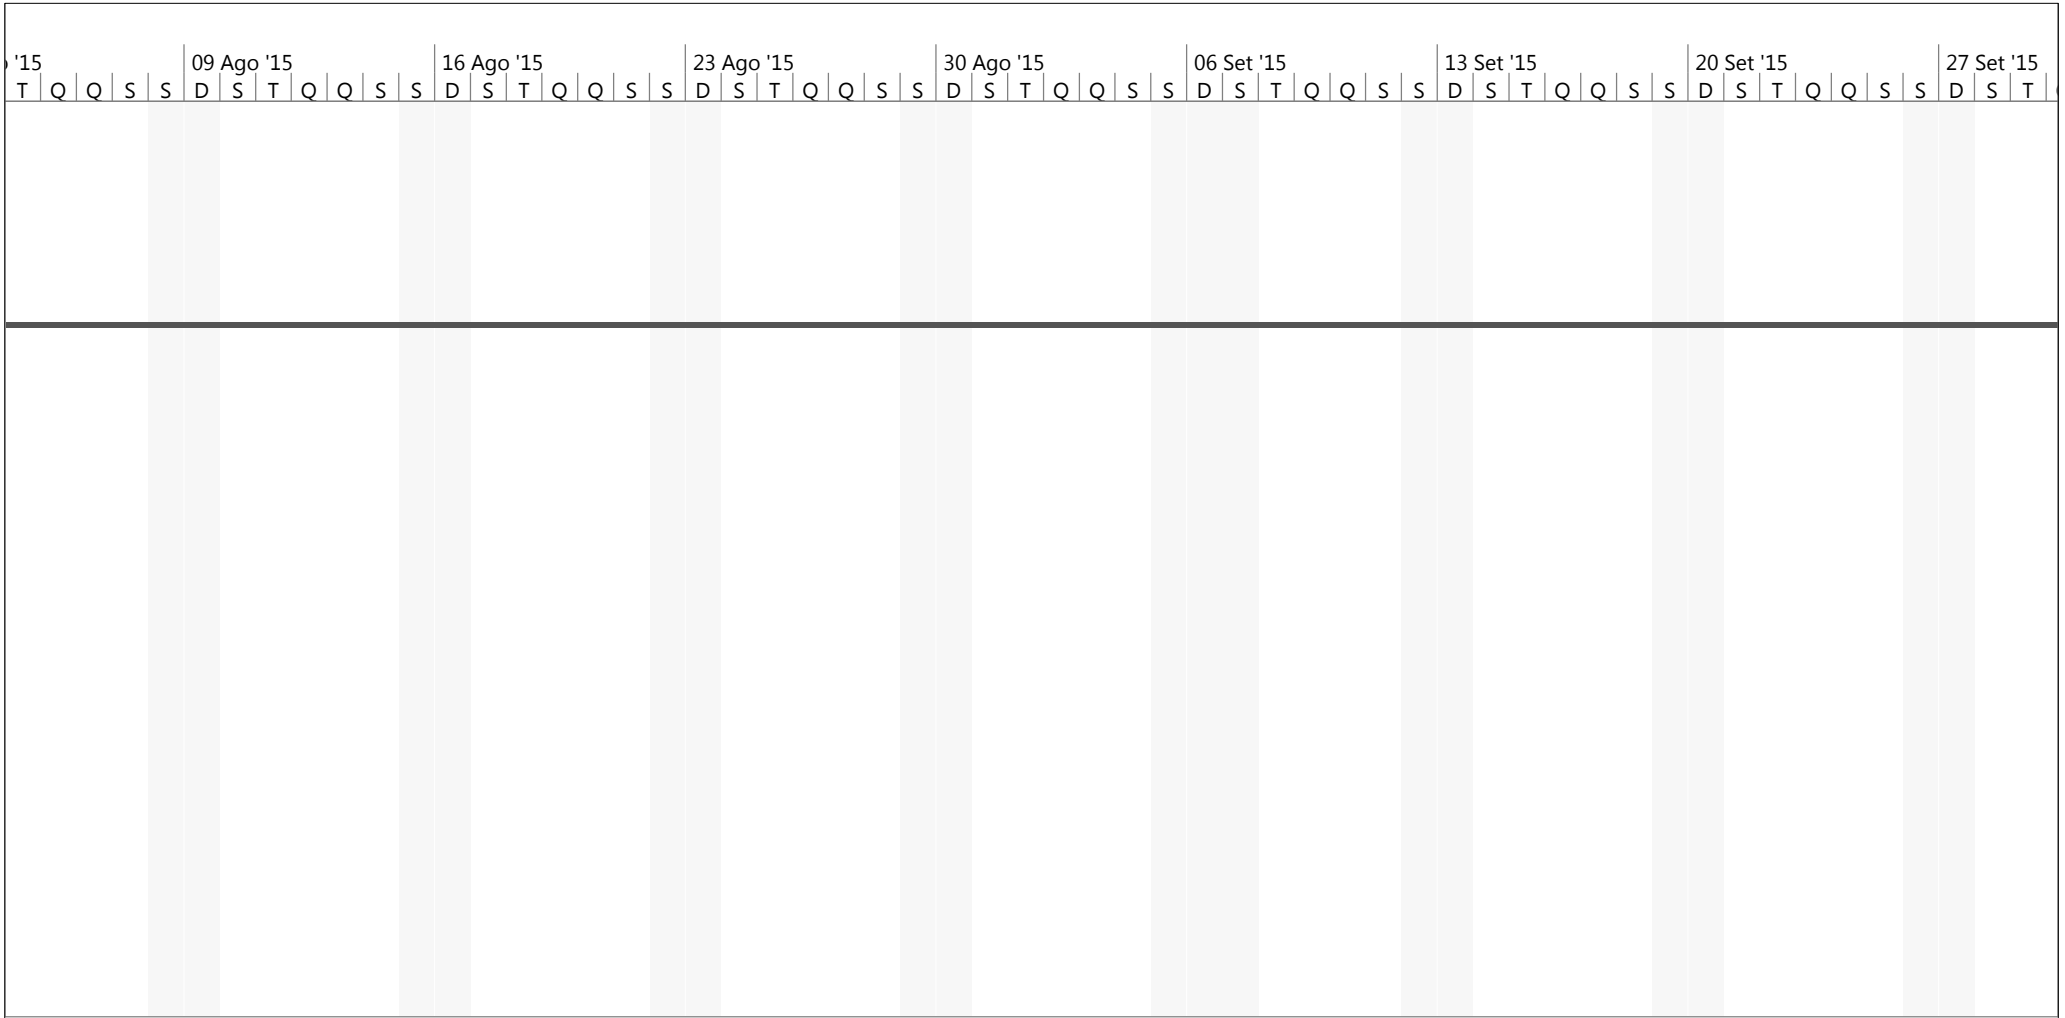


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

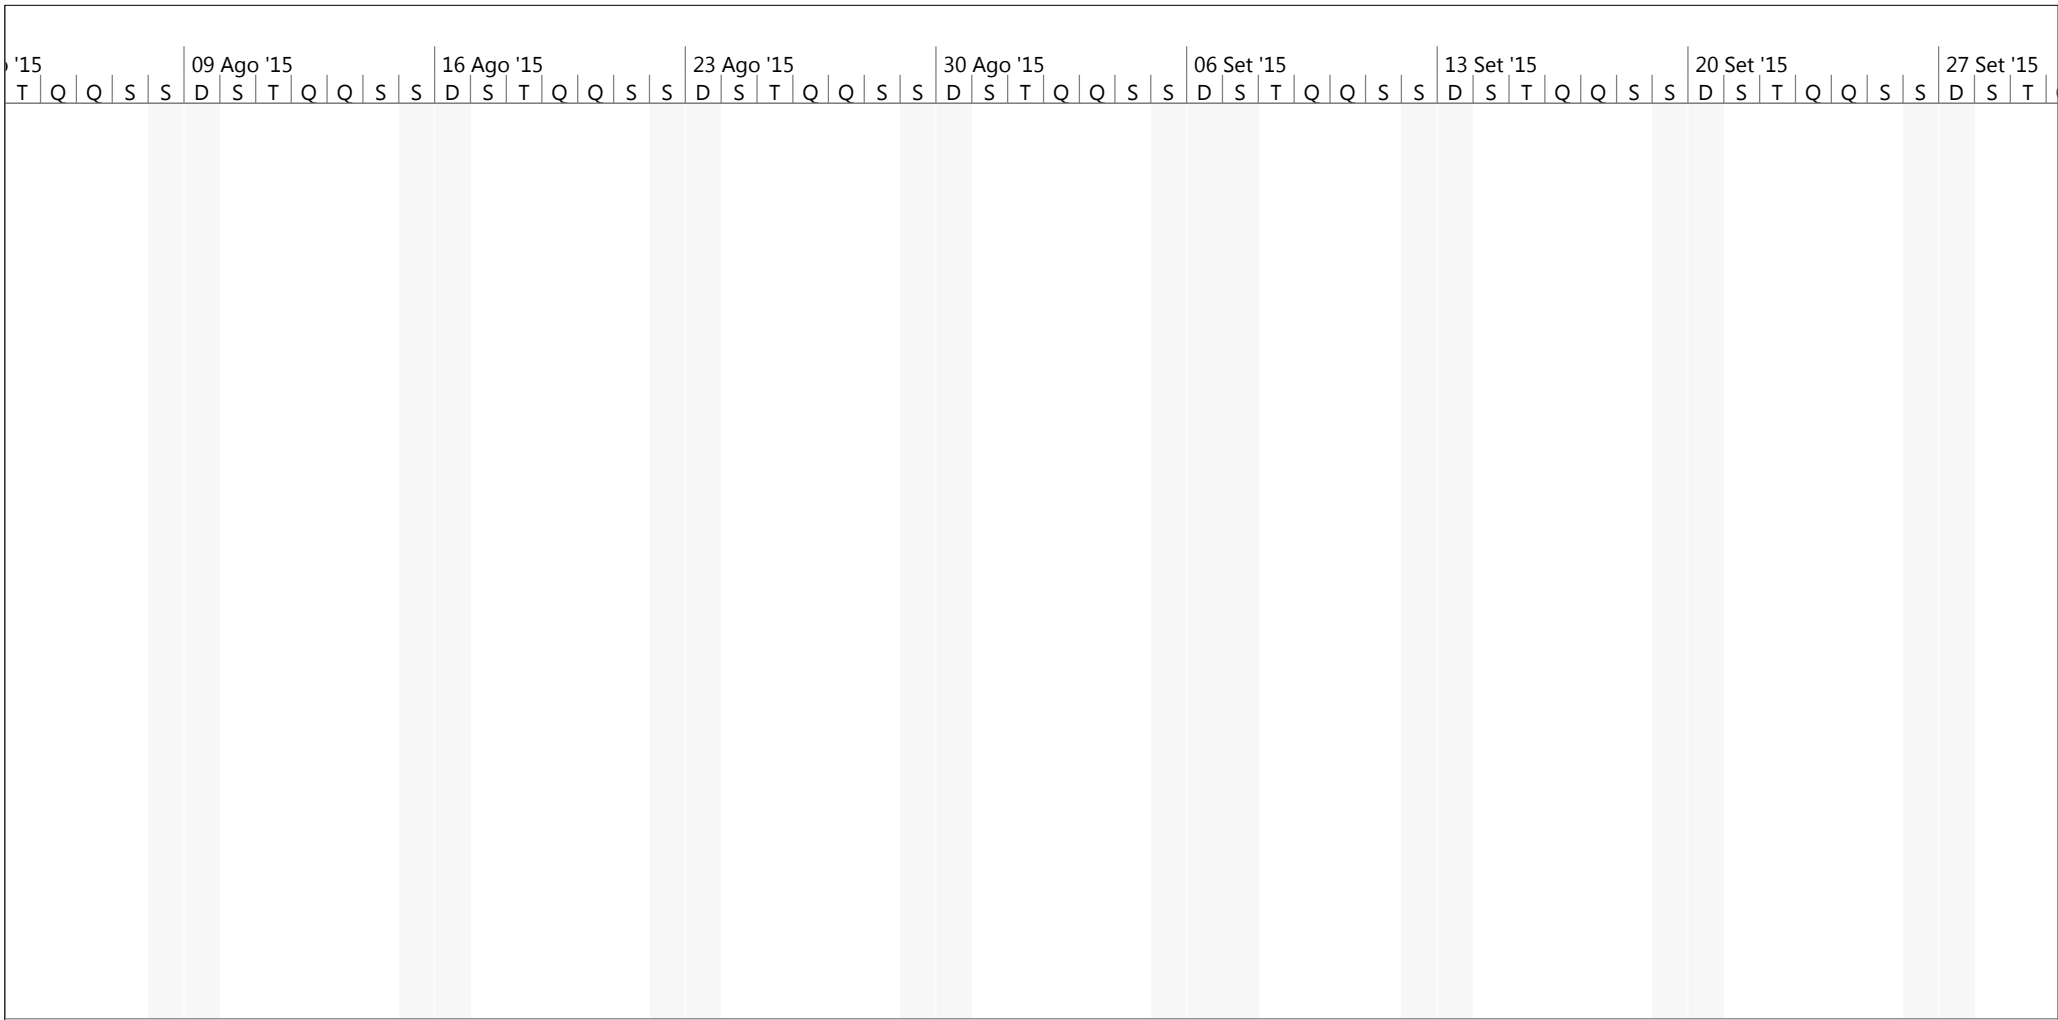


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

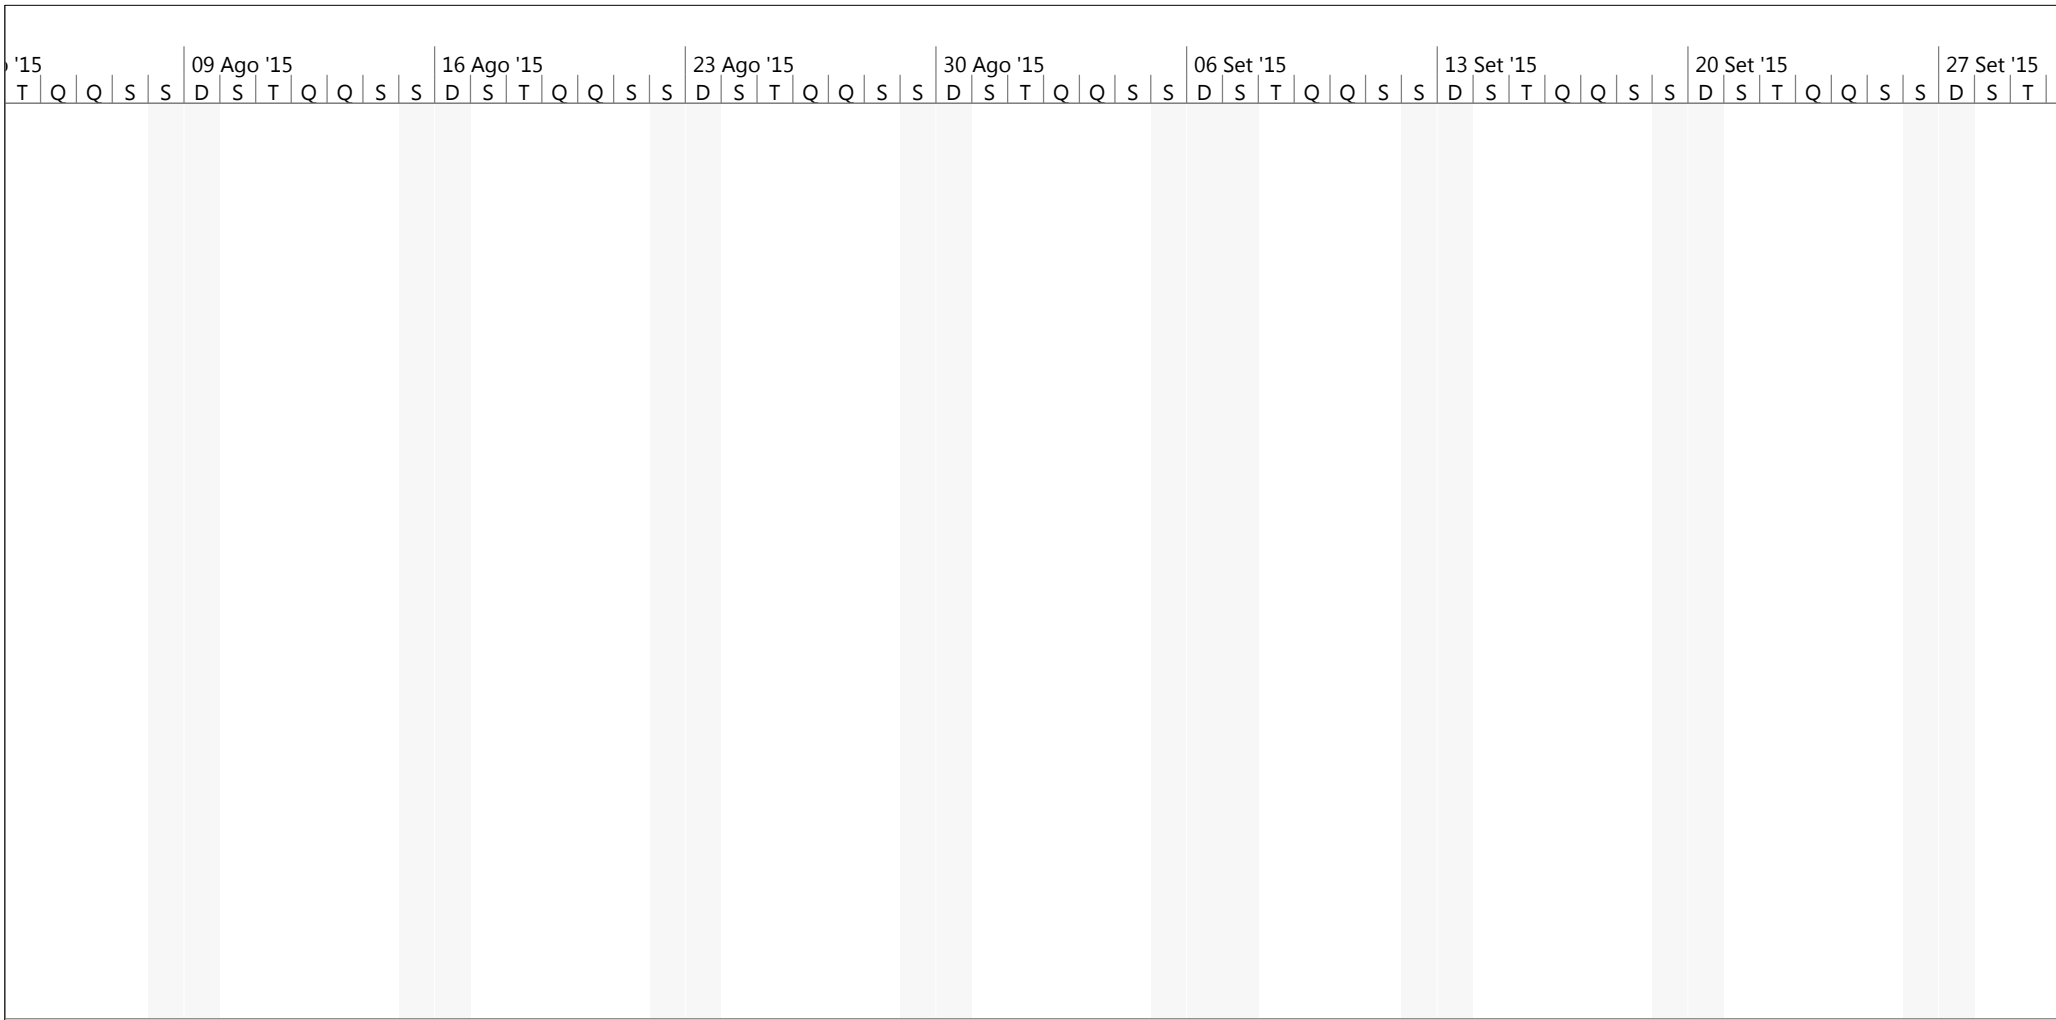


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

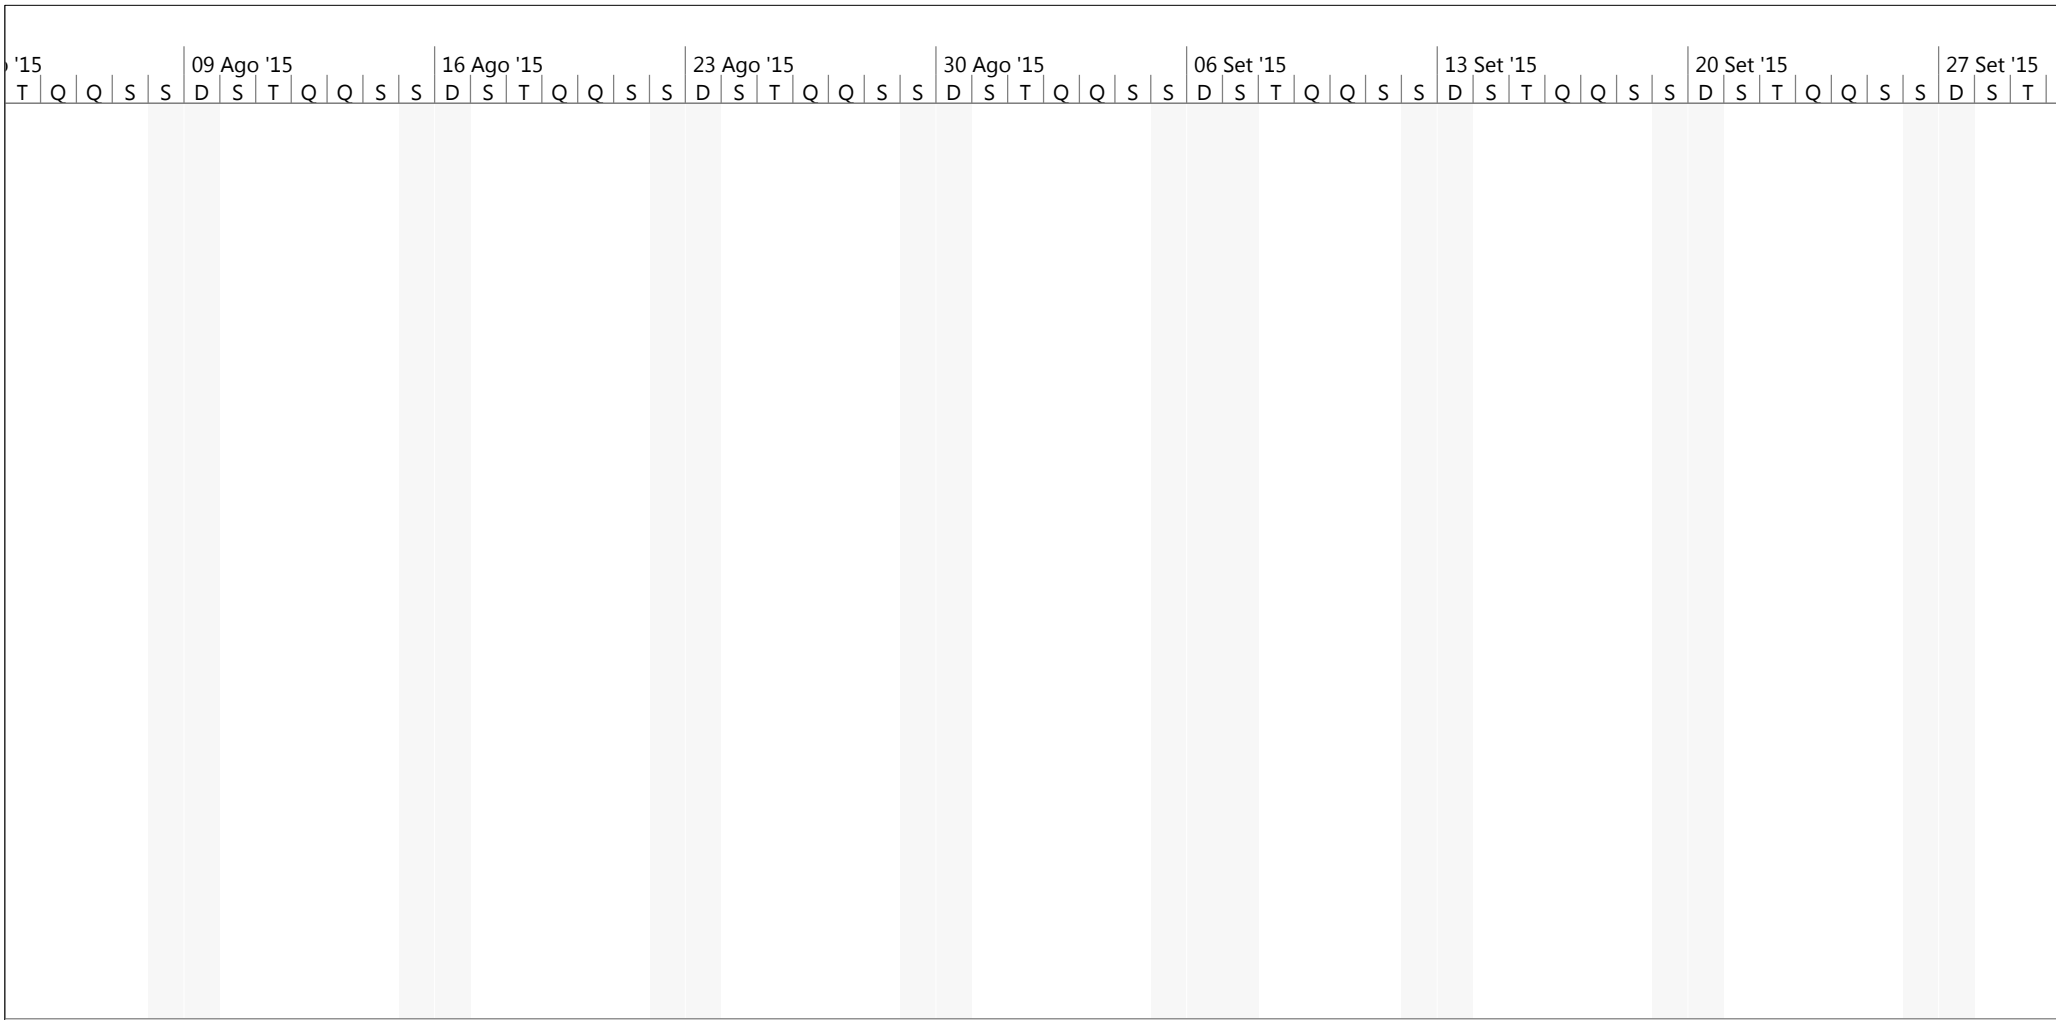


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

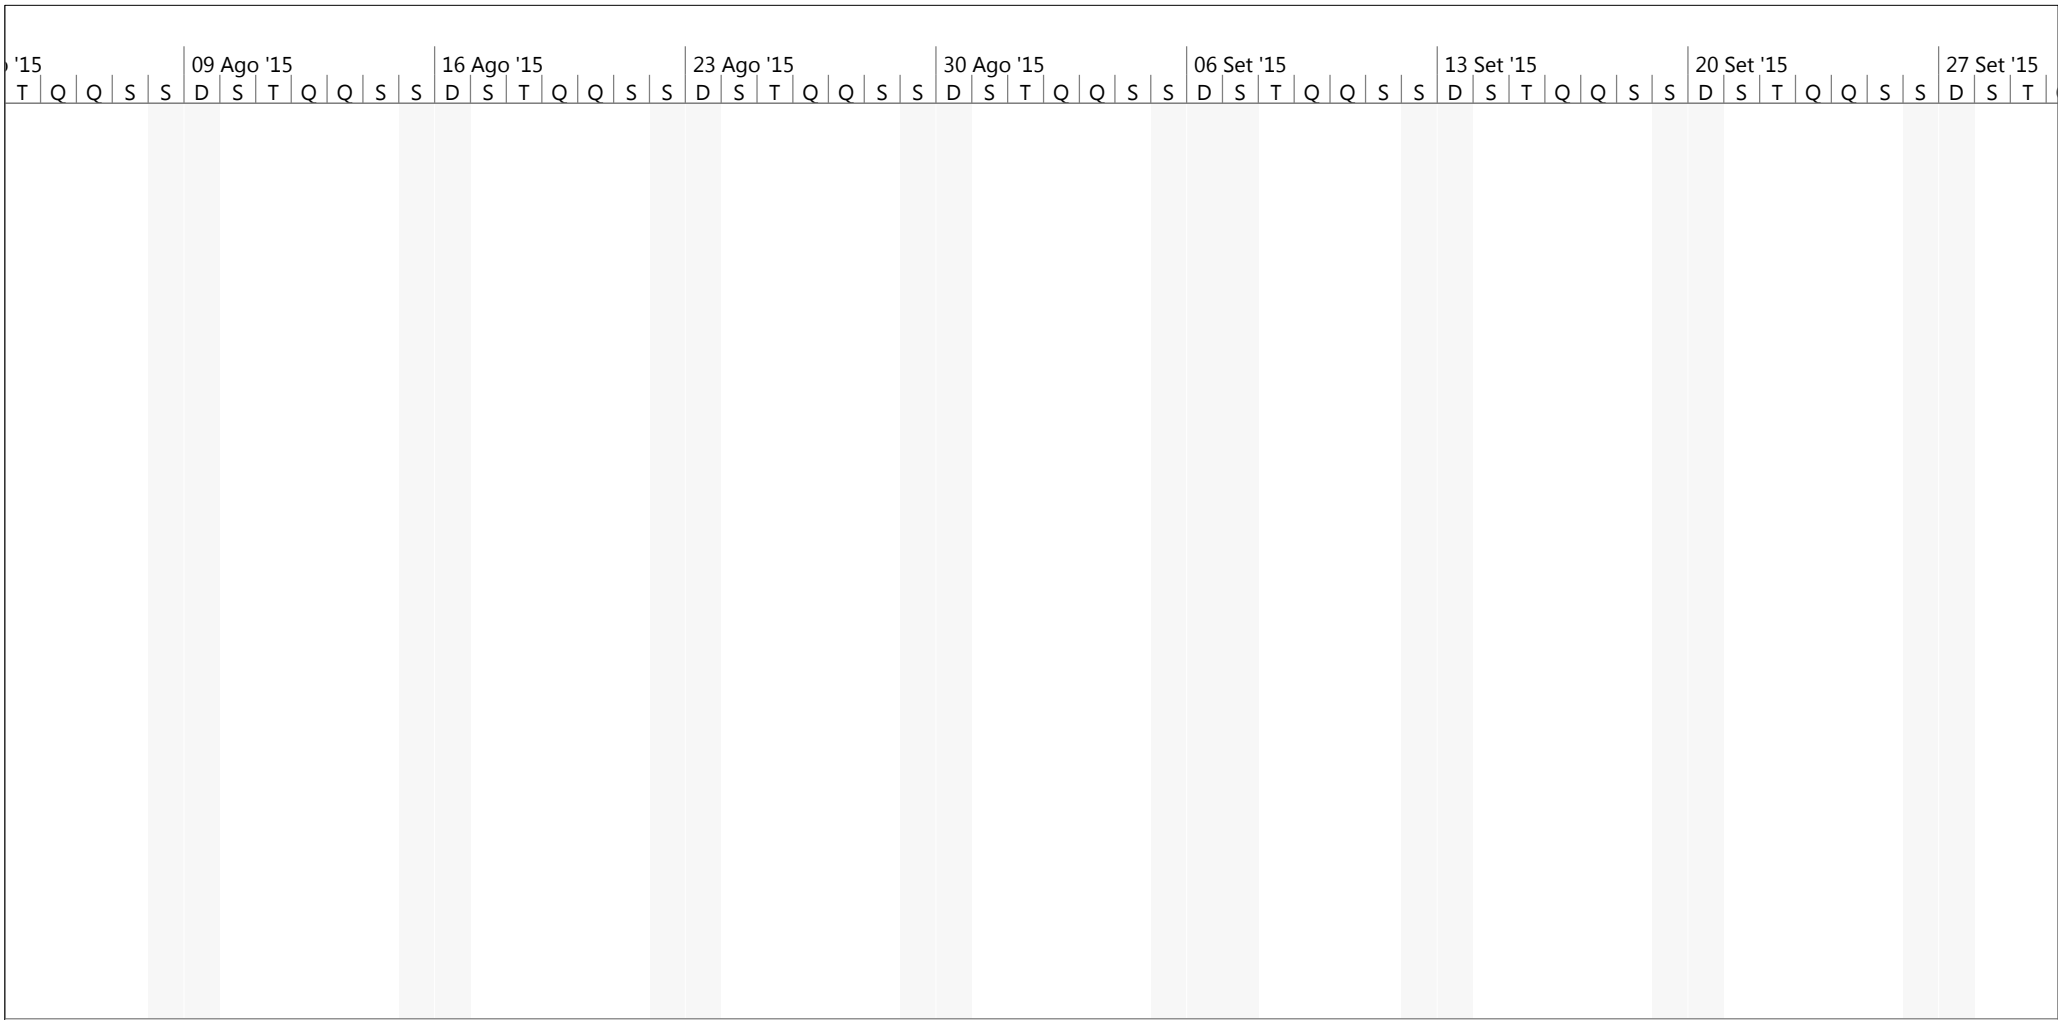


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

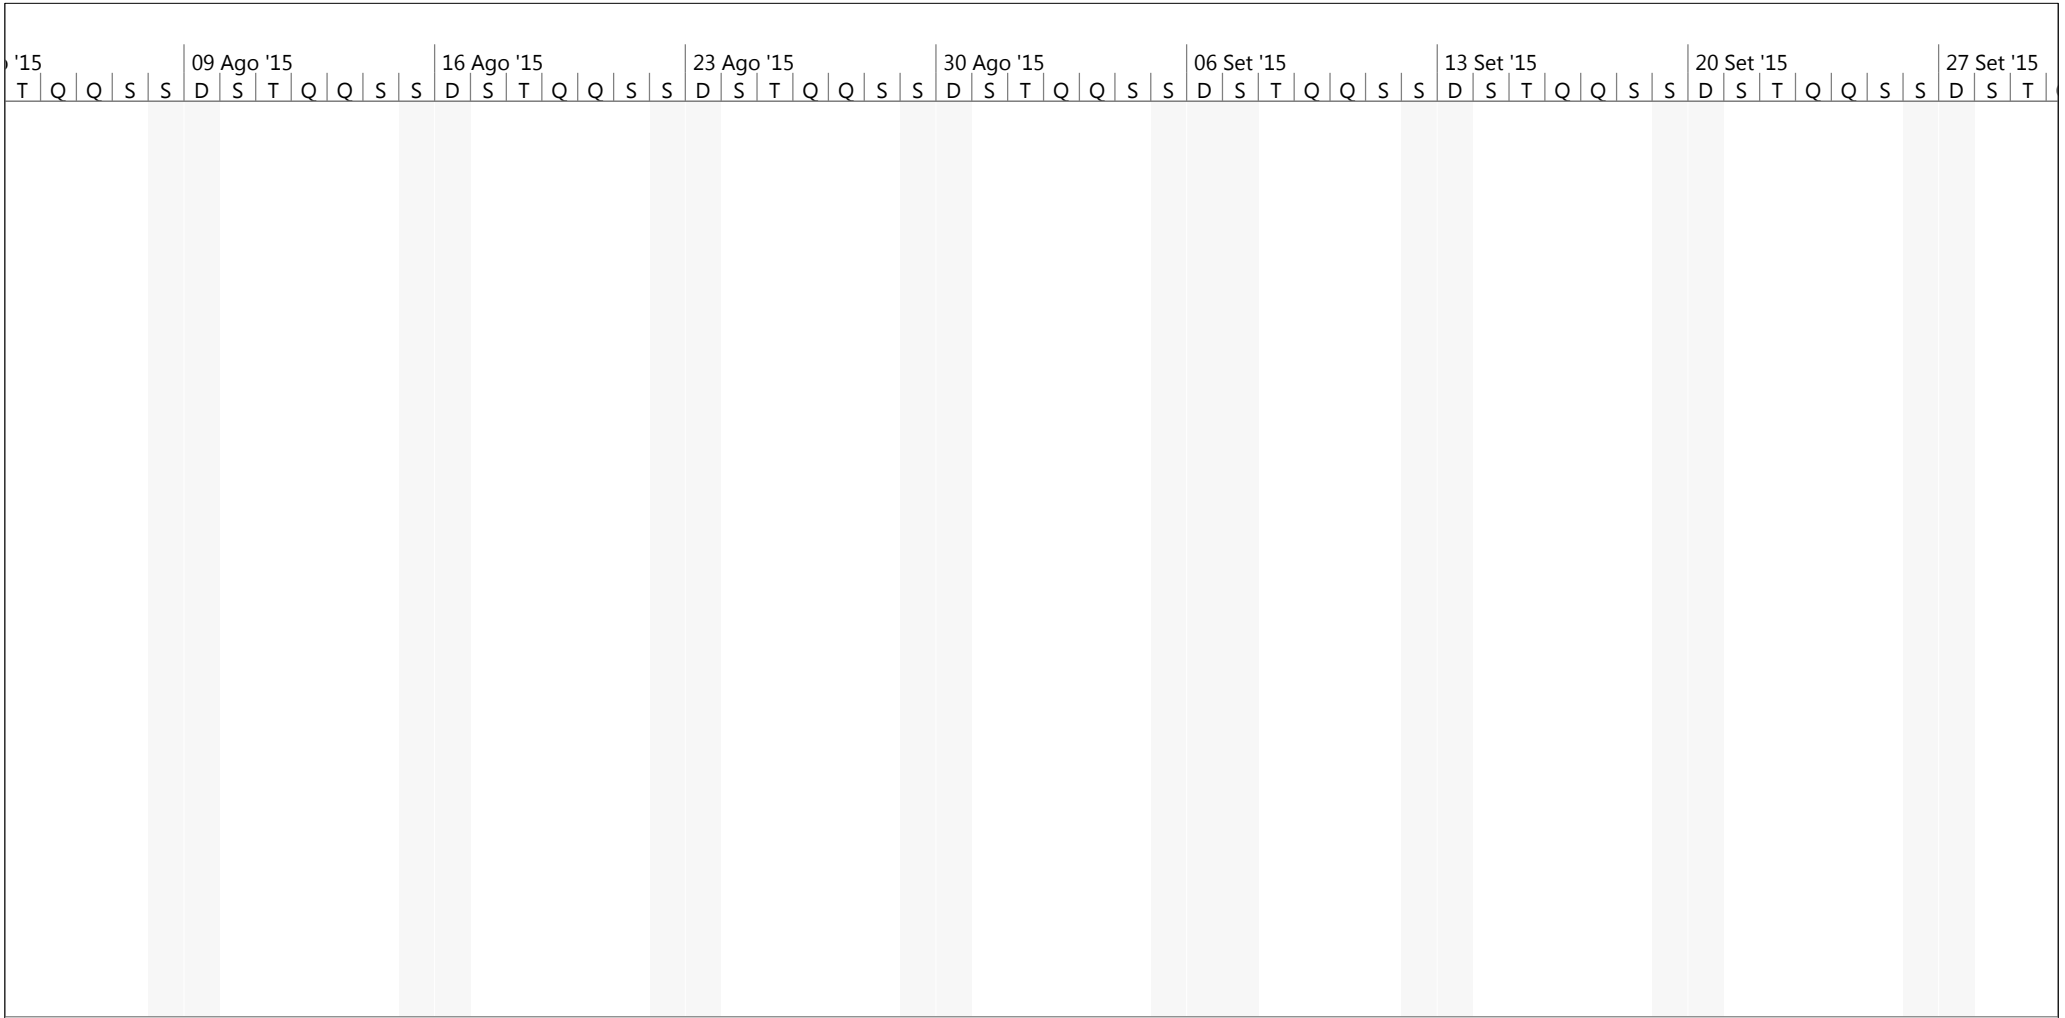


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

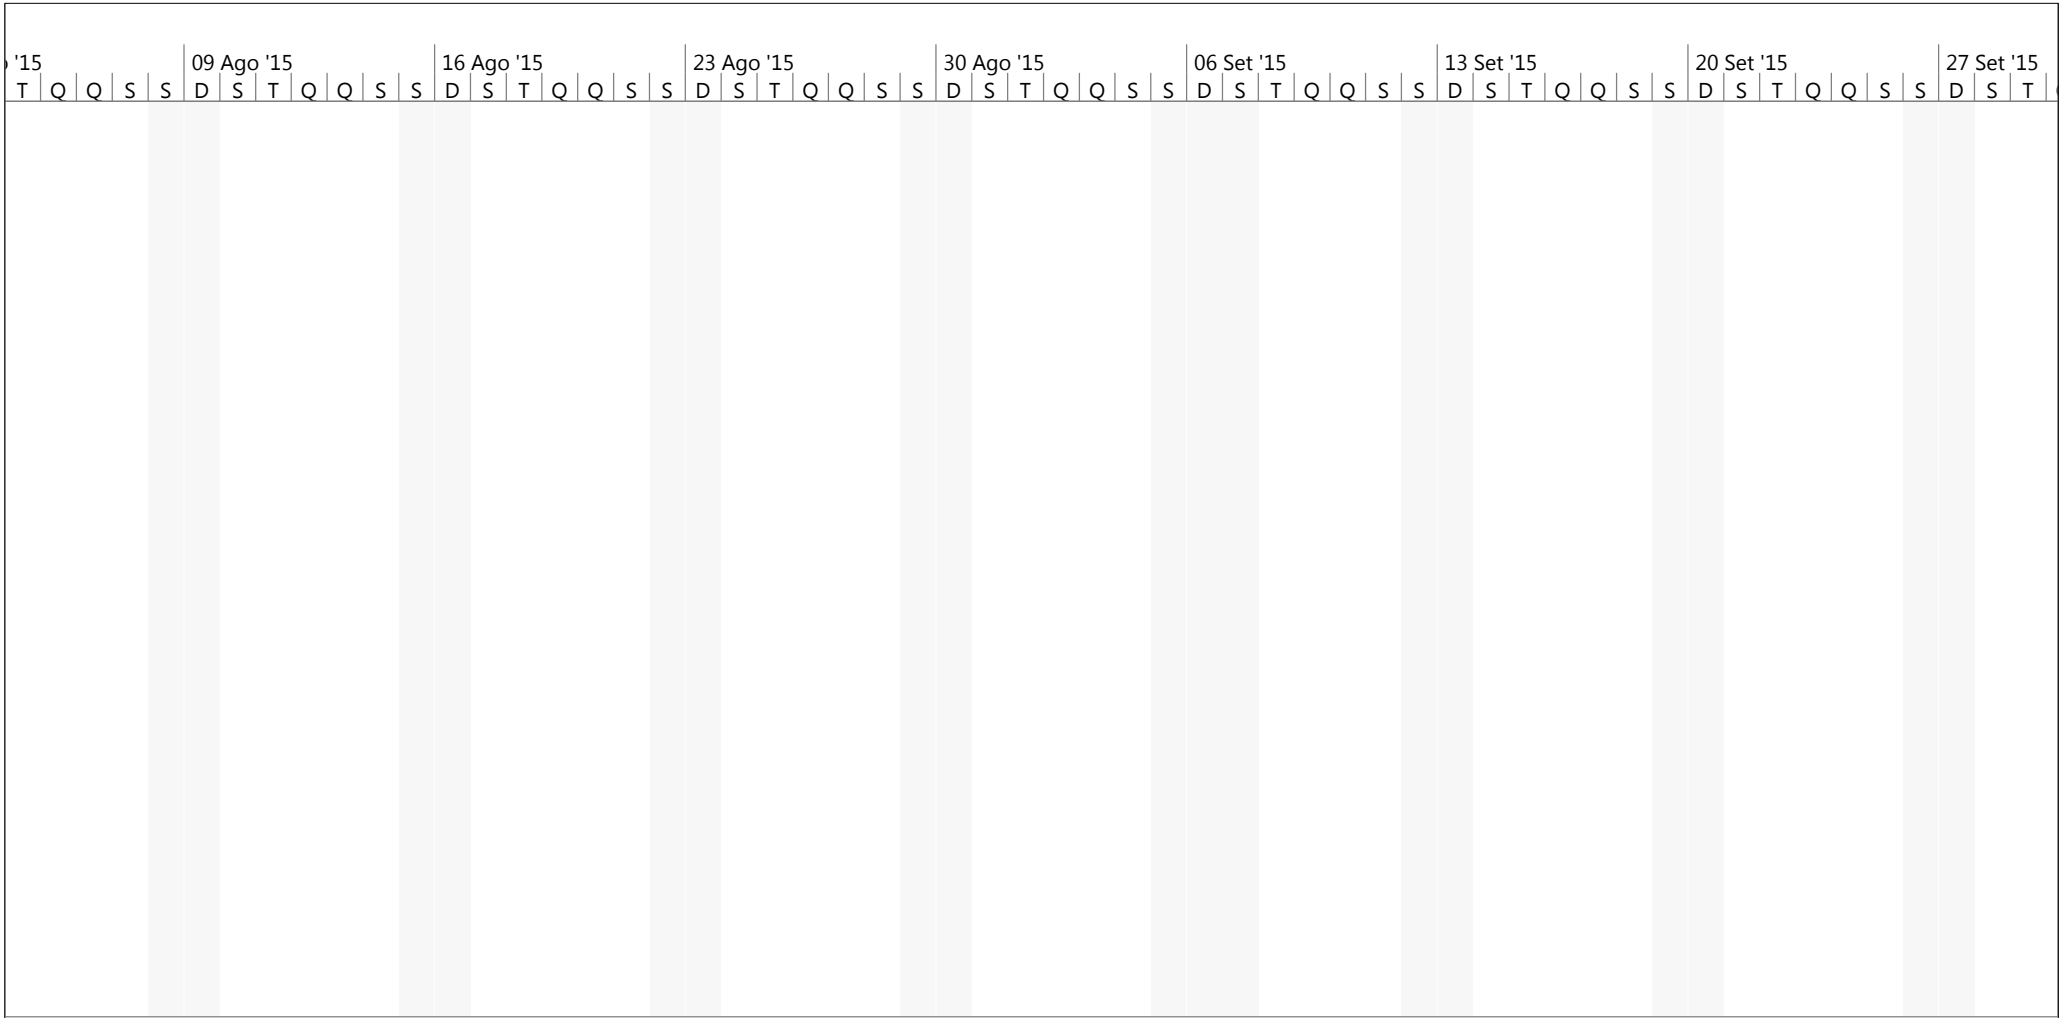


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

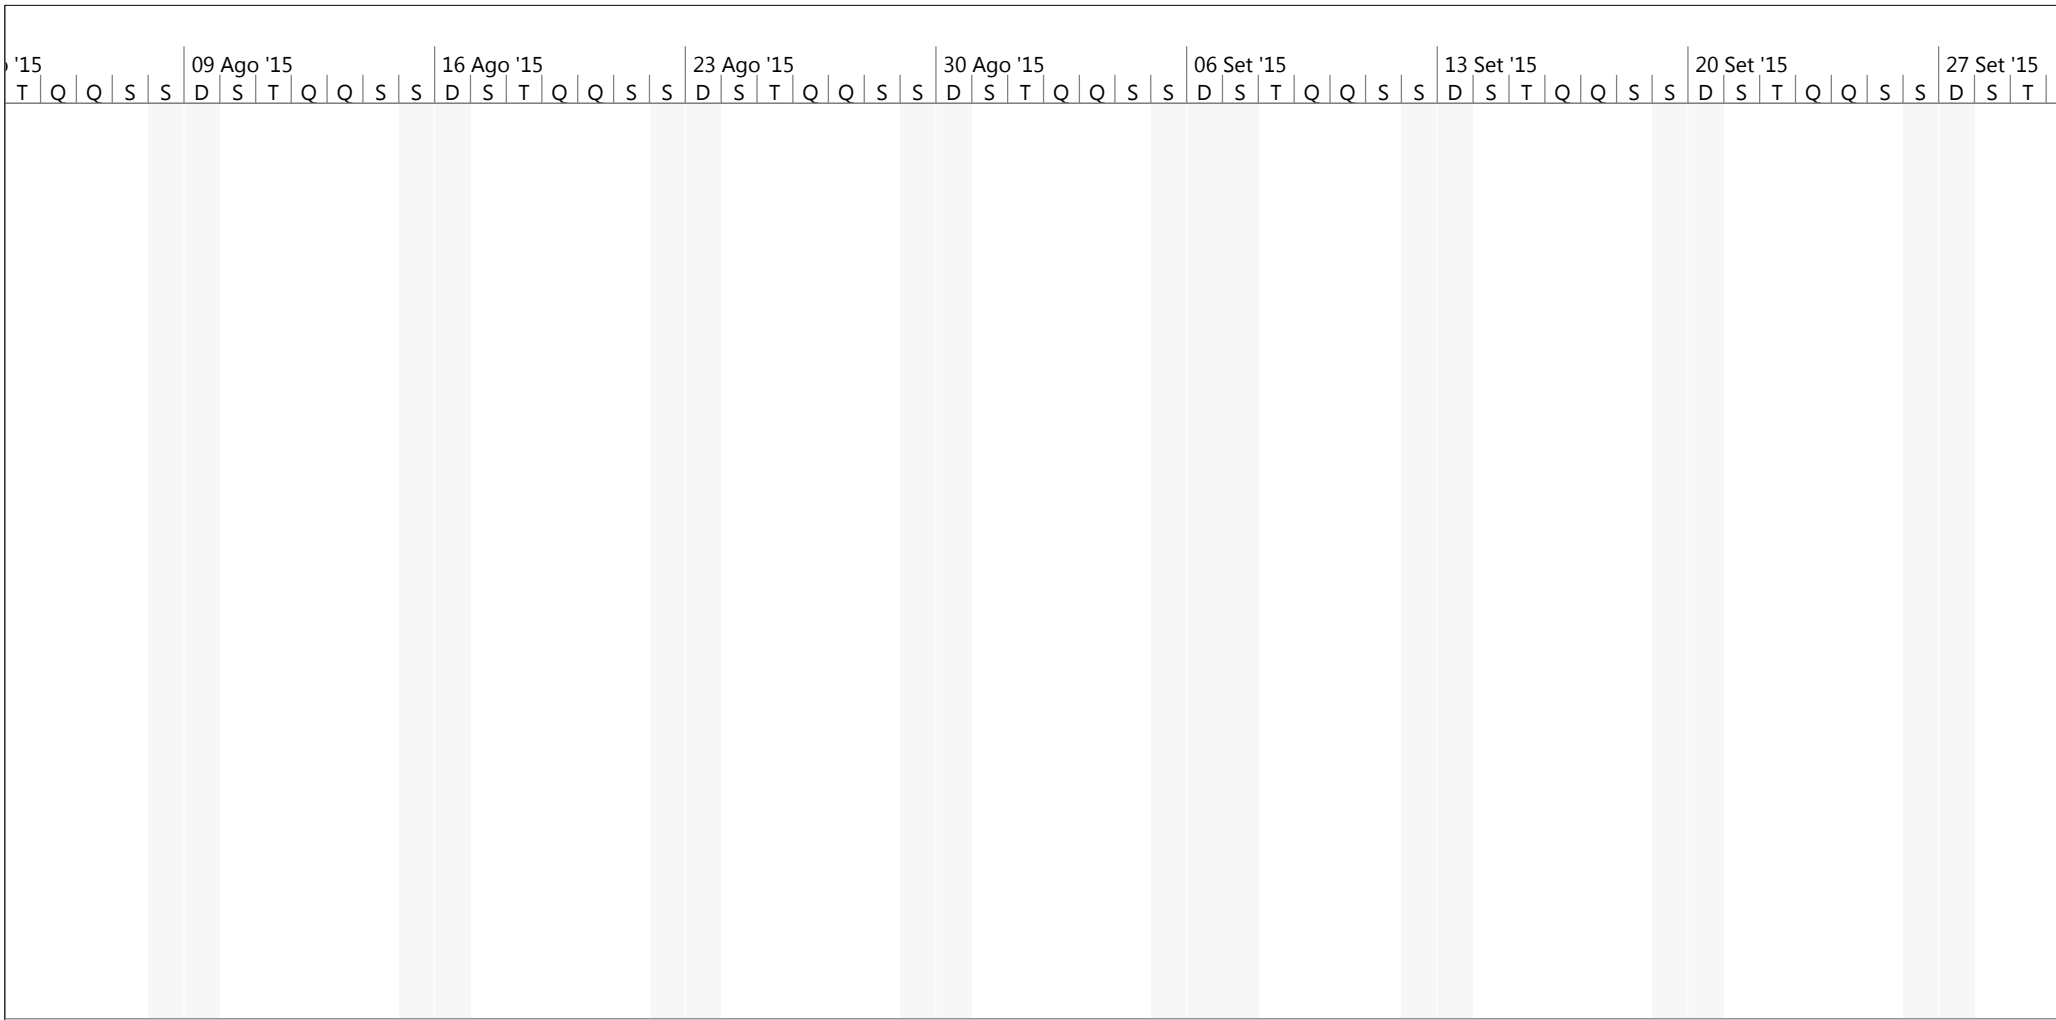


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

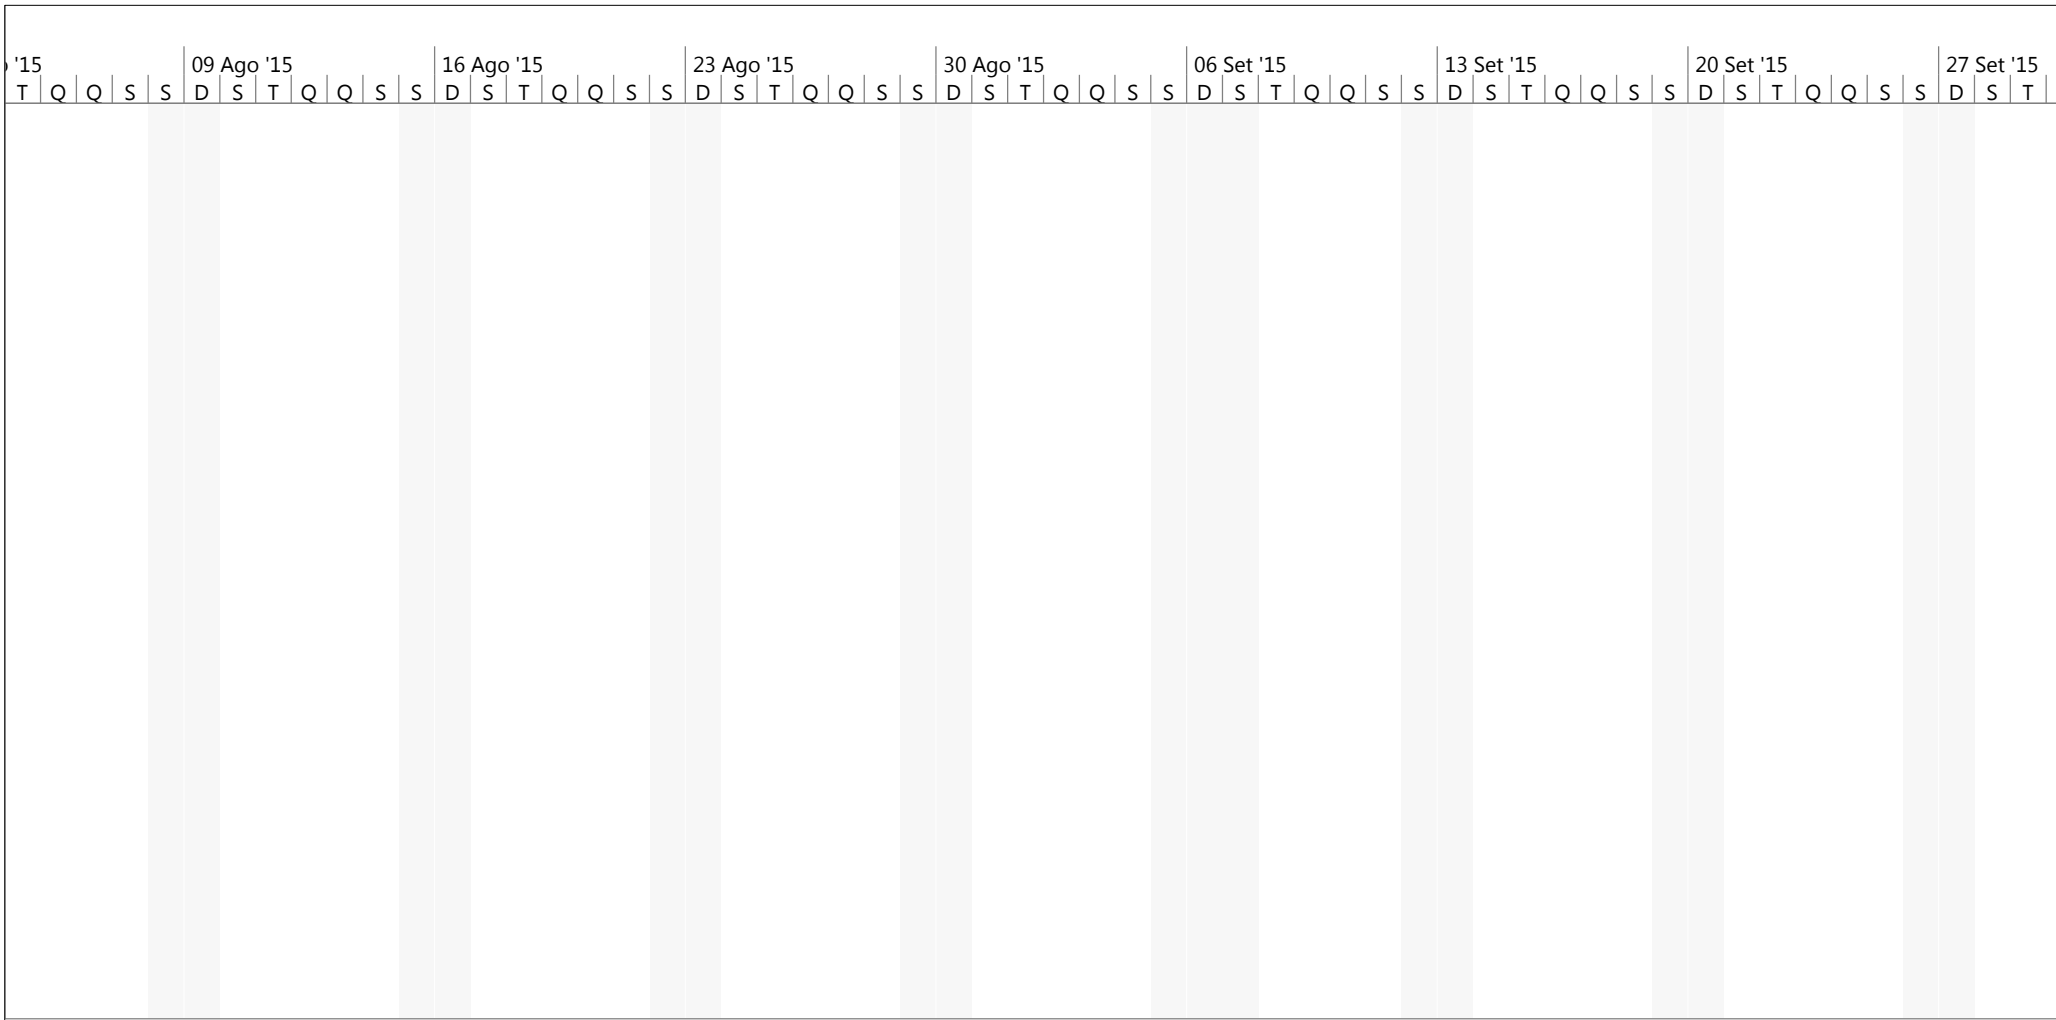


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

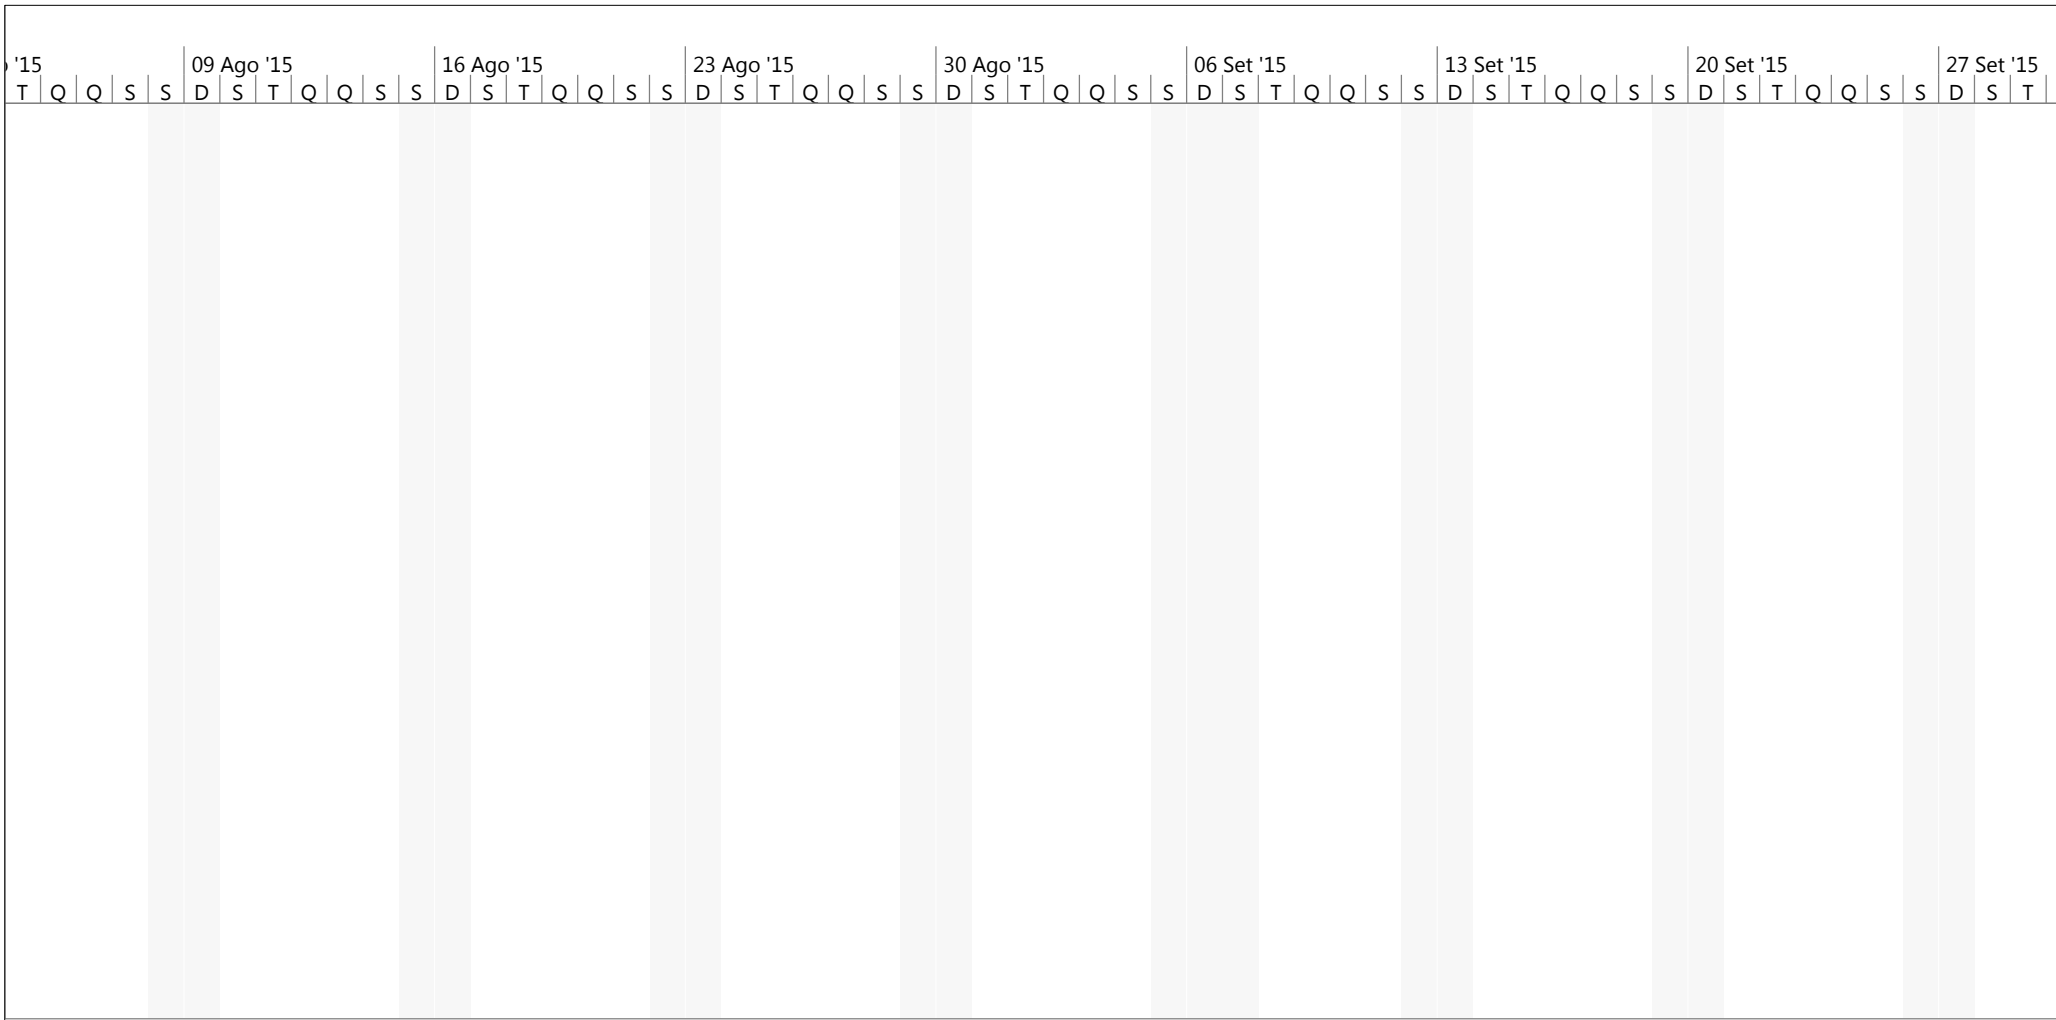


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

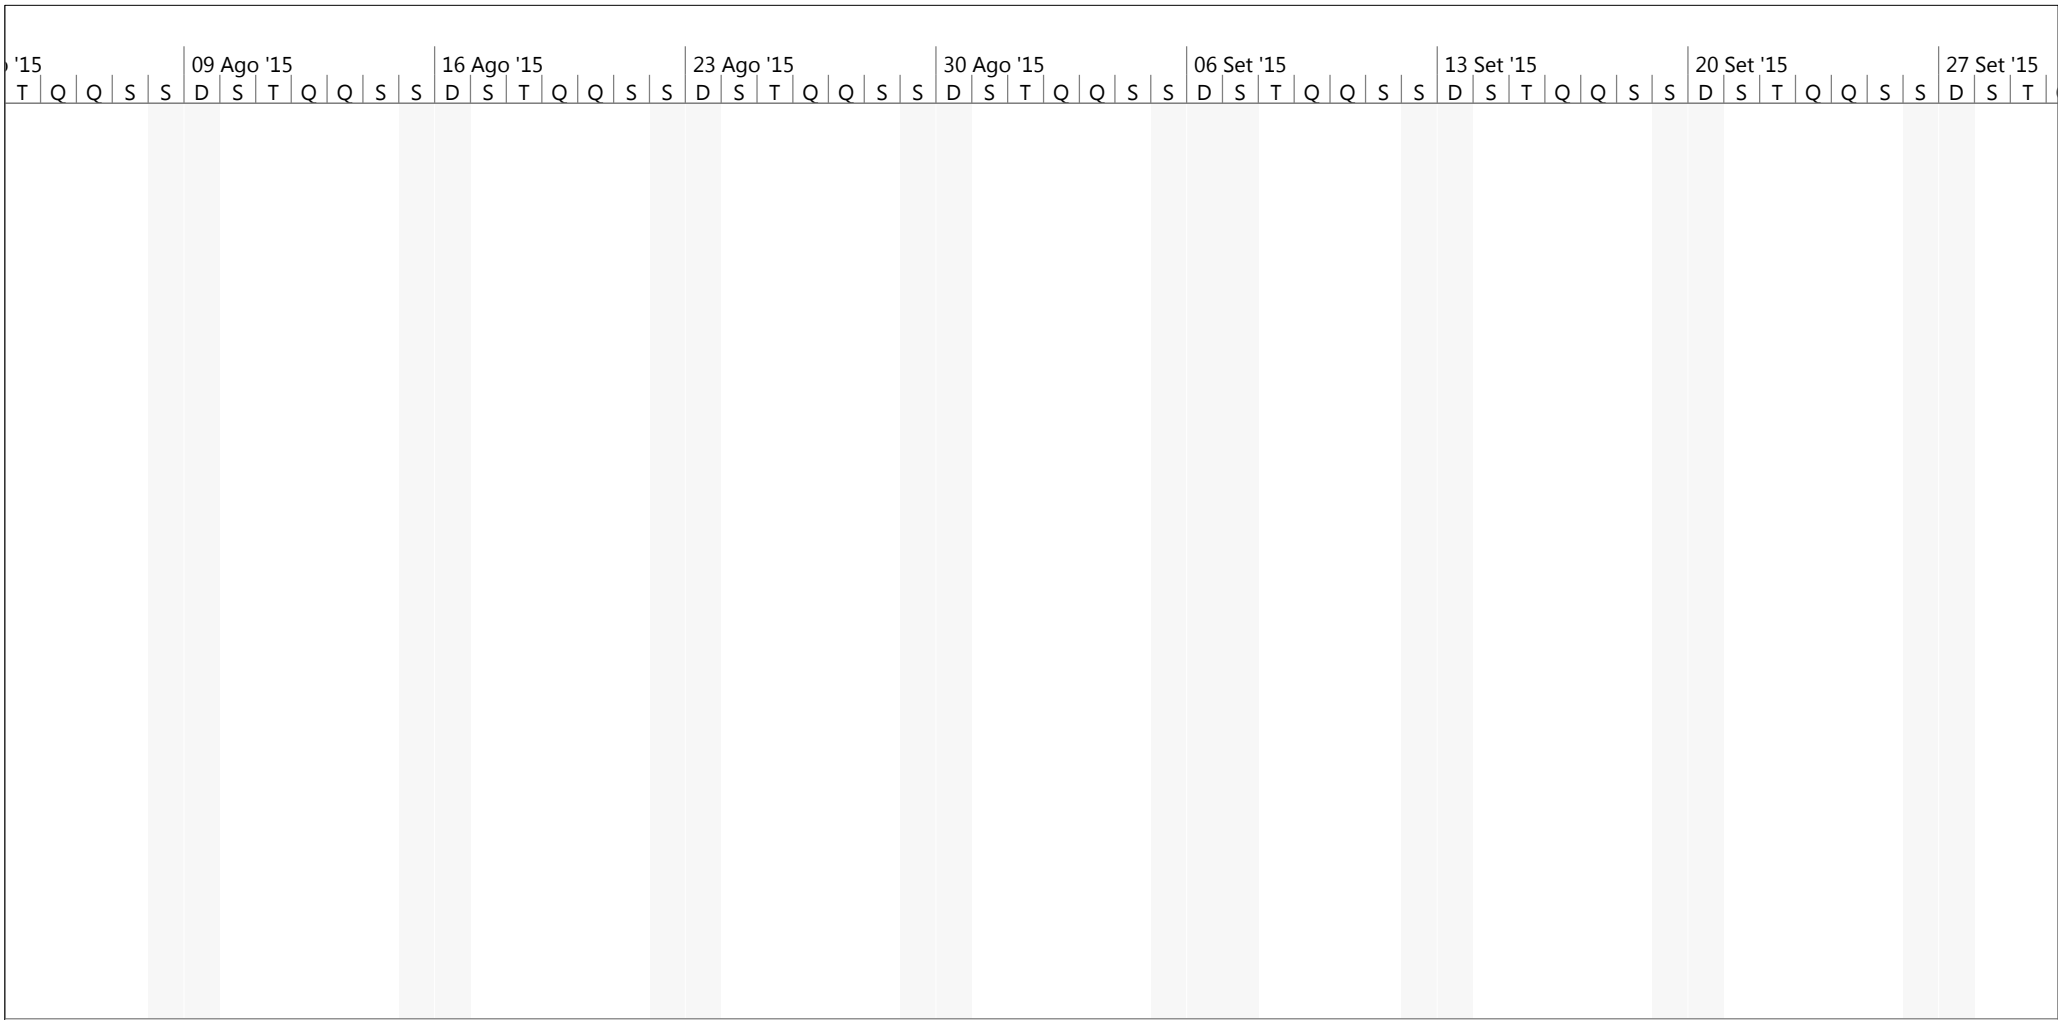


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

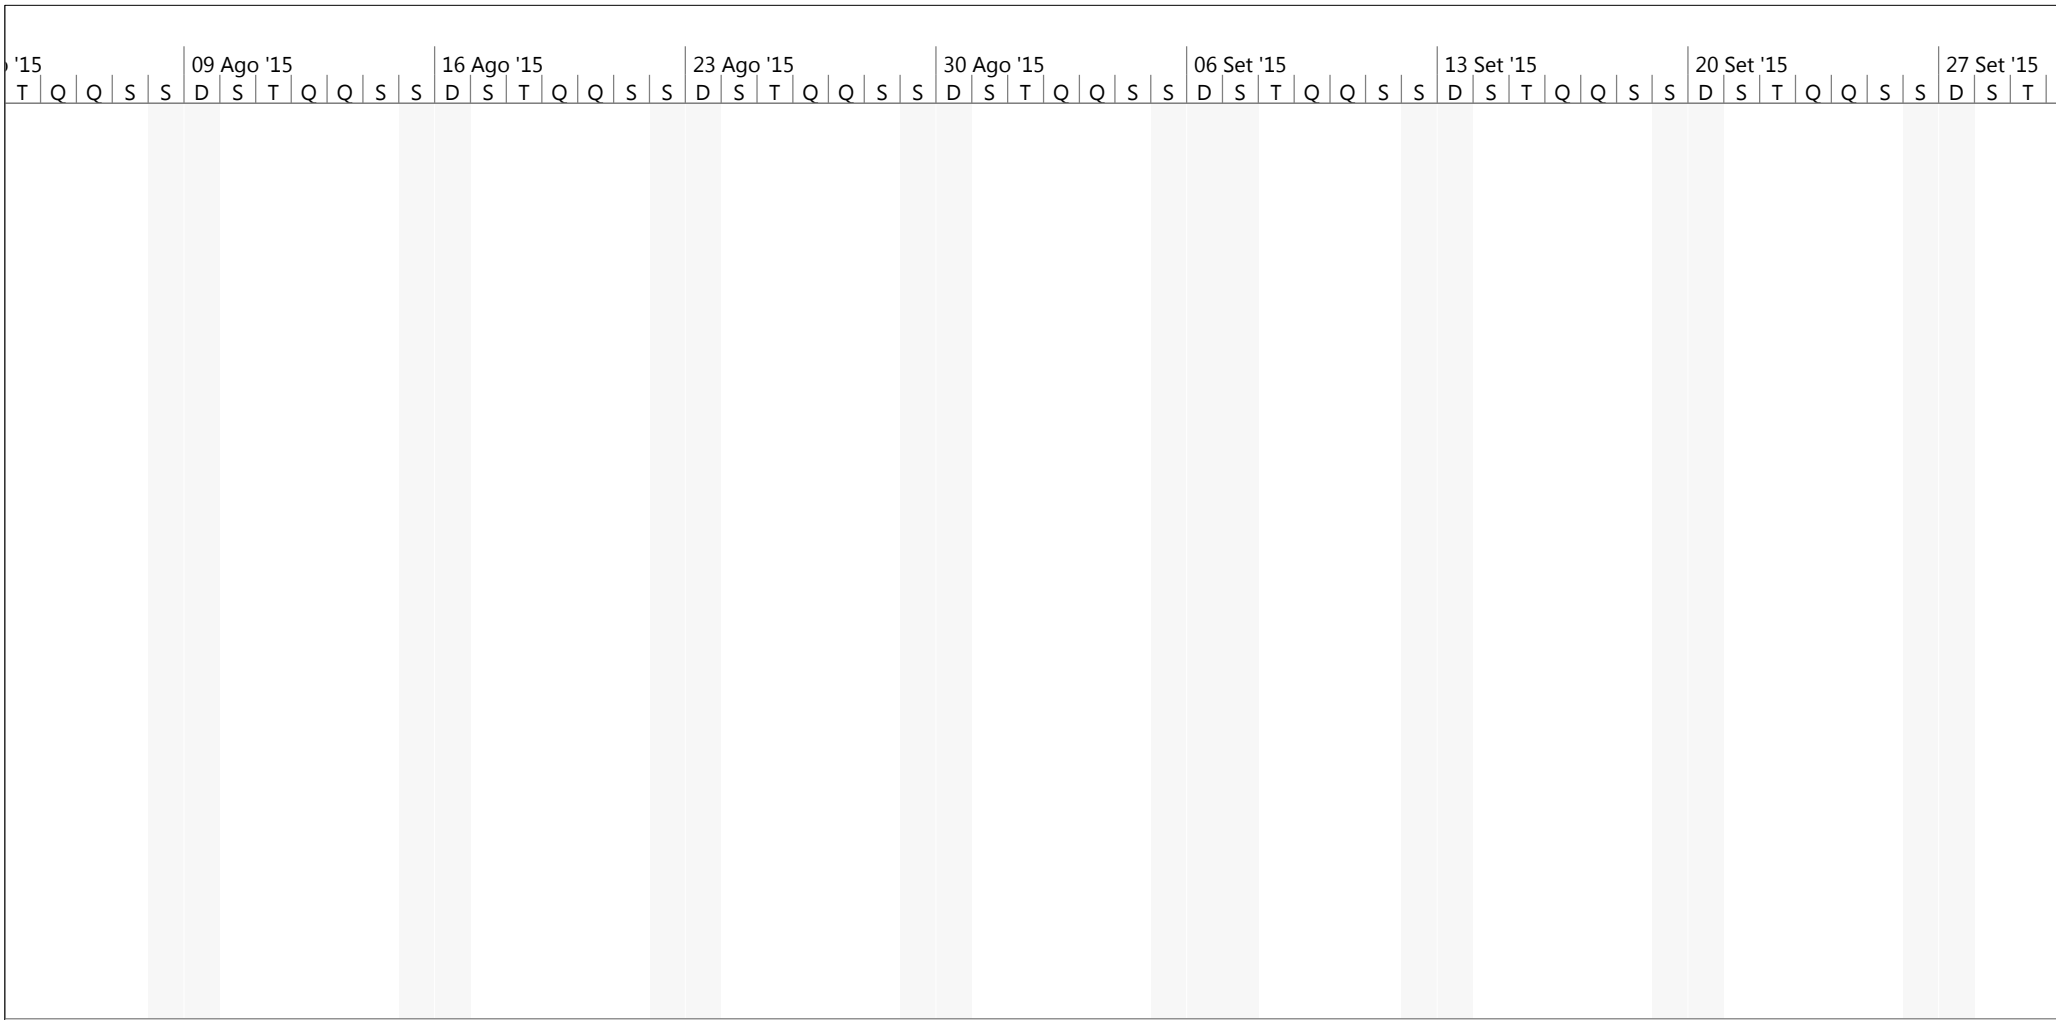


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

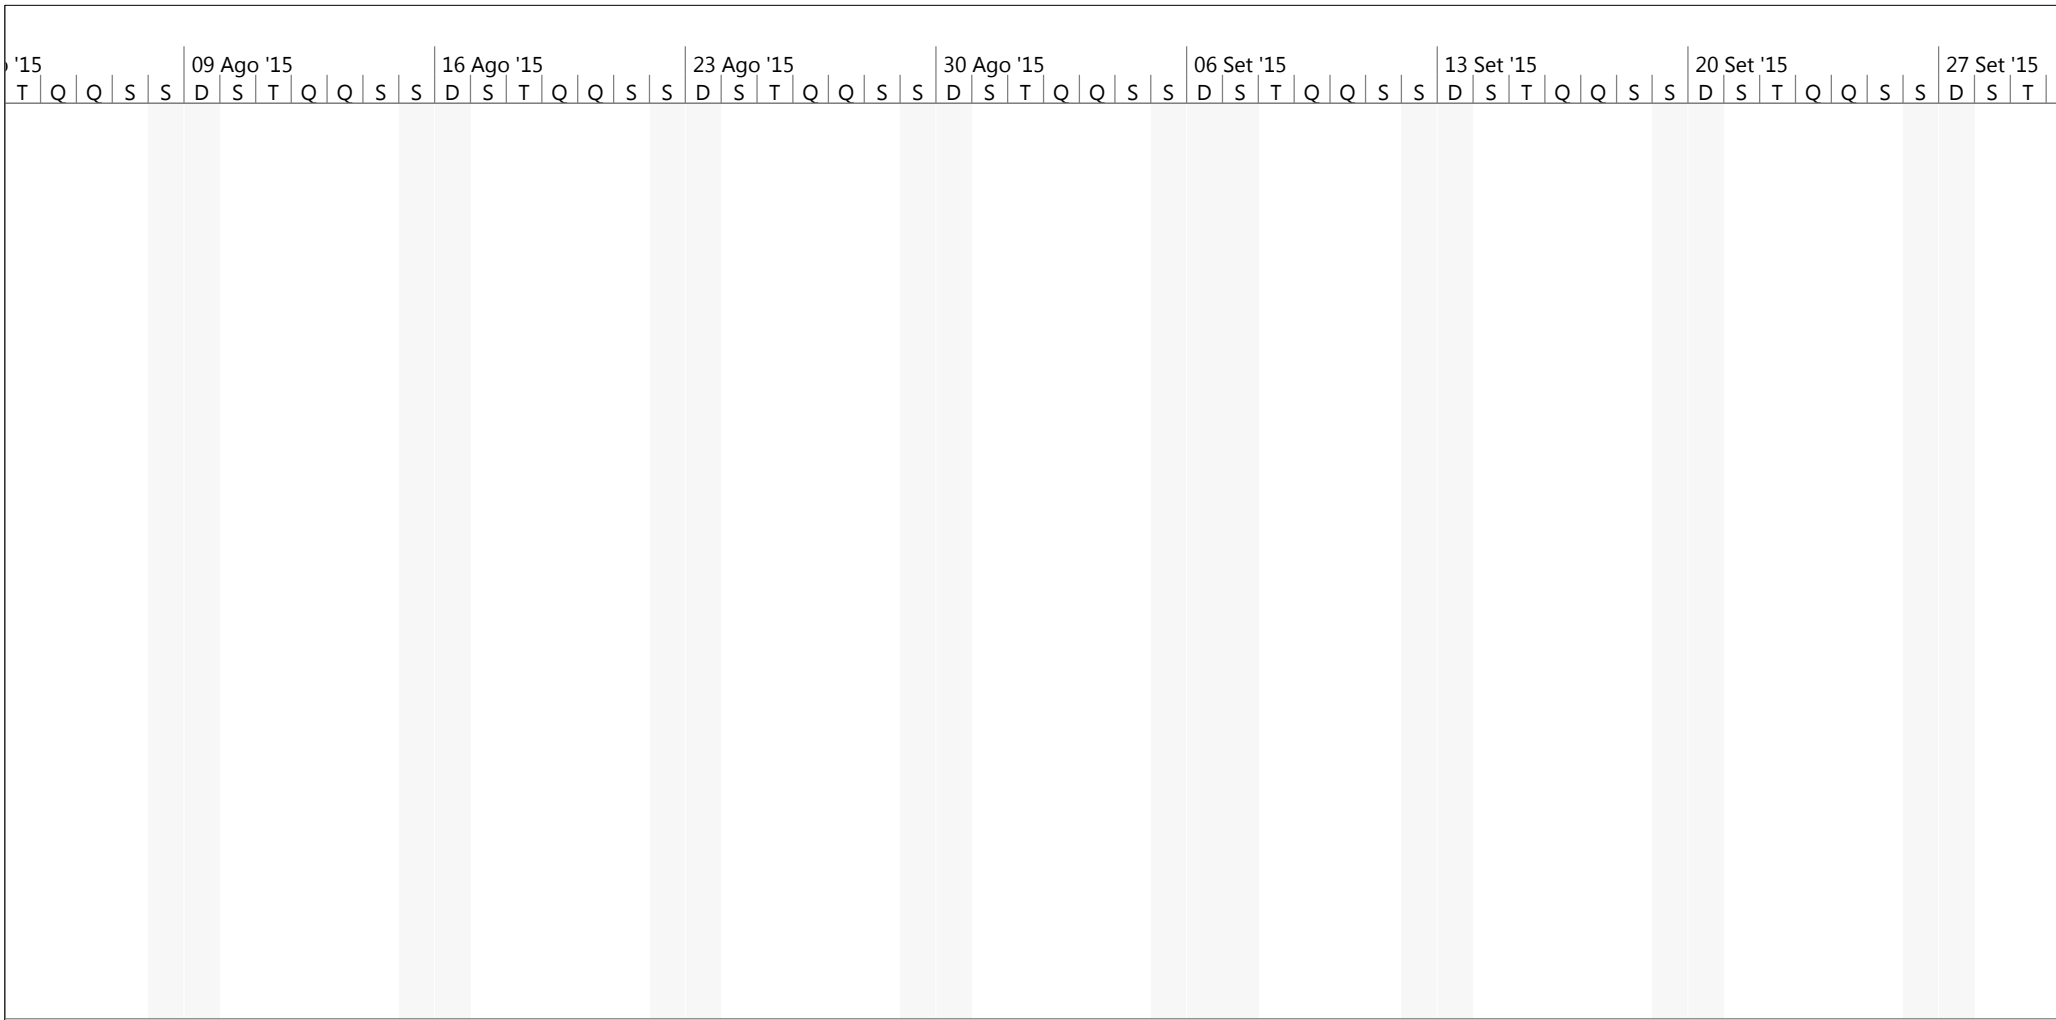

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

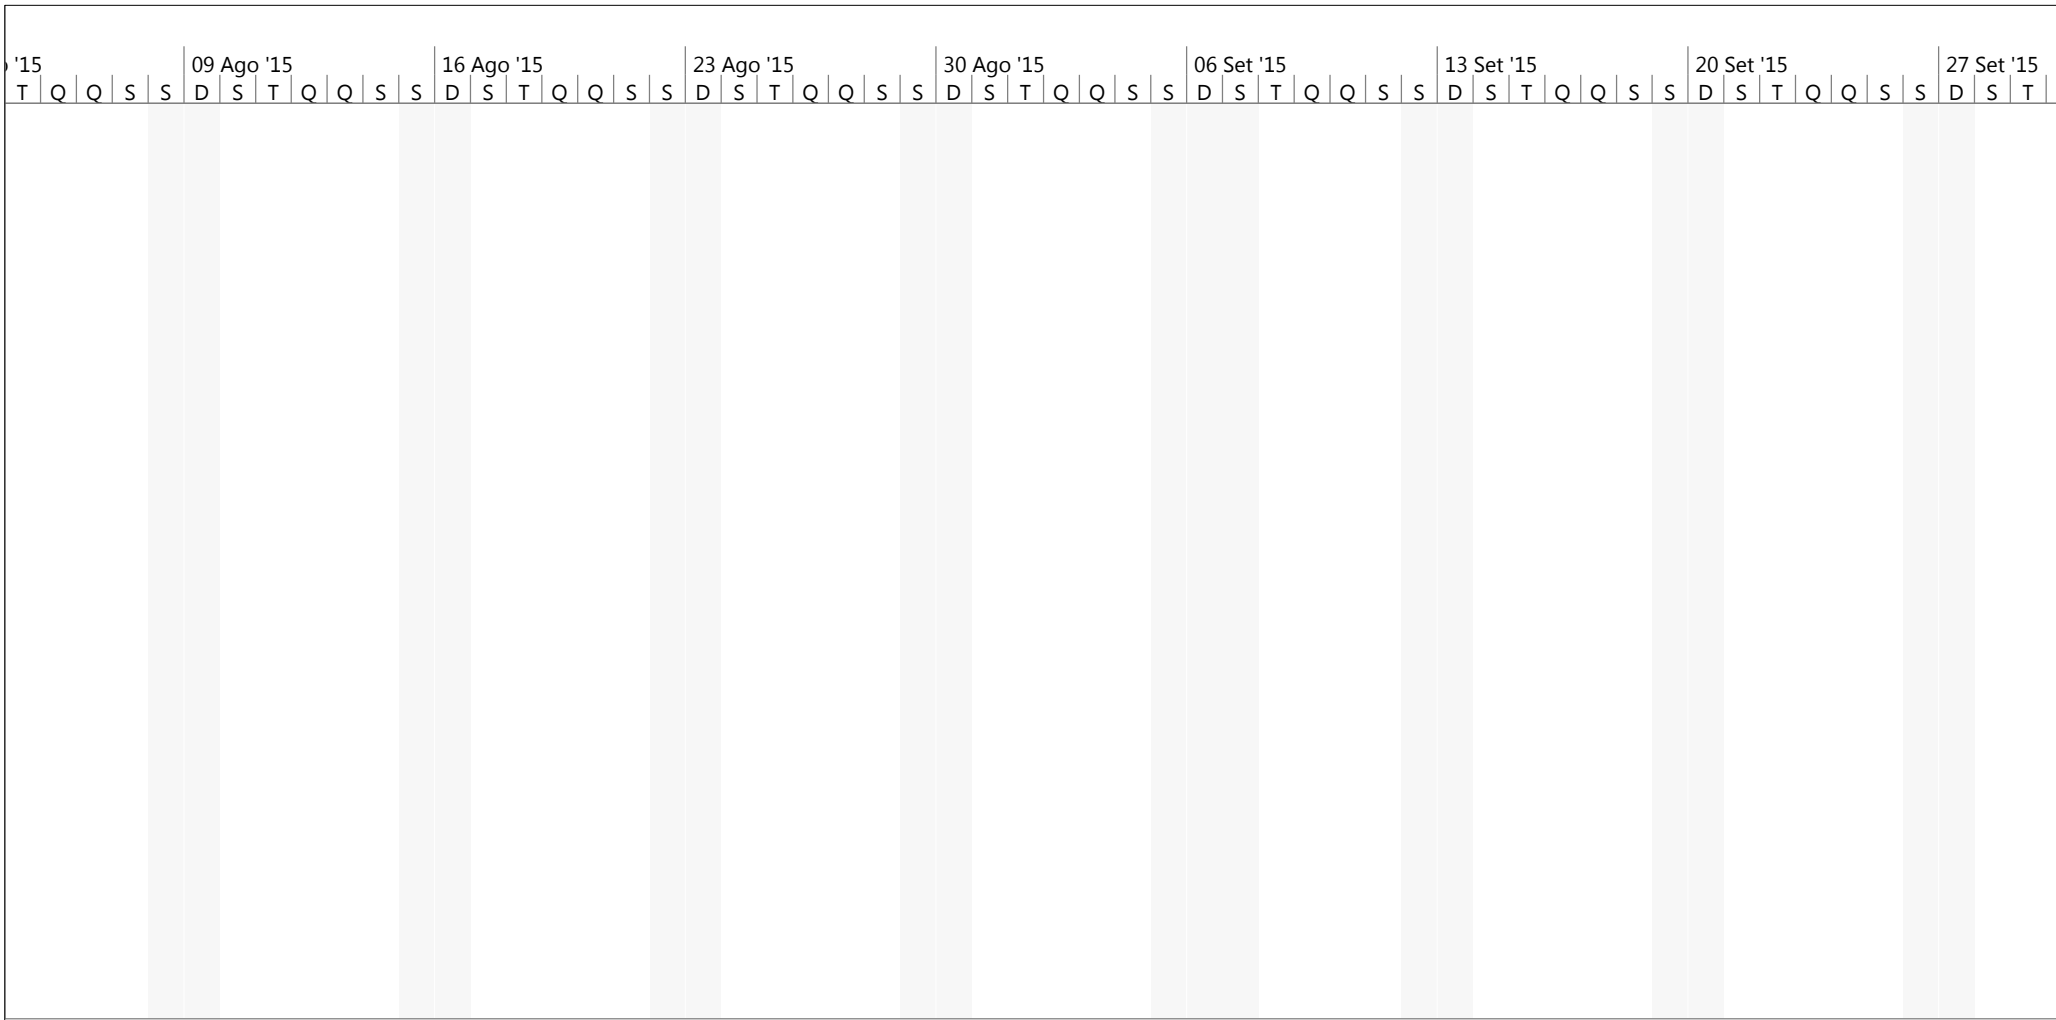


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


Q Q S S 04 Out '15 D S T Q Q S S 11 Out '15 D S T Q Q S S 18 Out '15 D S T Q Q S S 25 Out '15 D S T Q Q S S 01 Nov '15 D S T Q Q S S 08 Nov '15 D S T Q Q S S 15 Nov '15 D S T Q Q S S 22 Nov '15 D S T Q

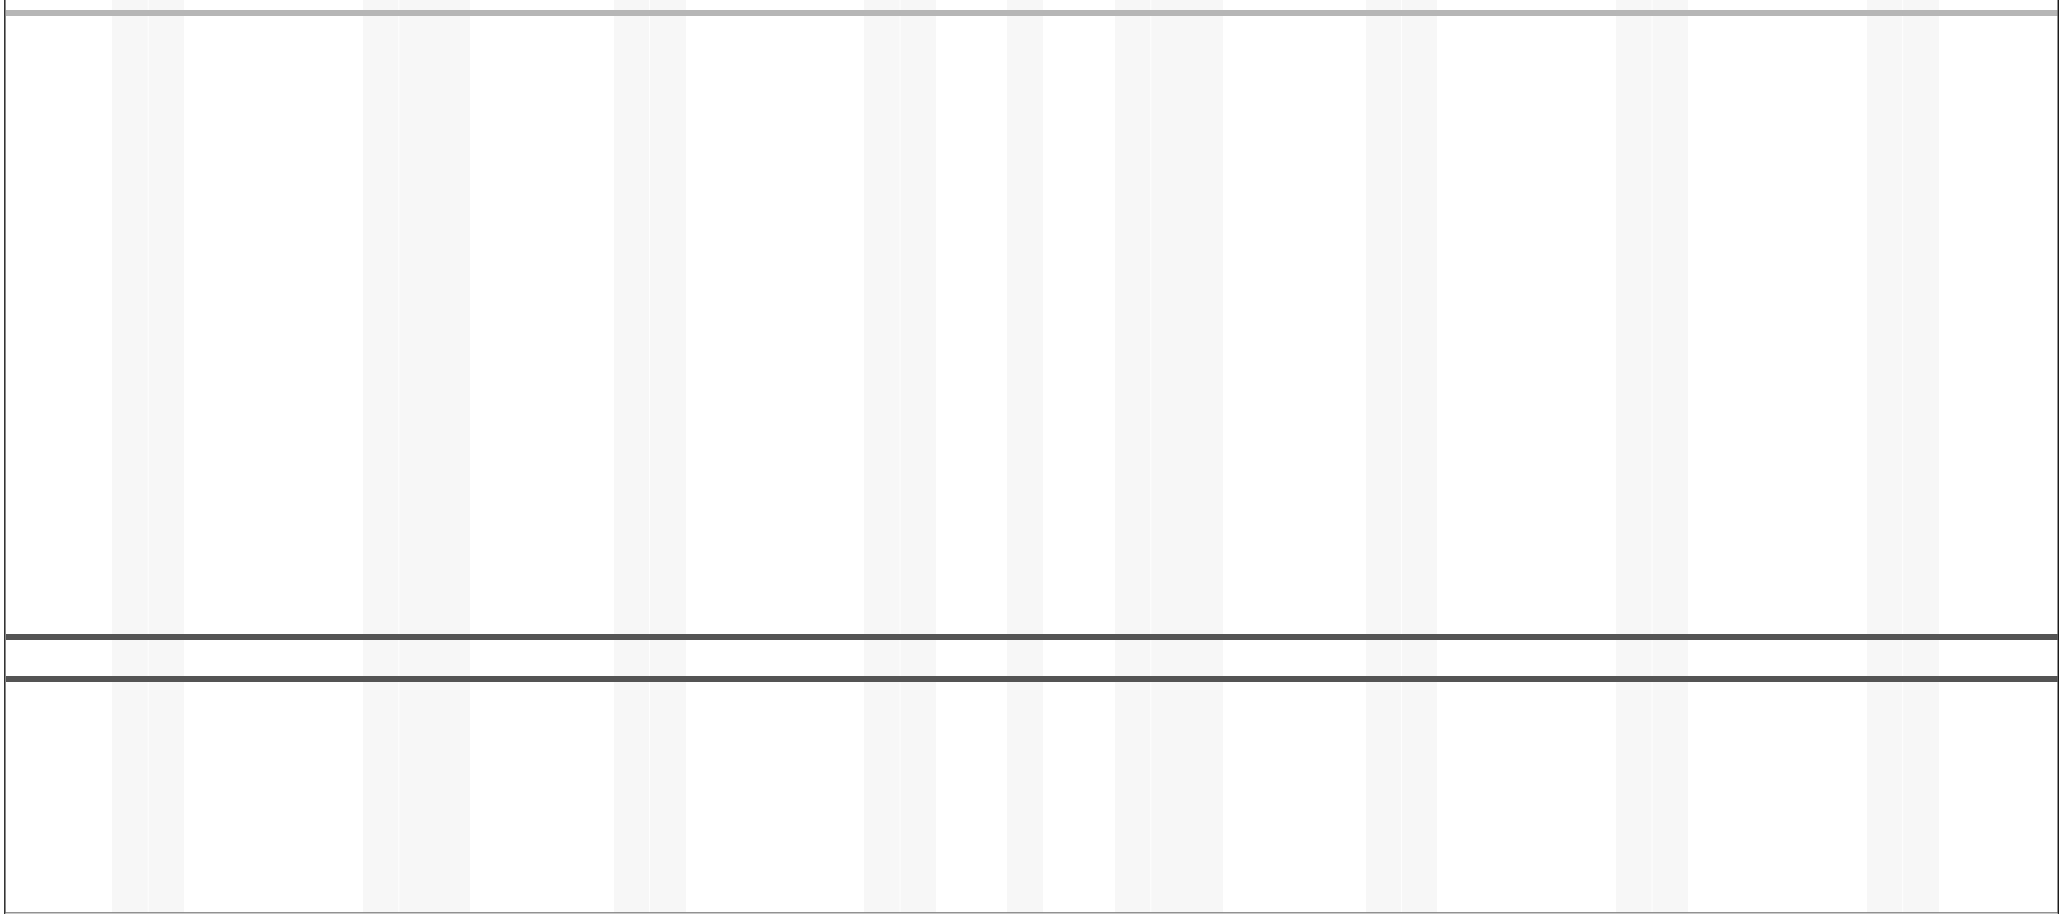


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

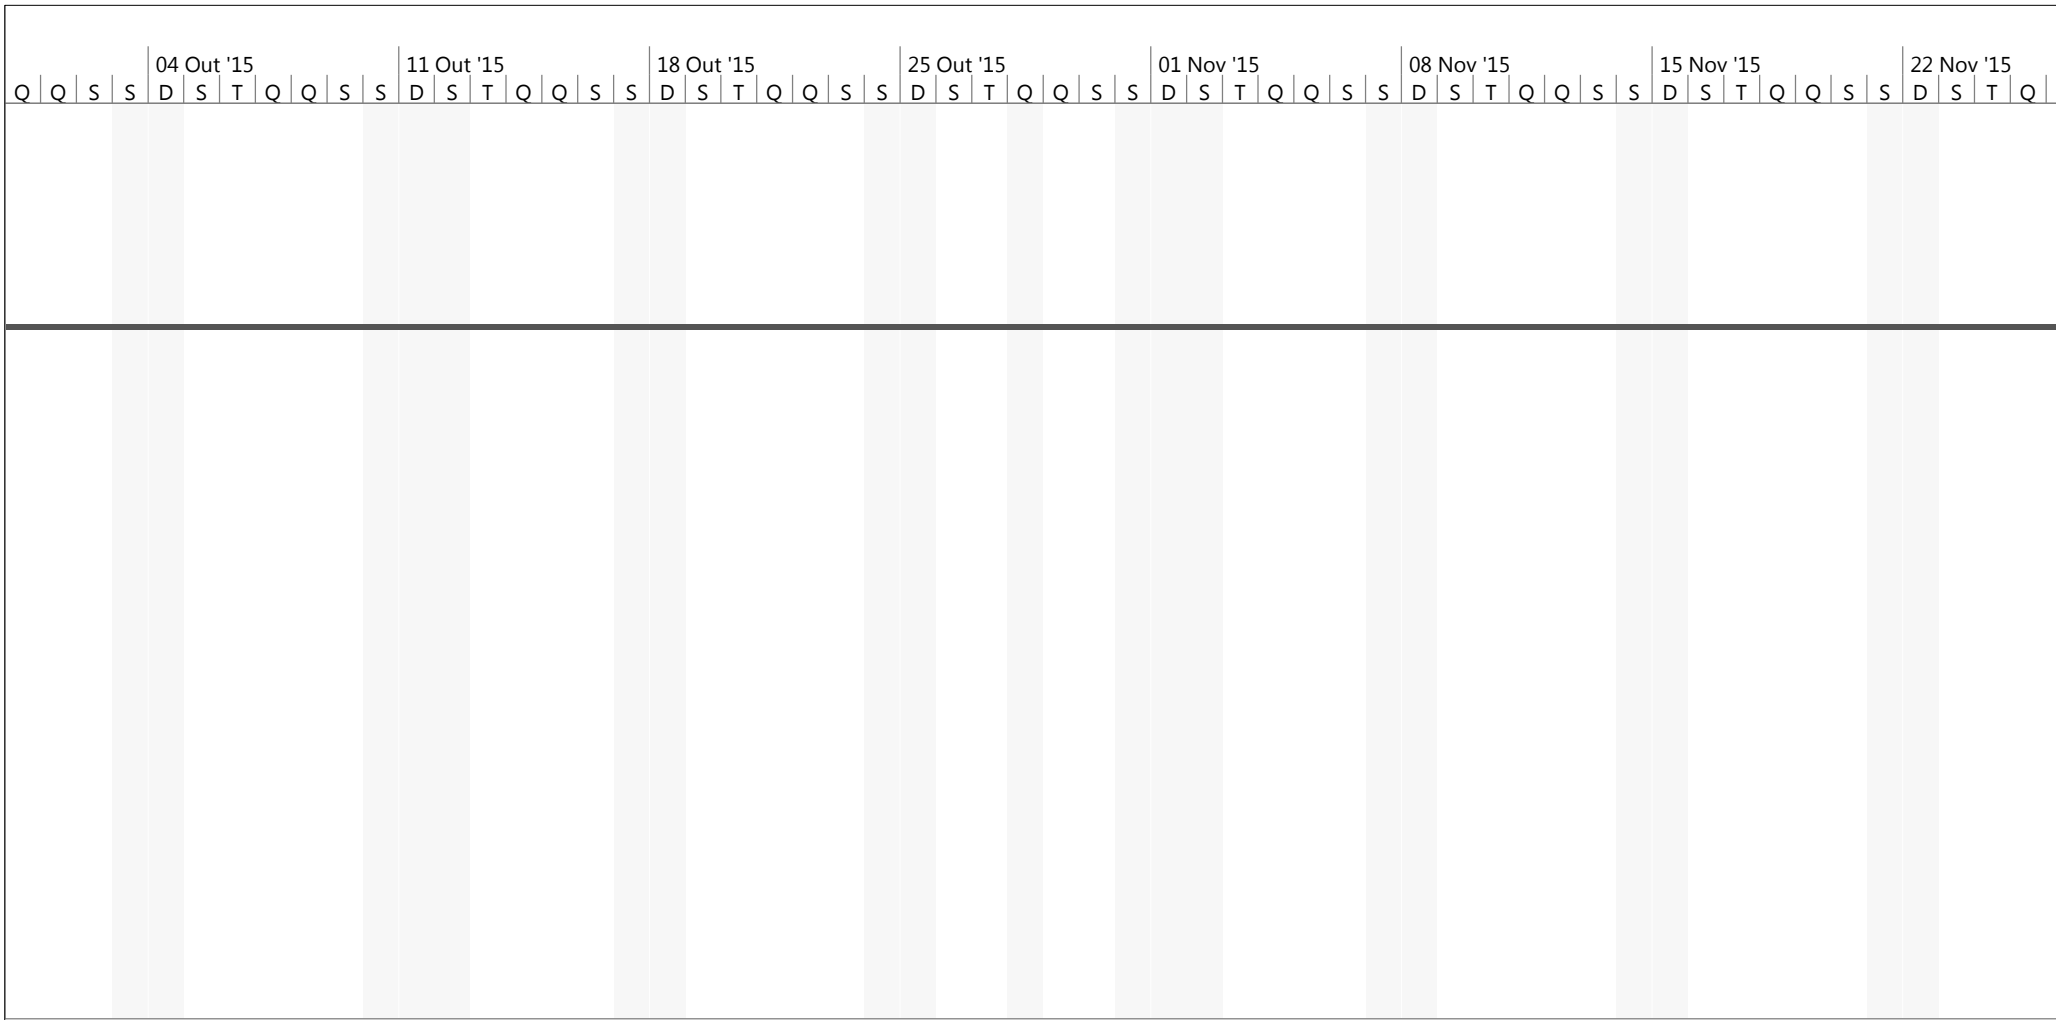


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

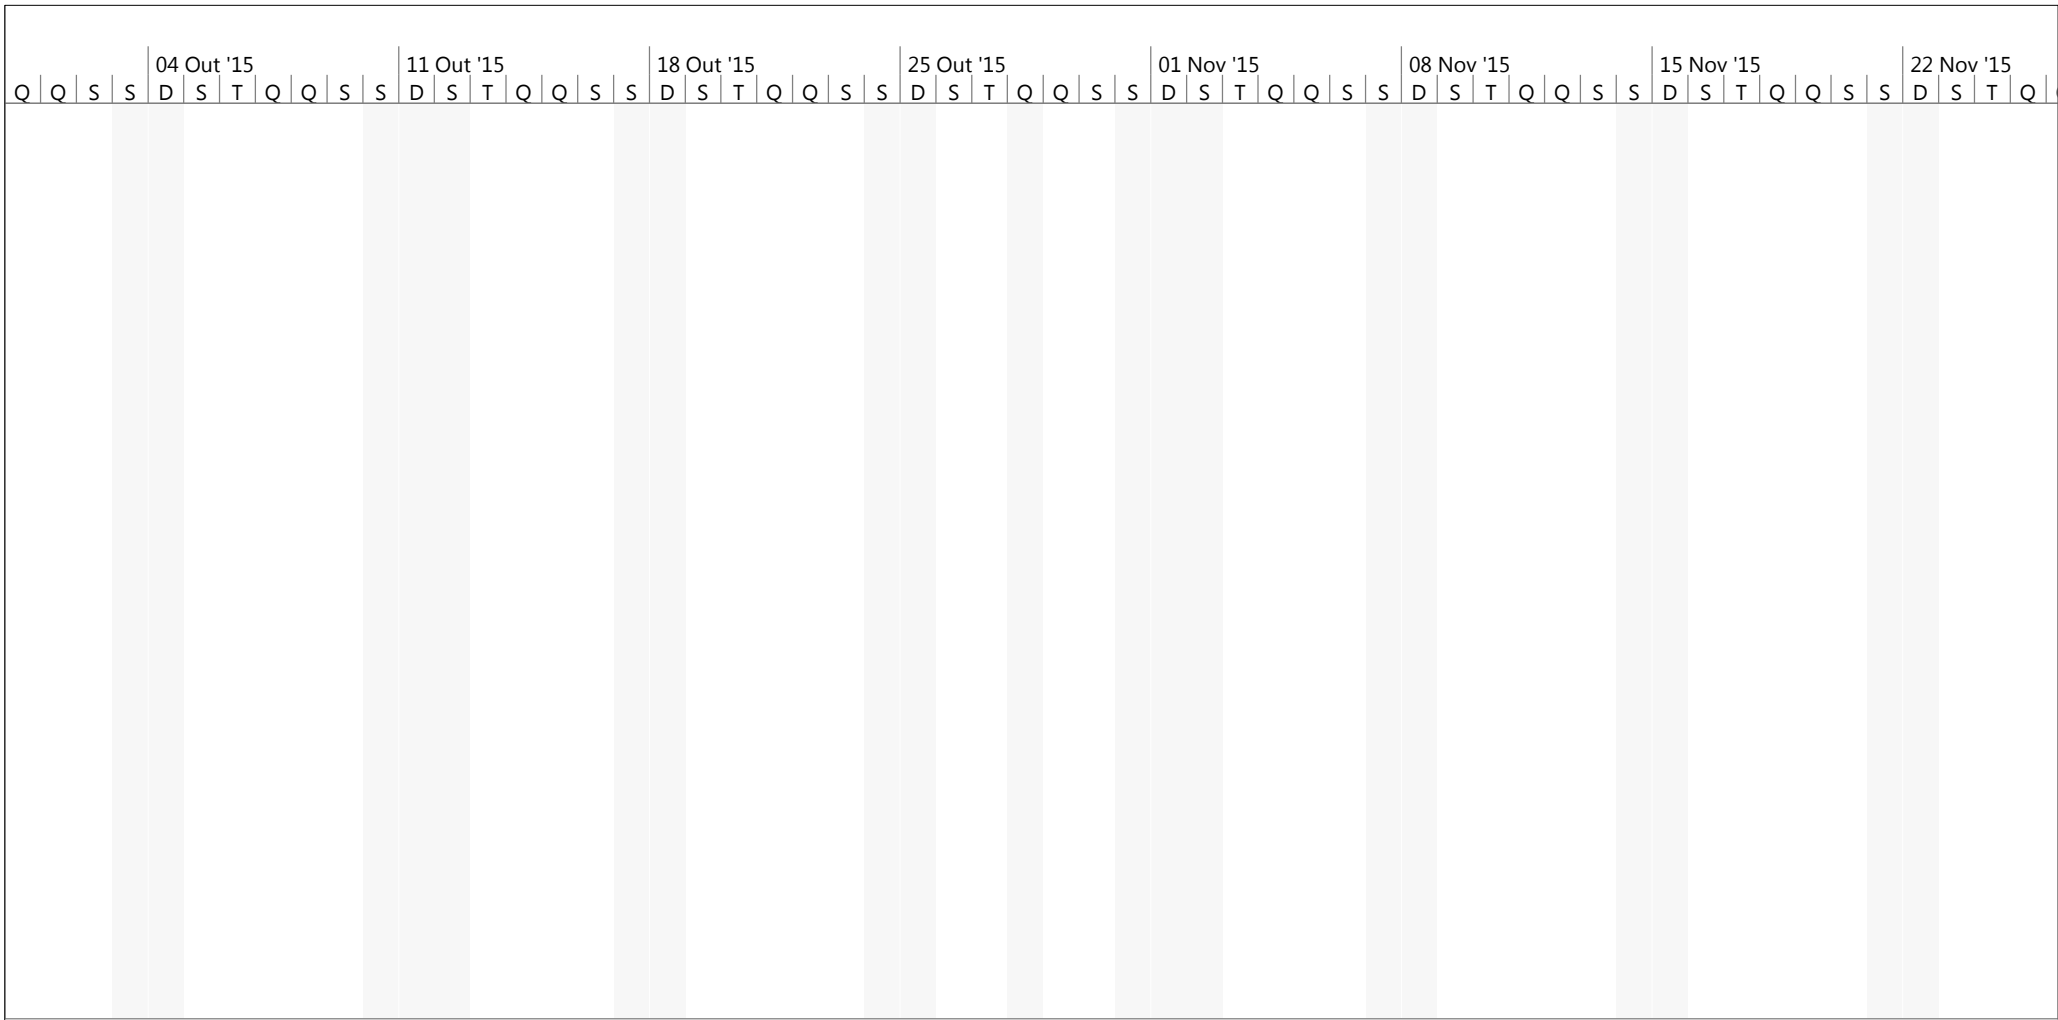


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

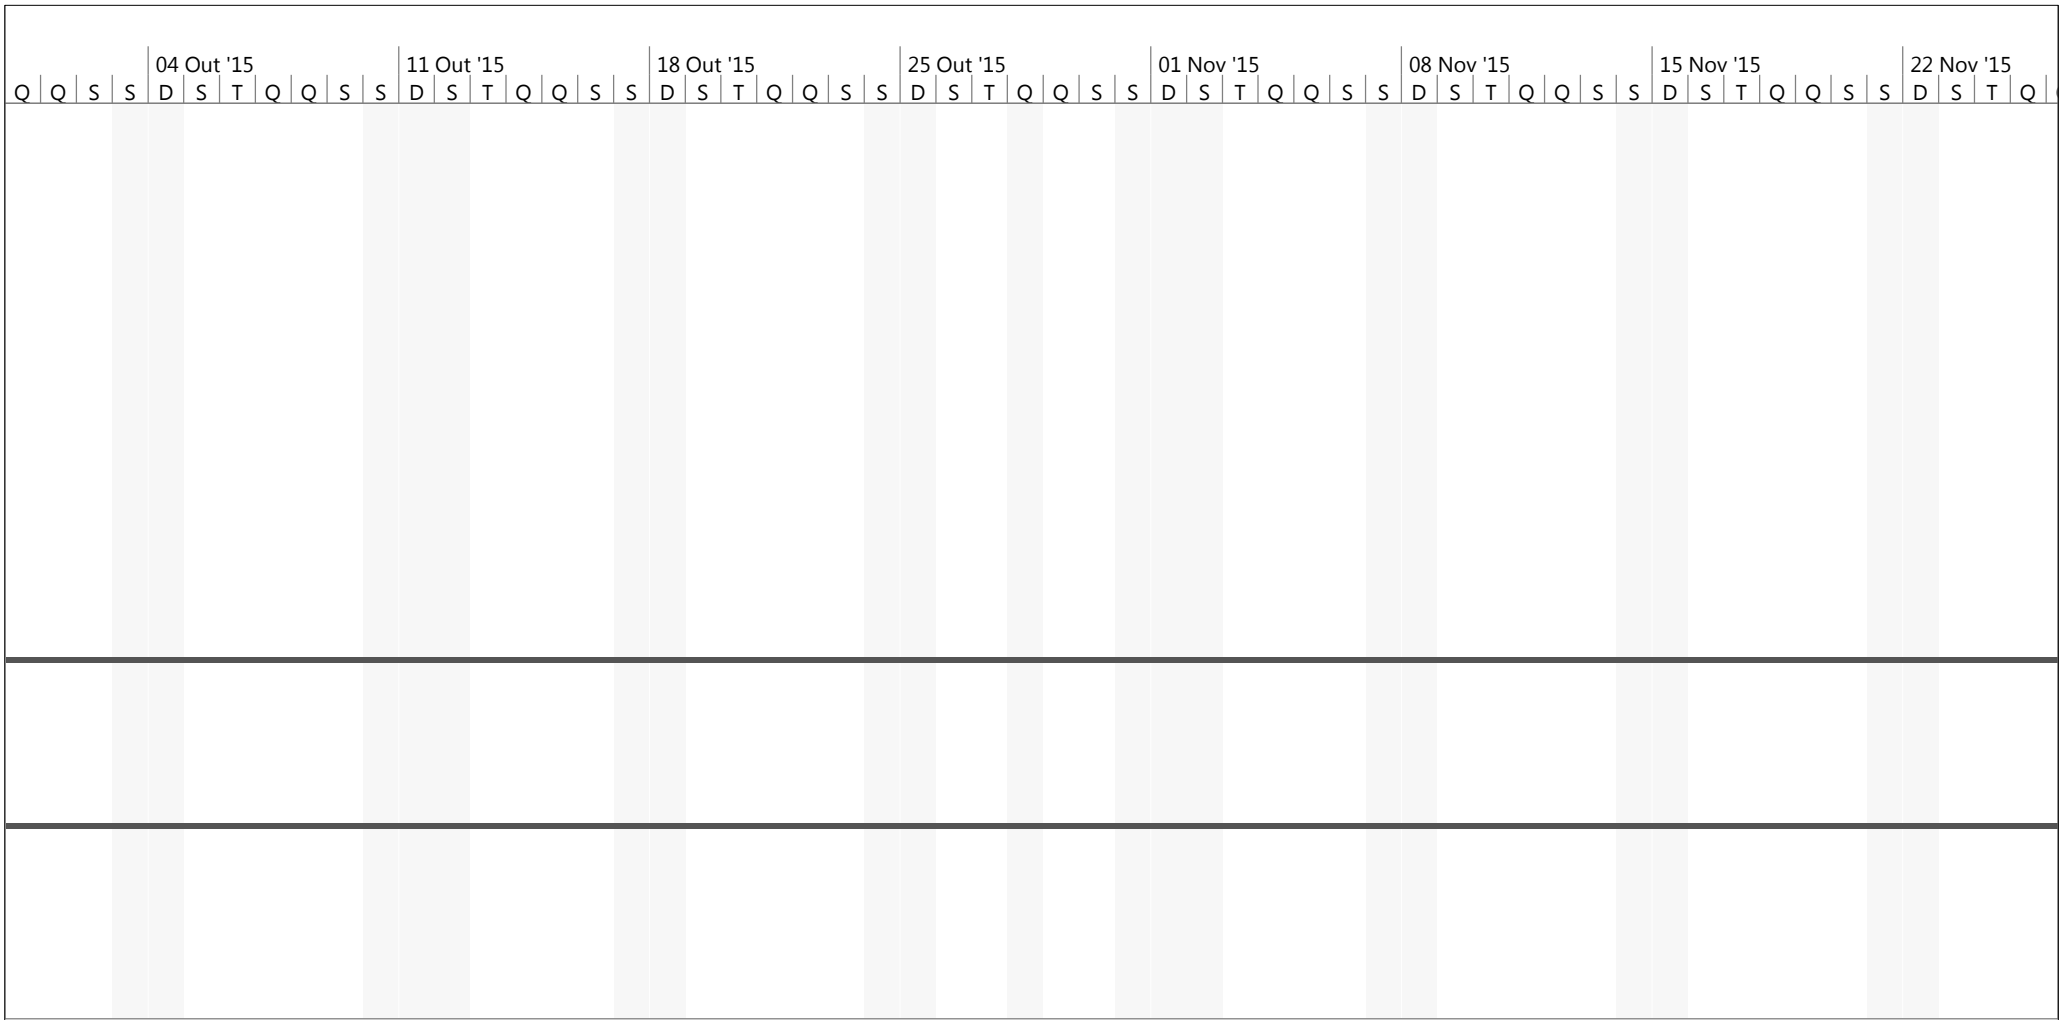


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

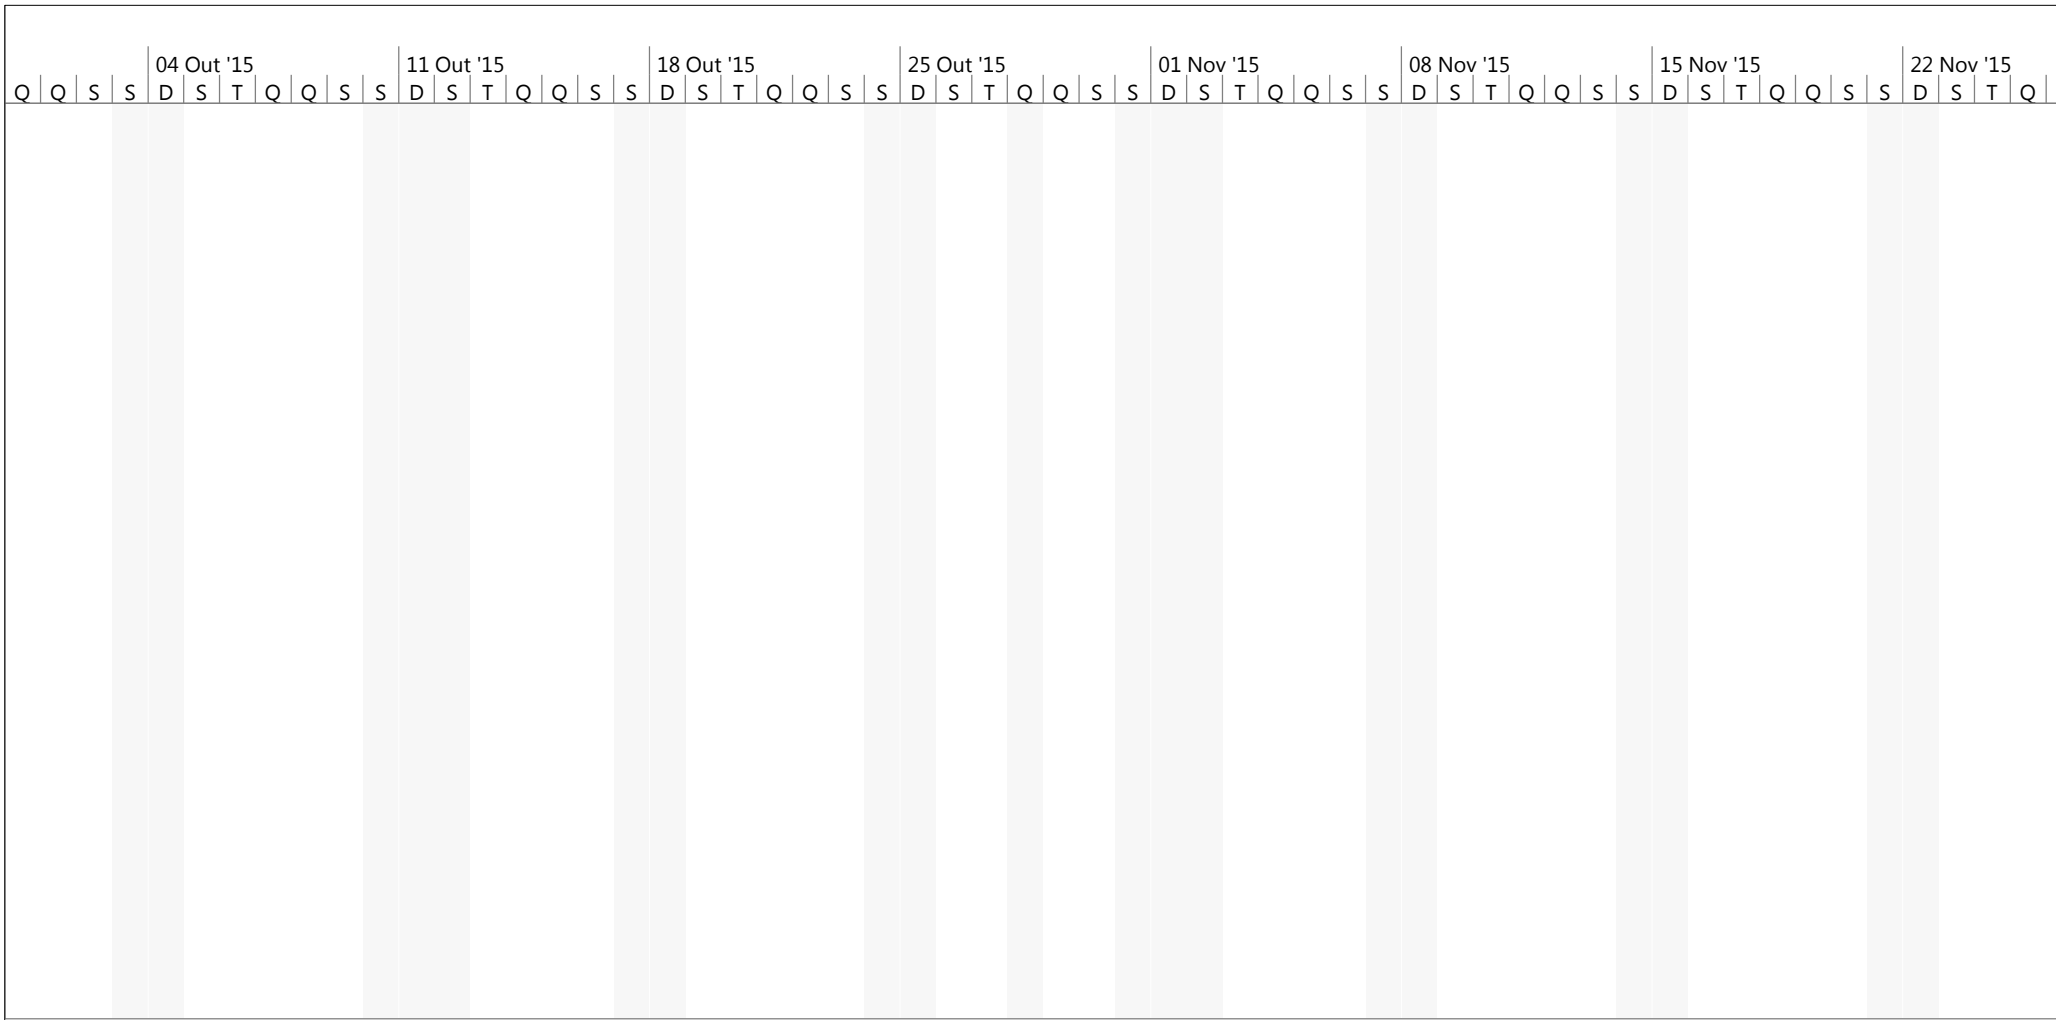


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

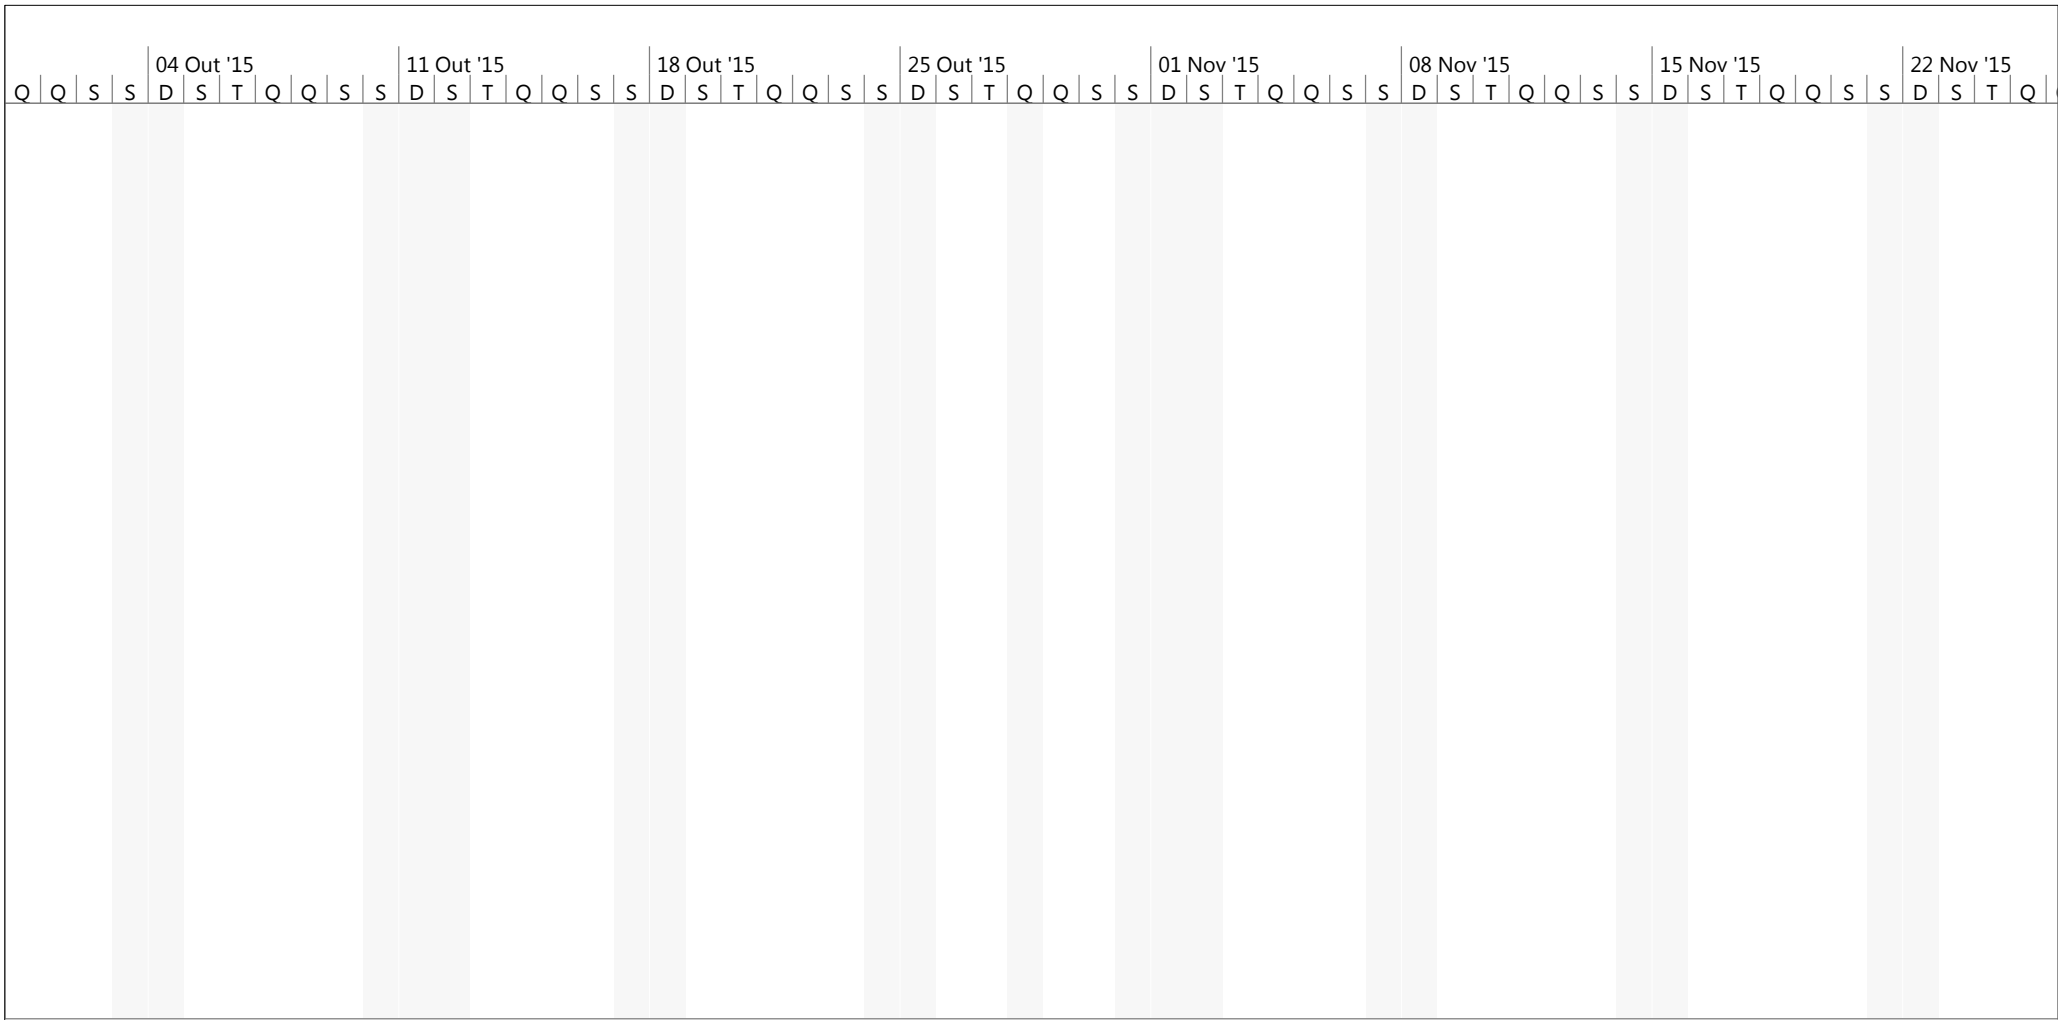


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

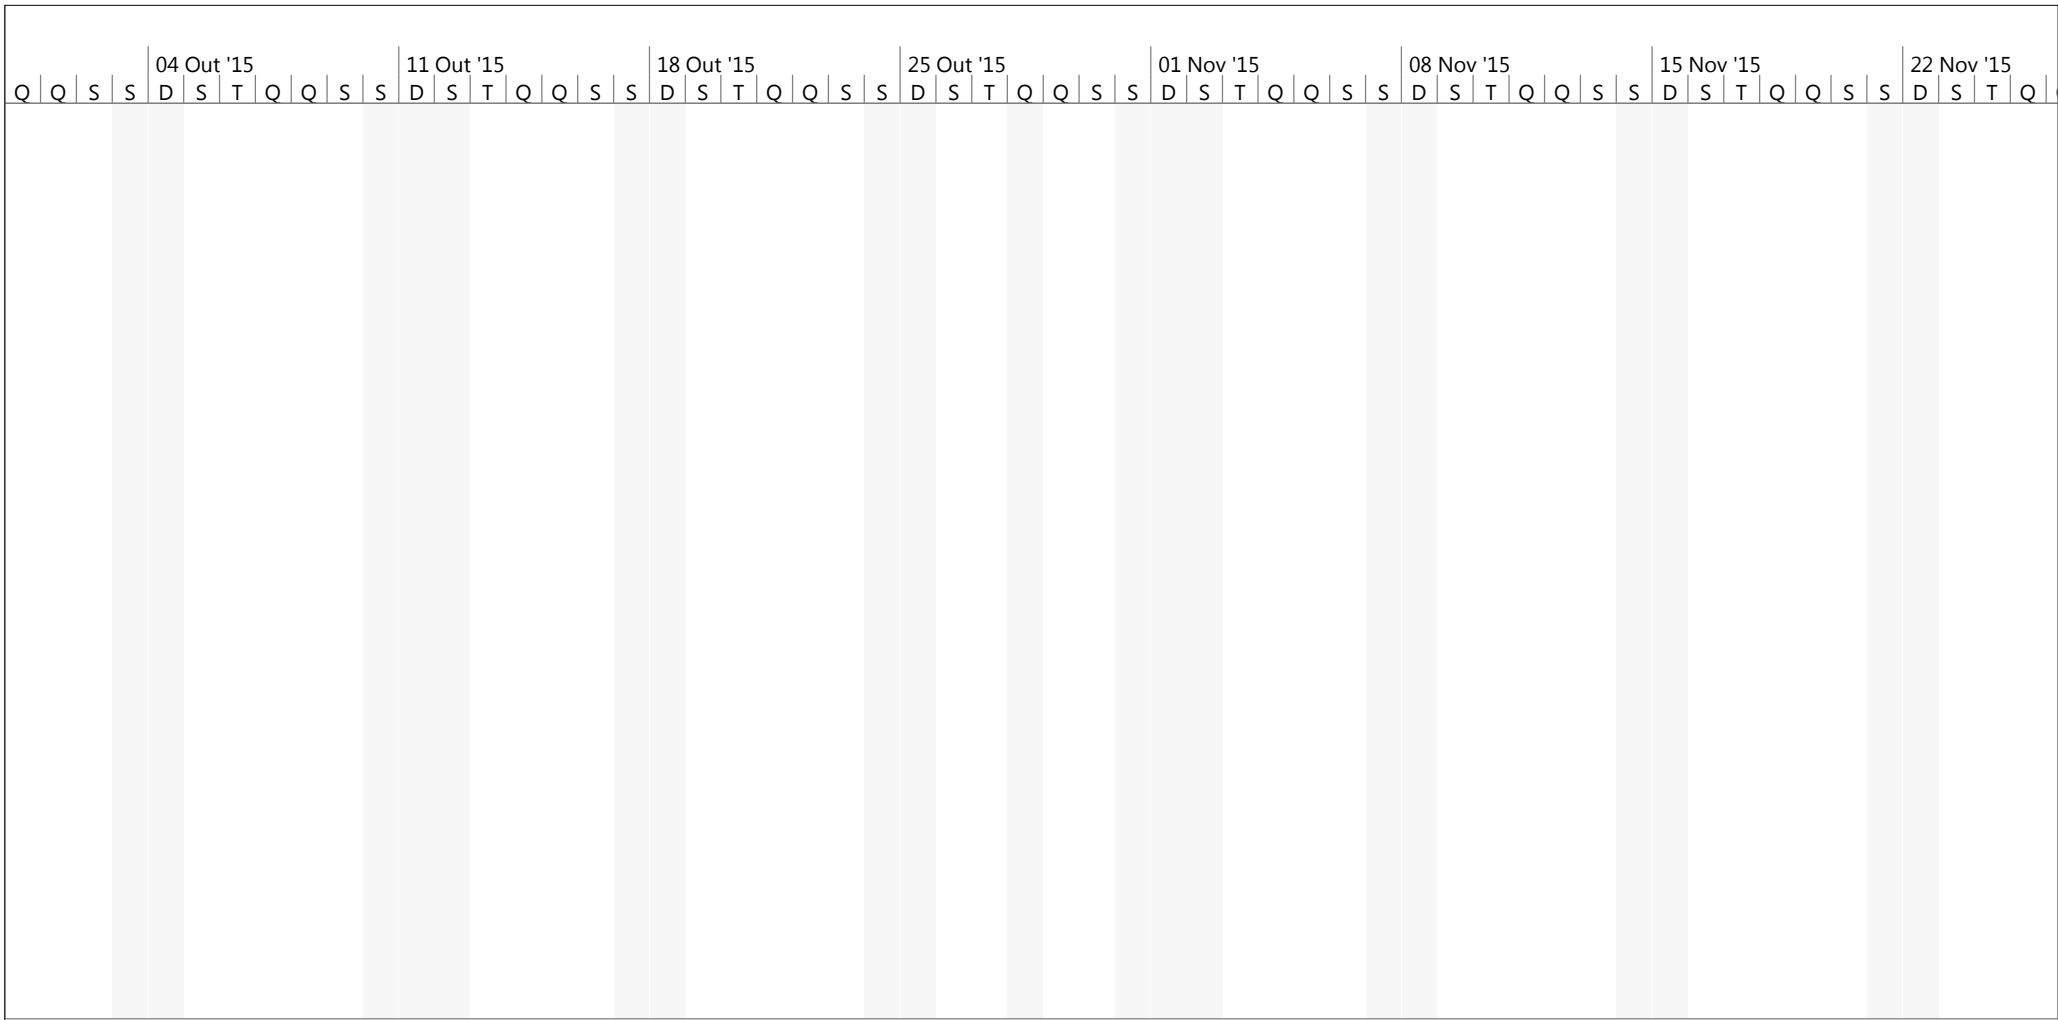


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

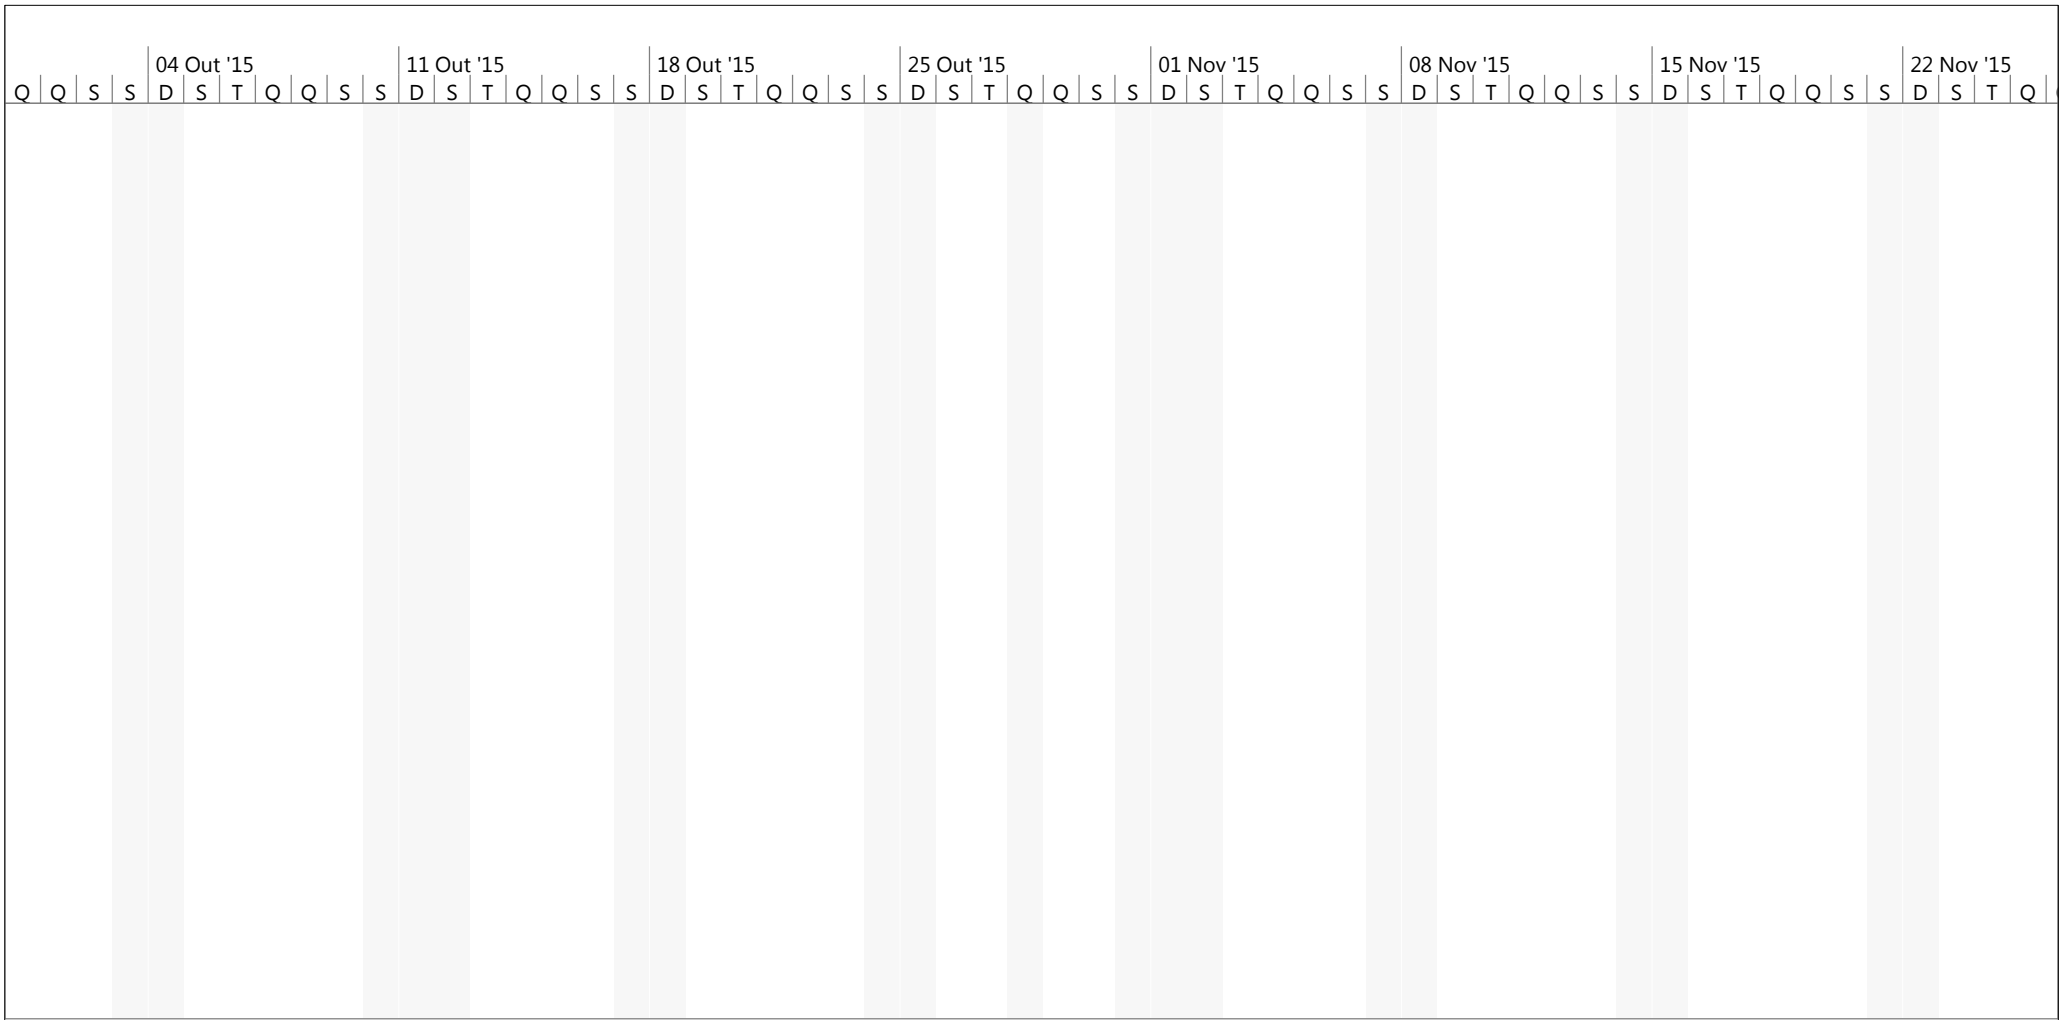


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

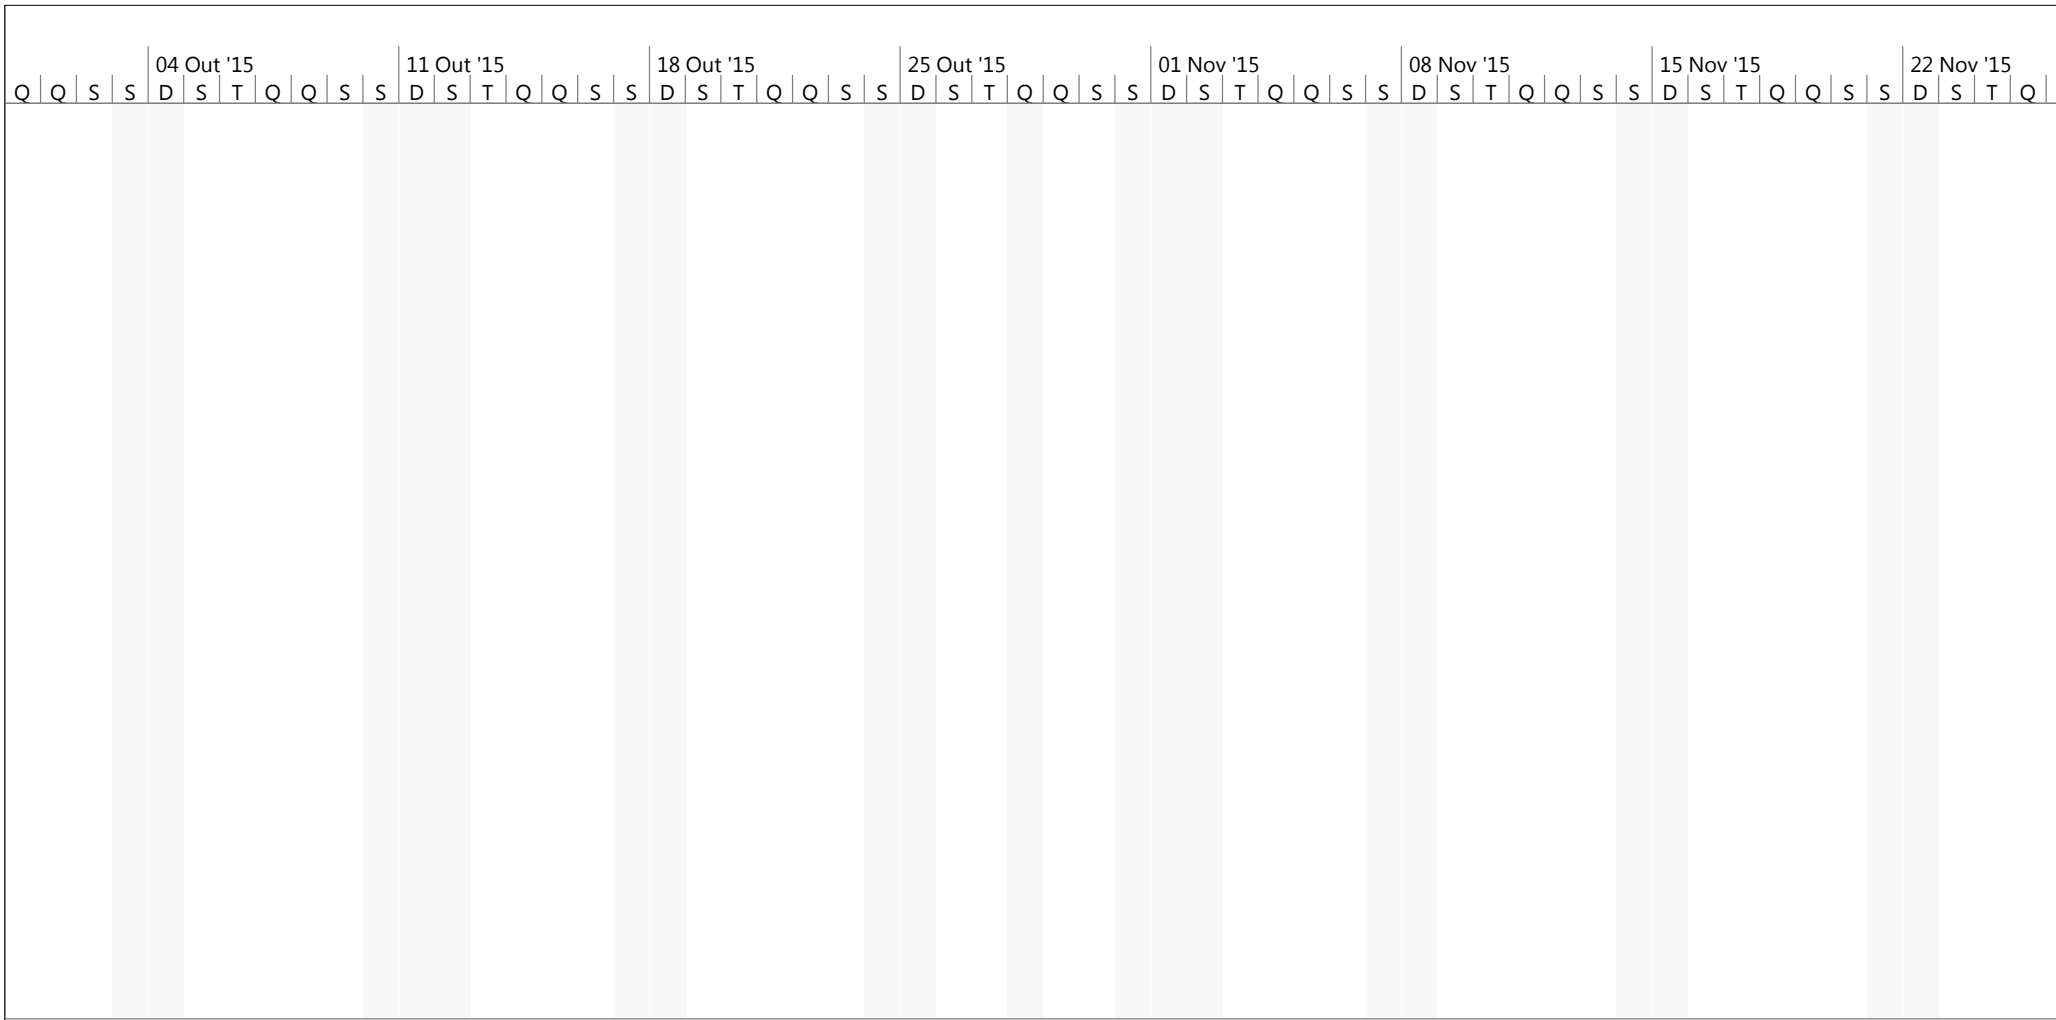


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

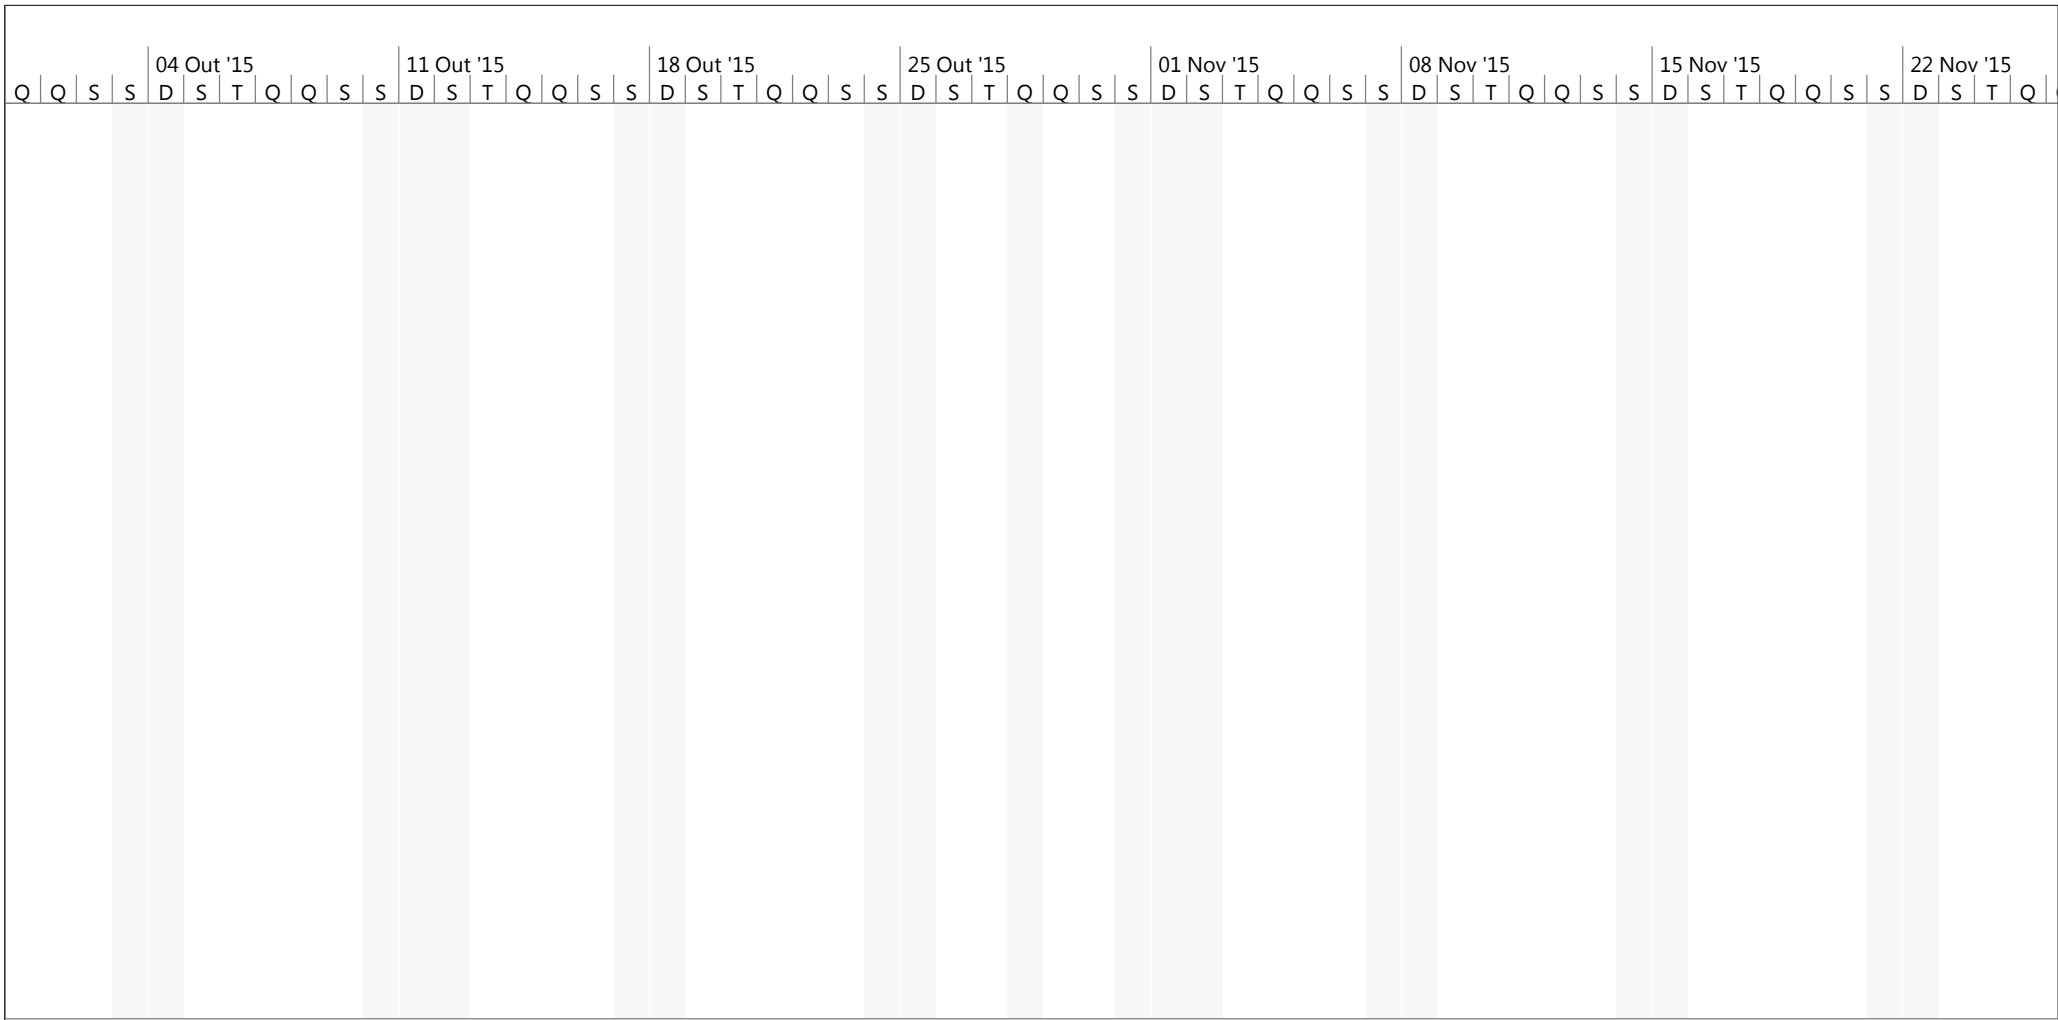


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

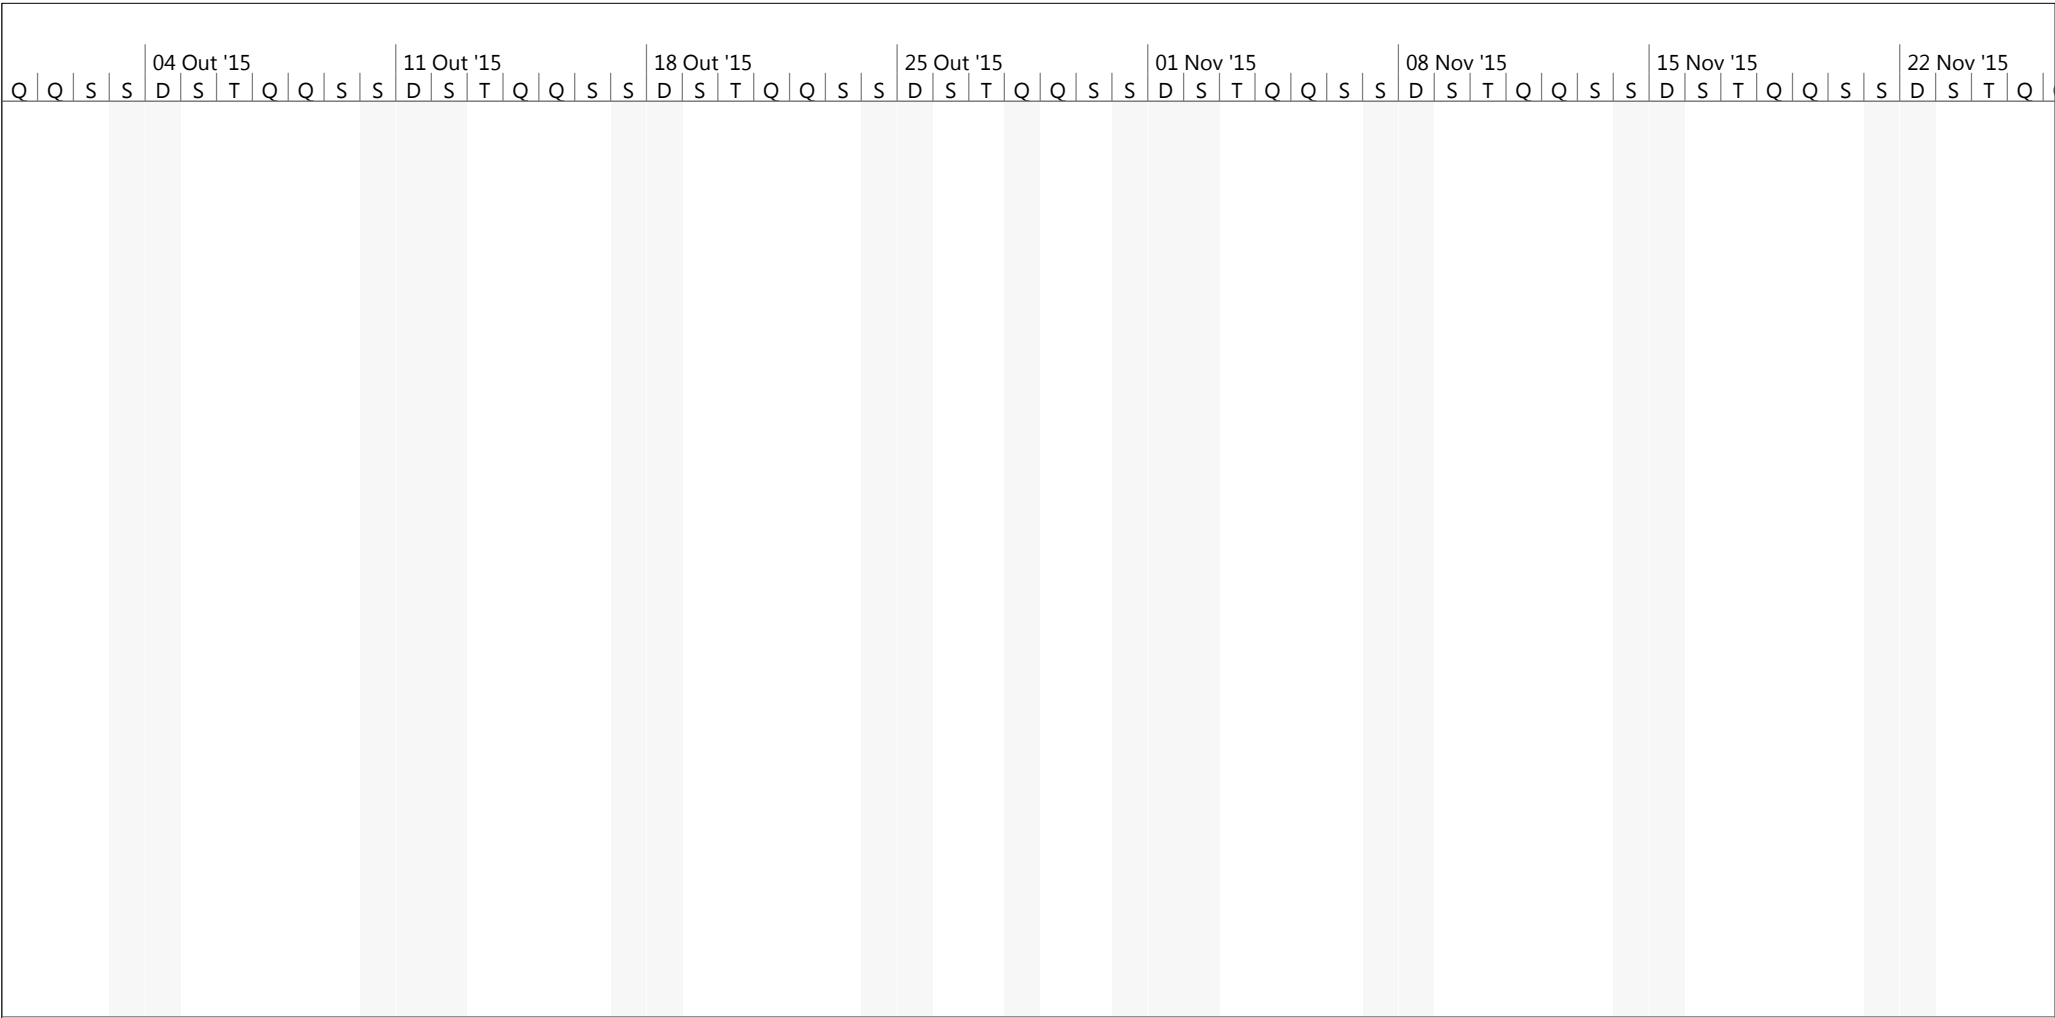


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

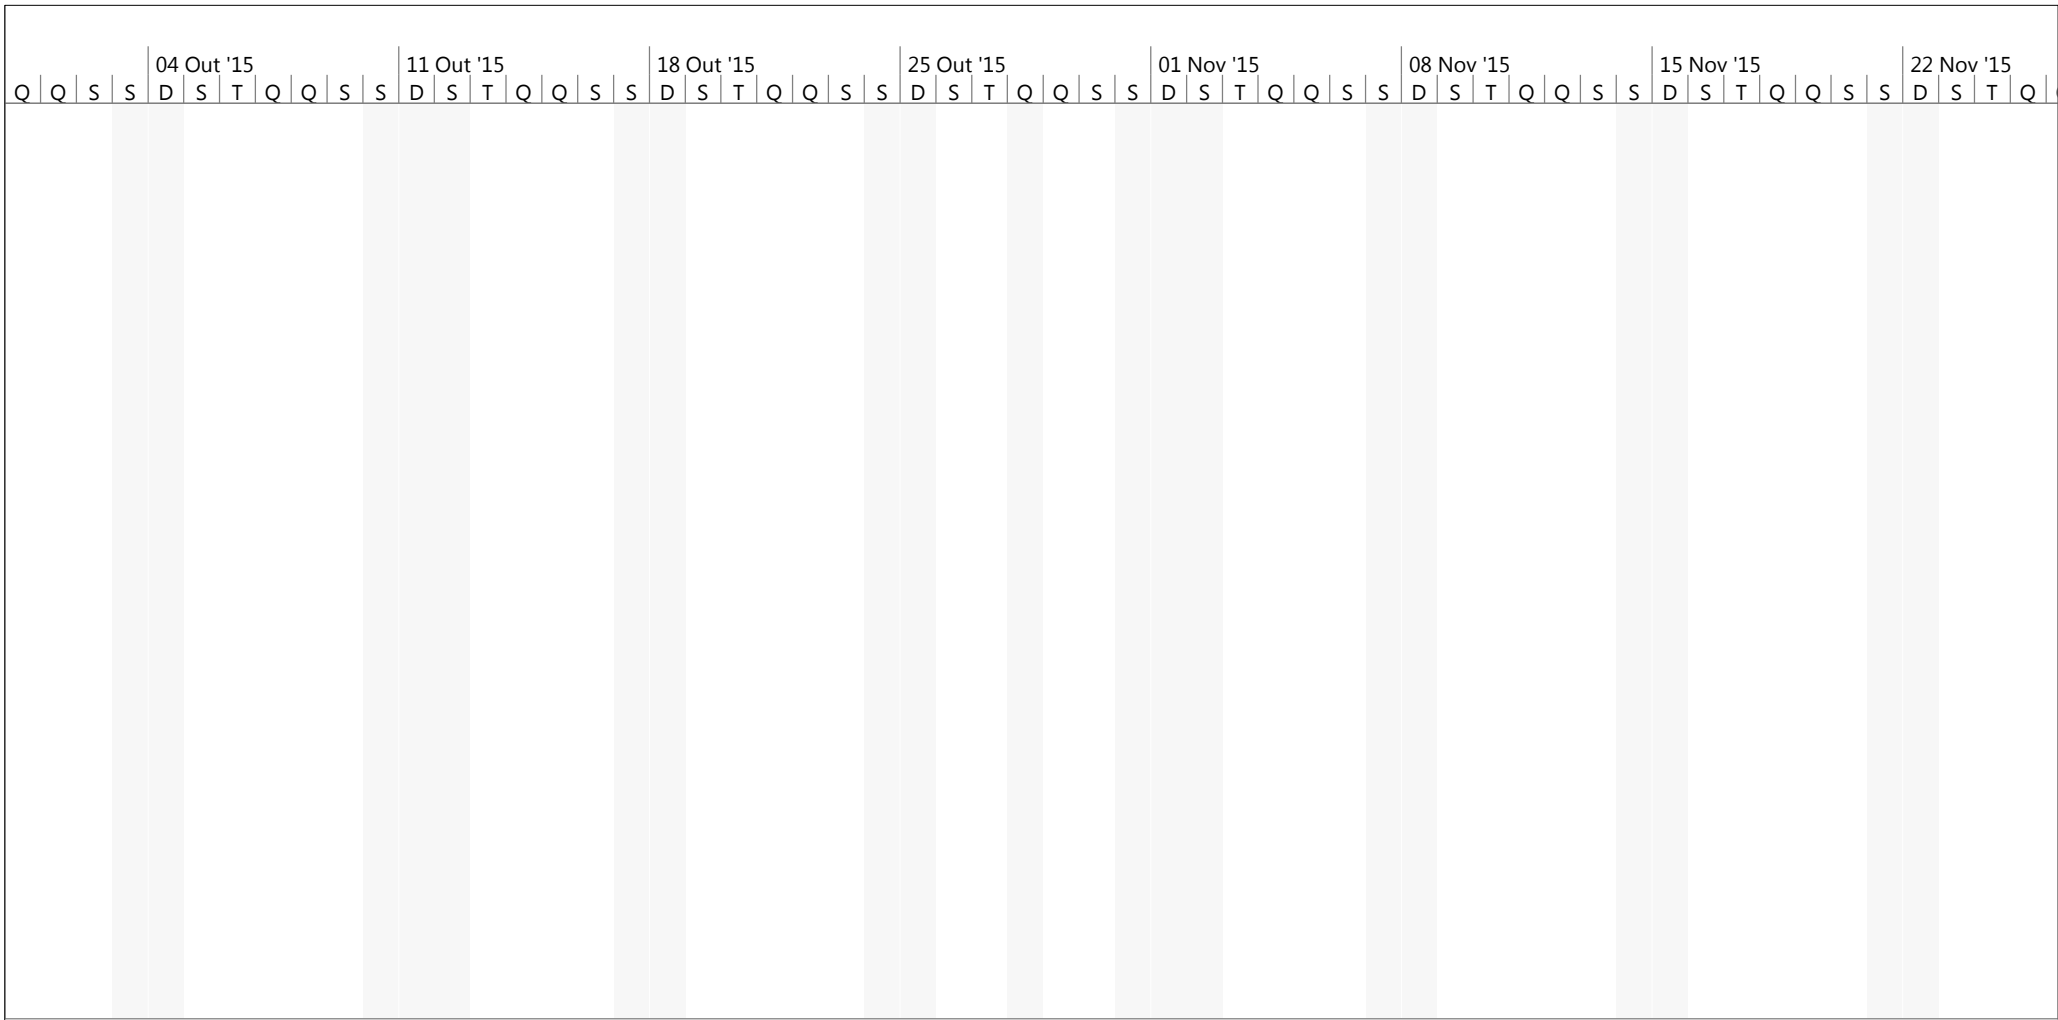


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

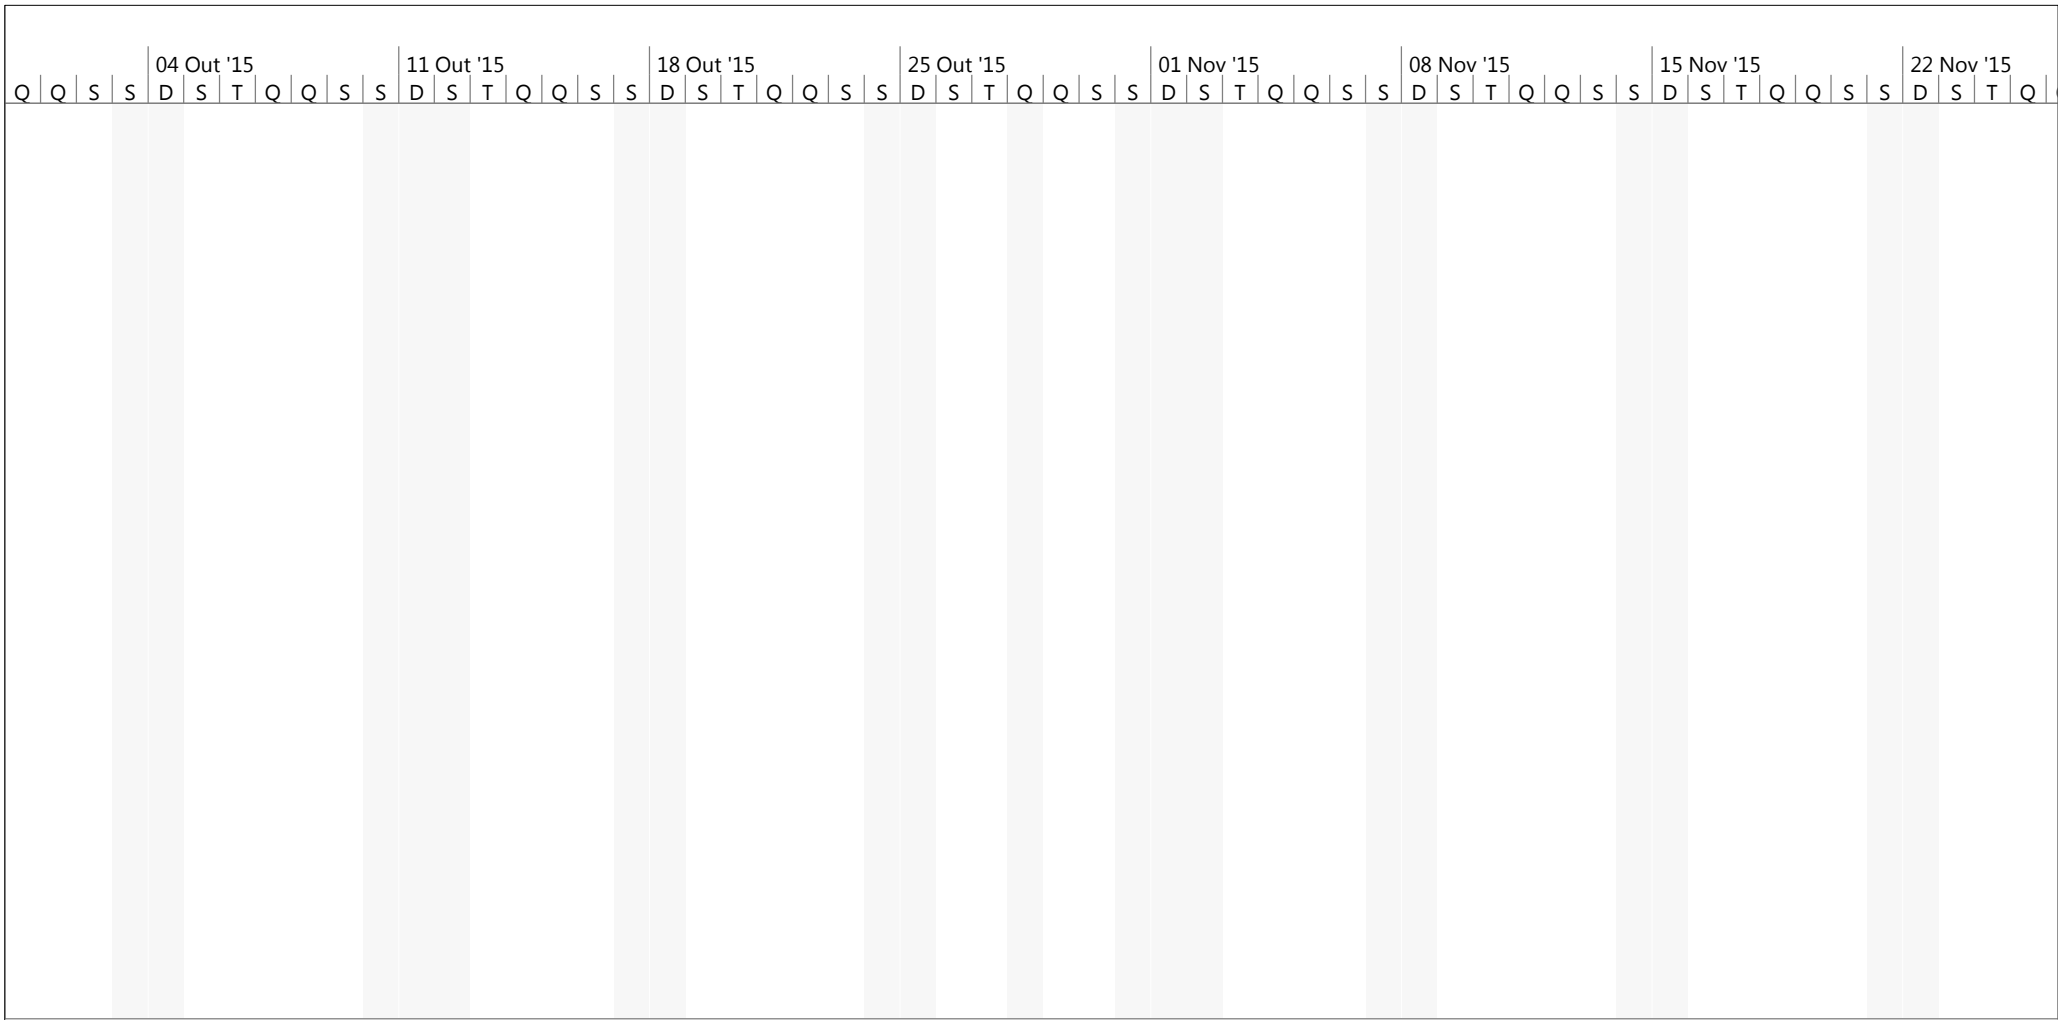


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

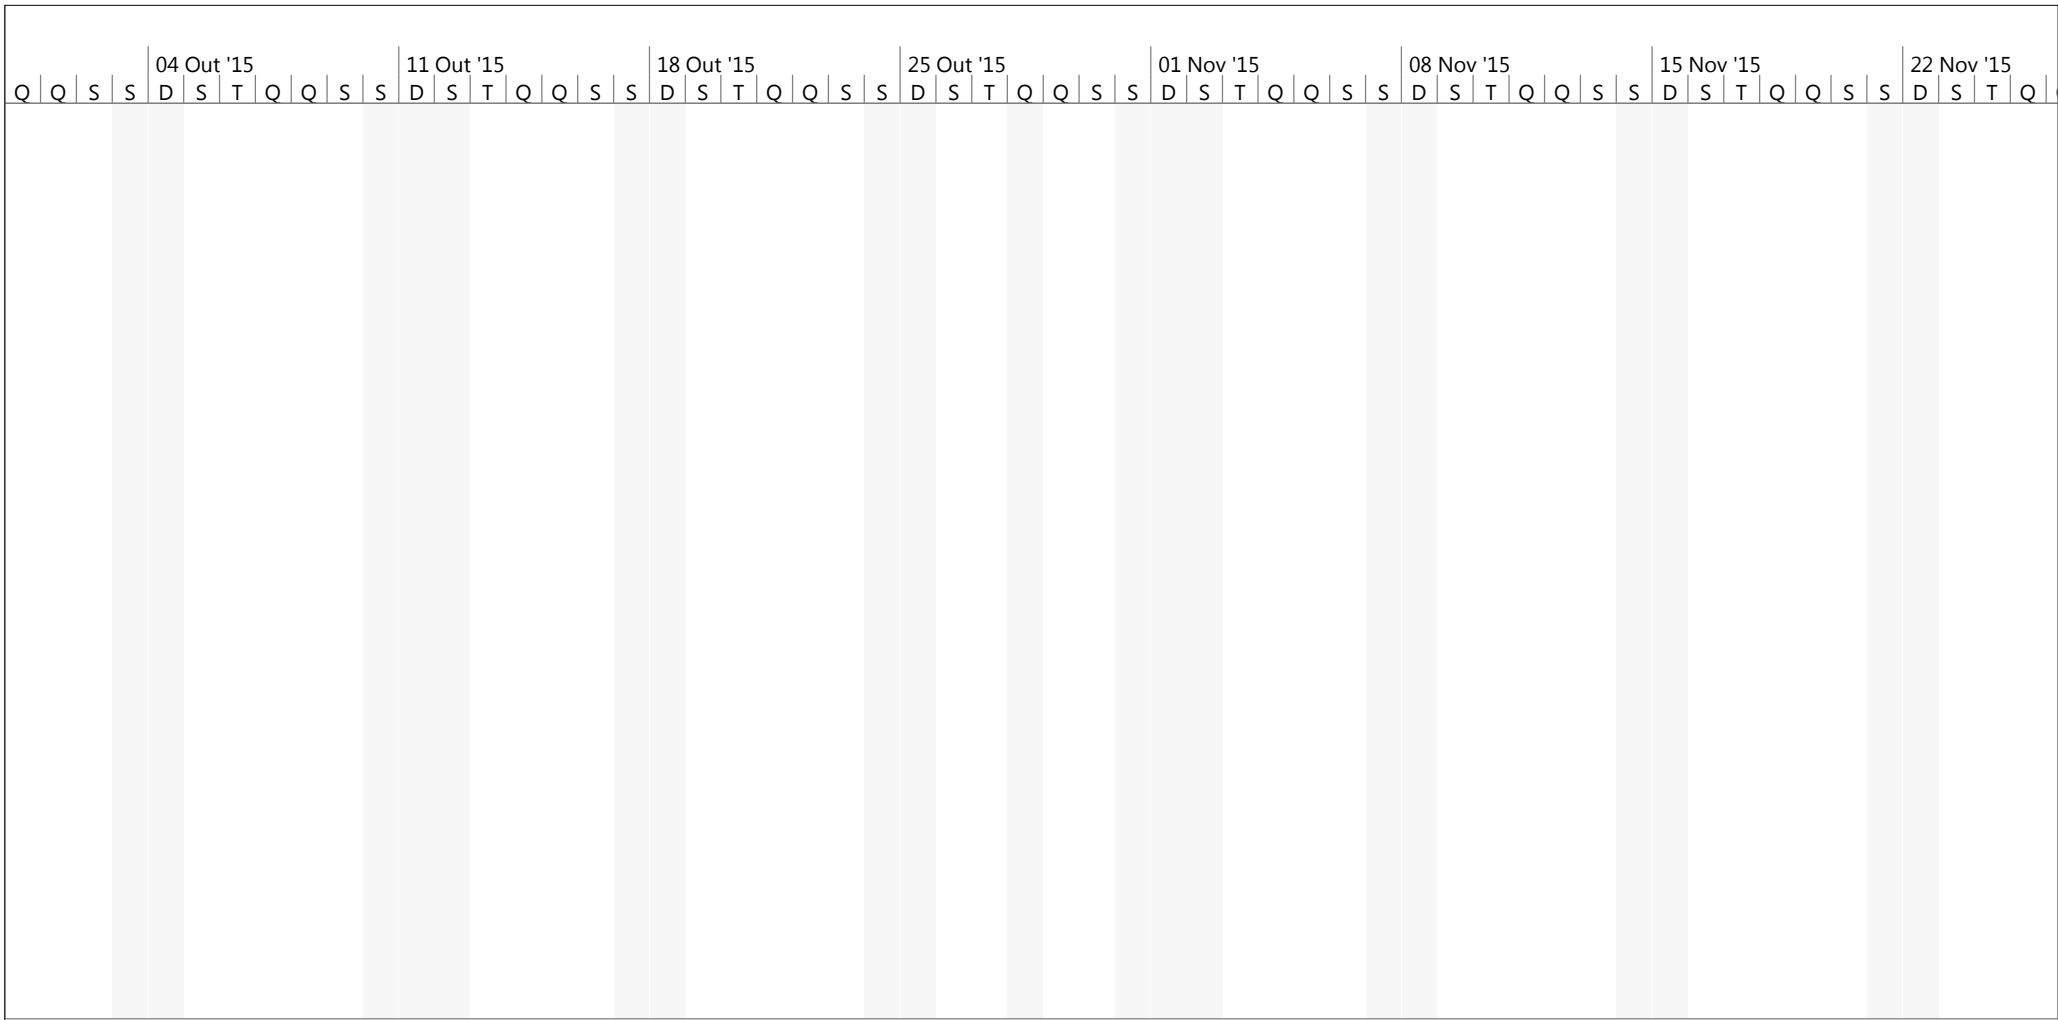

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

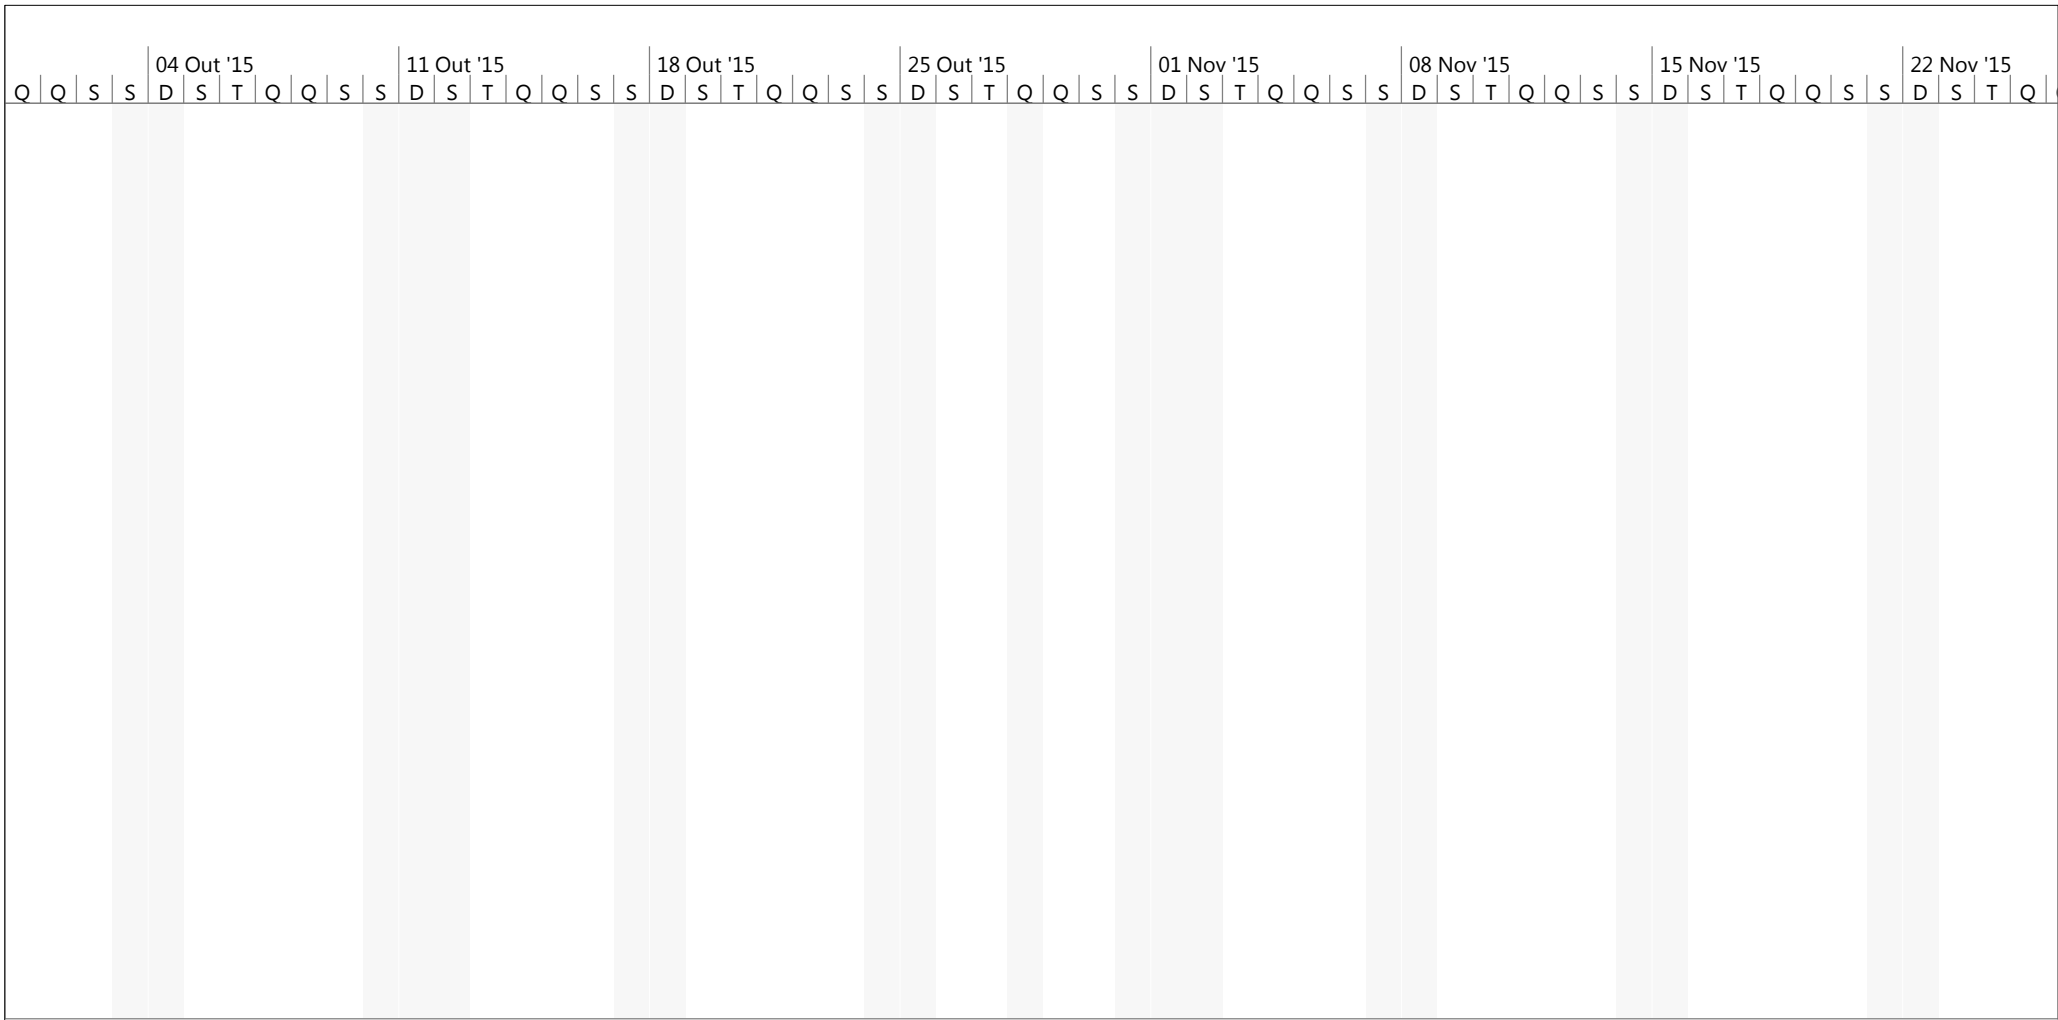

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


Q S S D S T Q Q S S 29 Nov '15 06 Dez '15 13 Dez '15 20 Dez '15 27 Dez '15 03 Jan '16 10 Jan '16 17 Jan '16




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

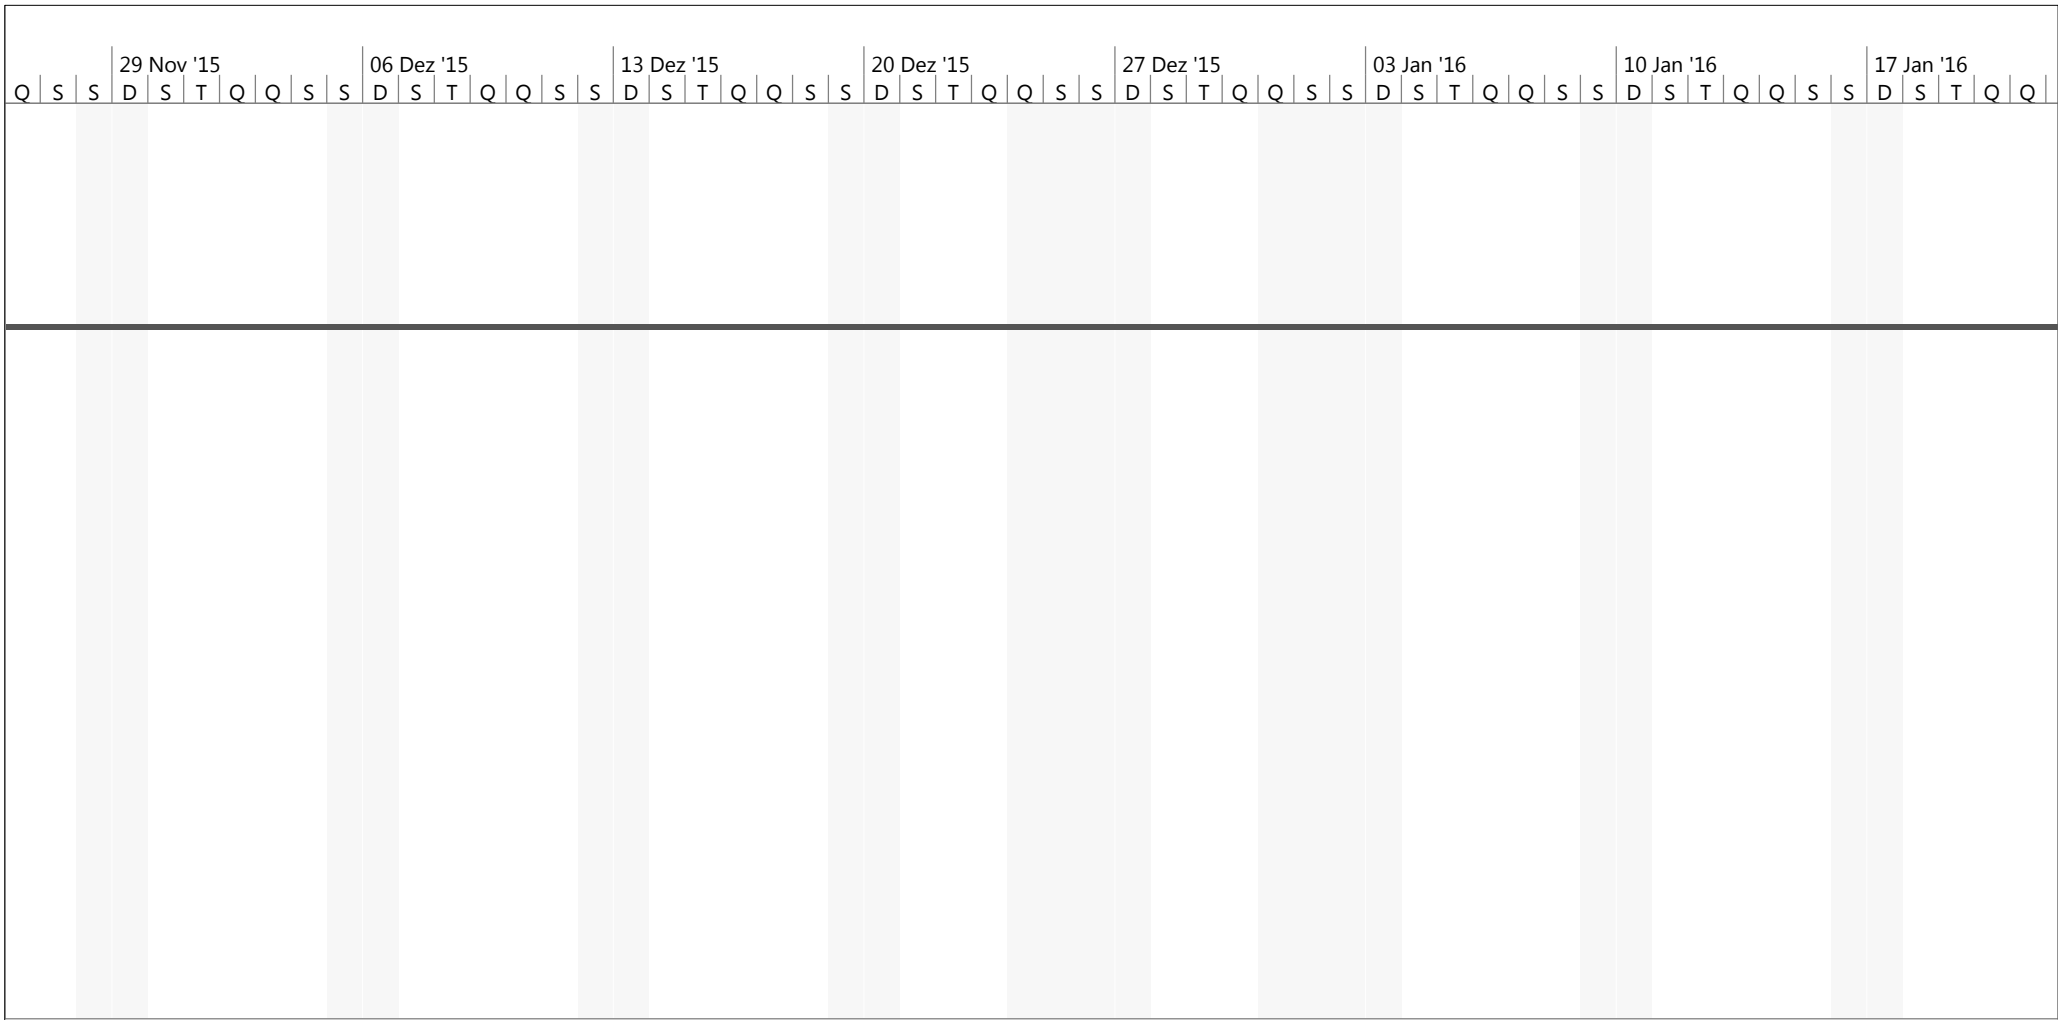


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

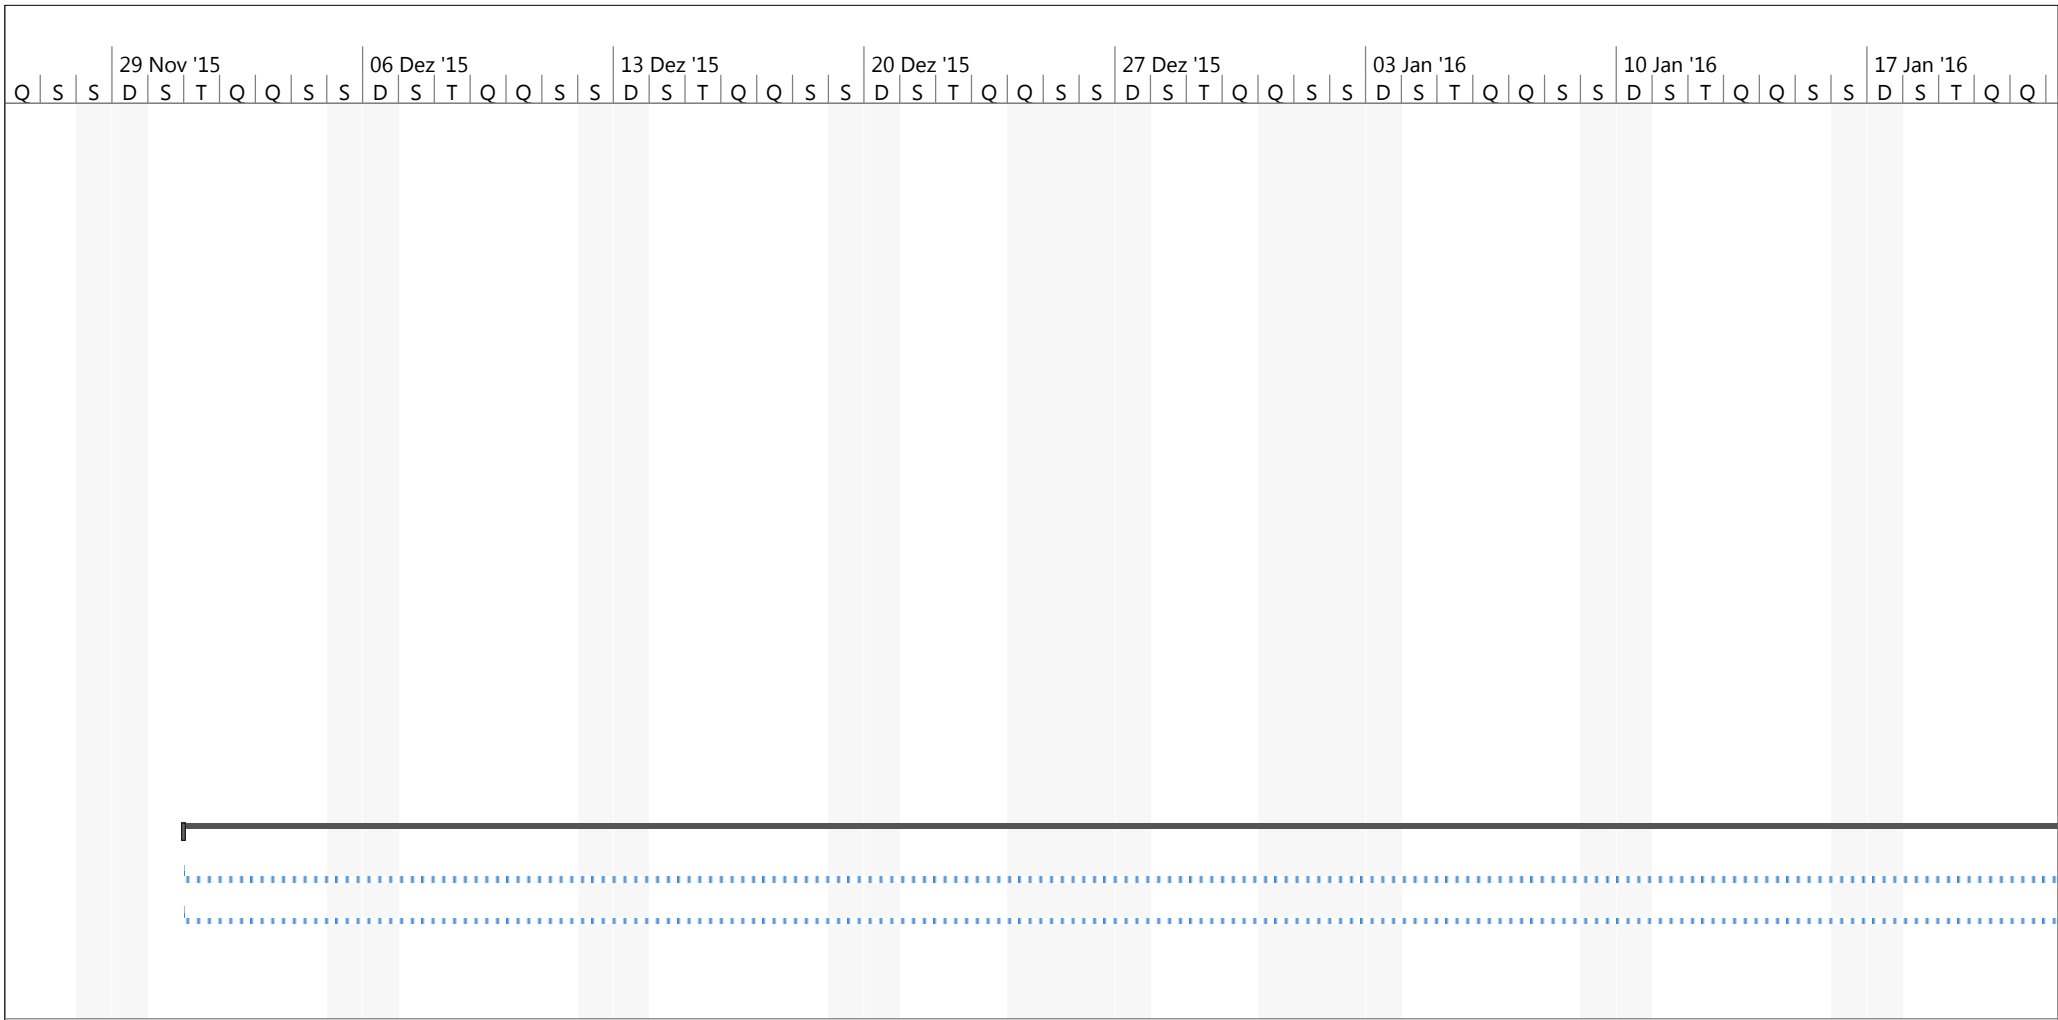


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

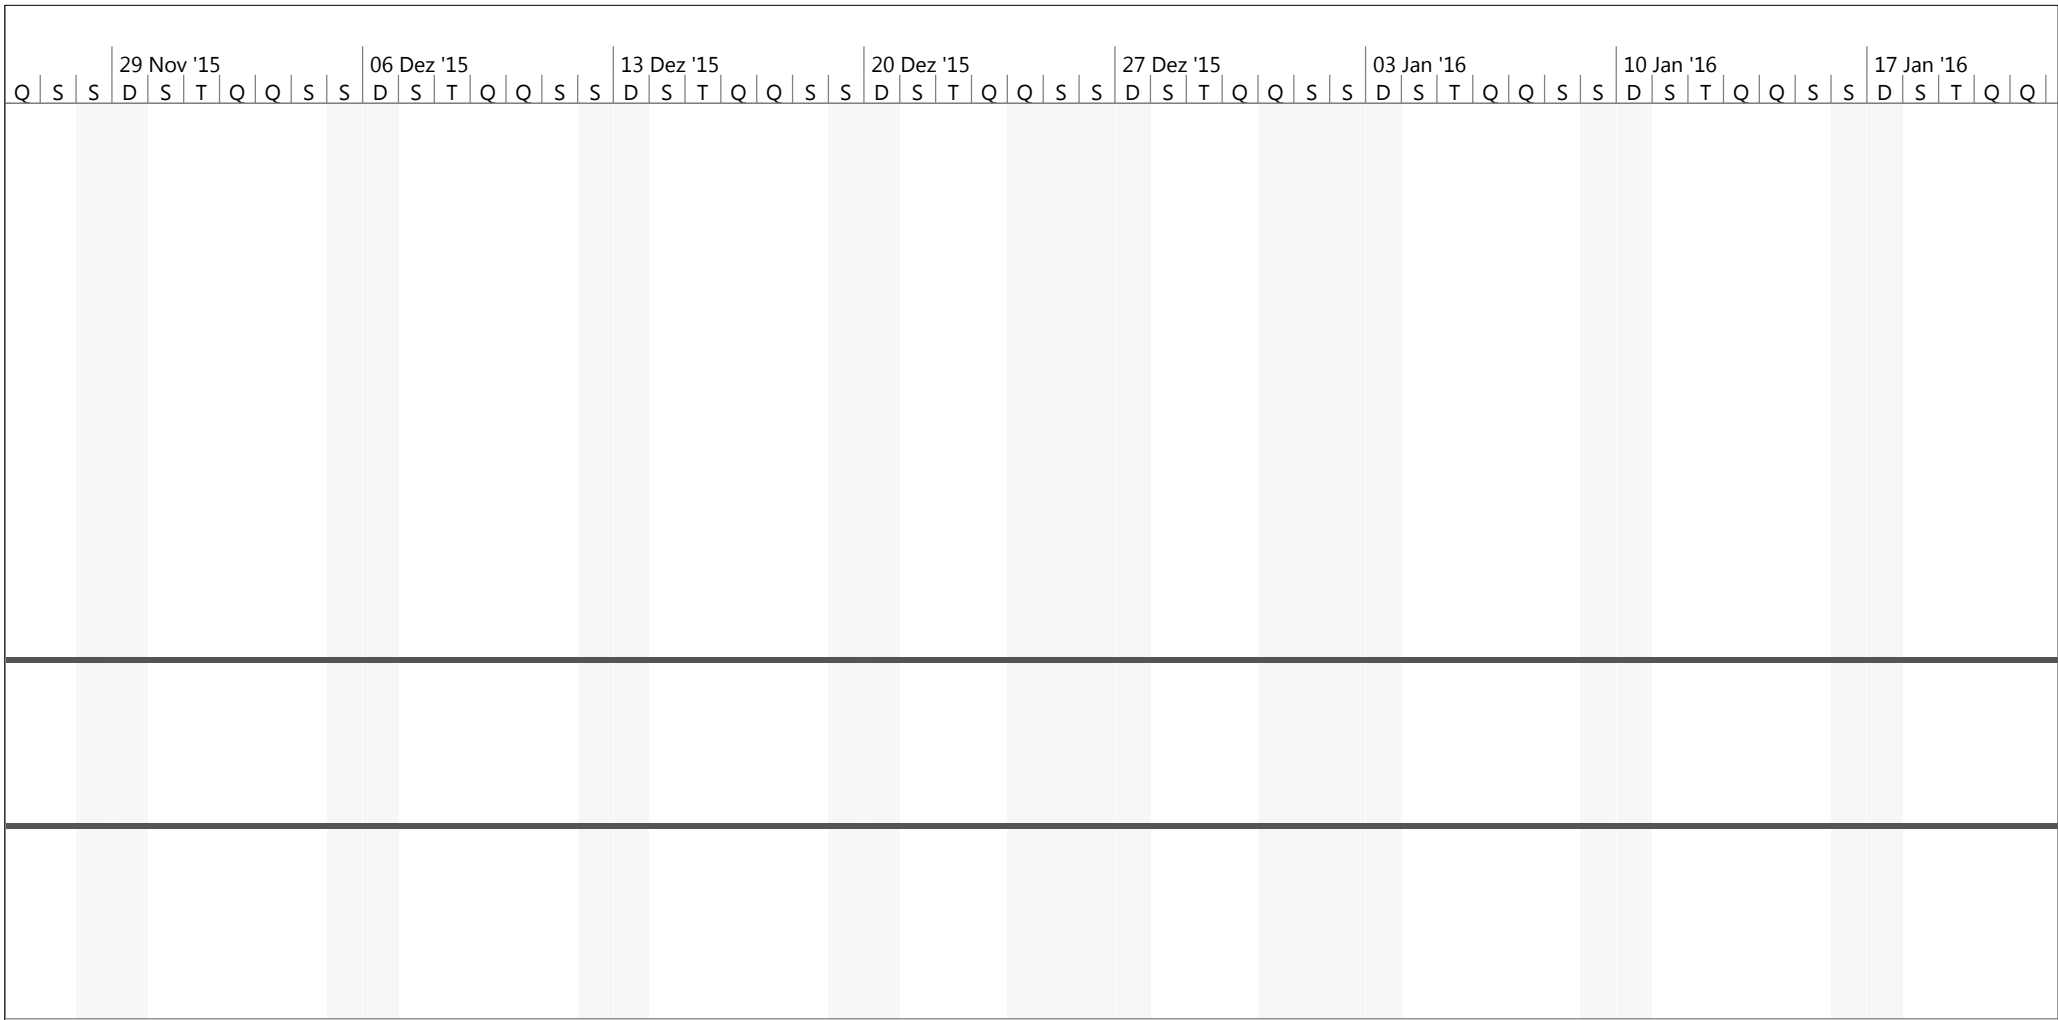


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

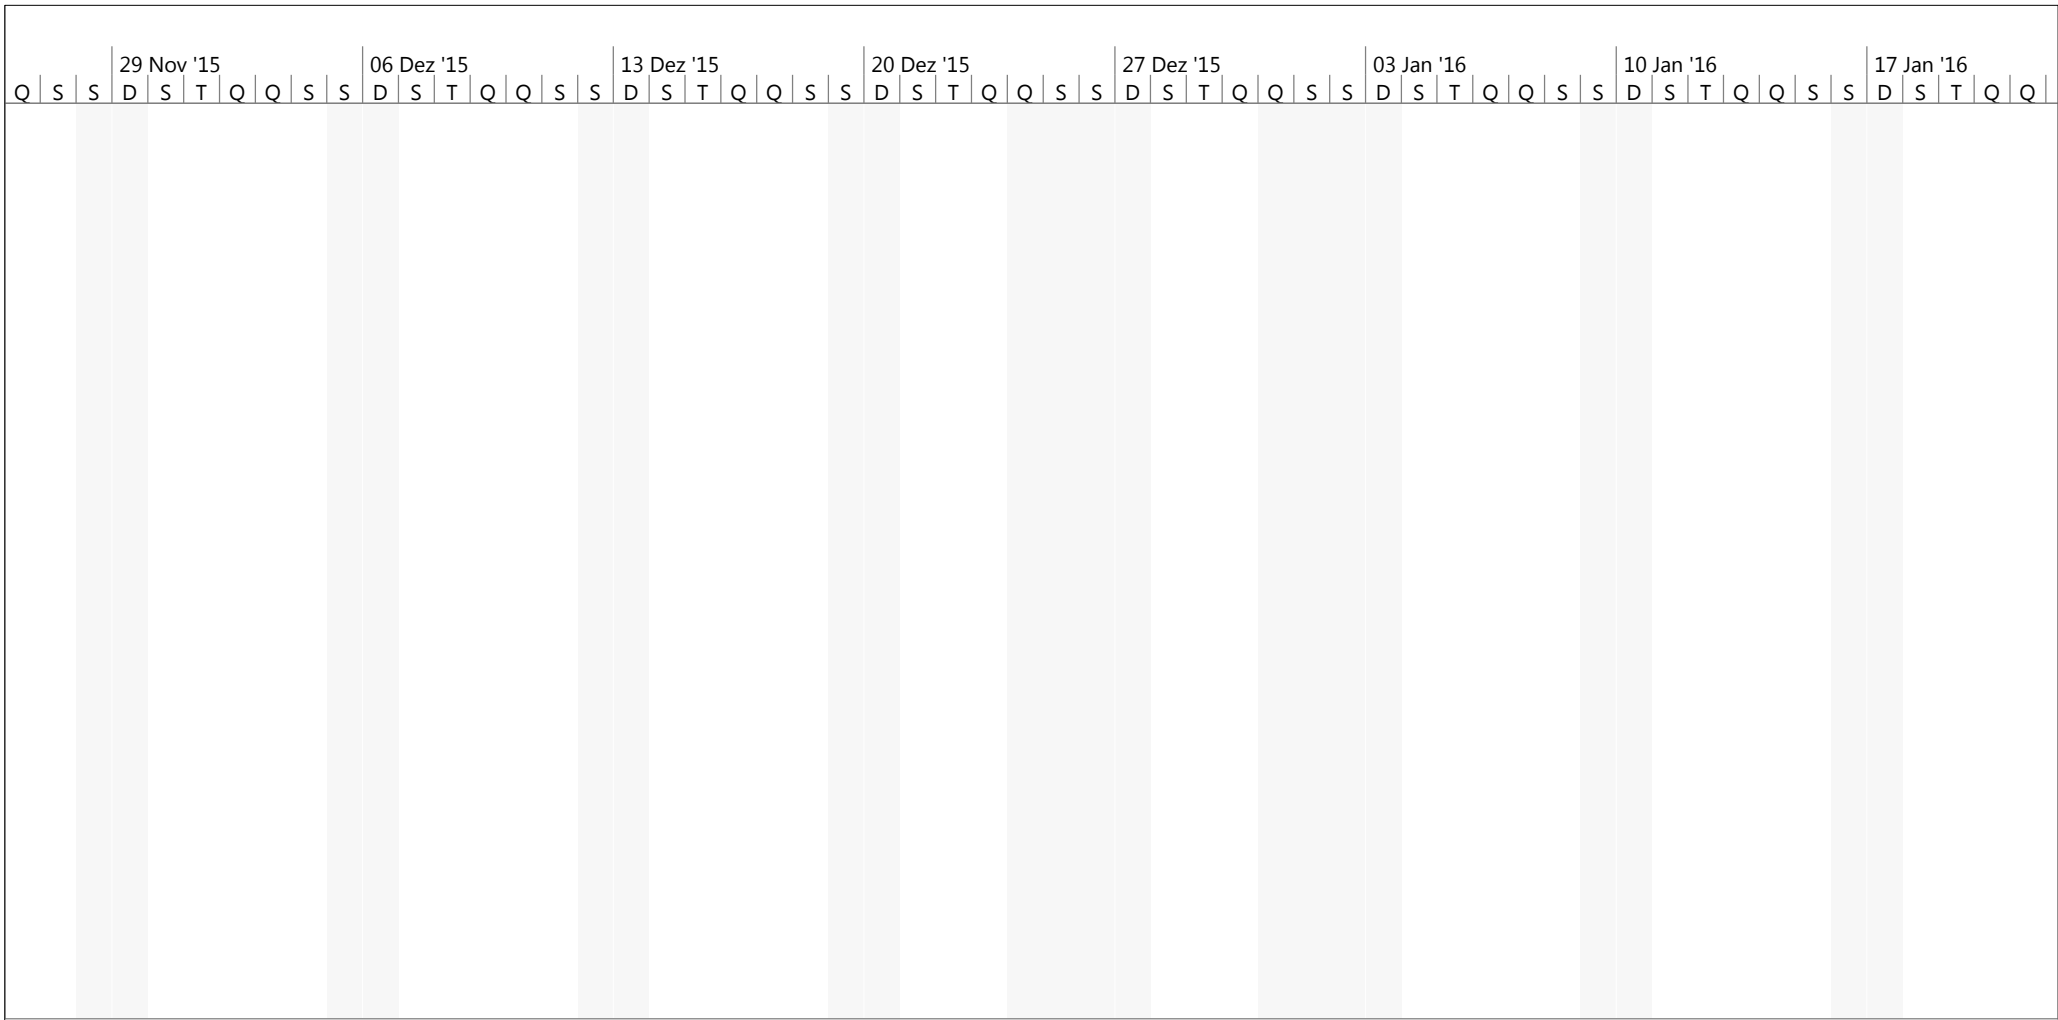


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

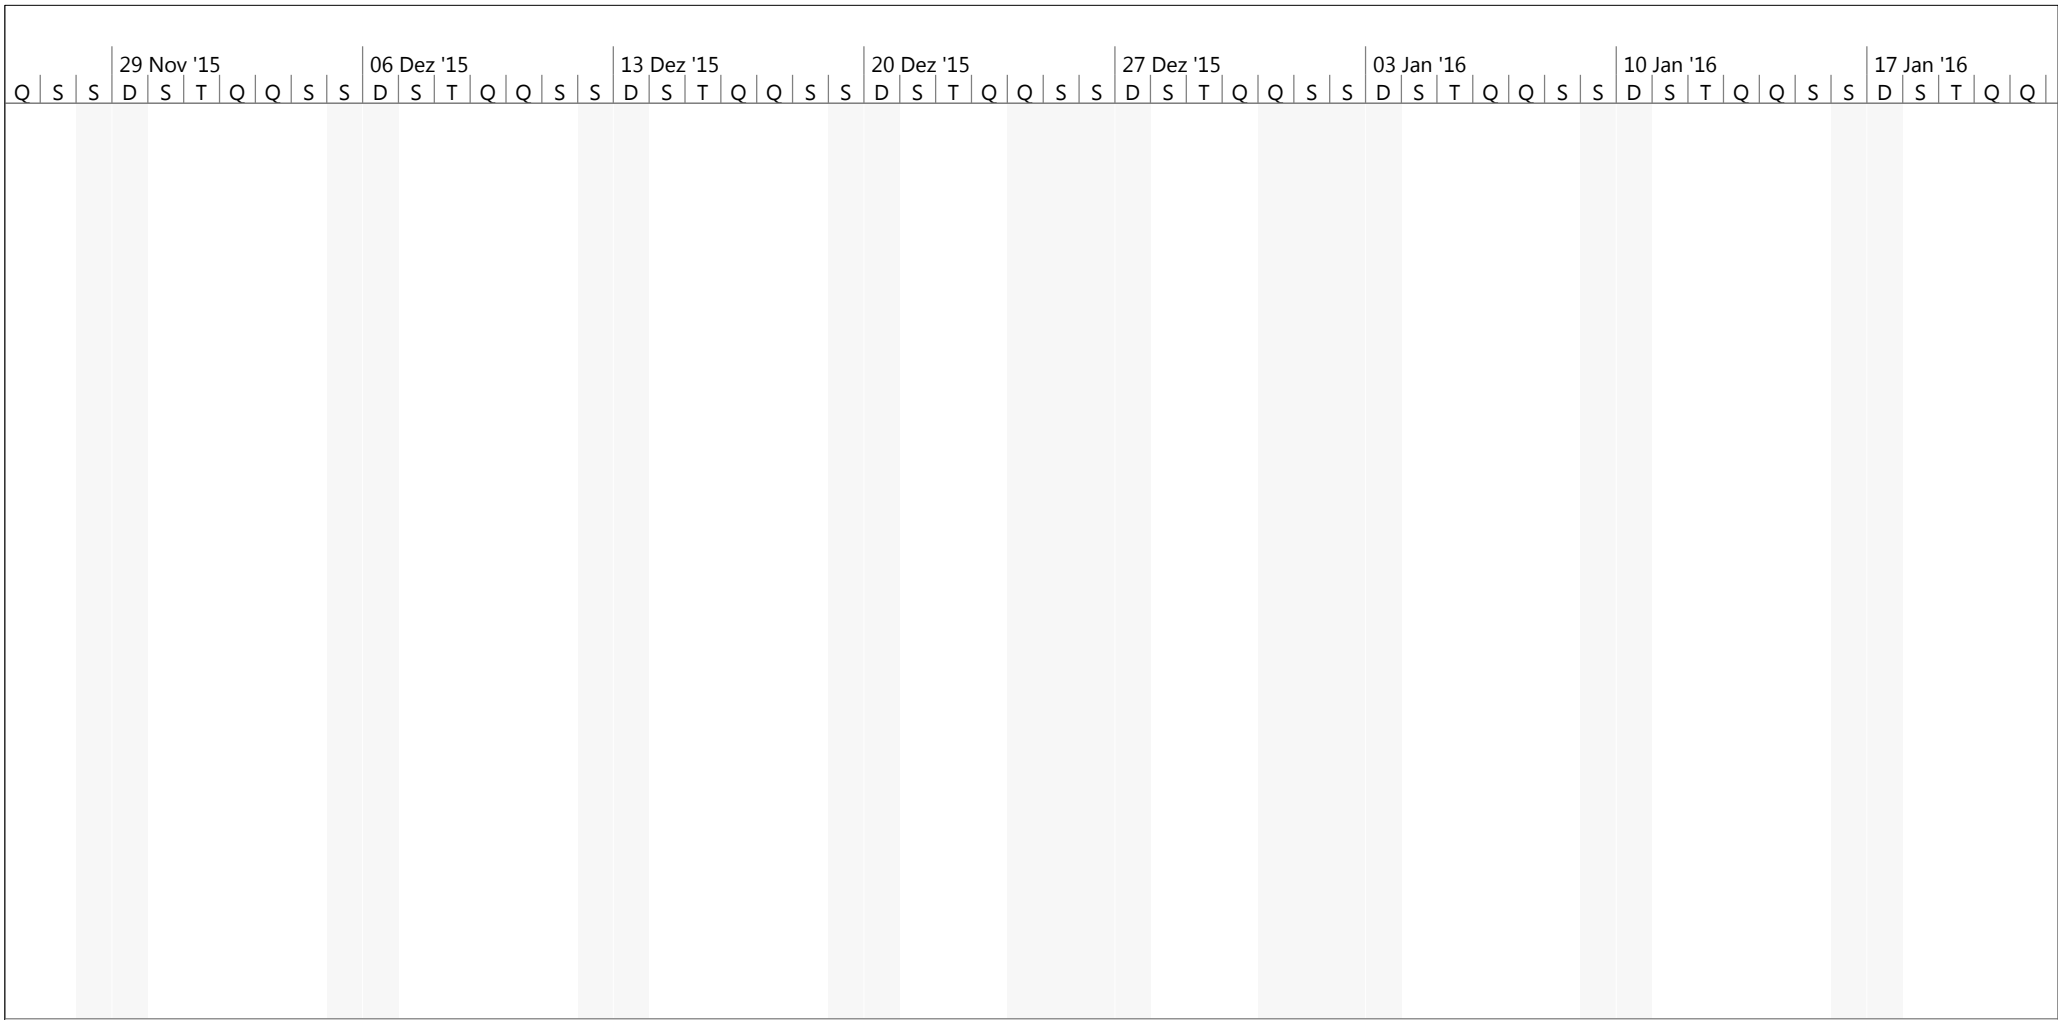


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

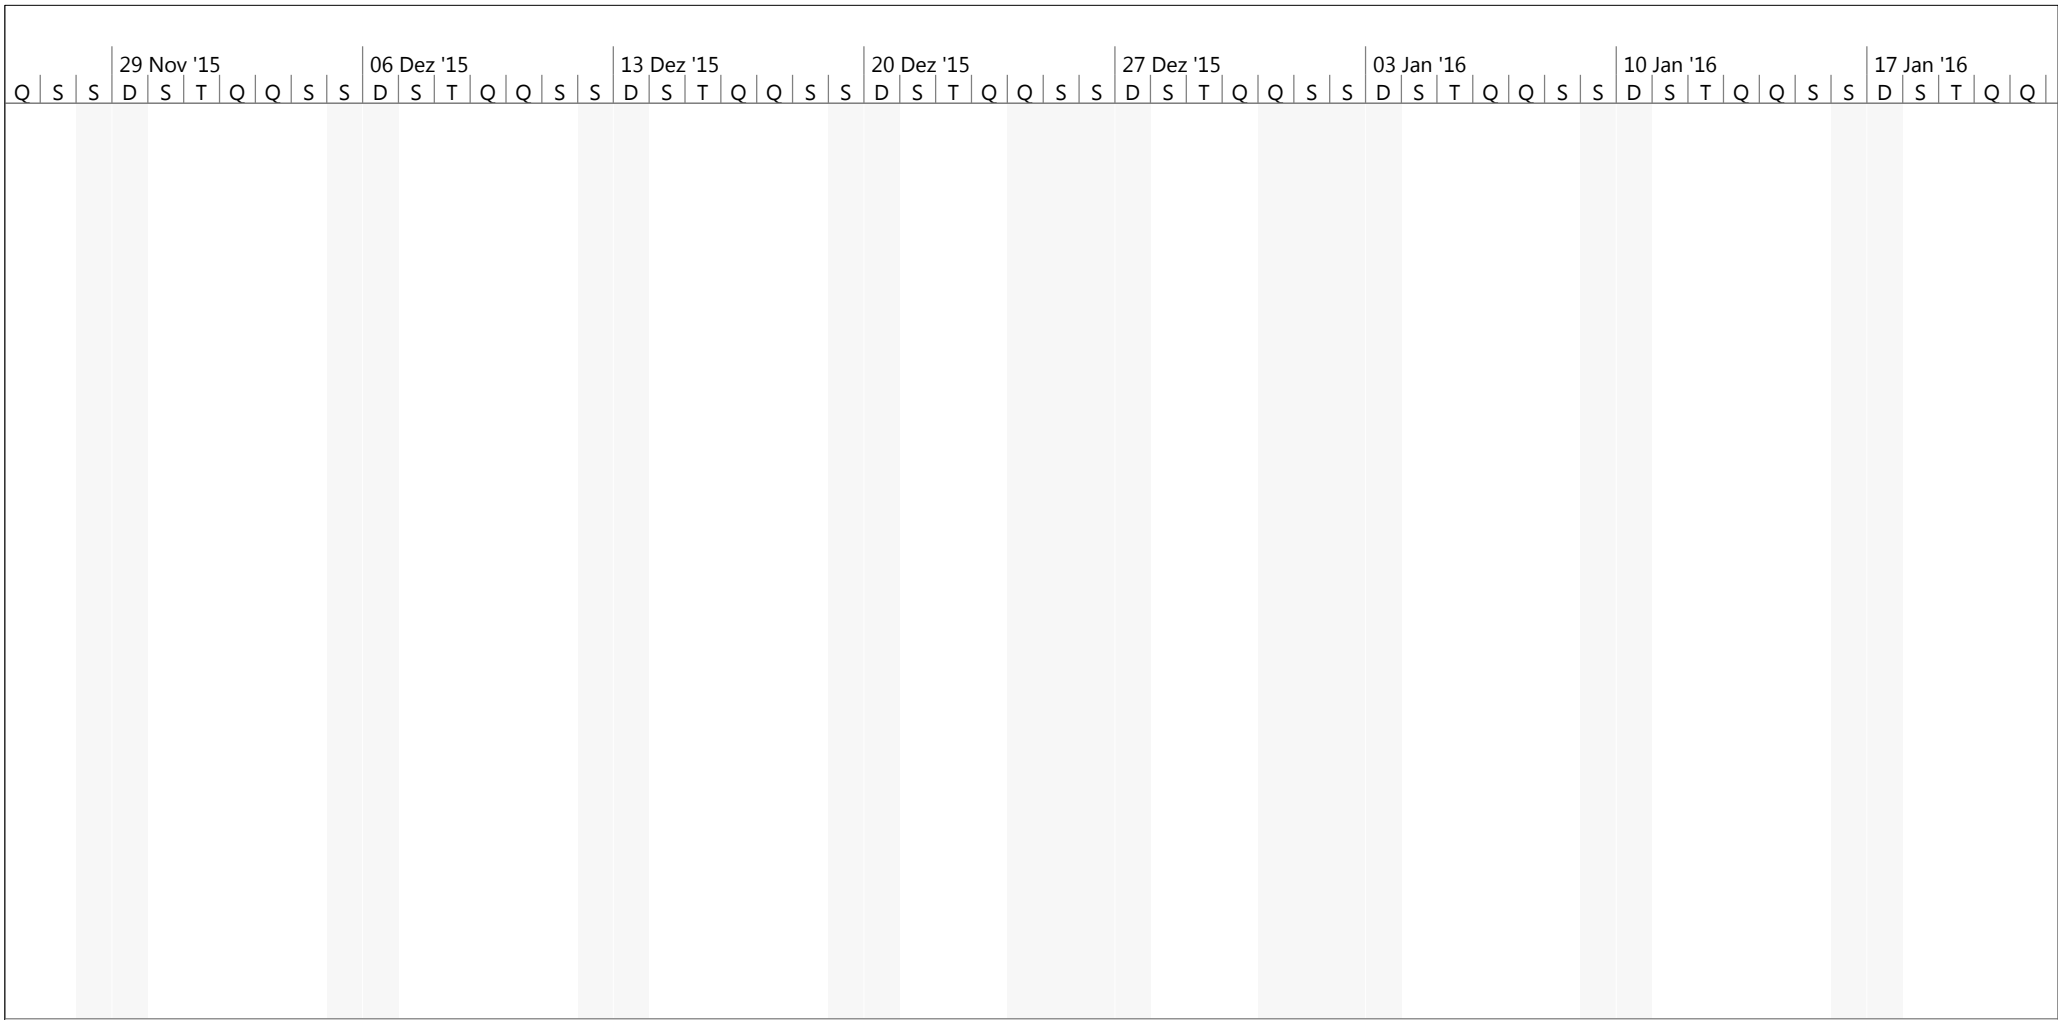


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

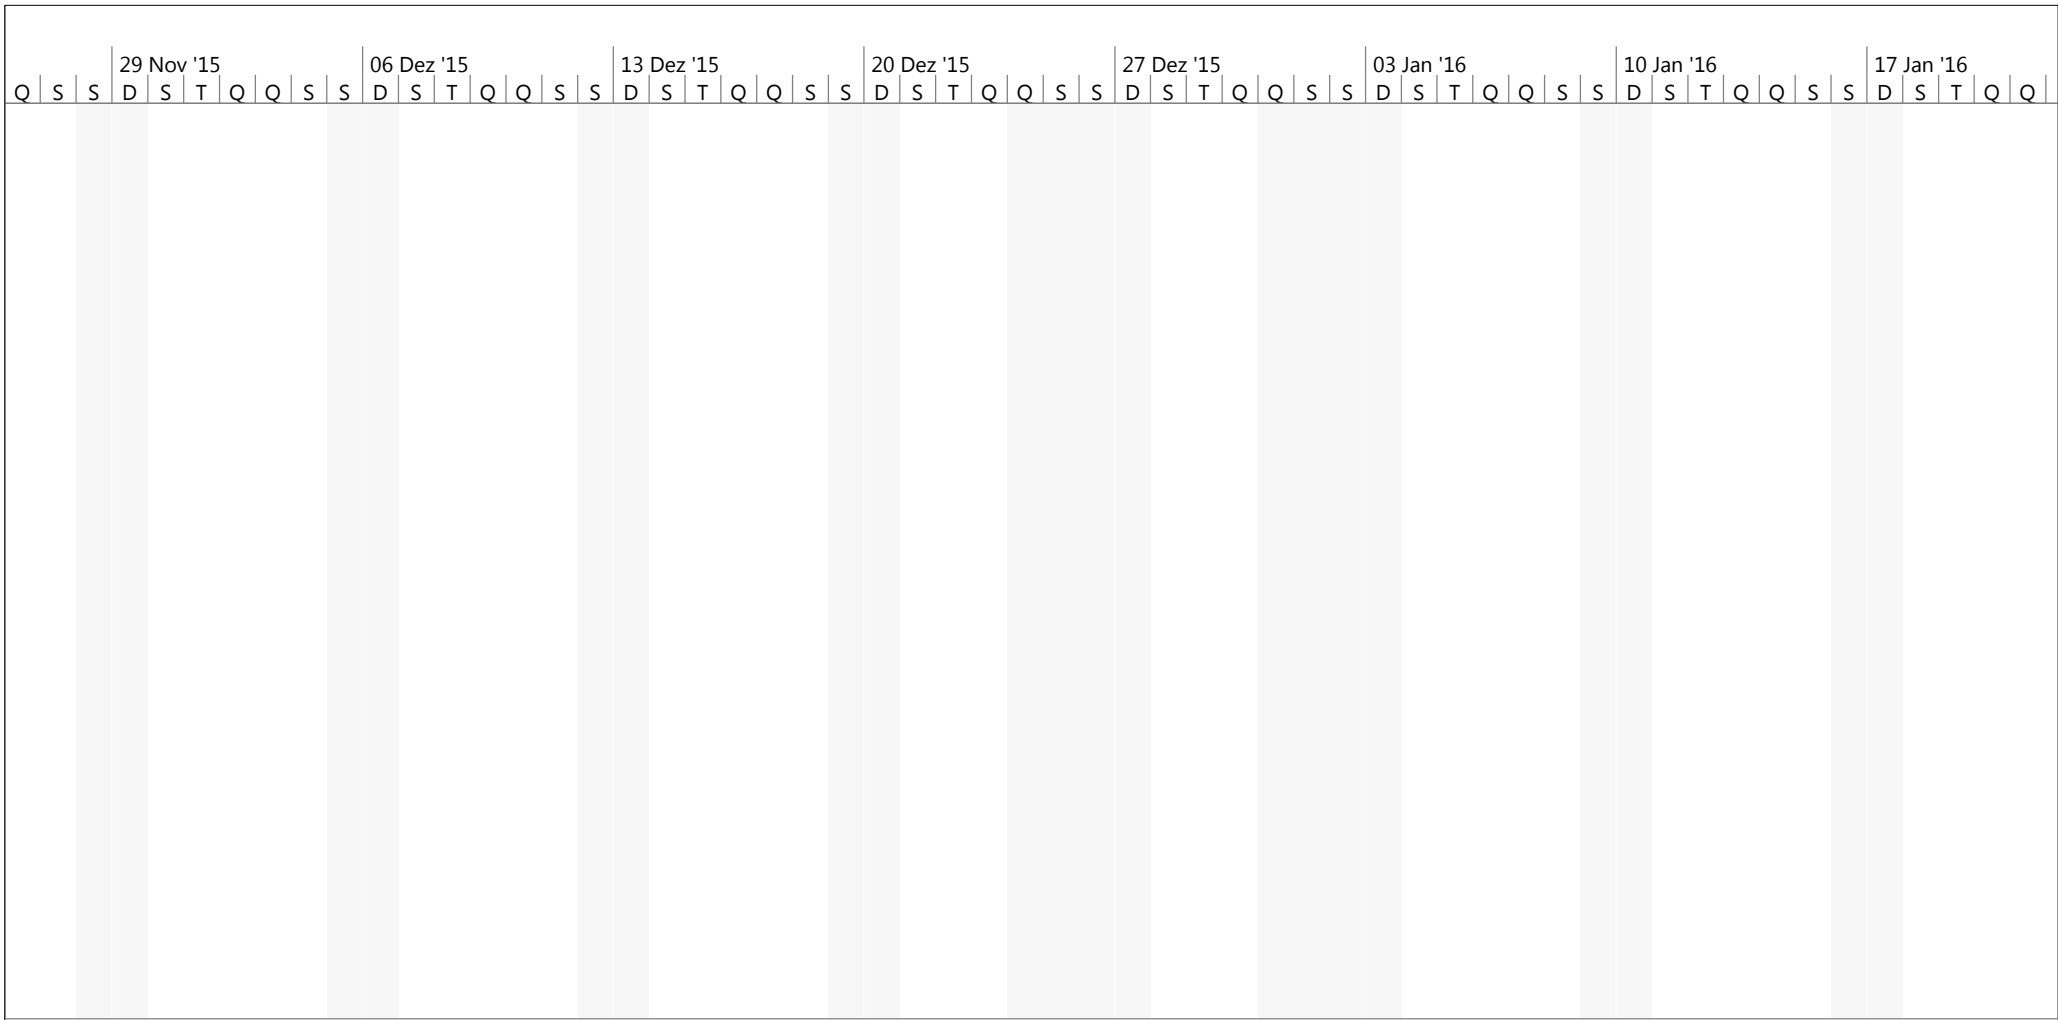


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

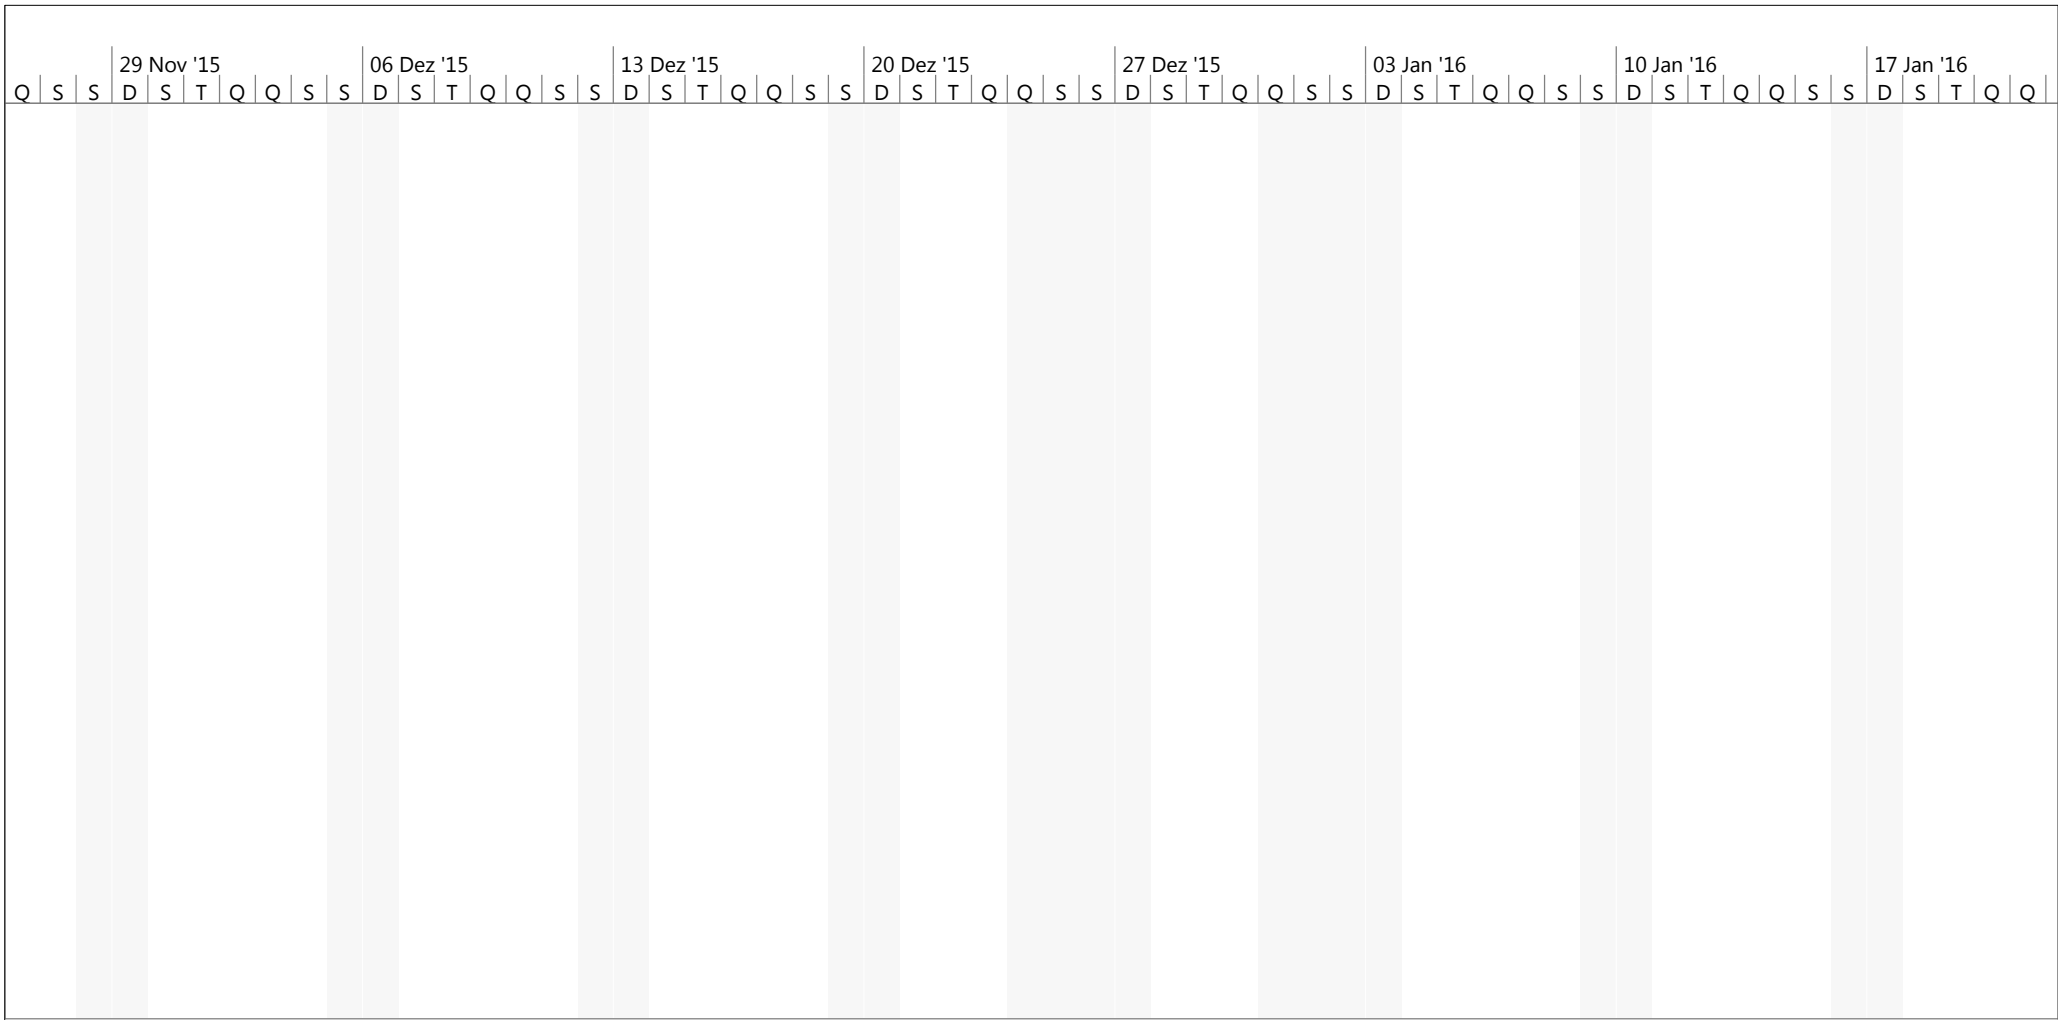


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

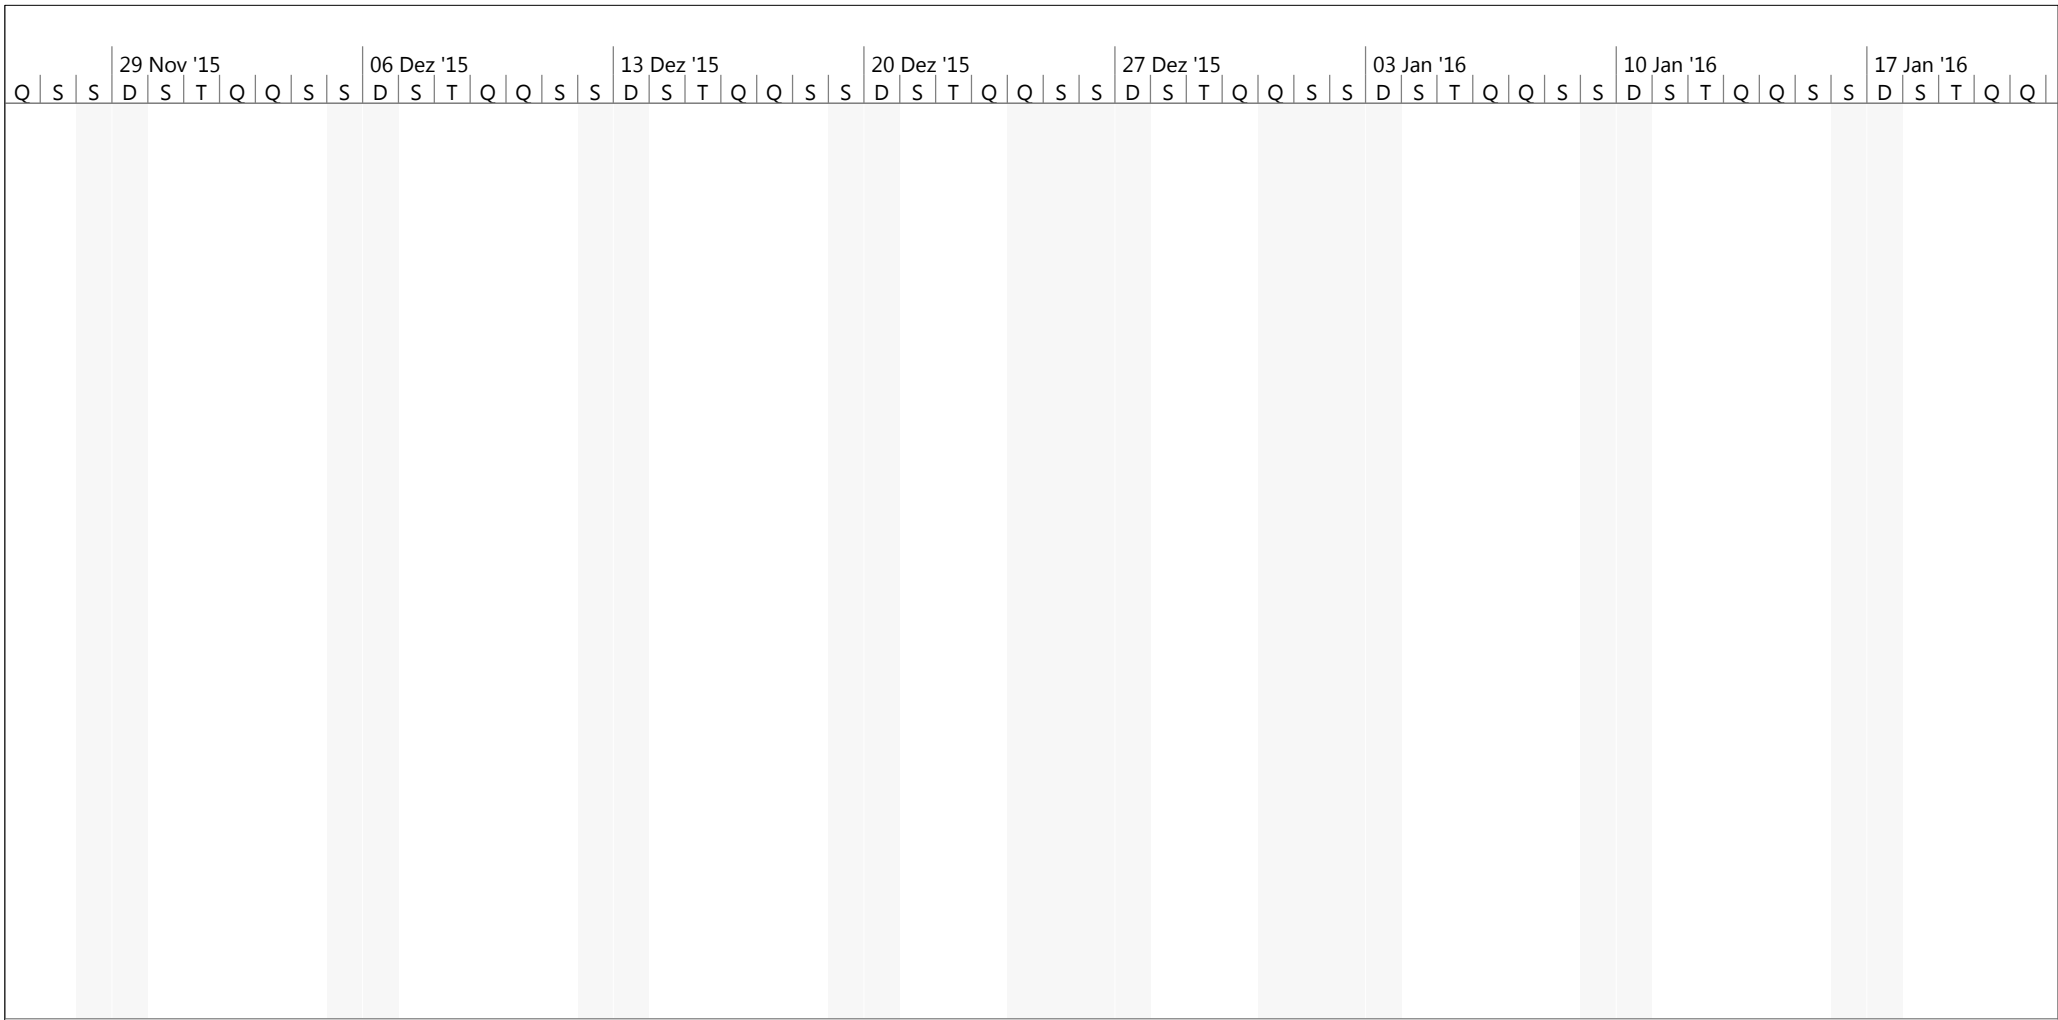


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

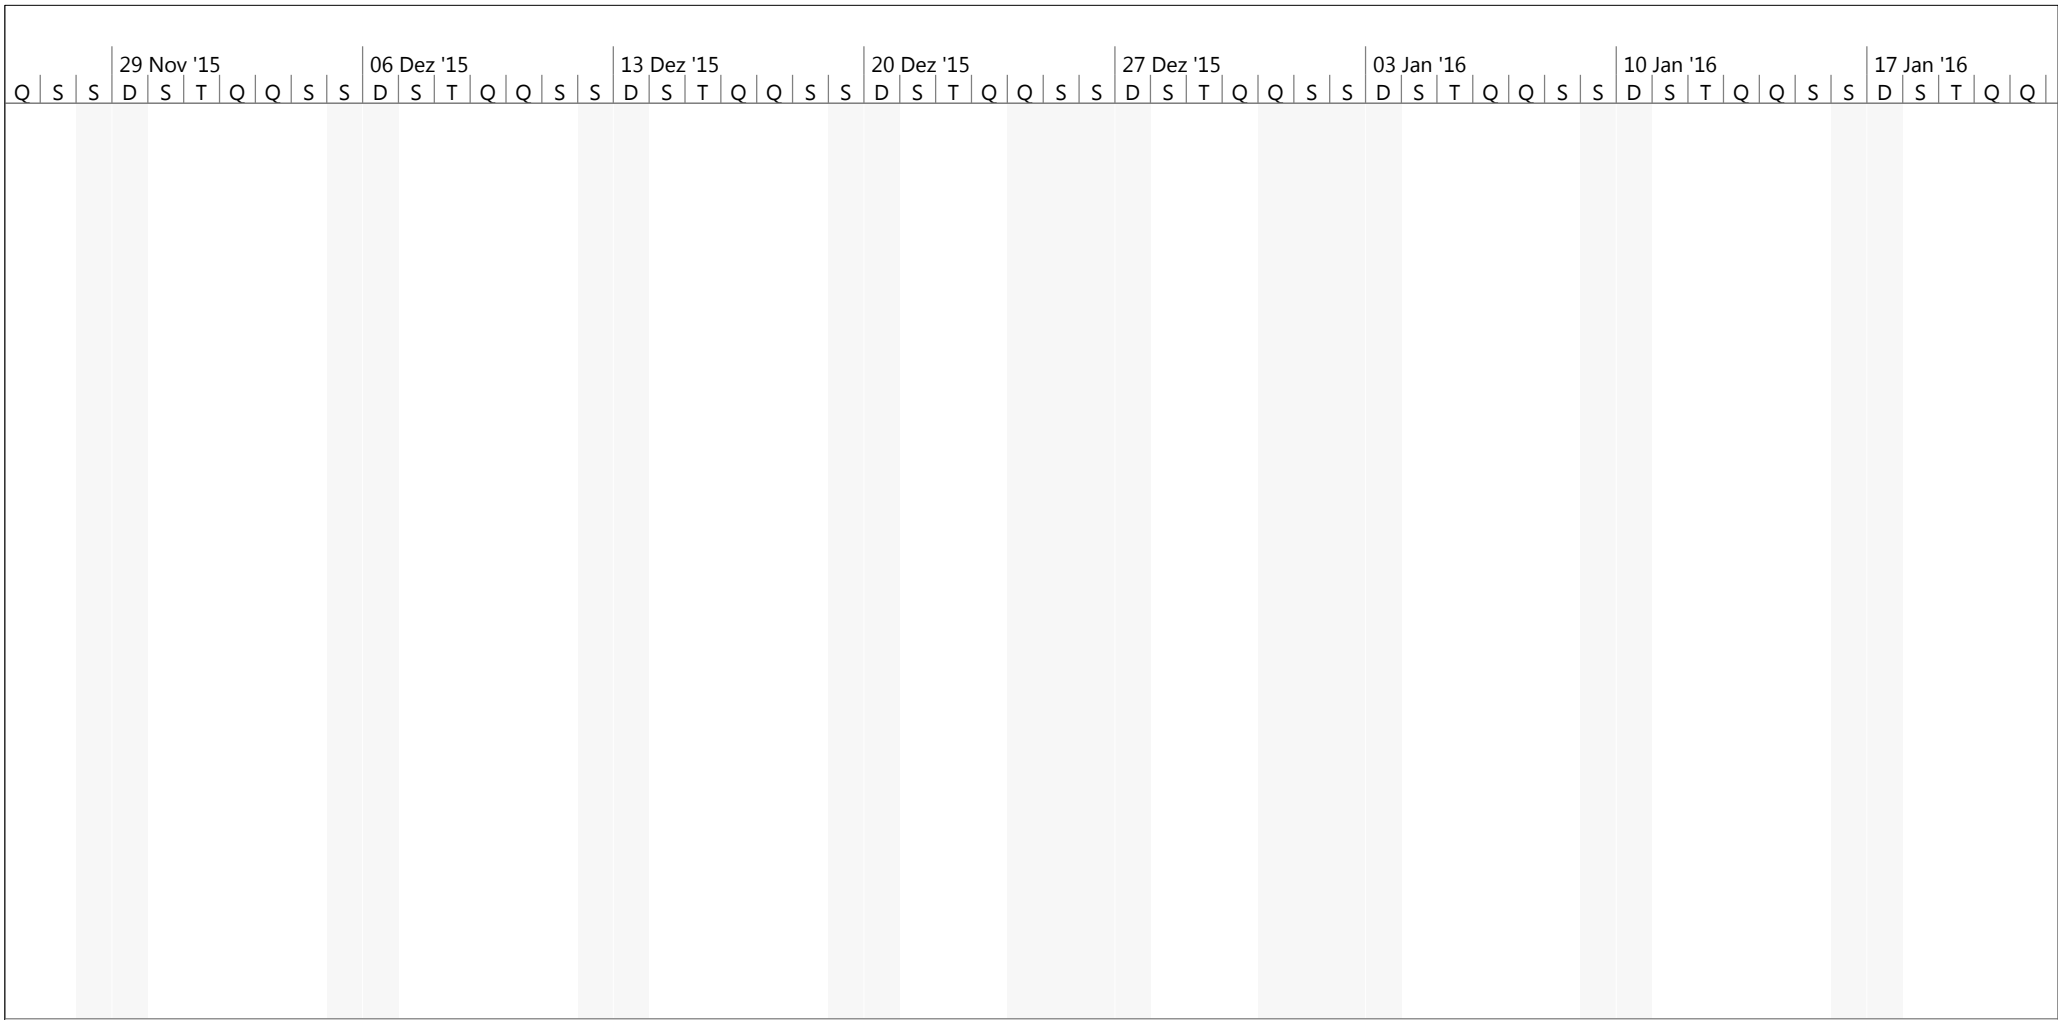


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

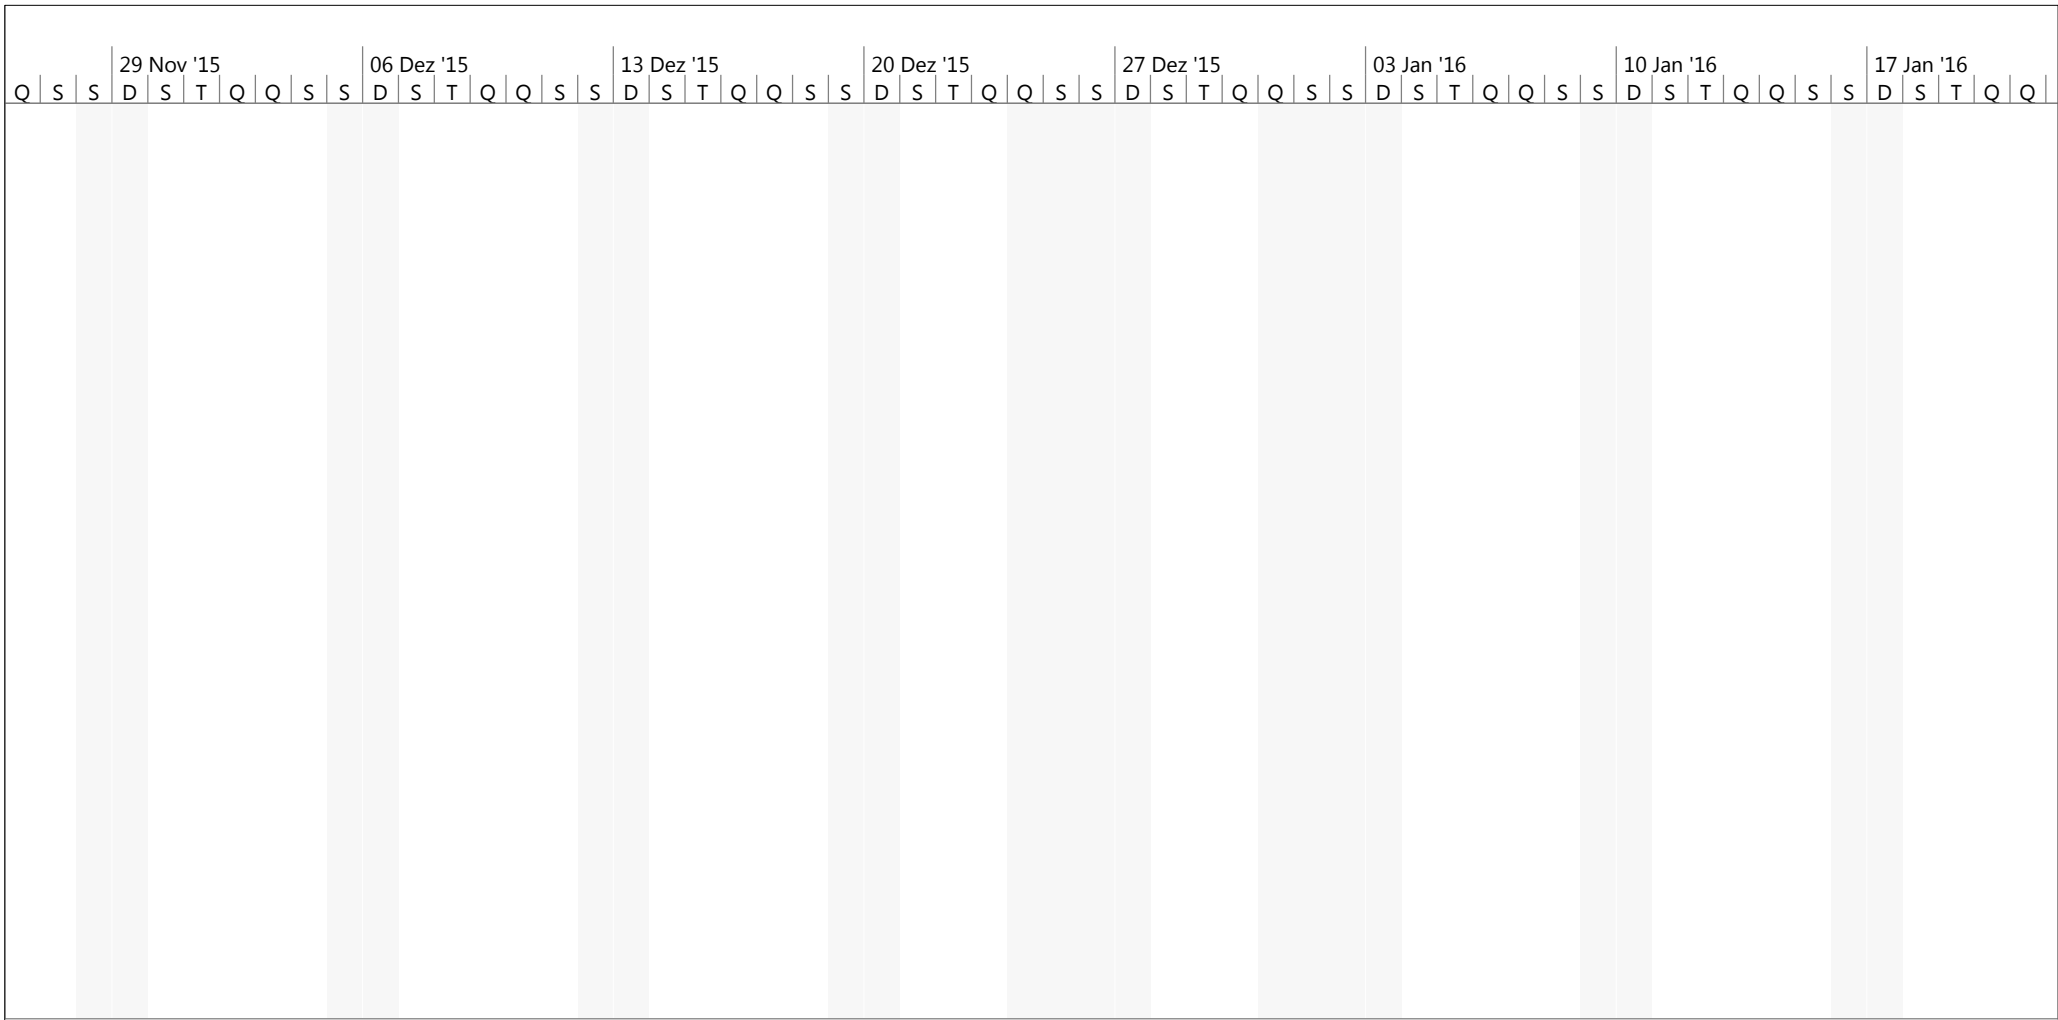


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

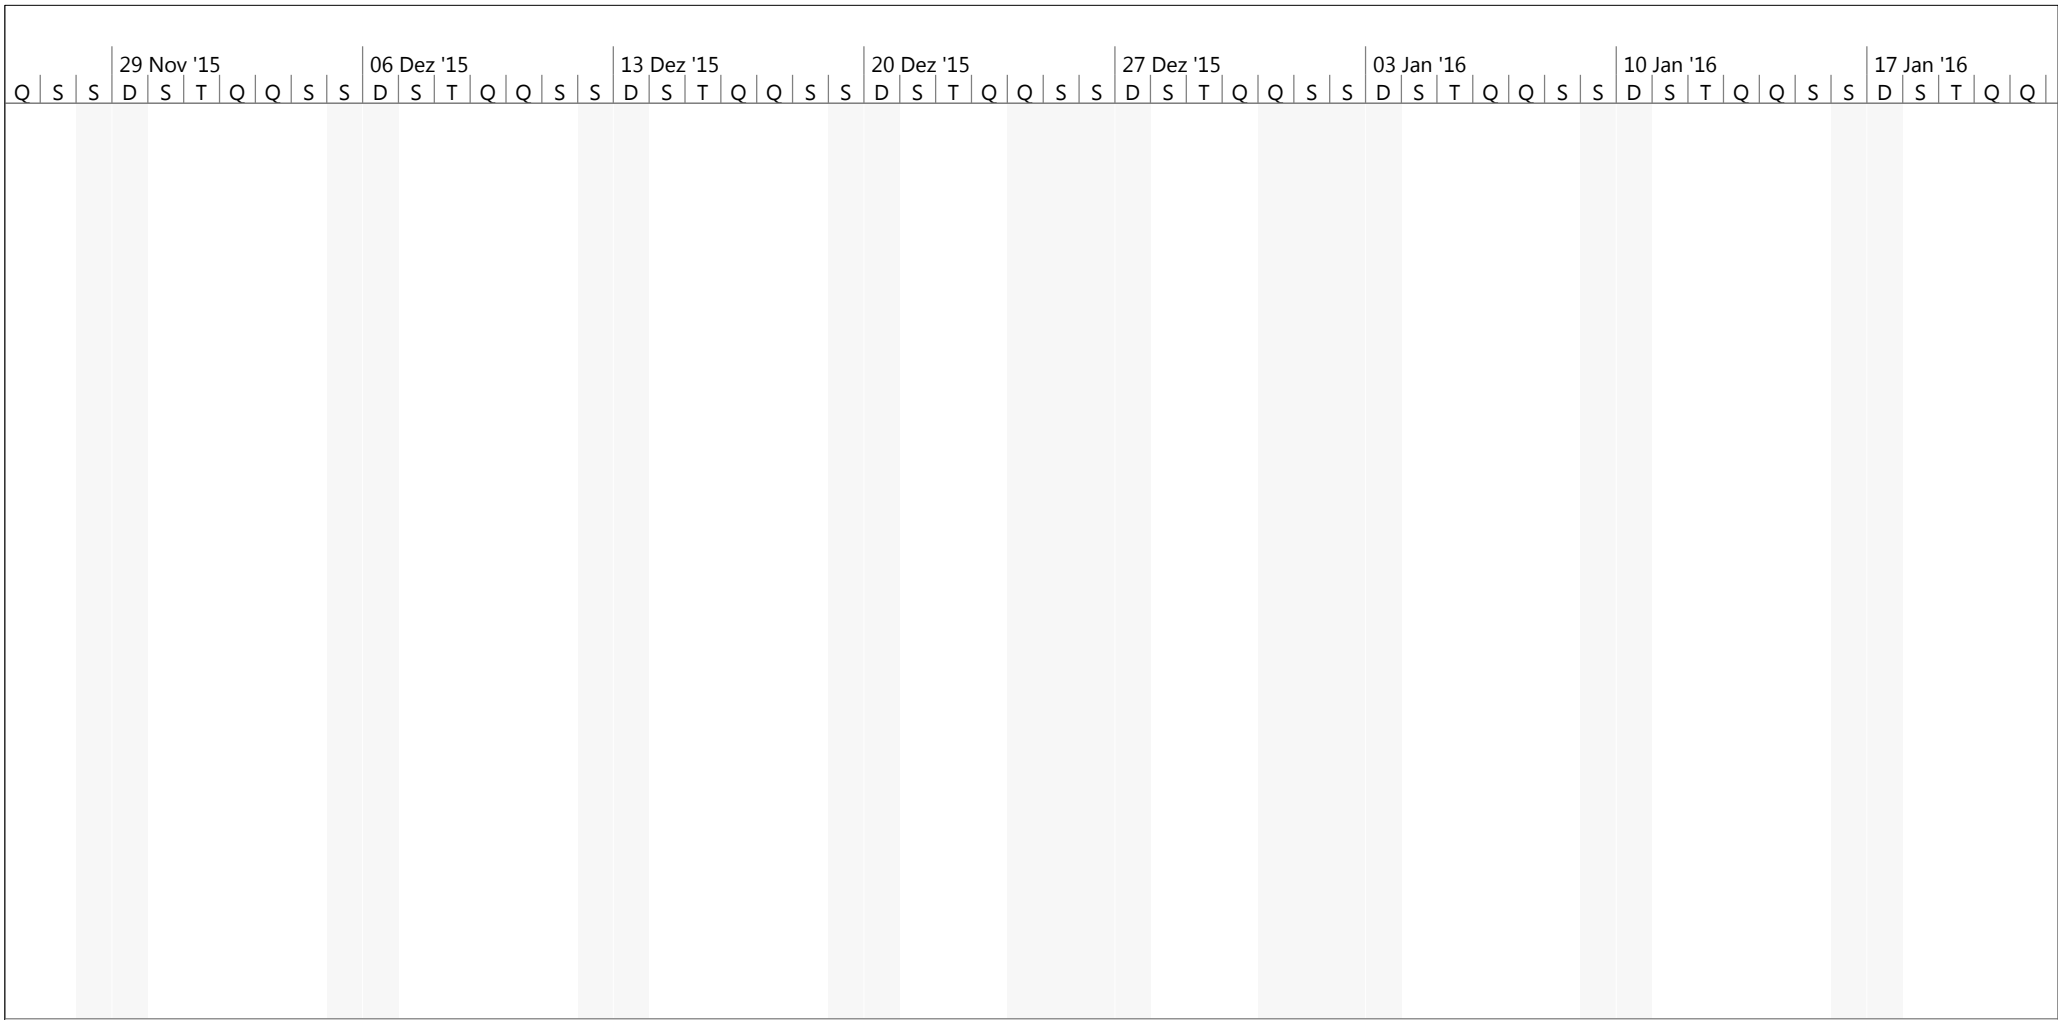


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

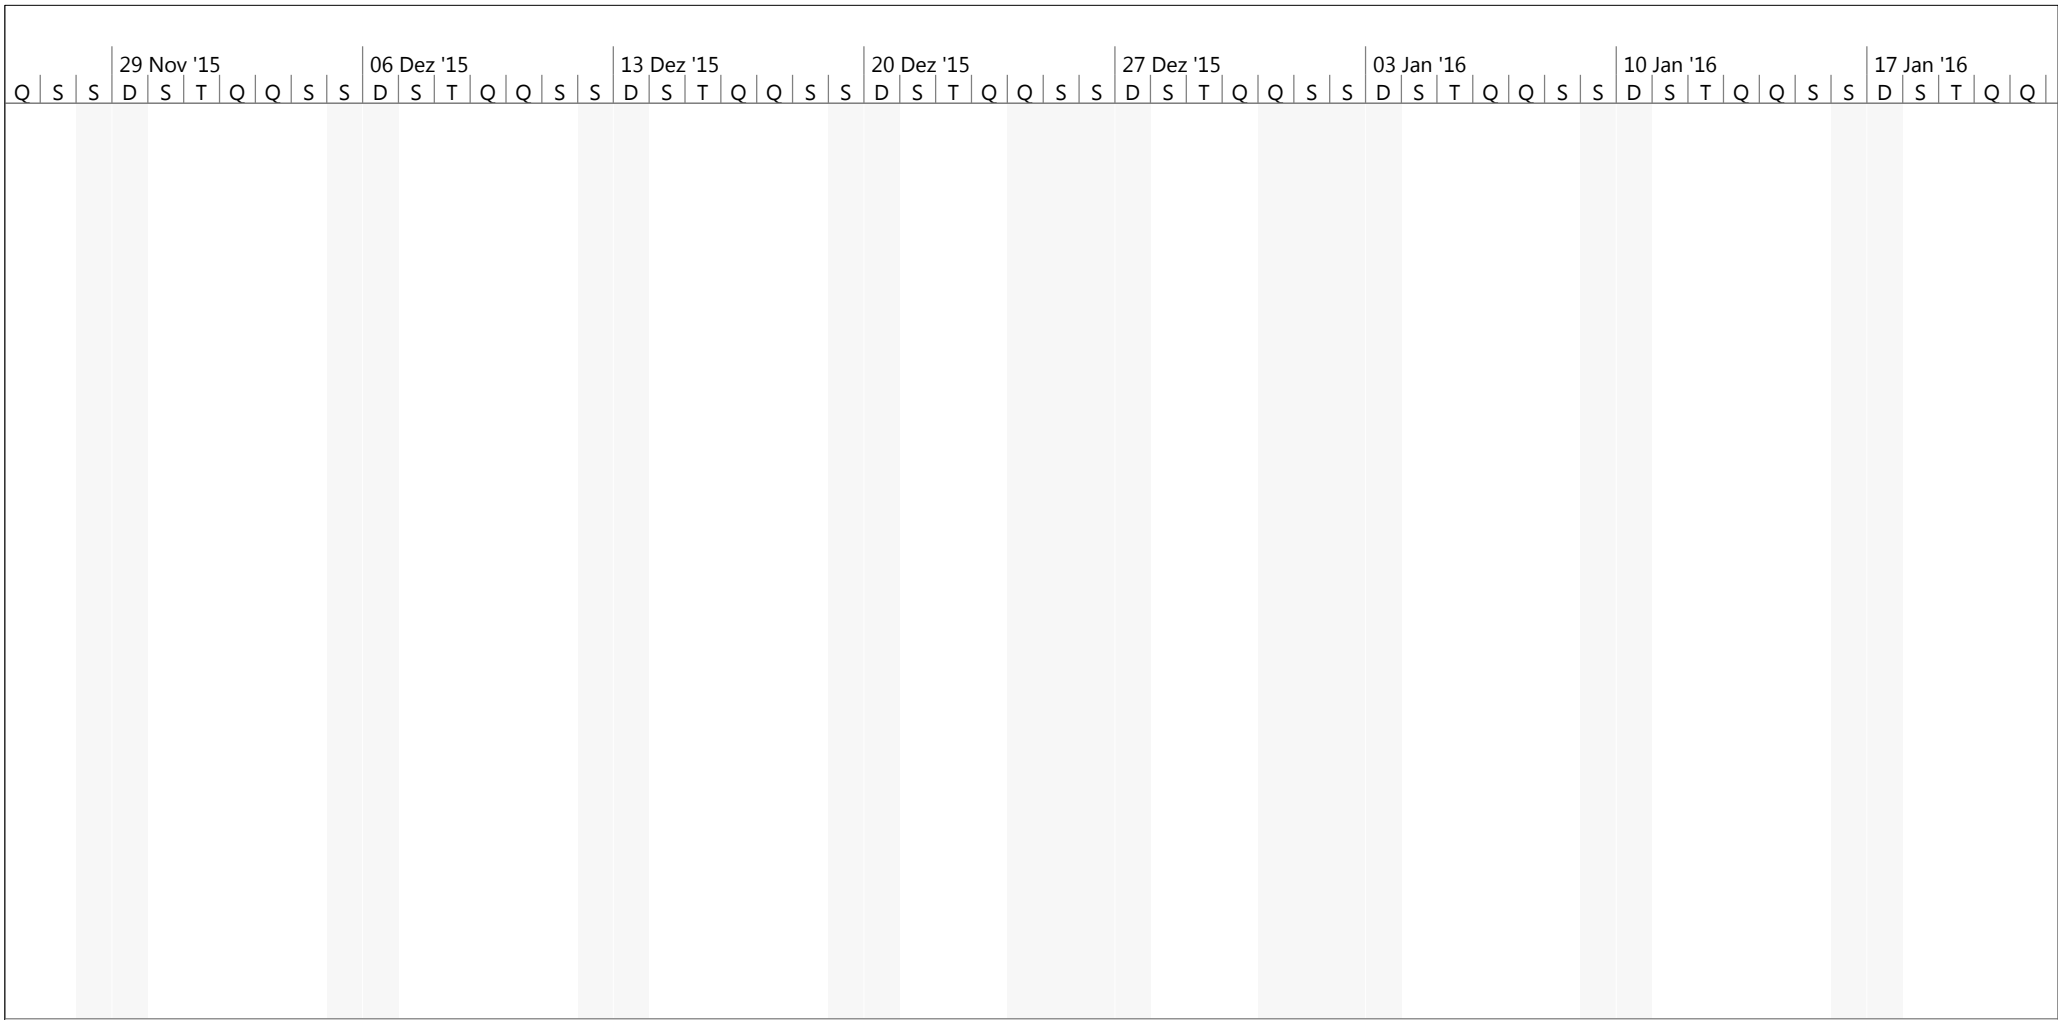


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

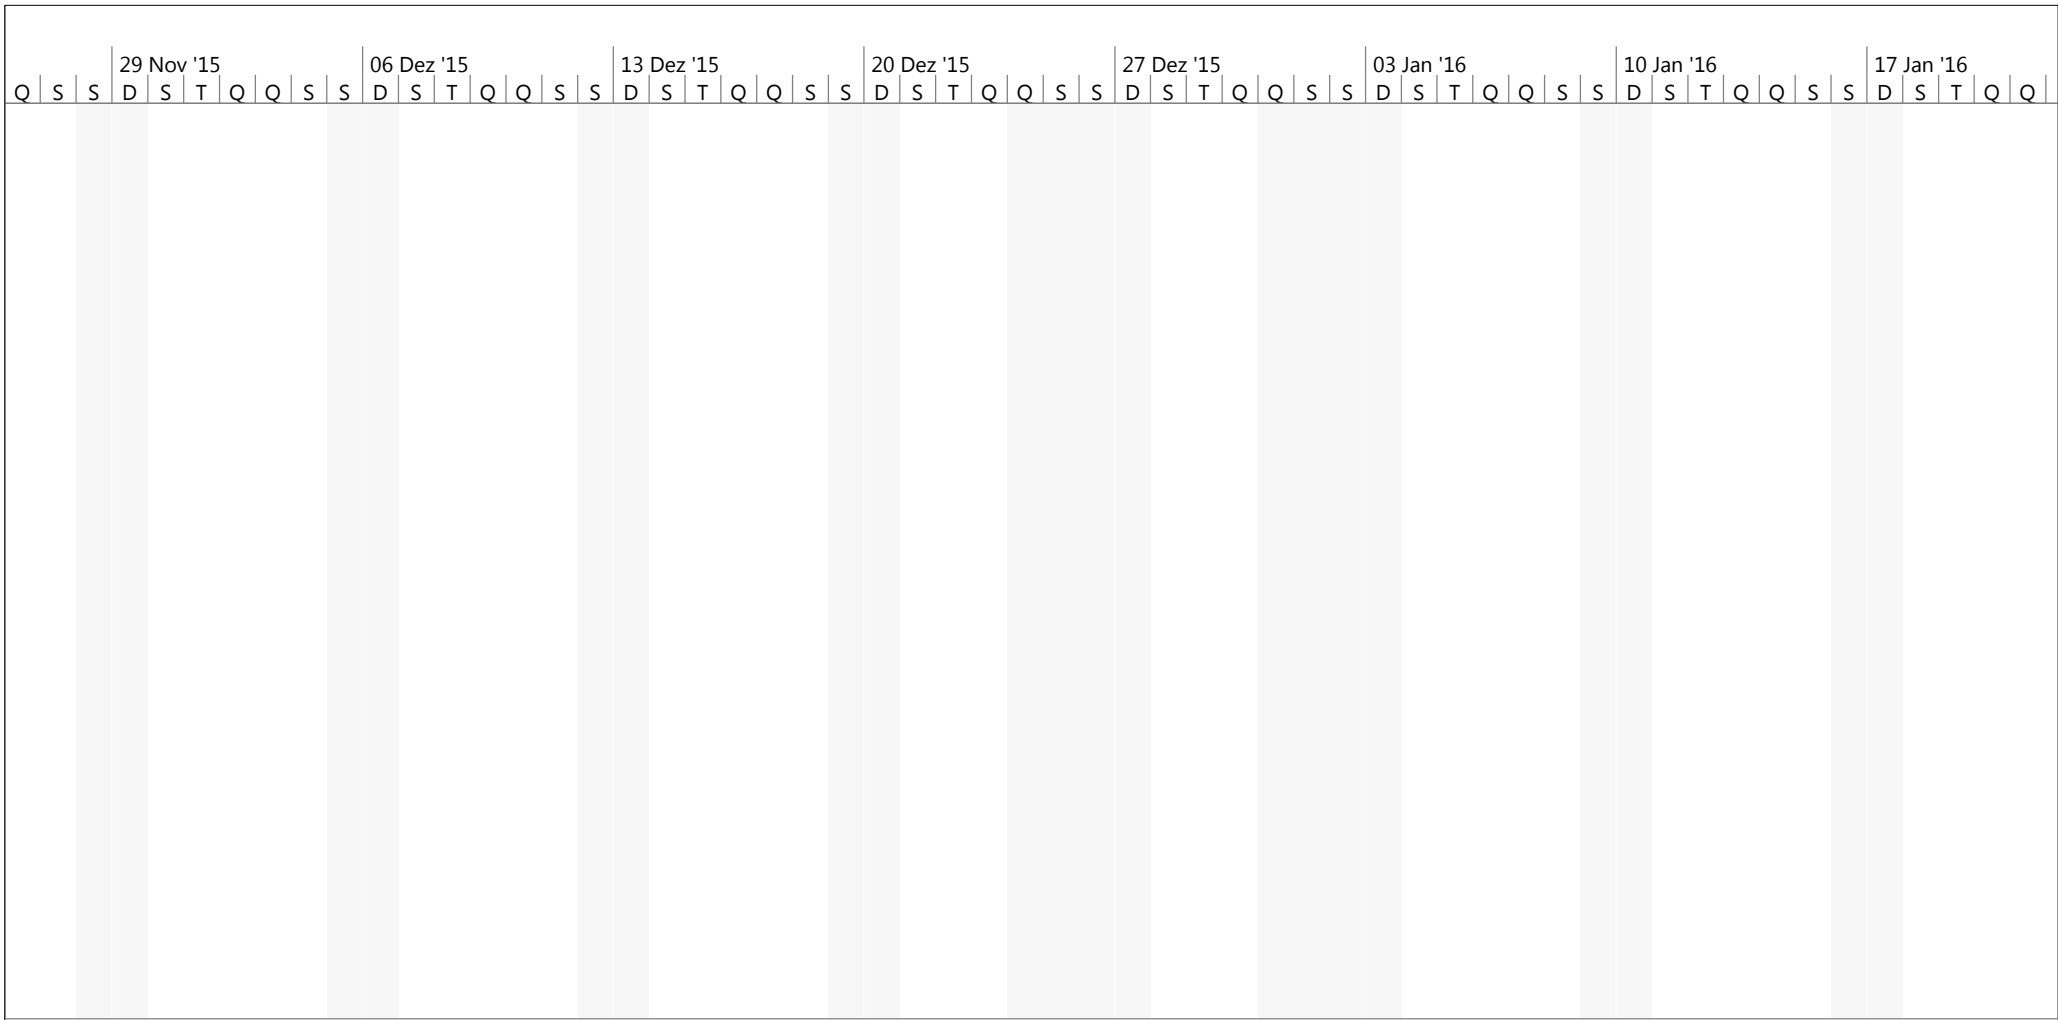


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

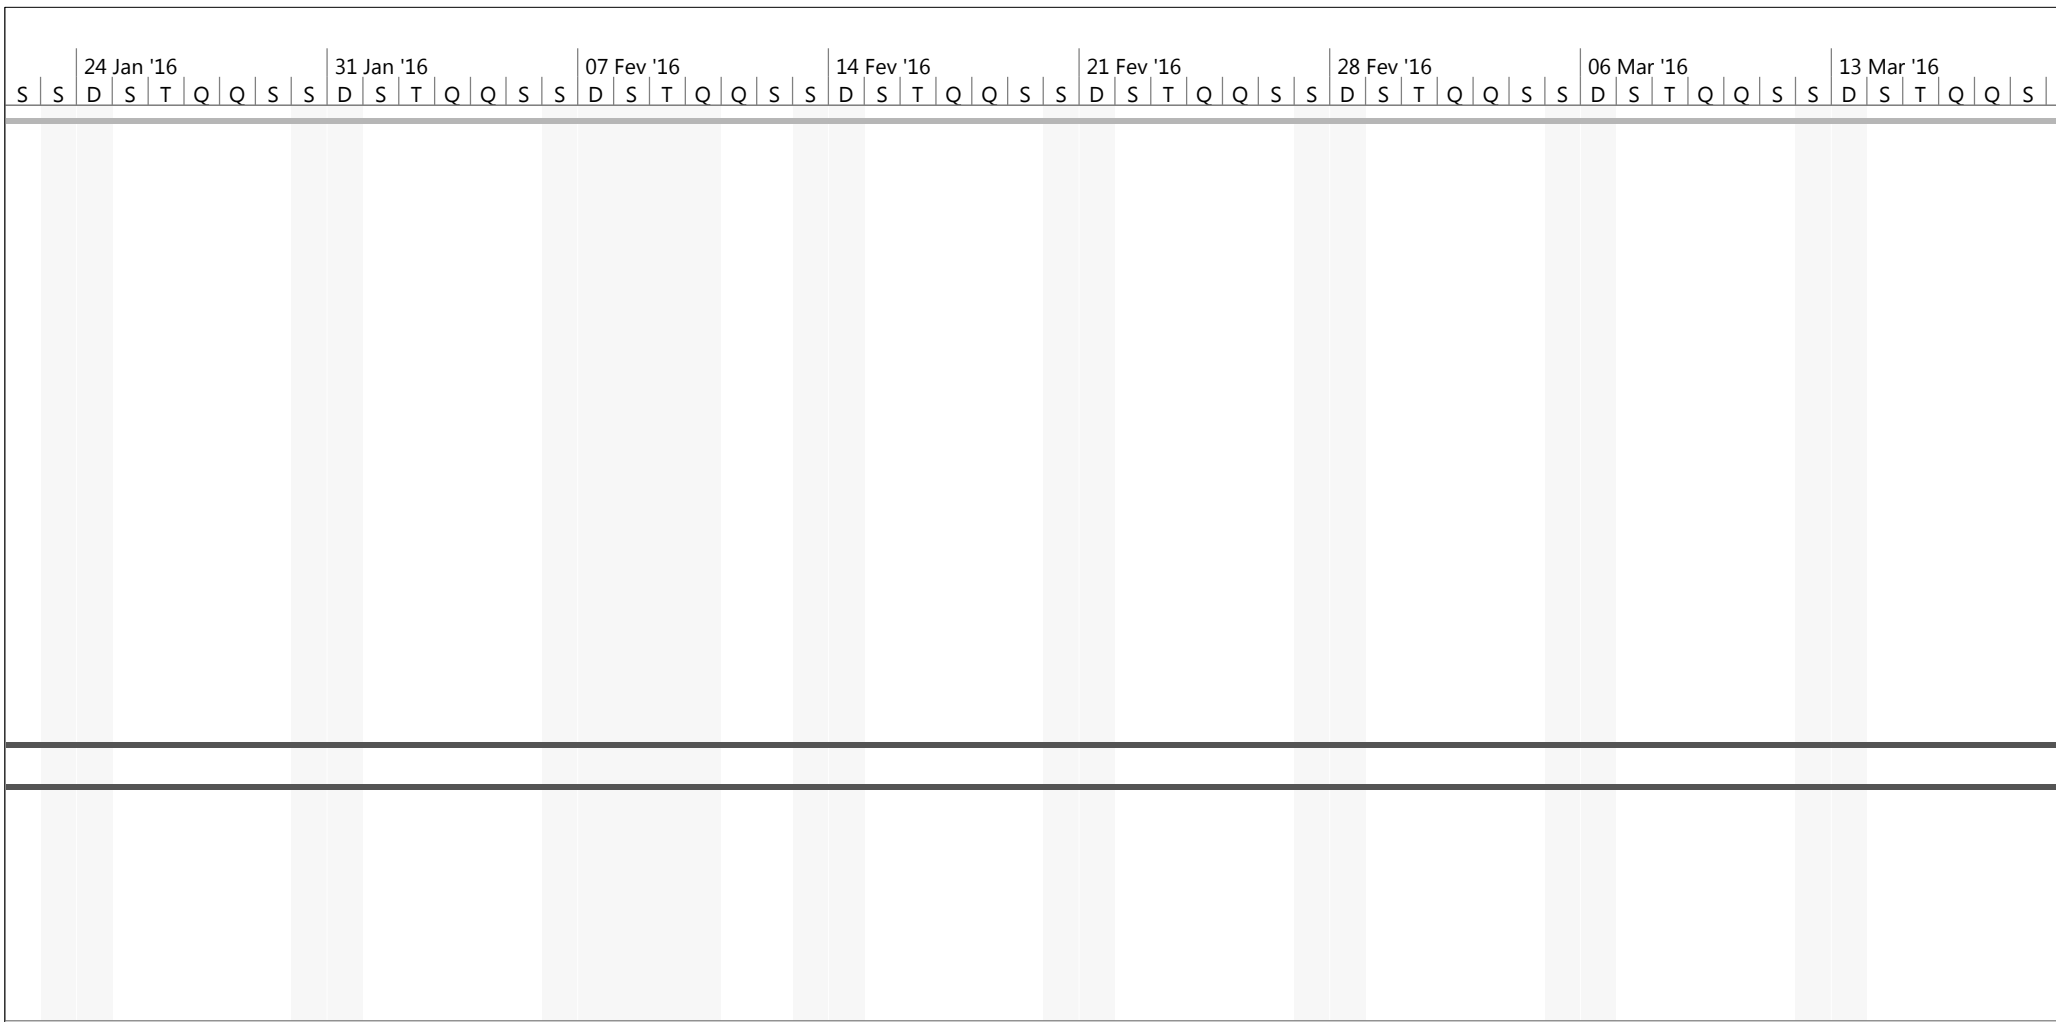


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

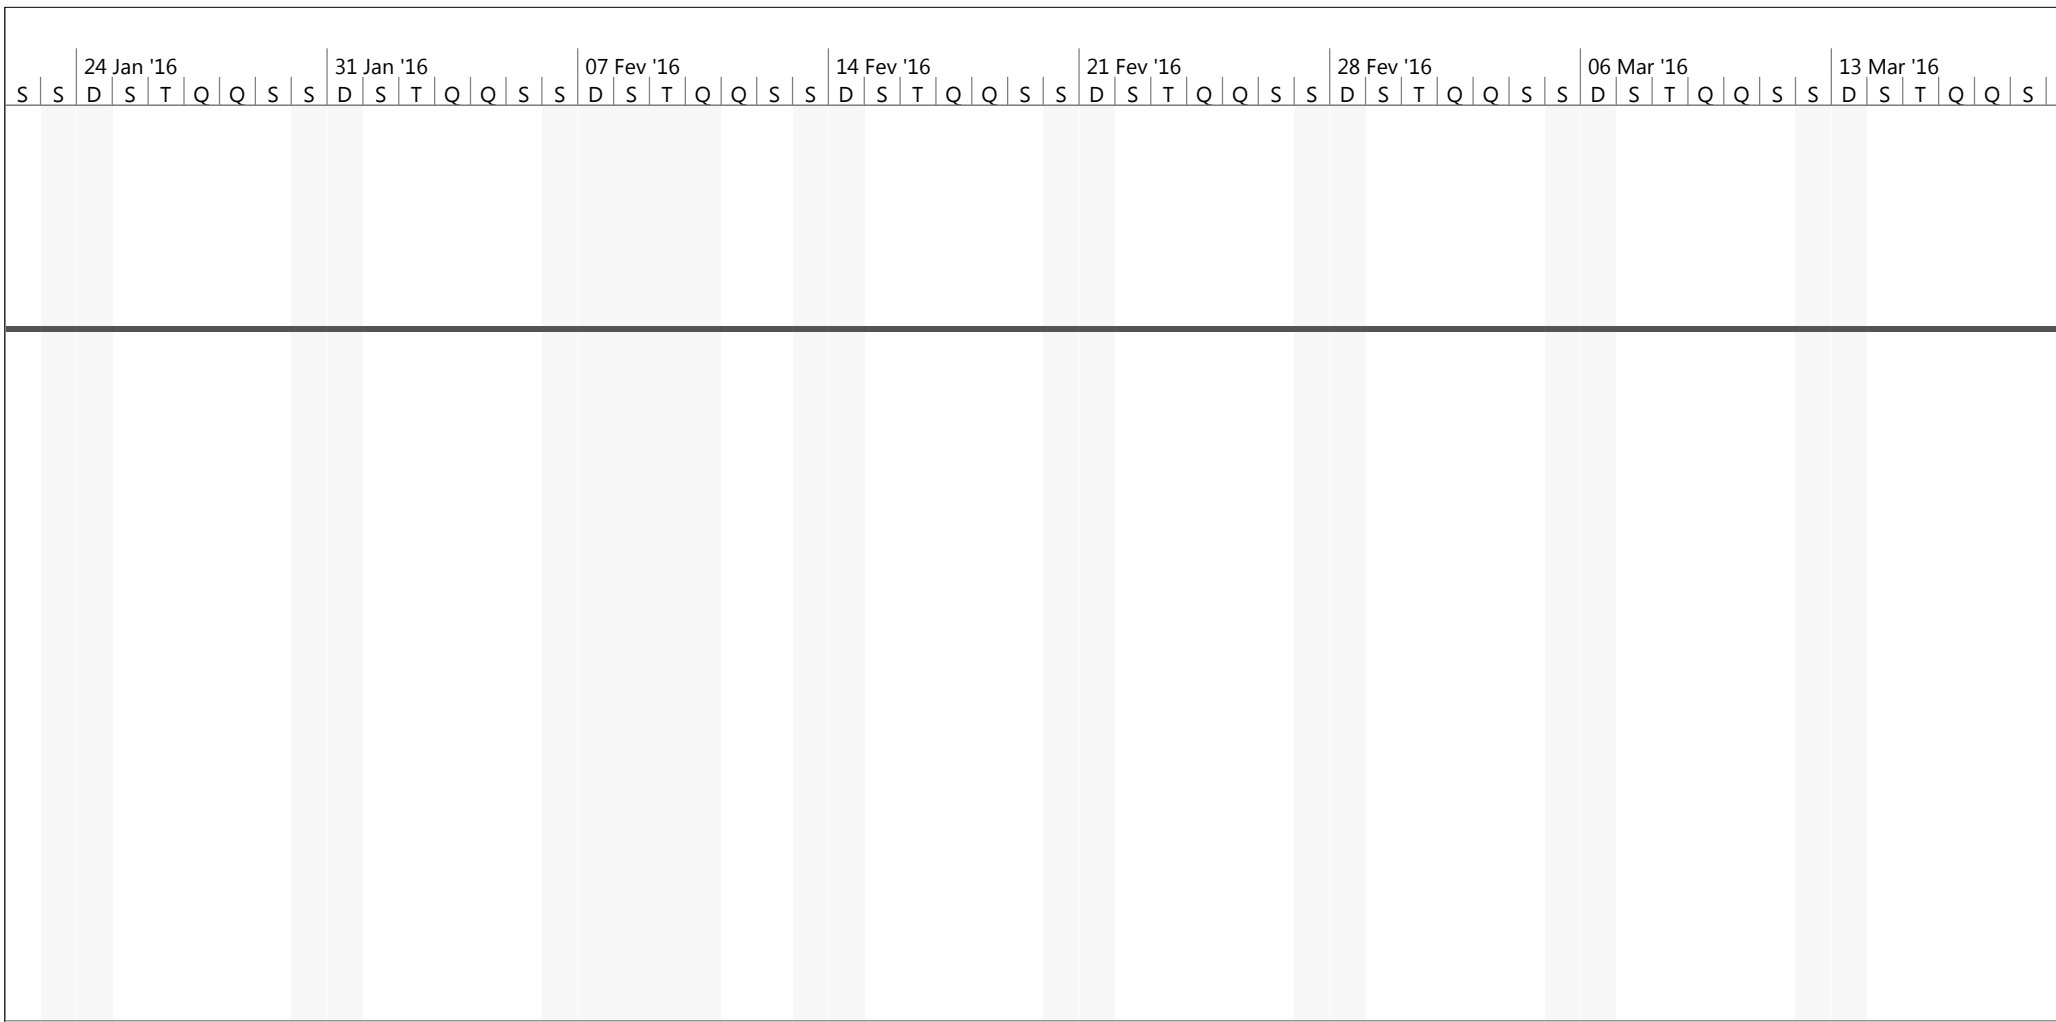


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

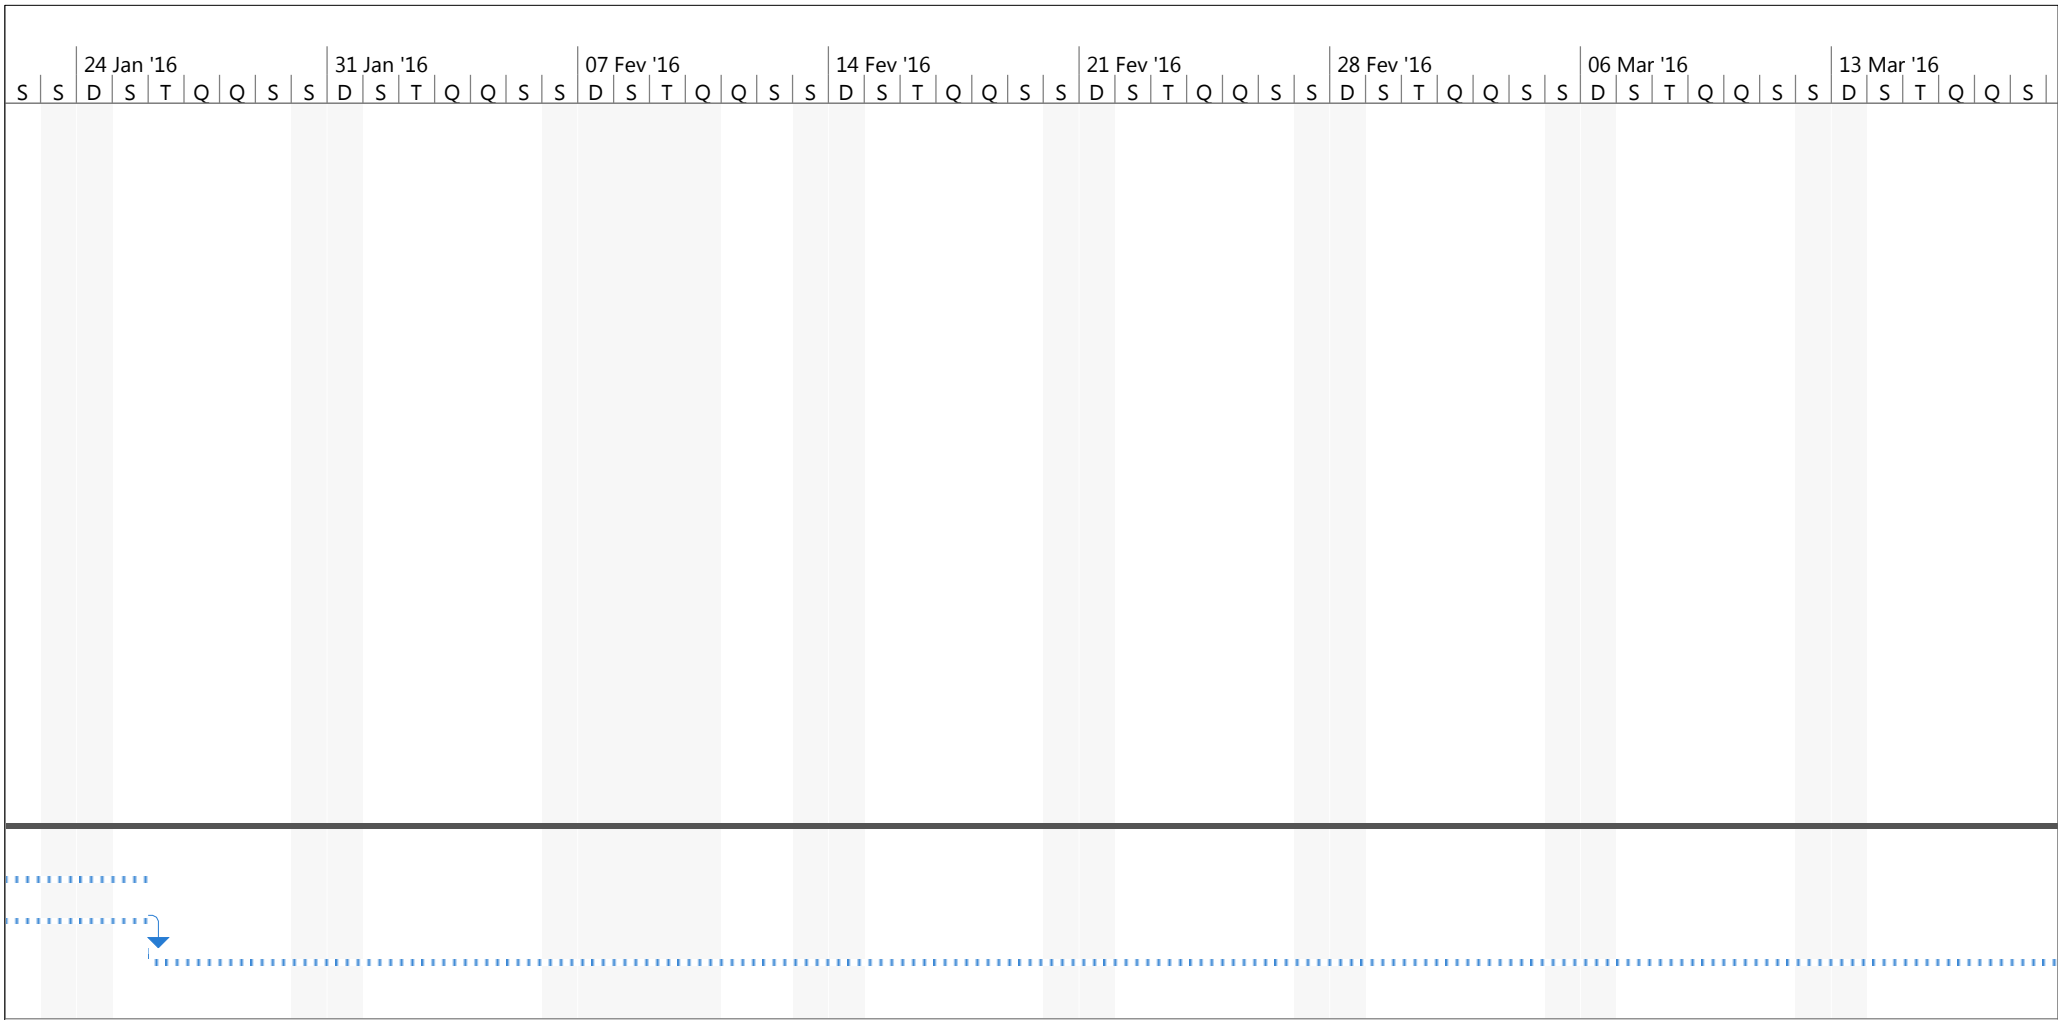


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

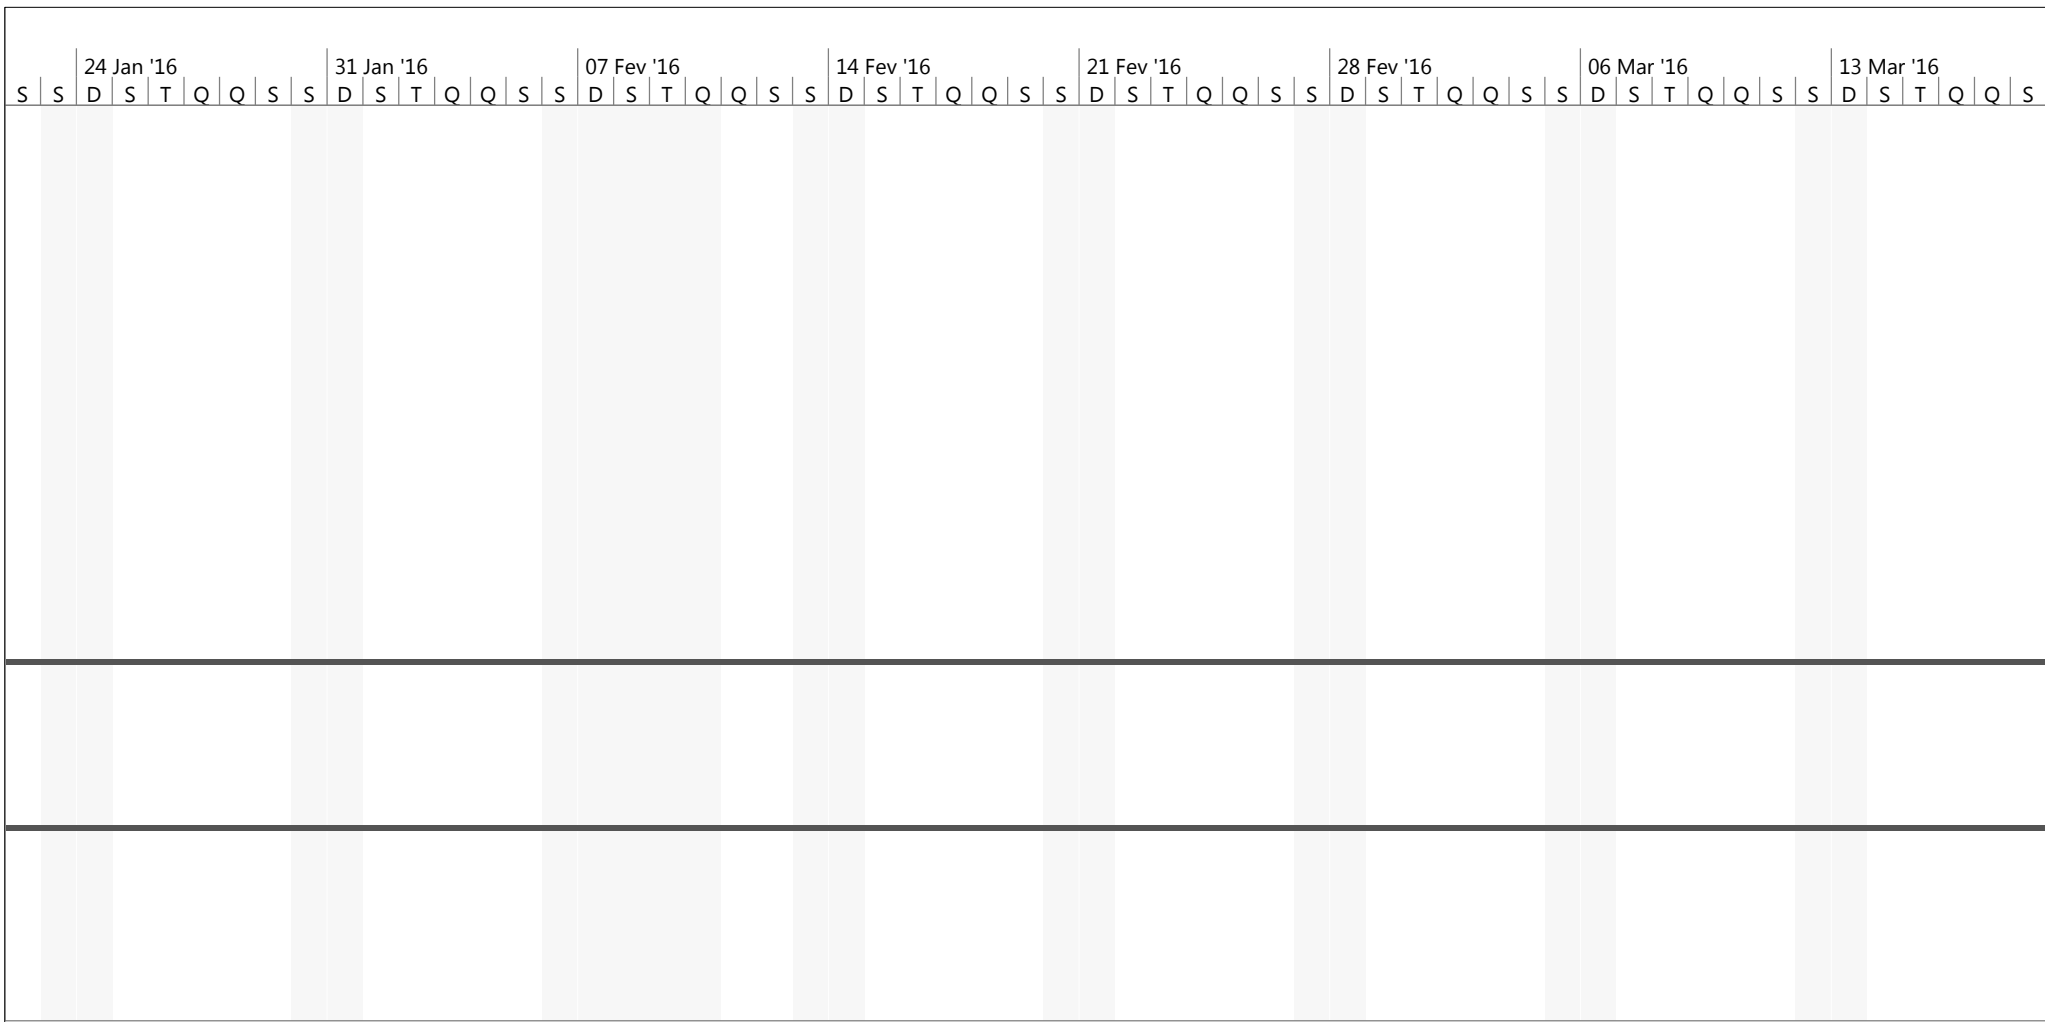


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

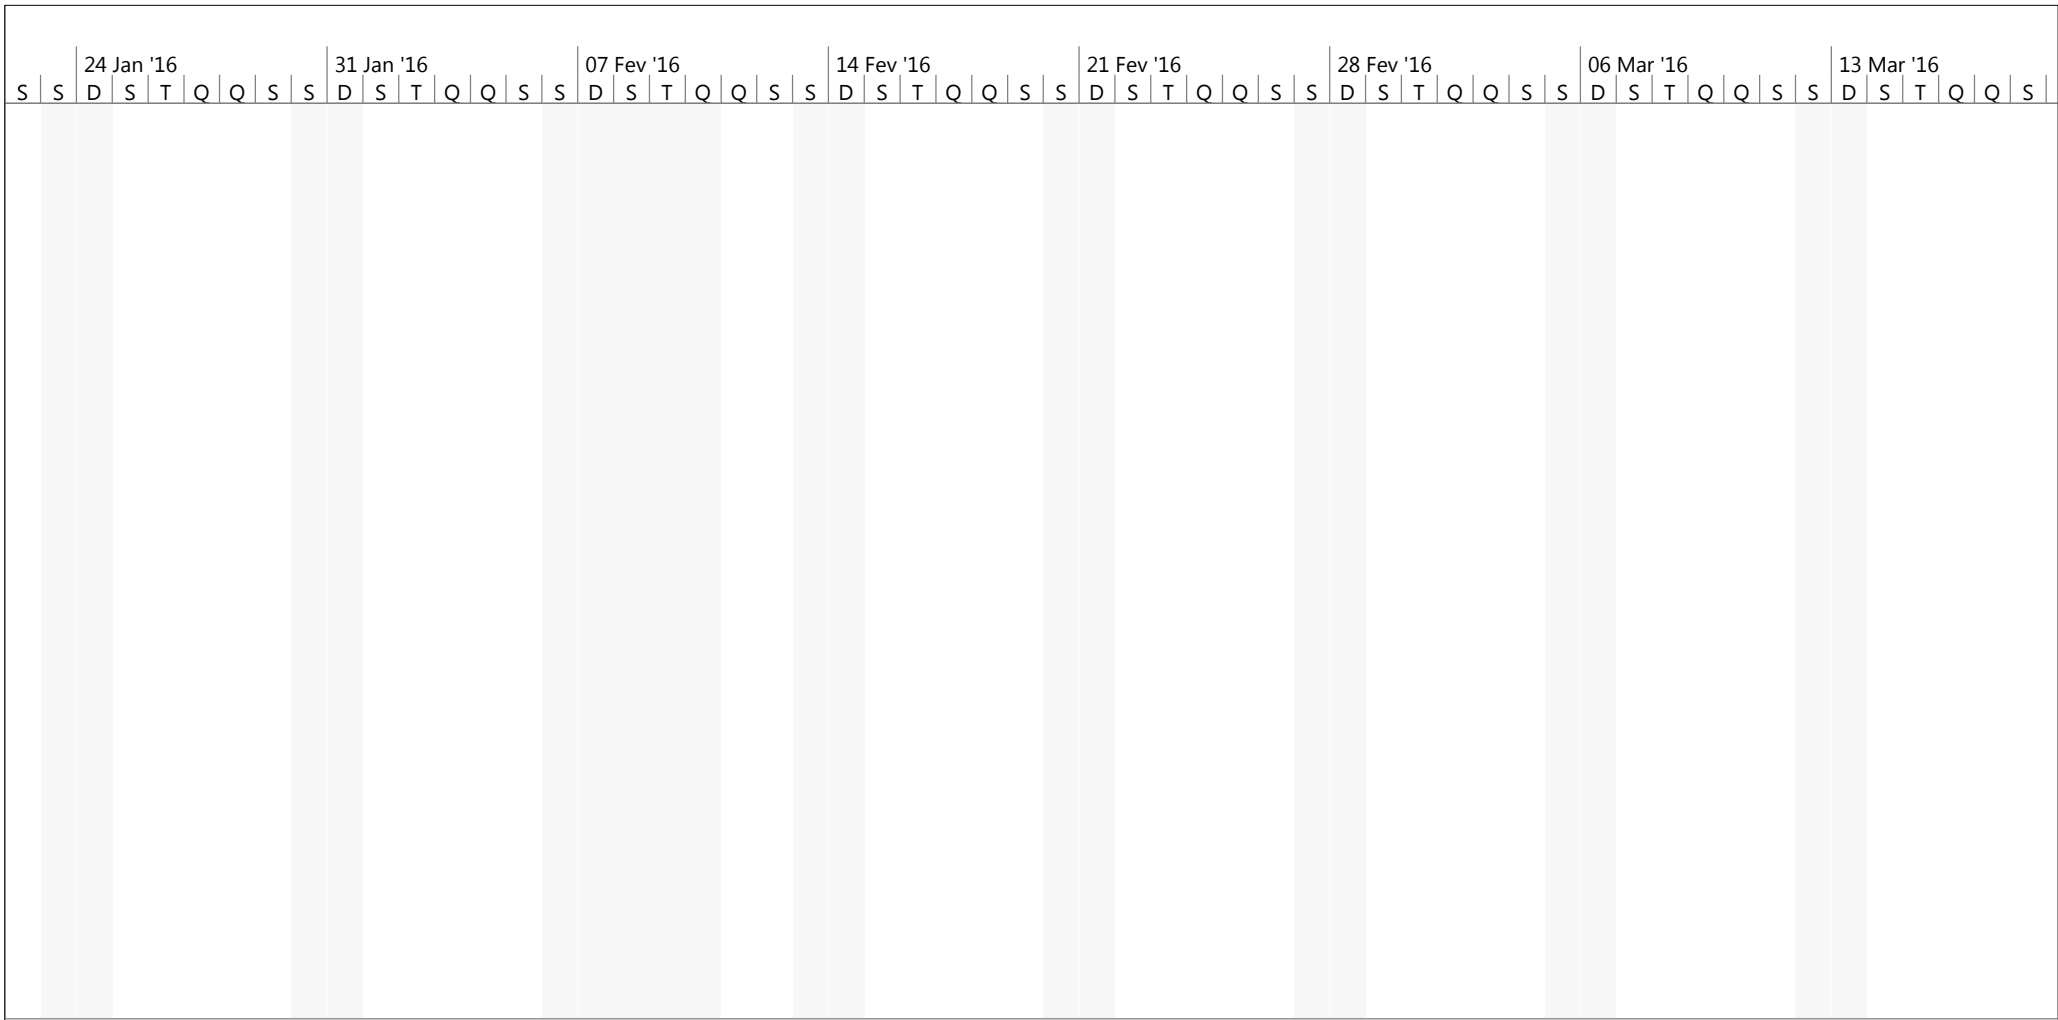


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

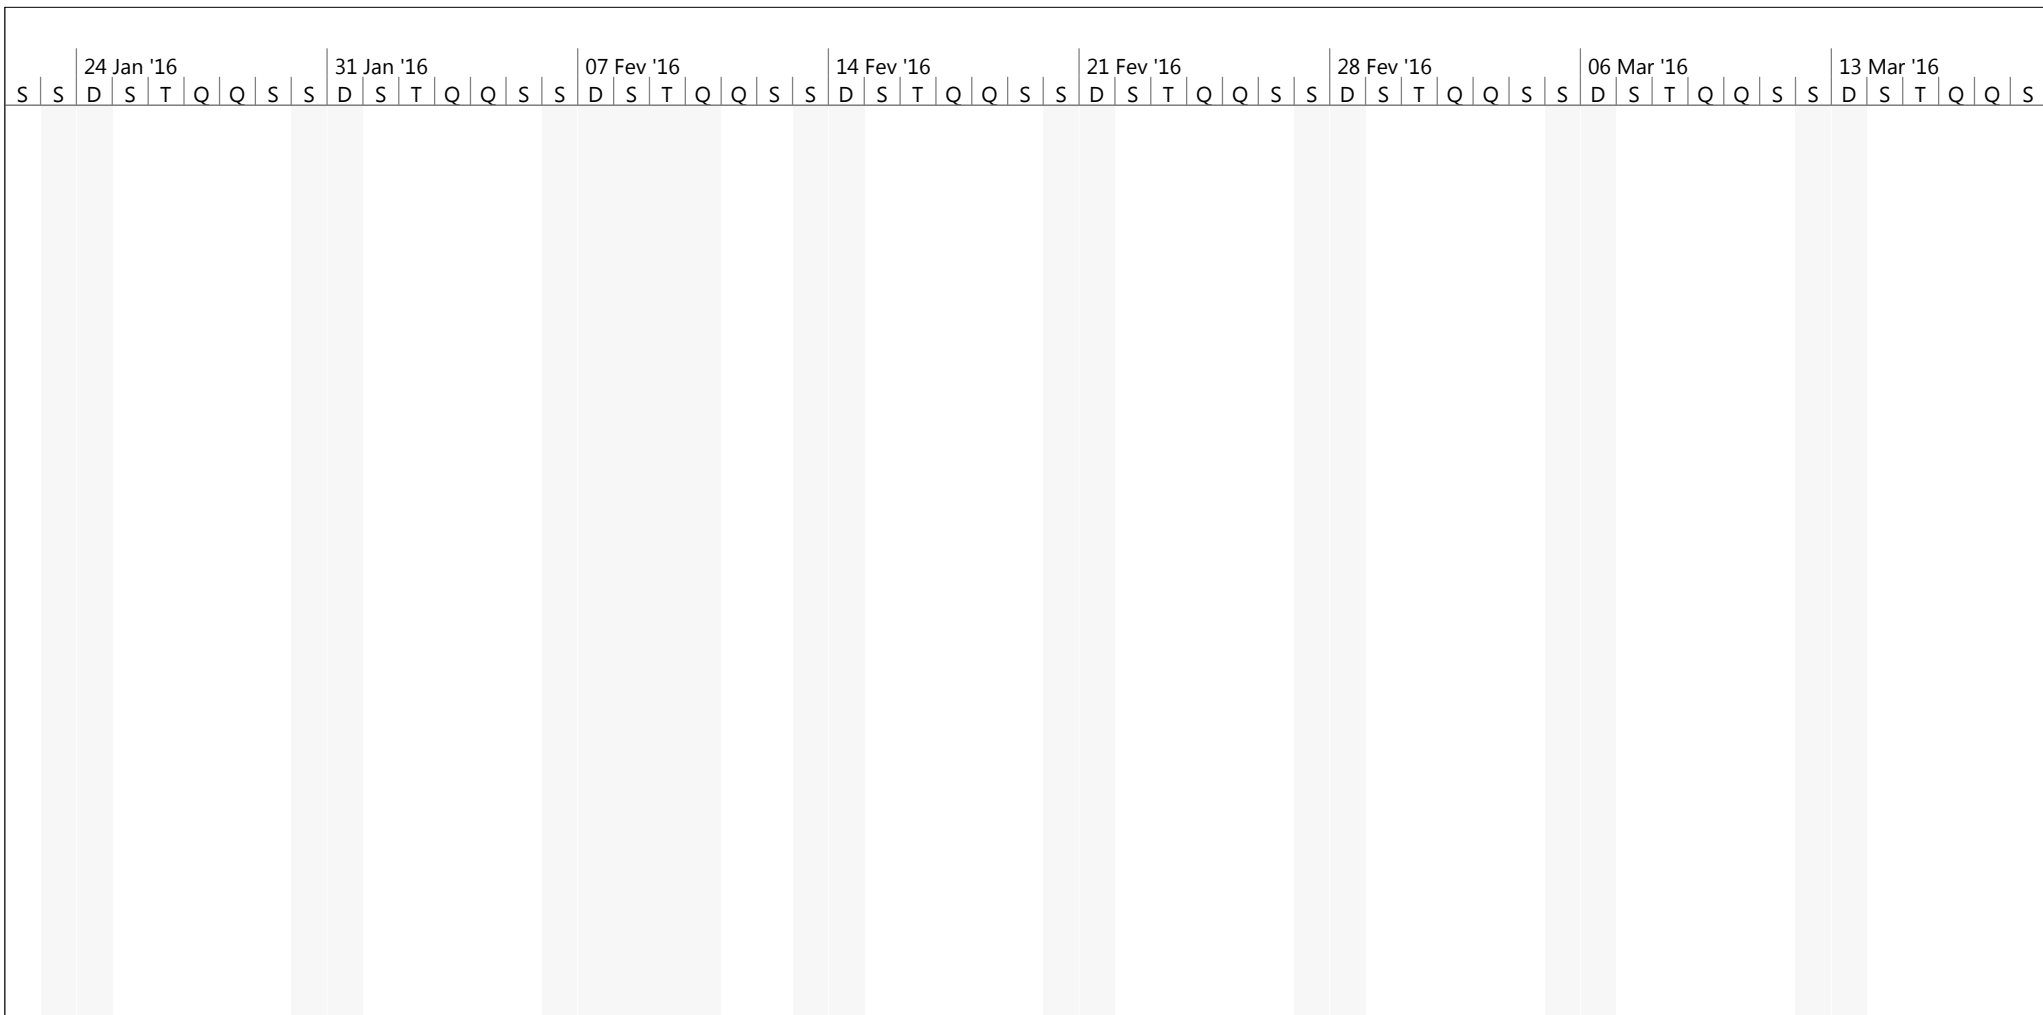


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

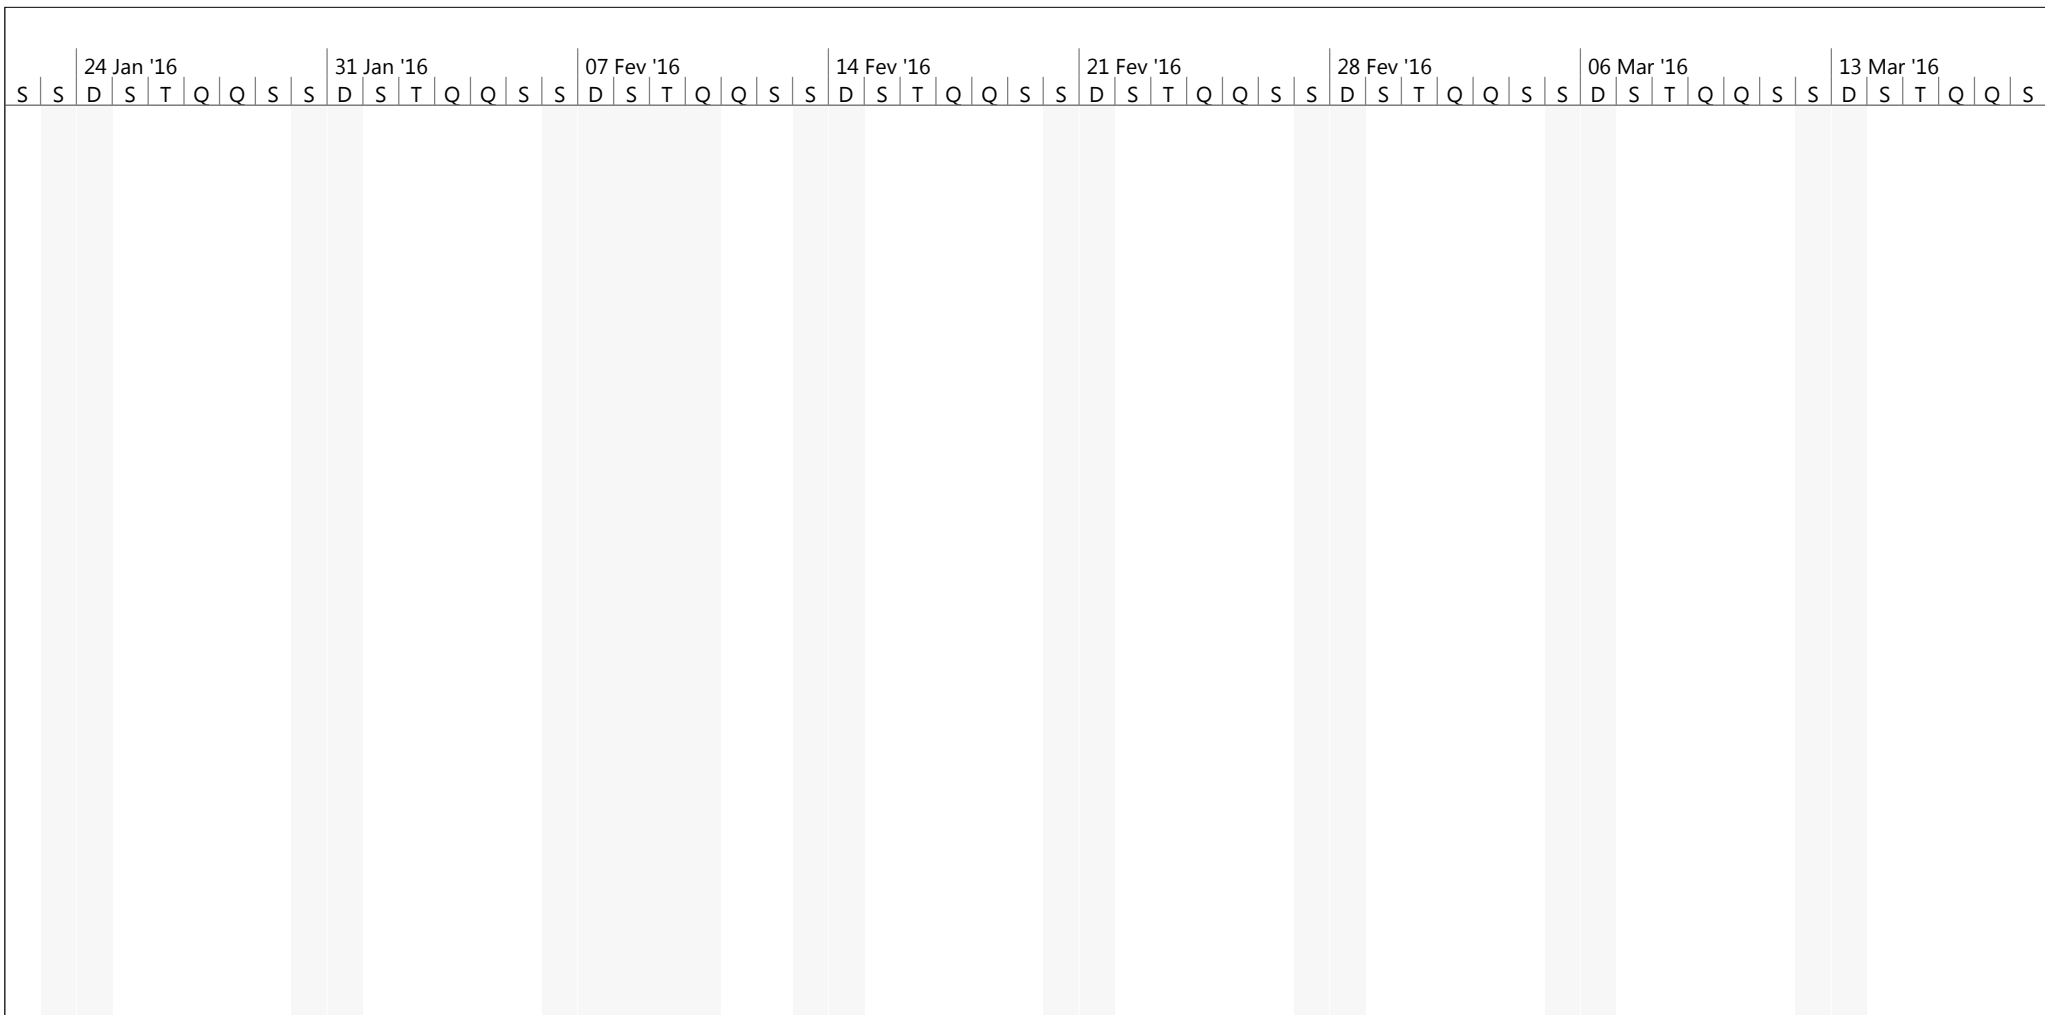


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

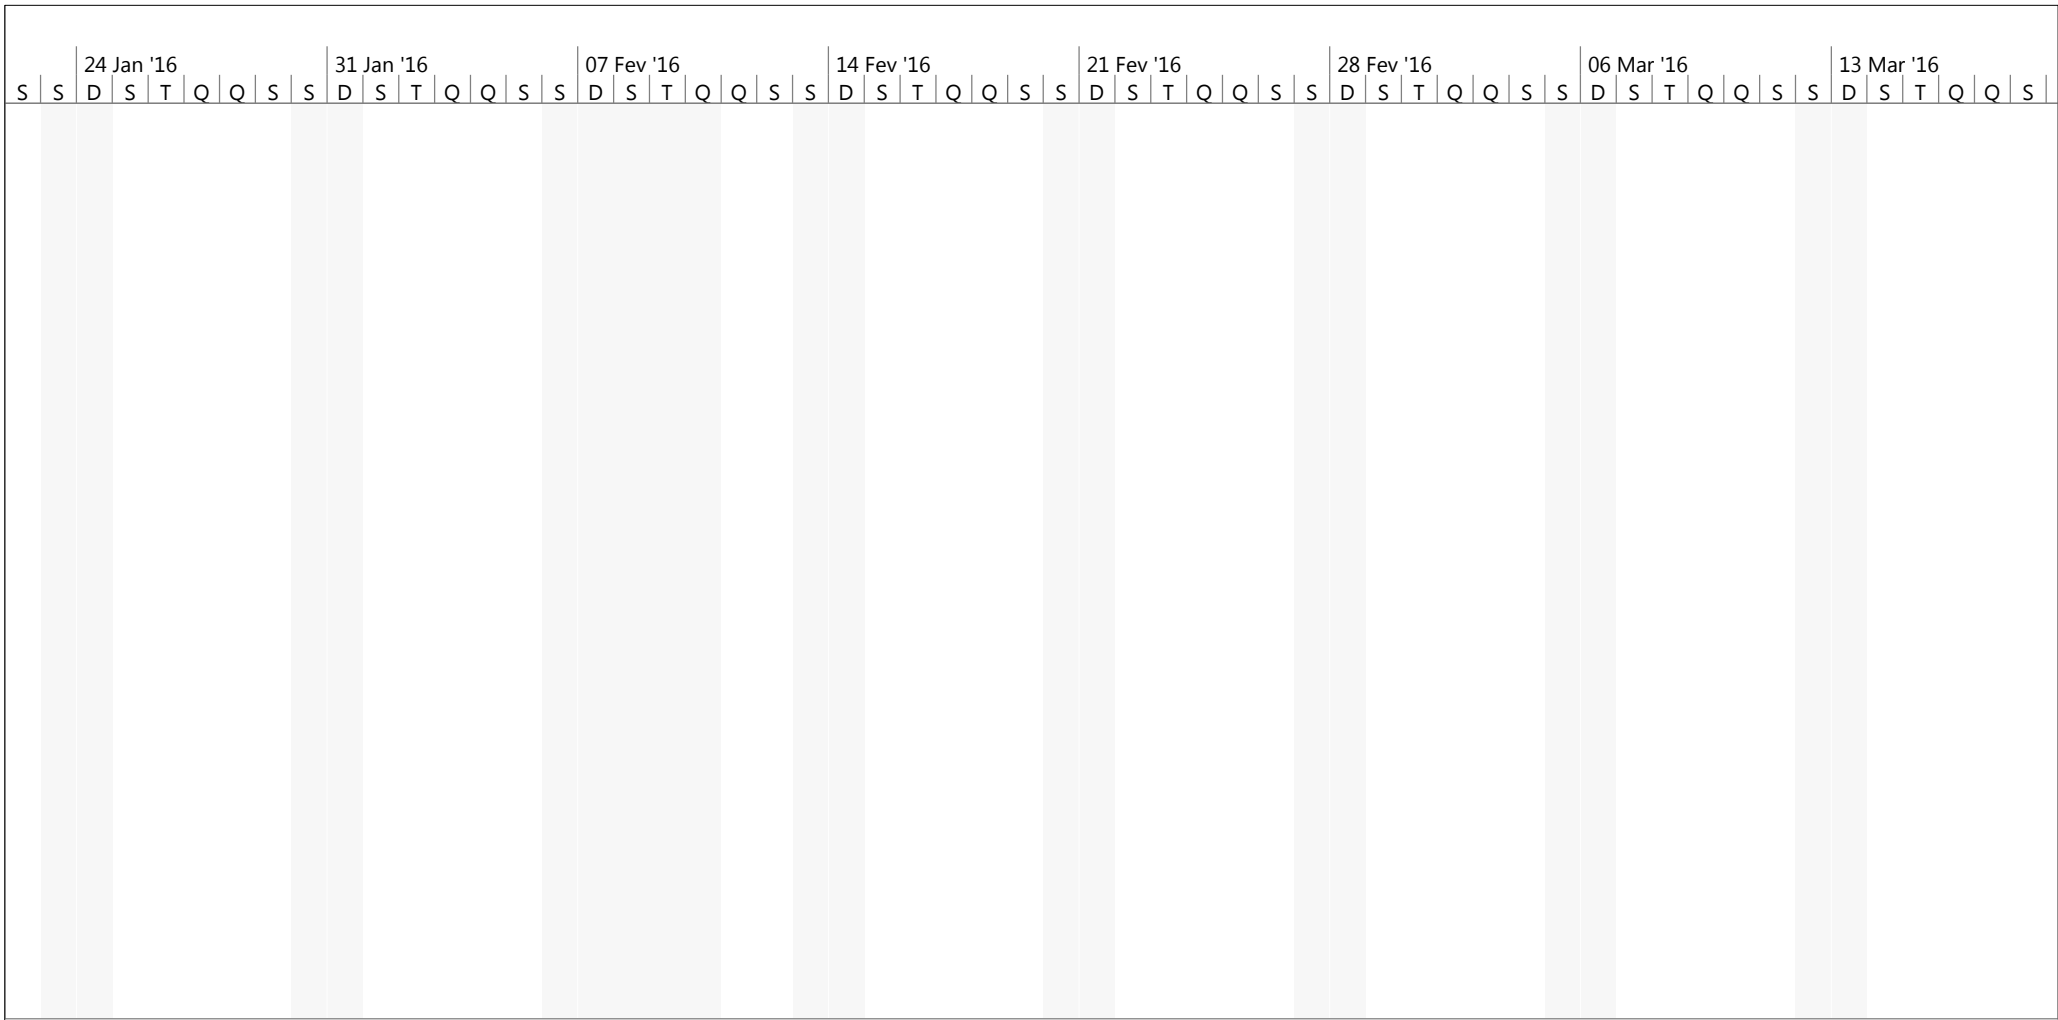


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

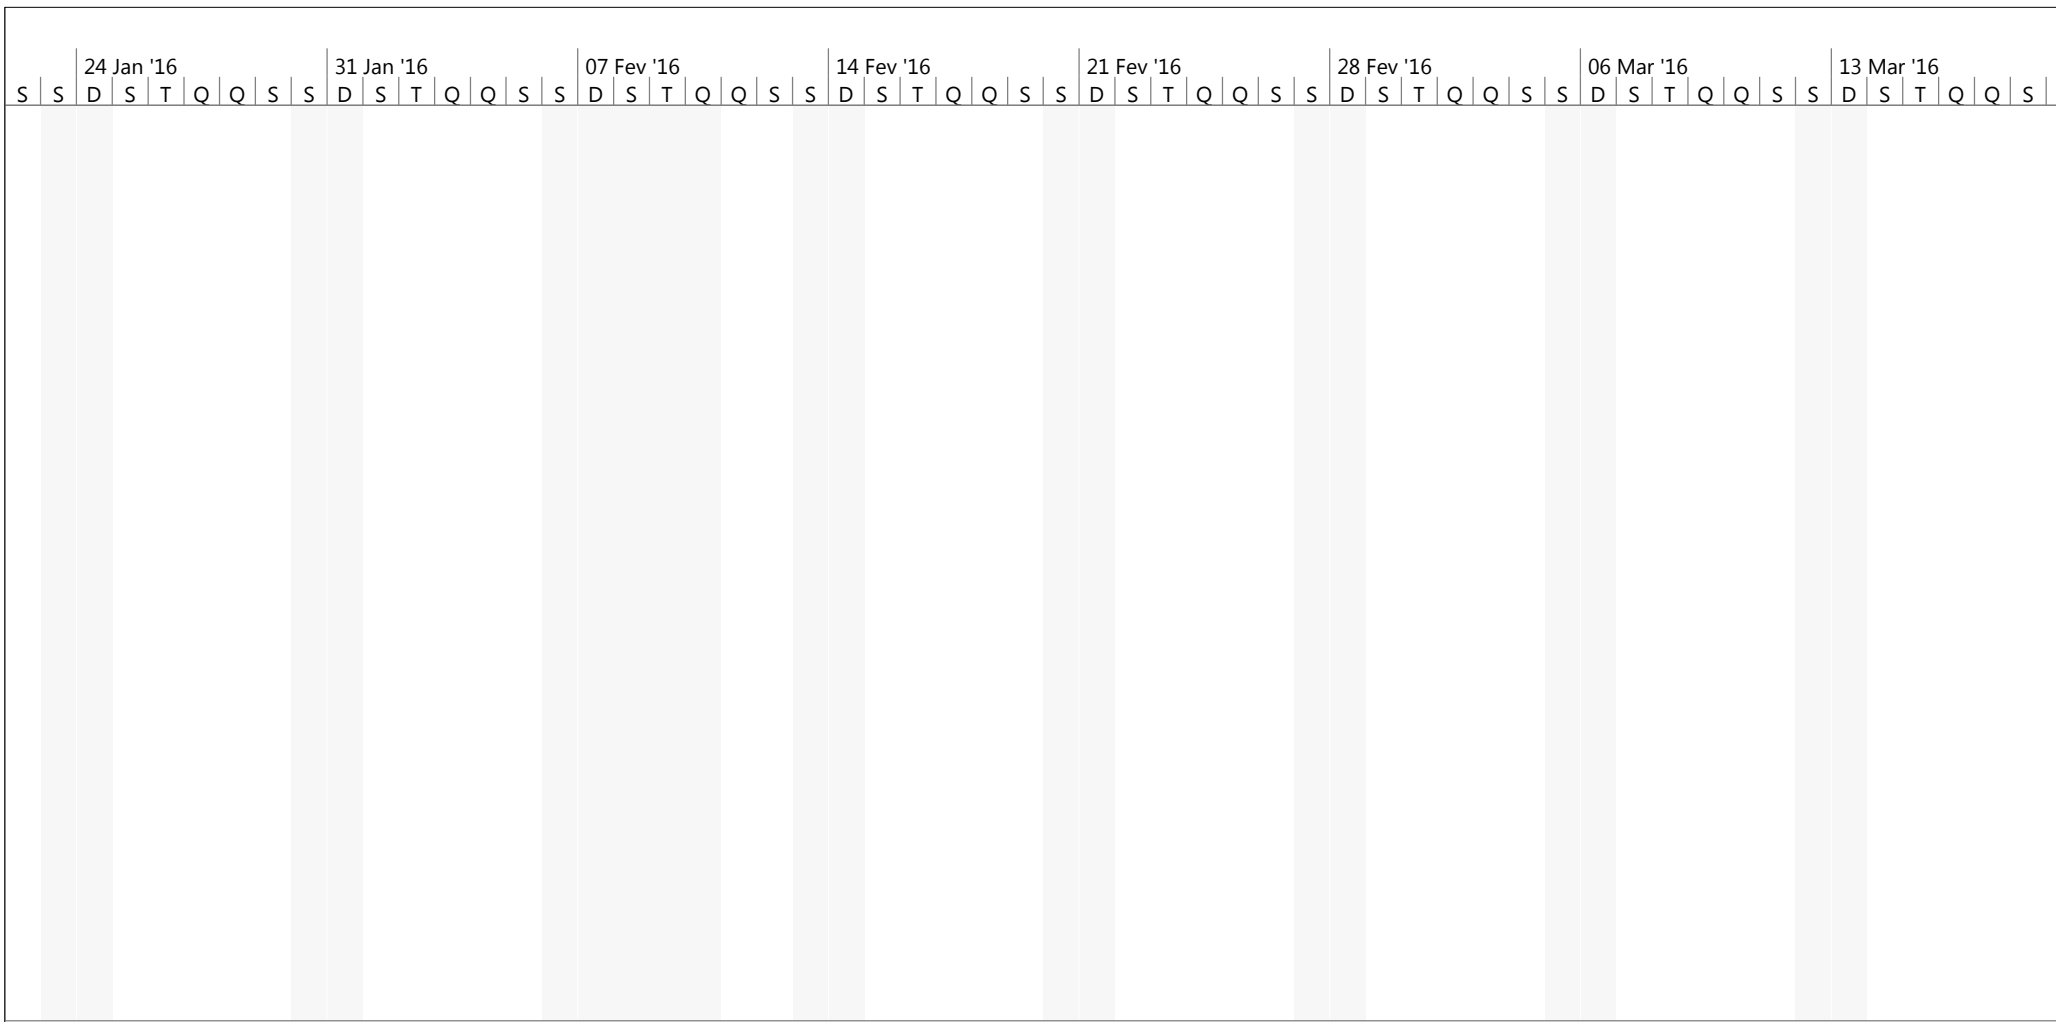


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

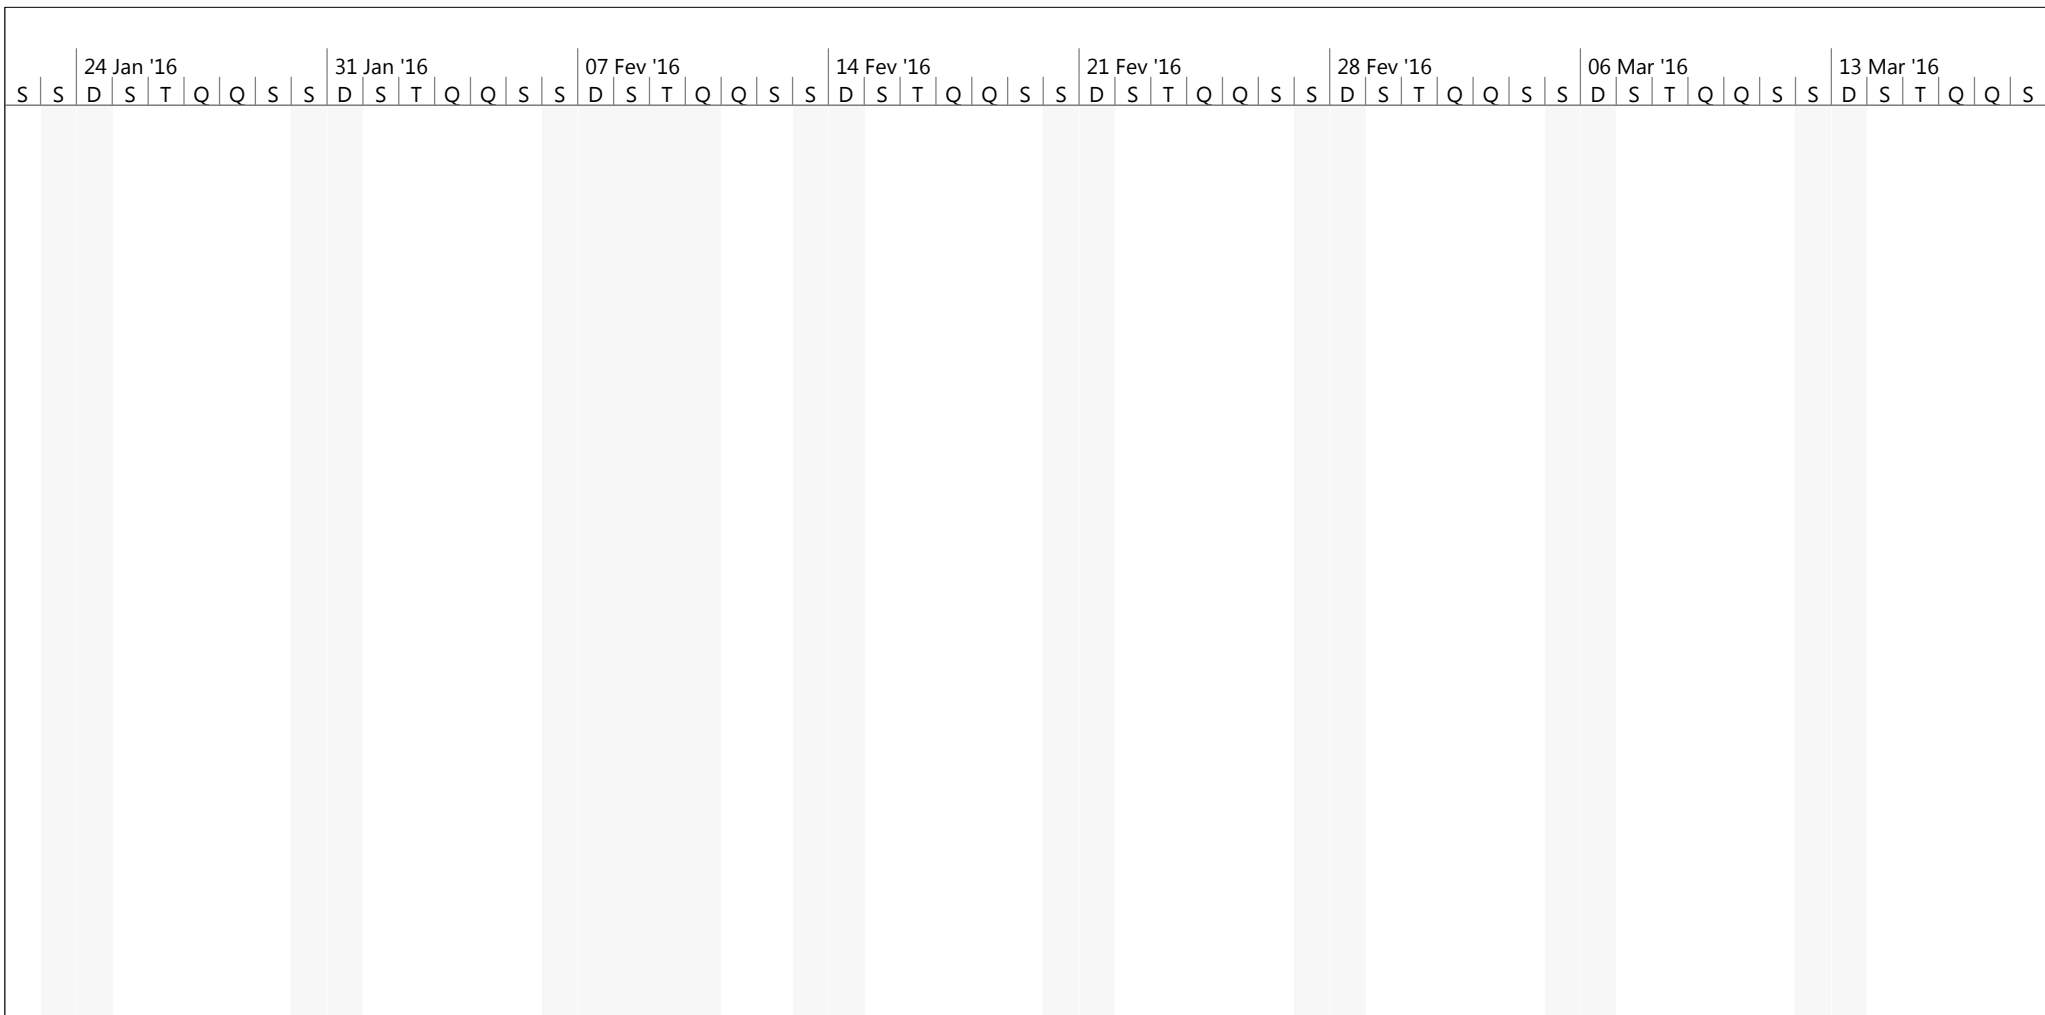


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

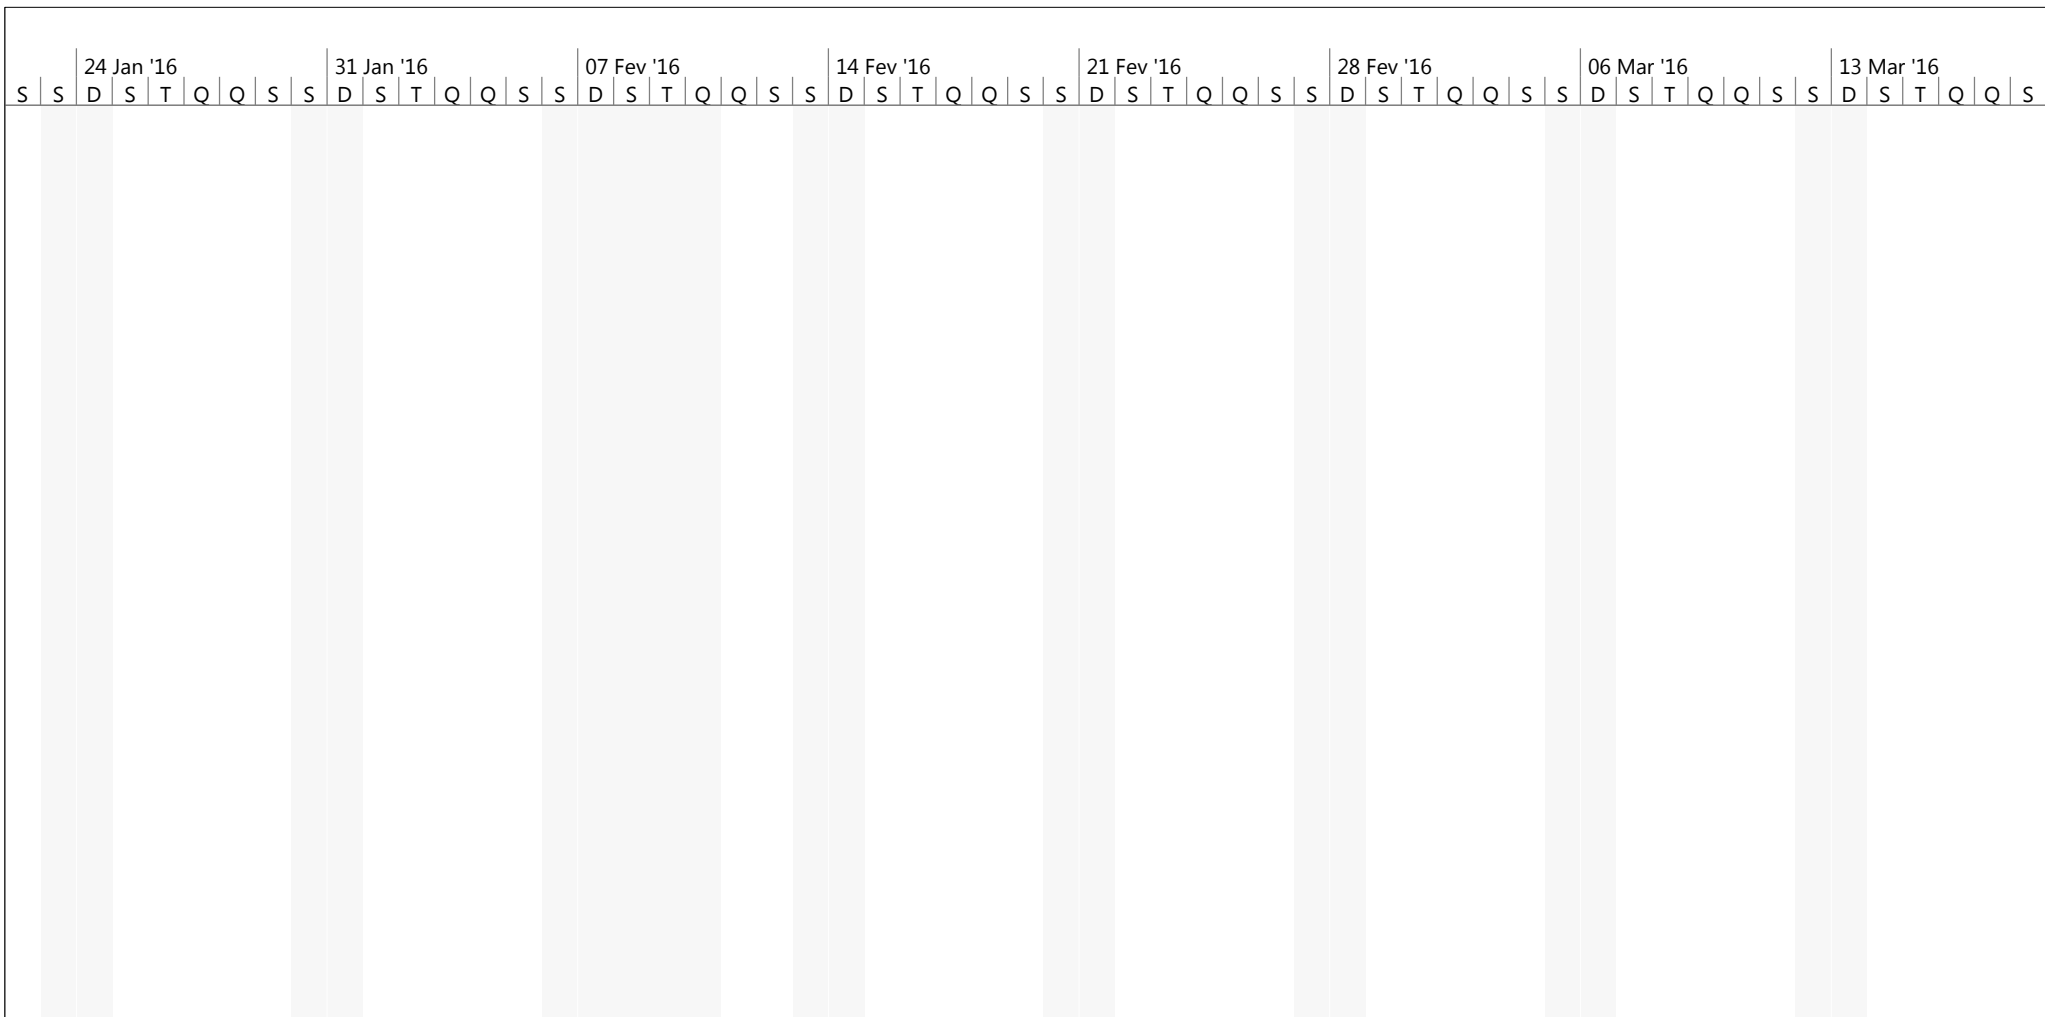


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

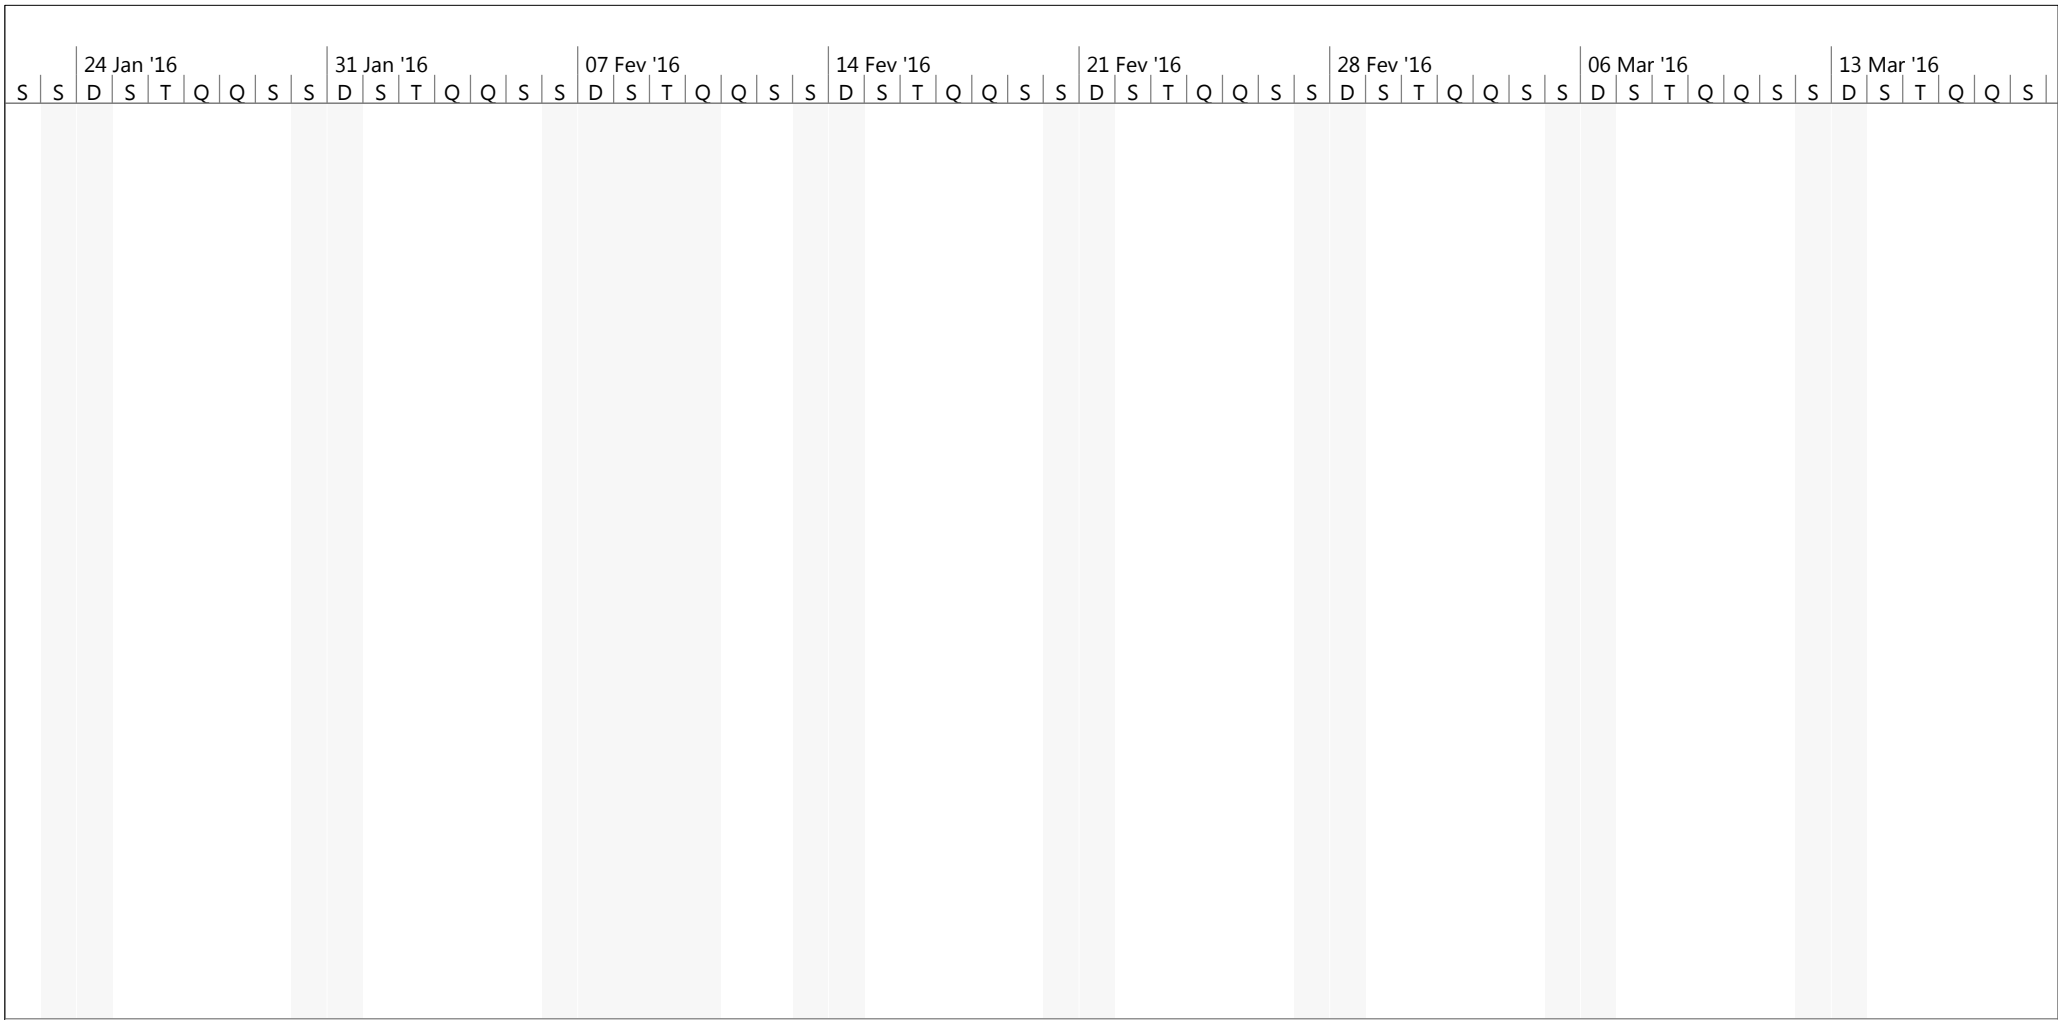


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

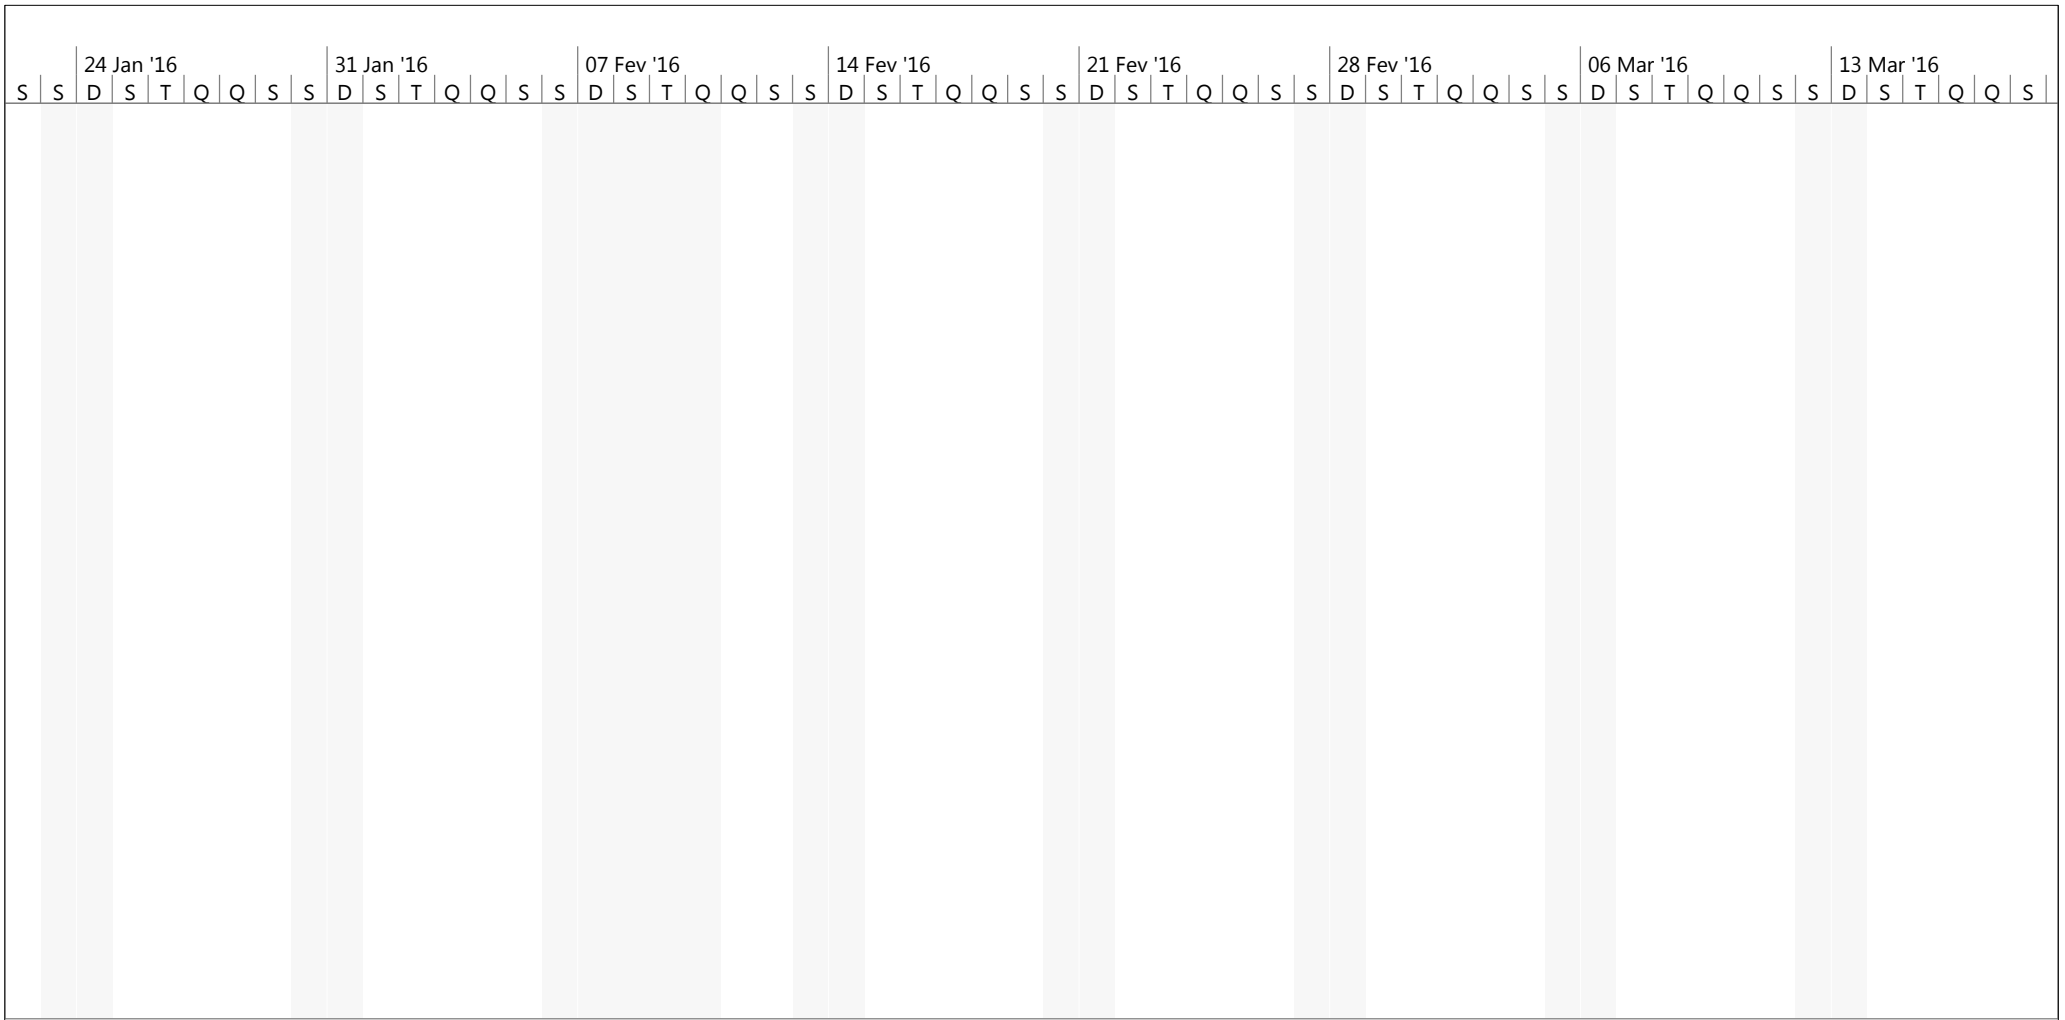


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

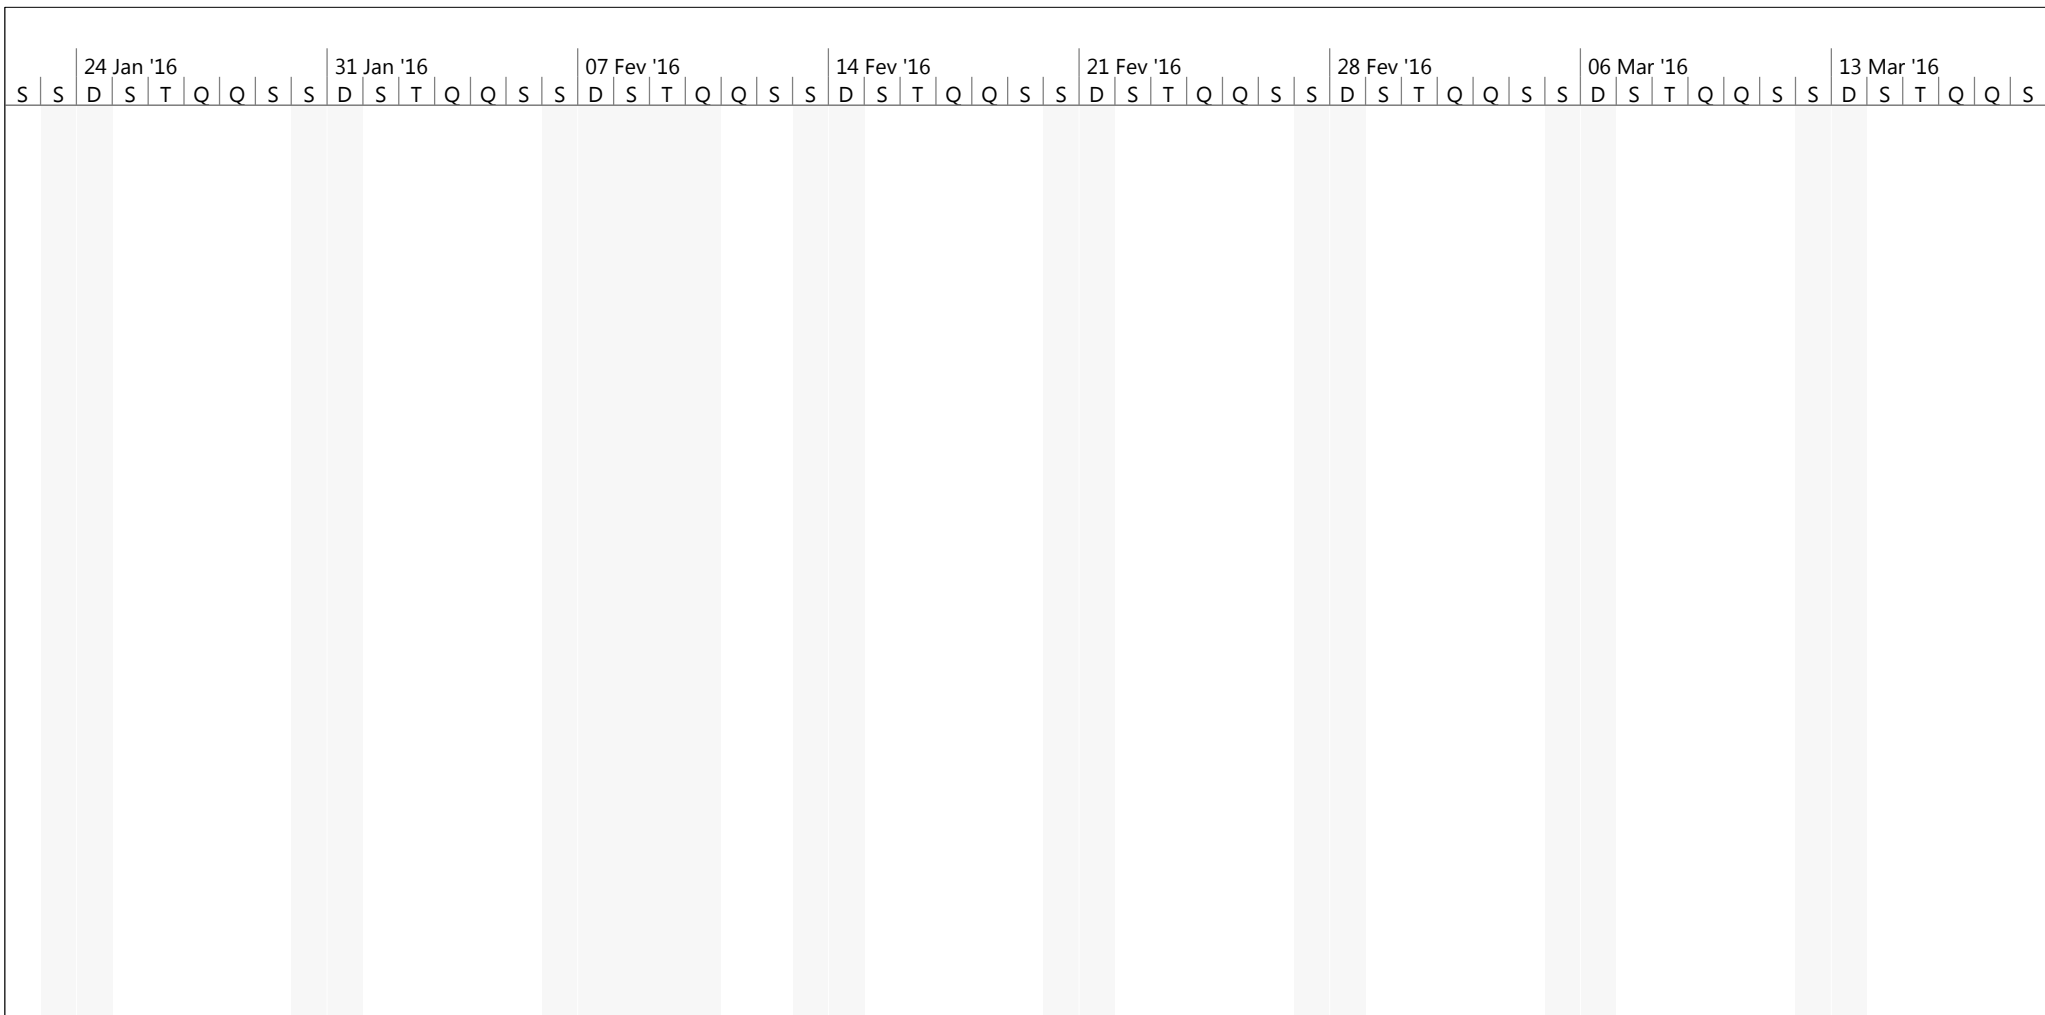


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

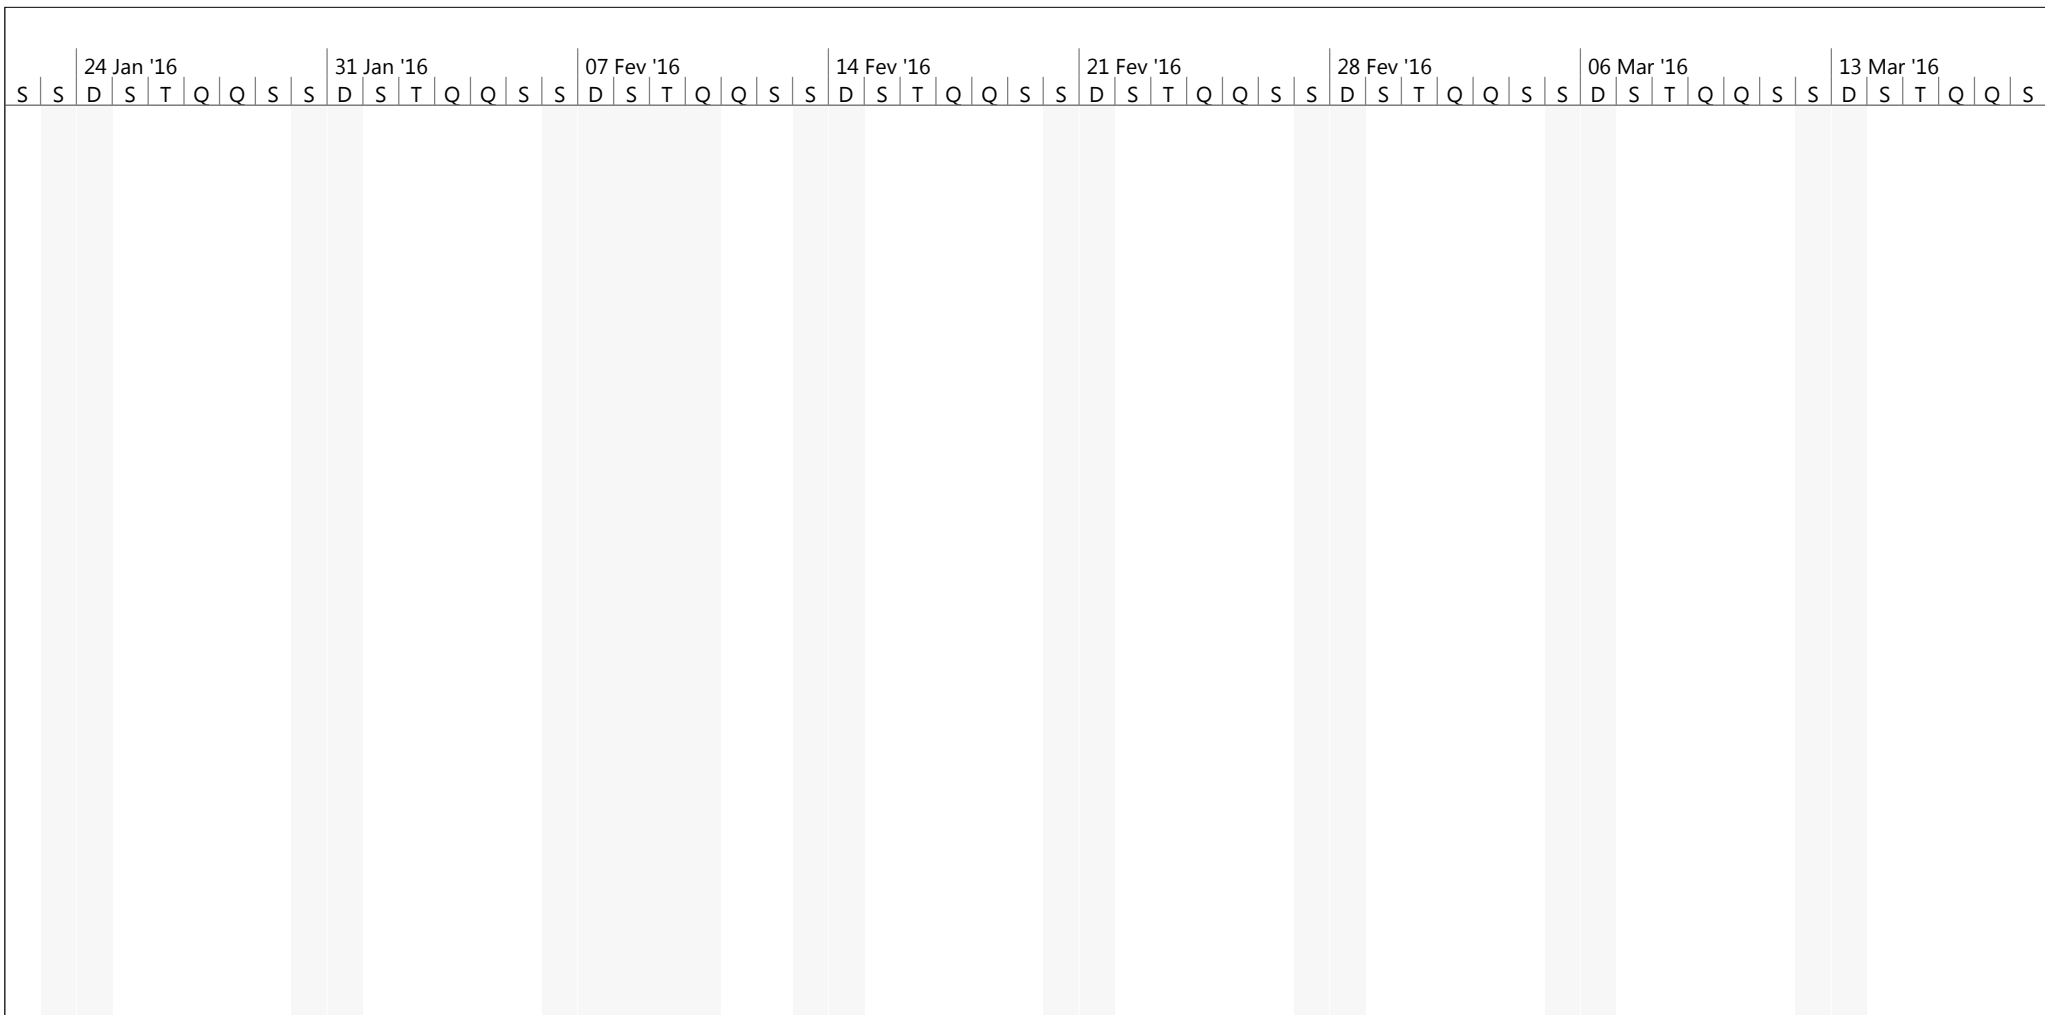

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

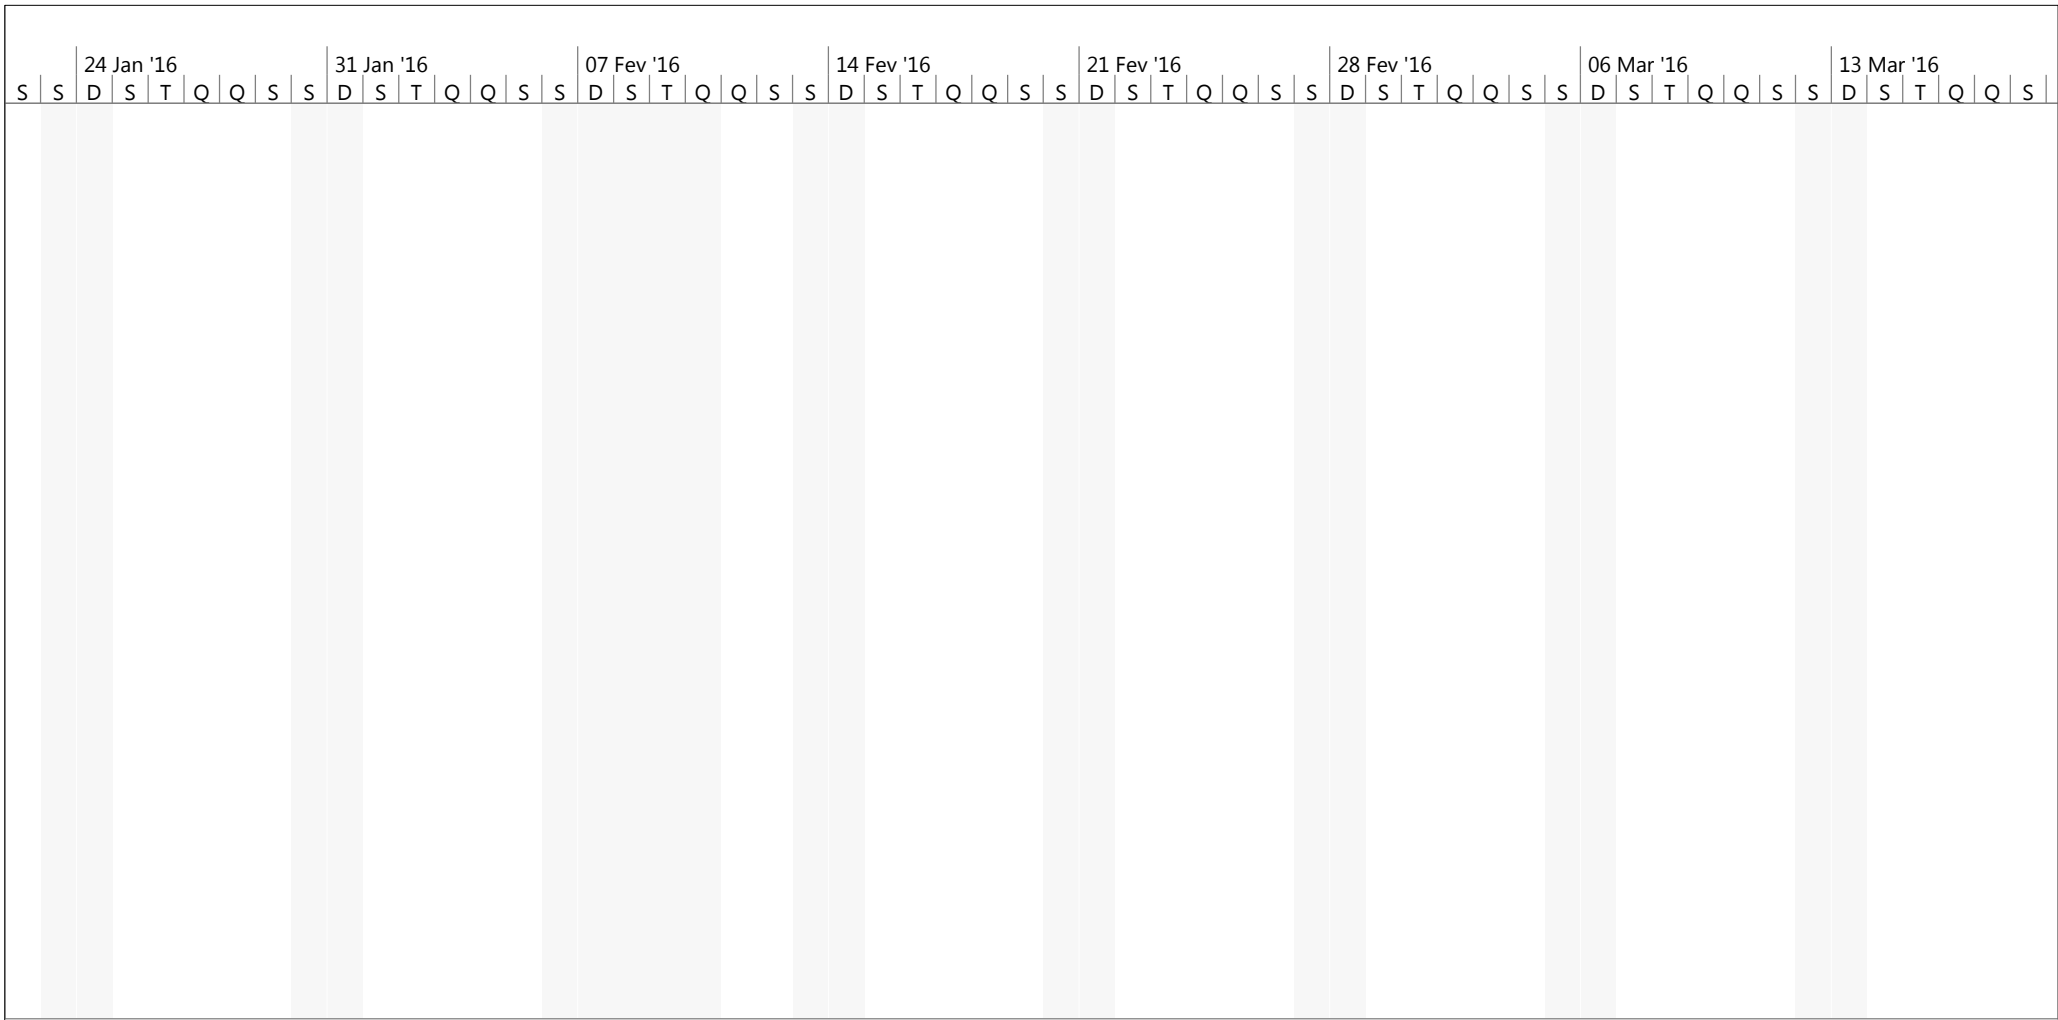


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

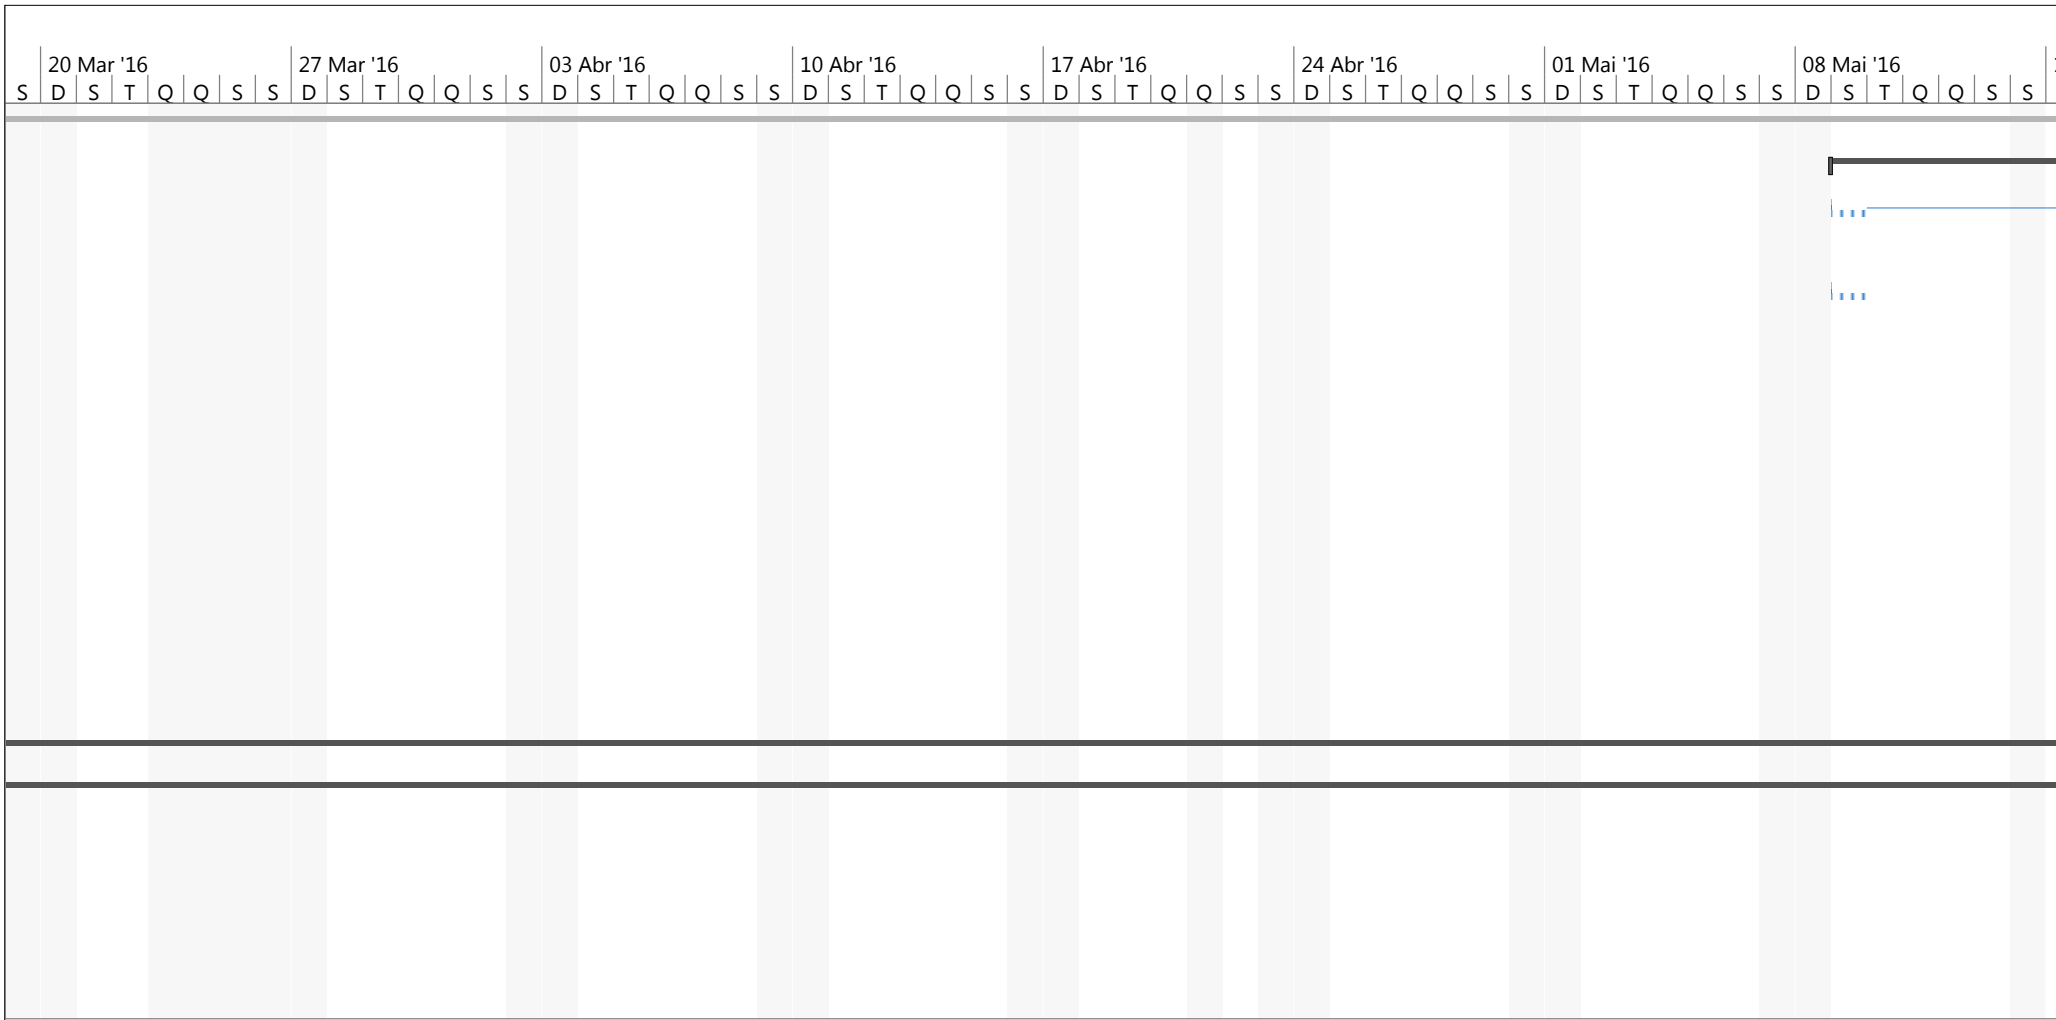


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

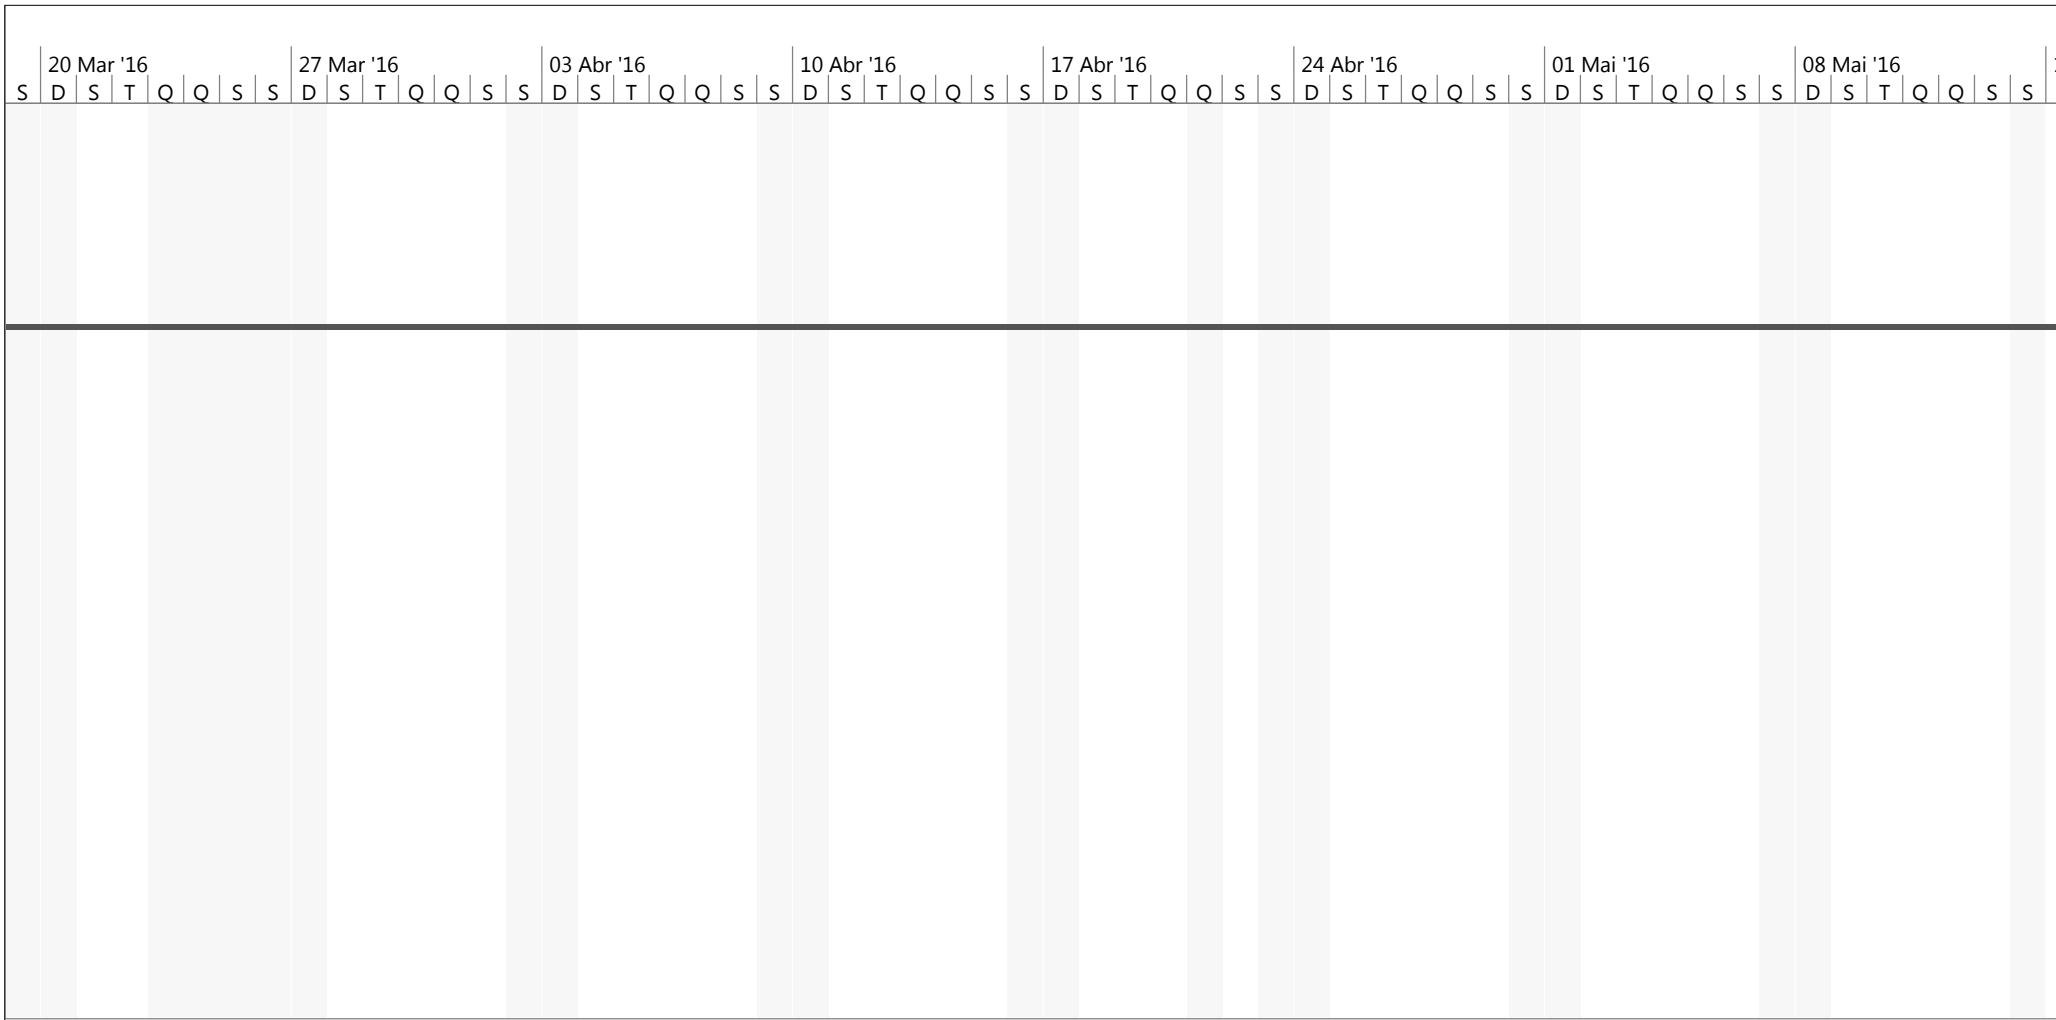


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

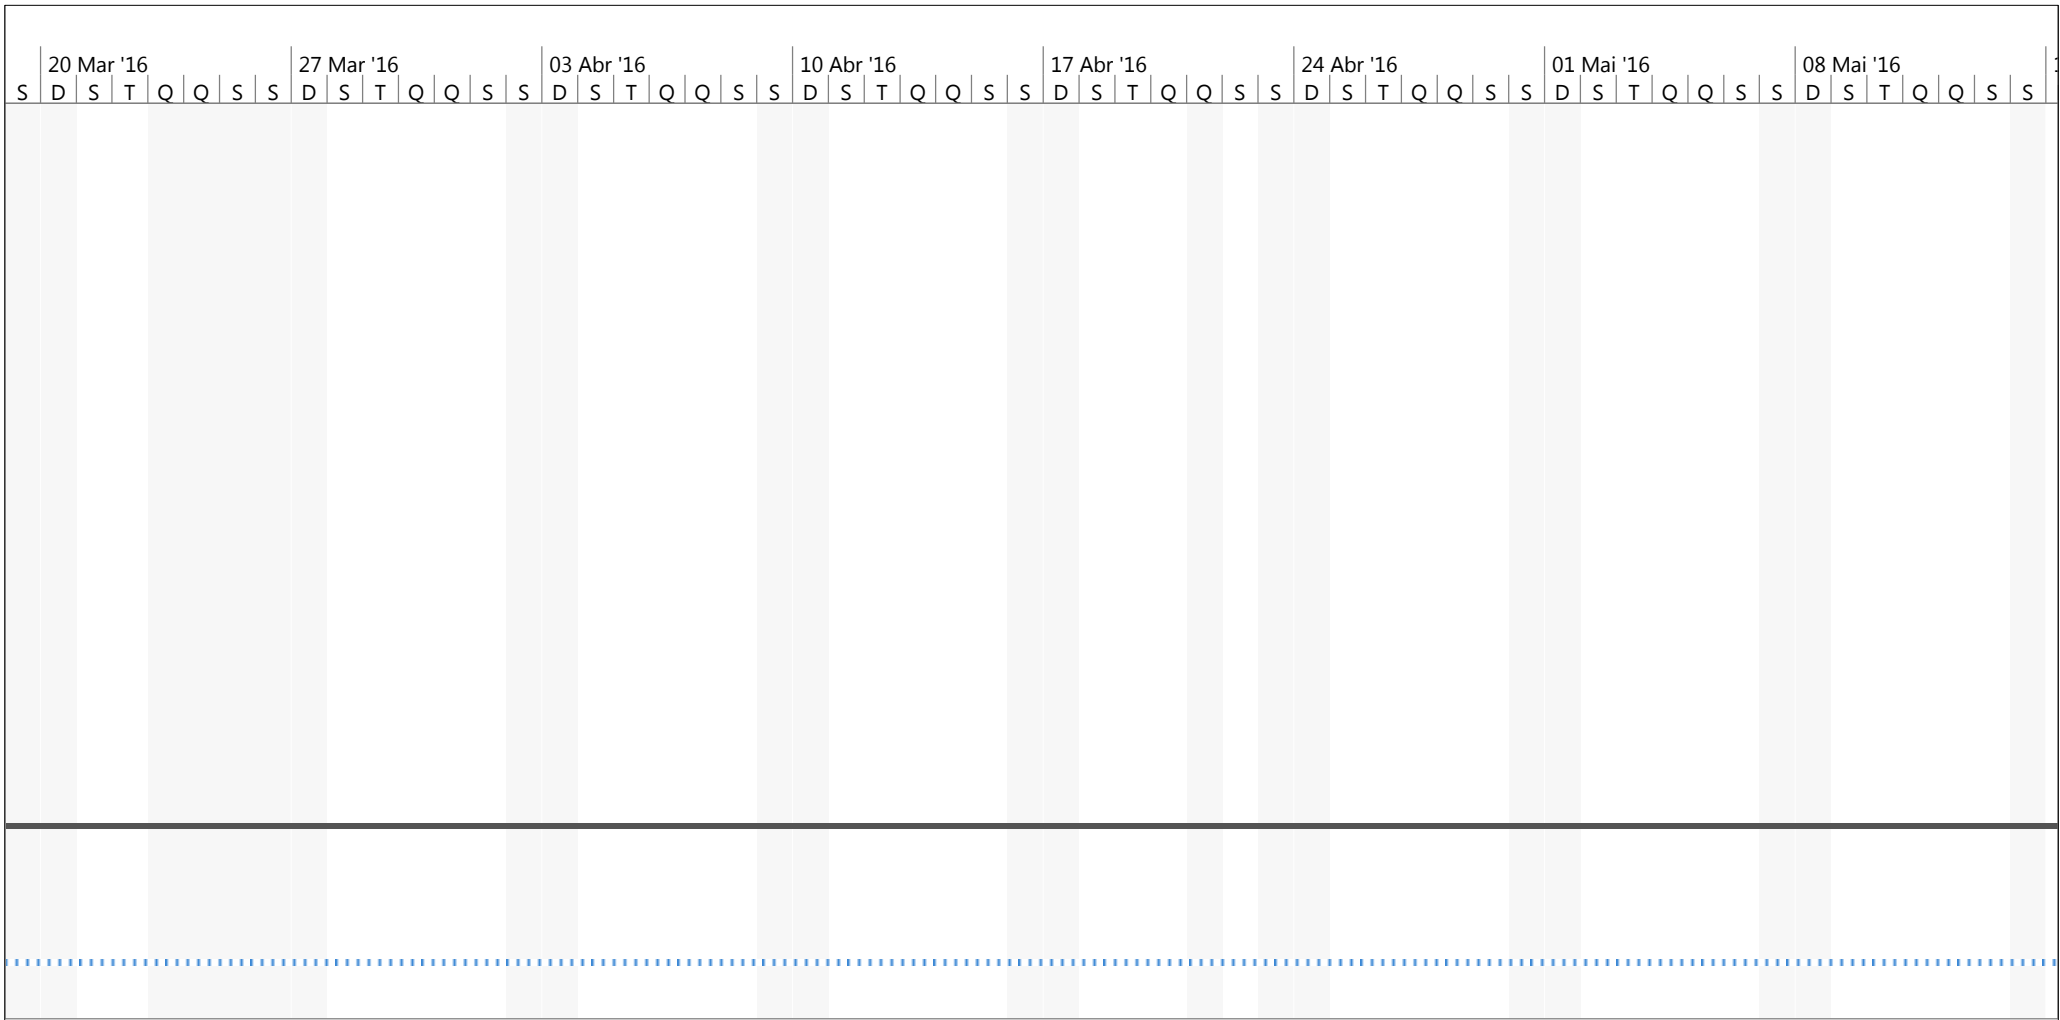


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

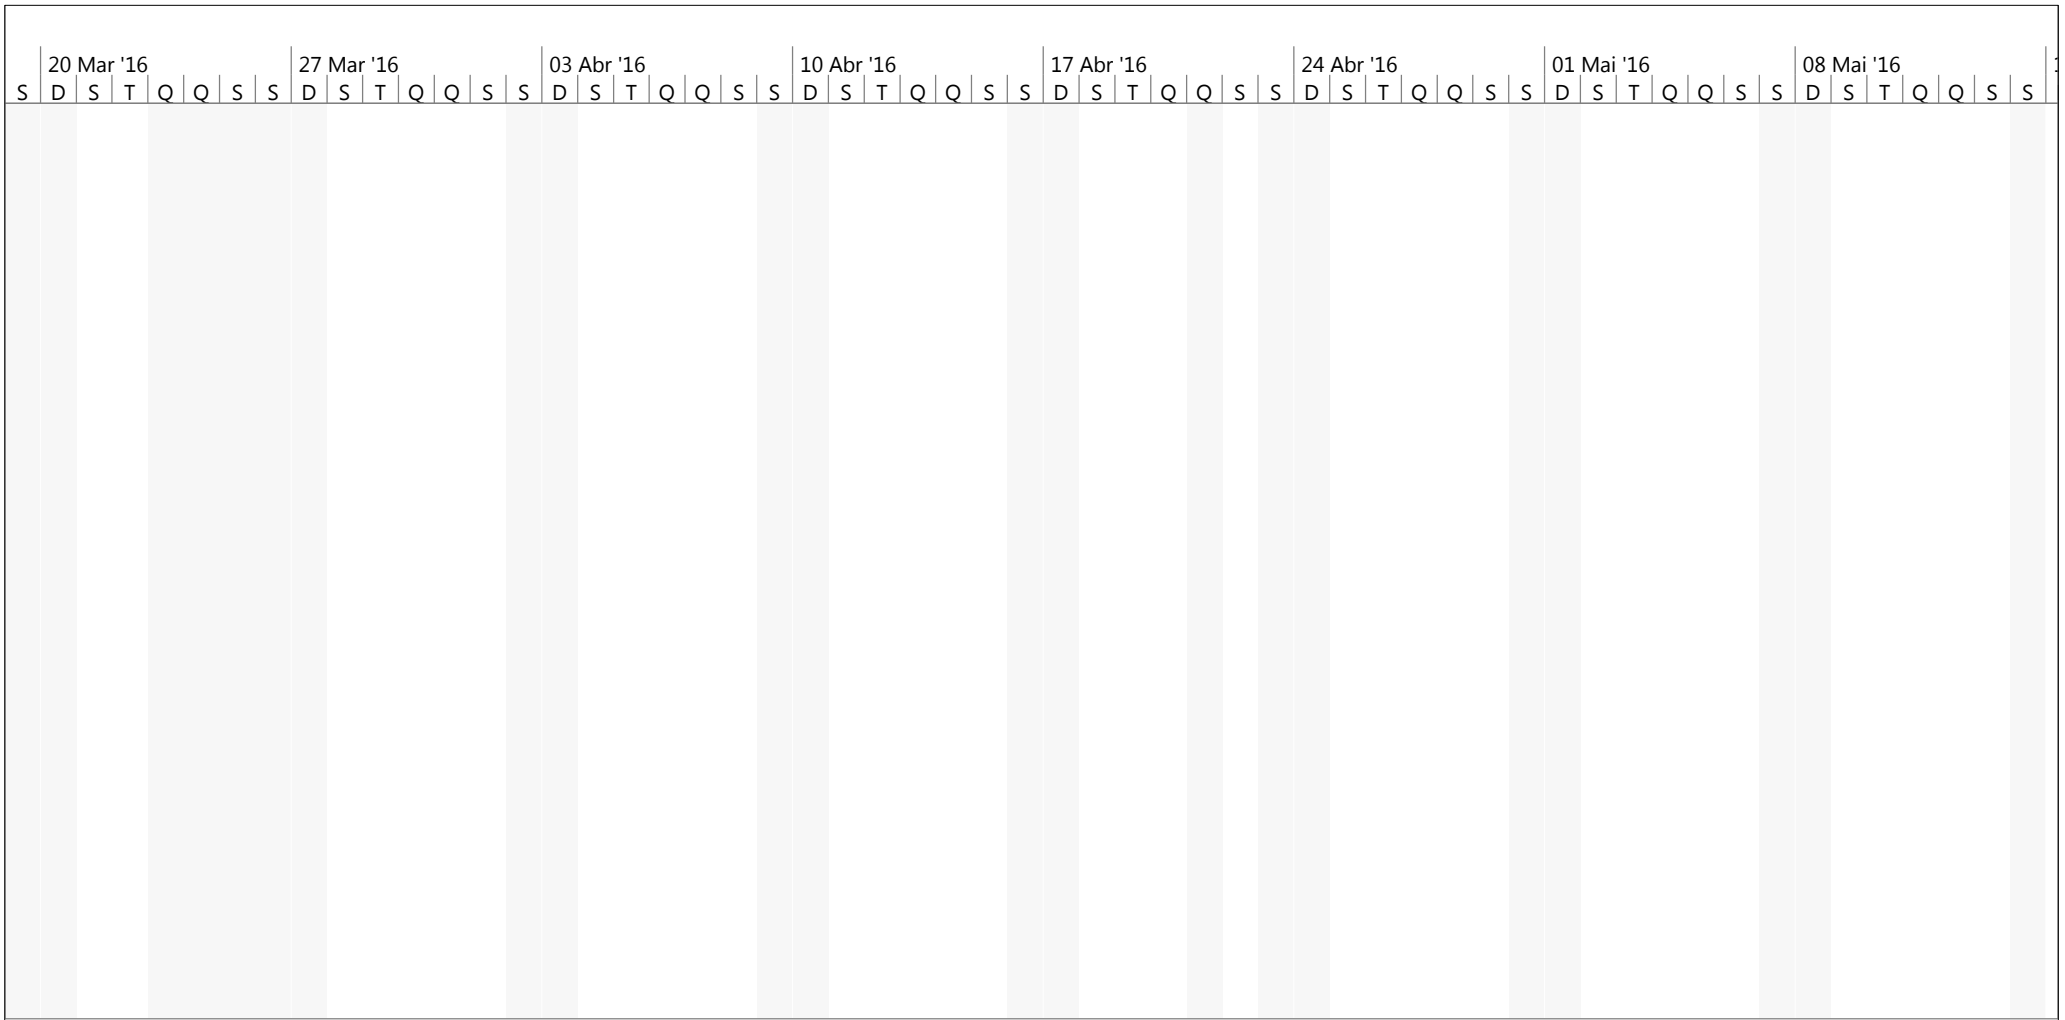


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

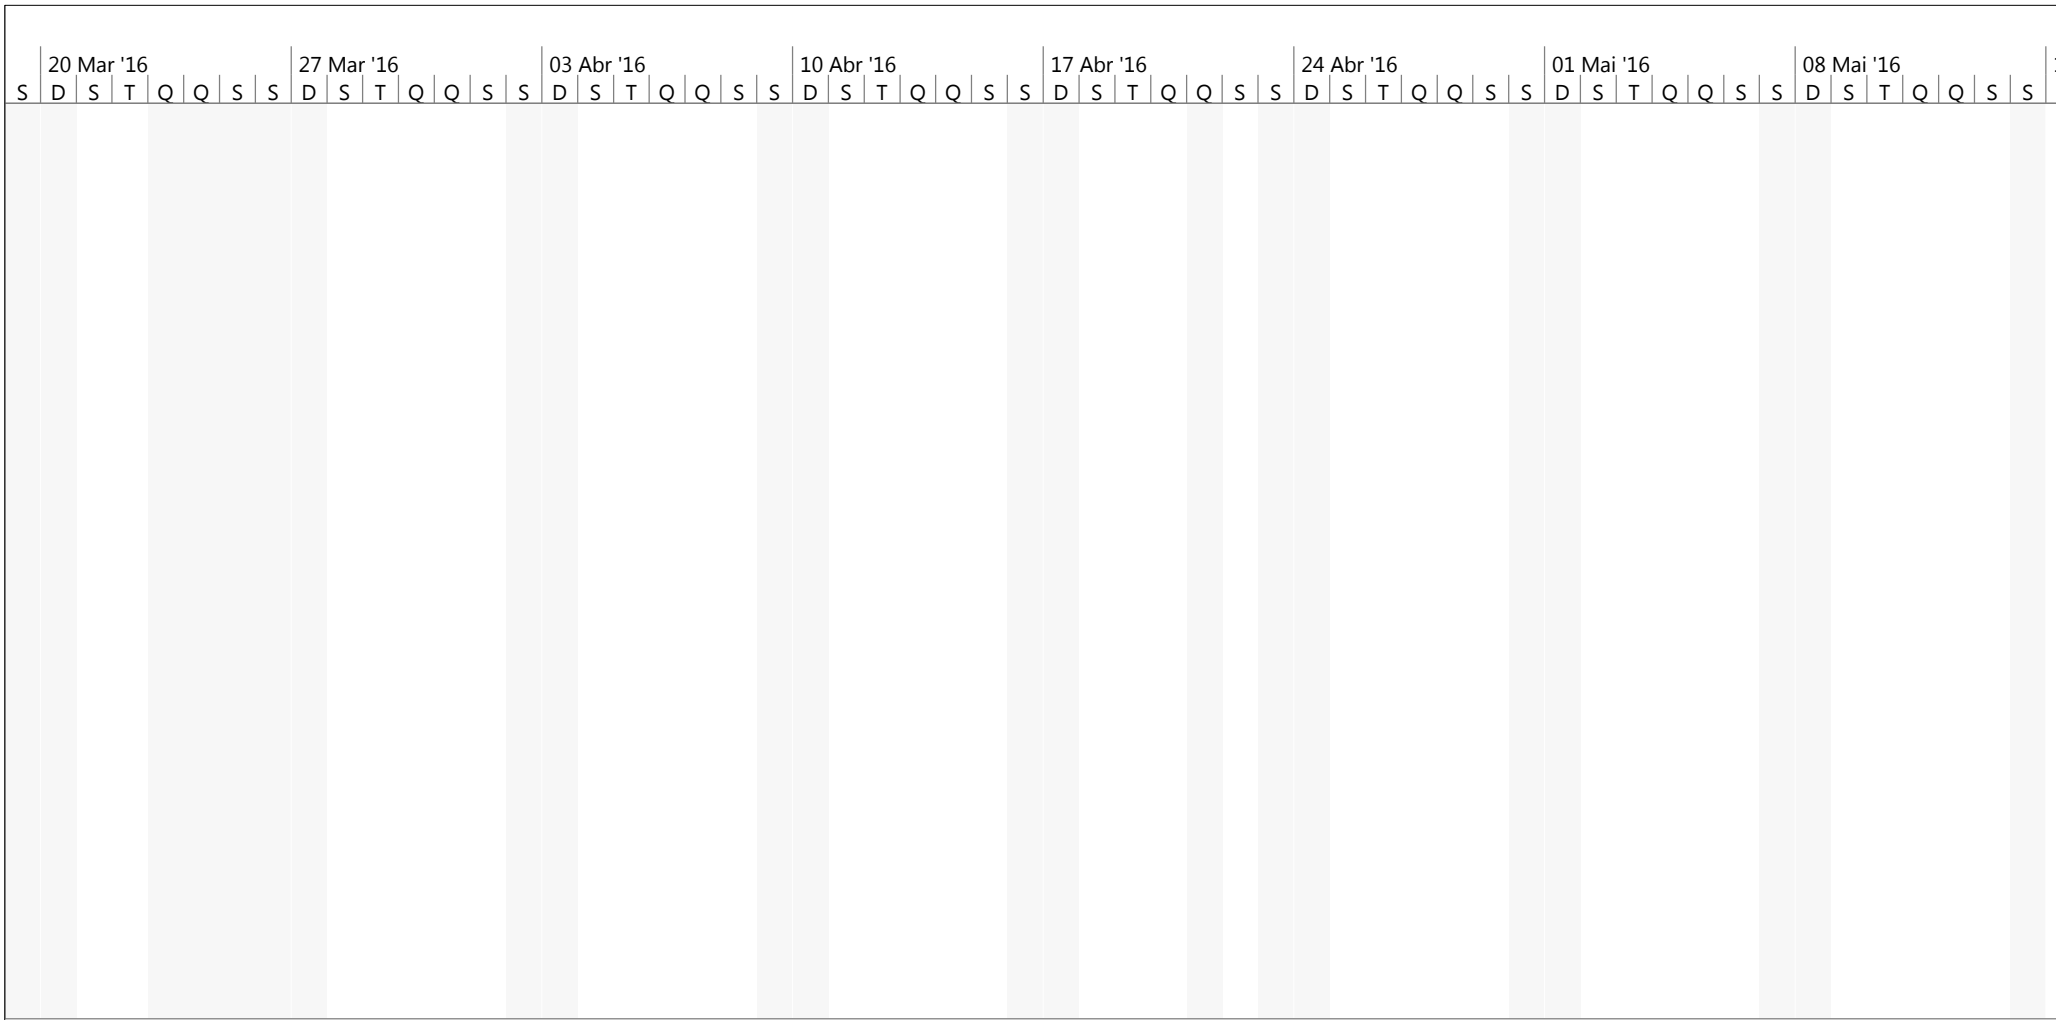


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

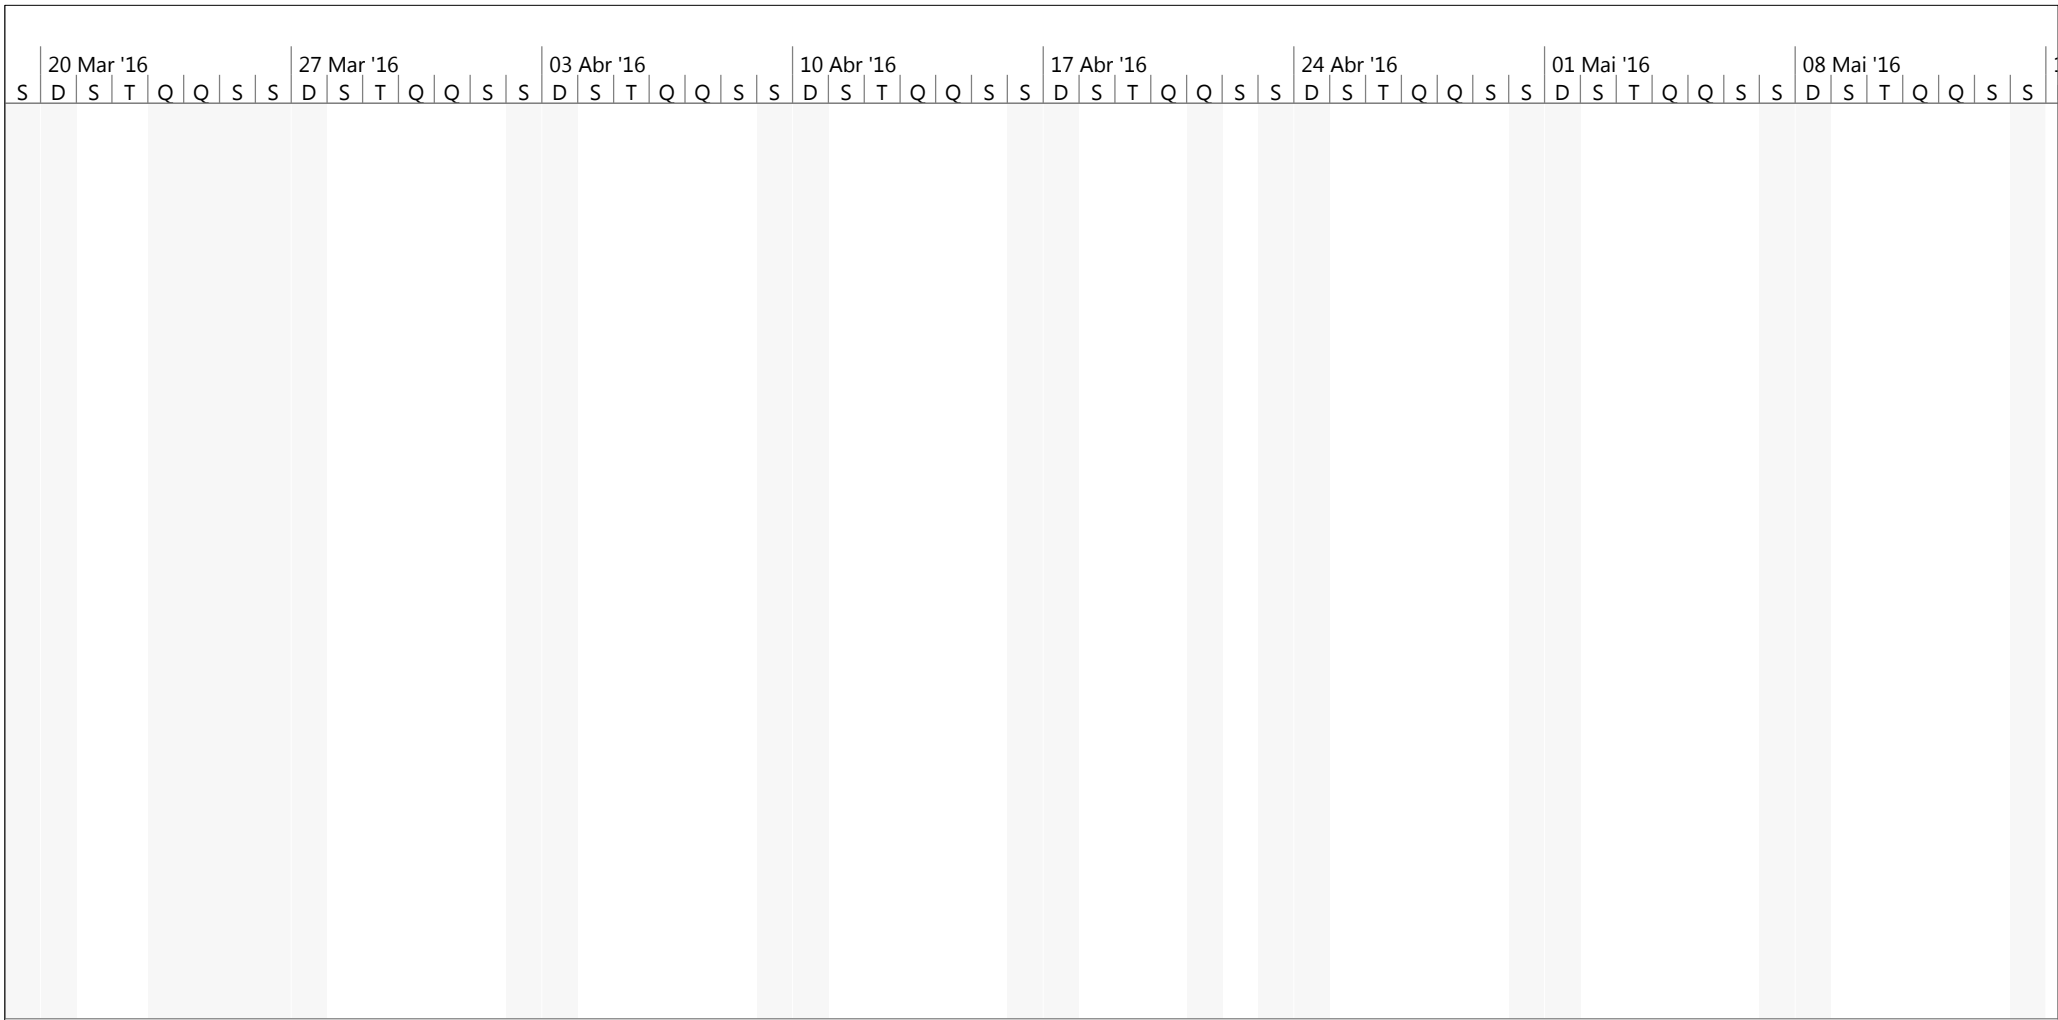


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

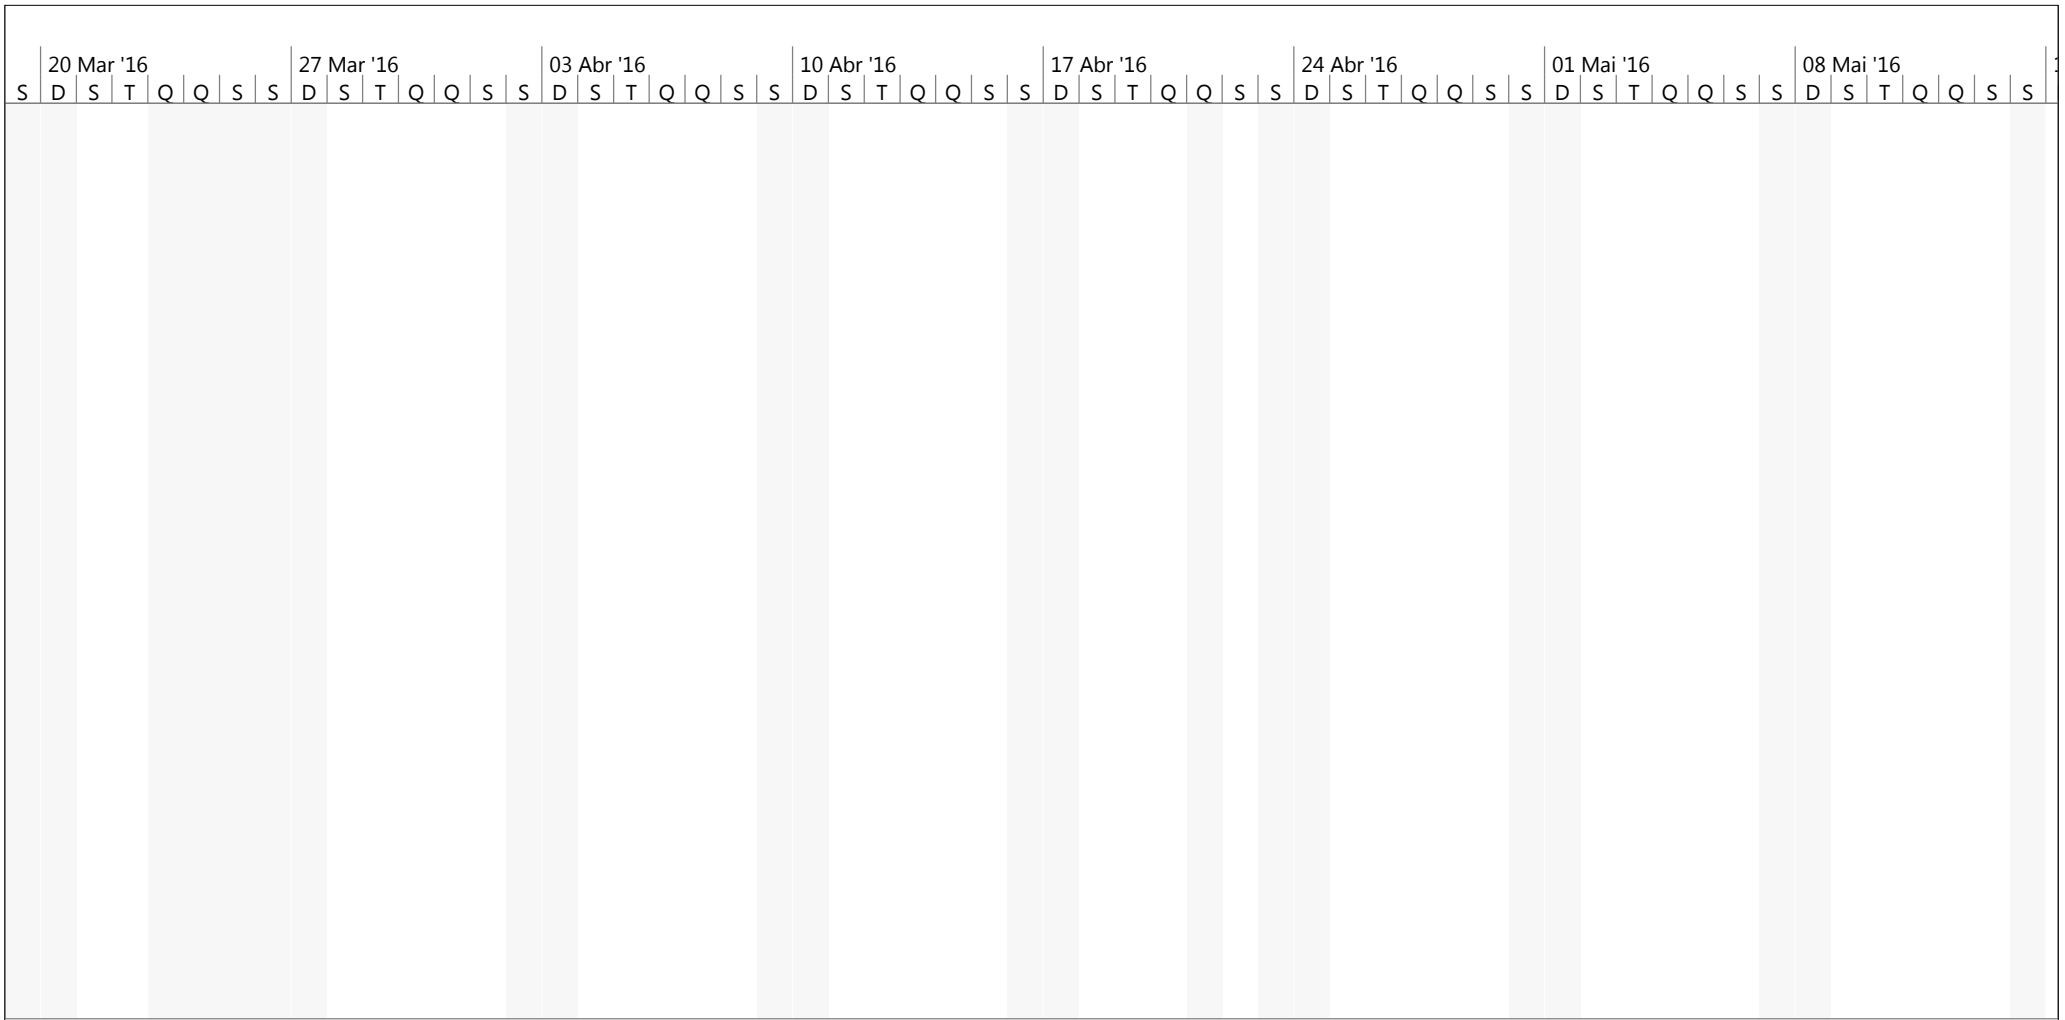


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

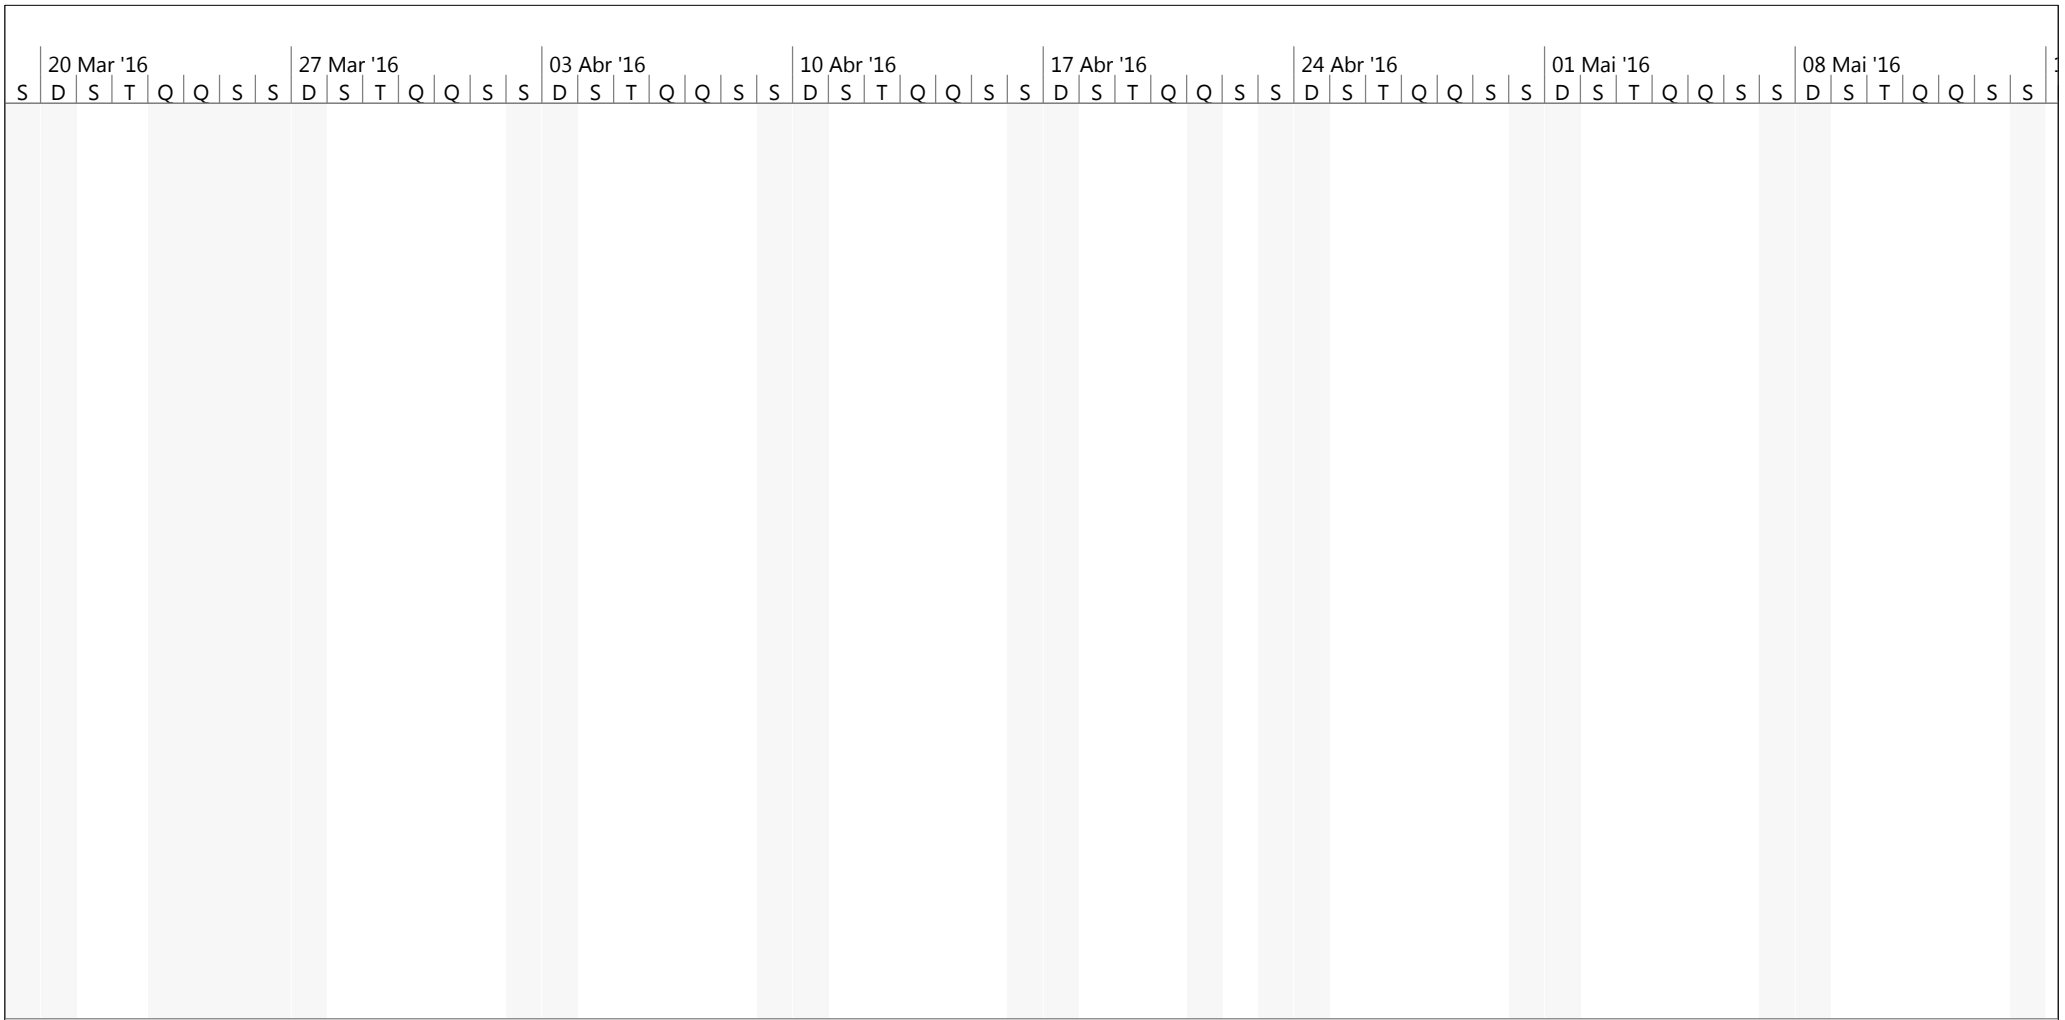


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

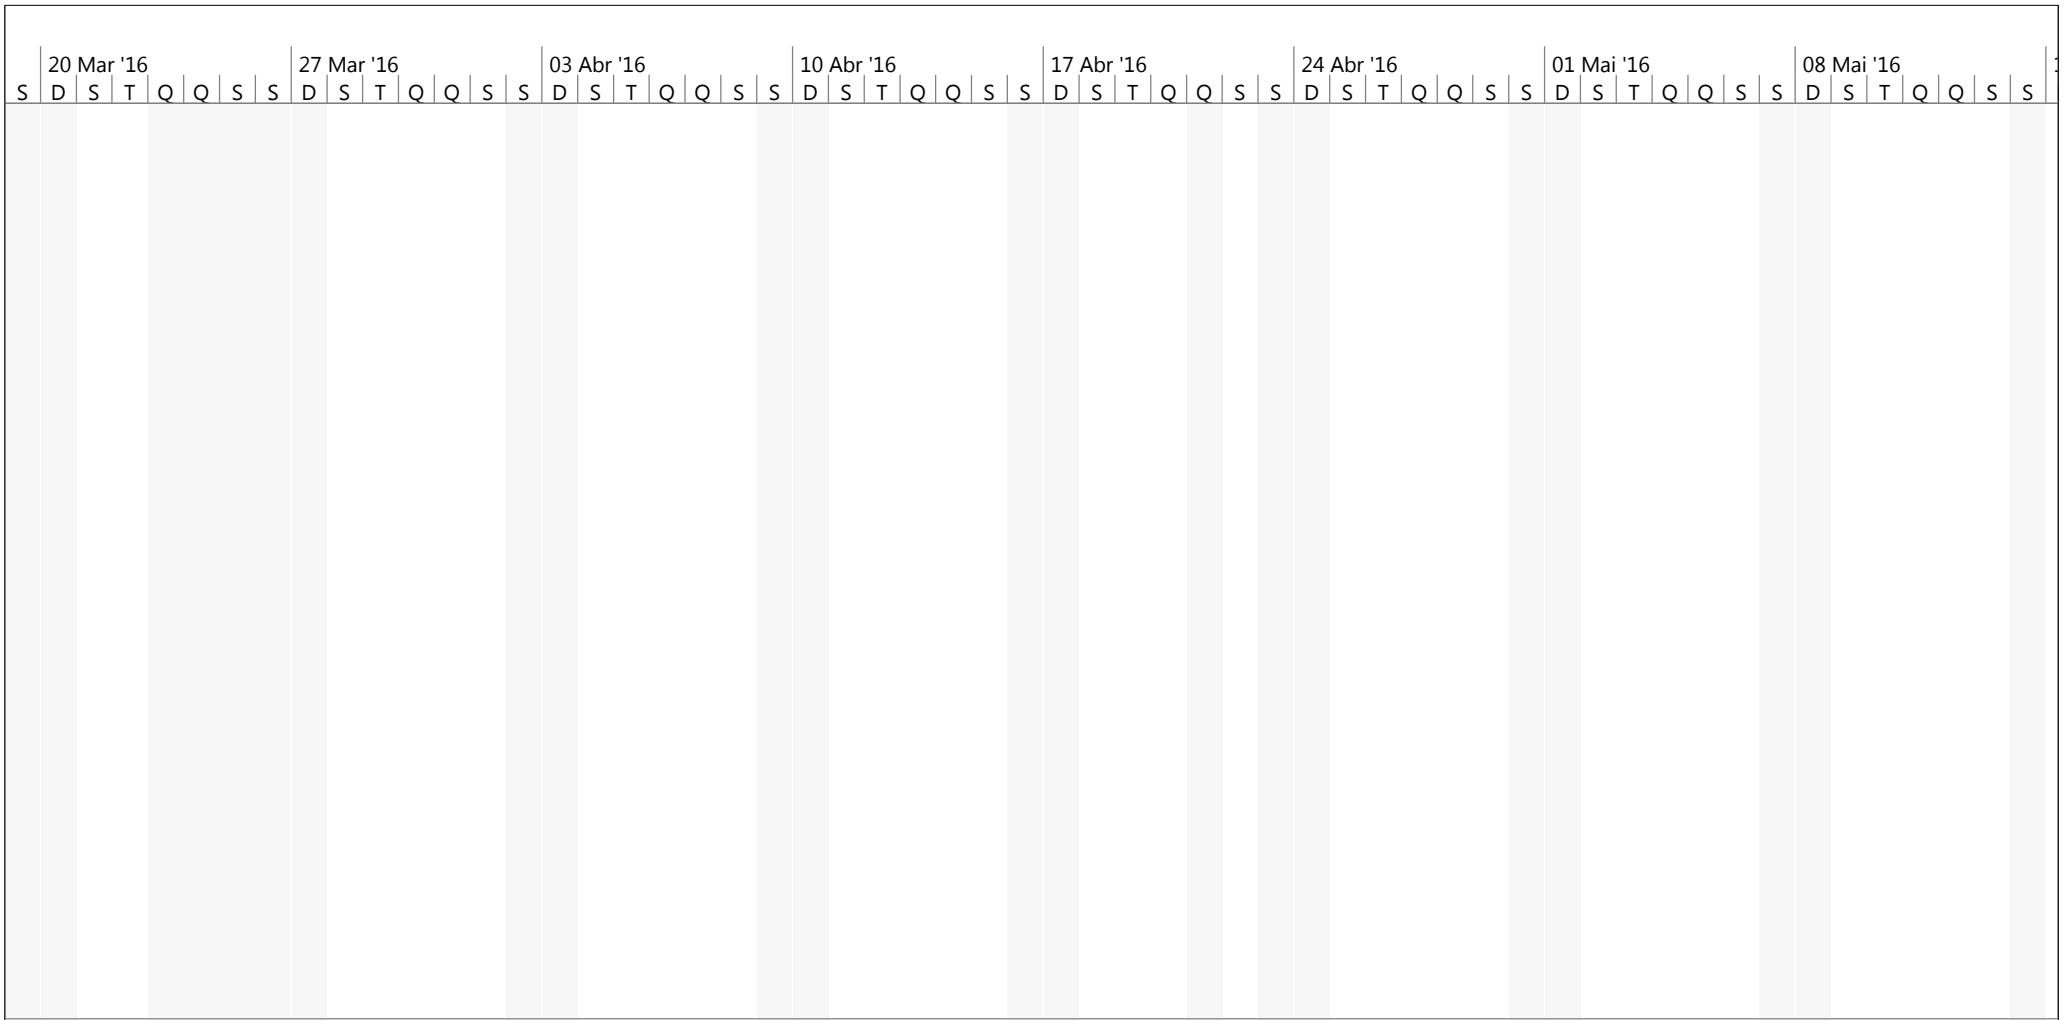


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

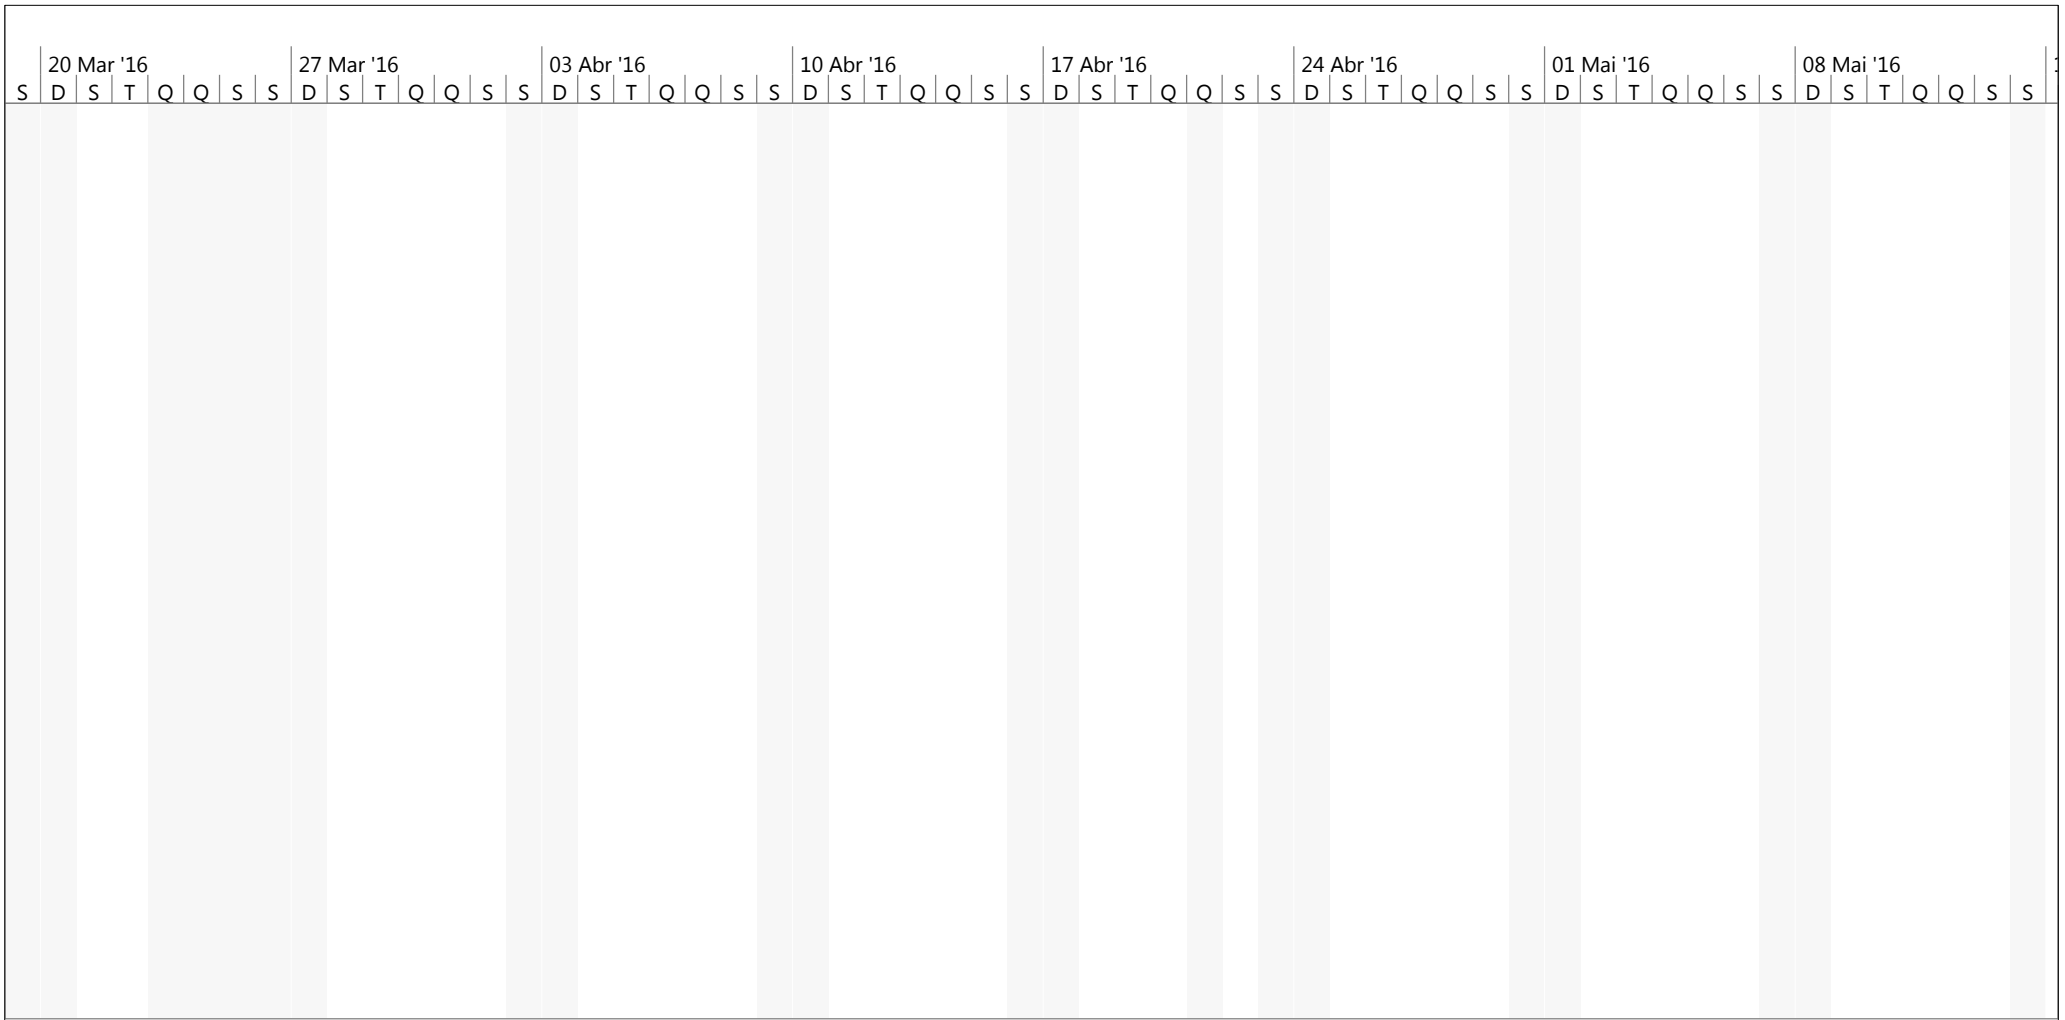


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

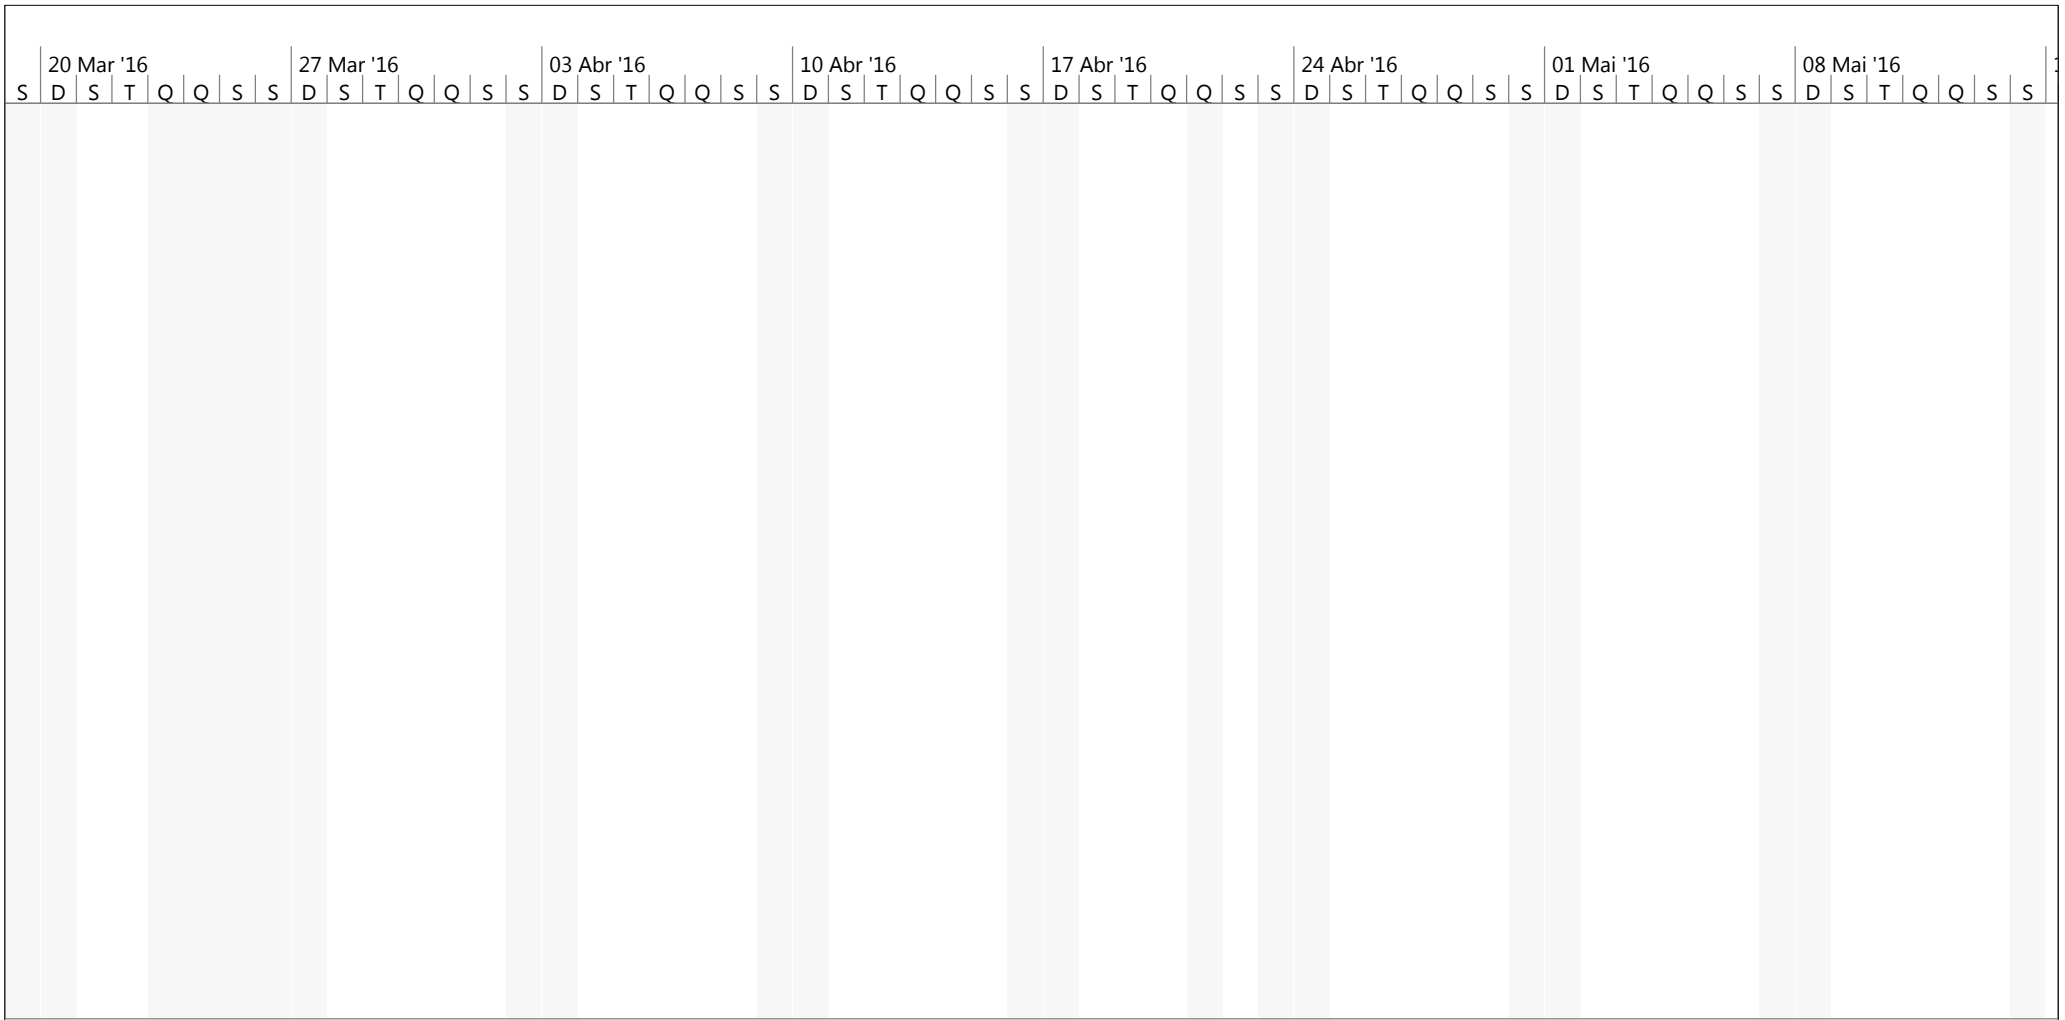


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

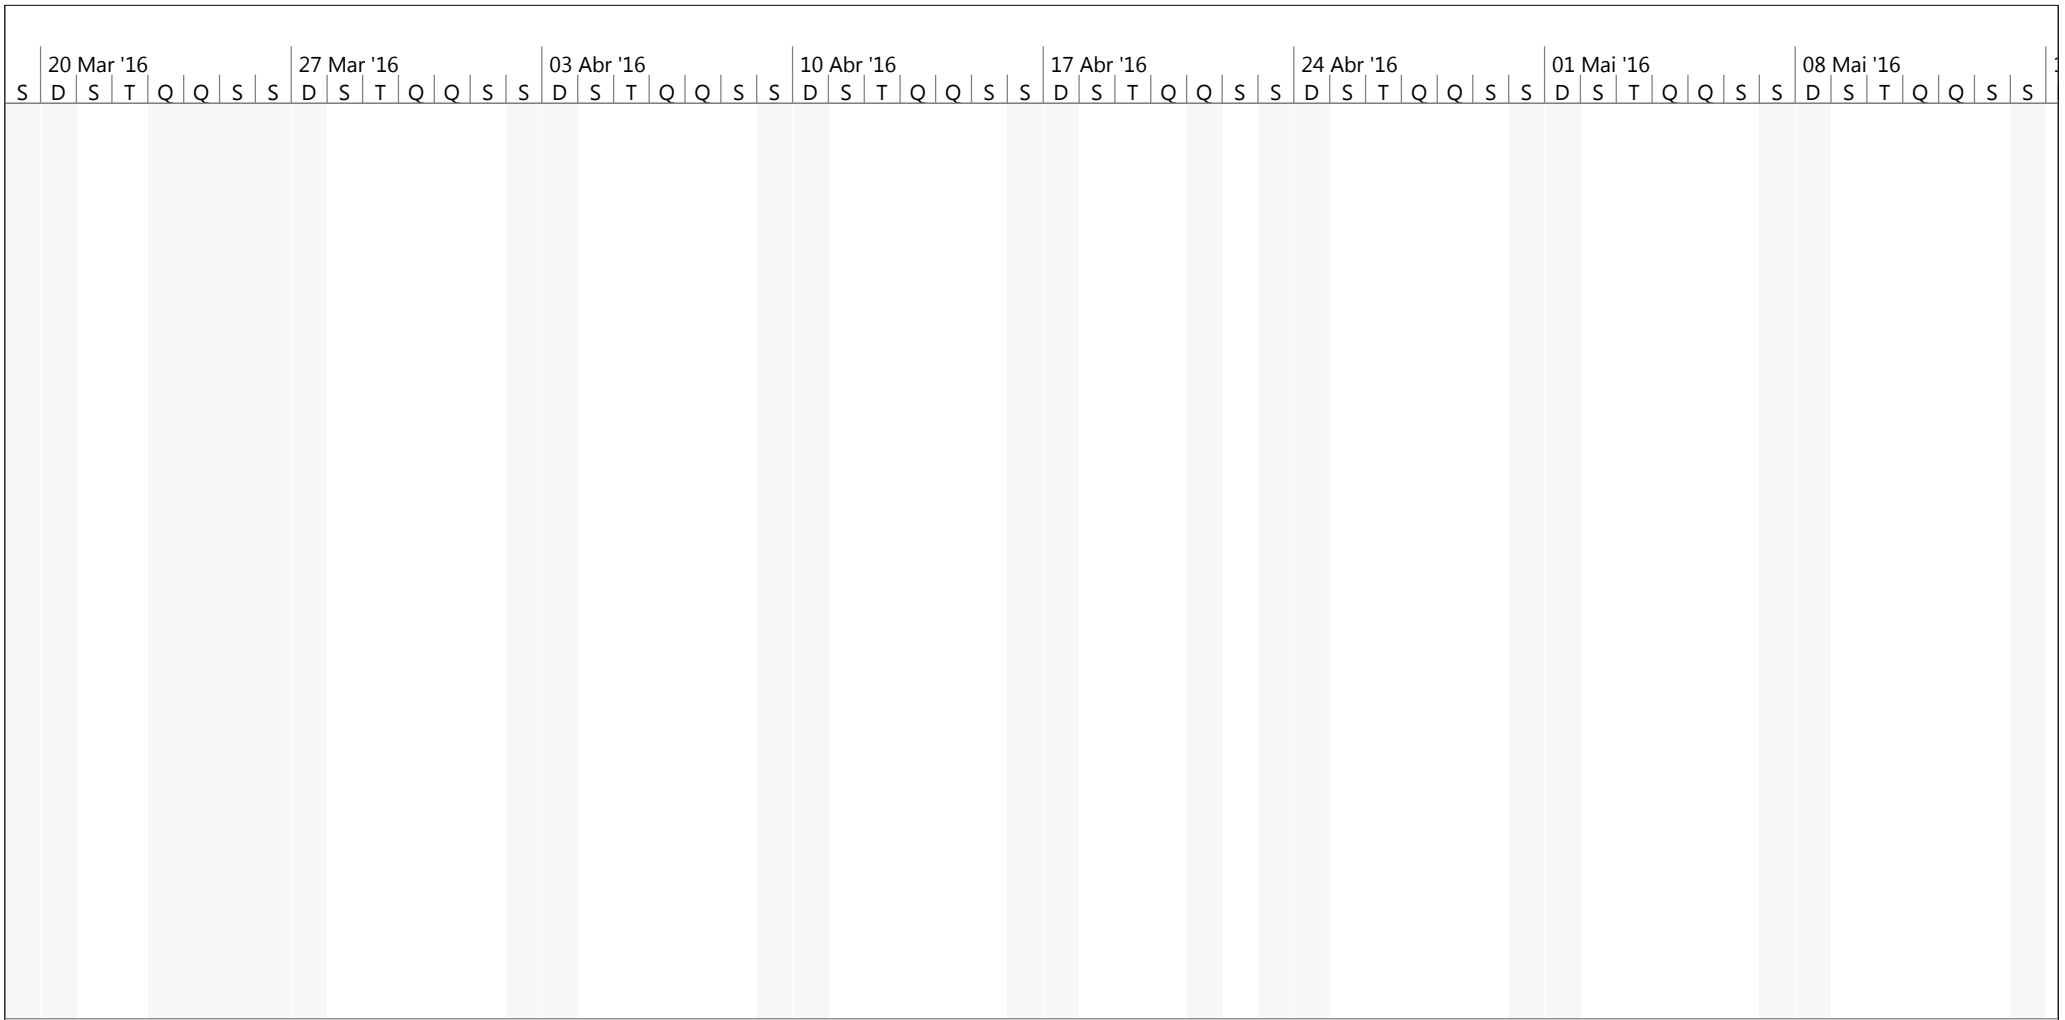


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

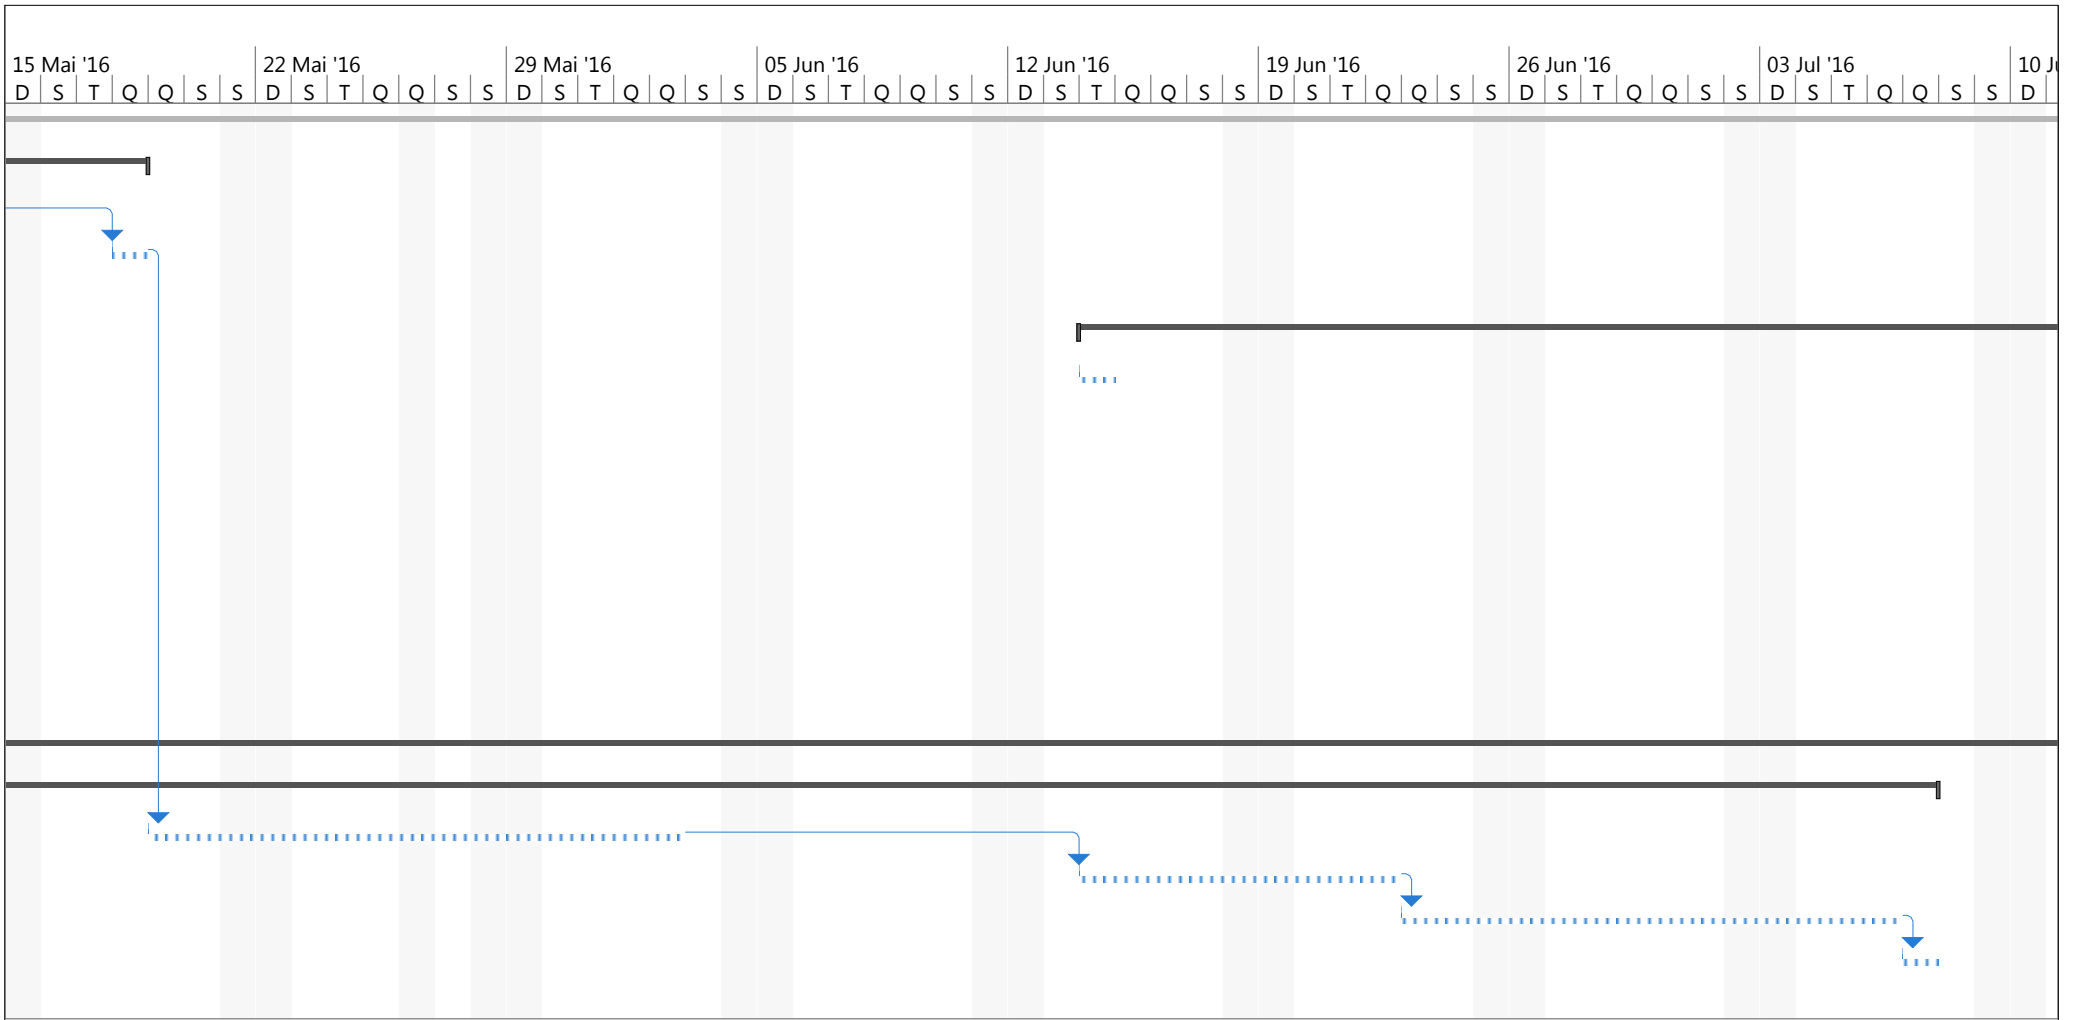


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

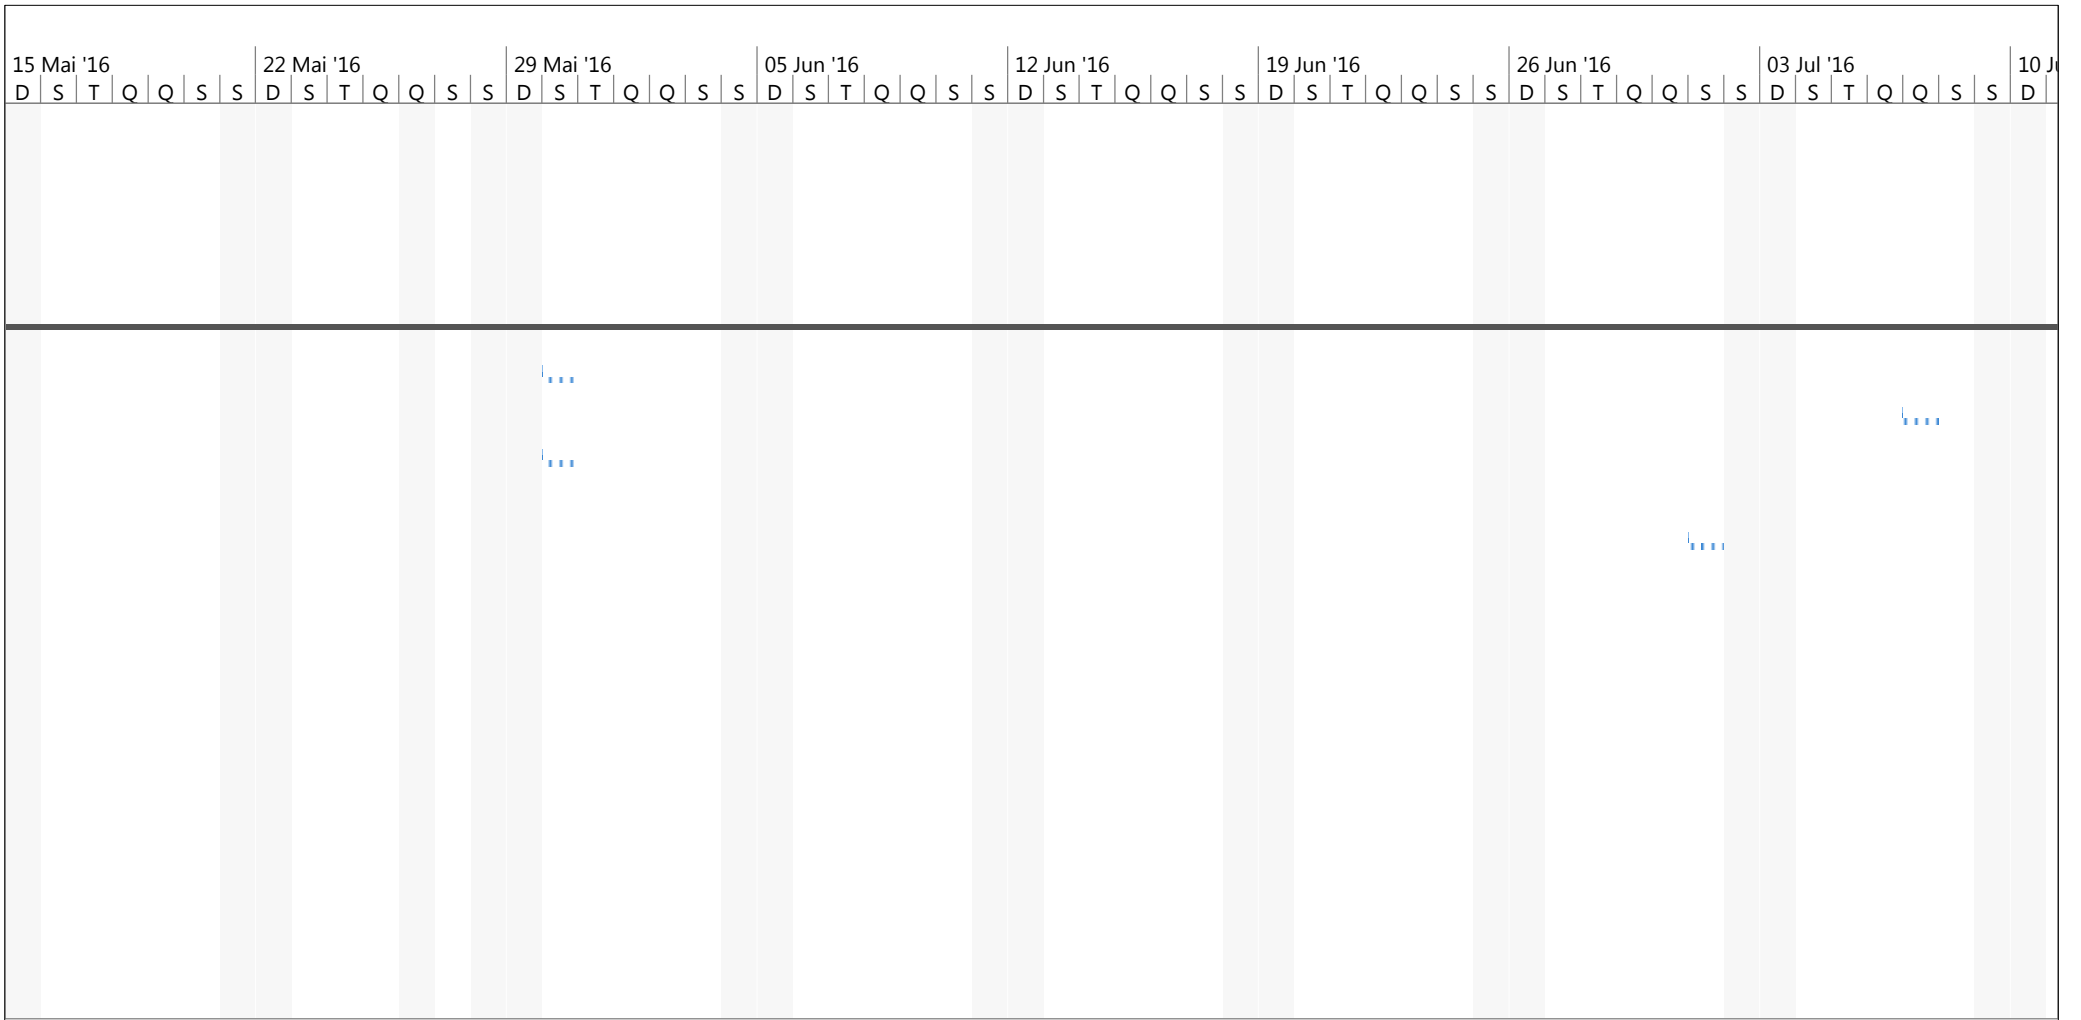


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

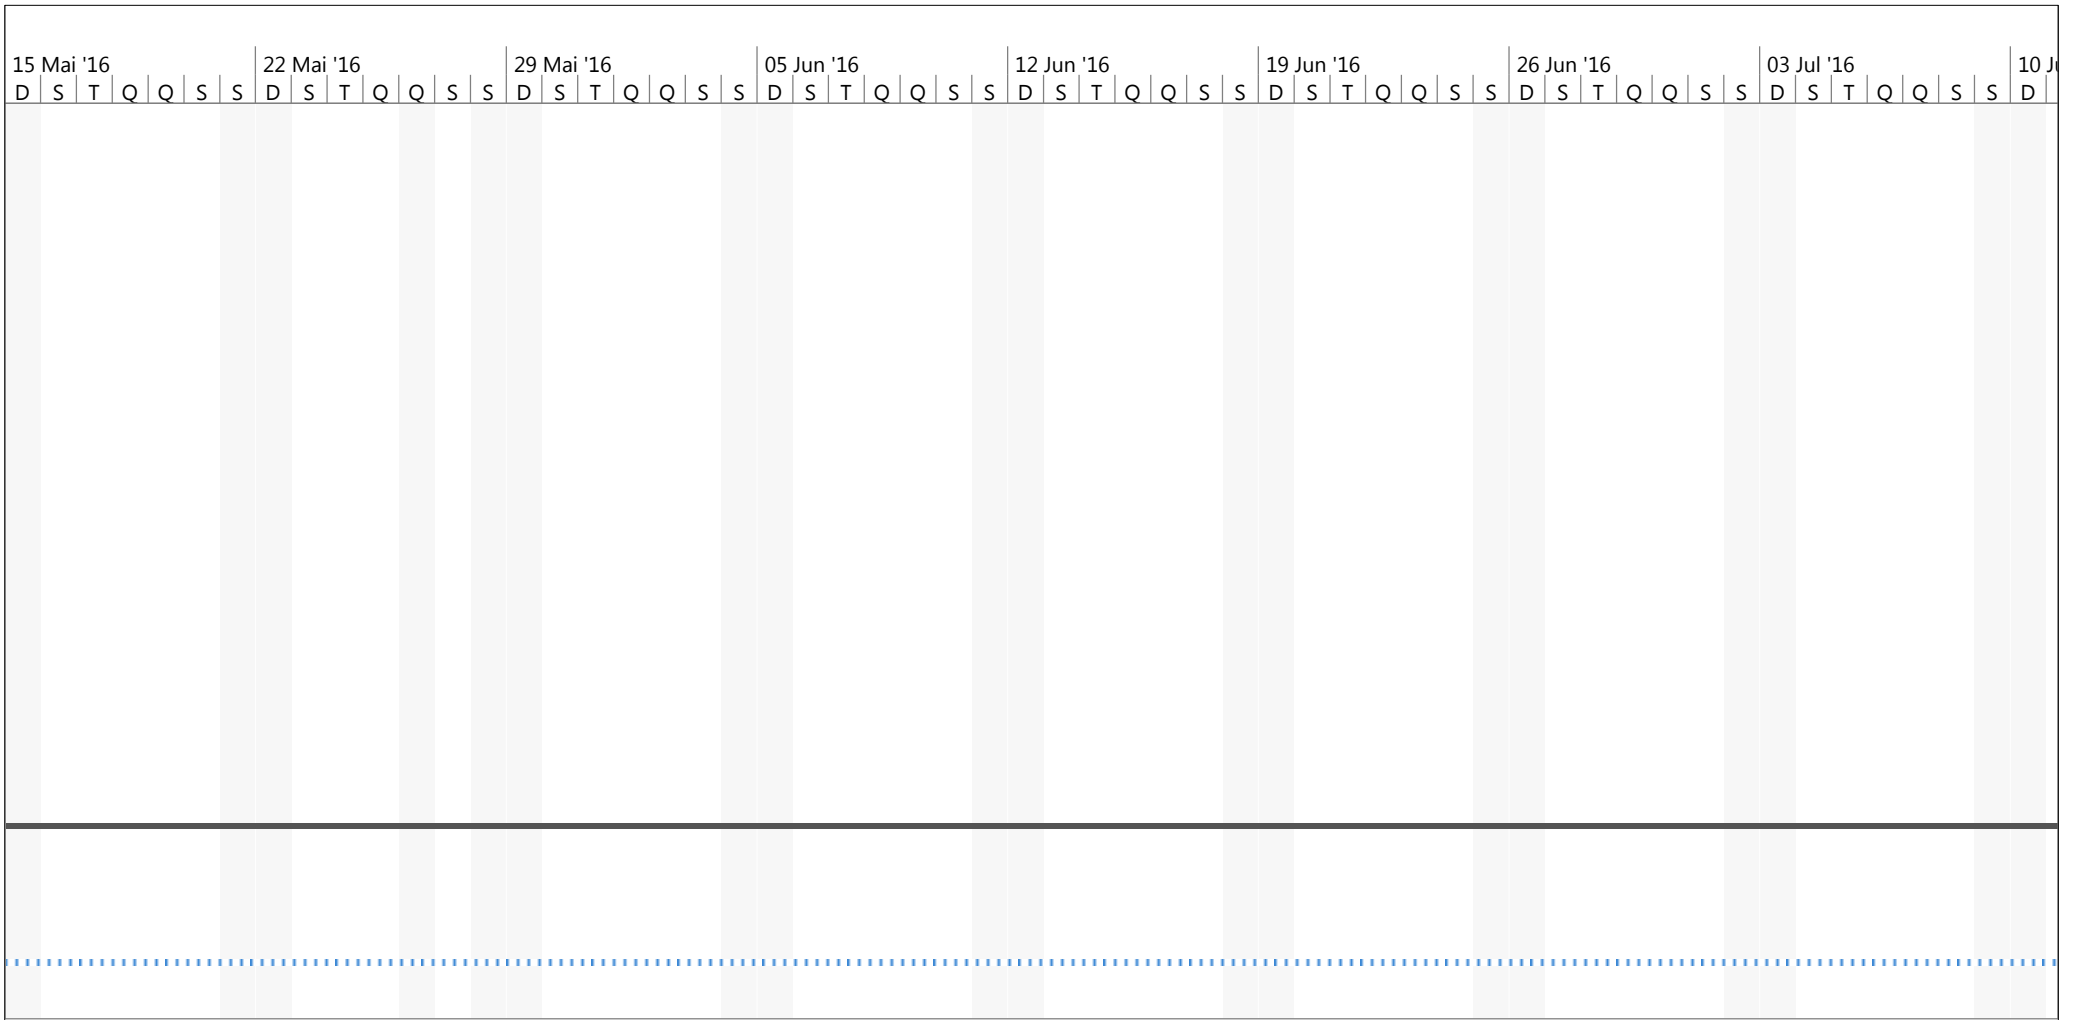


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

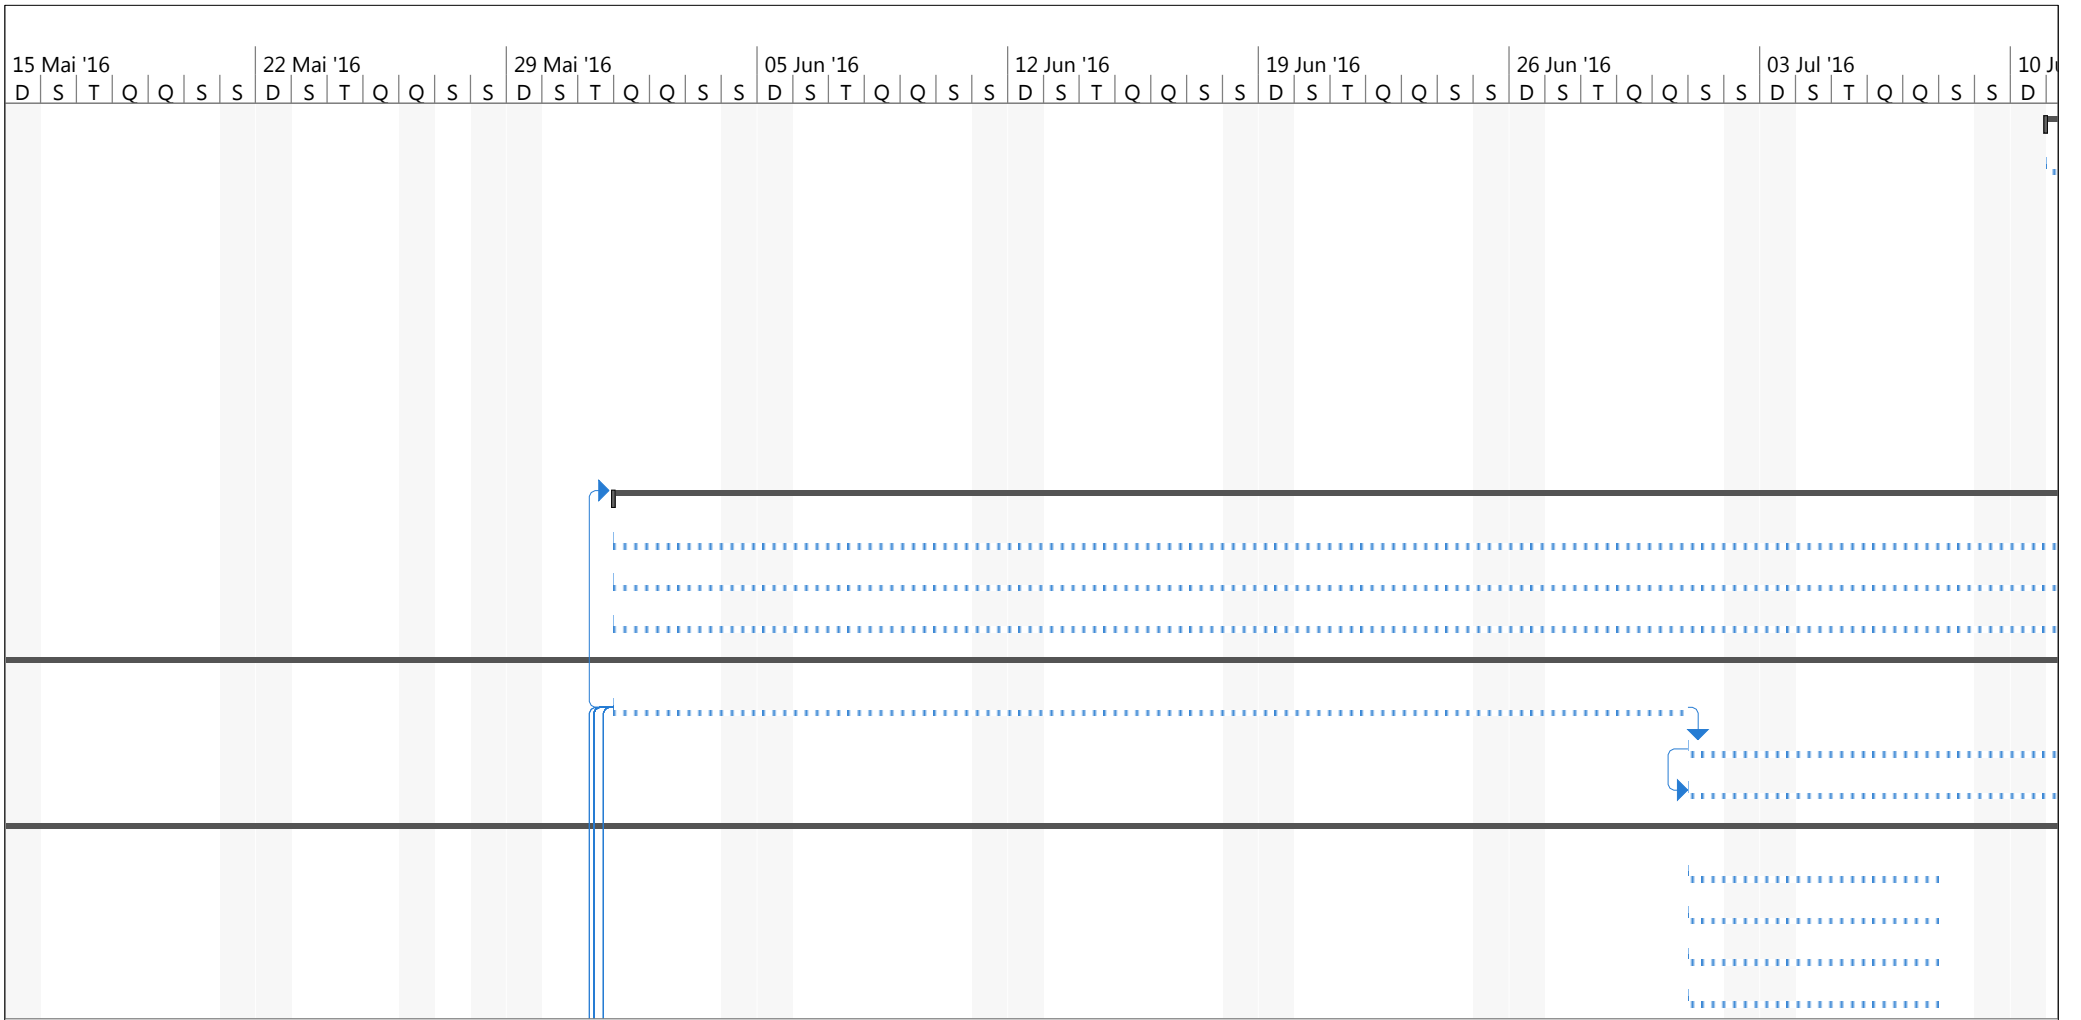


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

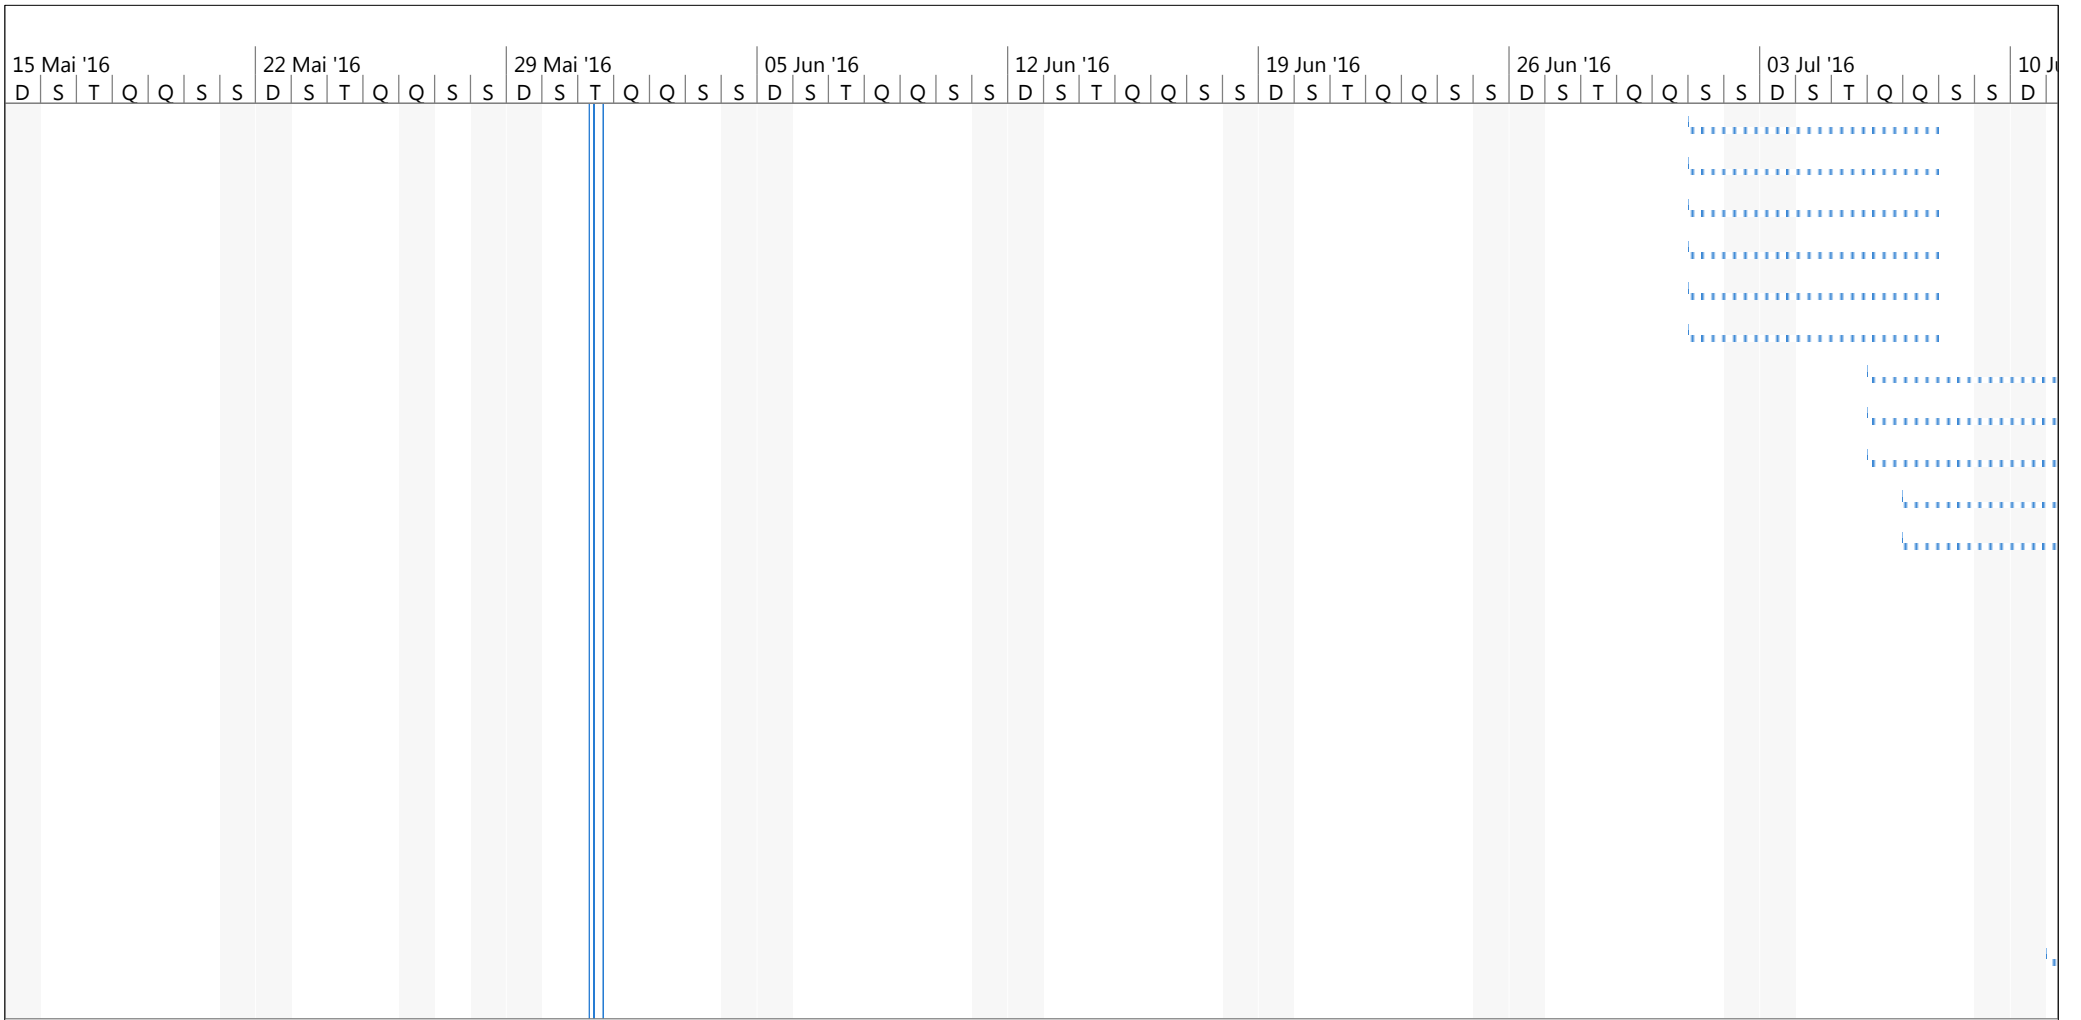


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

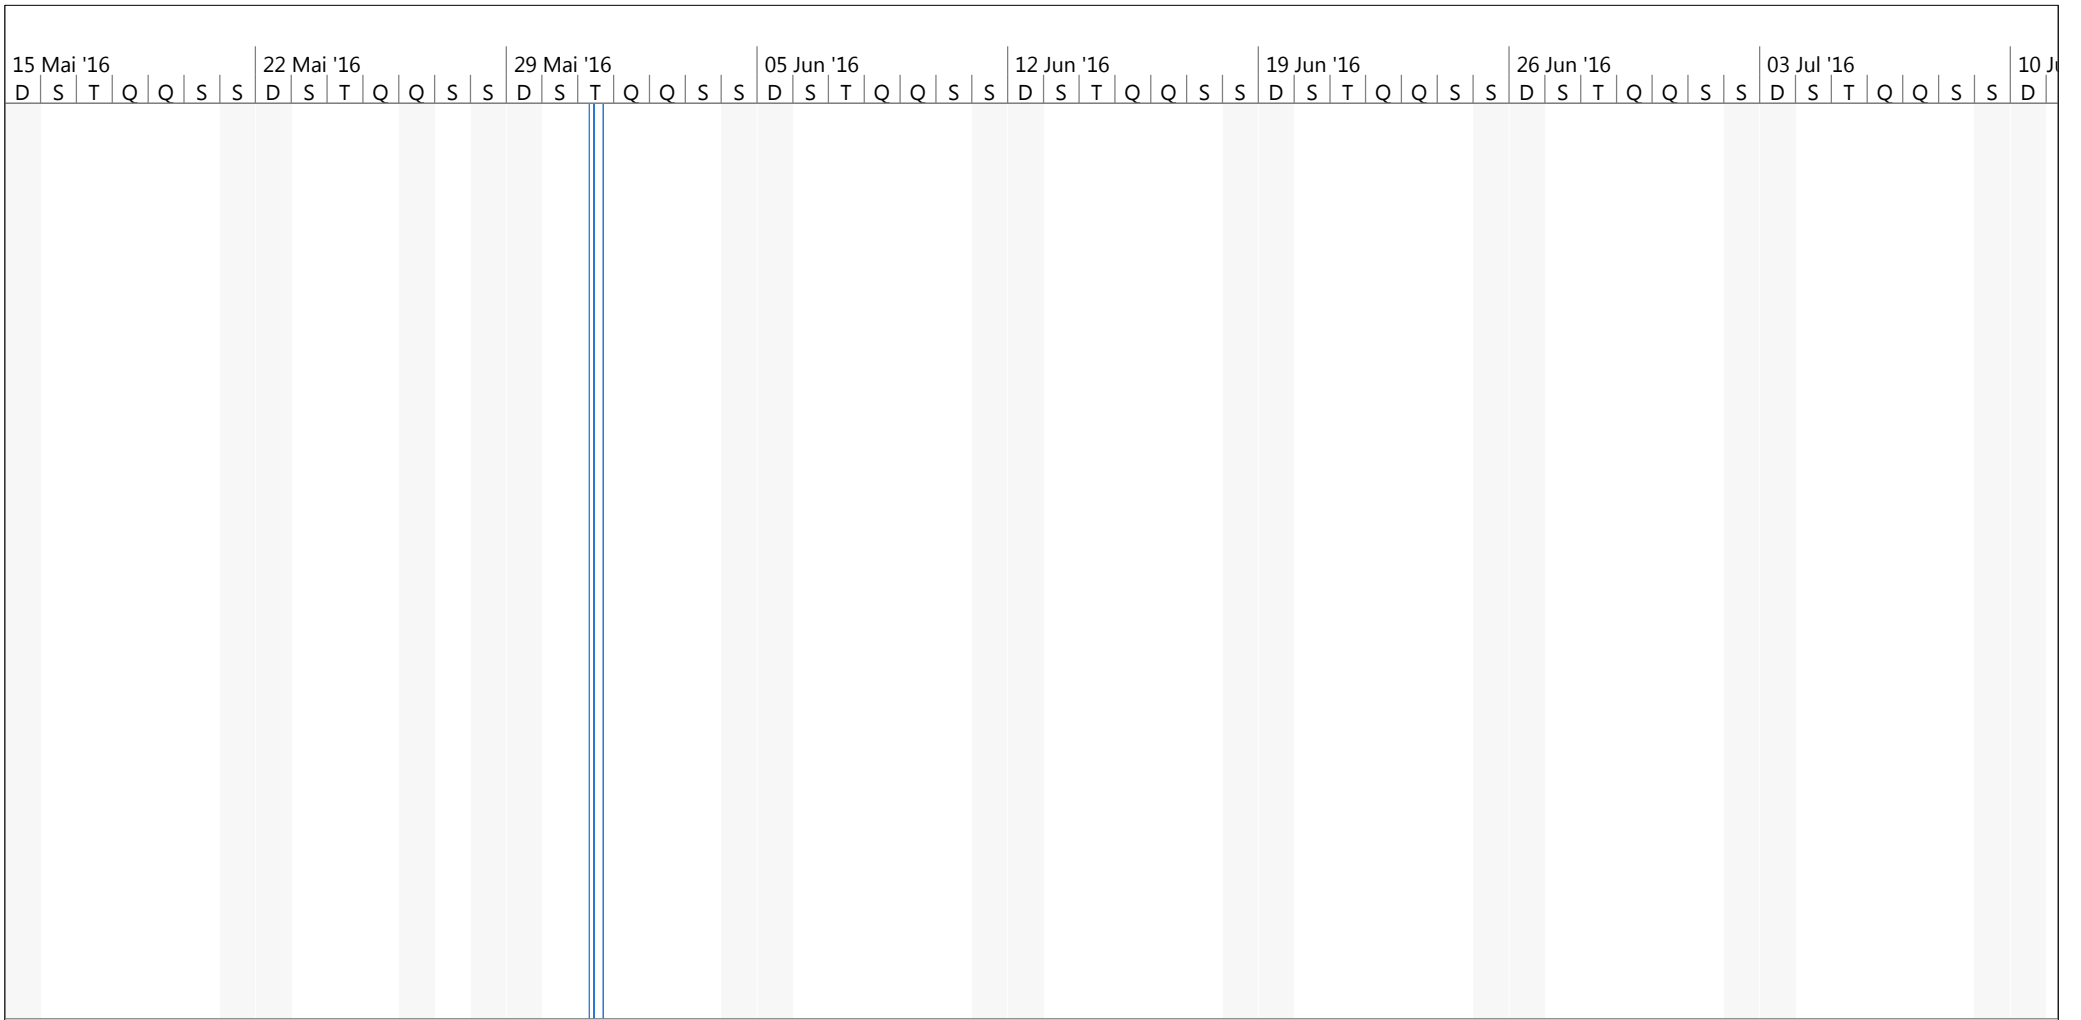


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

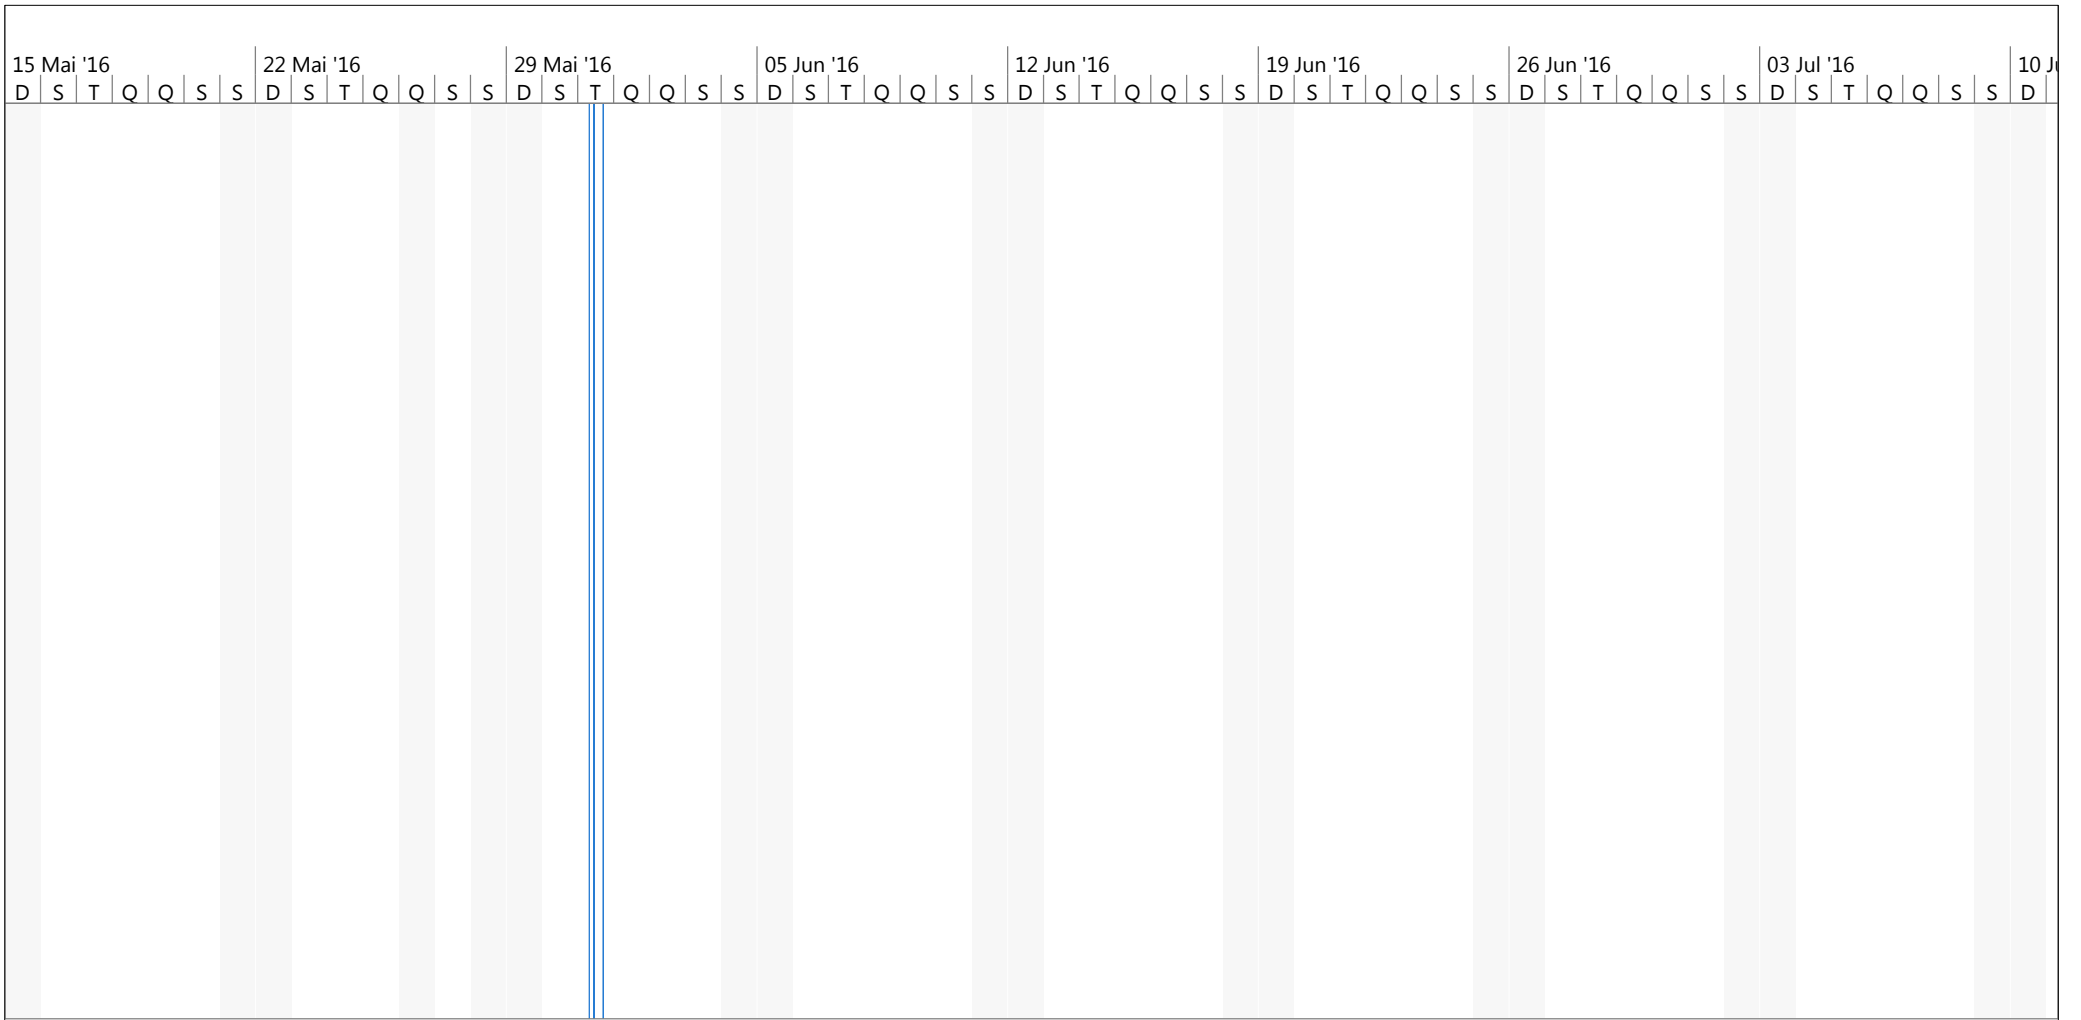


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

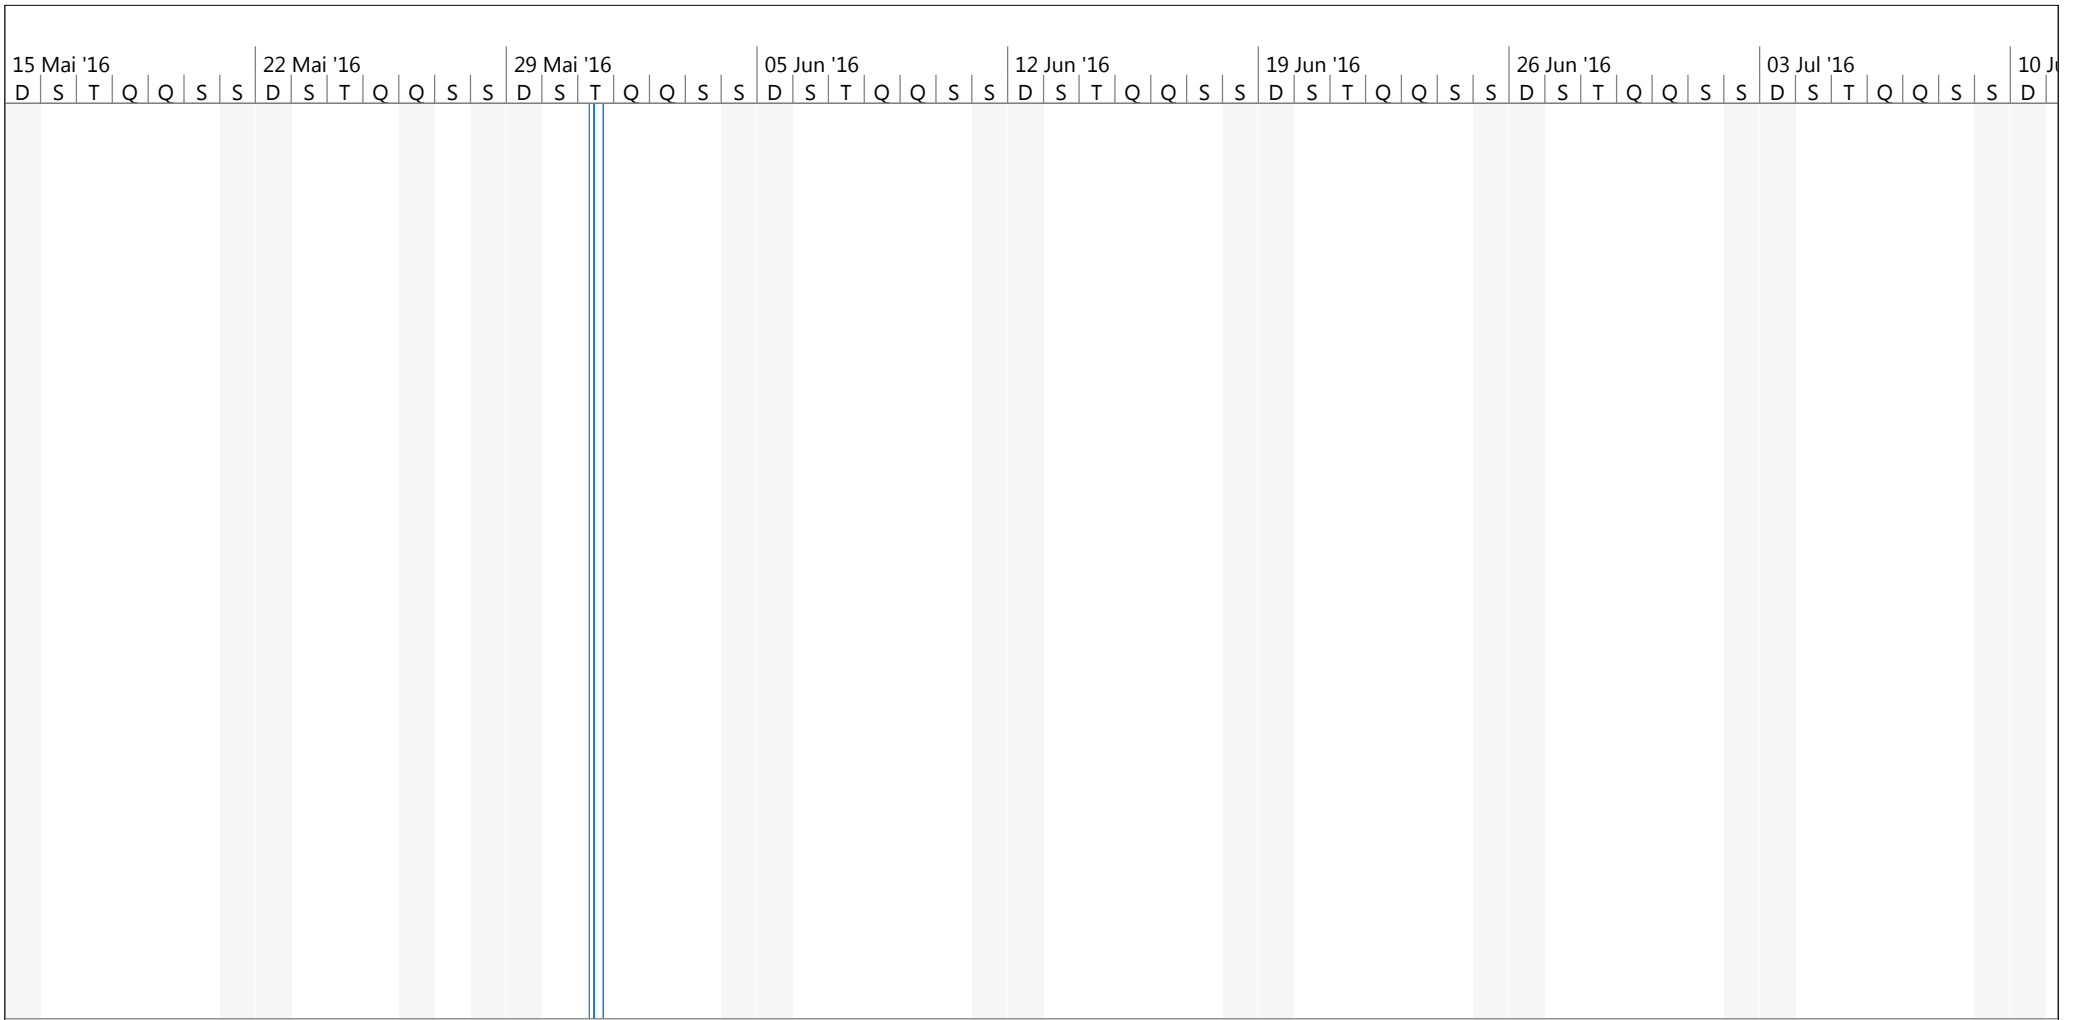


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

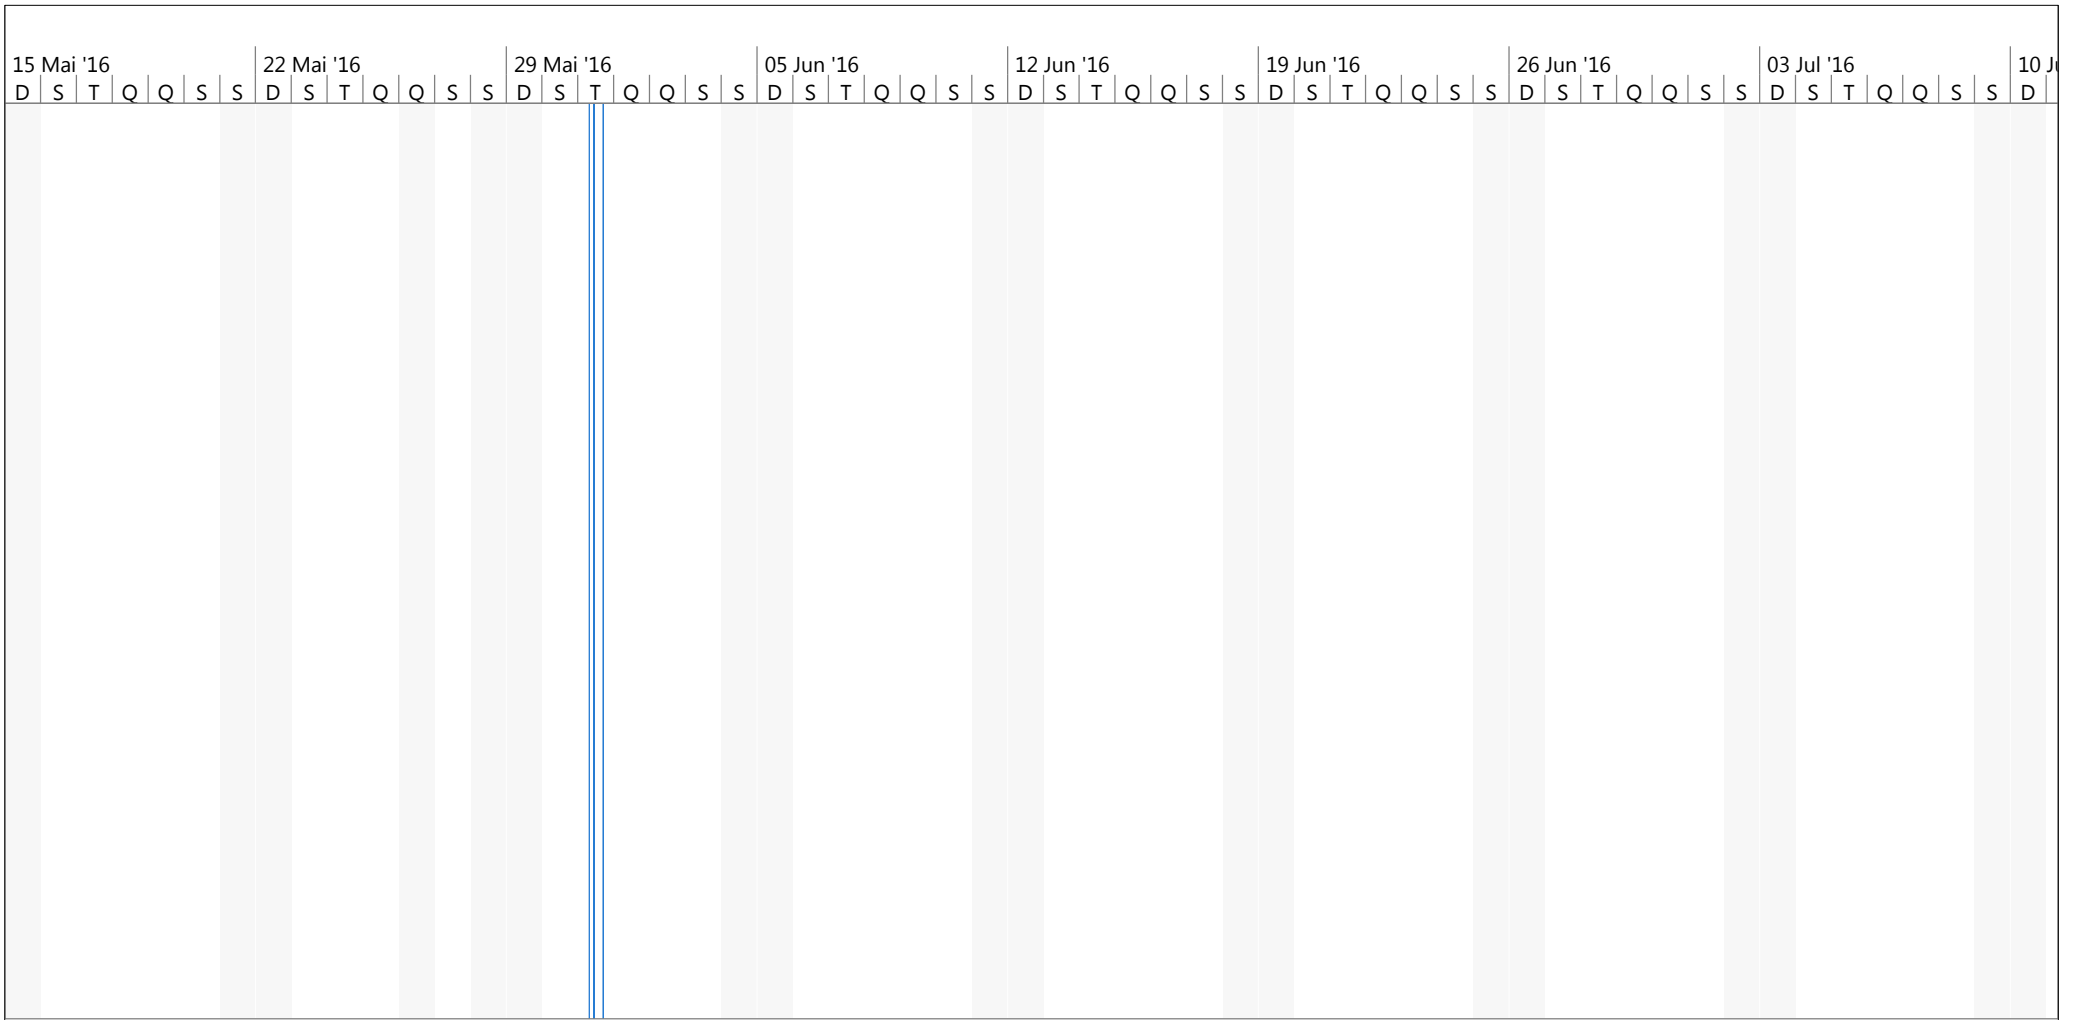


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

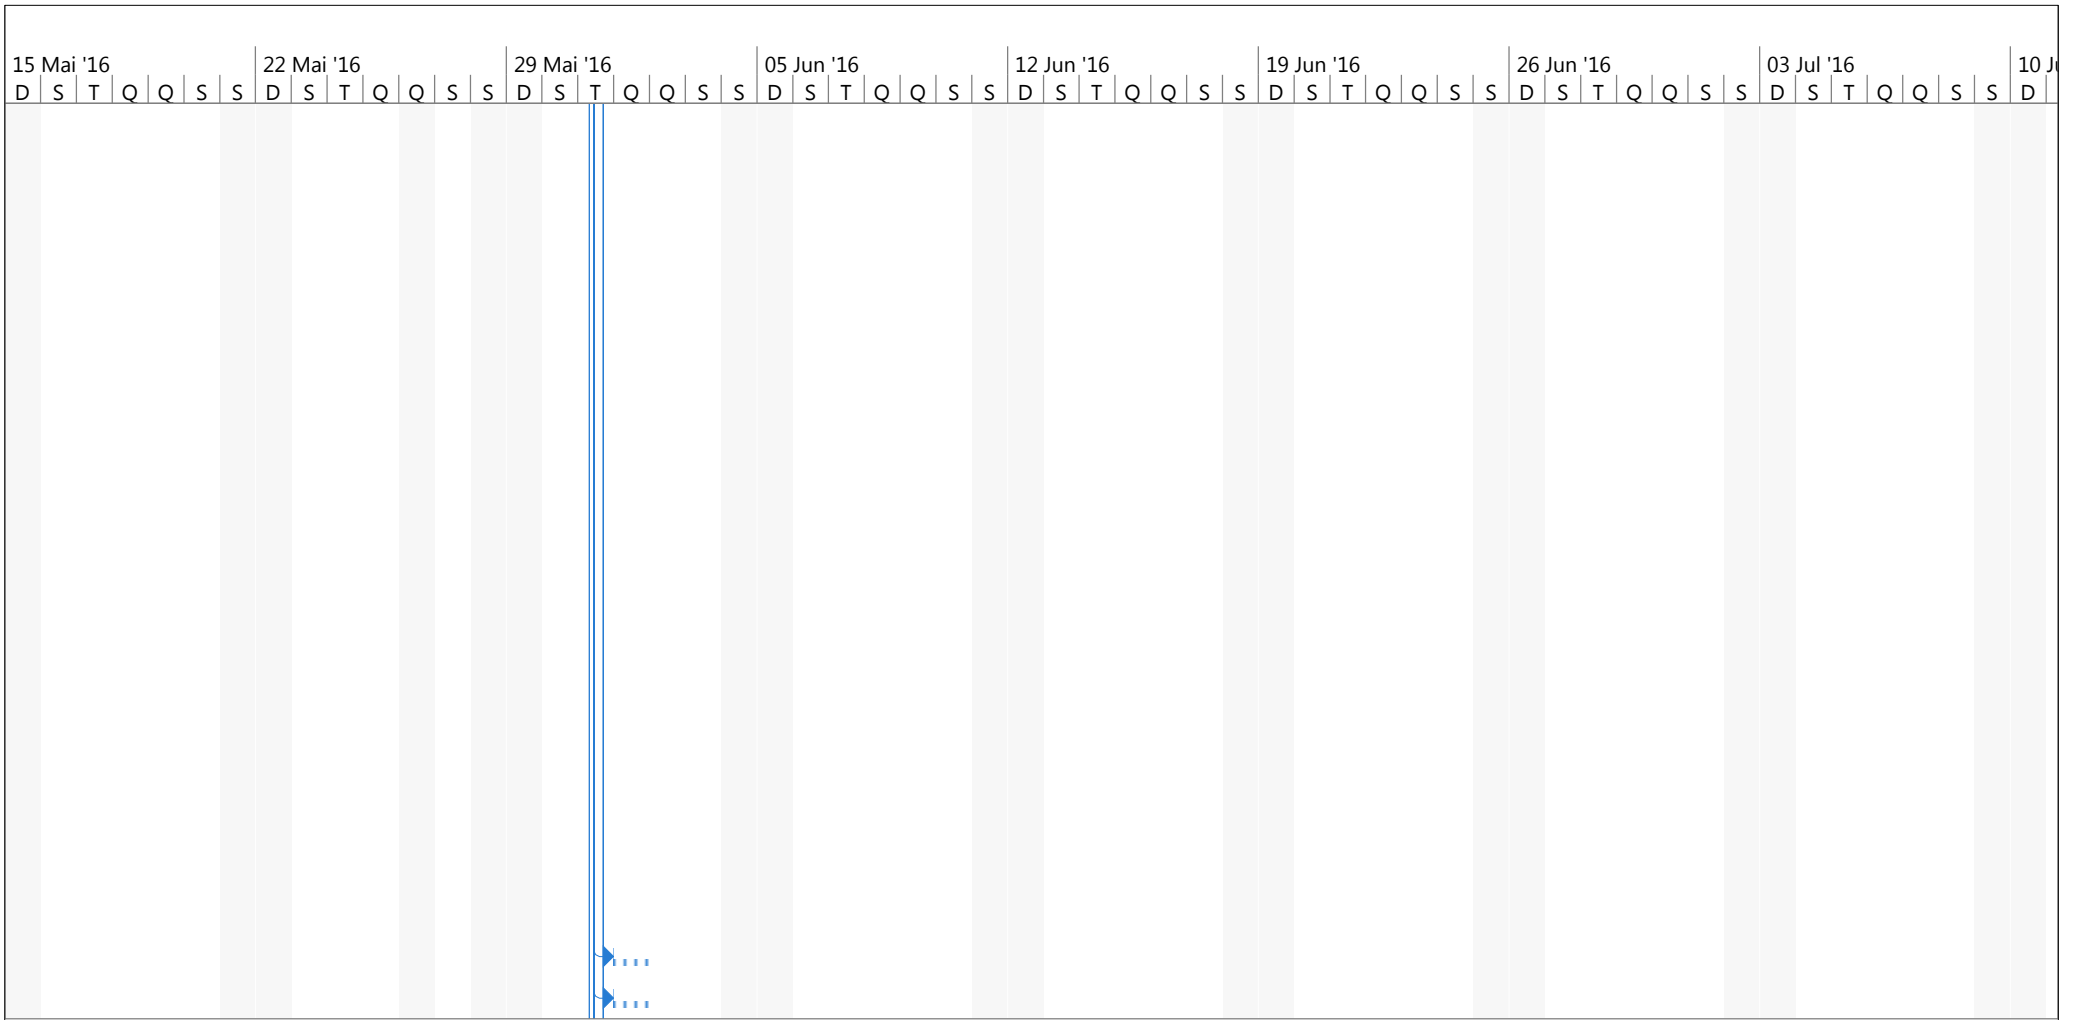


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

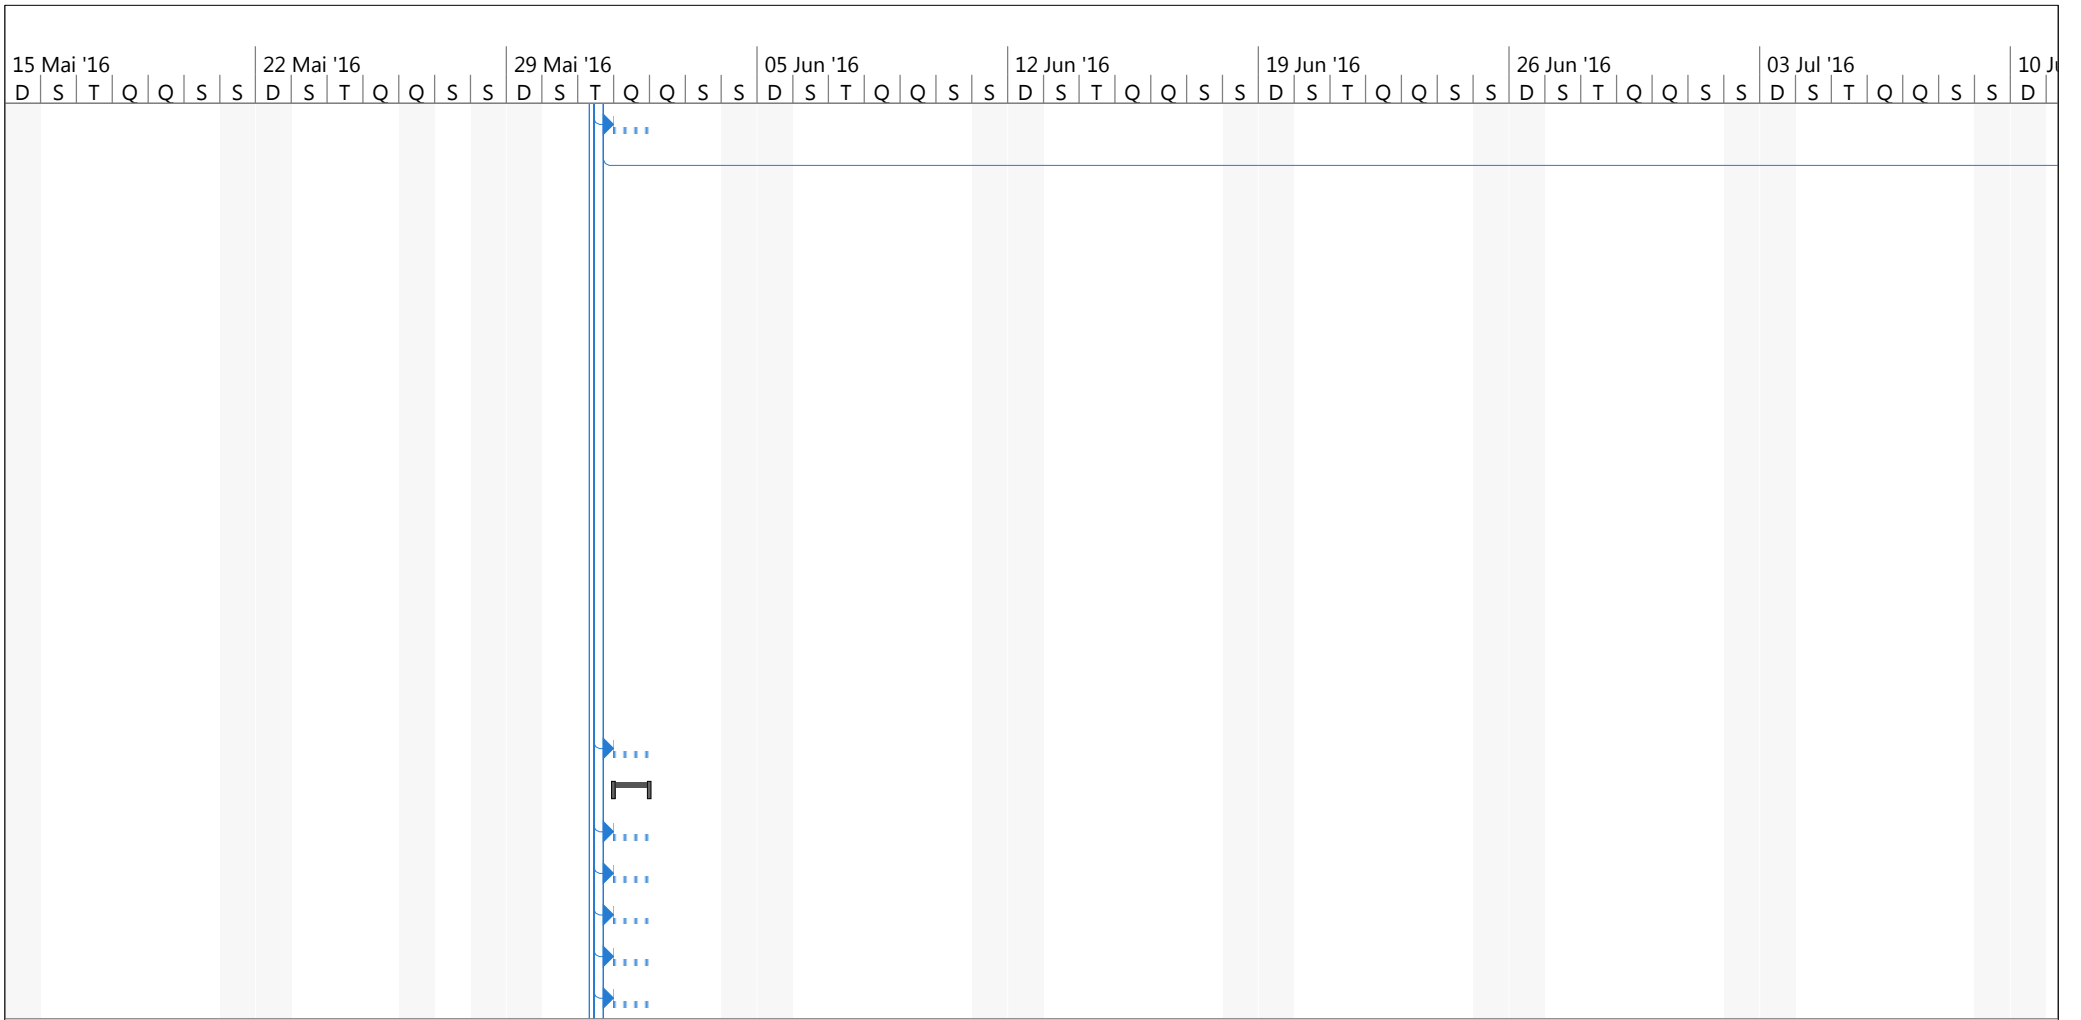


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

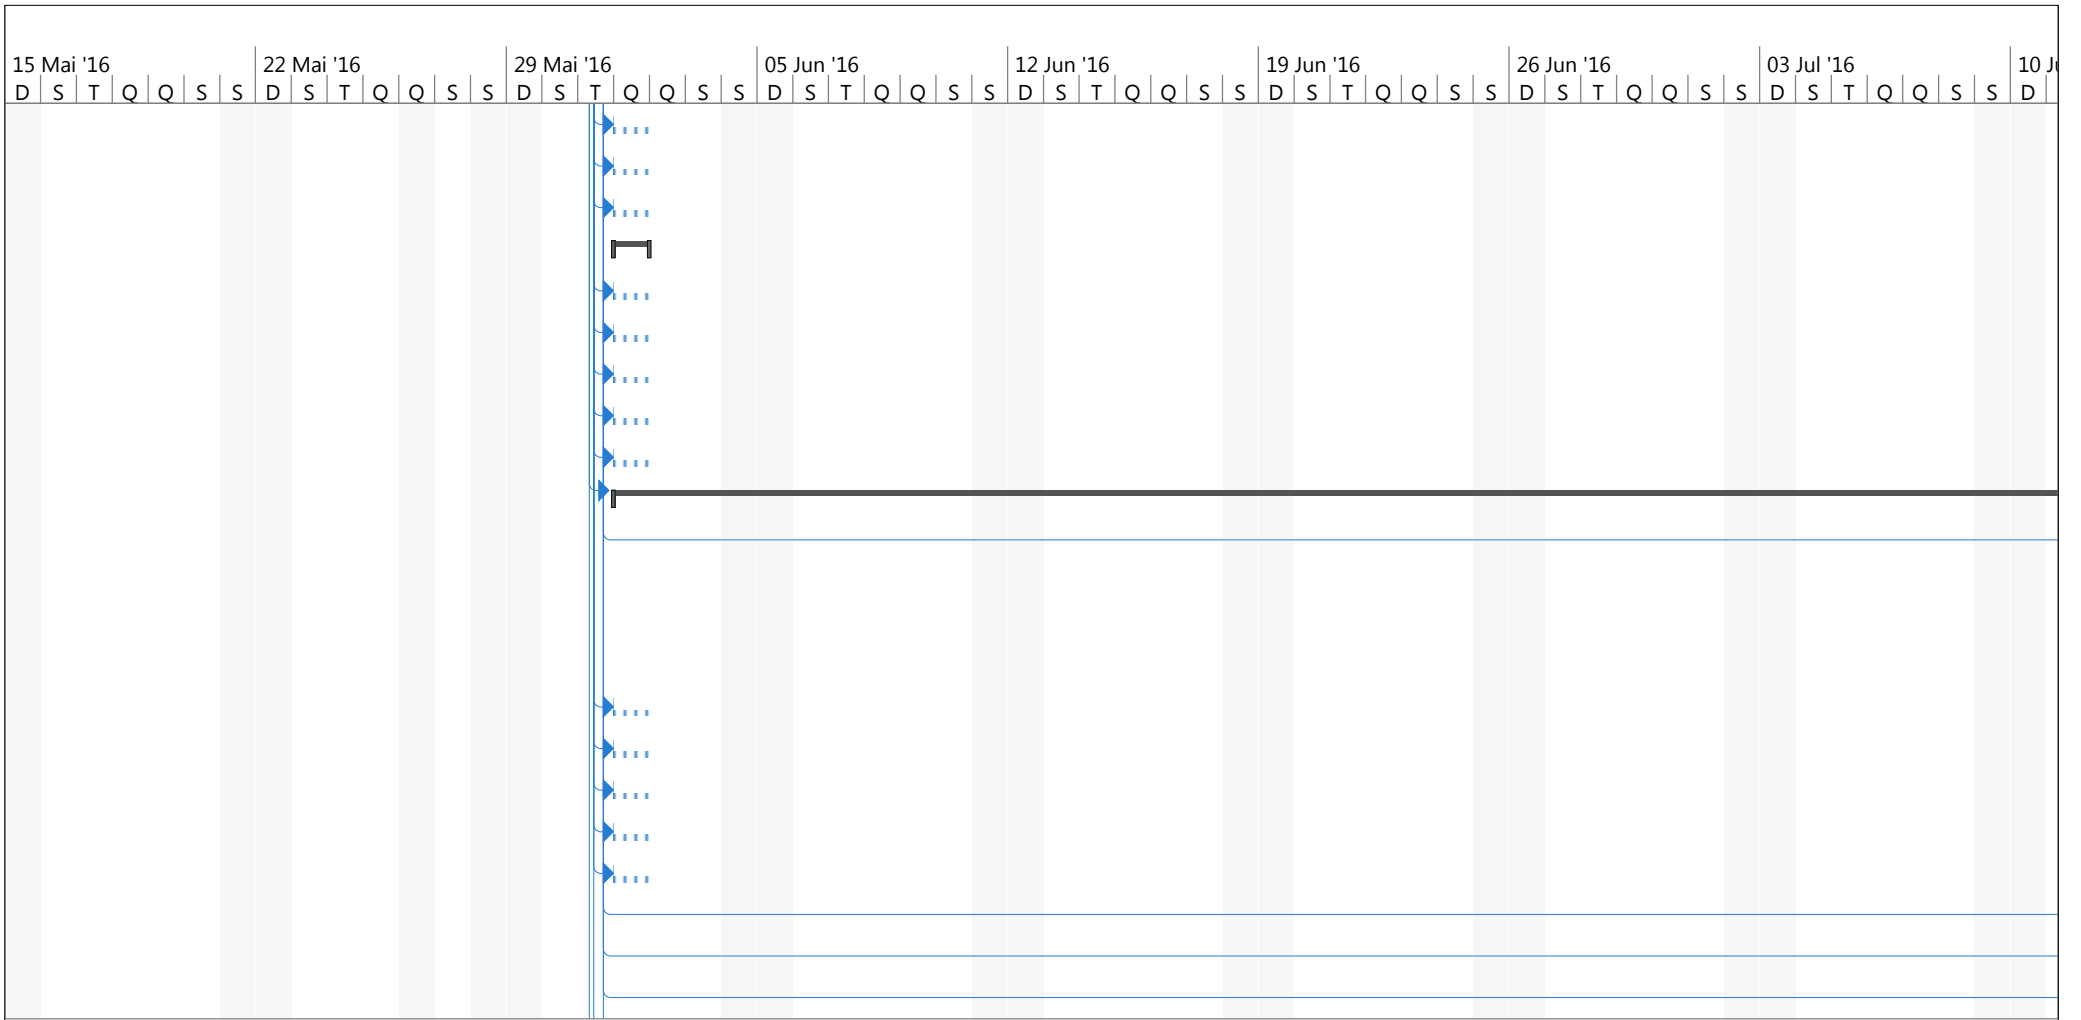

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

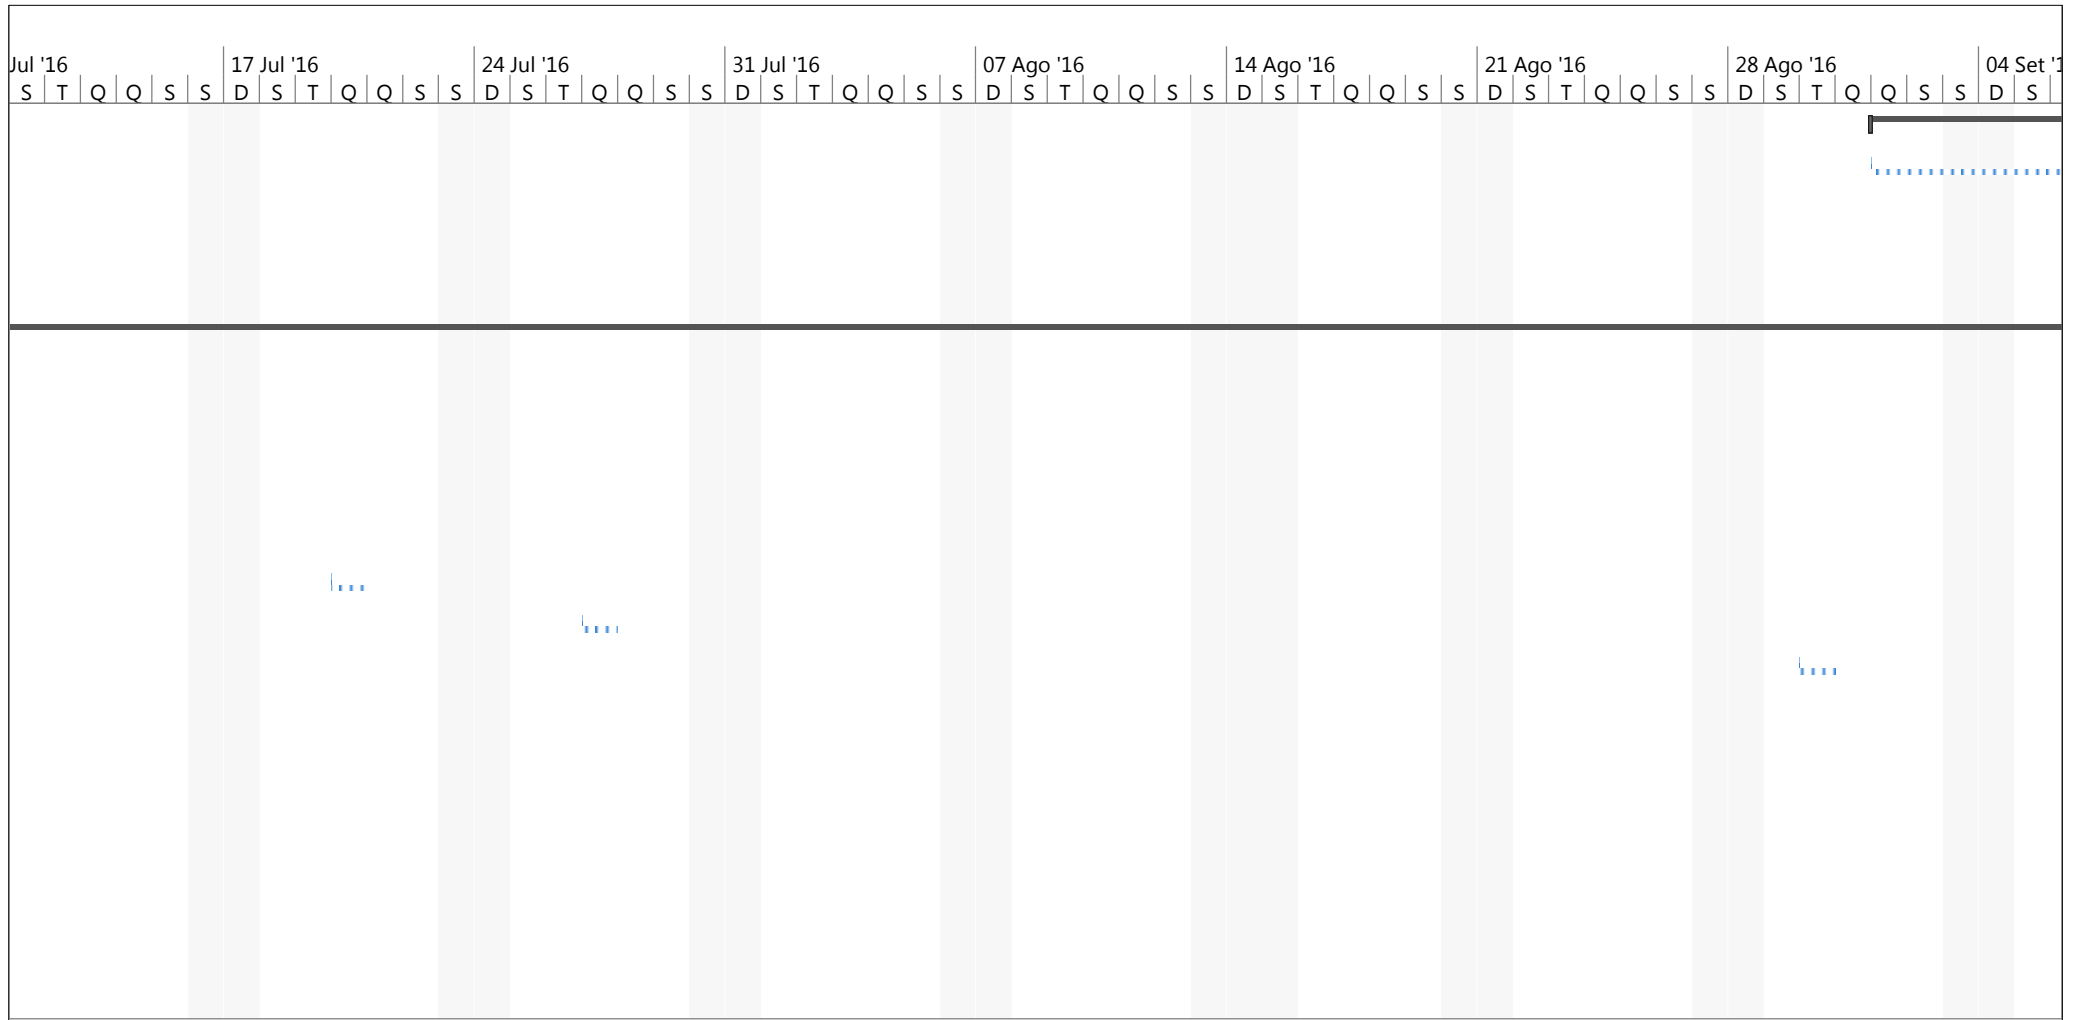


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

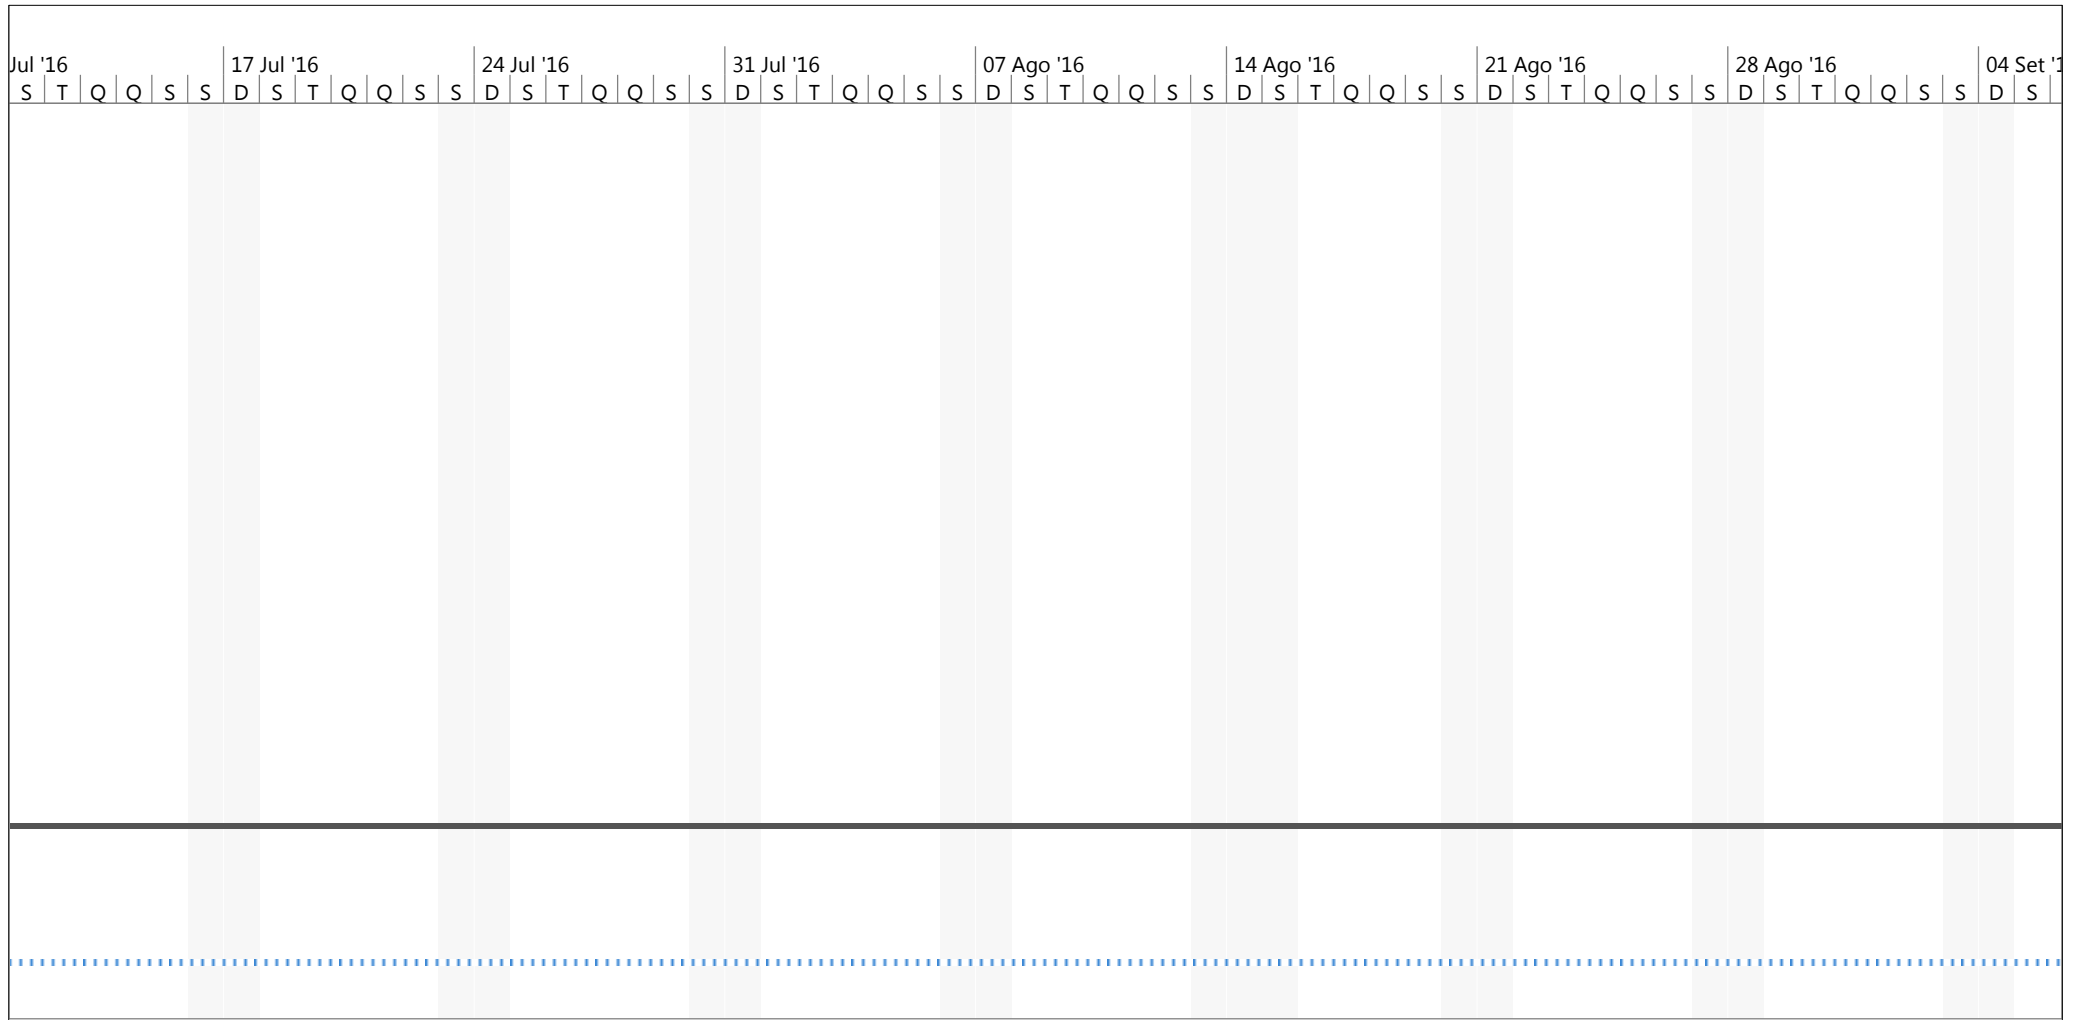


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

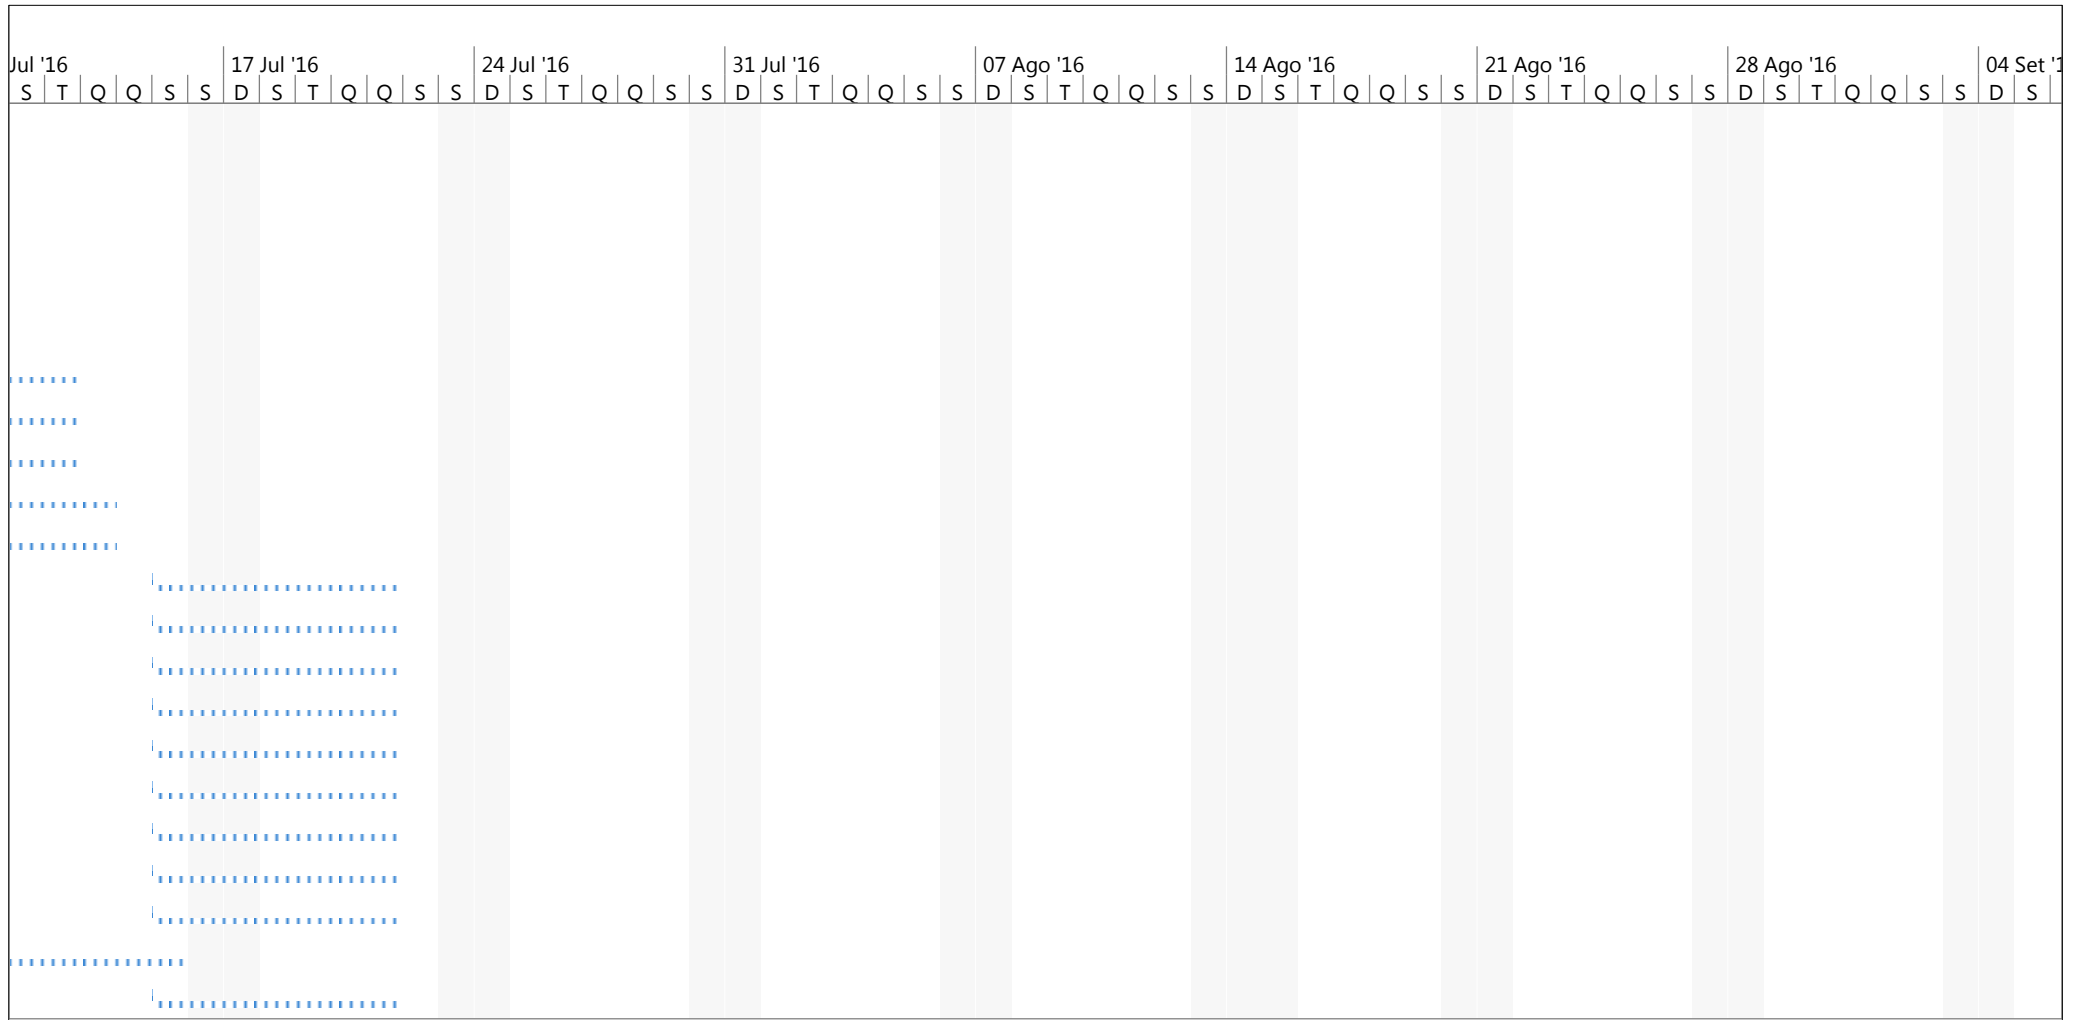


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

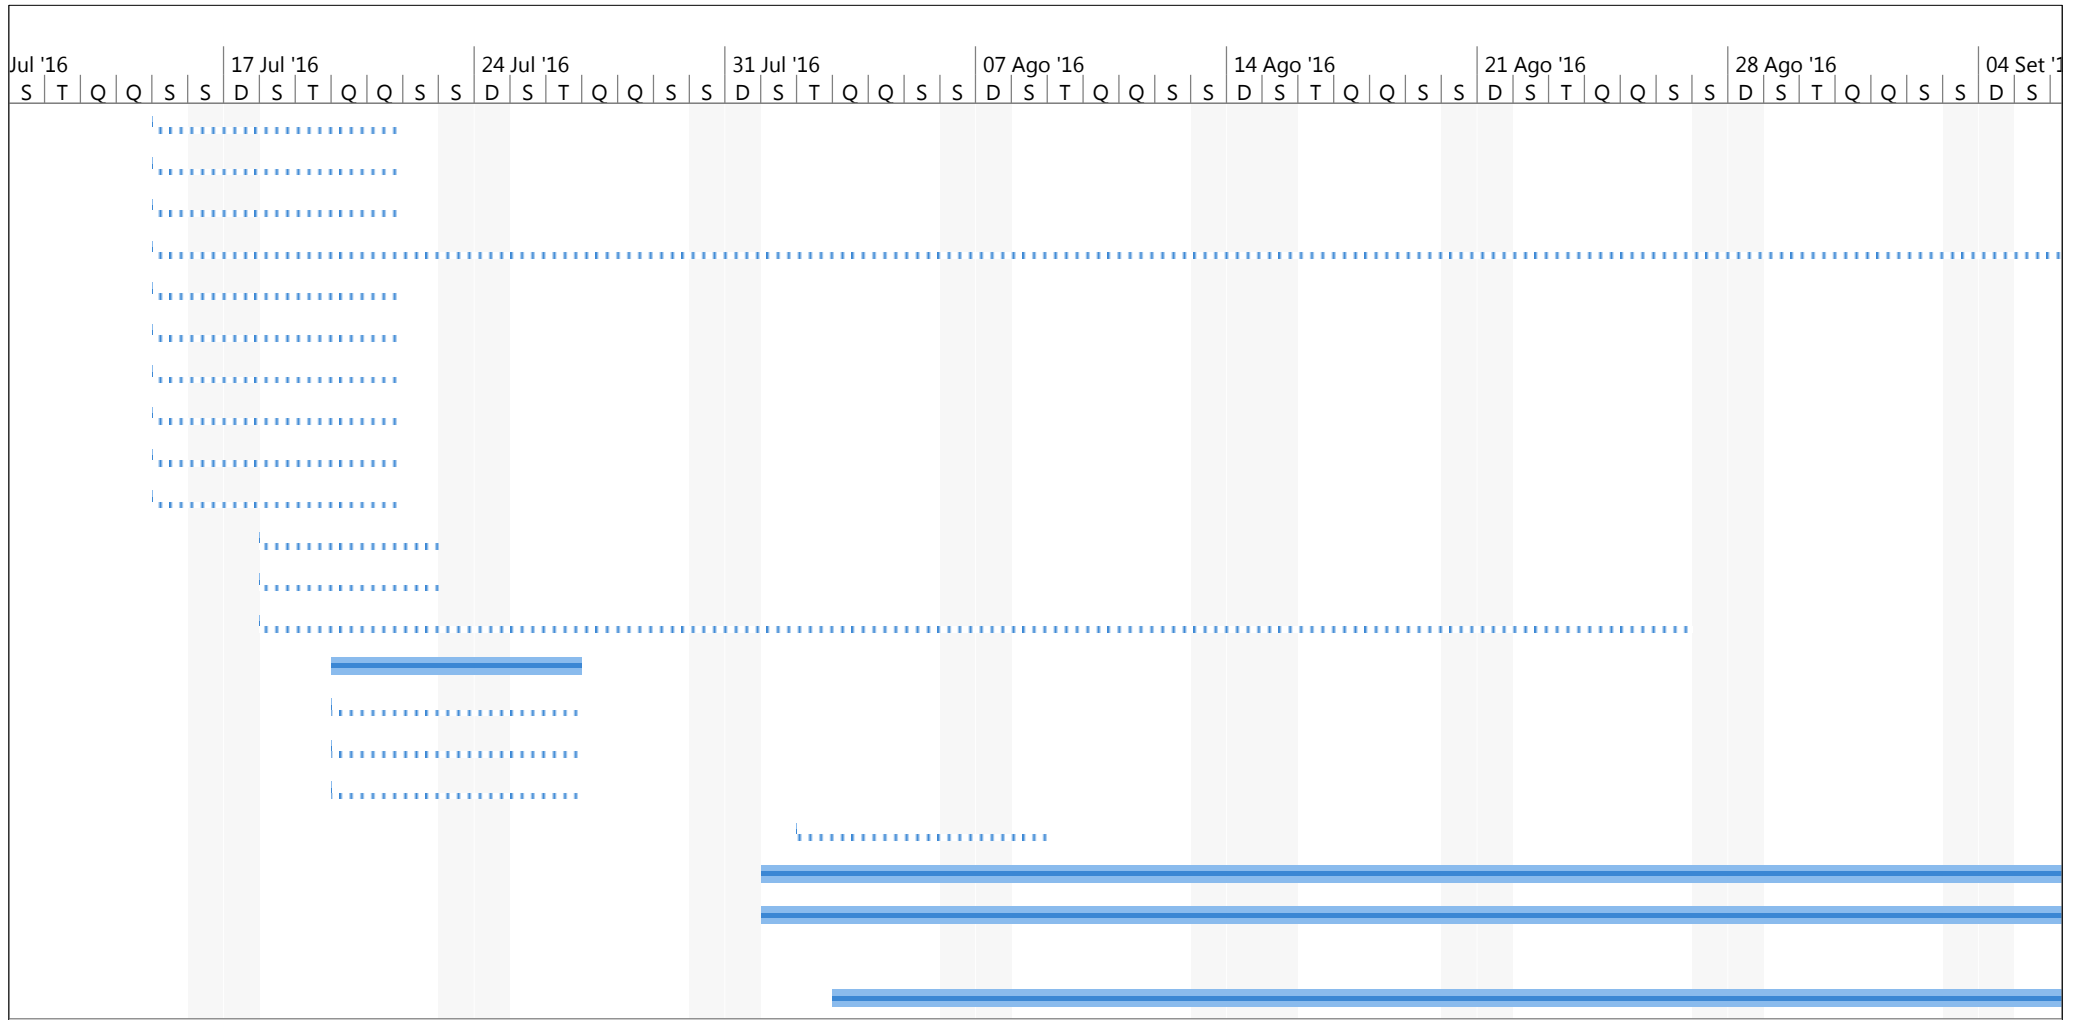


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

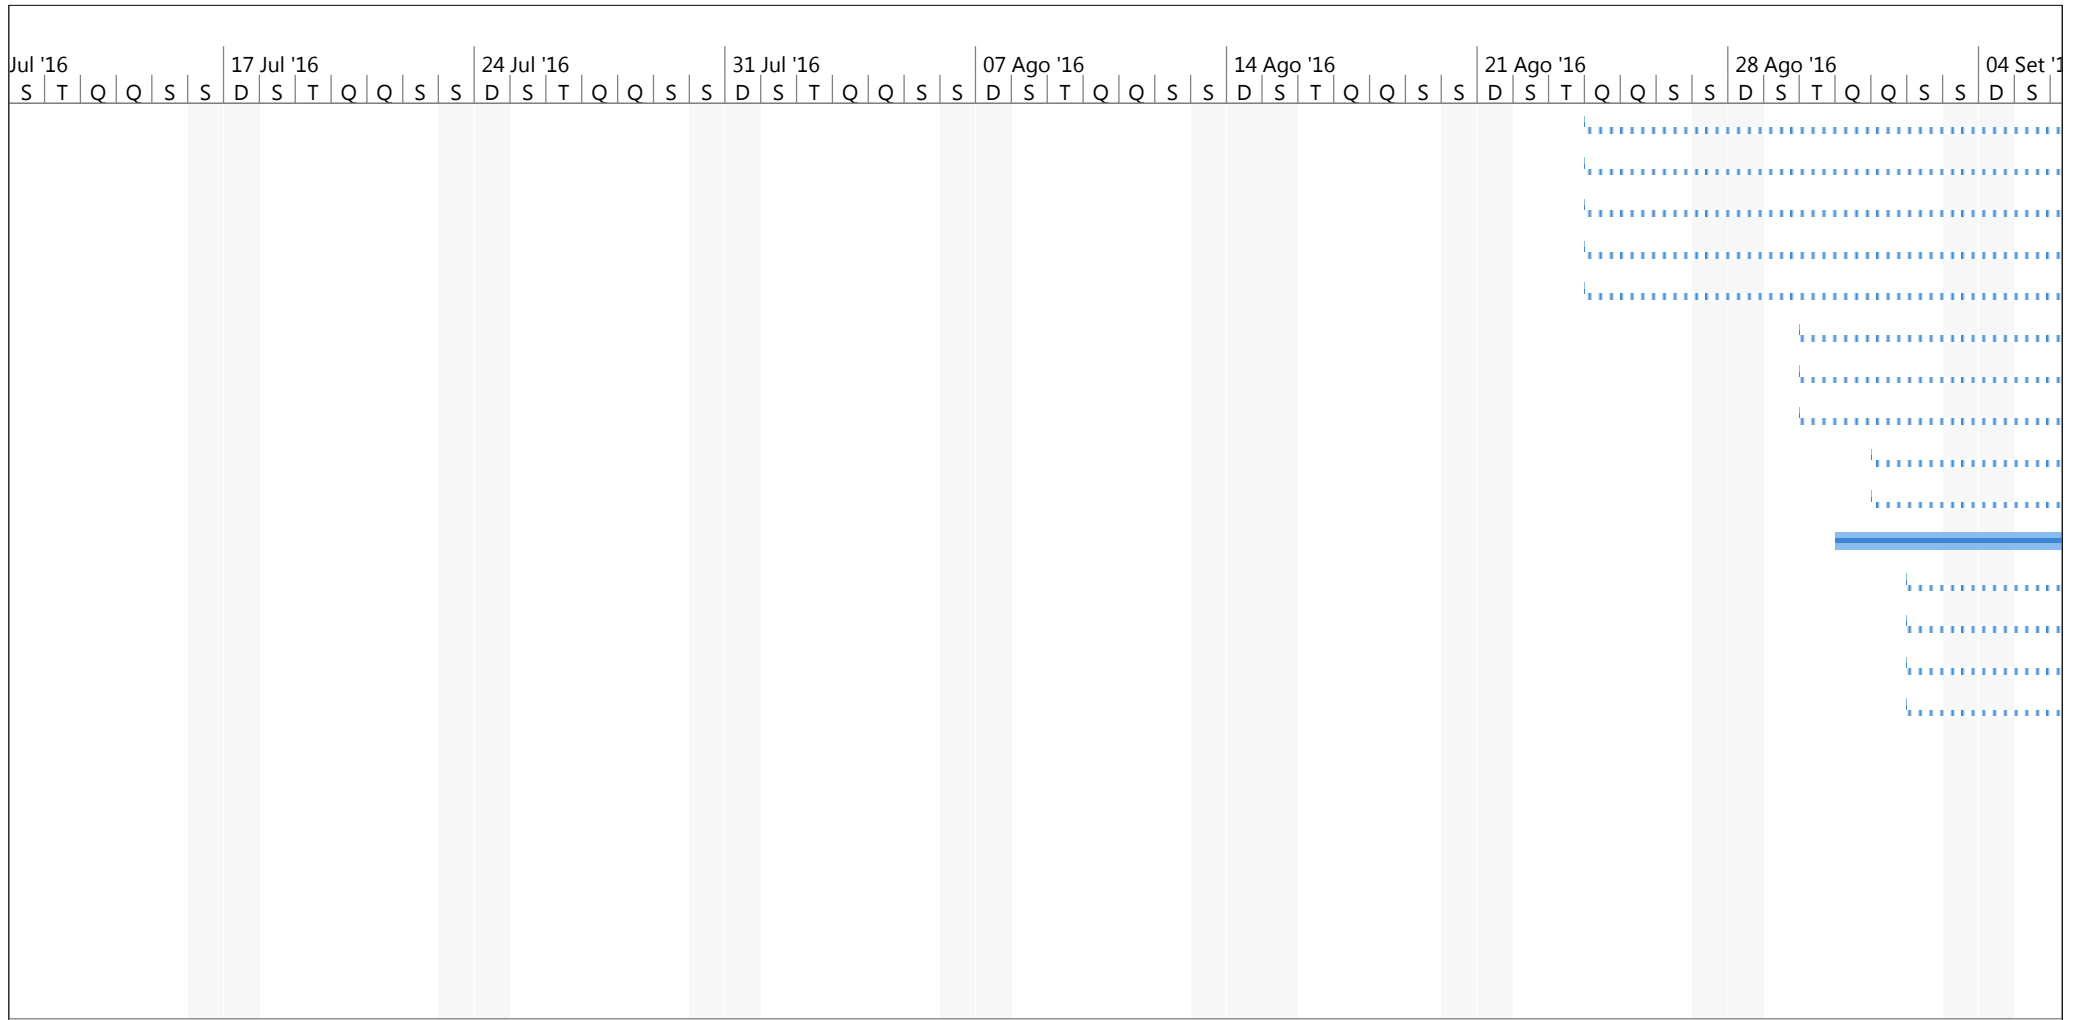


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

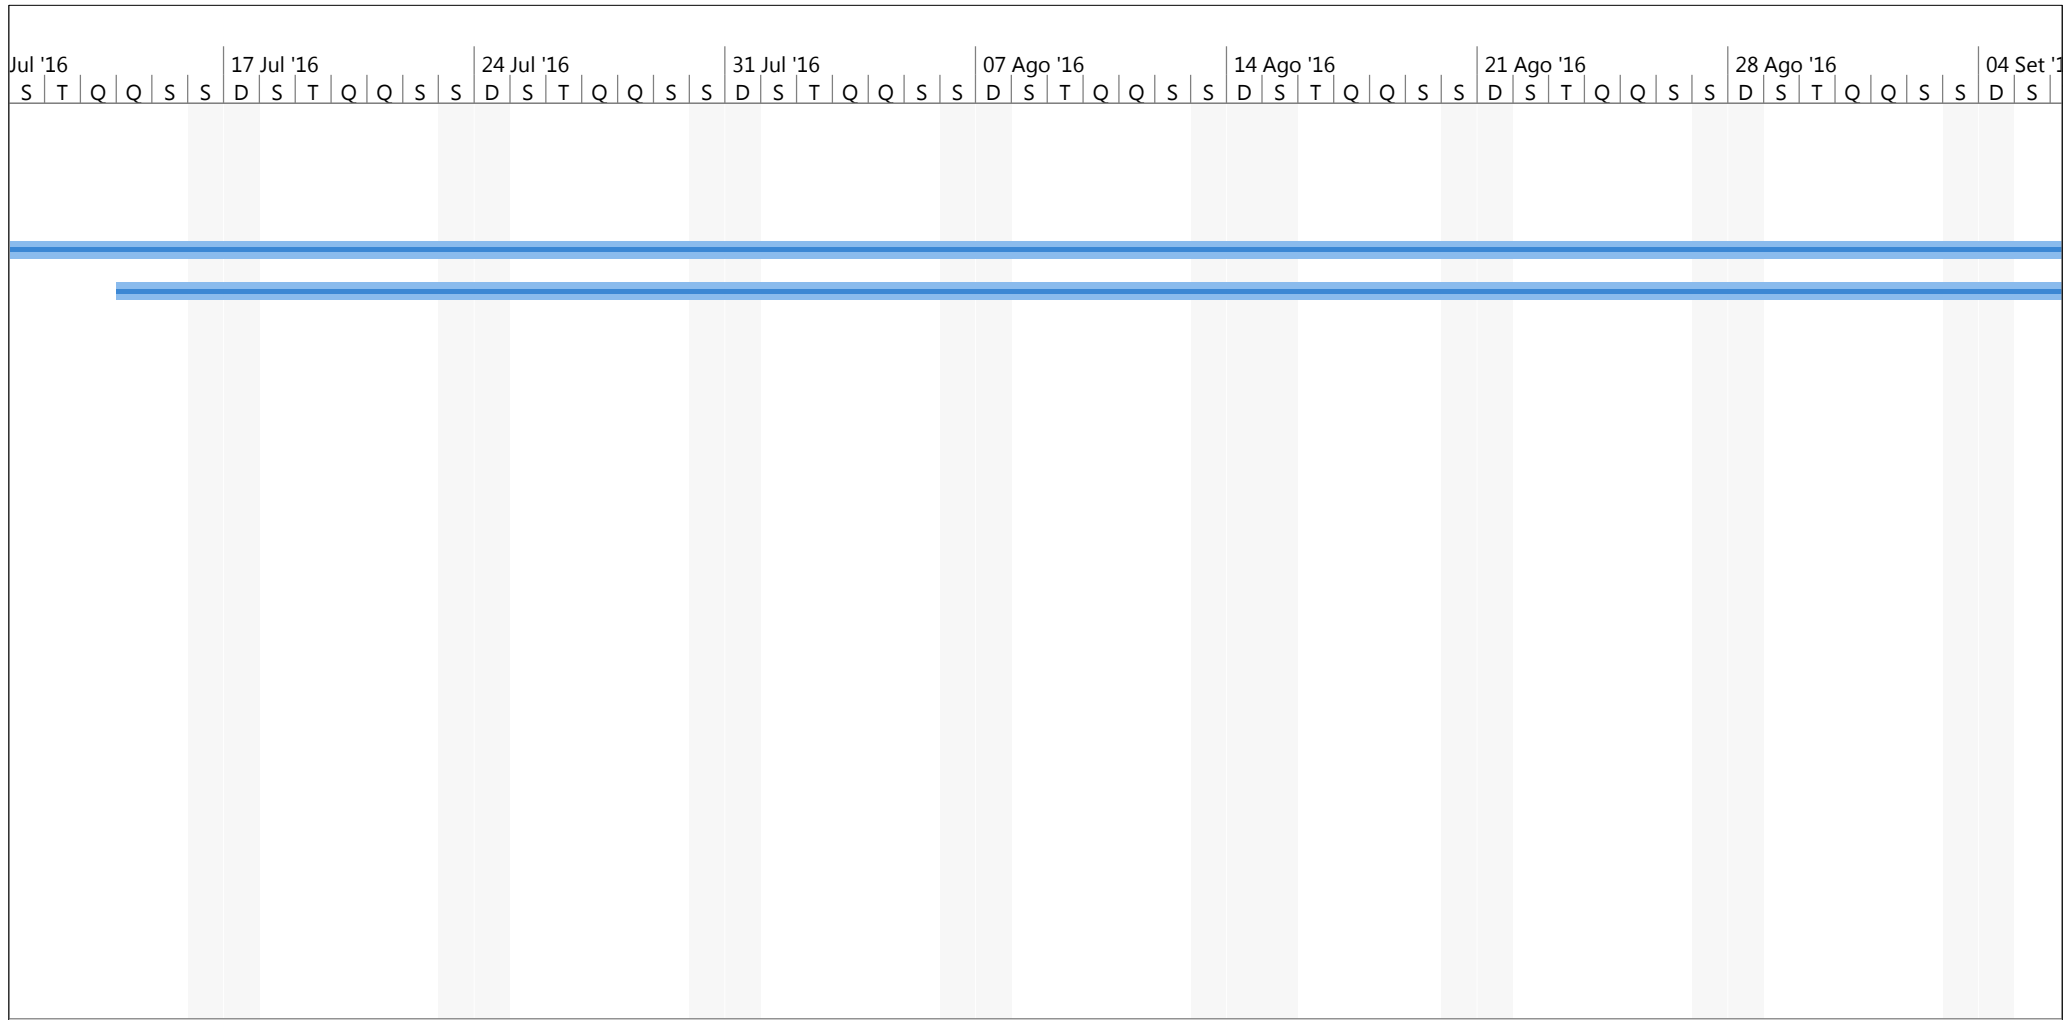


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

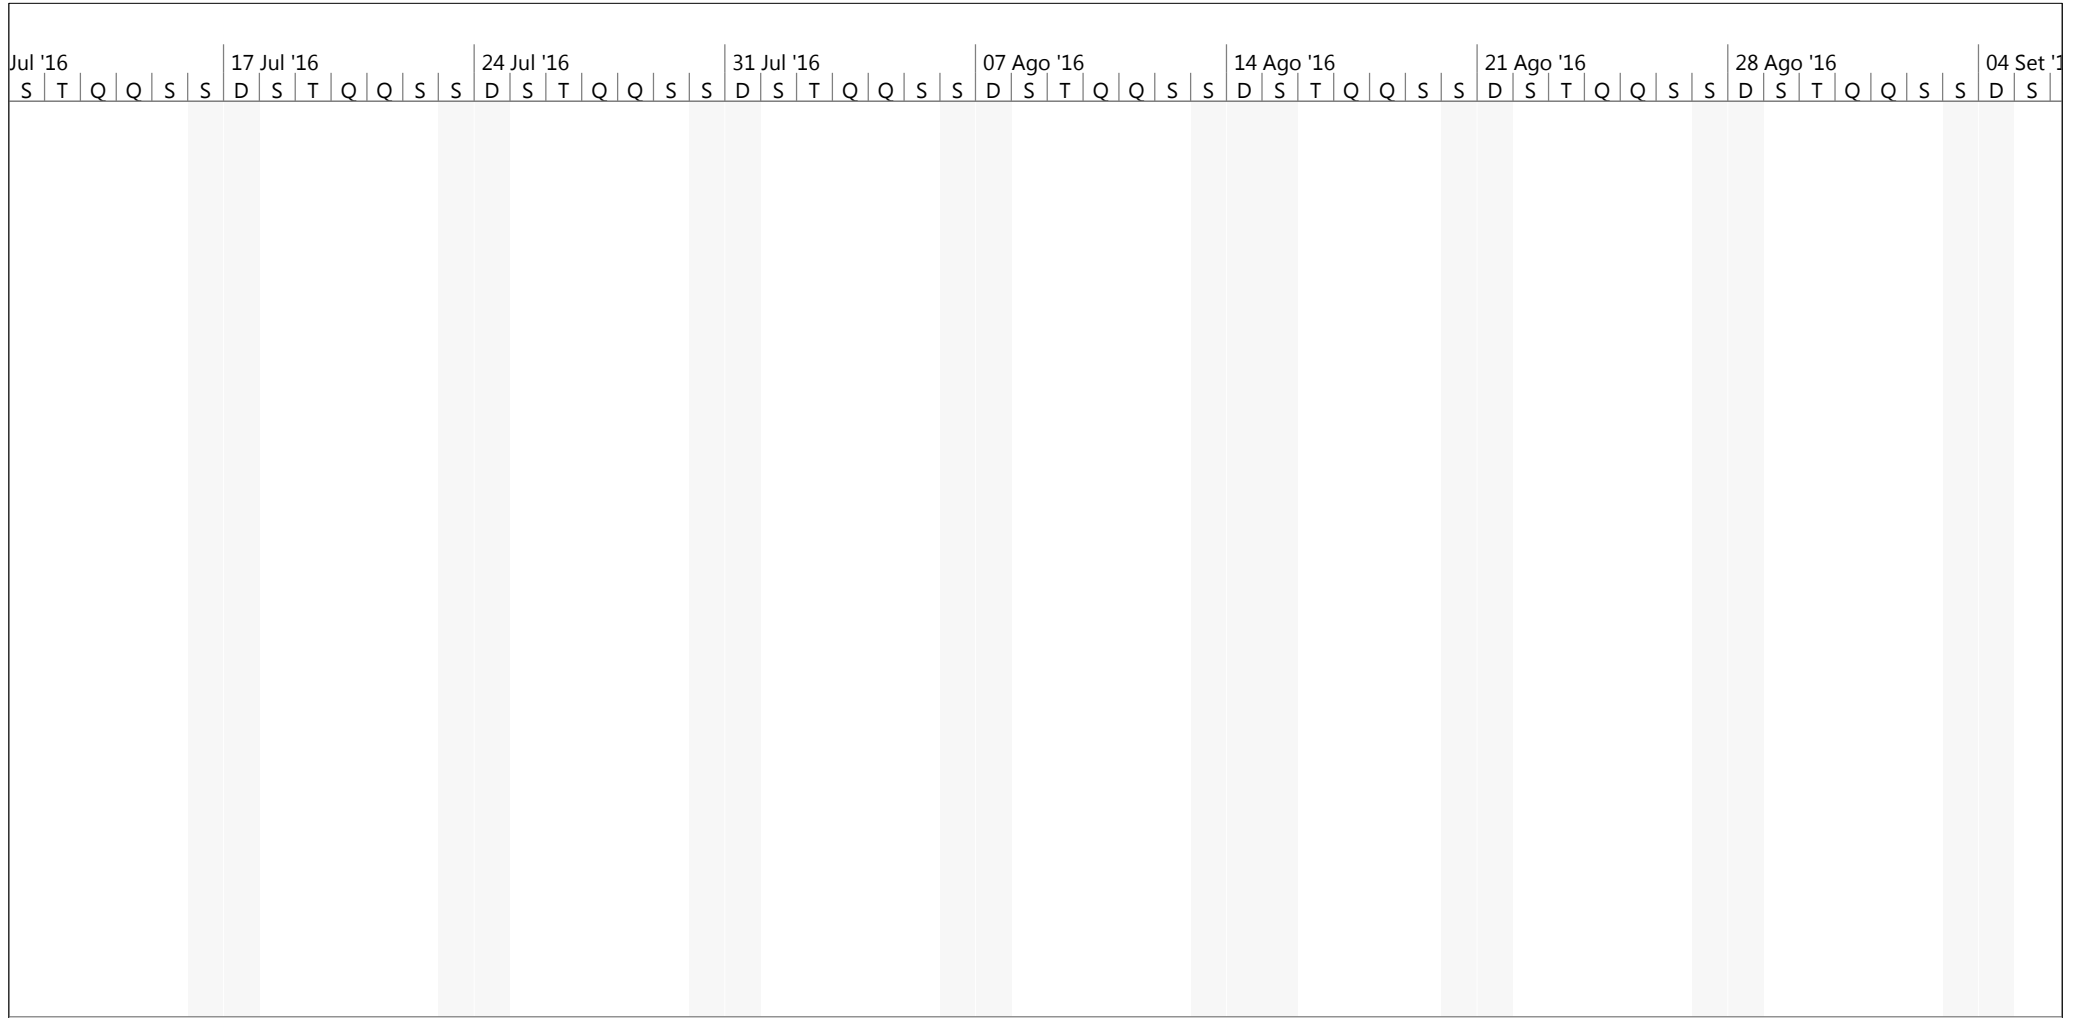

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

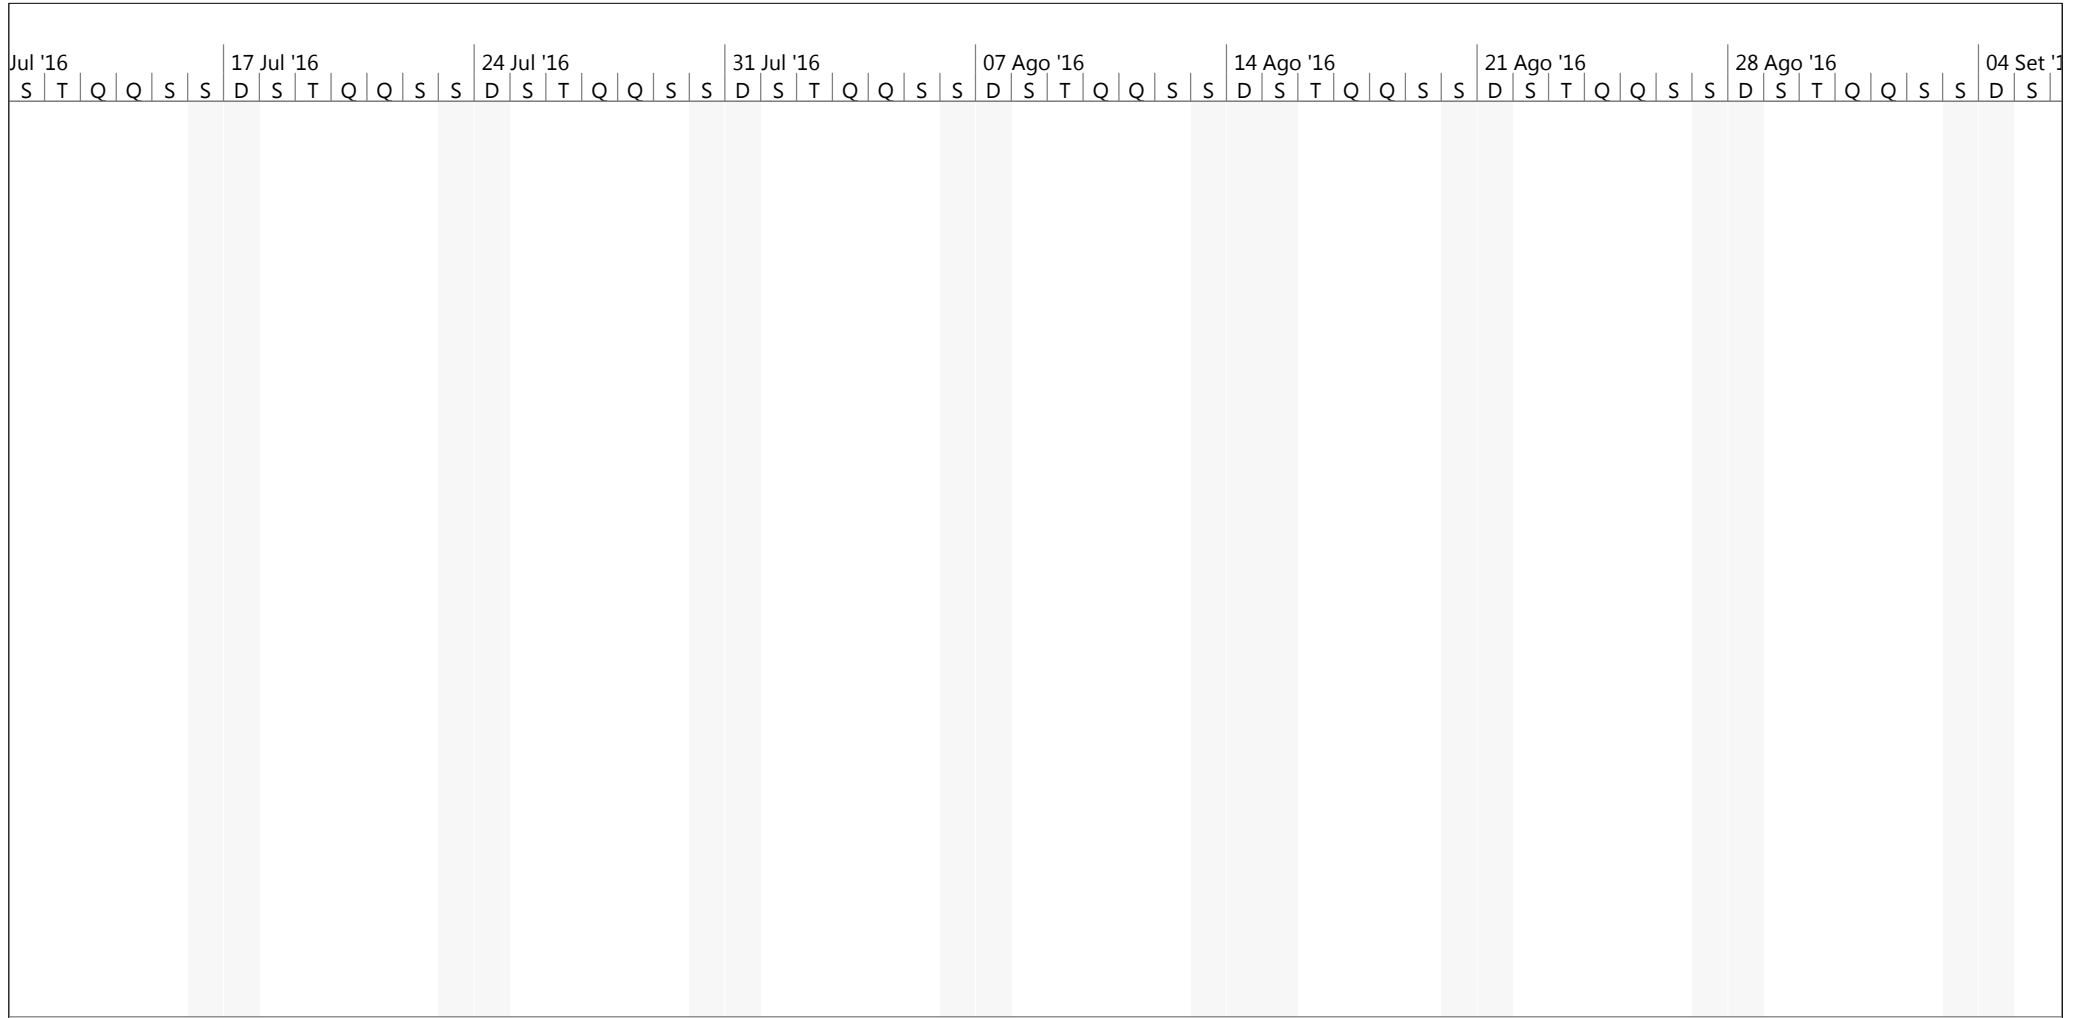

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

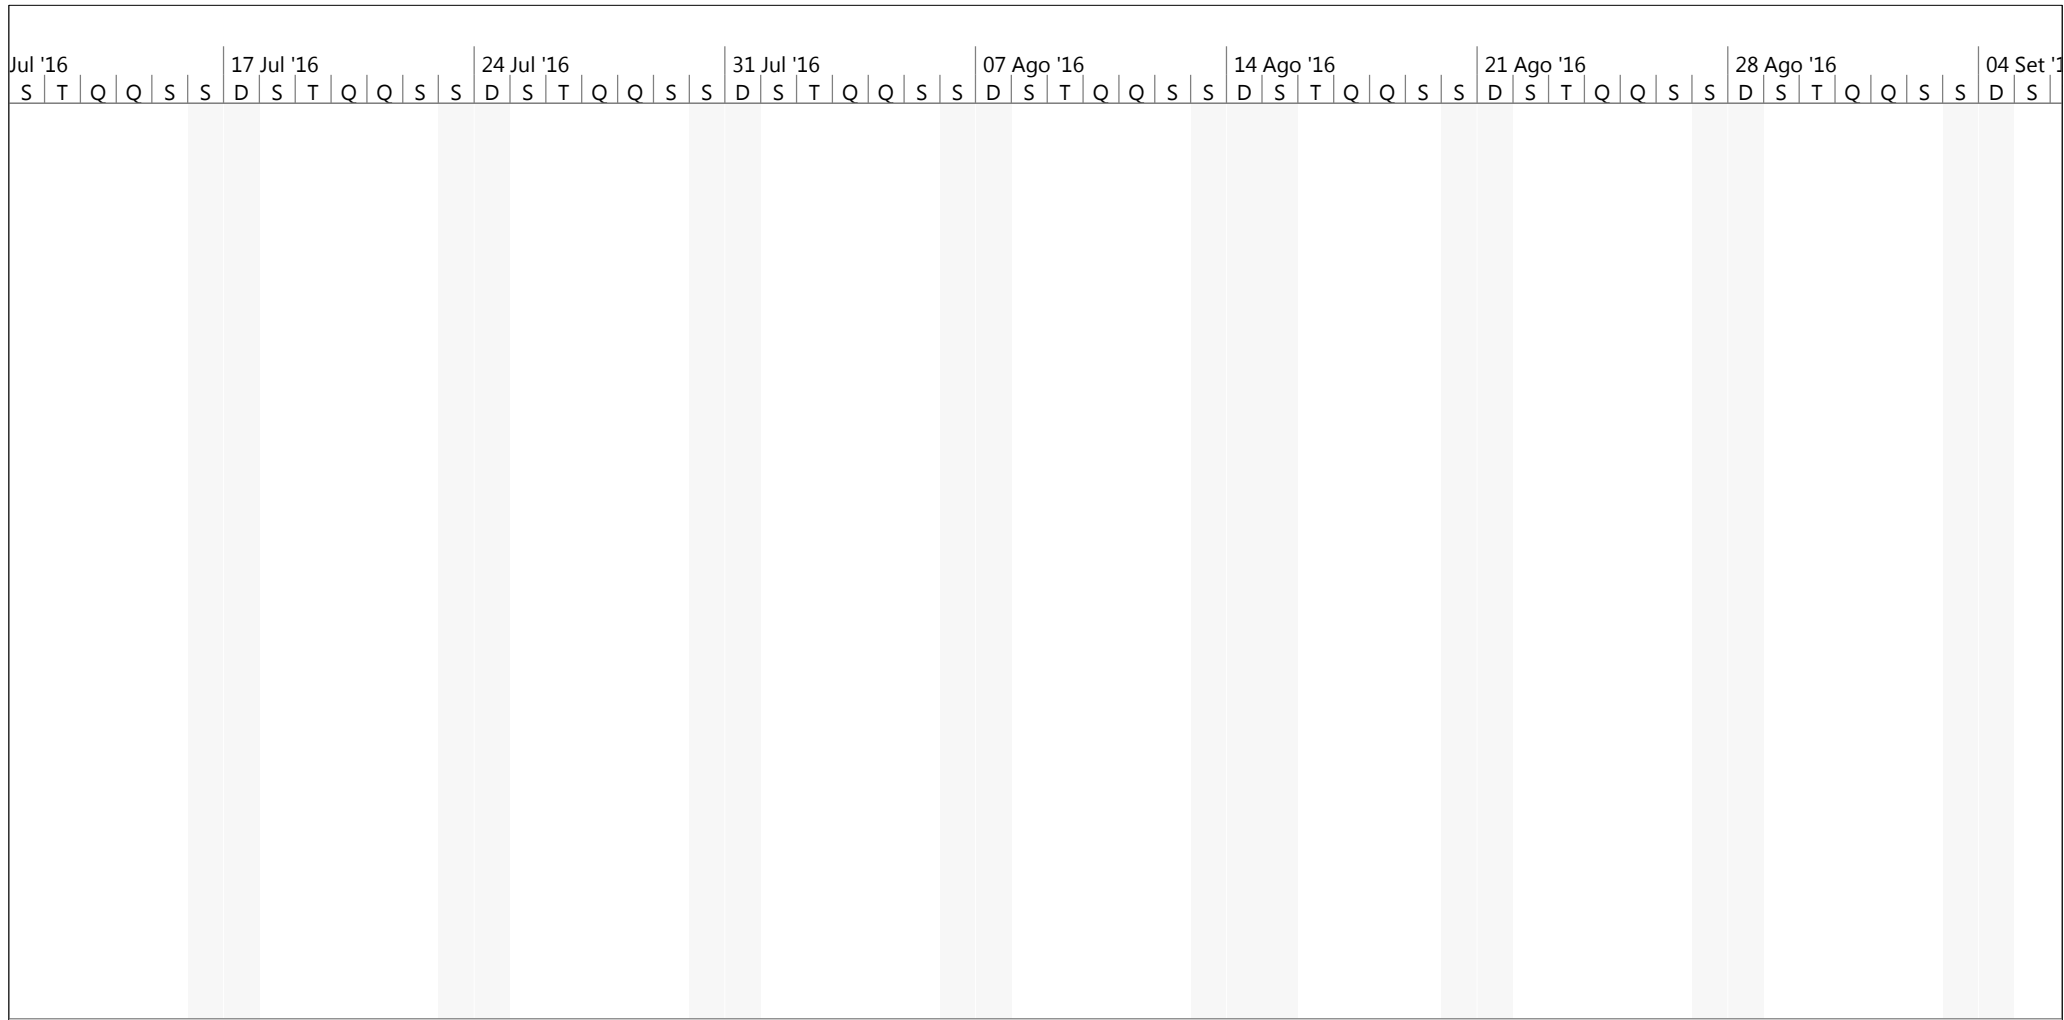


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

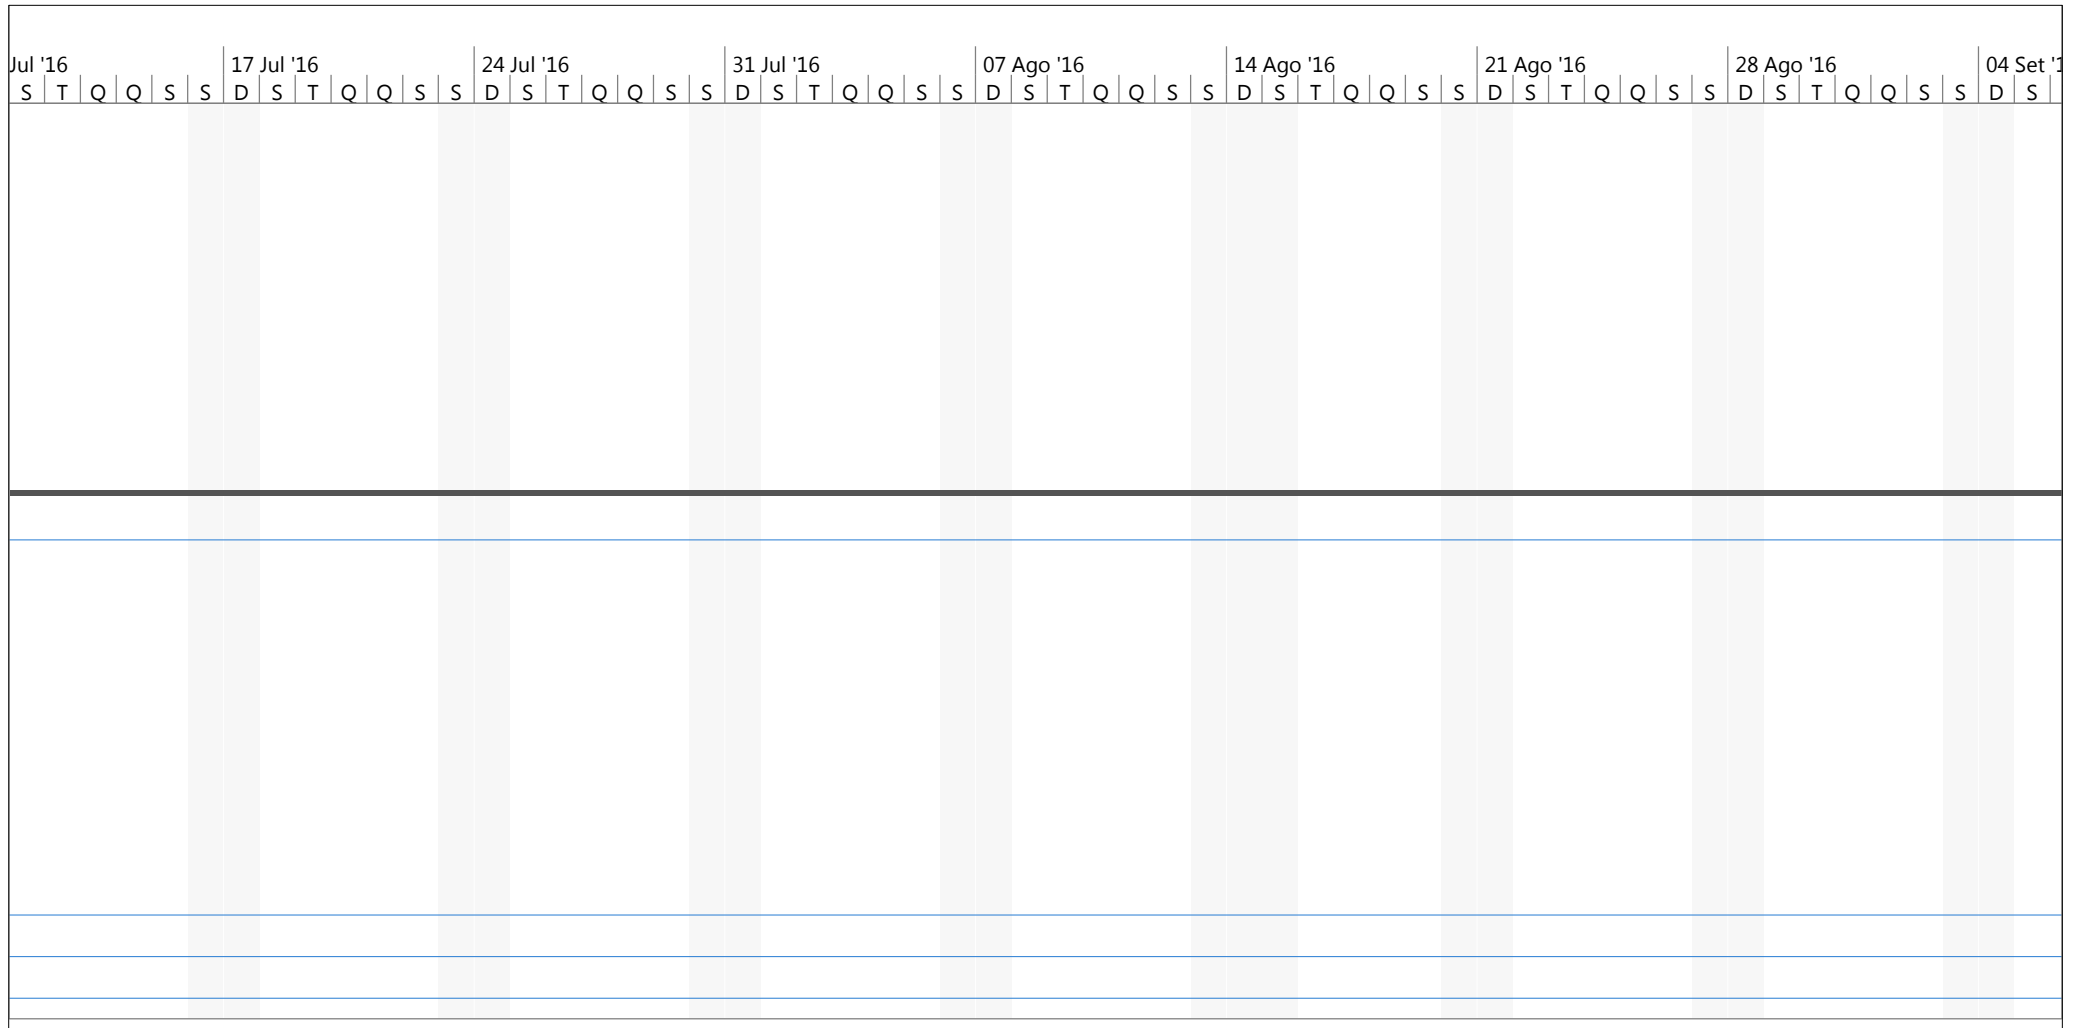

Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18



Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

'16 | 11 Set '16 | 18 Set '16 | 25 Set '16 | 02 Out '16 | 09 Out '16 | 16 Out '16 | 23 Out '16 | 30 Out '16
T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T

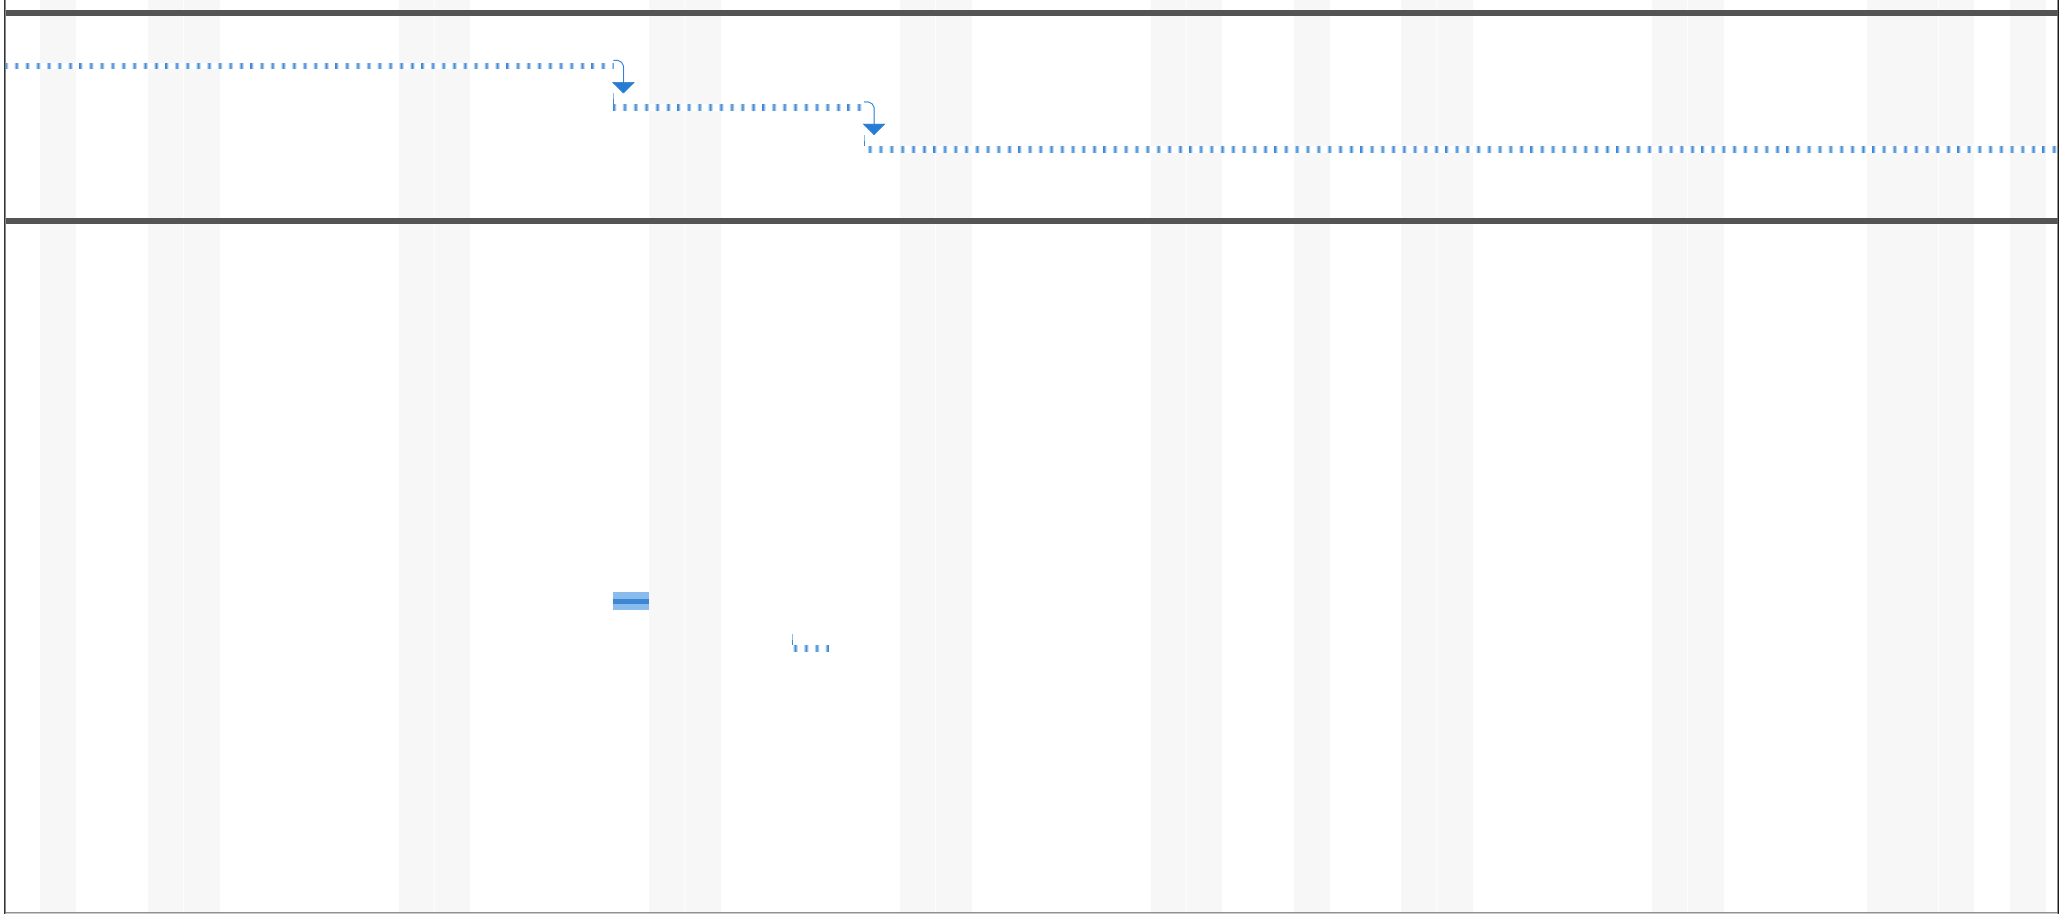




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

'16 T Q Q S S 11 Set '16 D S T Q Q S S 18 Set '16 D S T Q Q S S 25 Set '16 D S T Q Q S S 02 Out '16 D S T Q Q S S 09 Out '16 D S T Q Q S S 16 Out '16 D S T Q Q S S 23 Out '16 D S T Q Q S S 30 Out '16 D S T

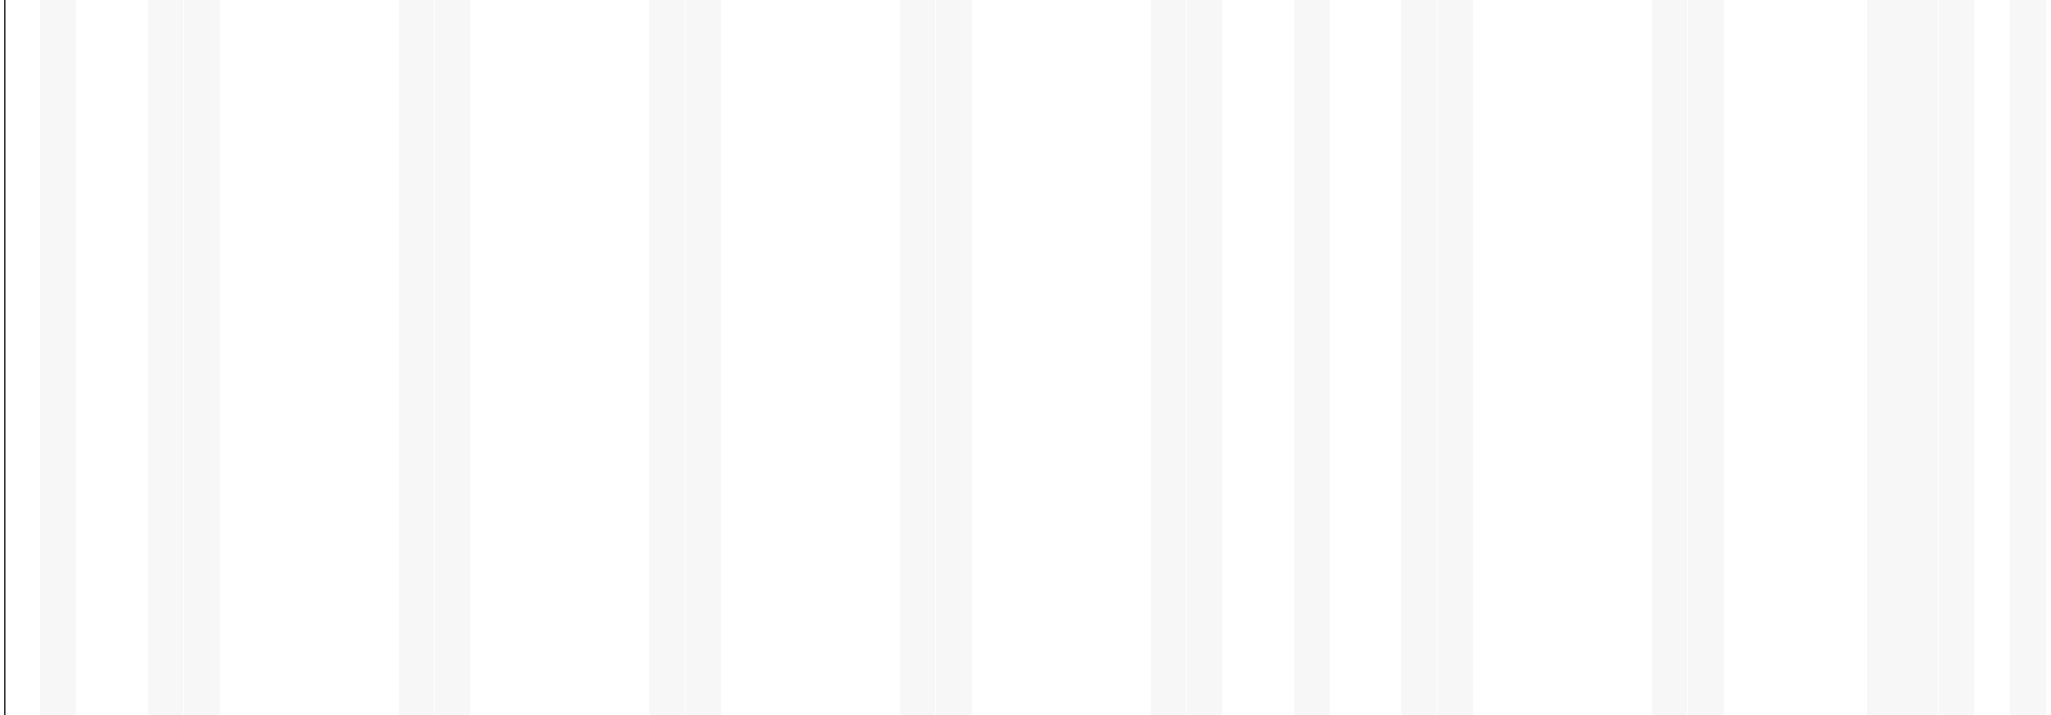


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


'16 | Q | Q | S | S | 11 Set '16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 18 Set '16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 25 Set '16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 02 Out '16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 09 Out '16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 16 Out '16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 23 Out '16 | D | S | T | Q | Q | S | S | 30 Out '16 | D | S | T |

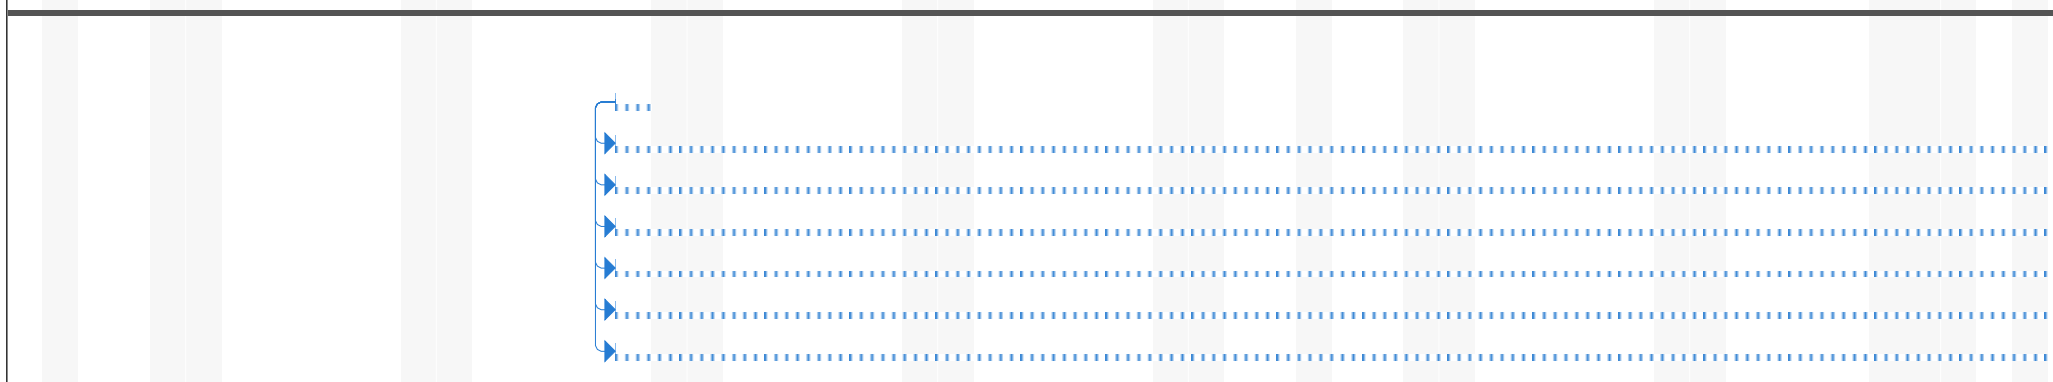


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

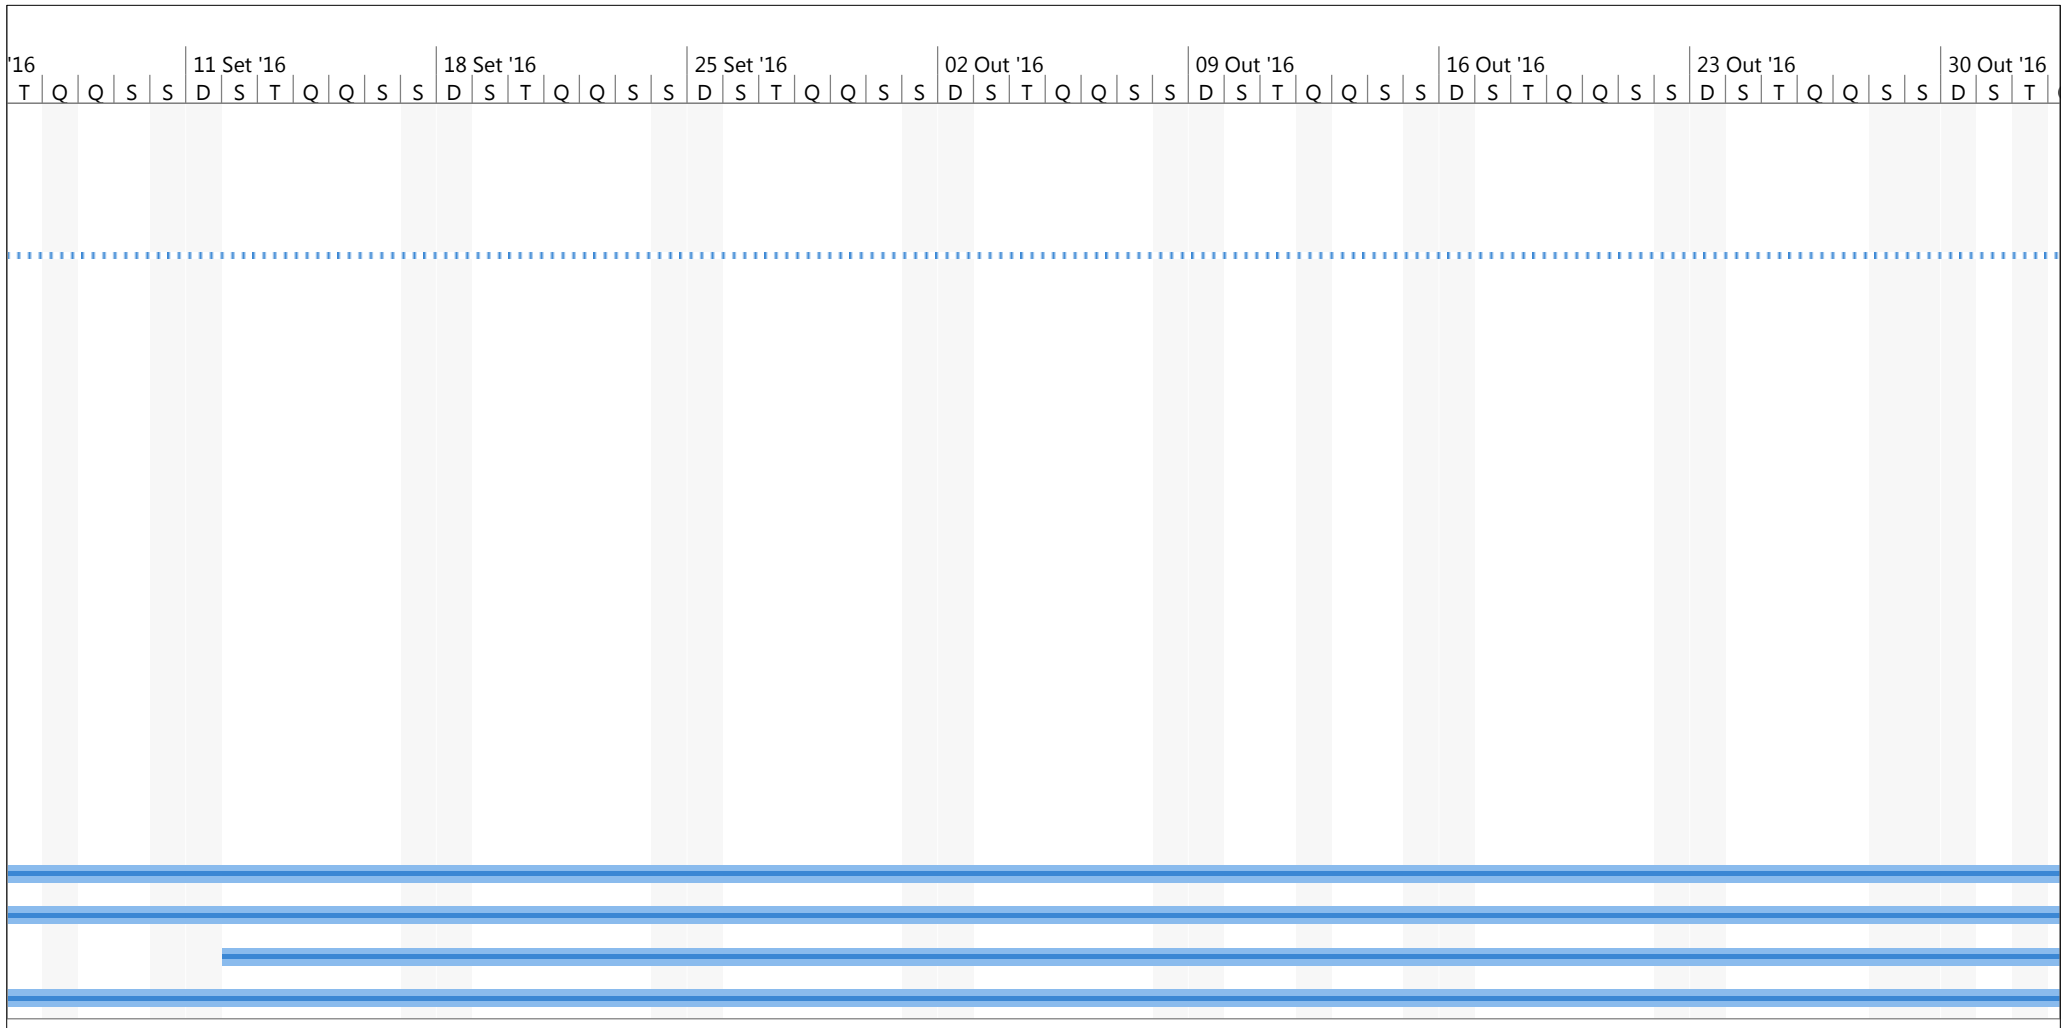


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

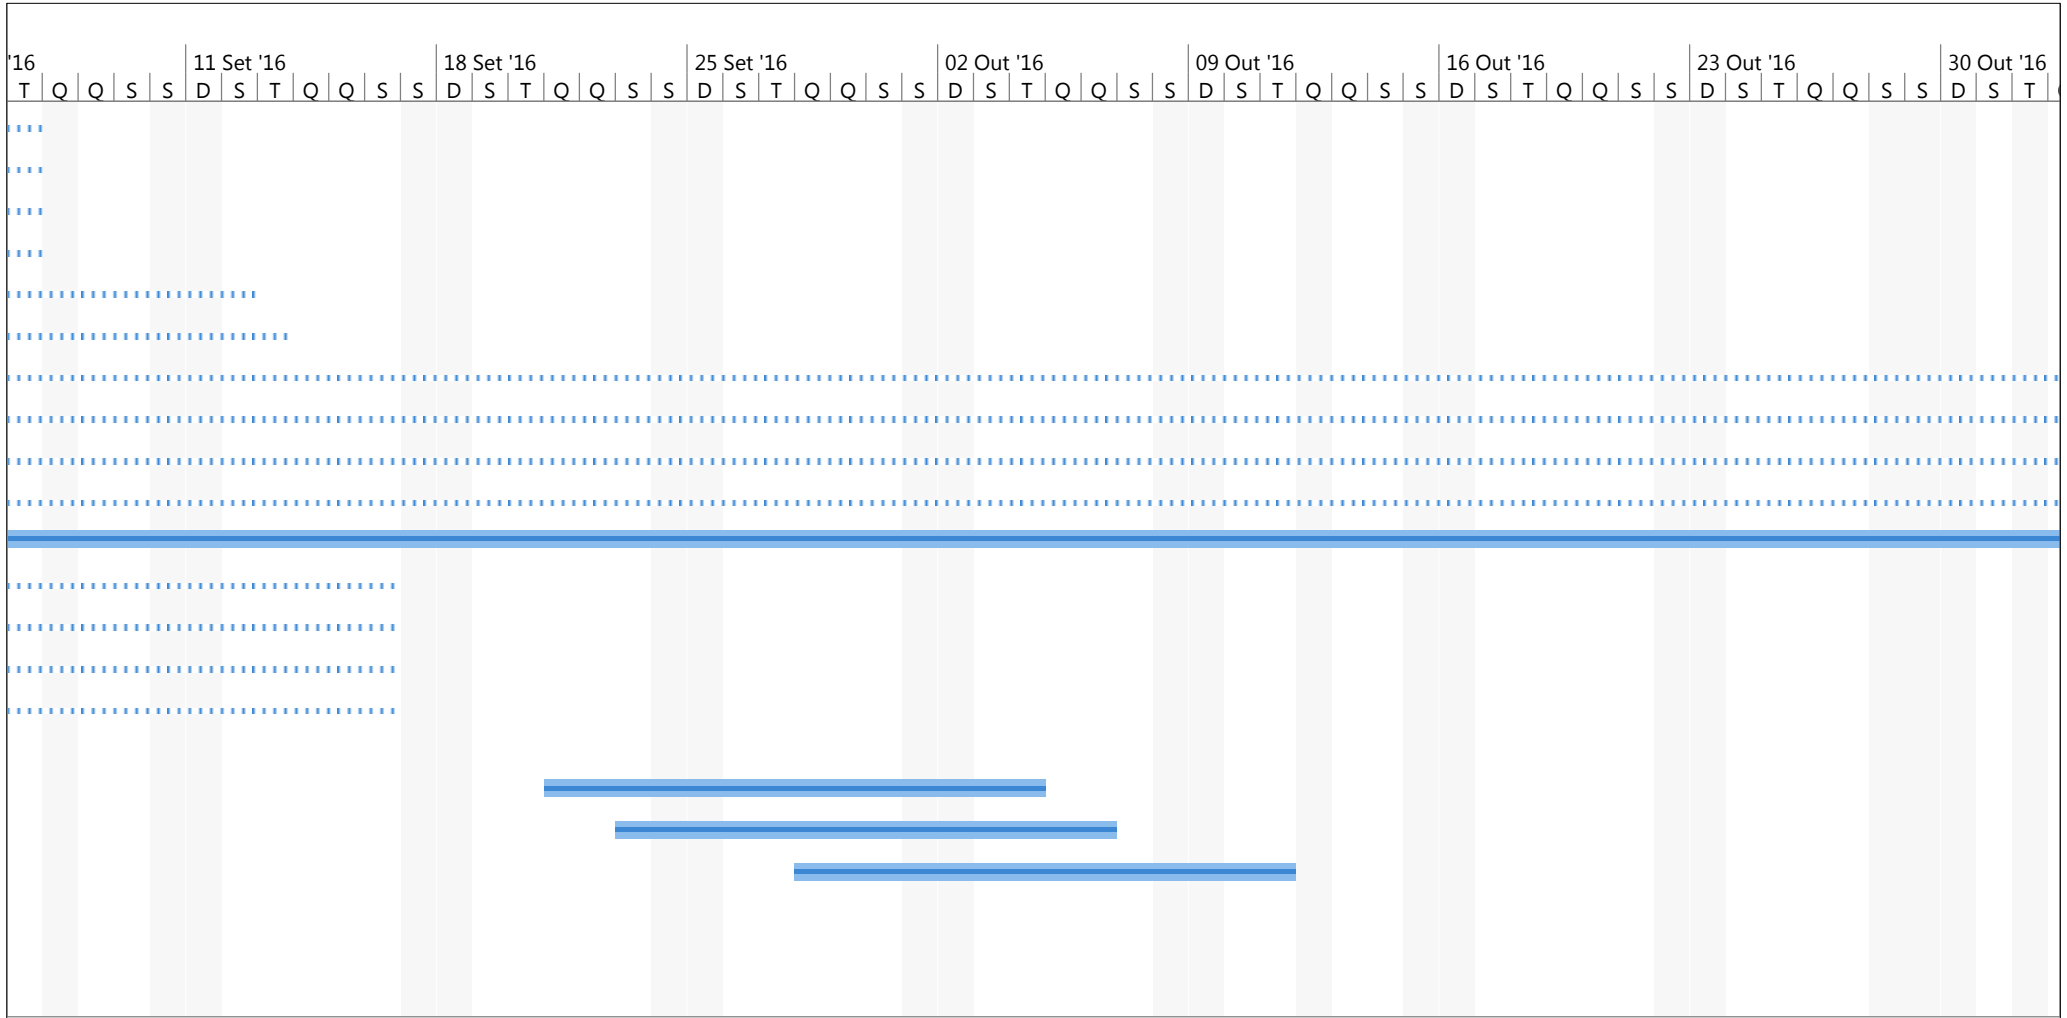


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

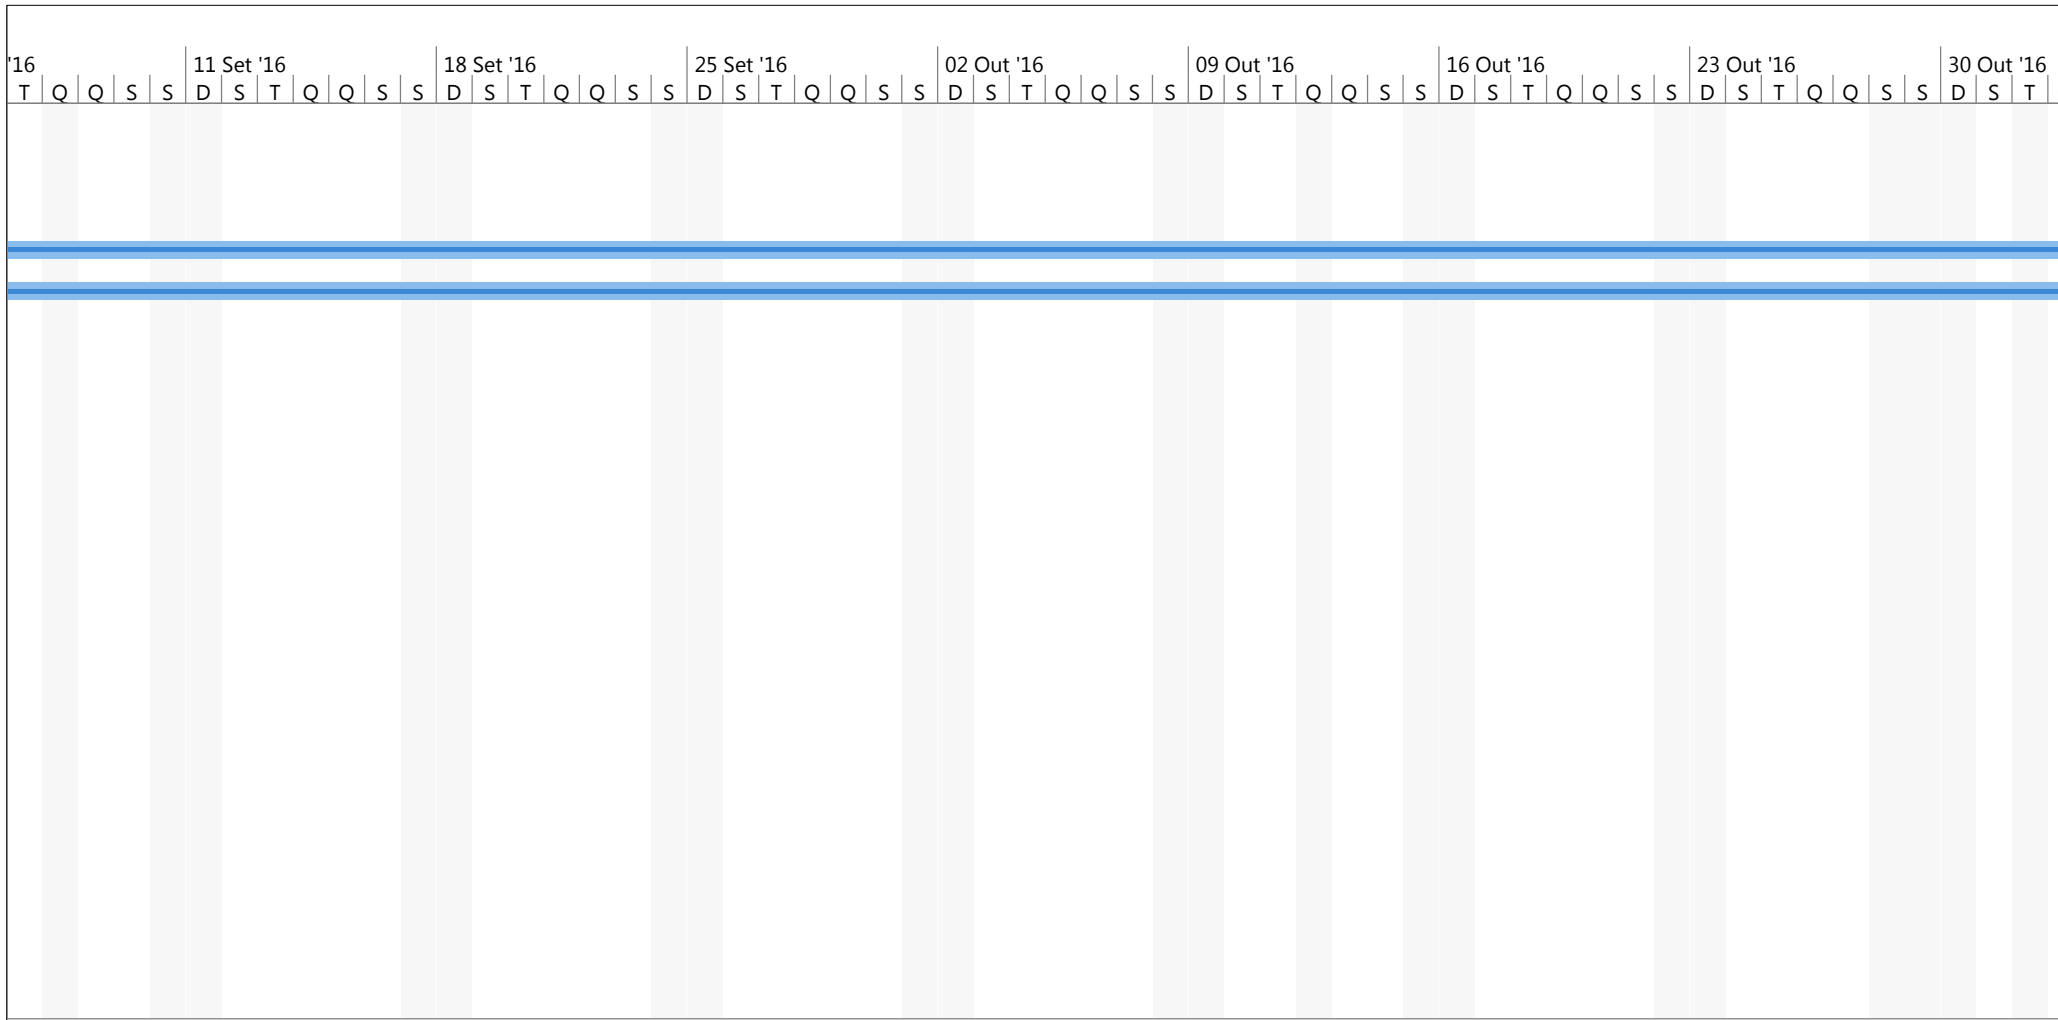


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

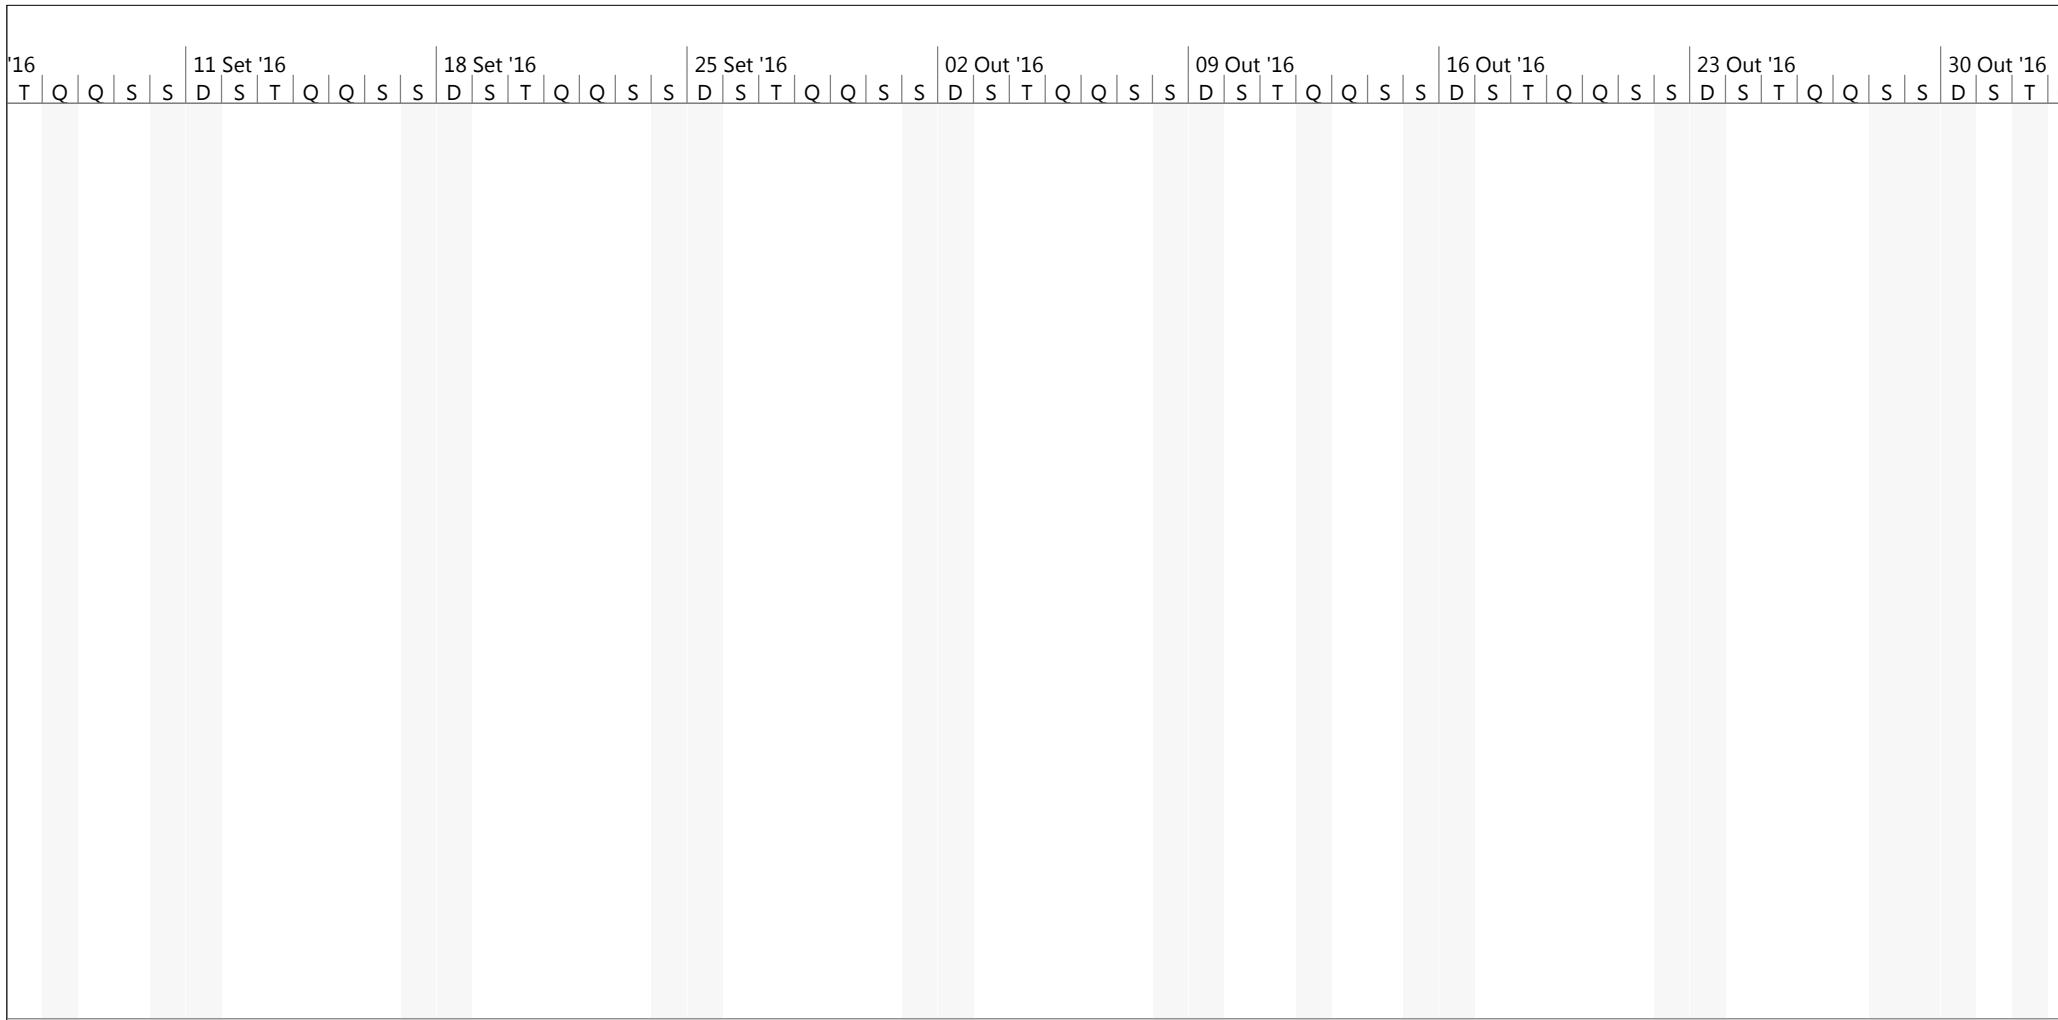


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

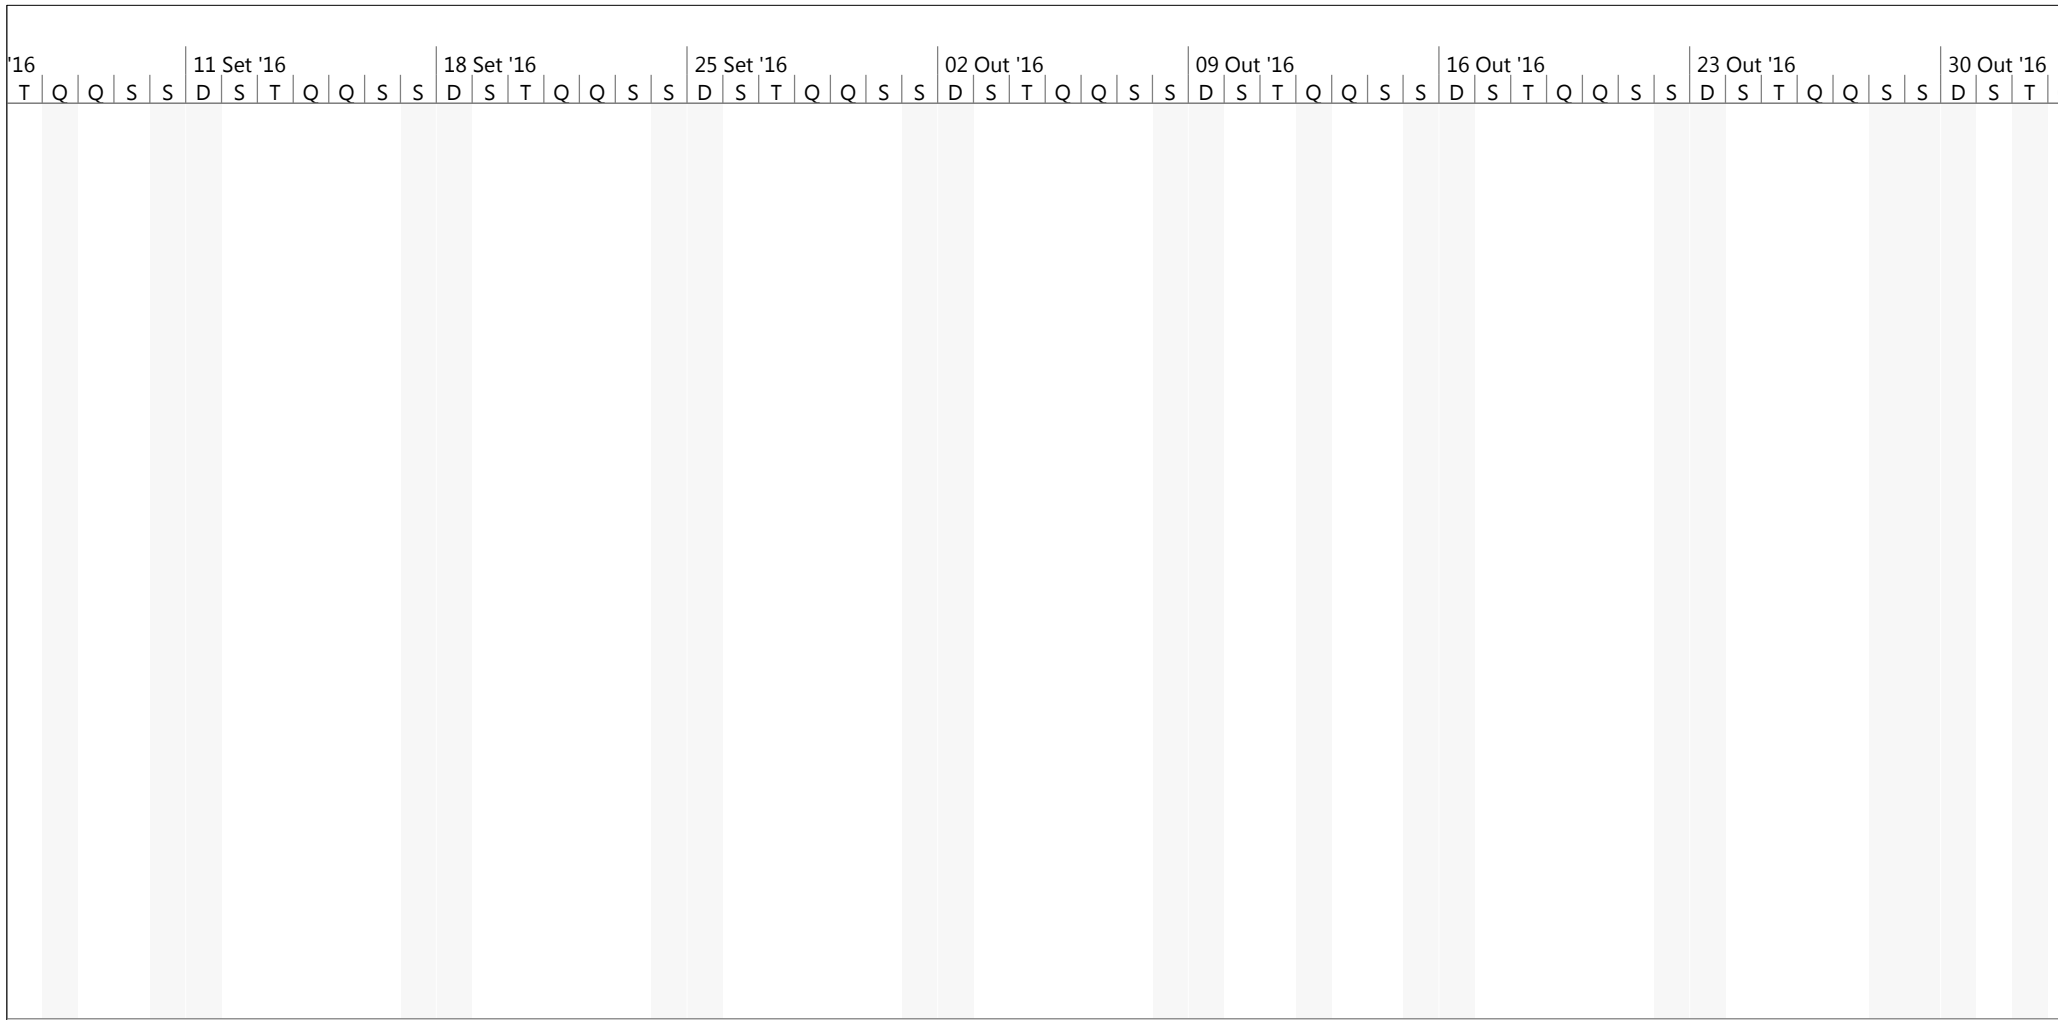


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

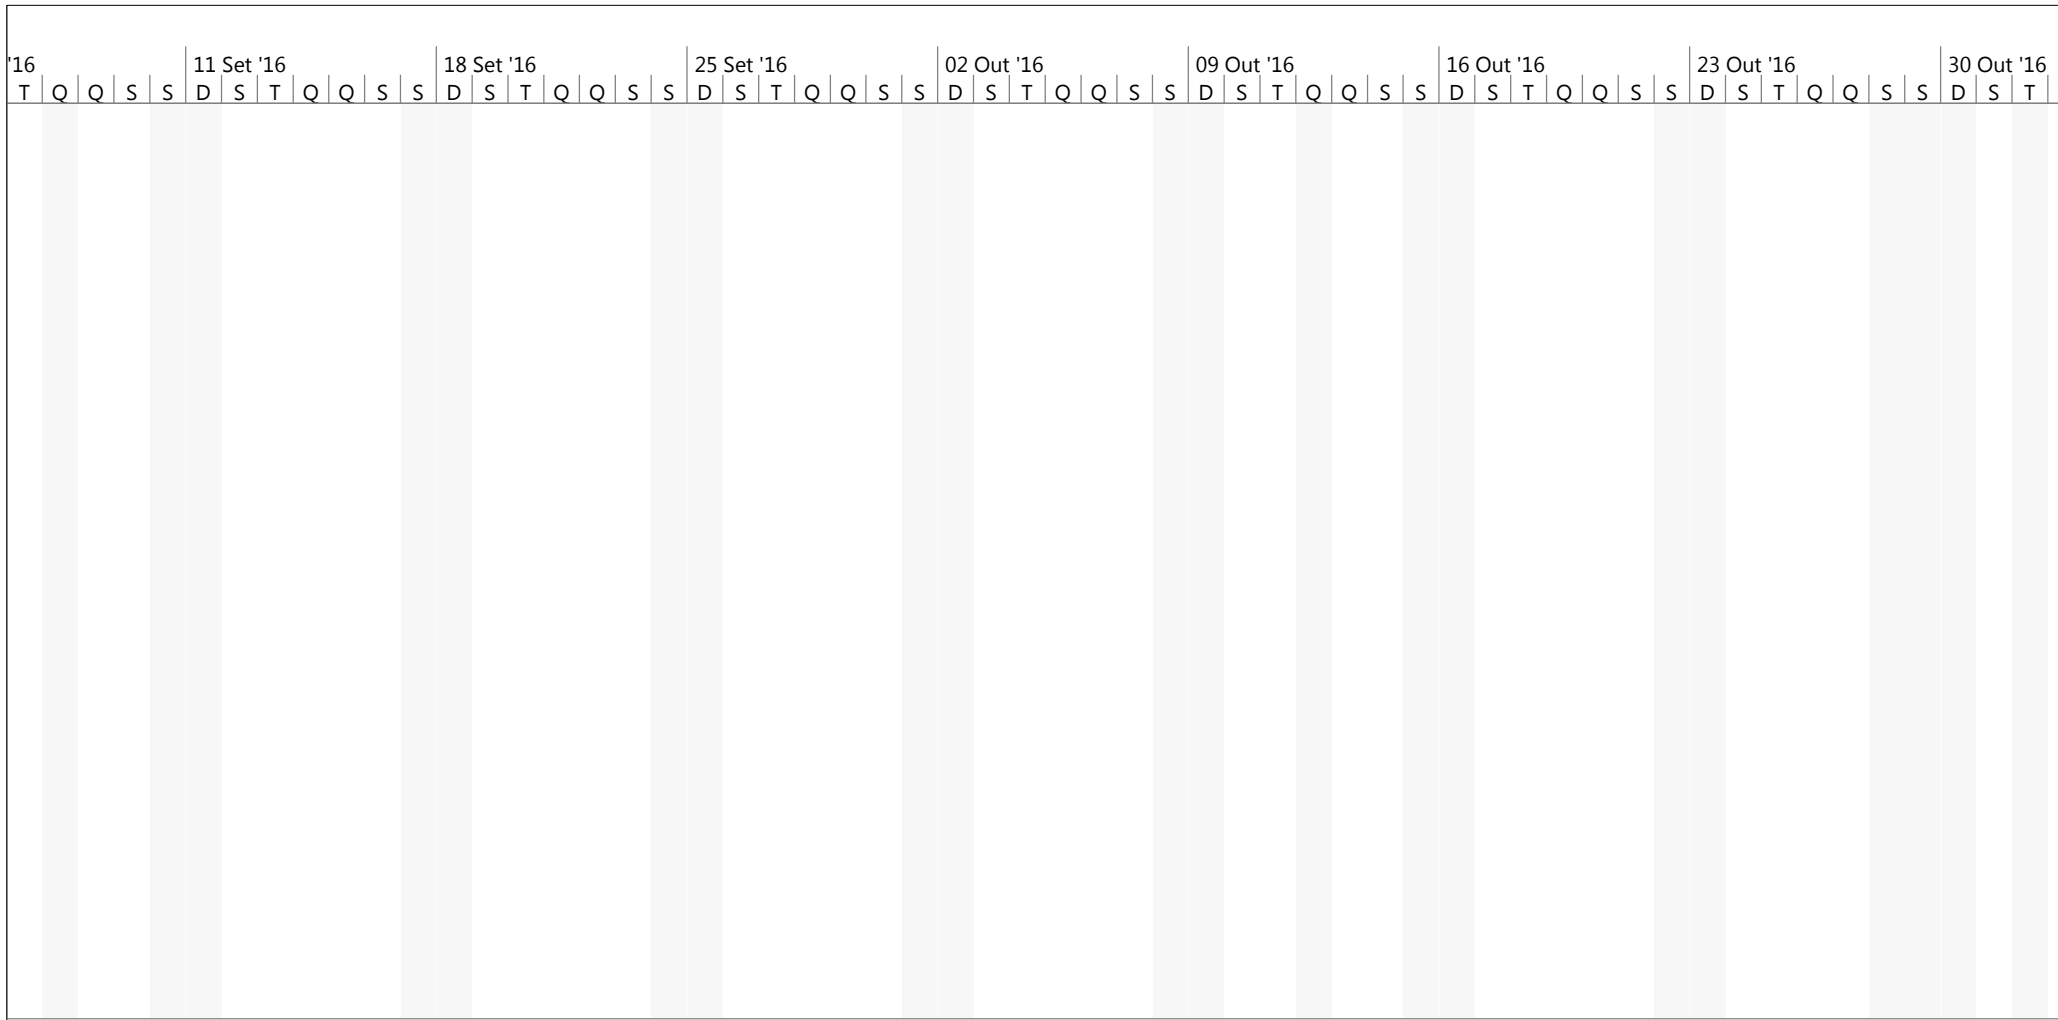


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

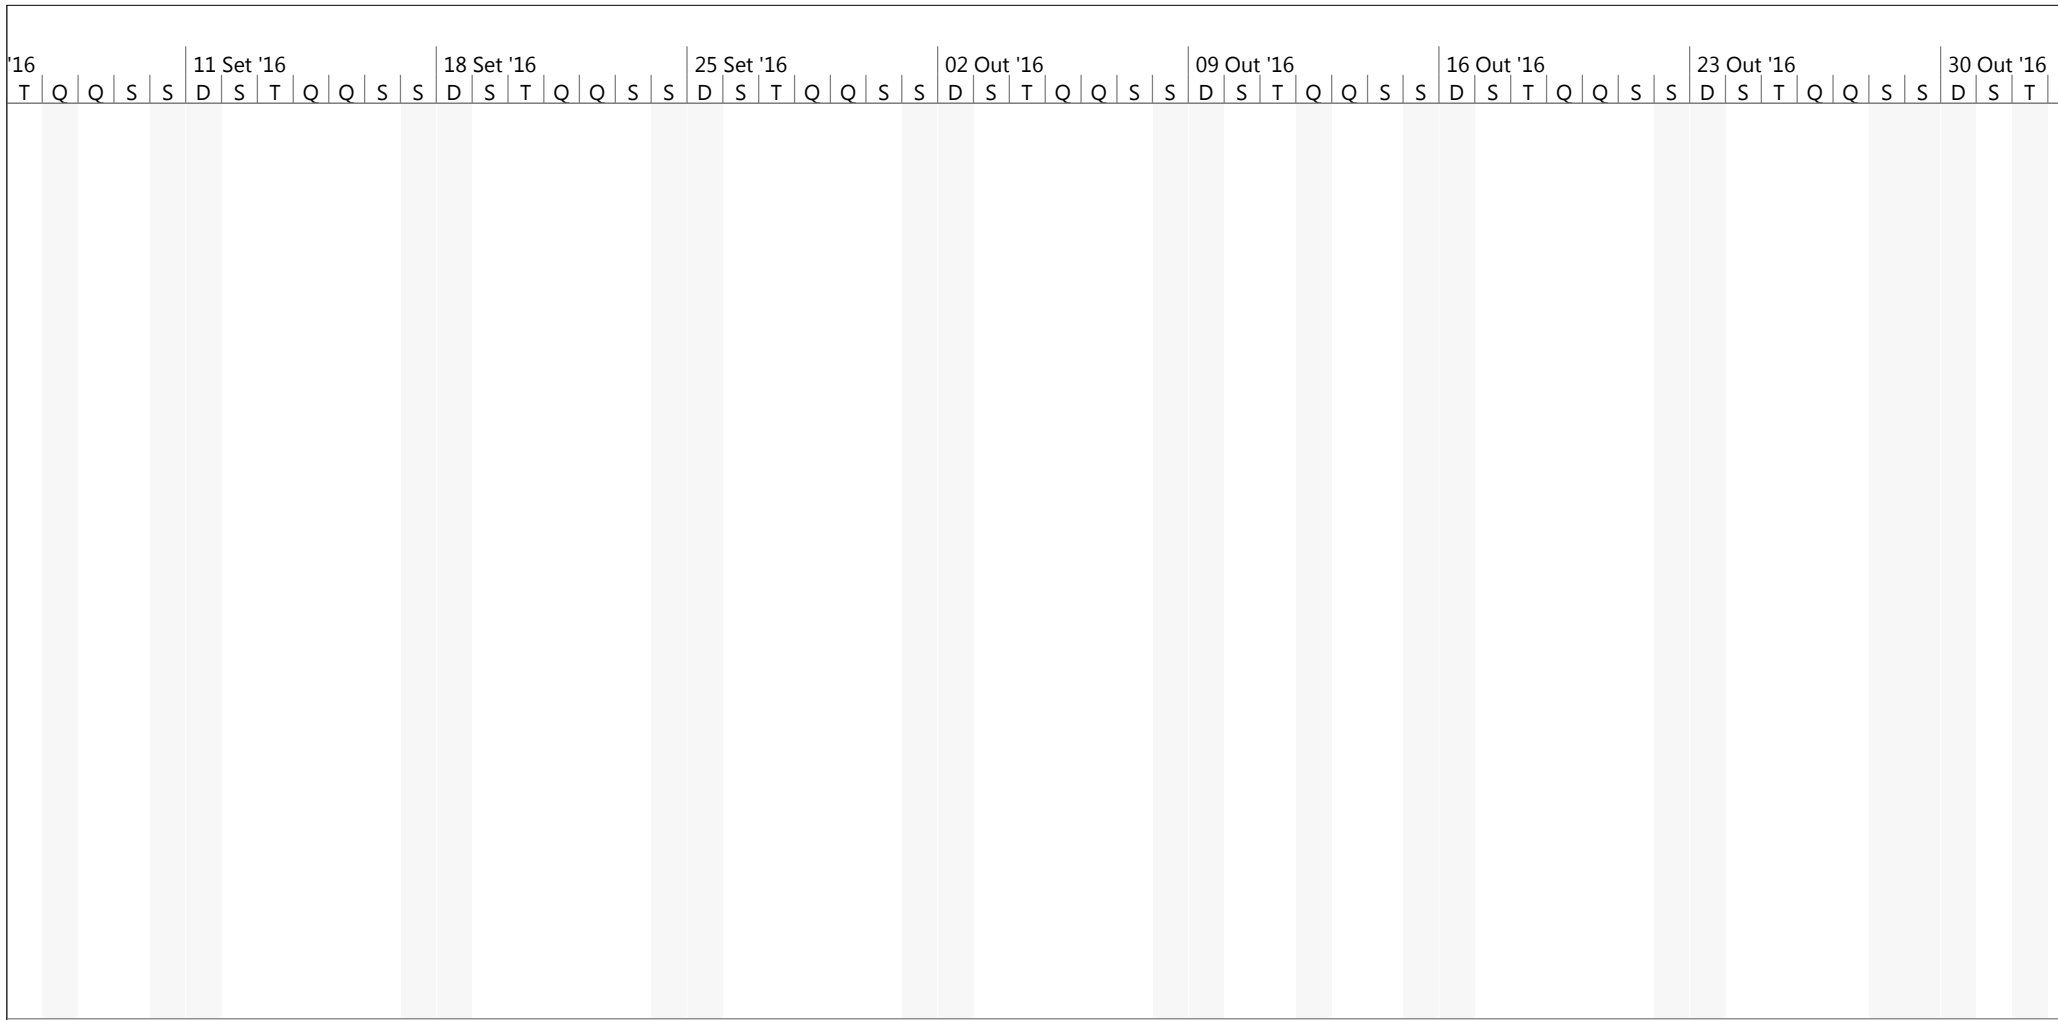


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

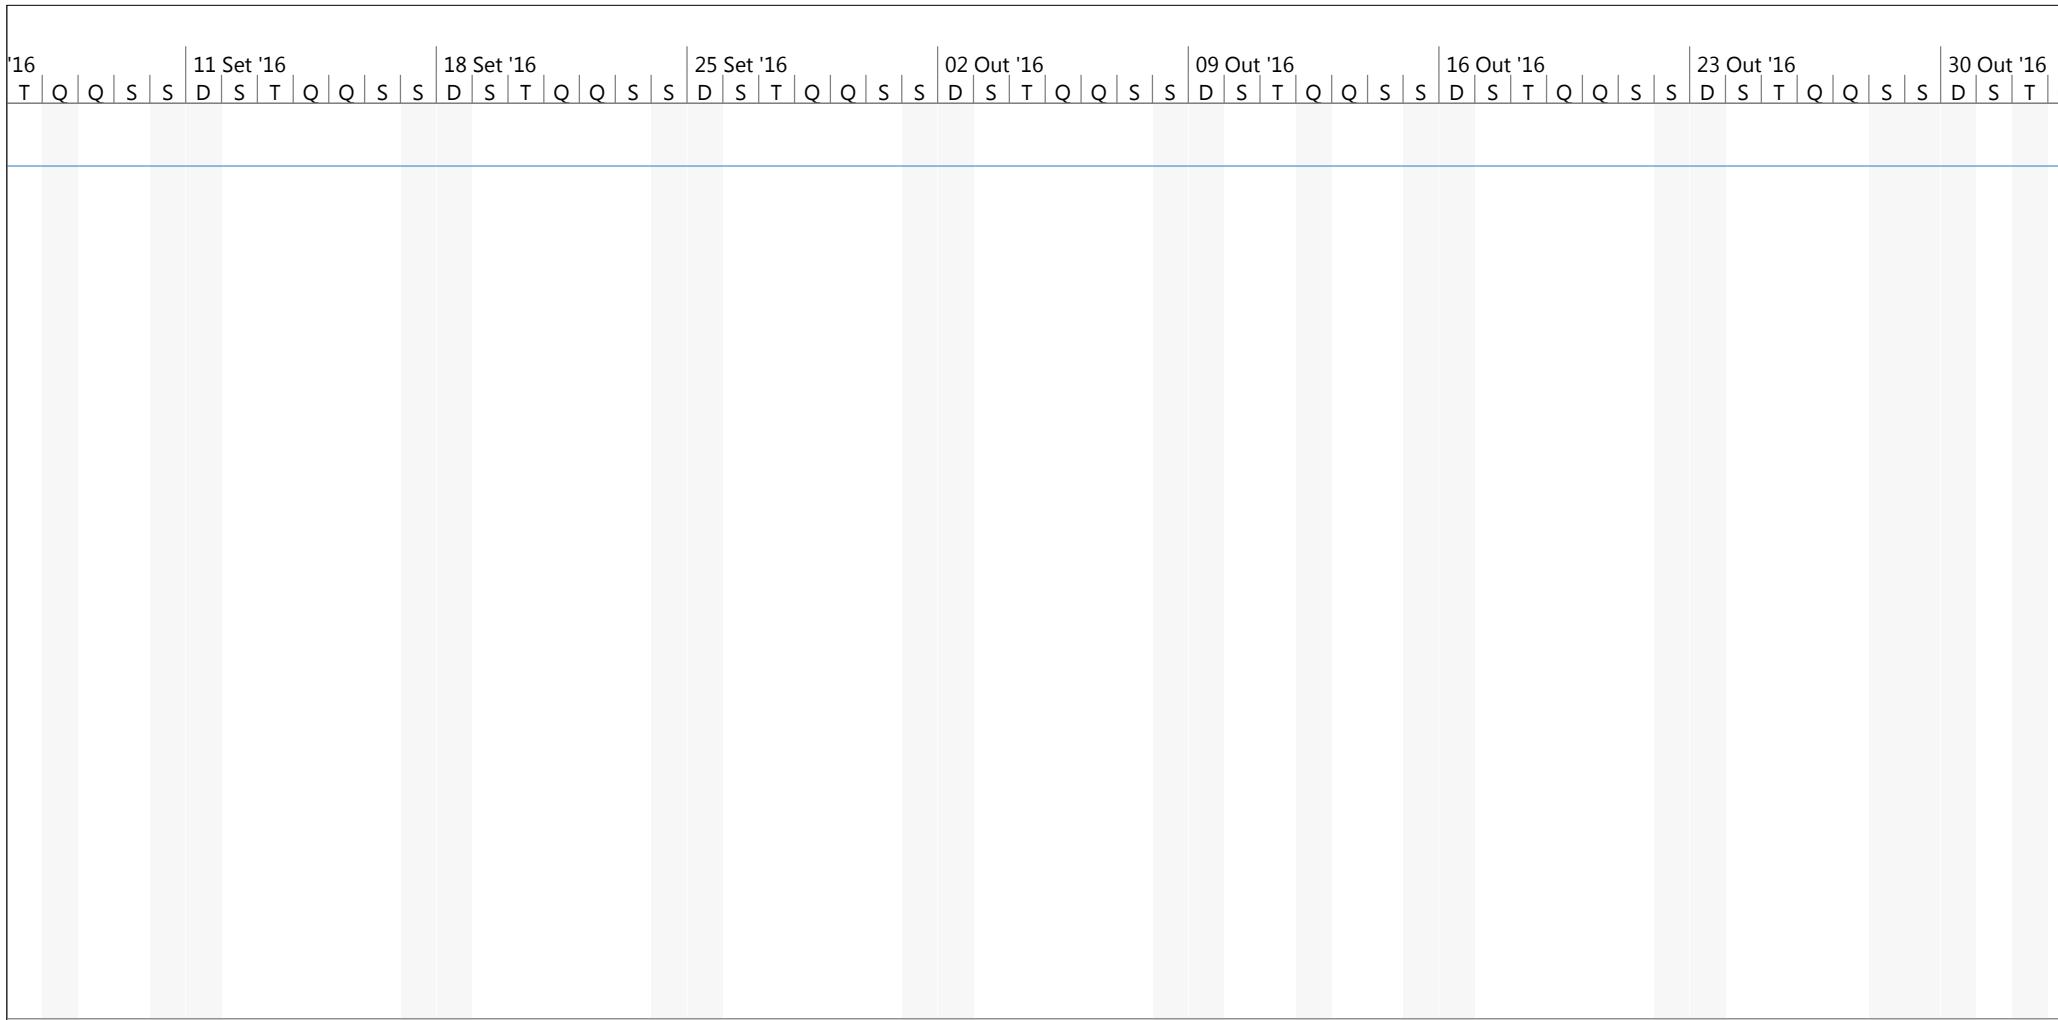


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

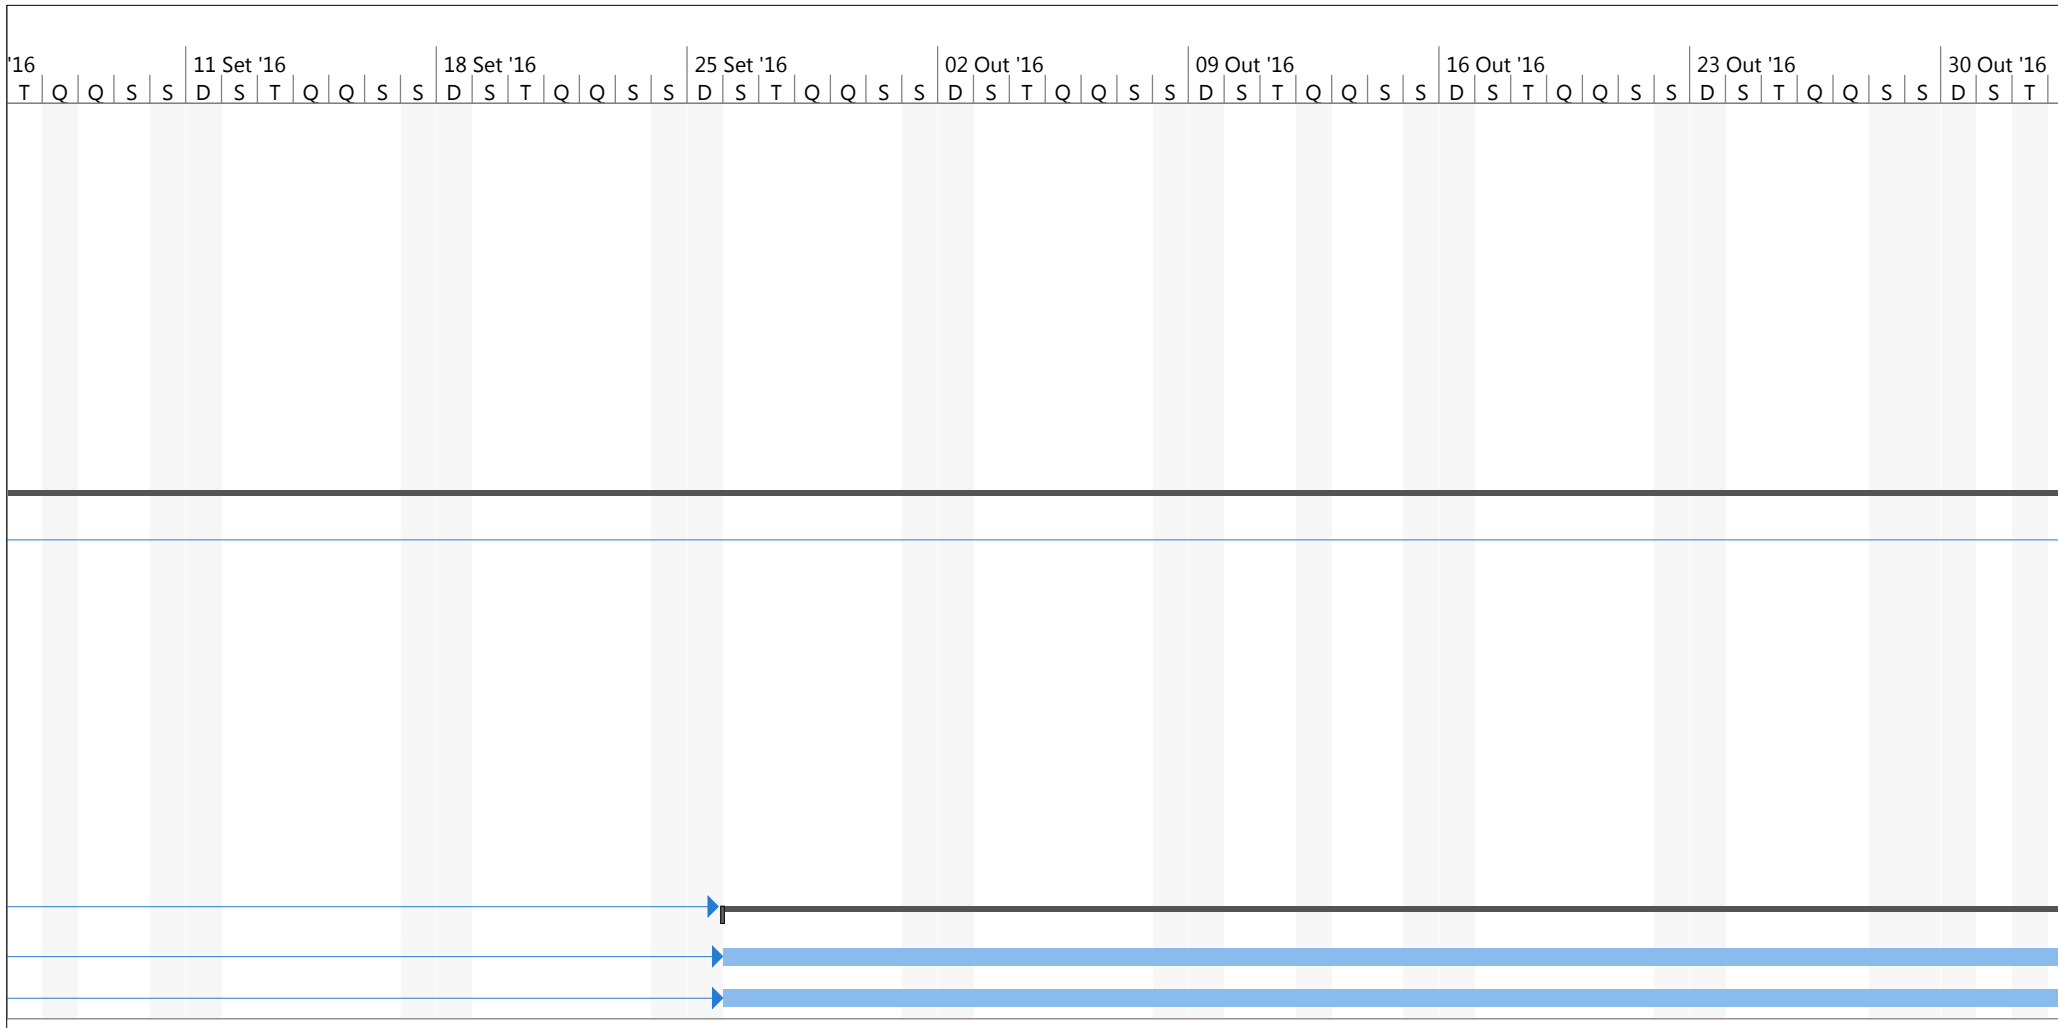


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

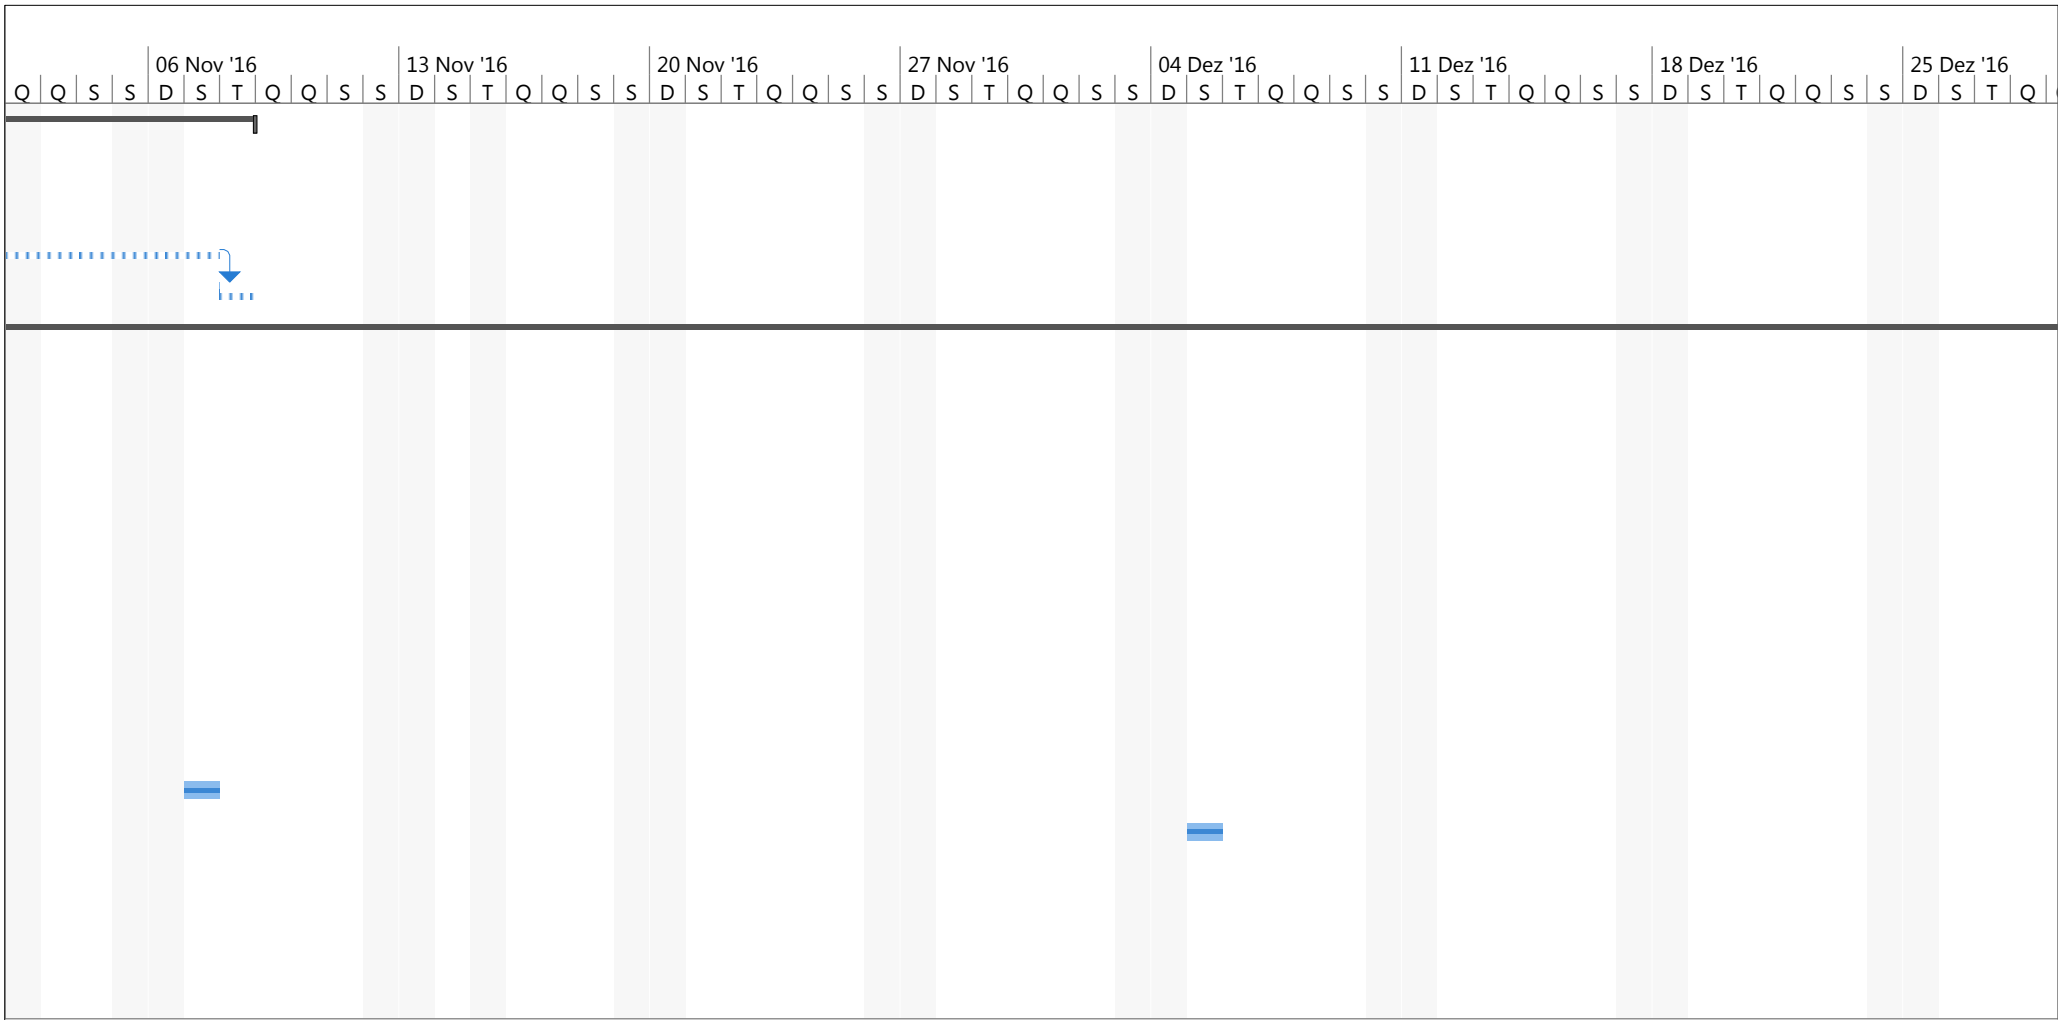


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

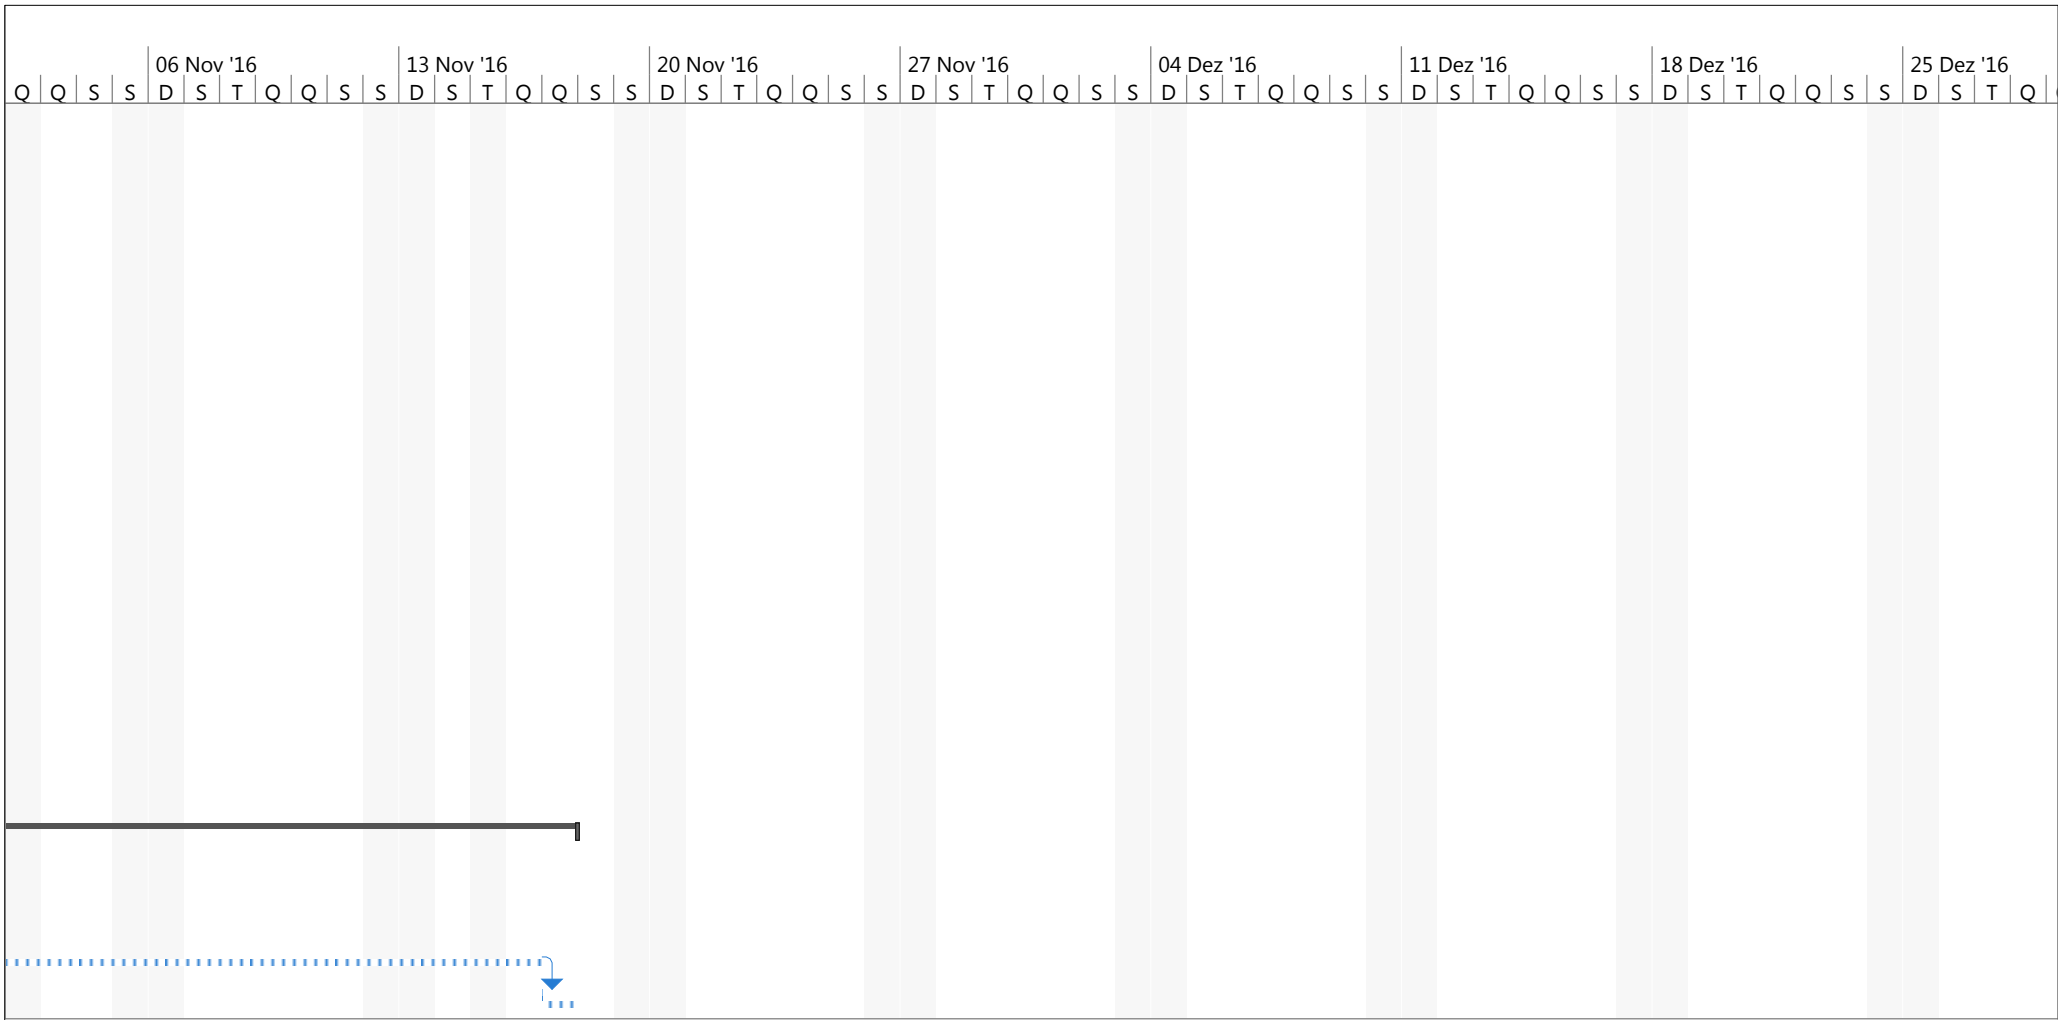


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

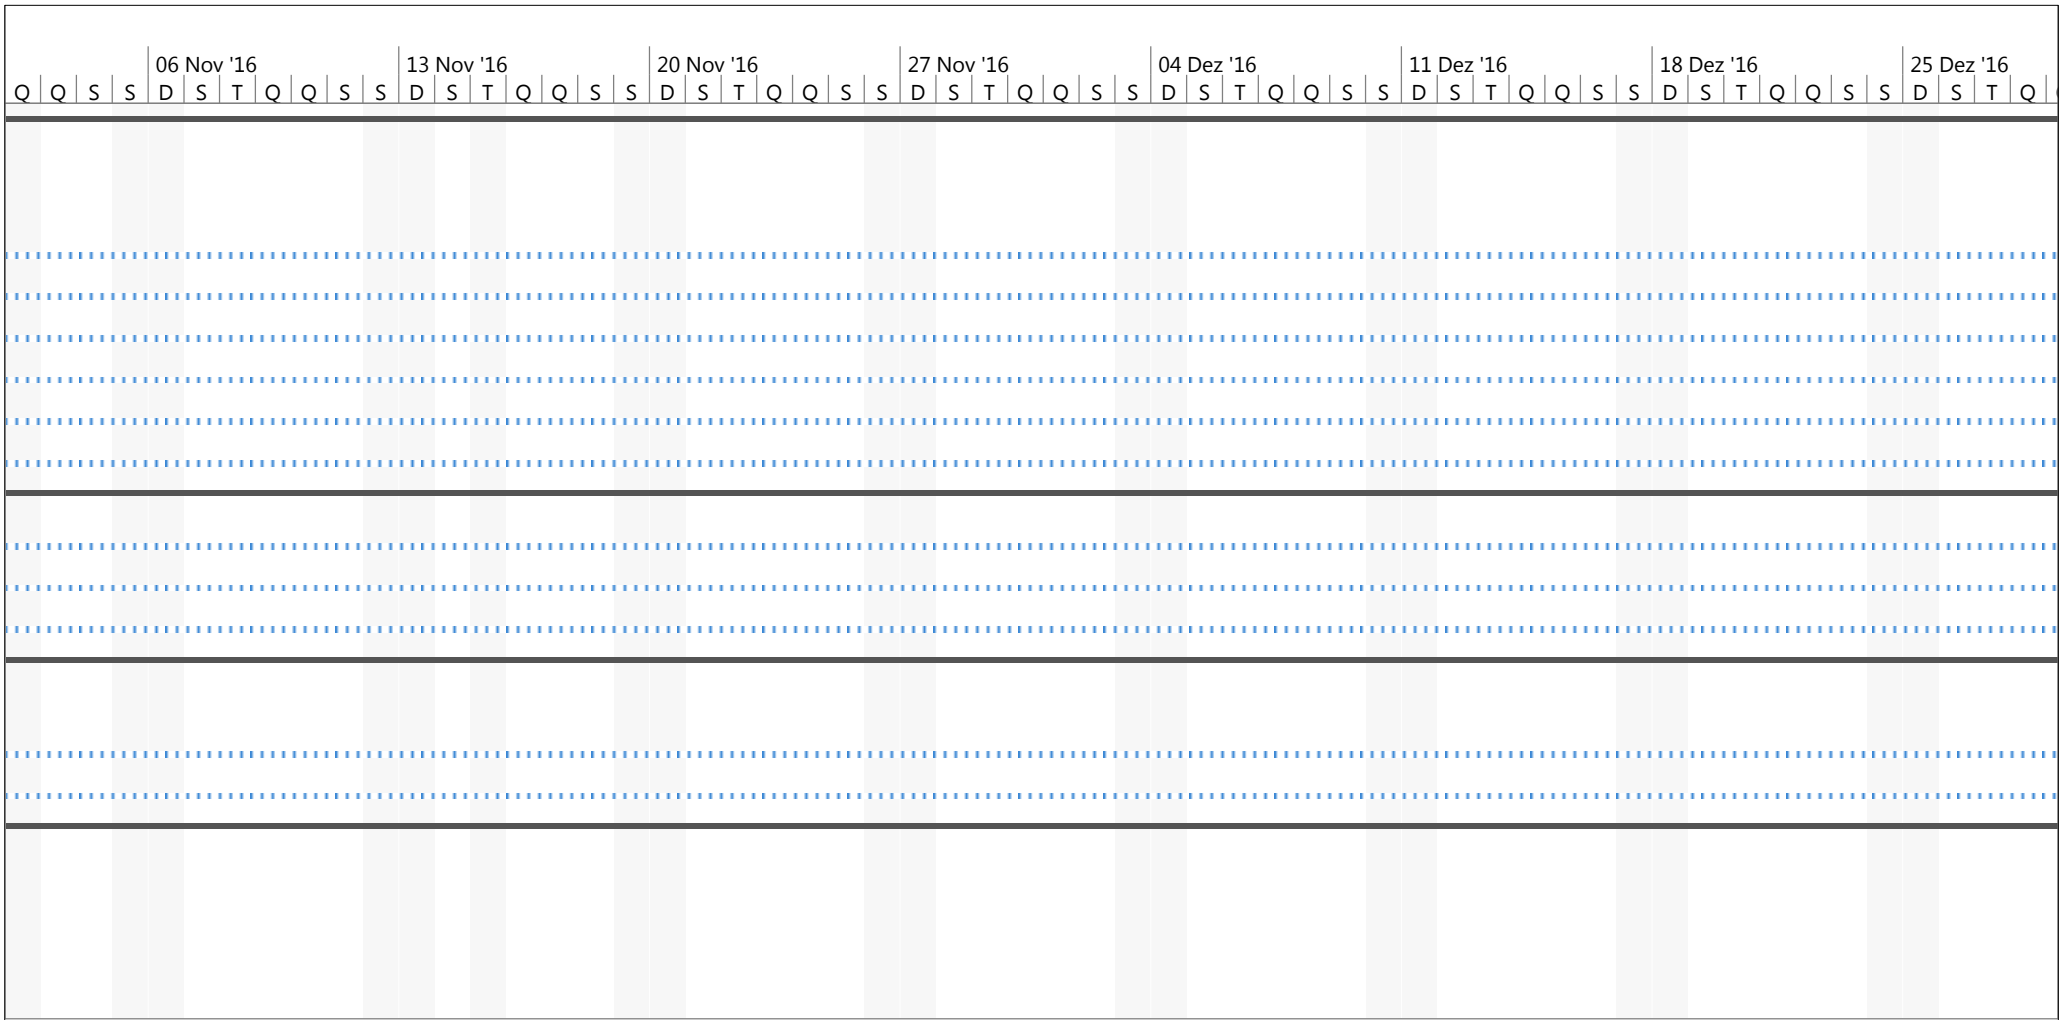


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

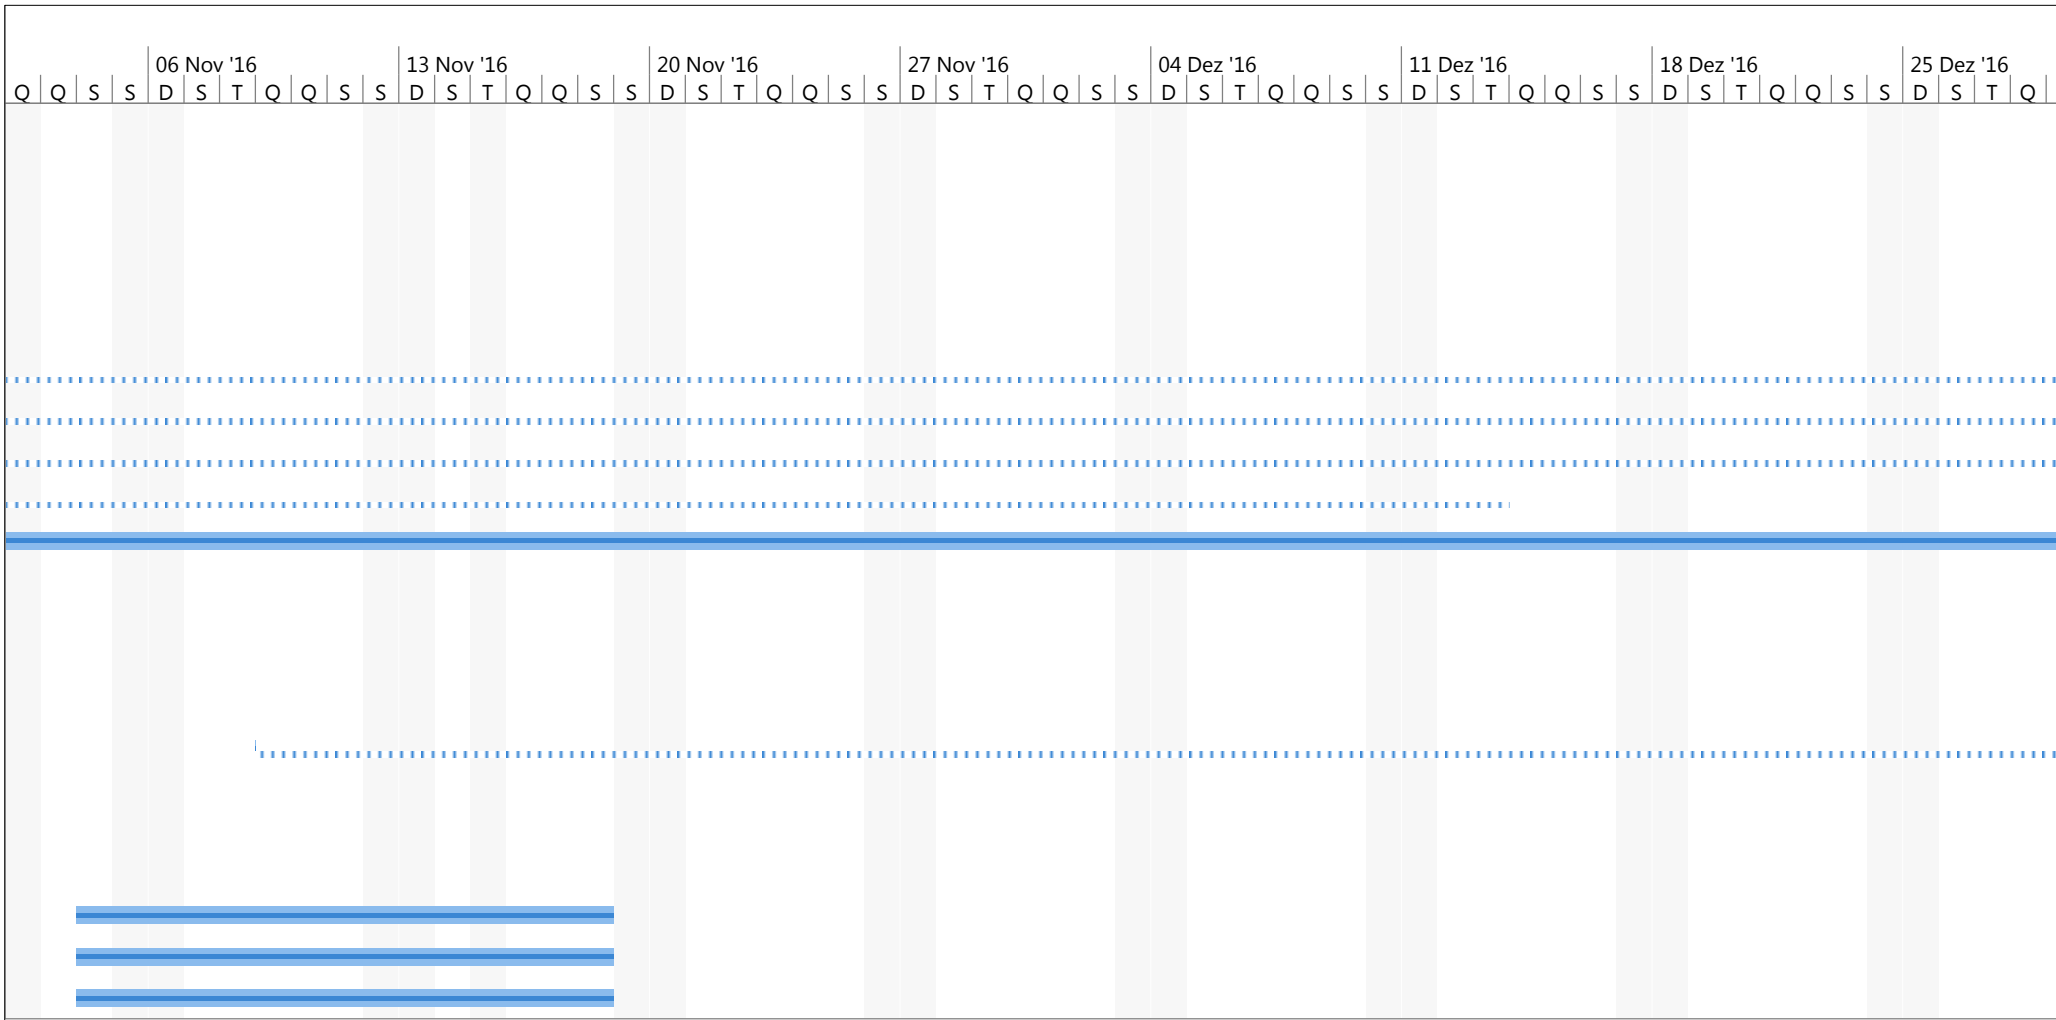


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

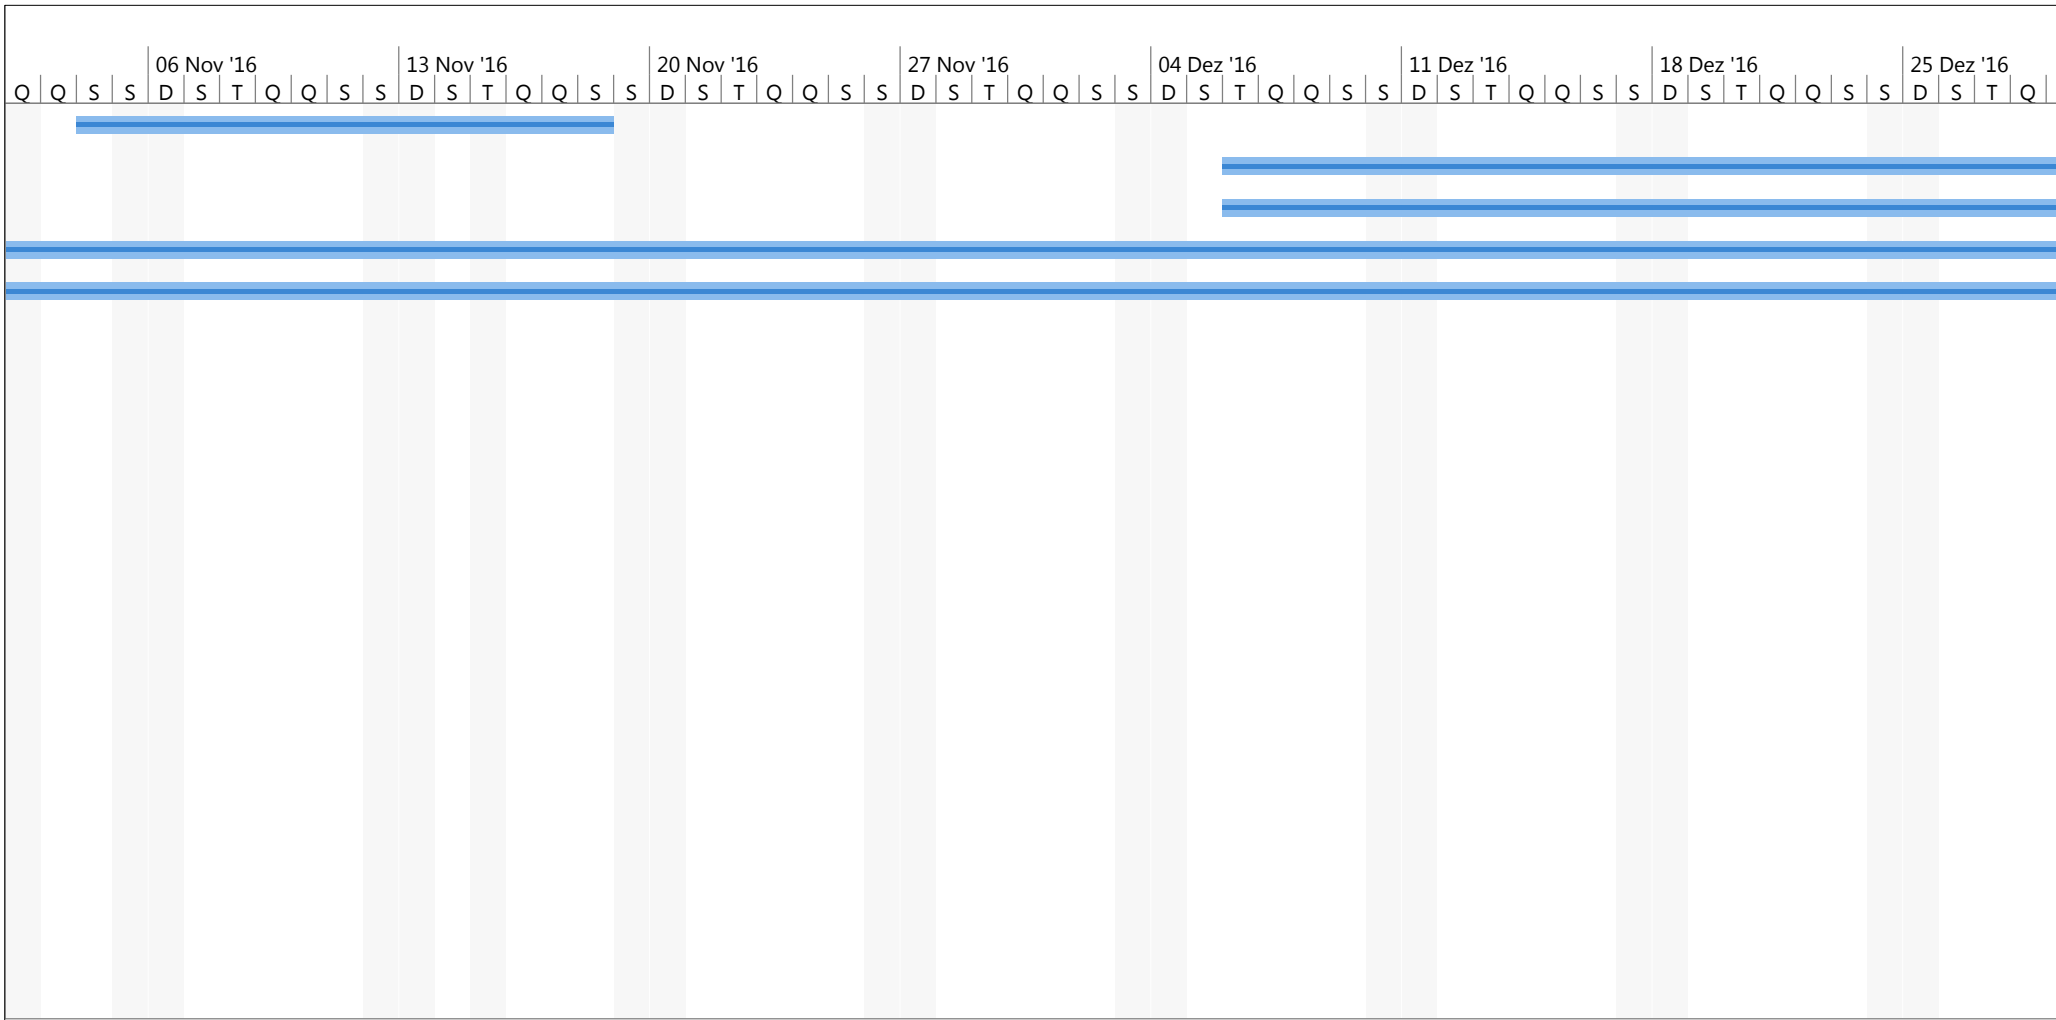


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

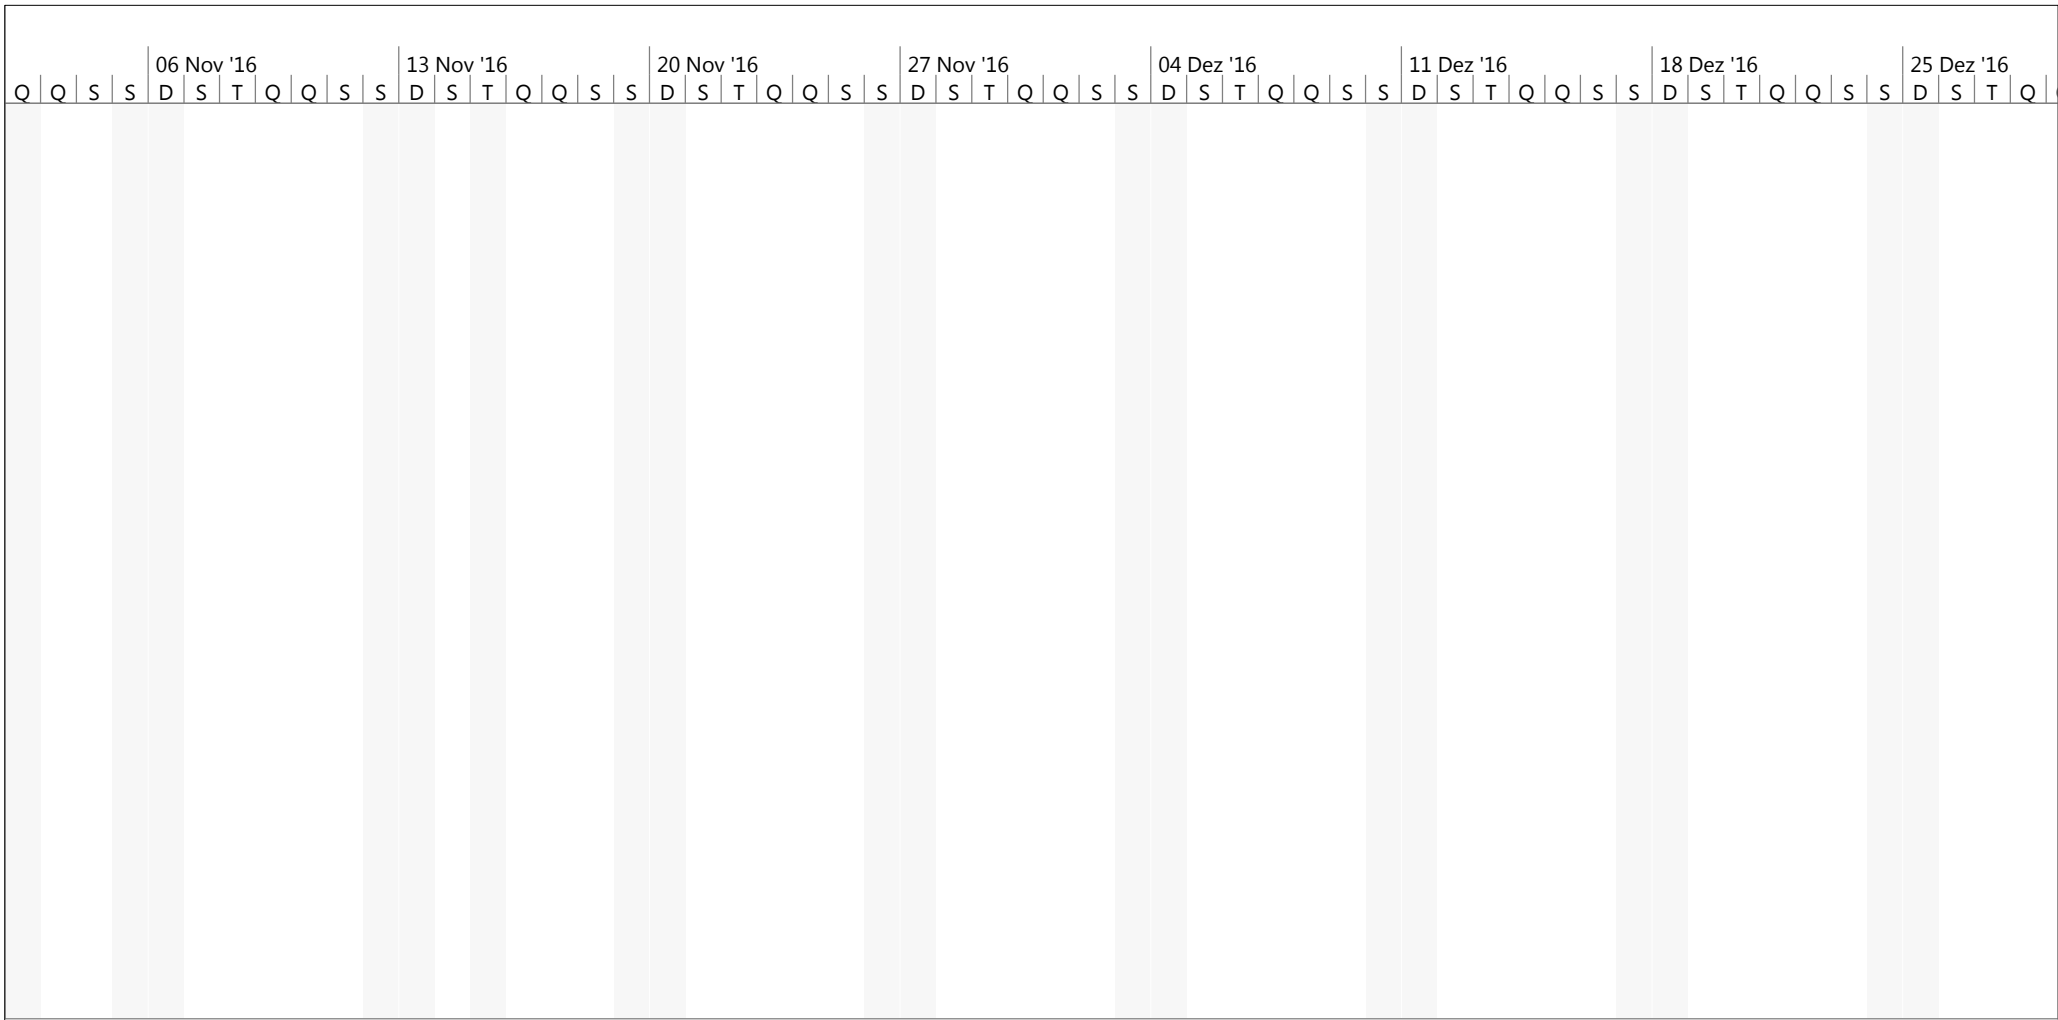


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

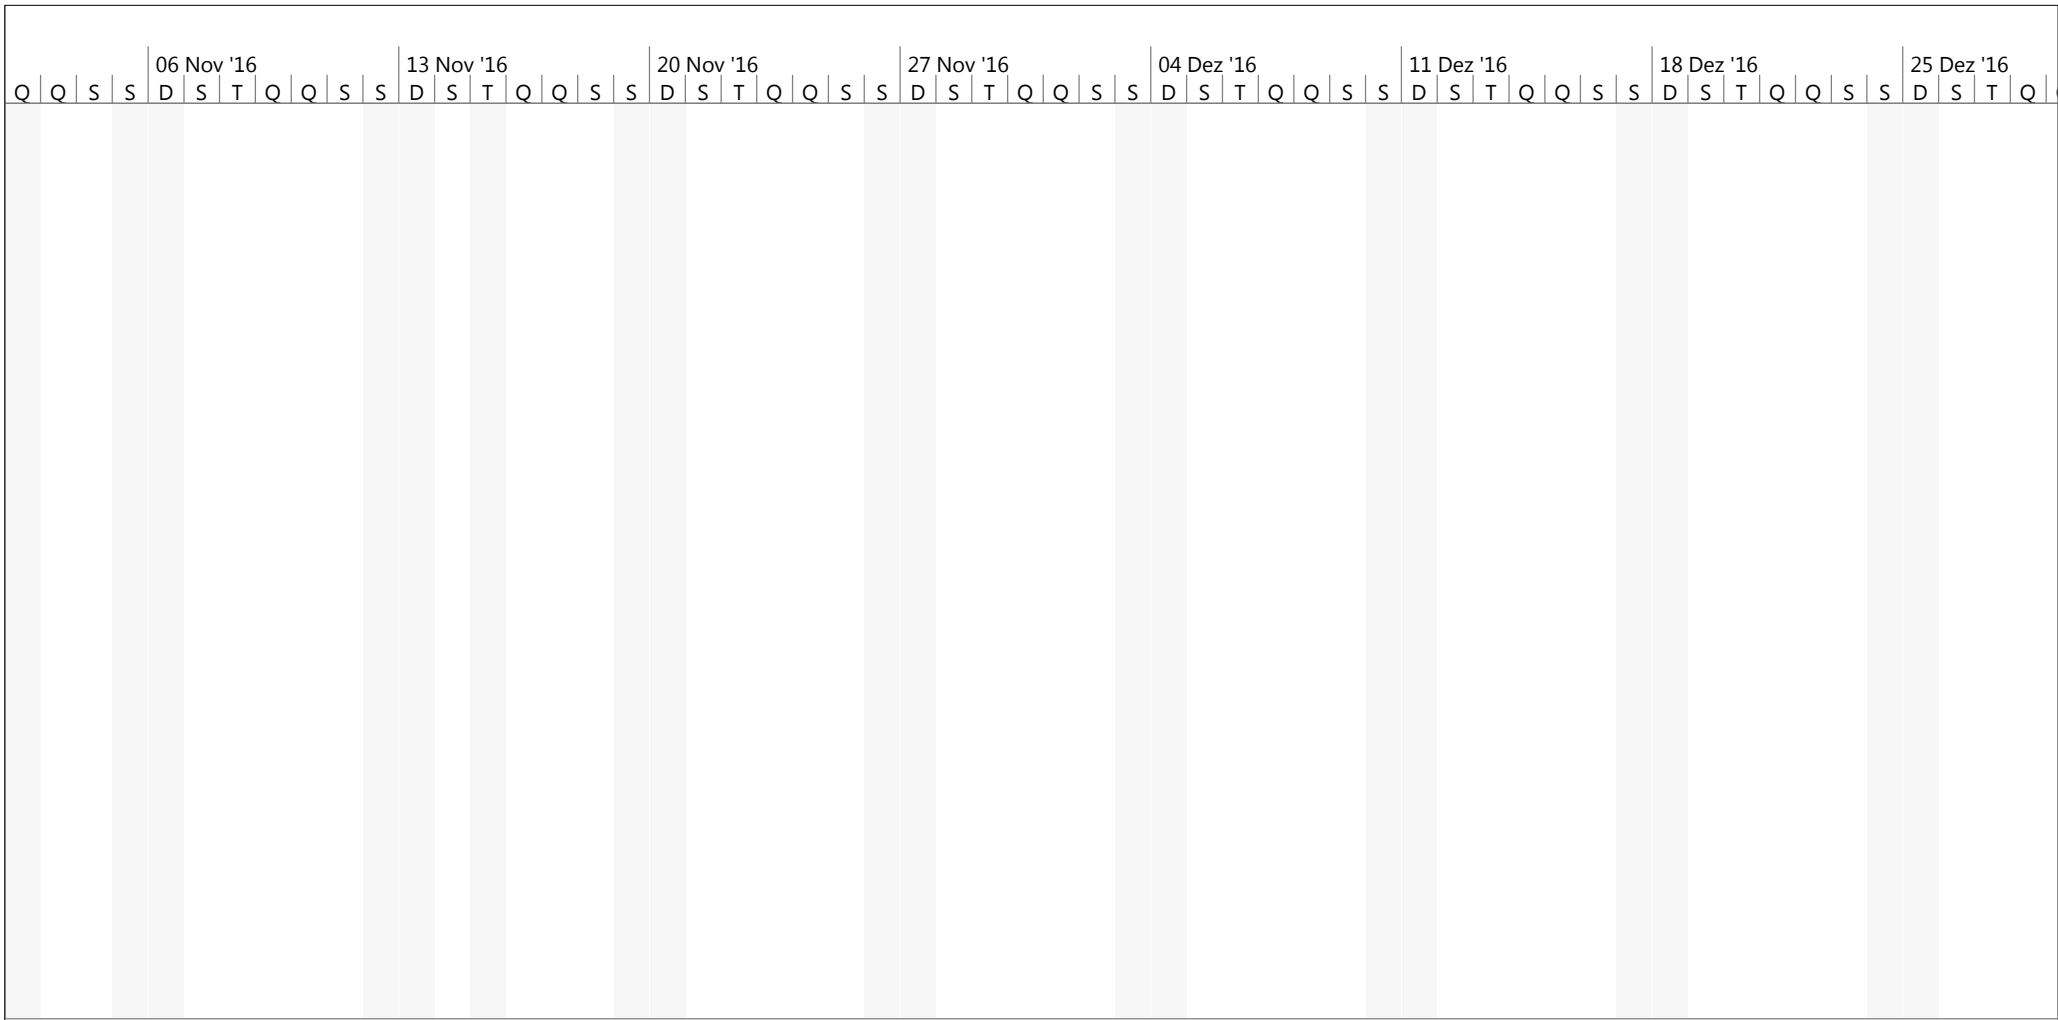


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

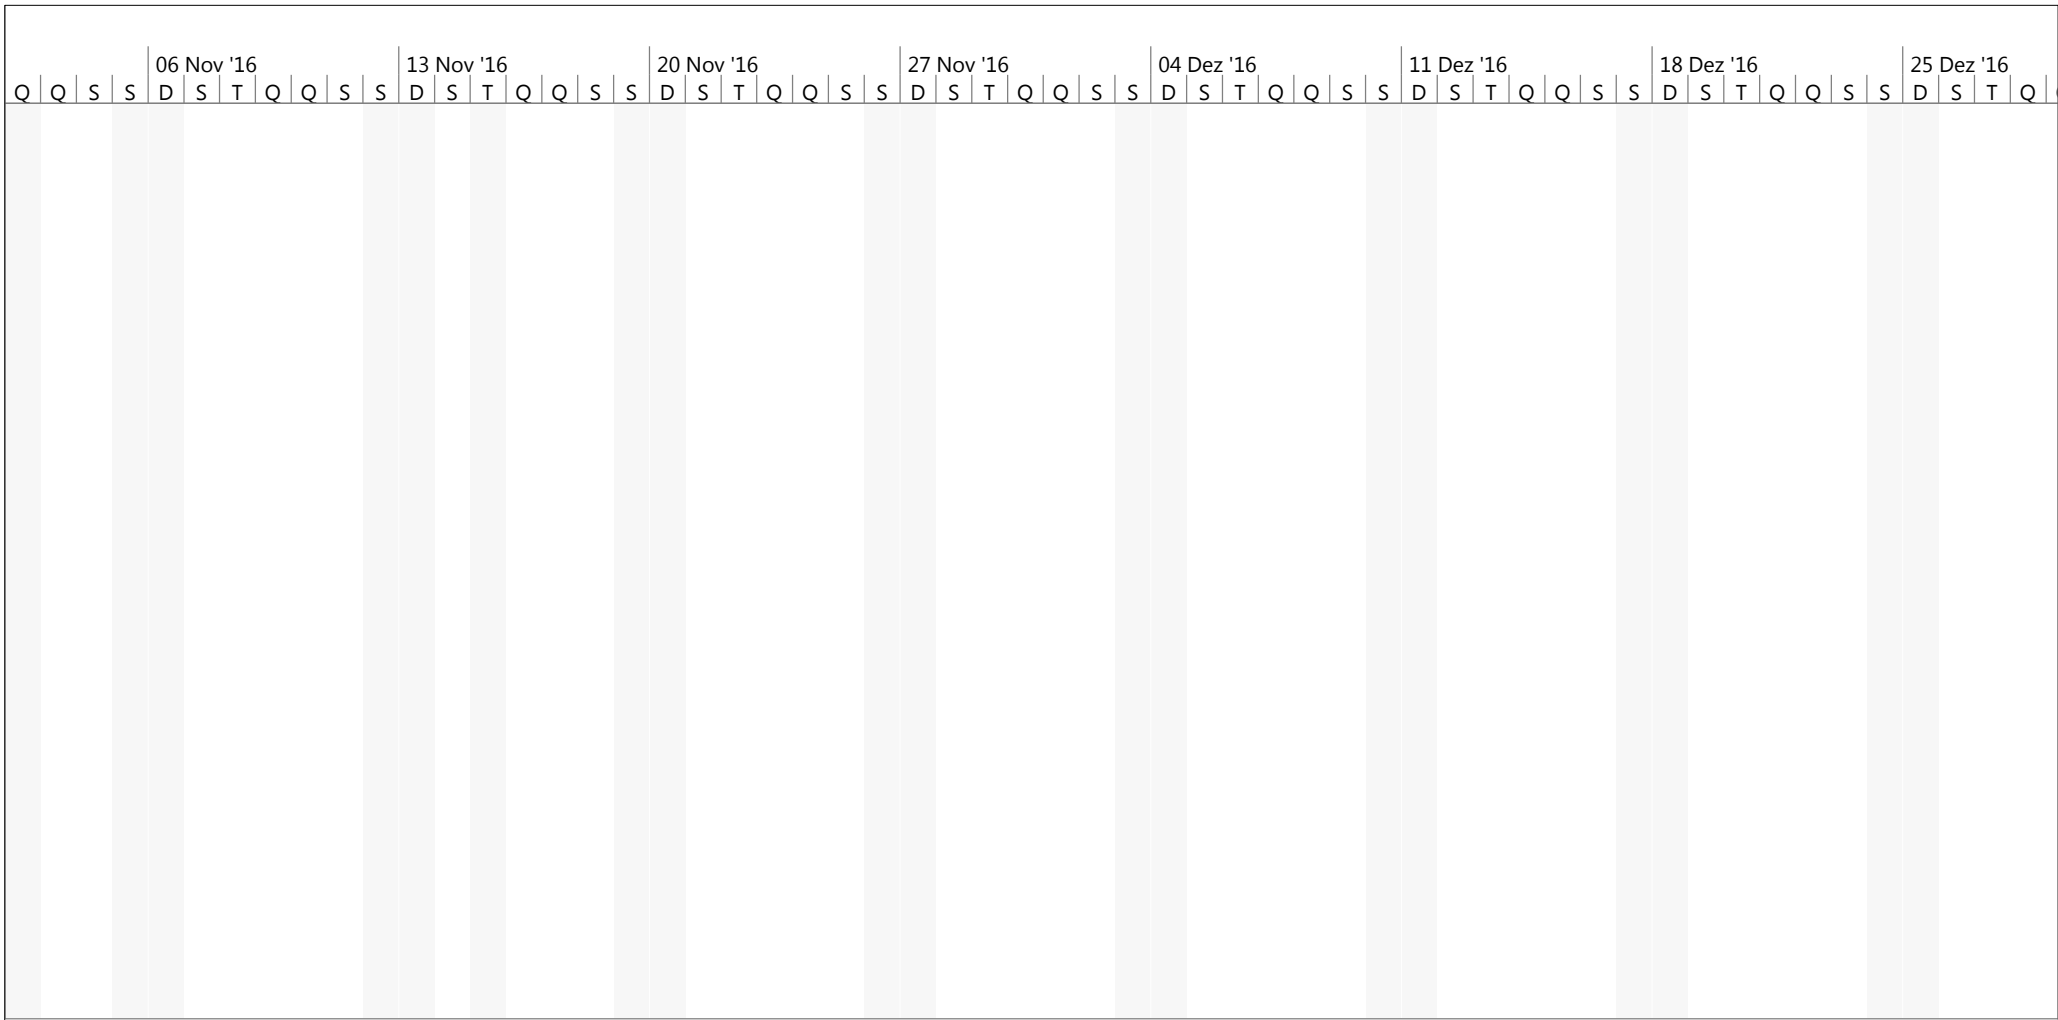


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

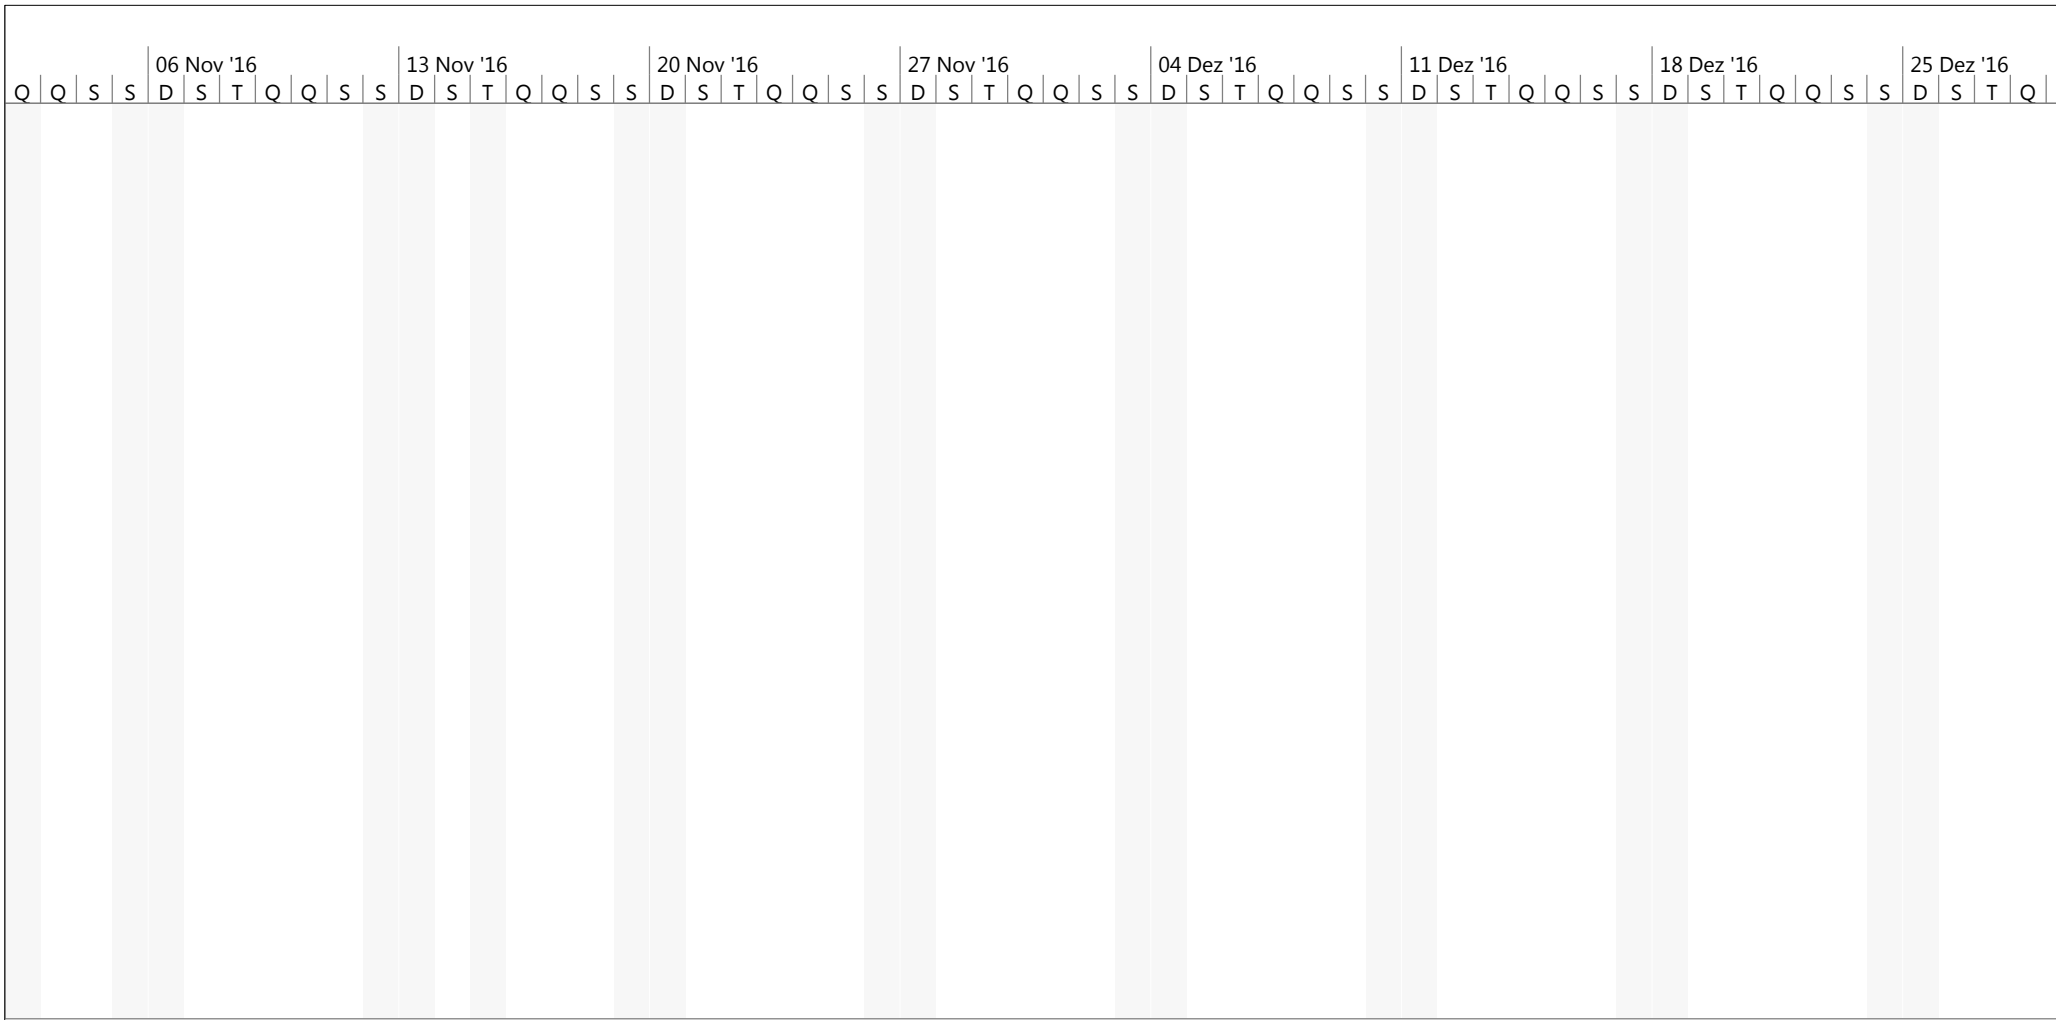


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

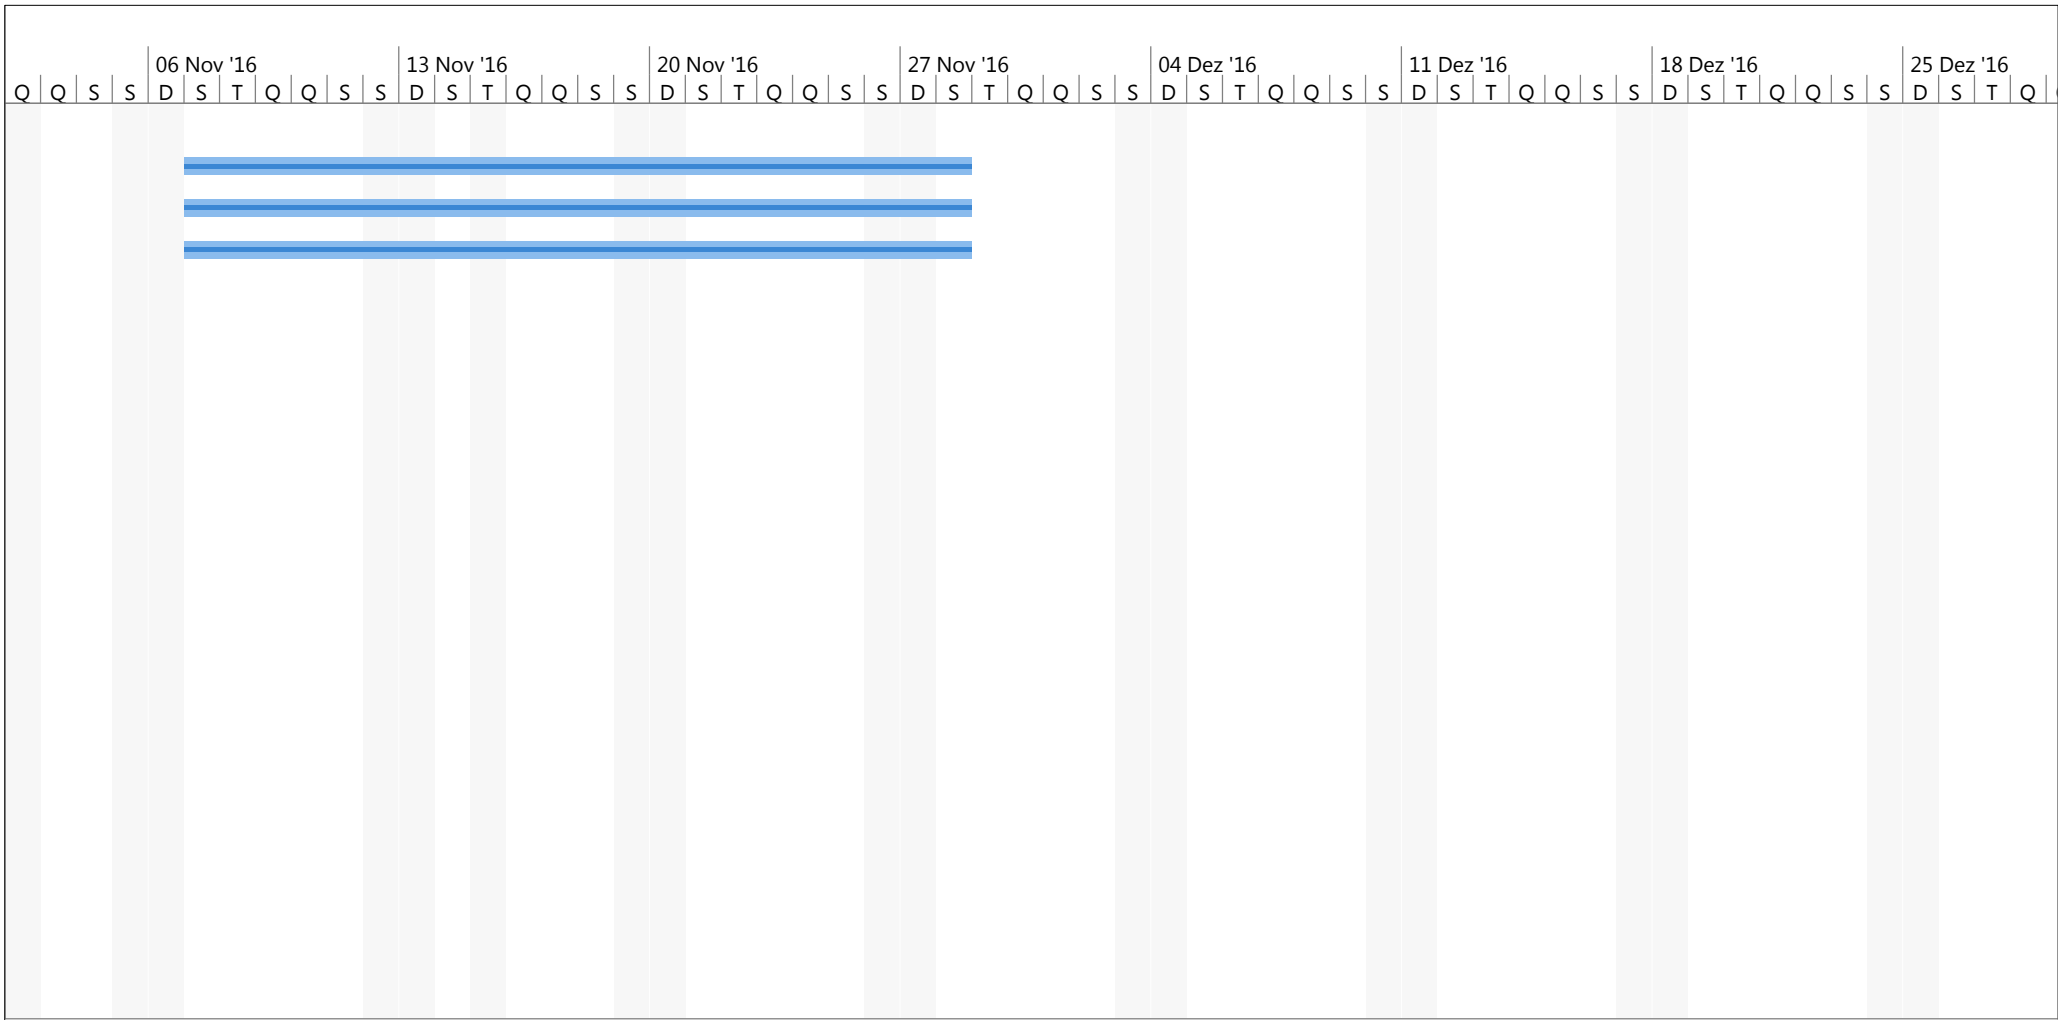


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

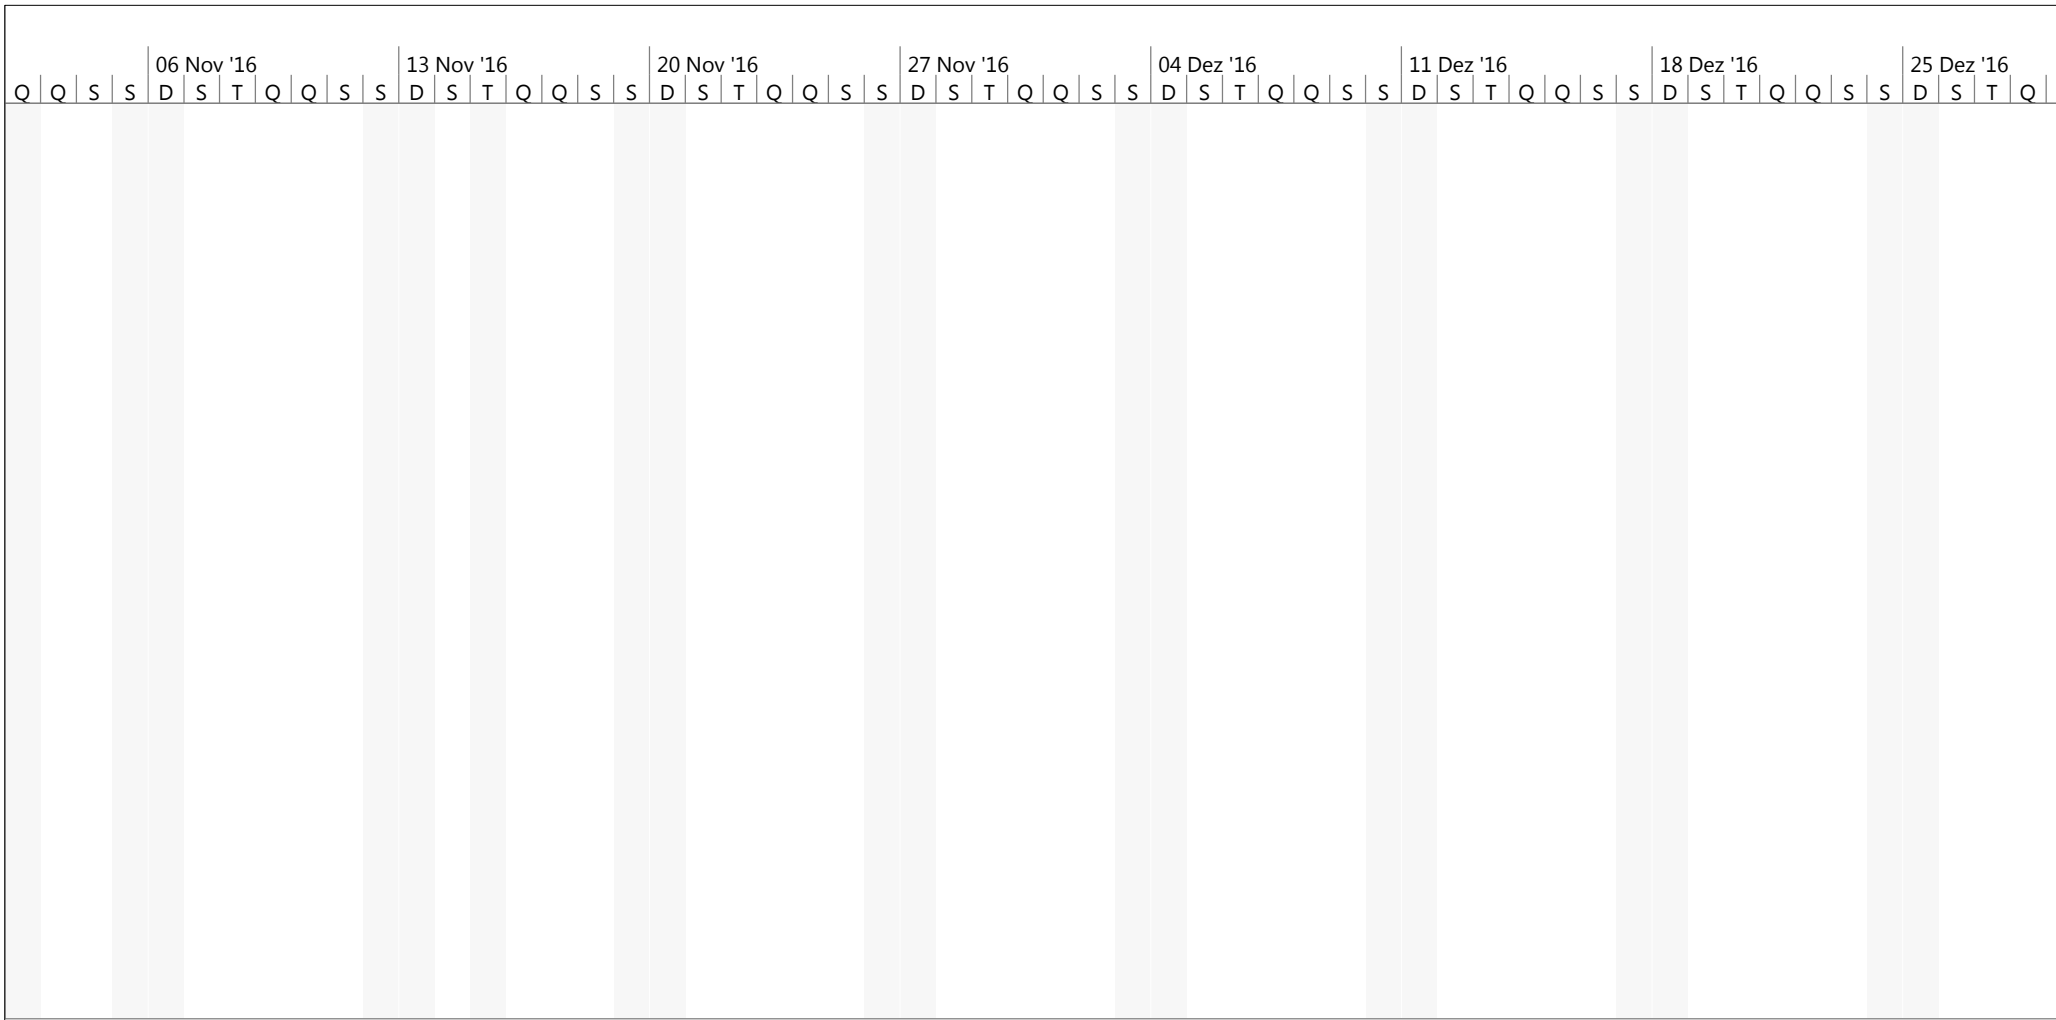


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

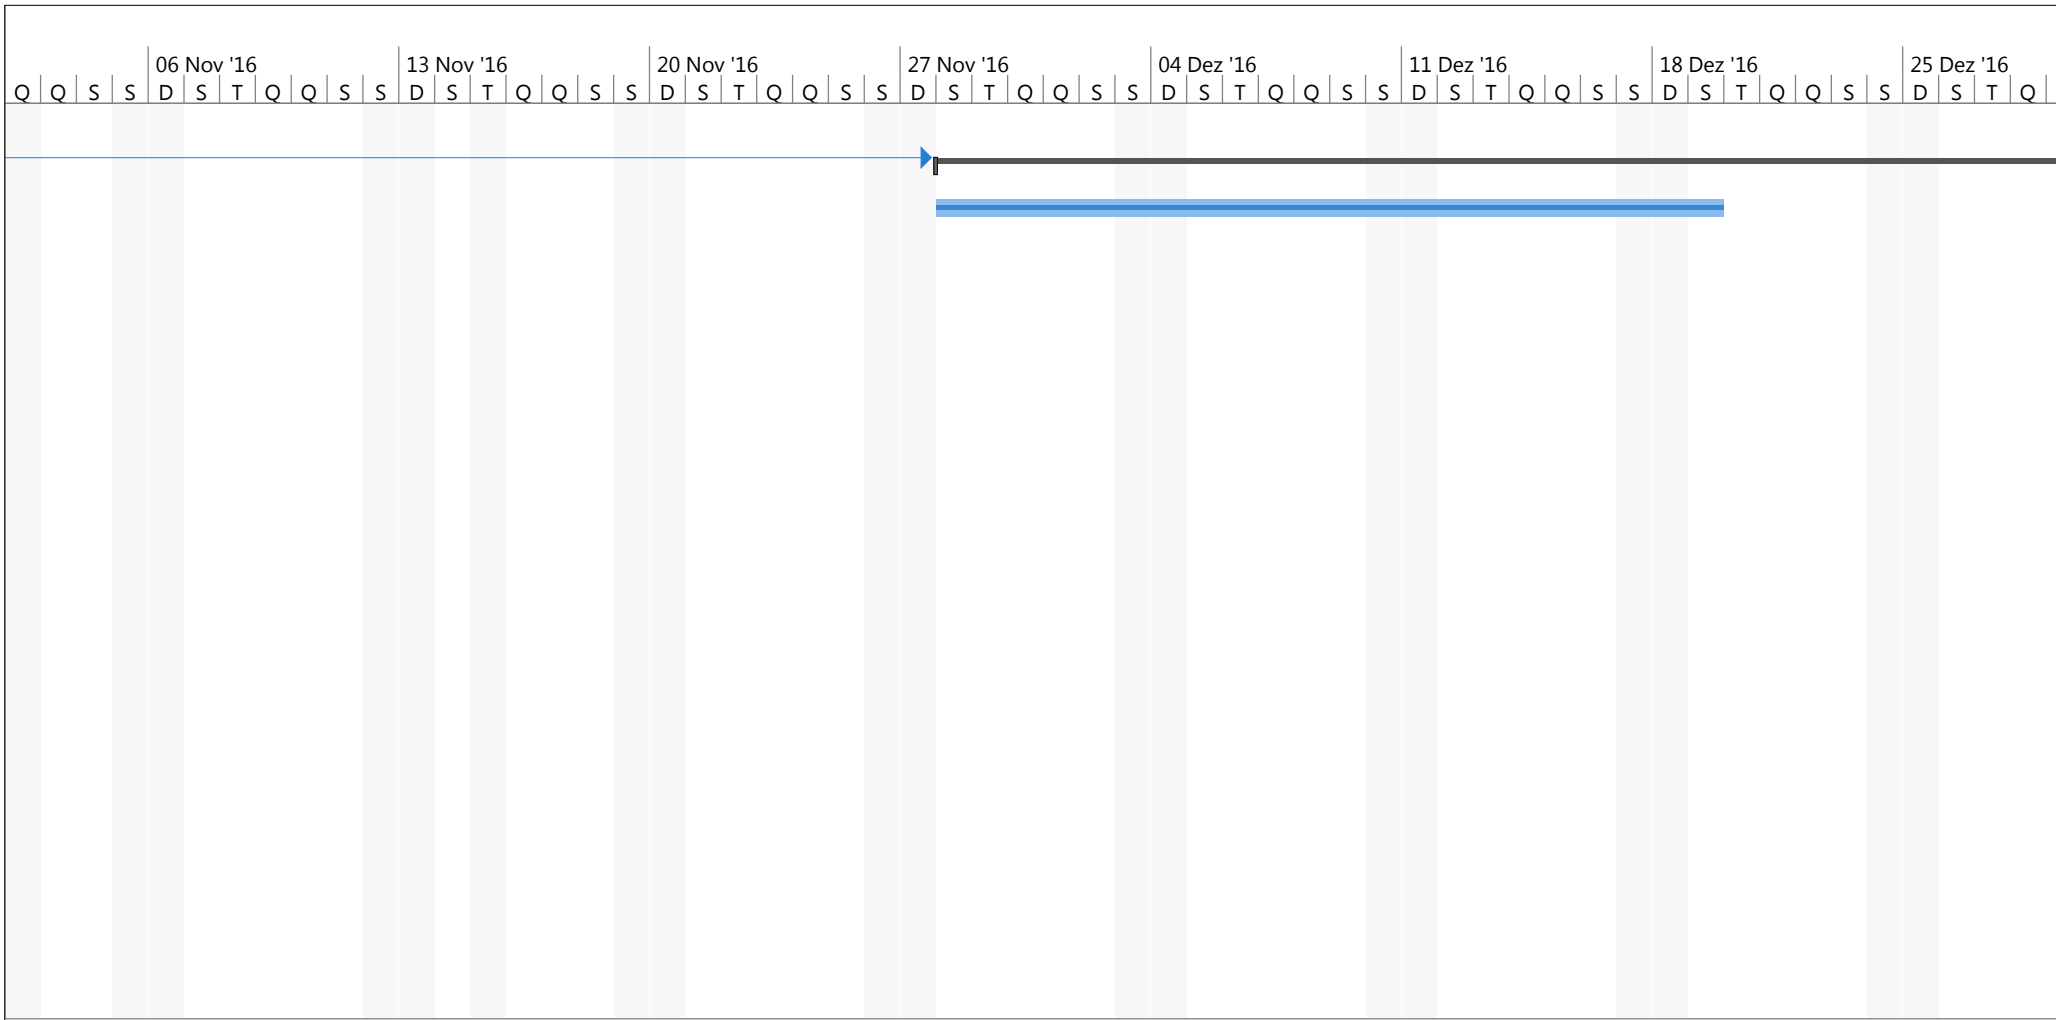


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

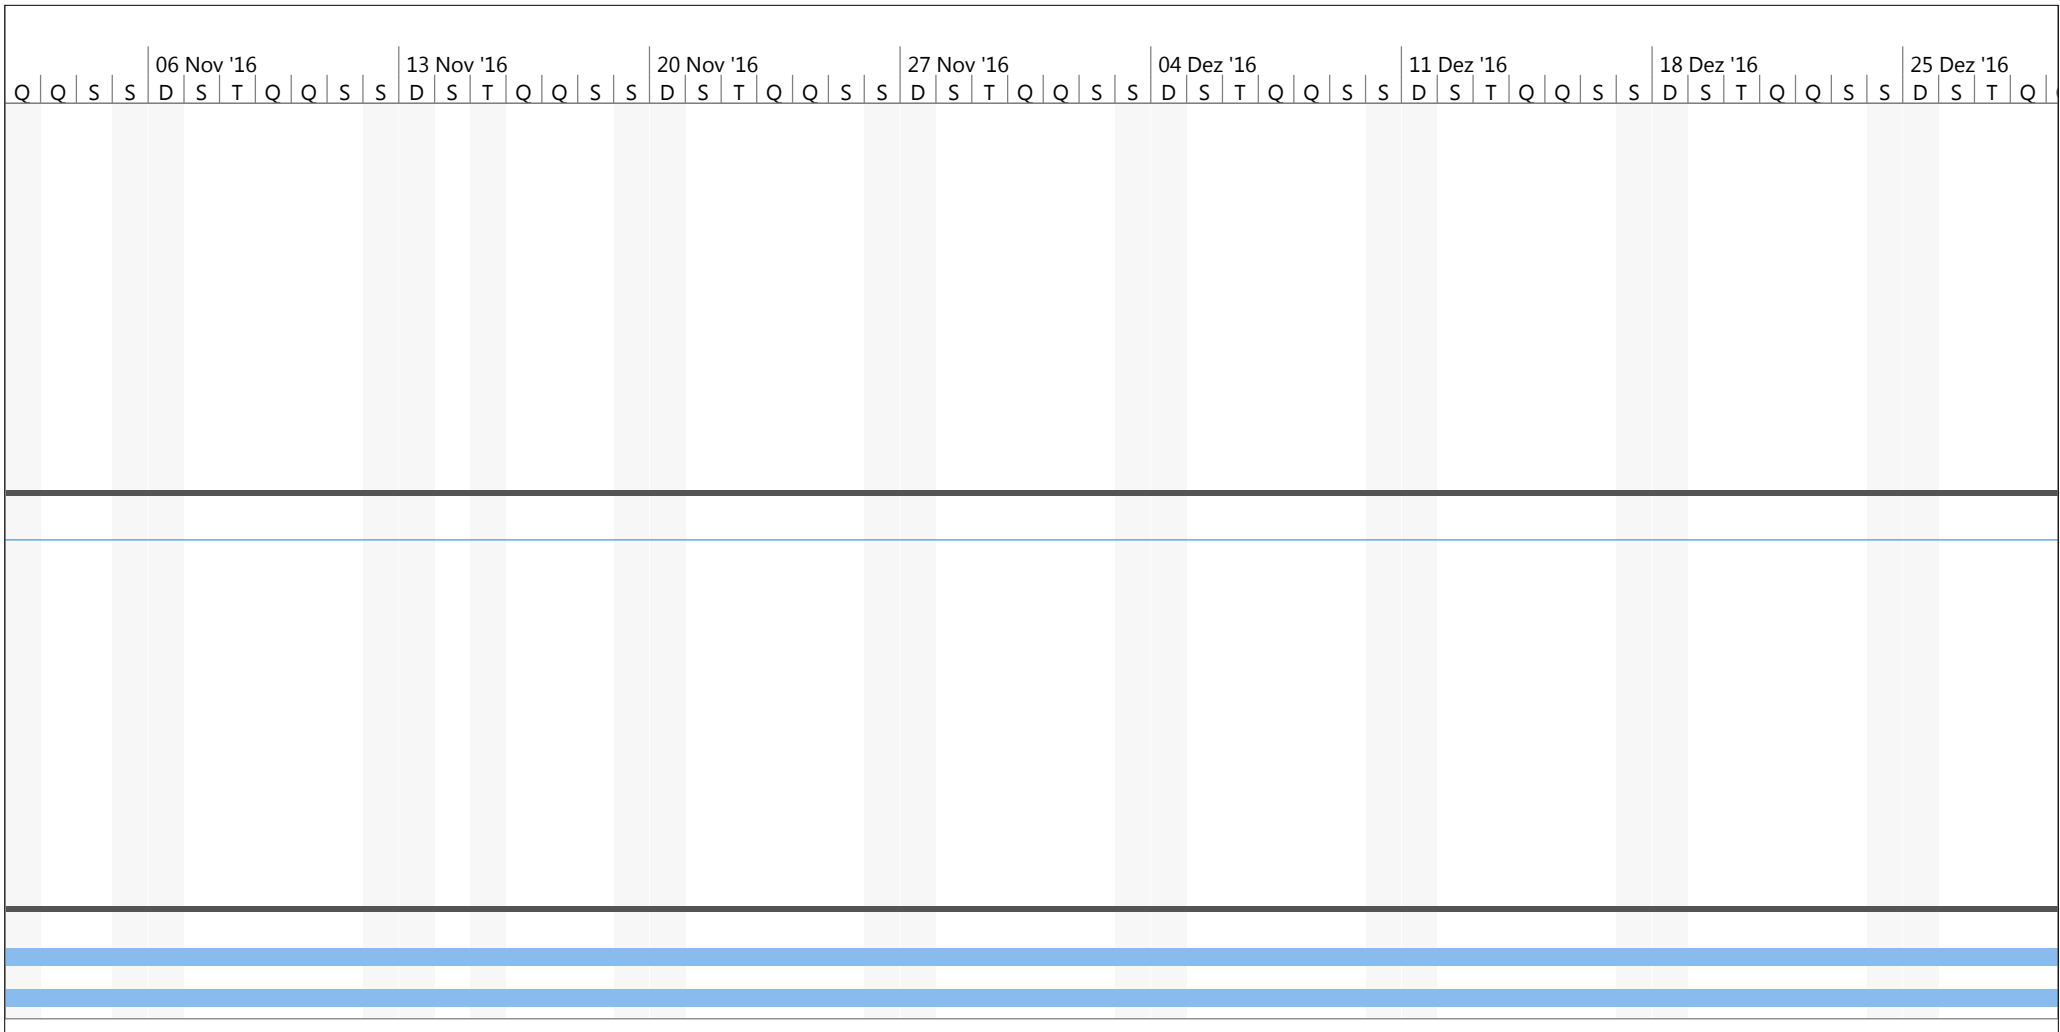


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

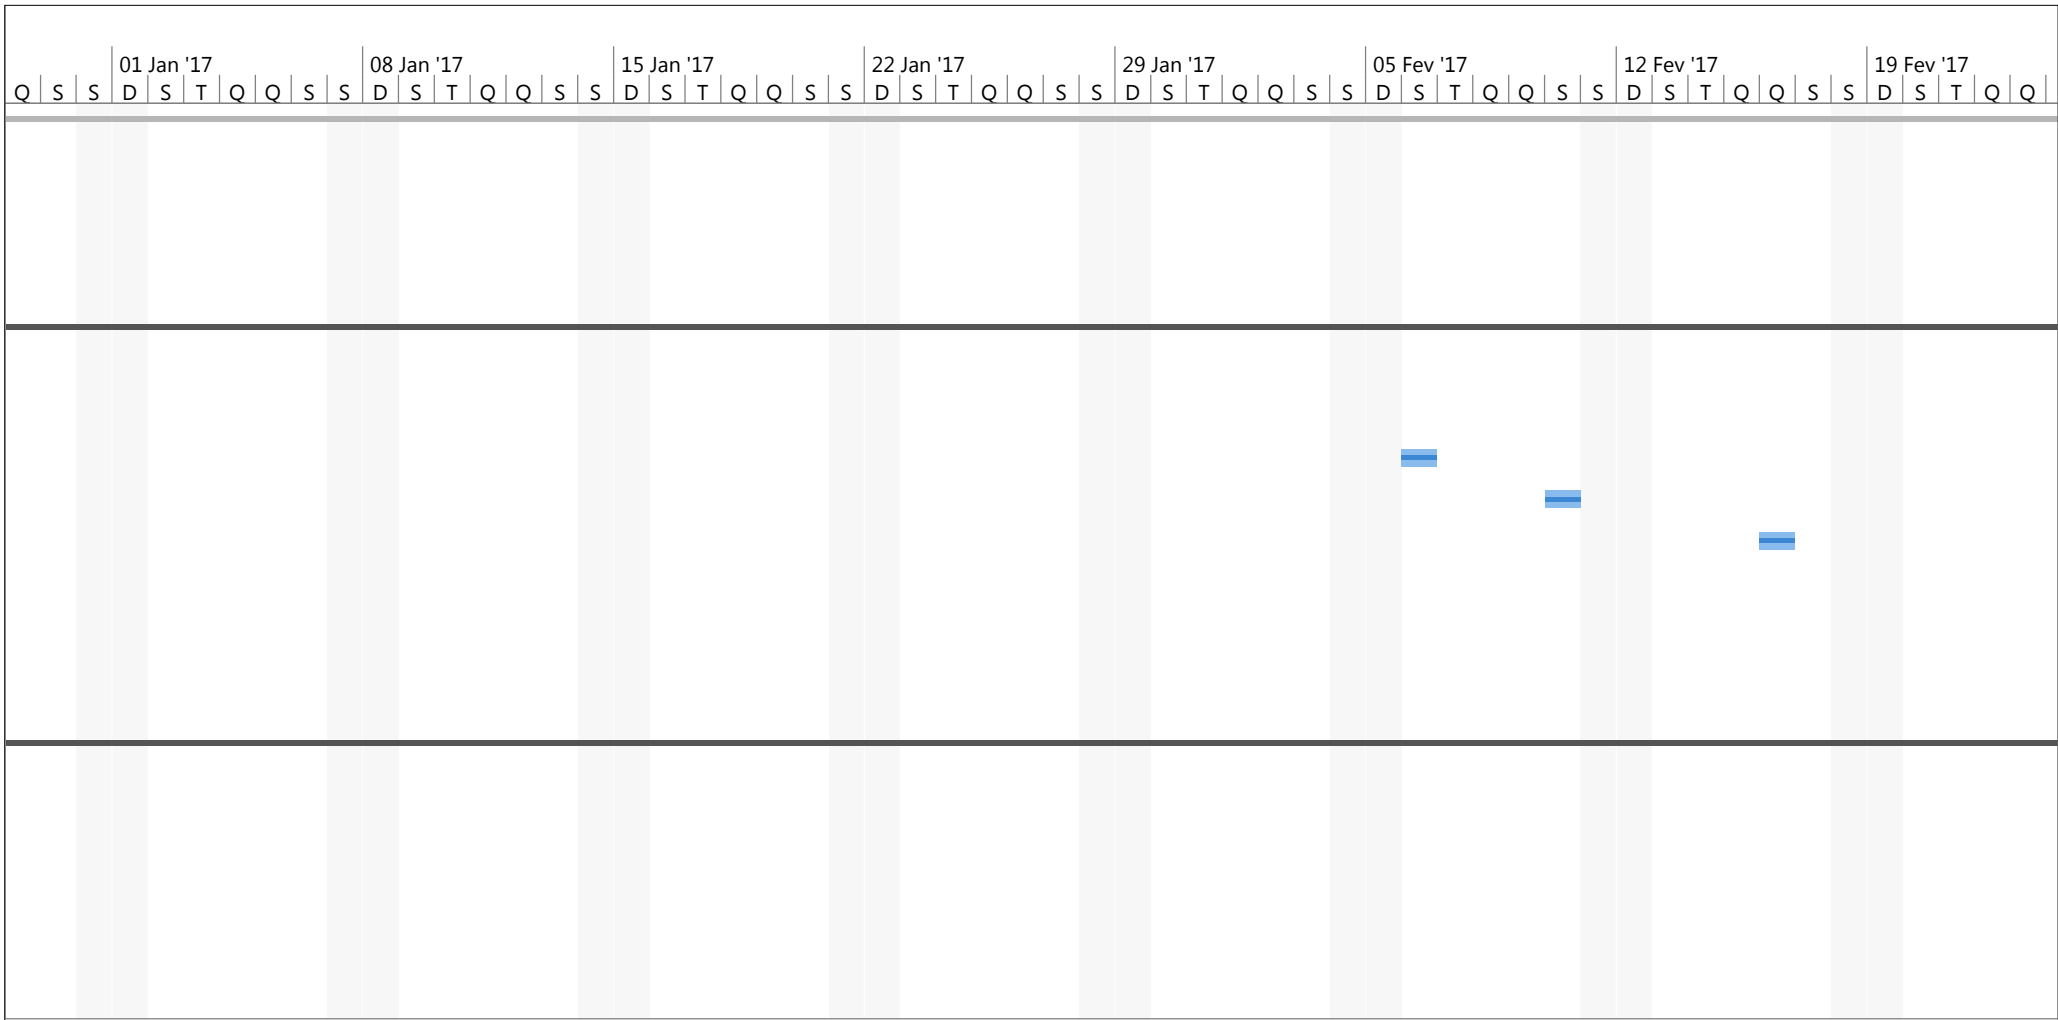


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

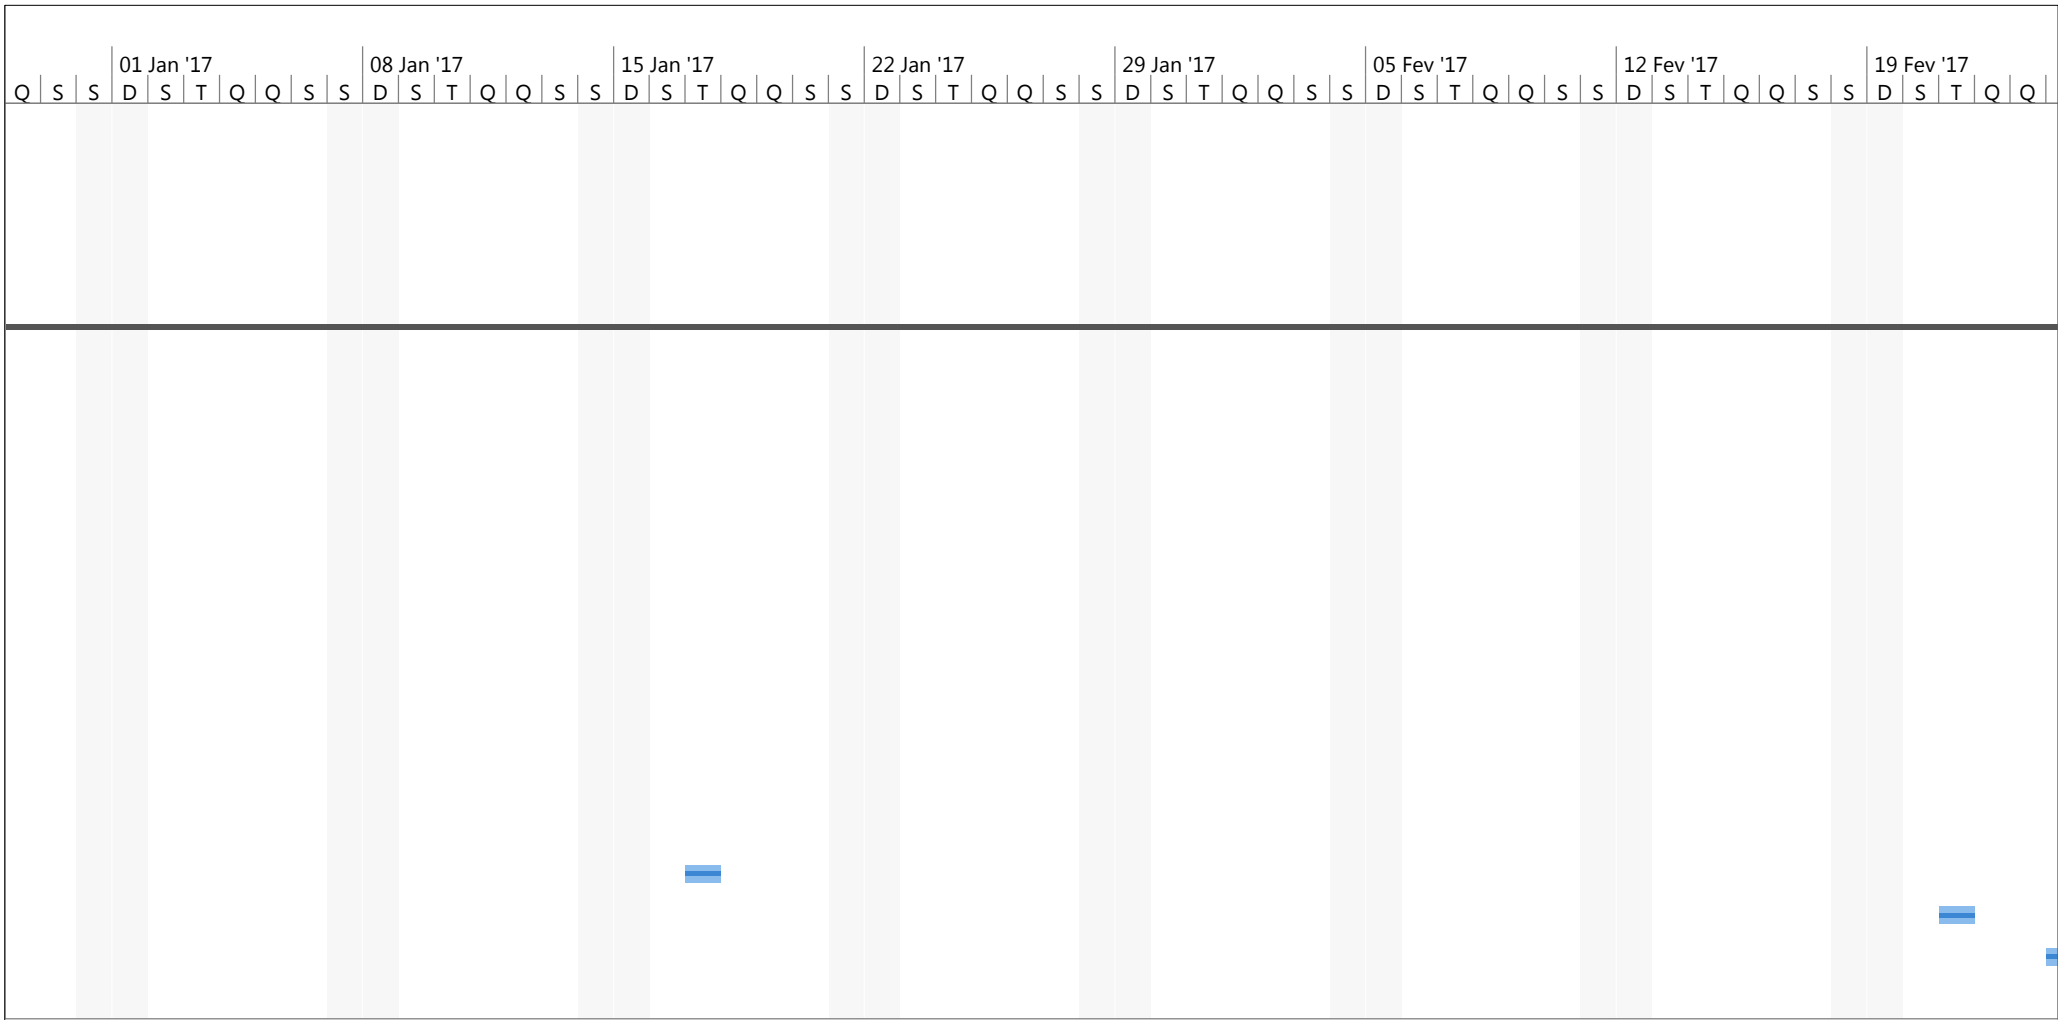


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

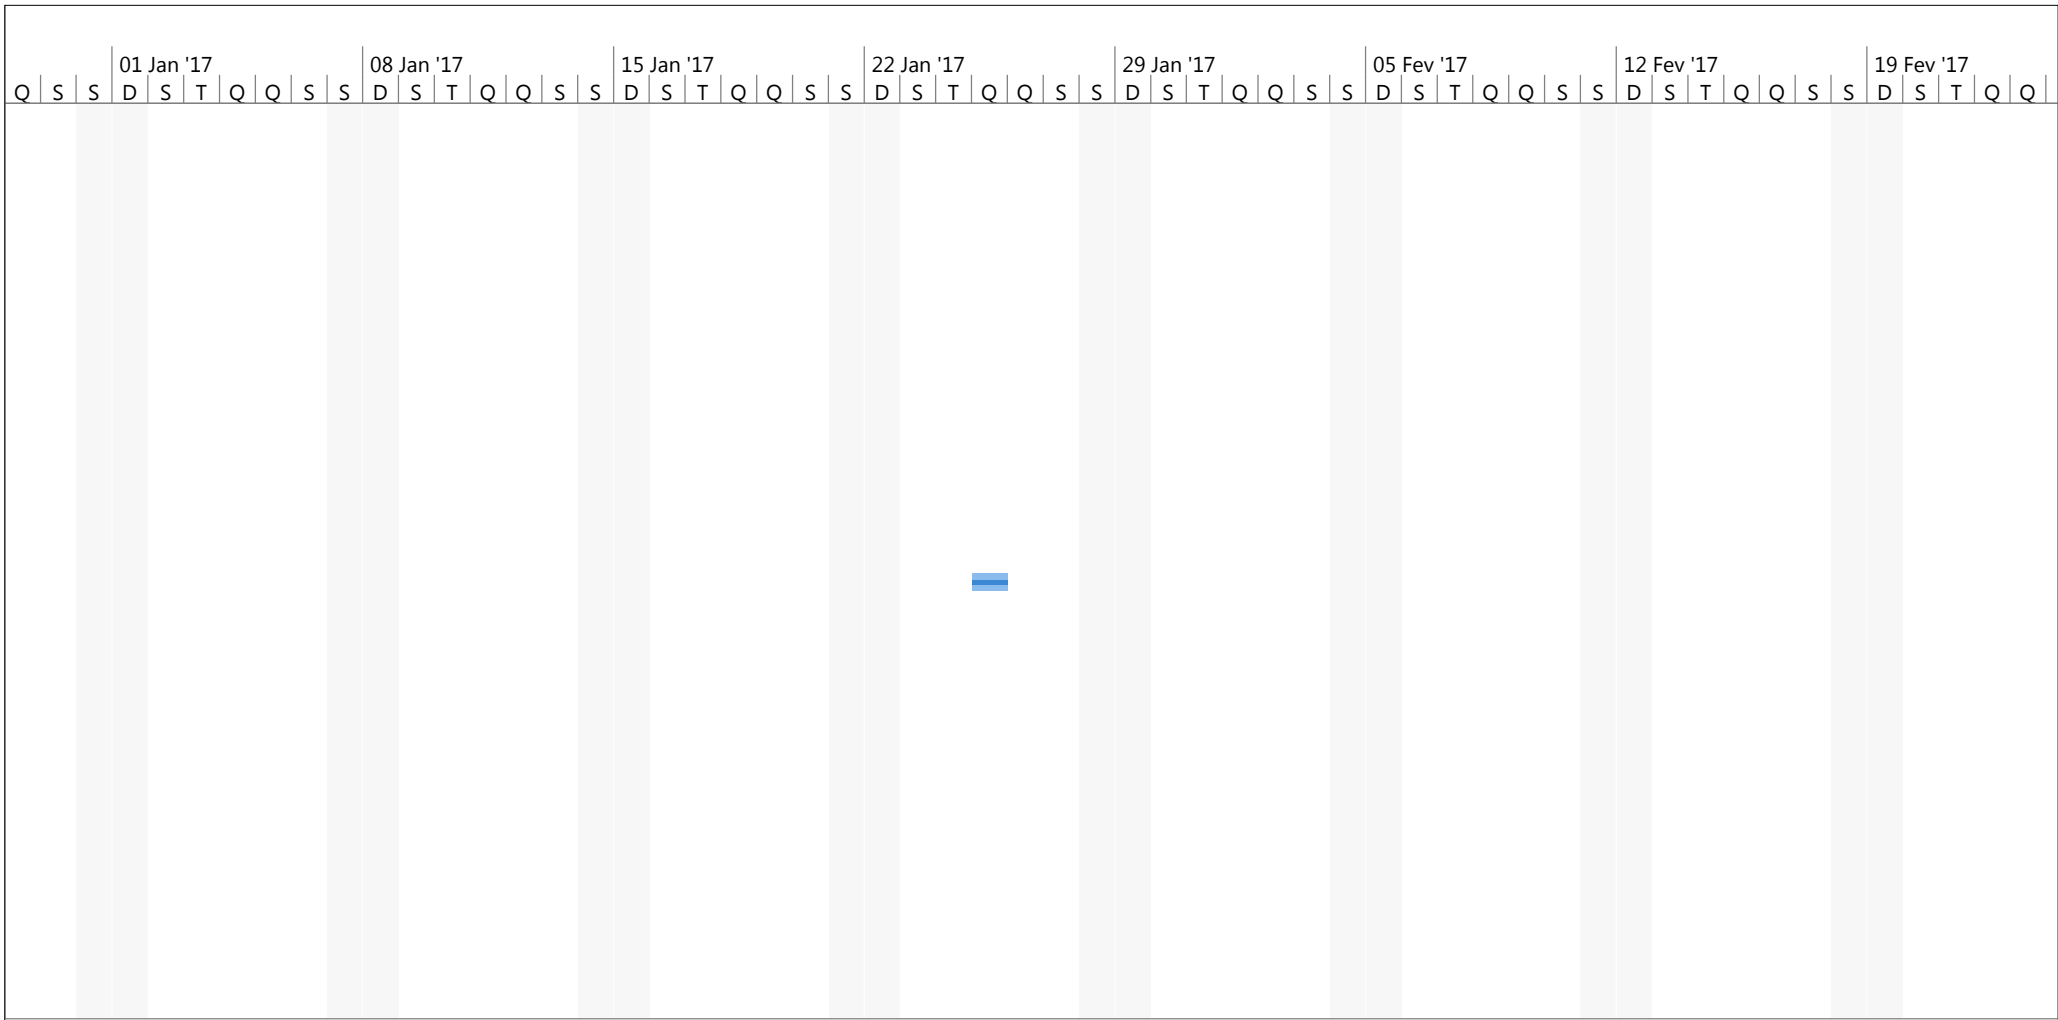


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

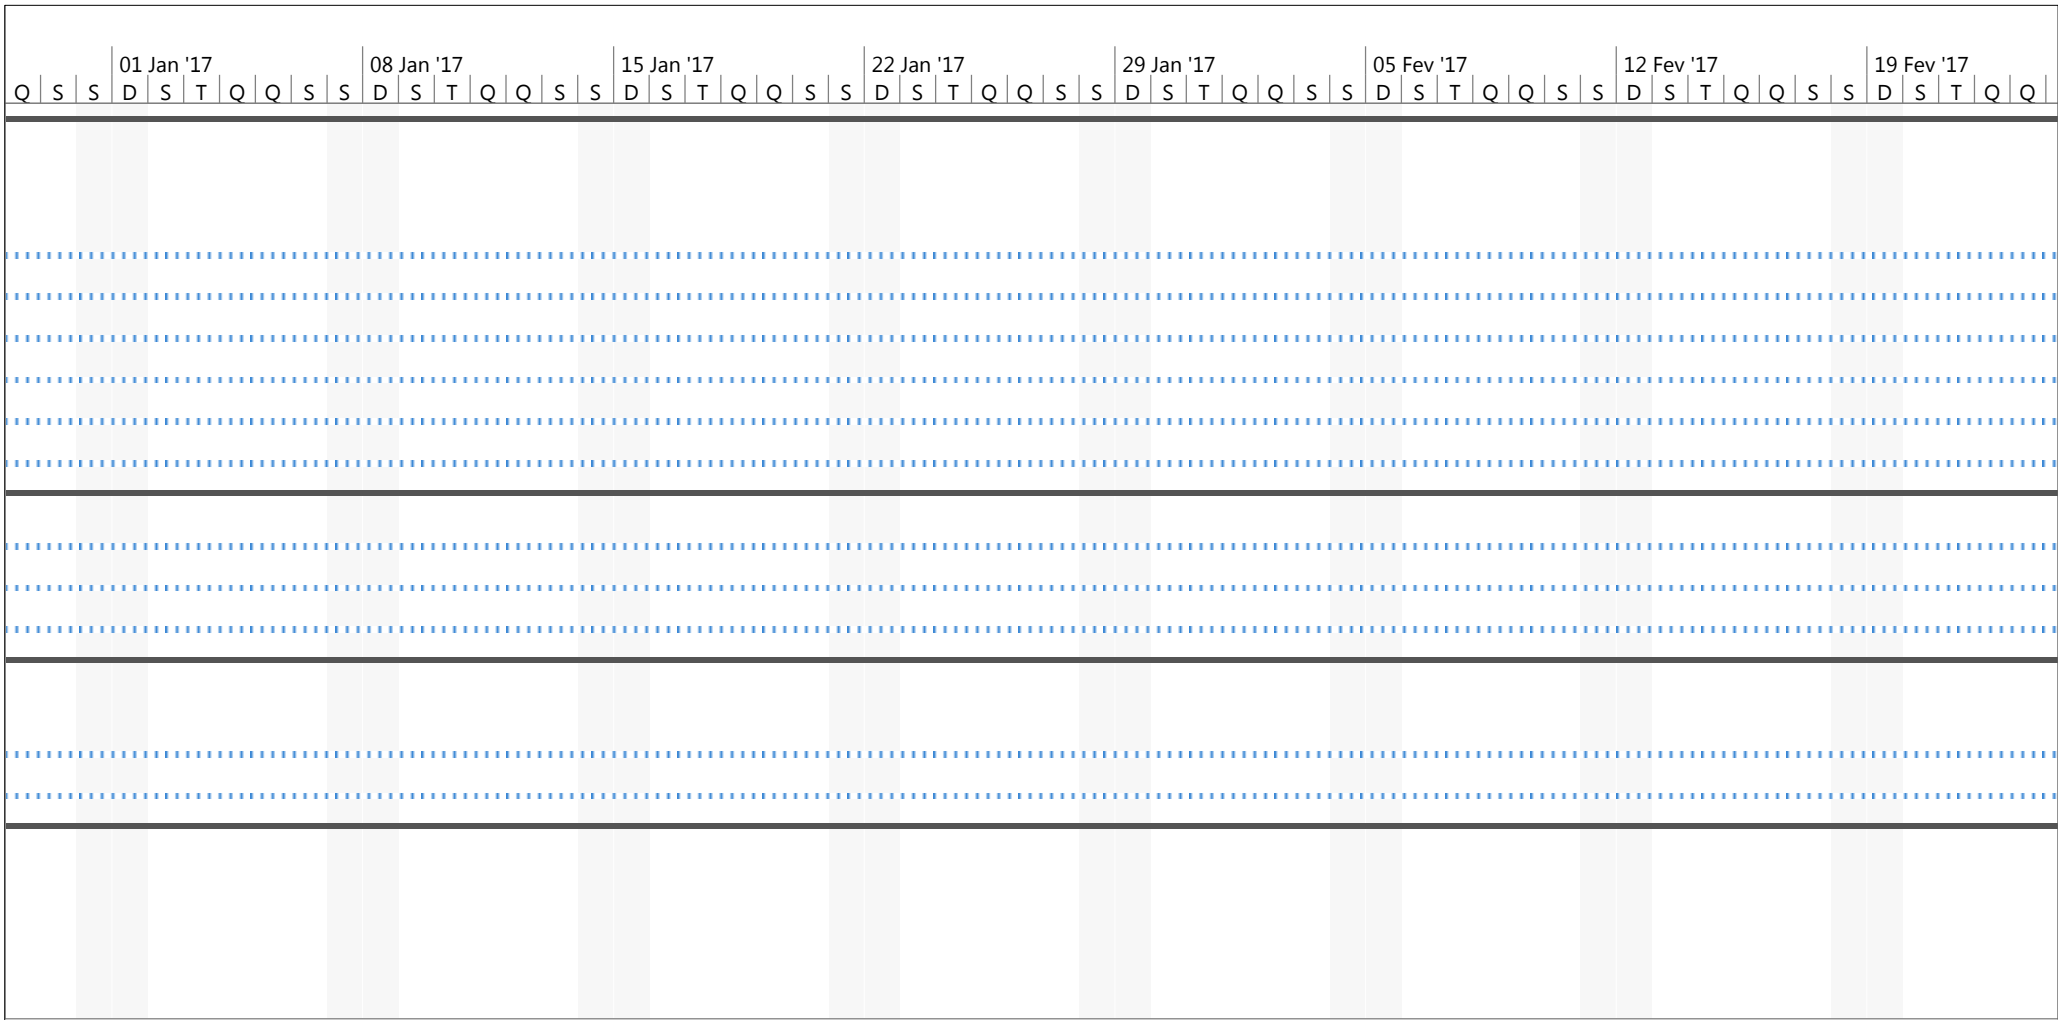


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

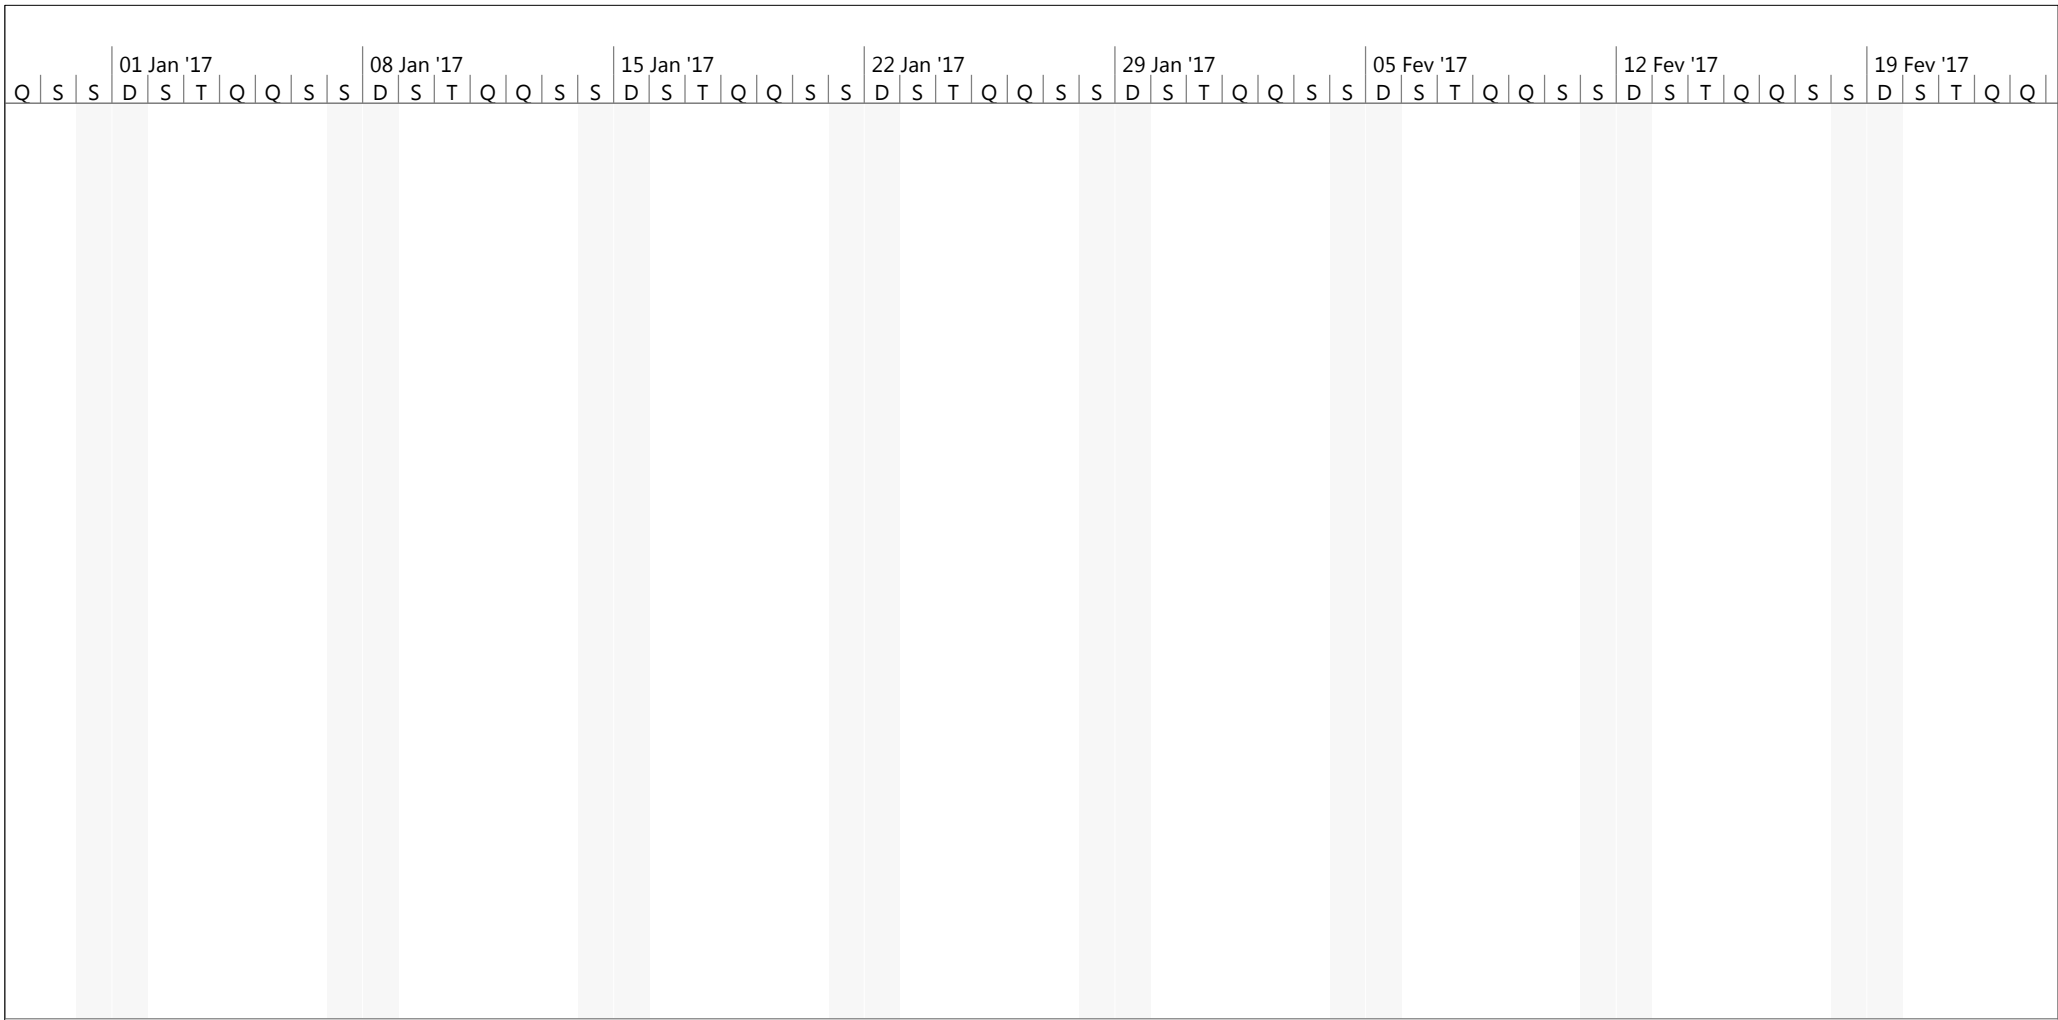


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

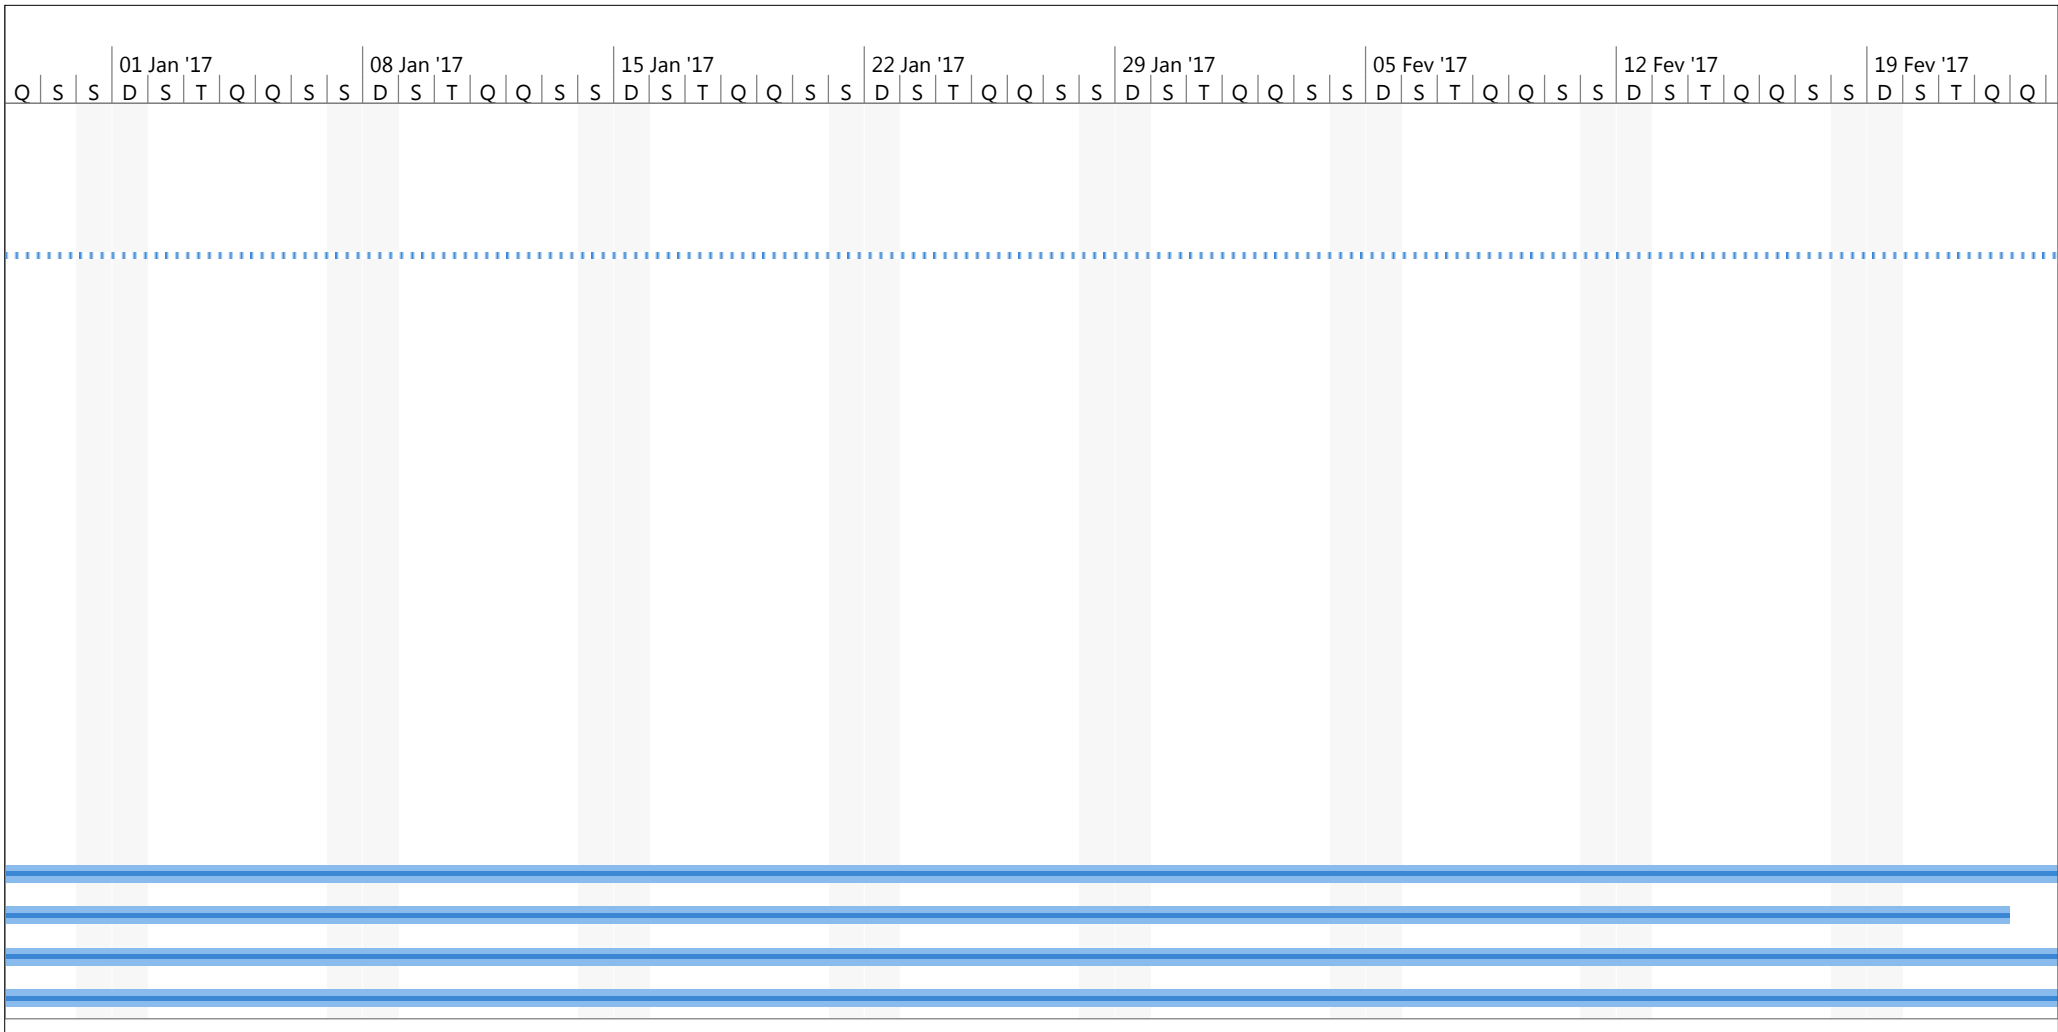


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

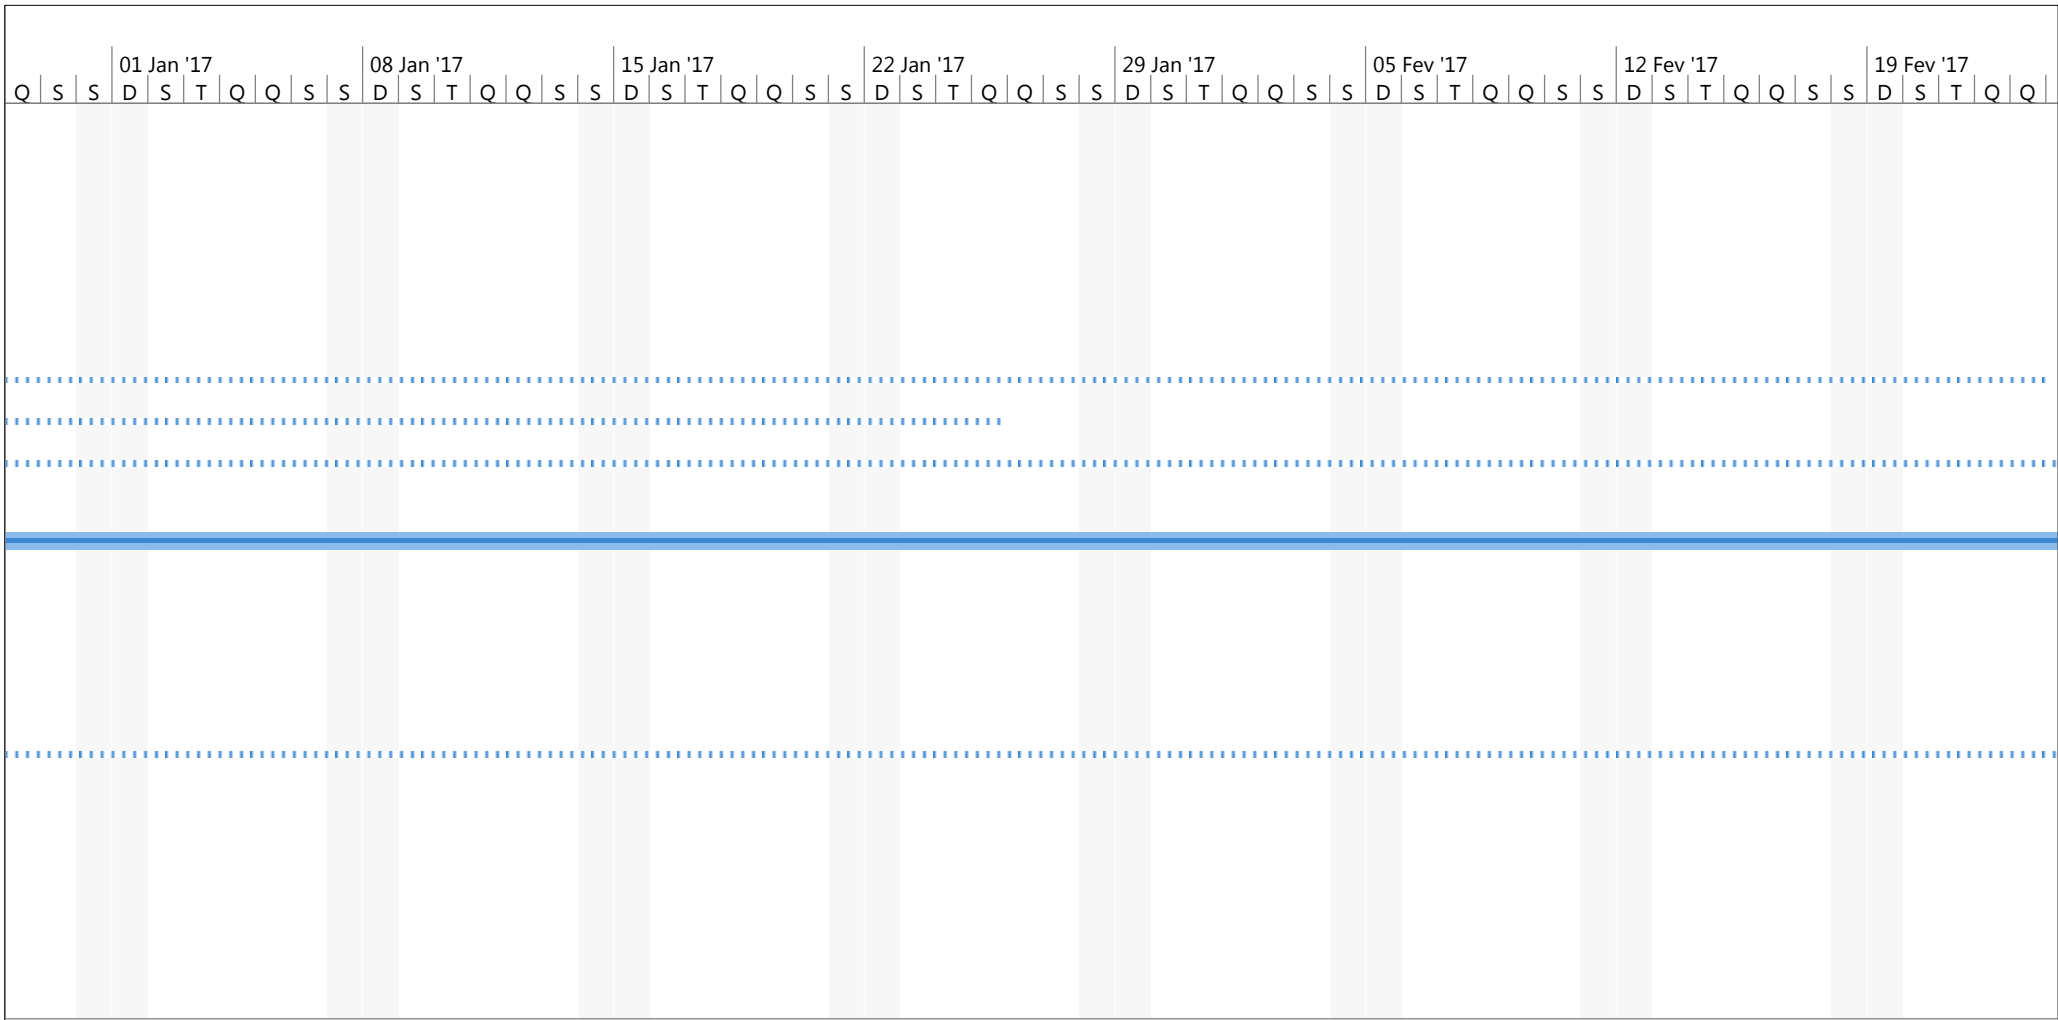


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

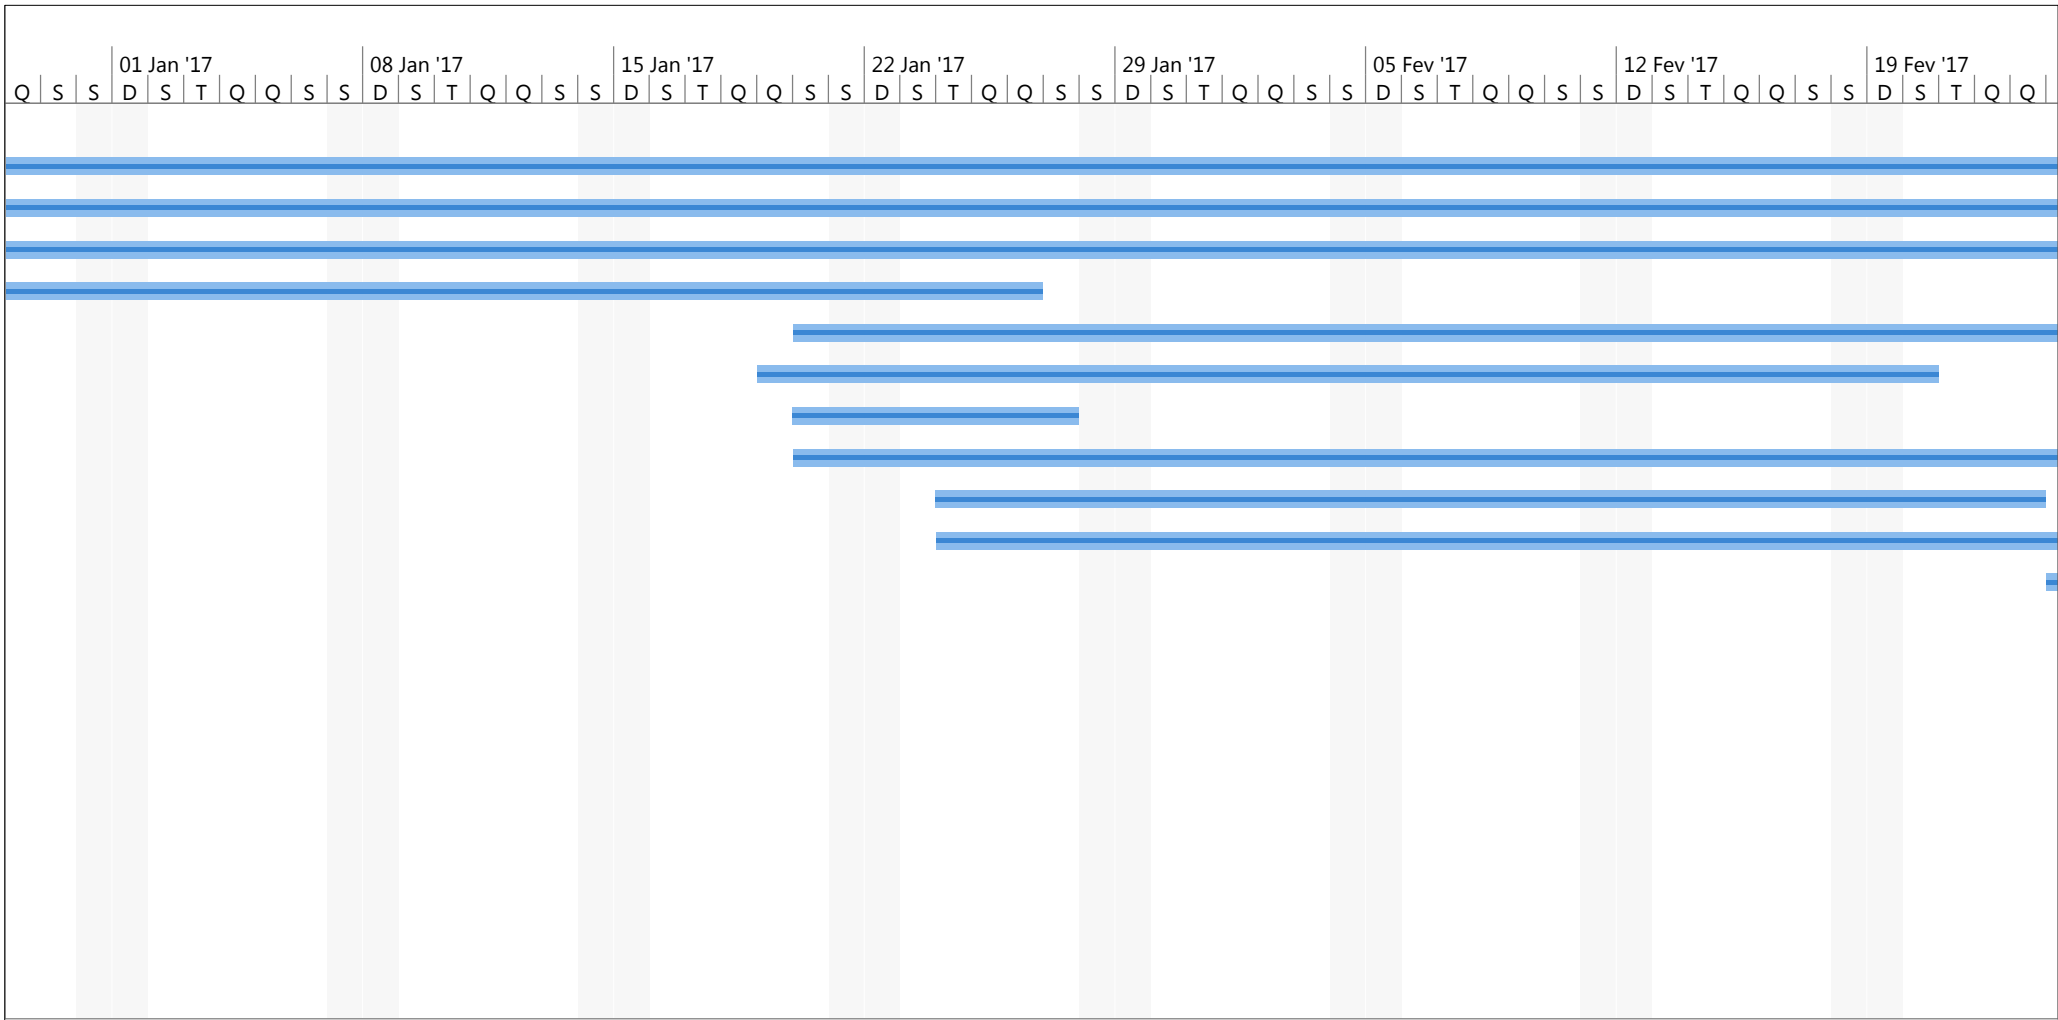


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

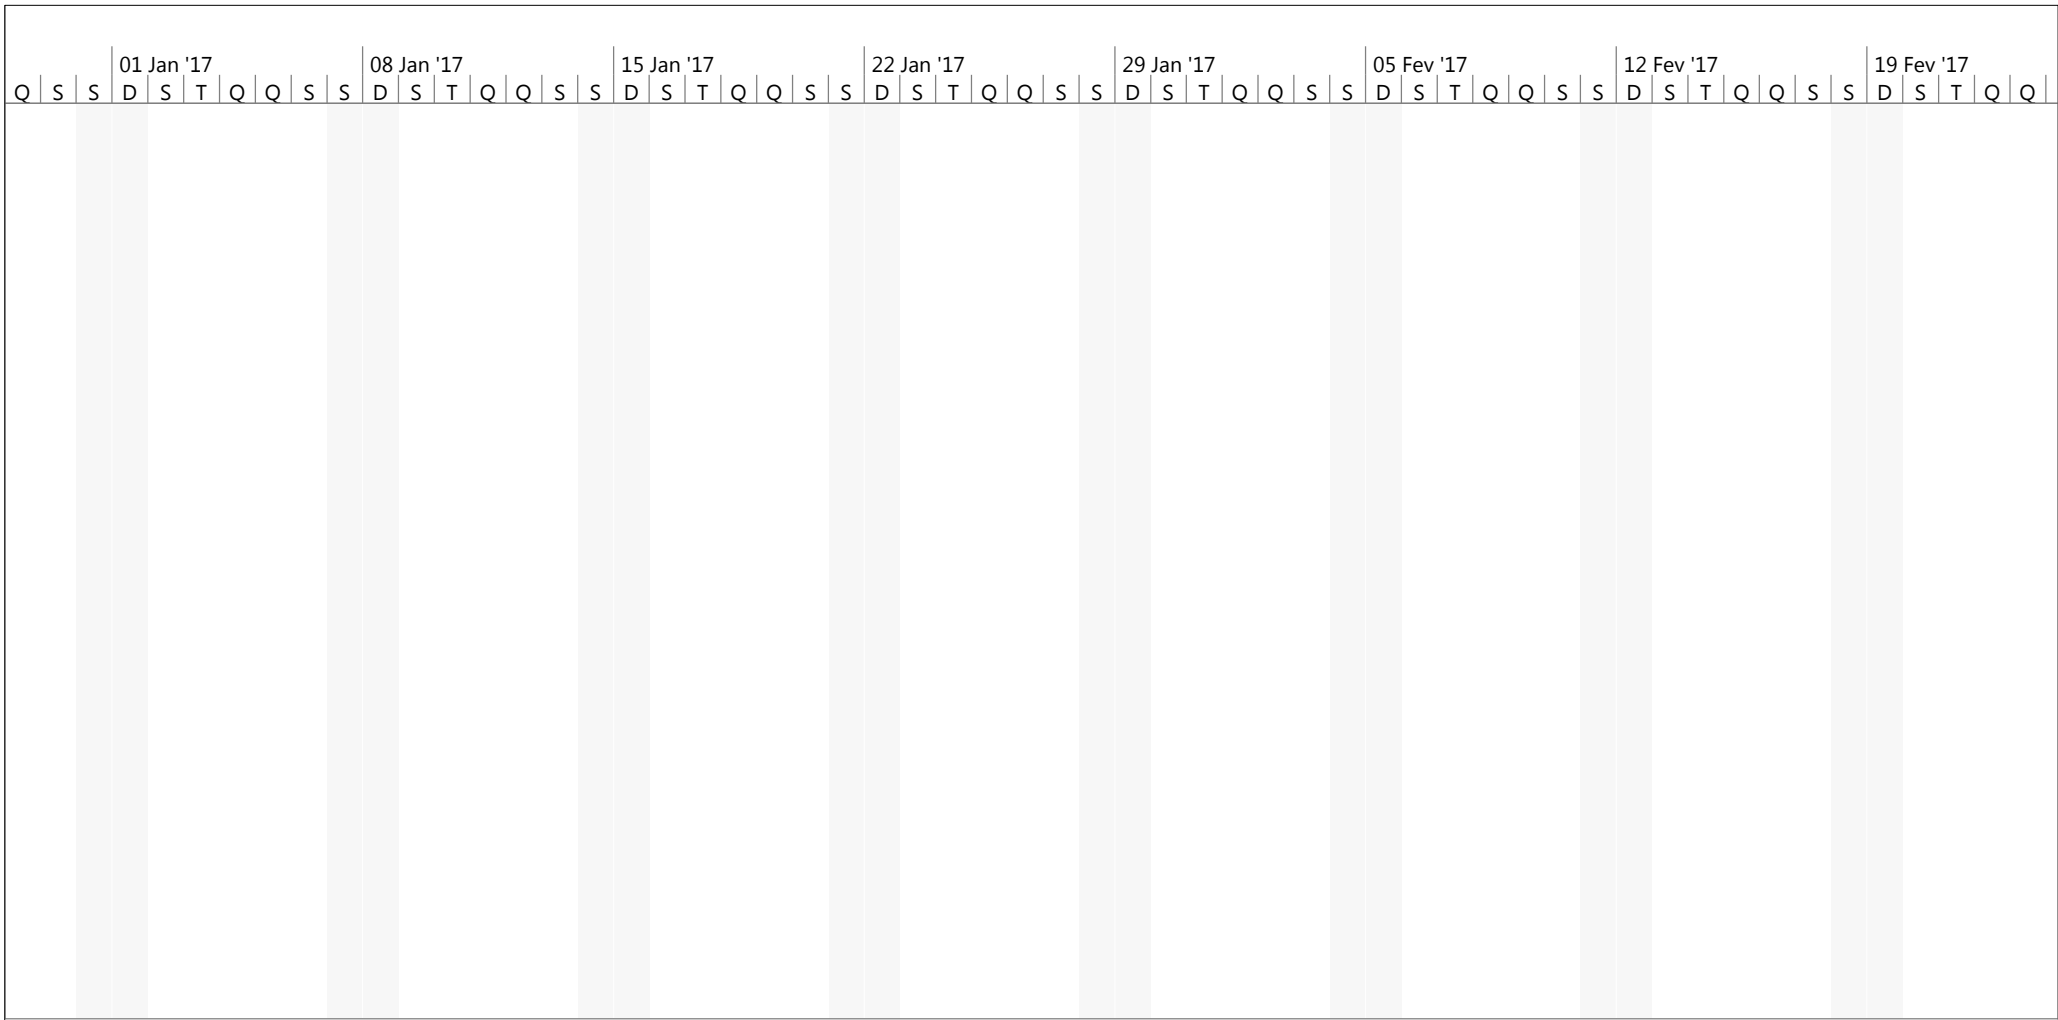


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

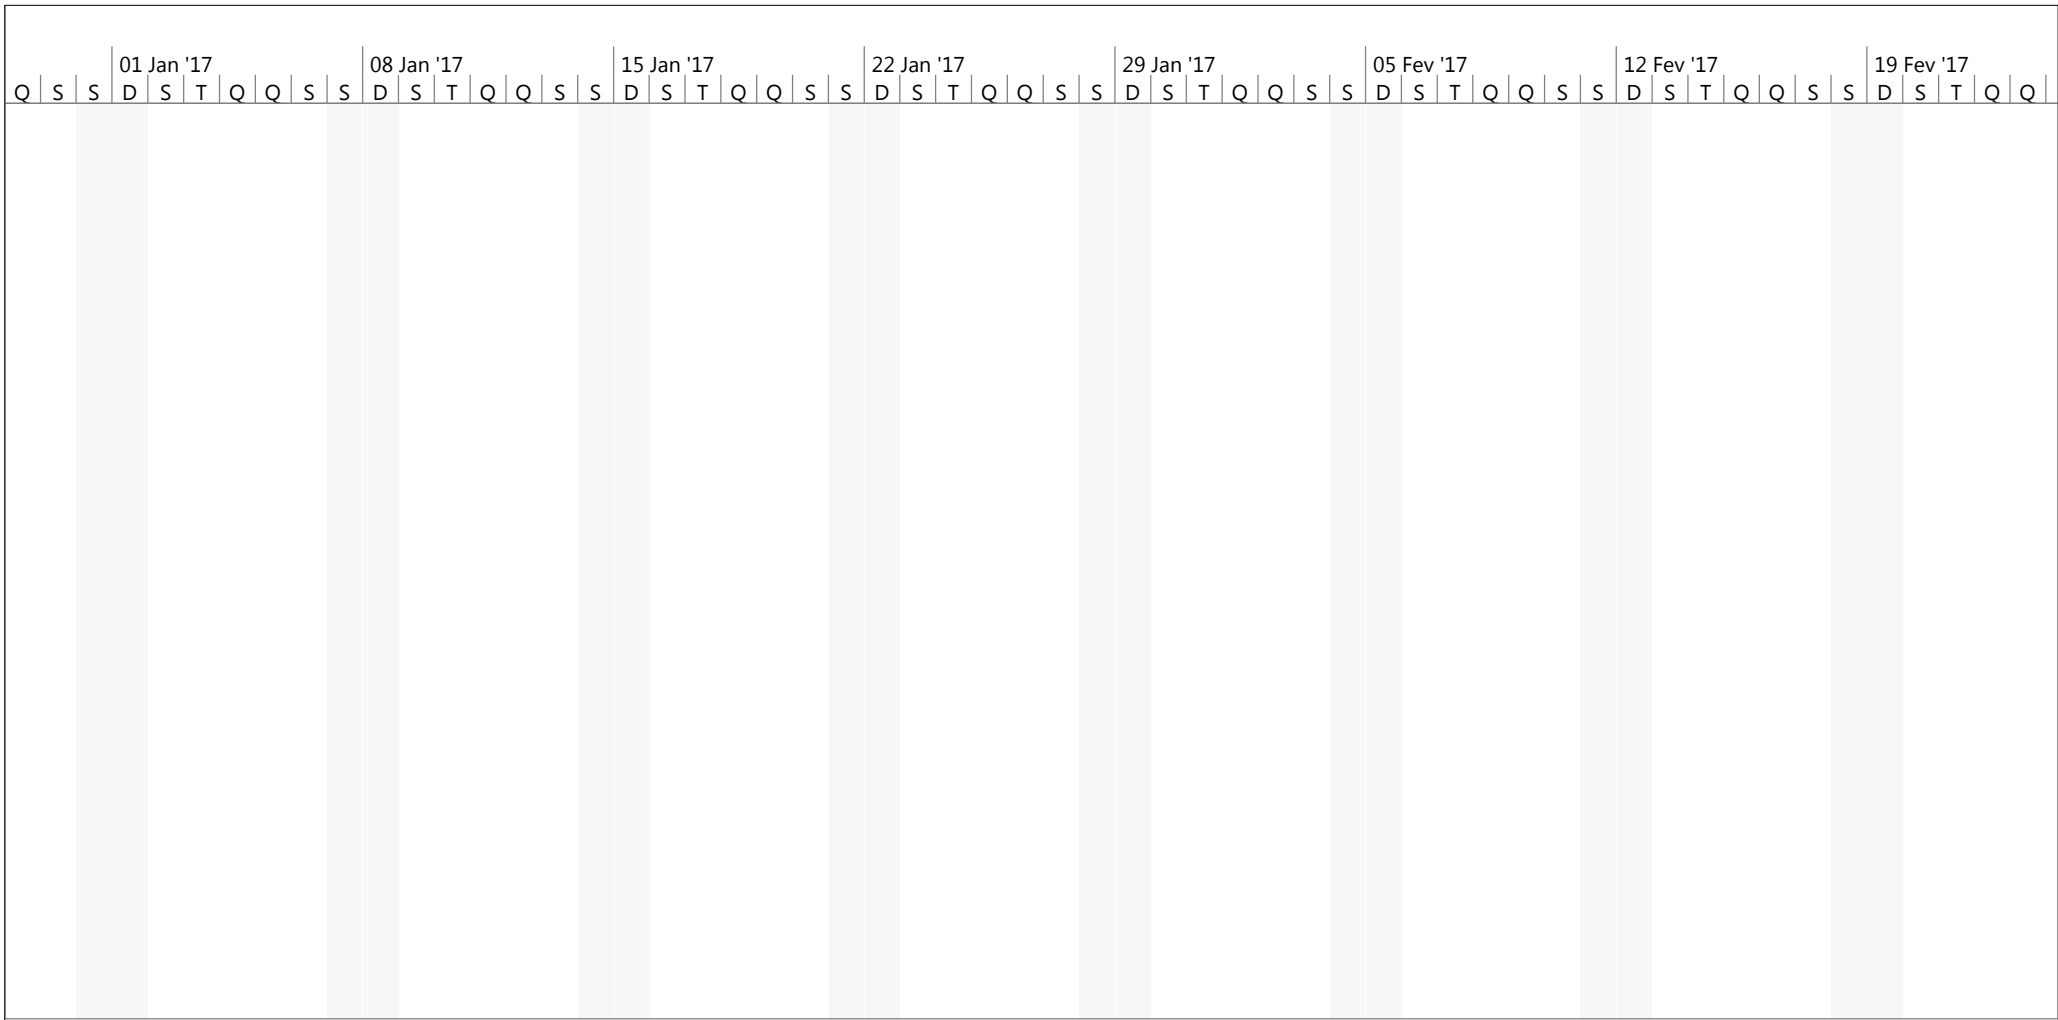


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

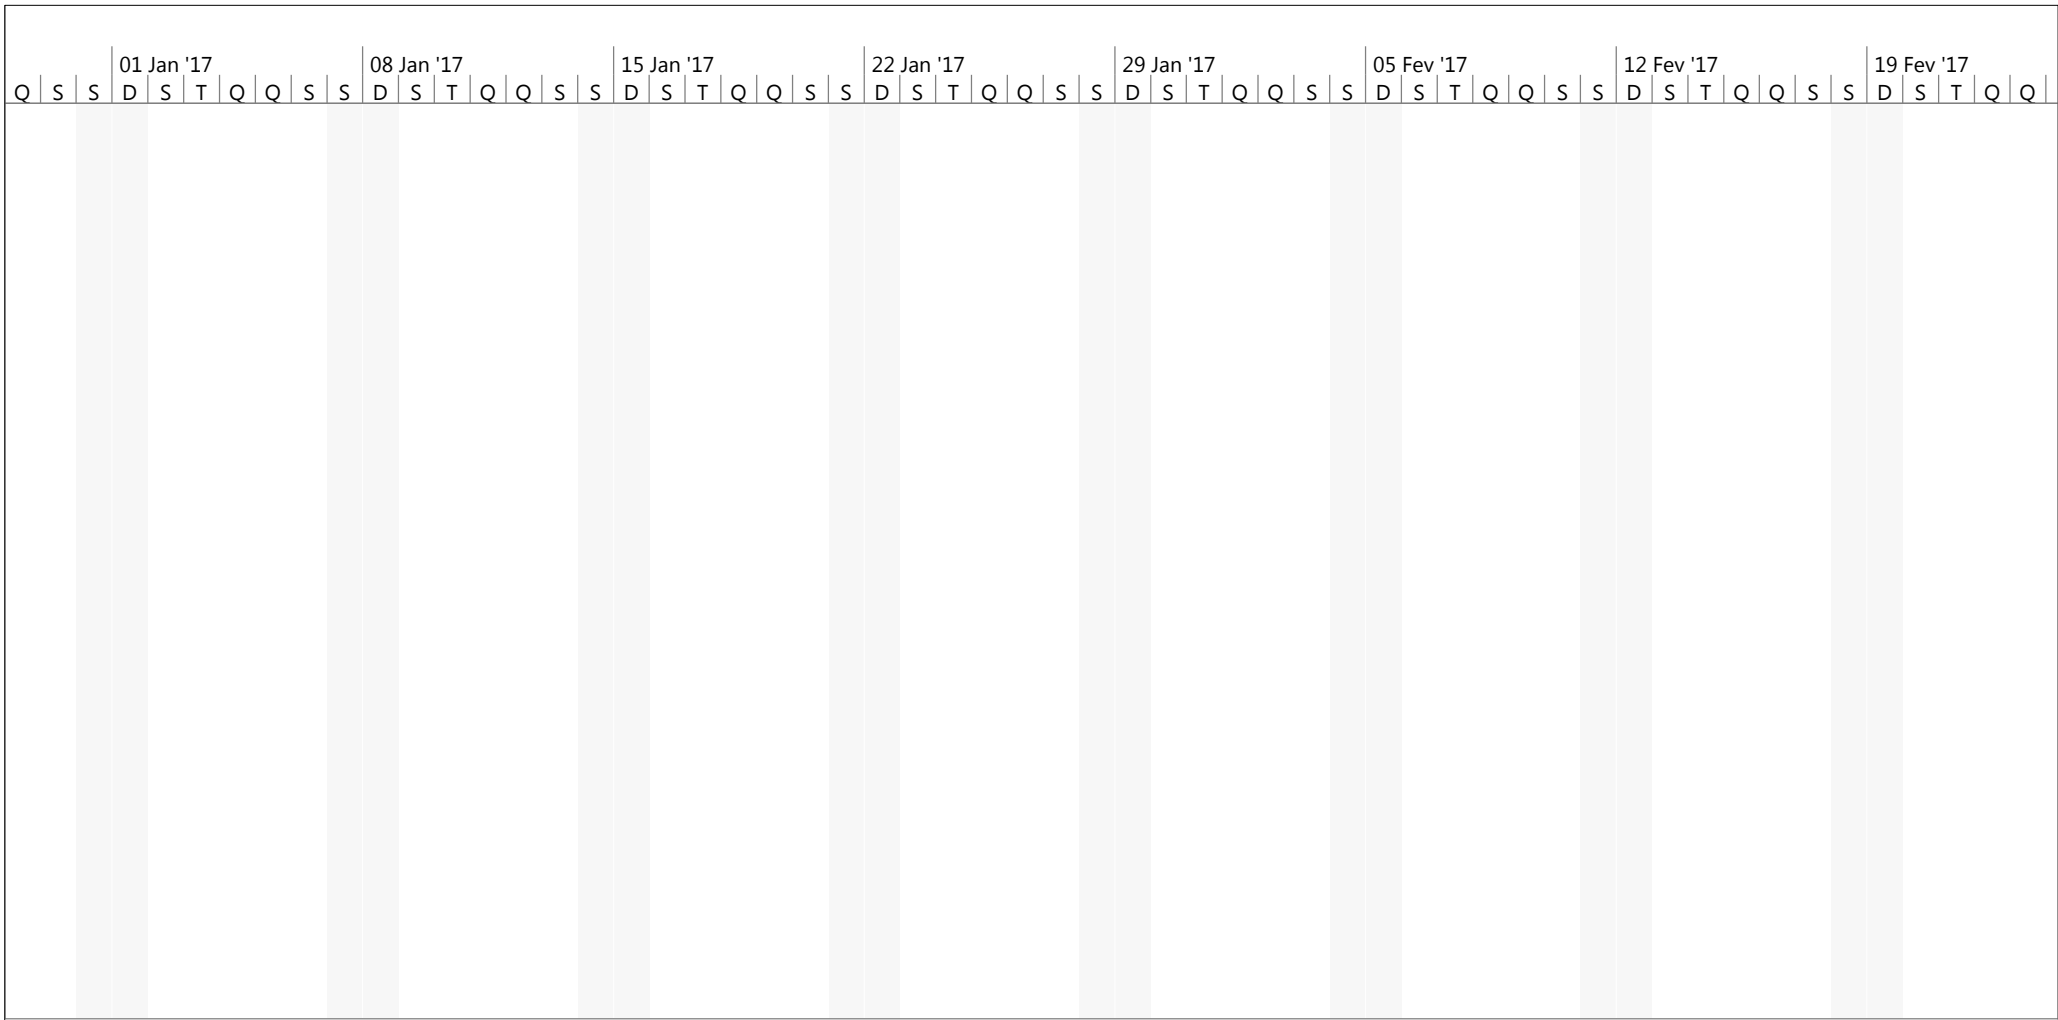


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

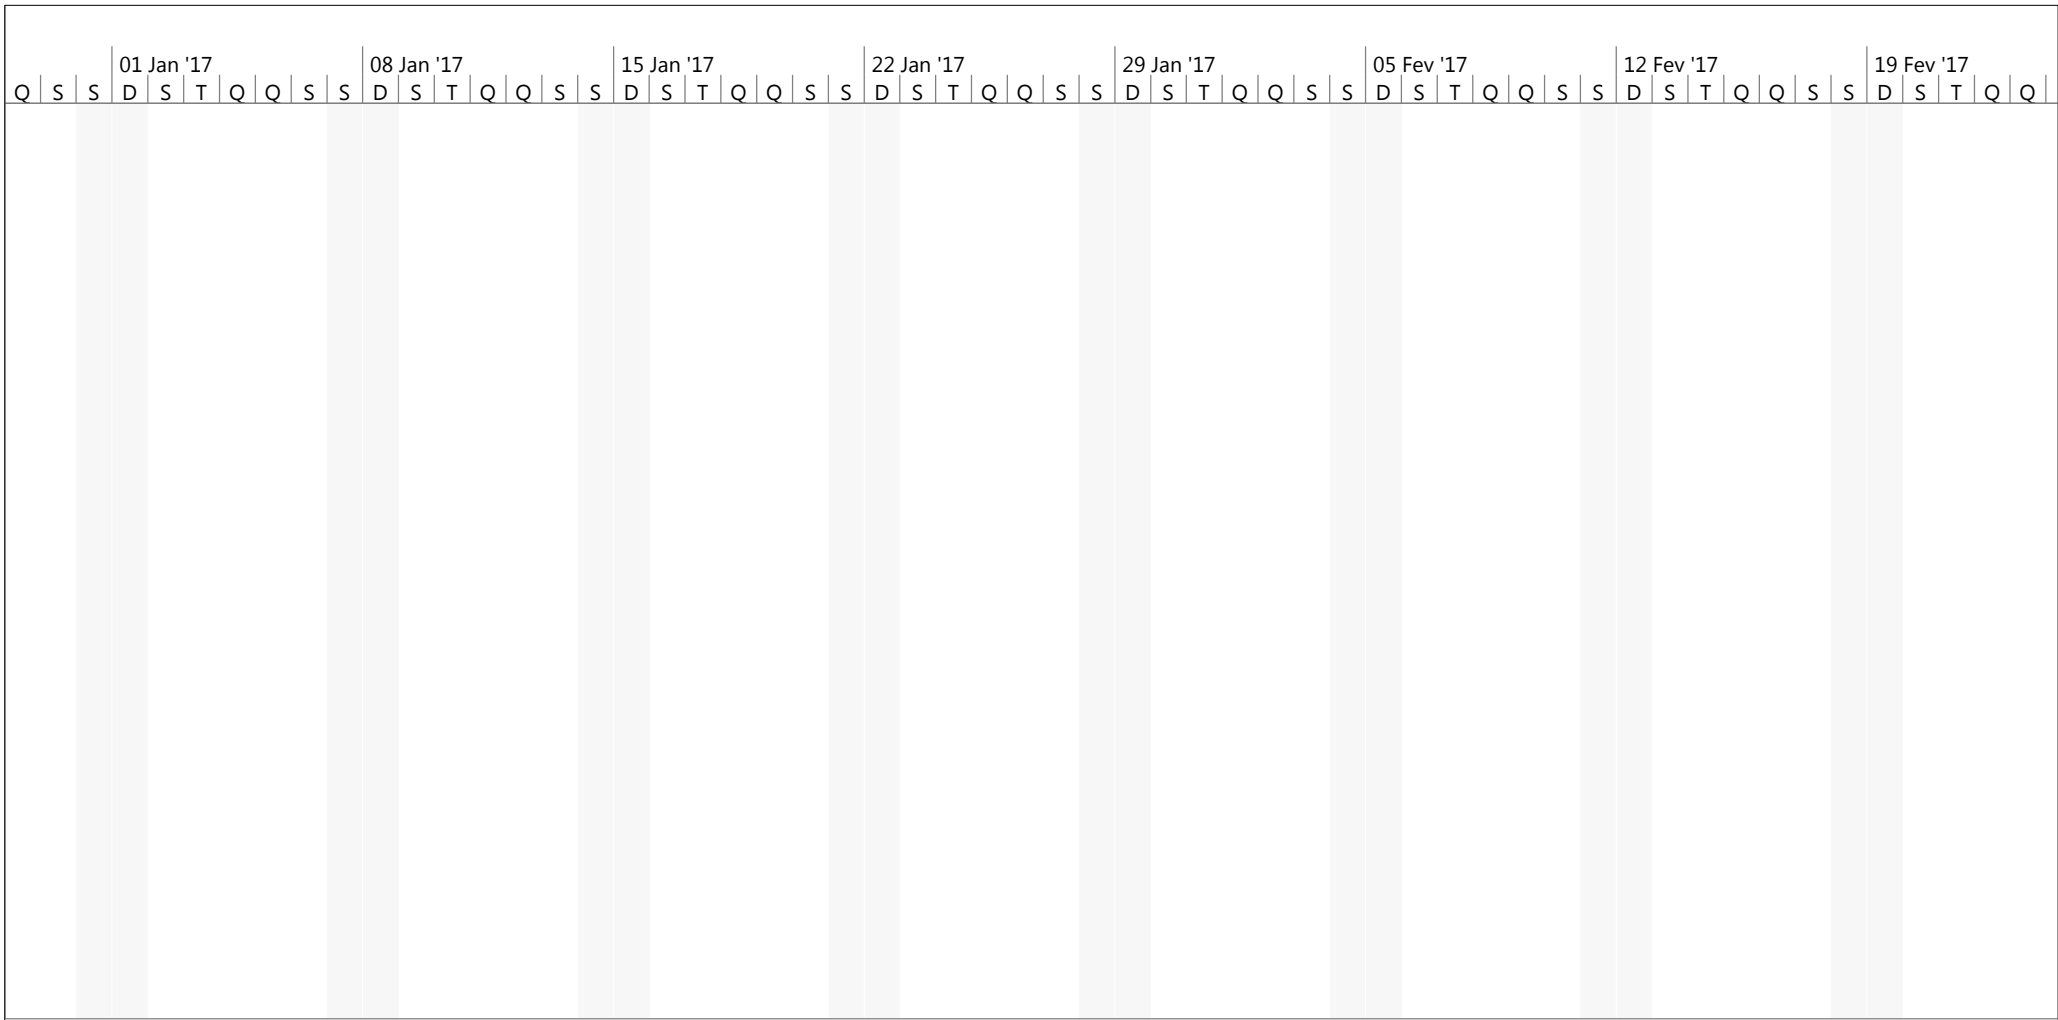

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

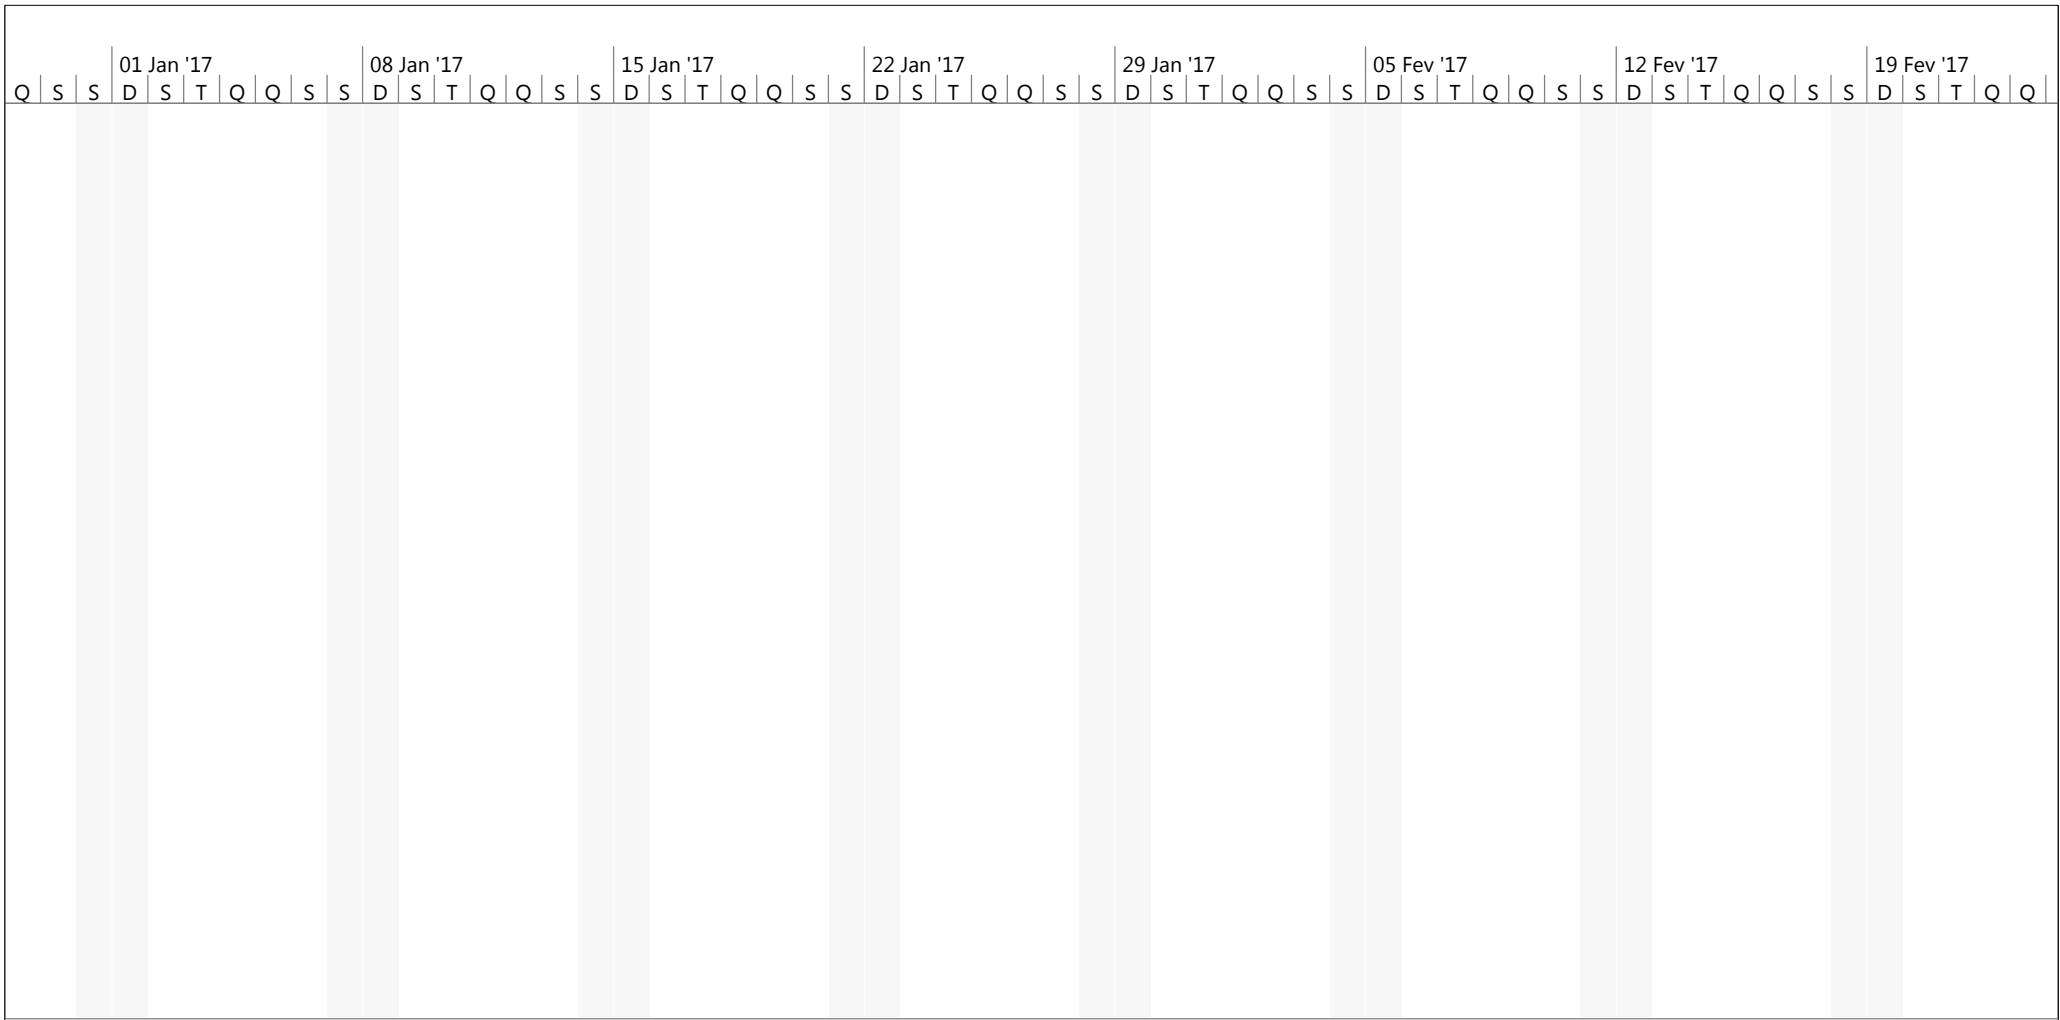


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

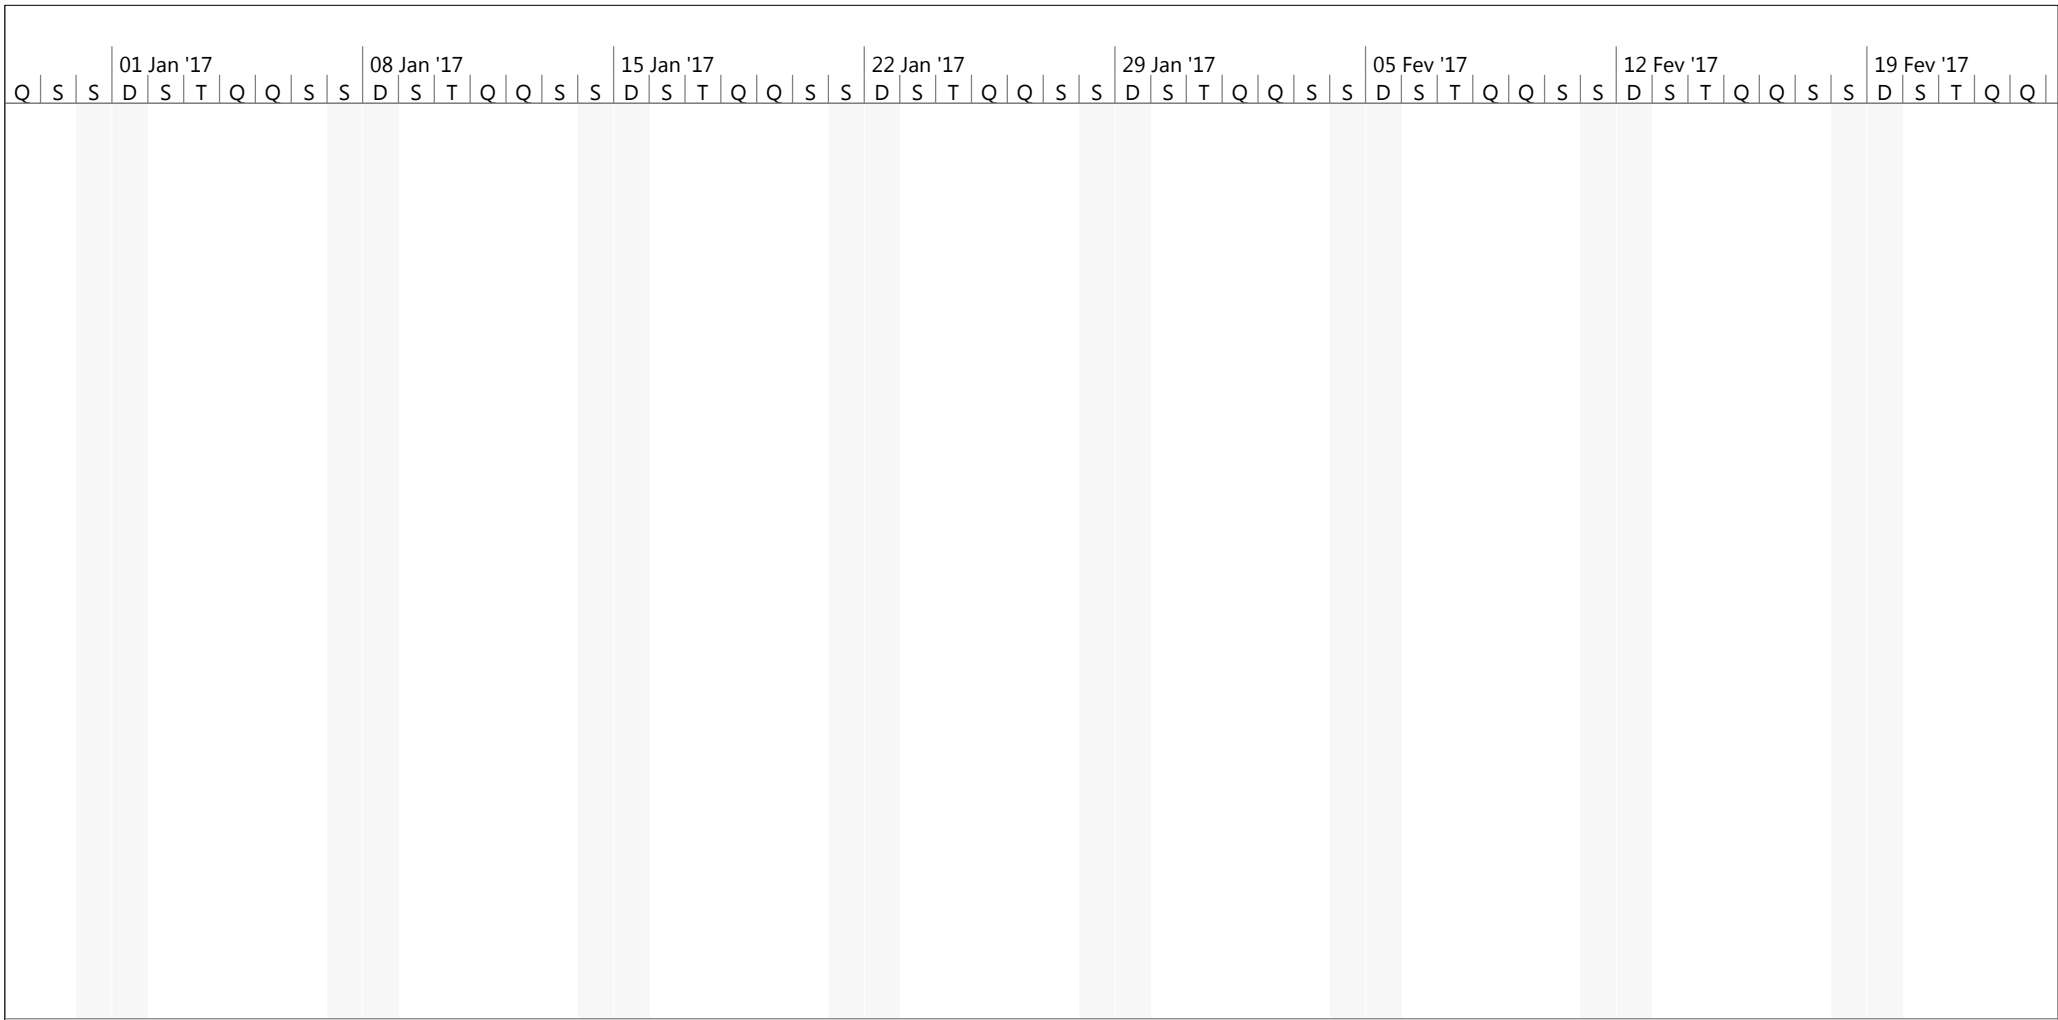


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Q S S D S T Q Q S S 01 Jan '17 08 Jan '17 15 Jan '17 22 Jan '17 29 Jan '17 05 Fev '17 12 Fev '17 19 Fev '17

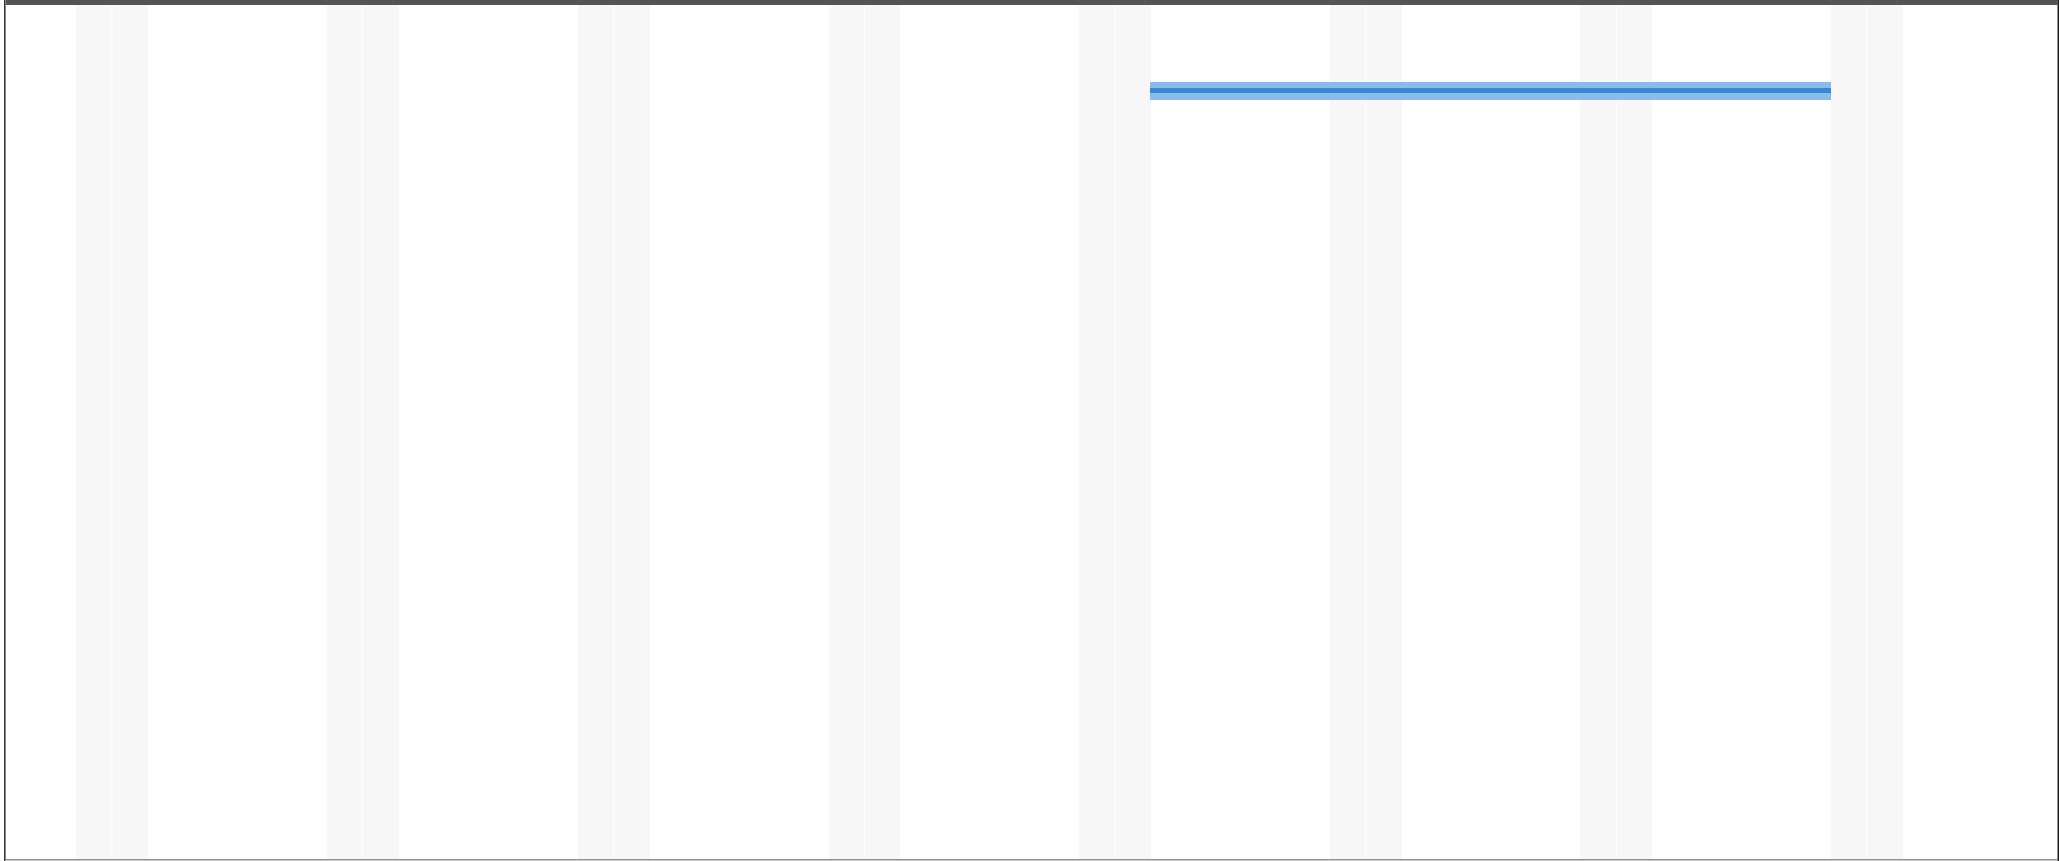


Projeto: SIGEP 10.06.2016
Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

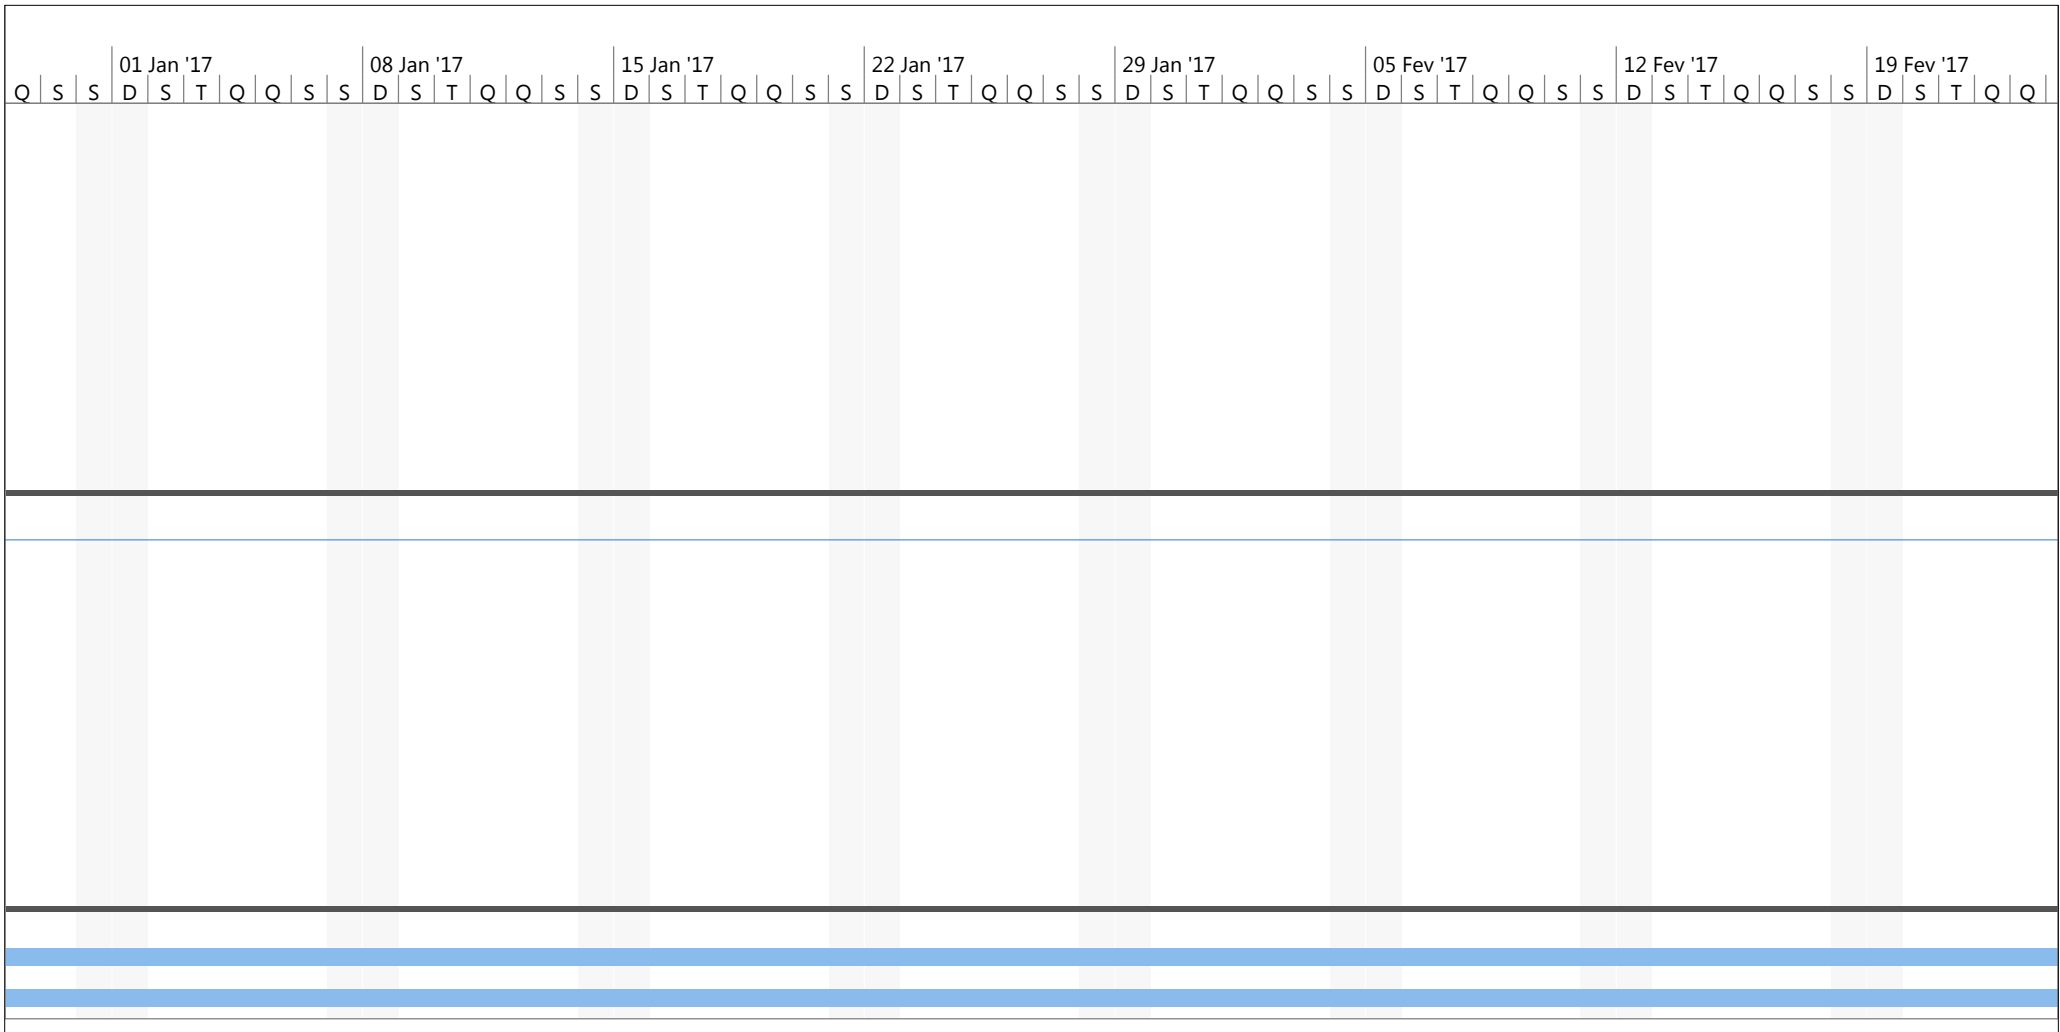


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

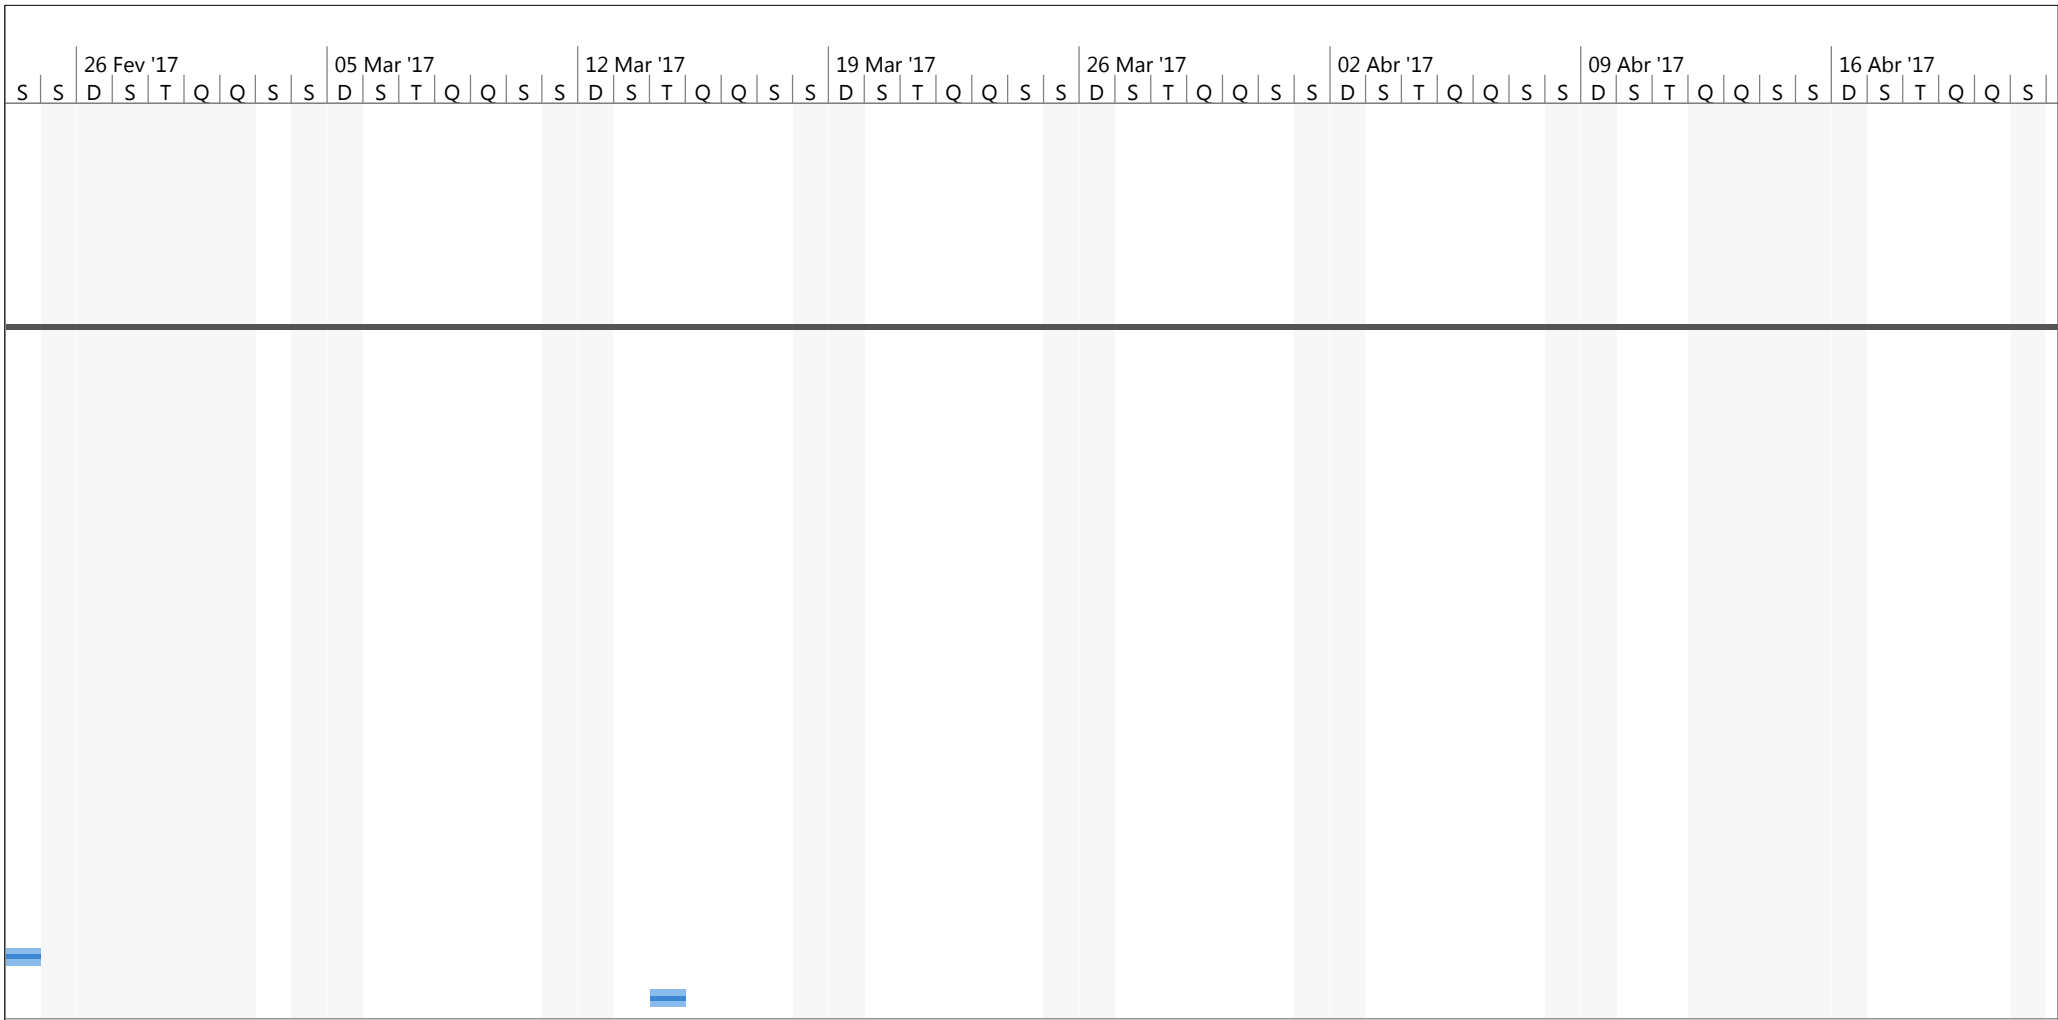


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

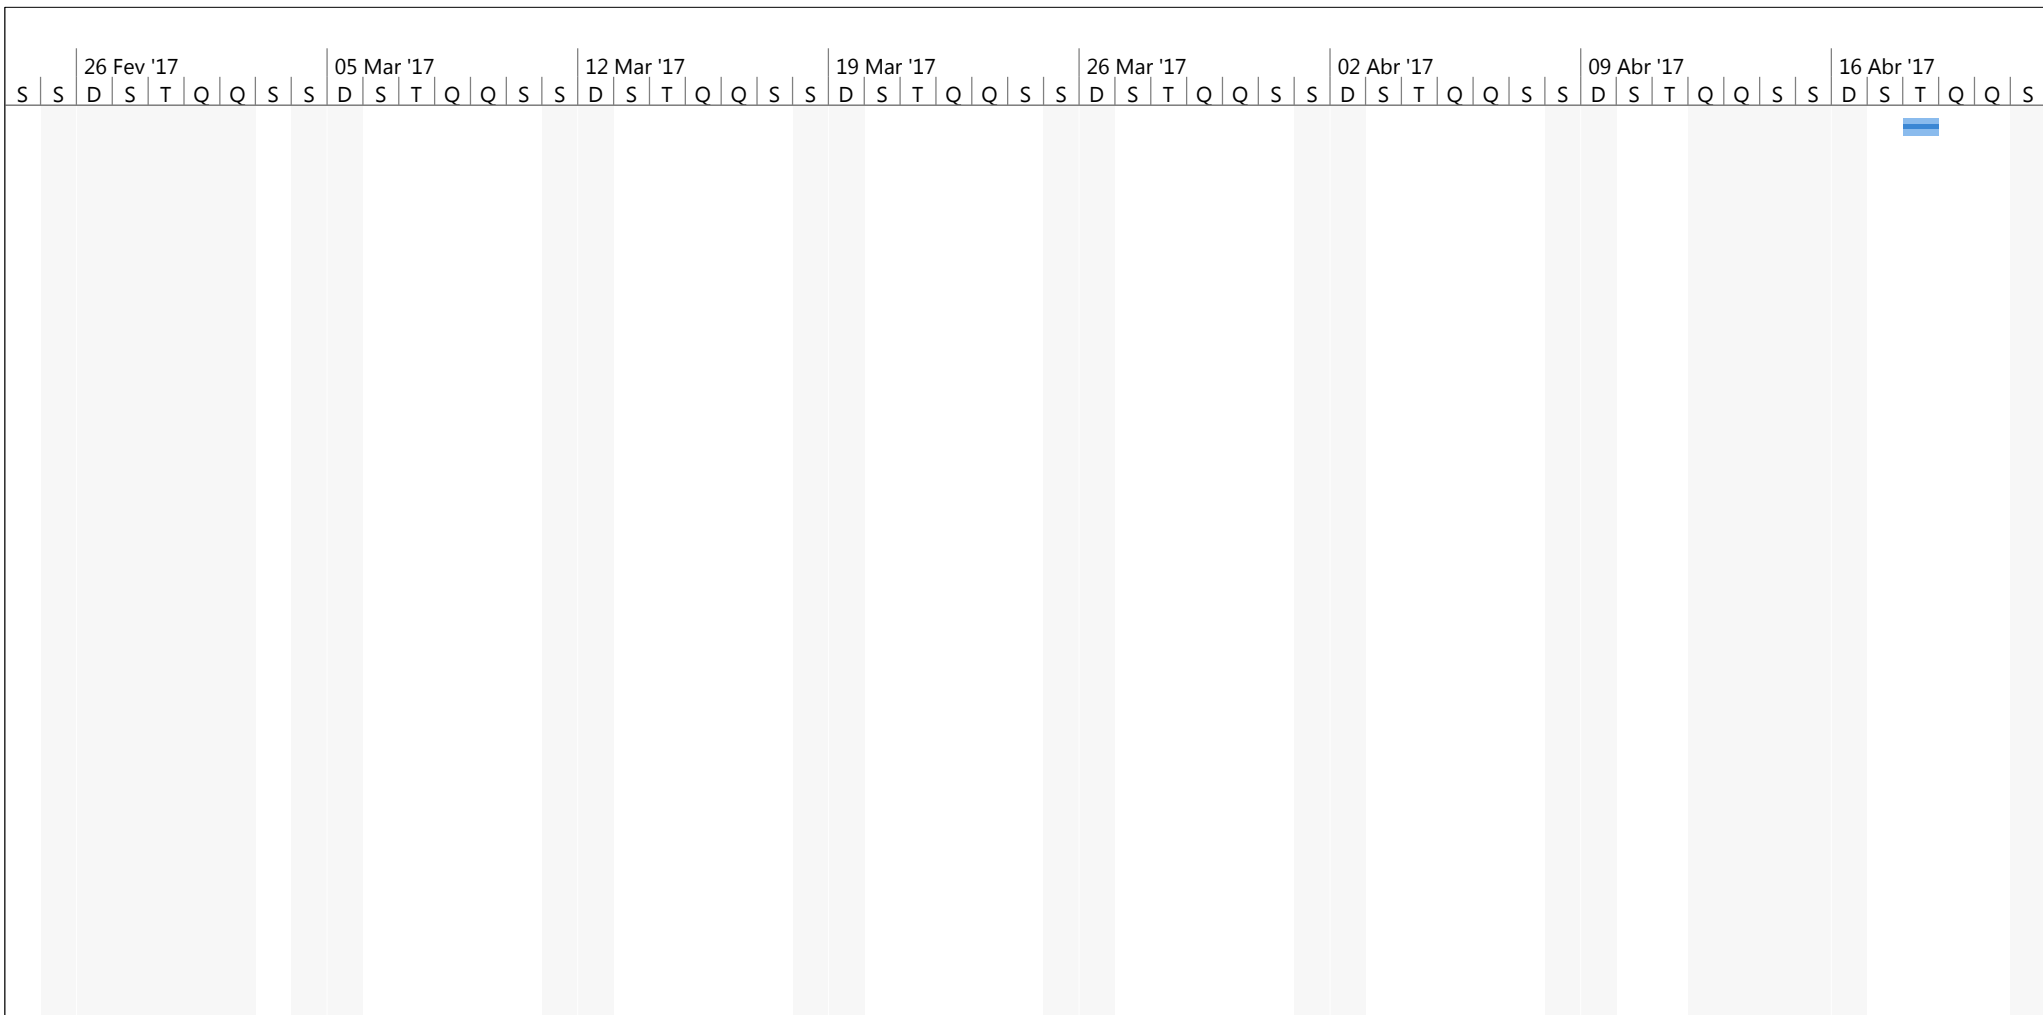


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

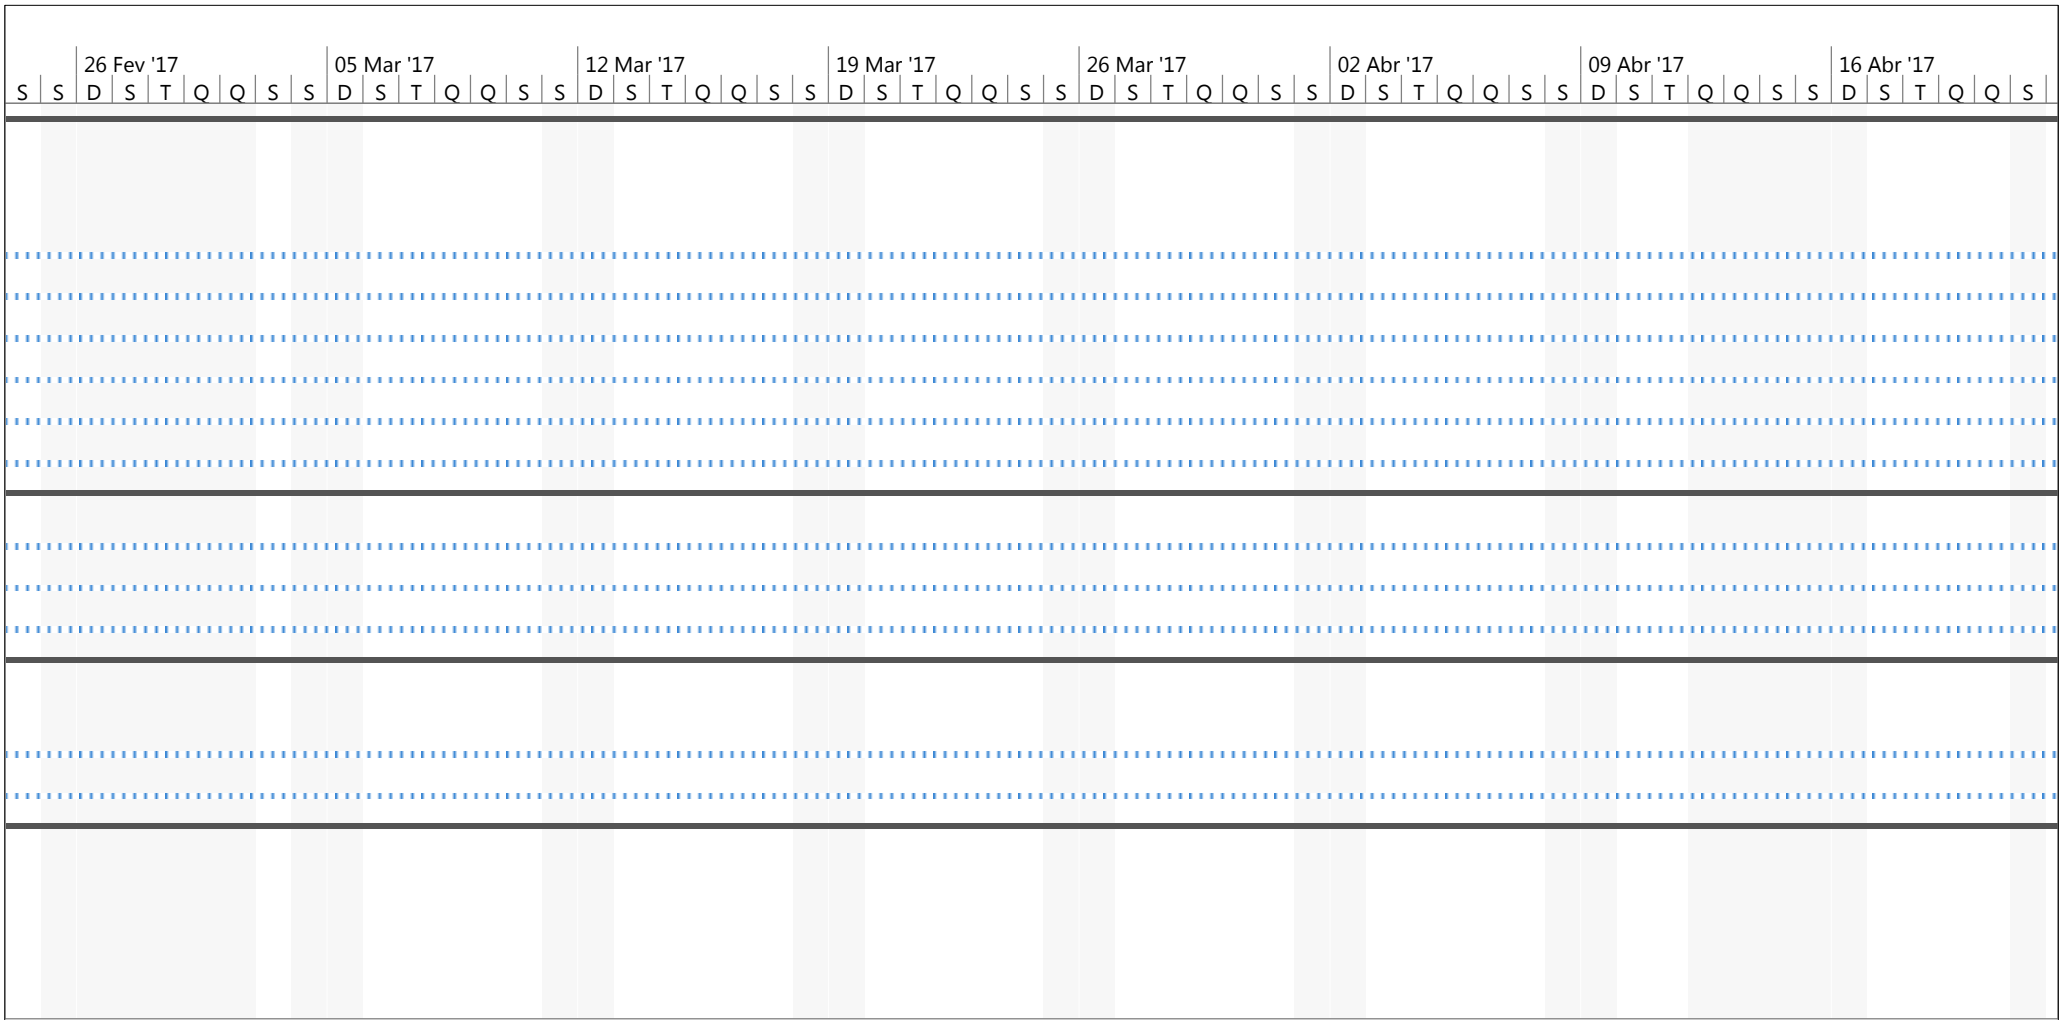


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

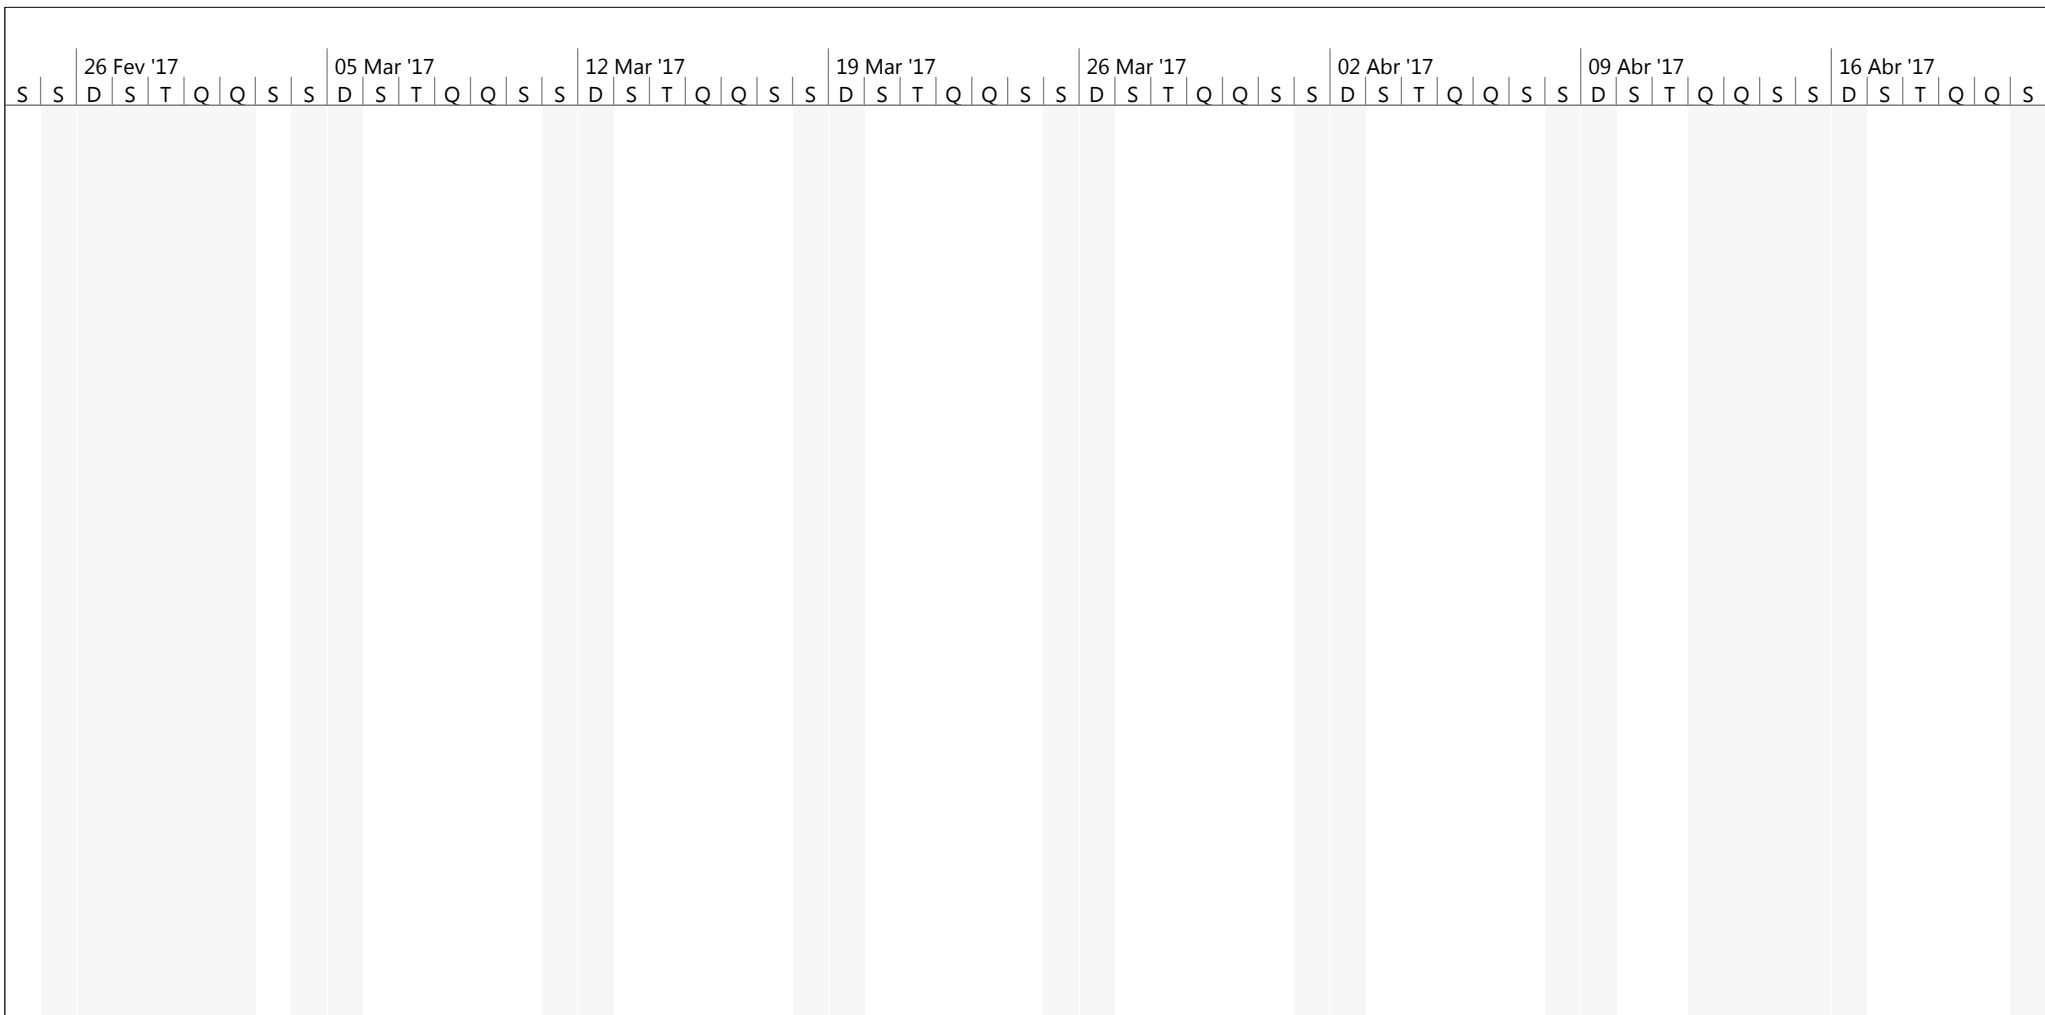


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

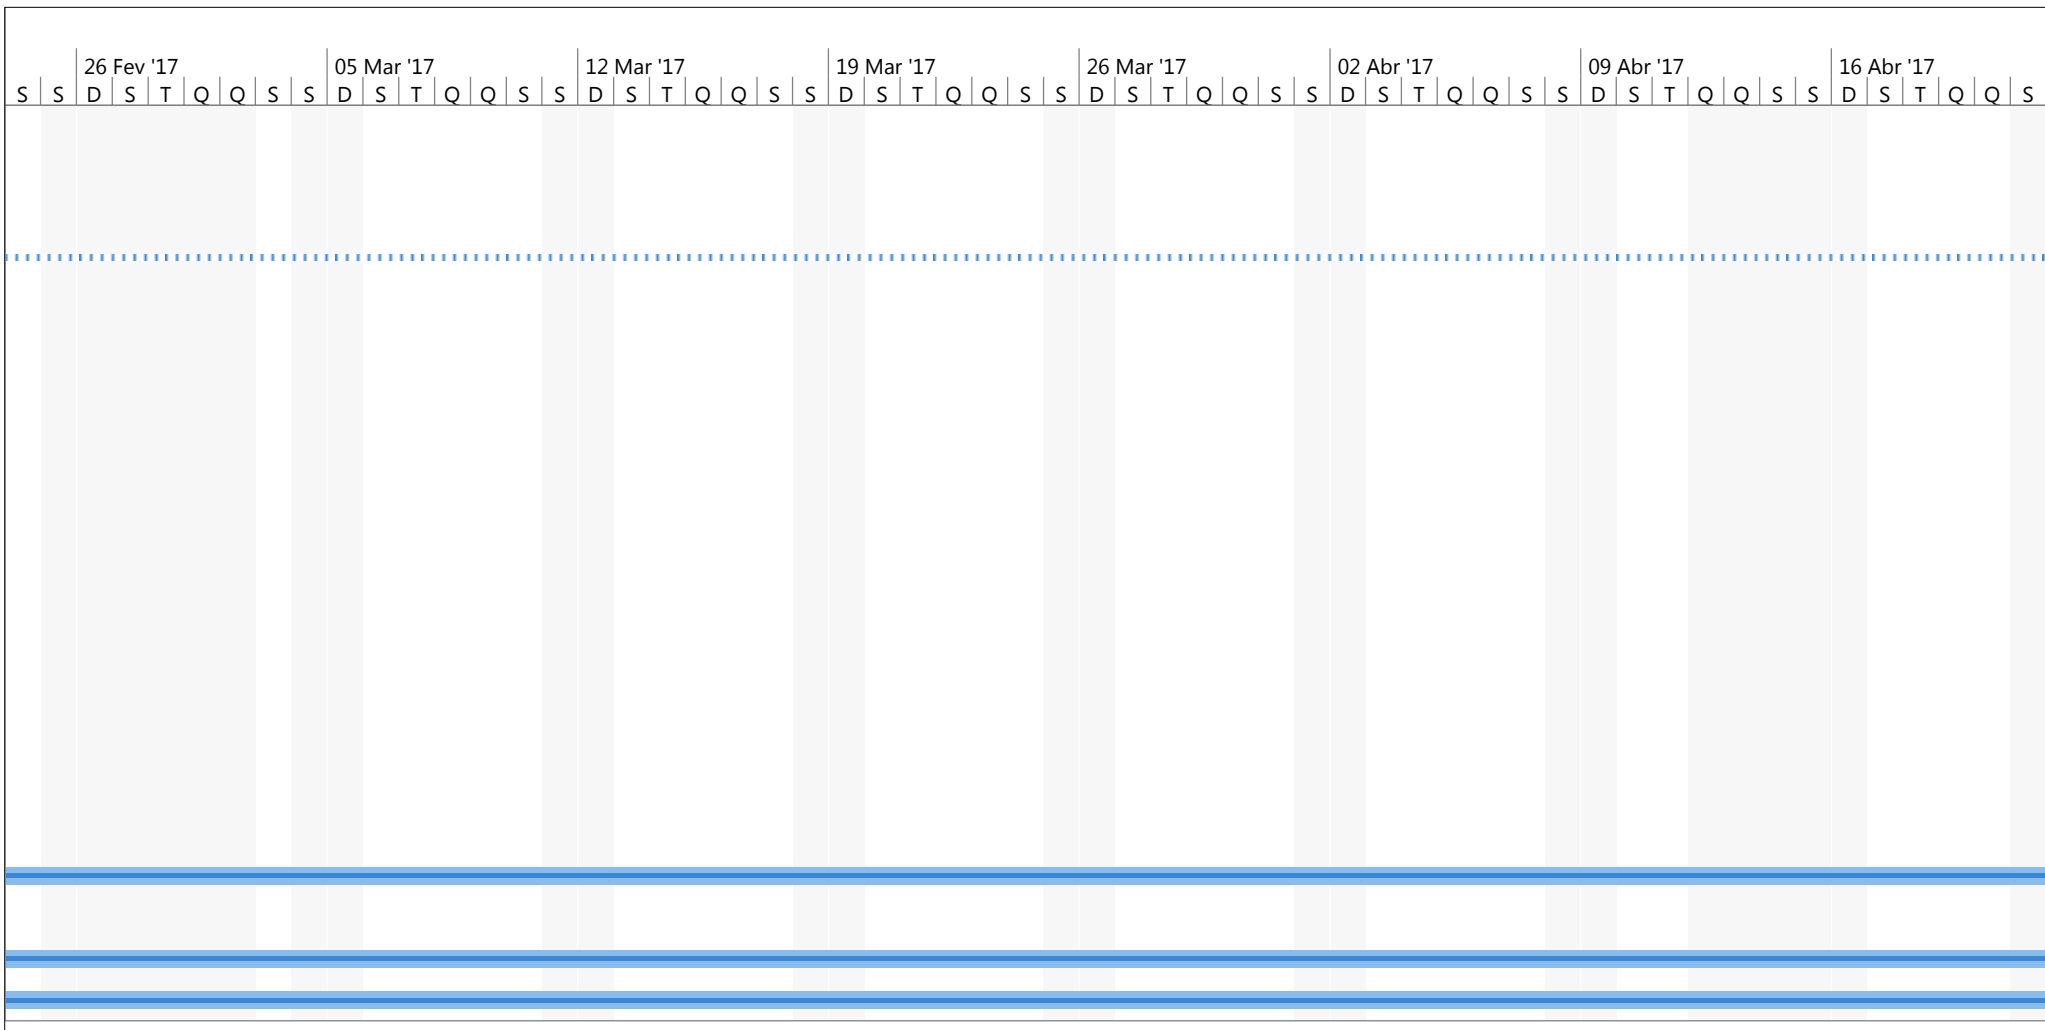


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

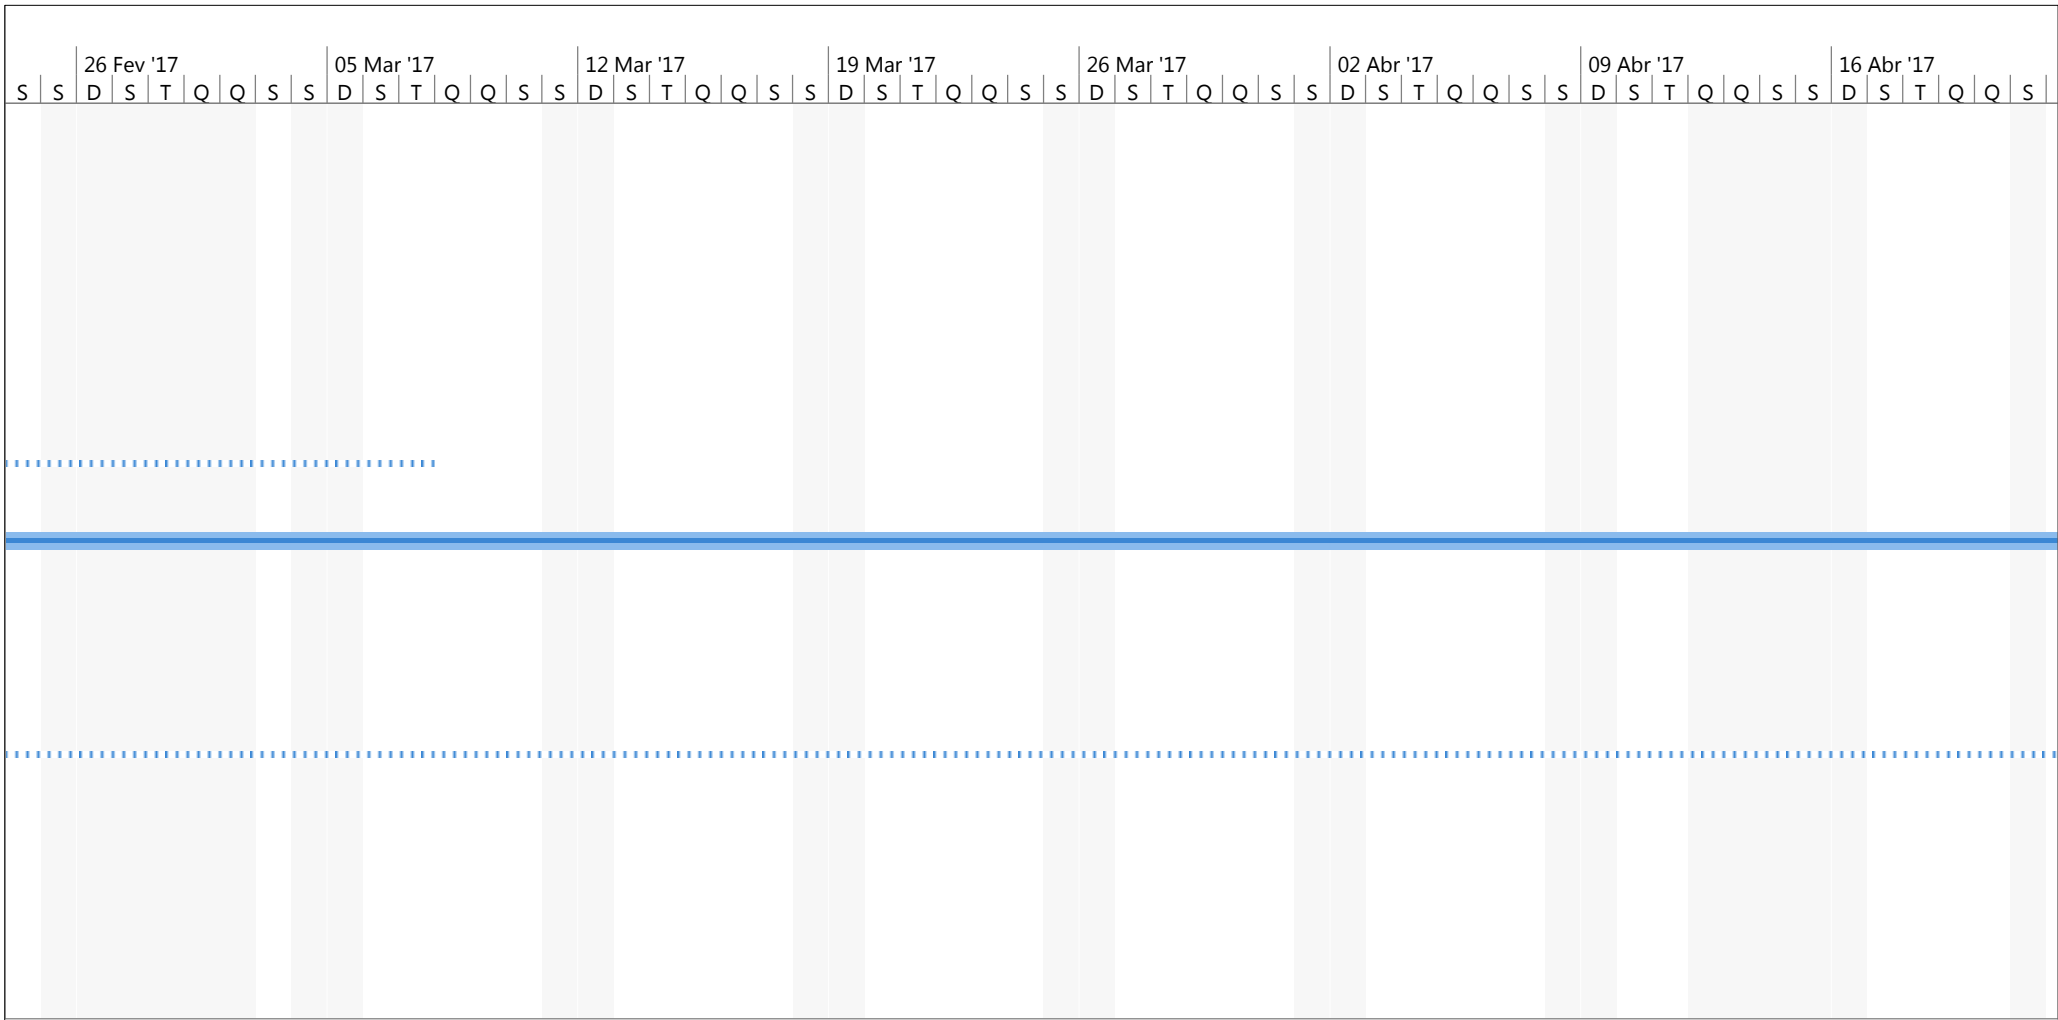


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

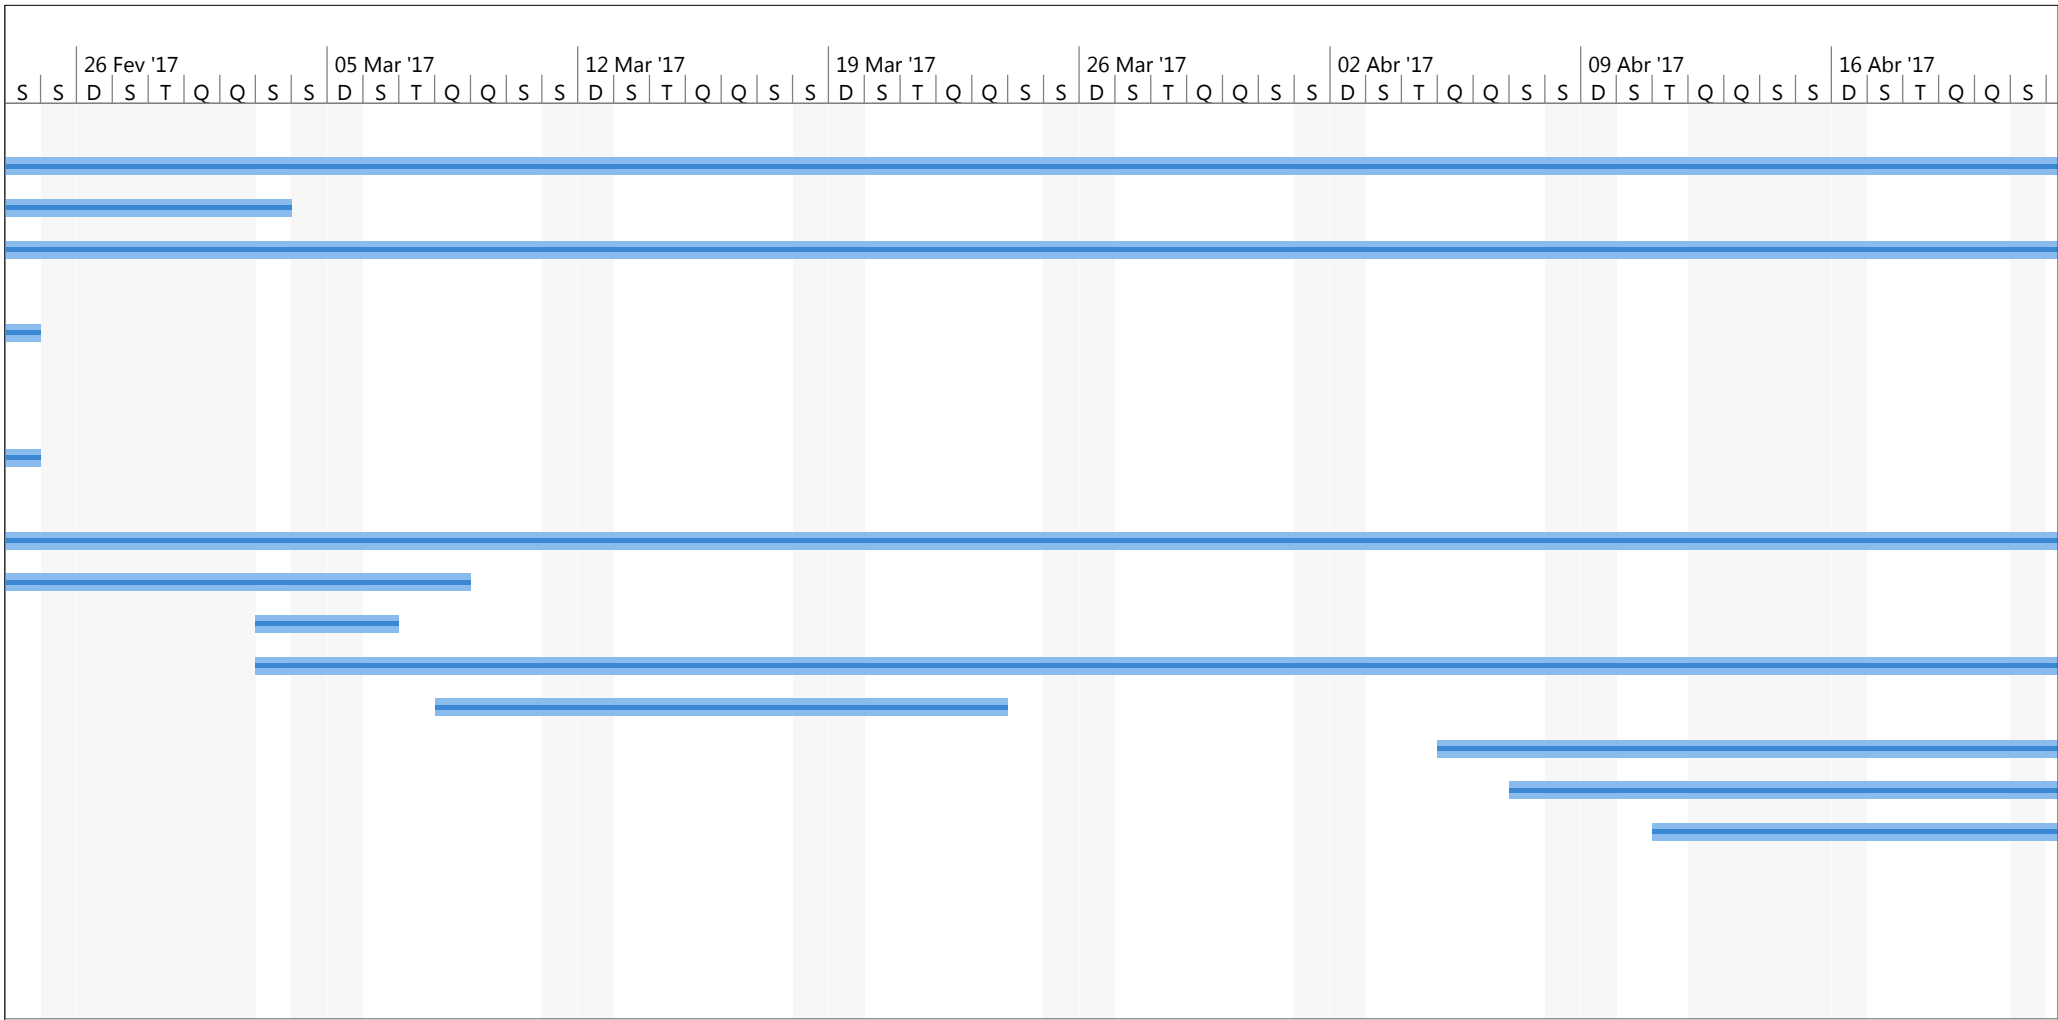


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

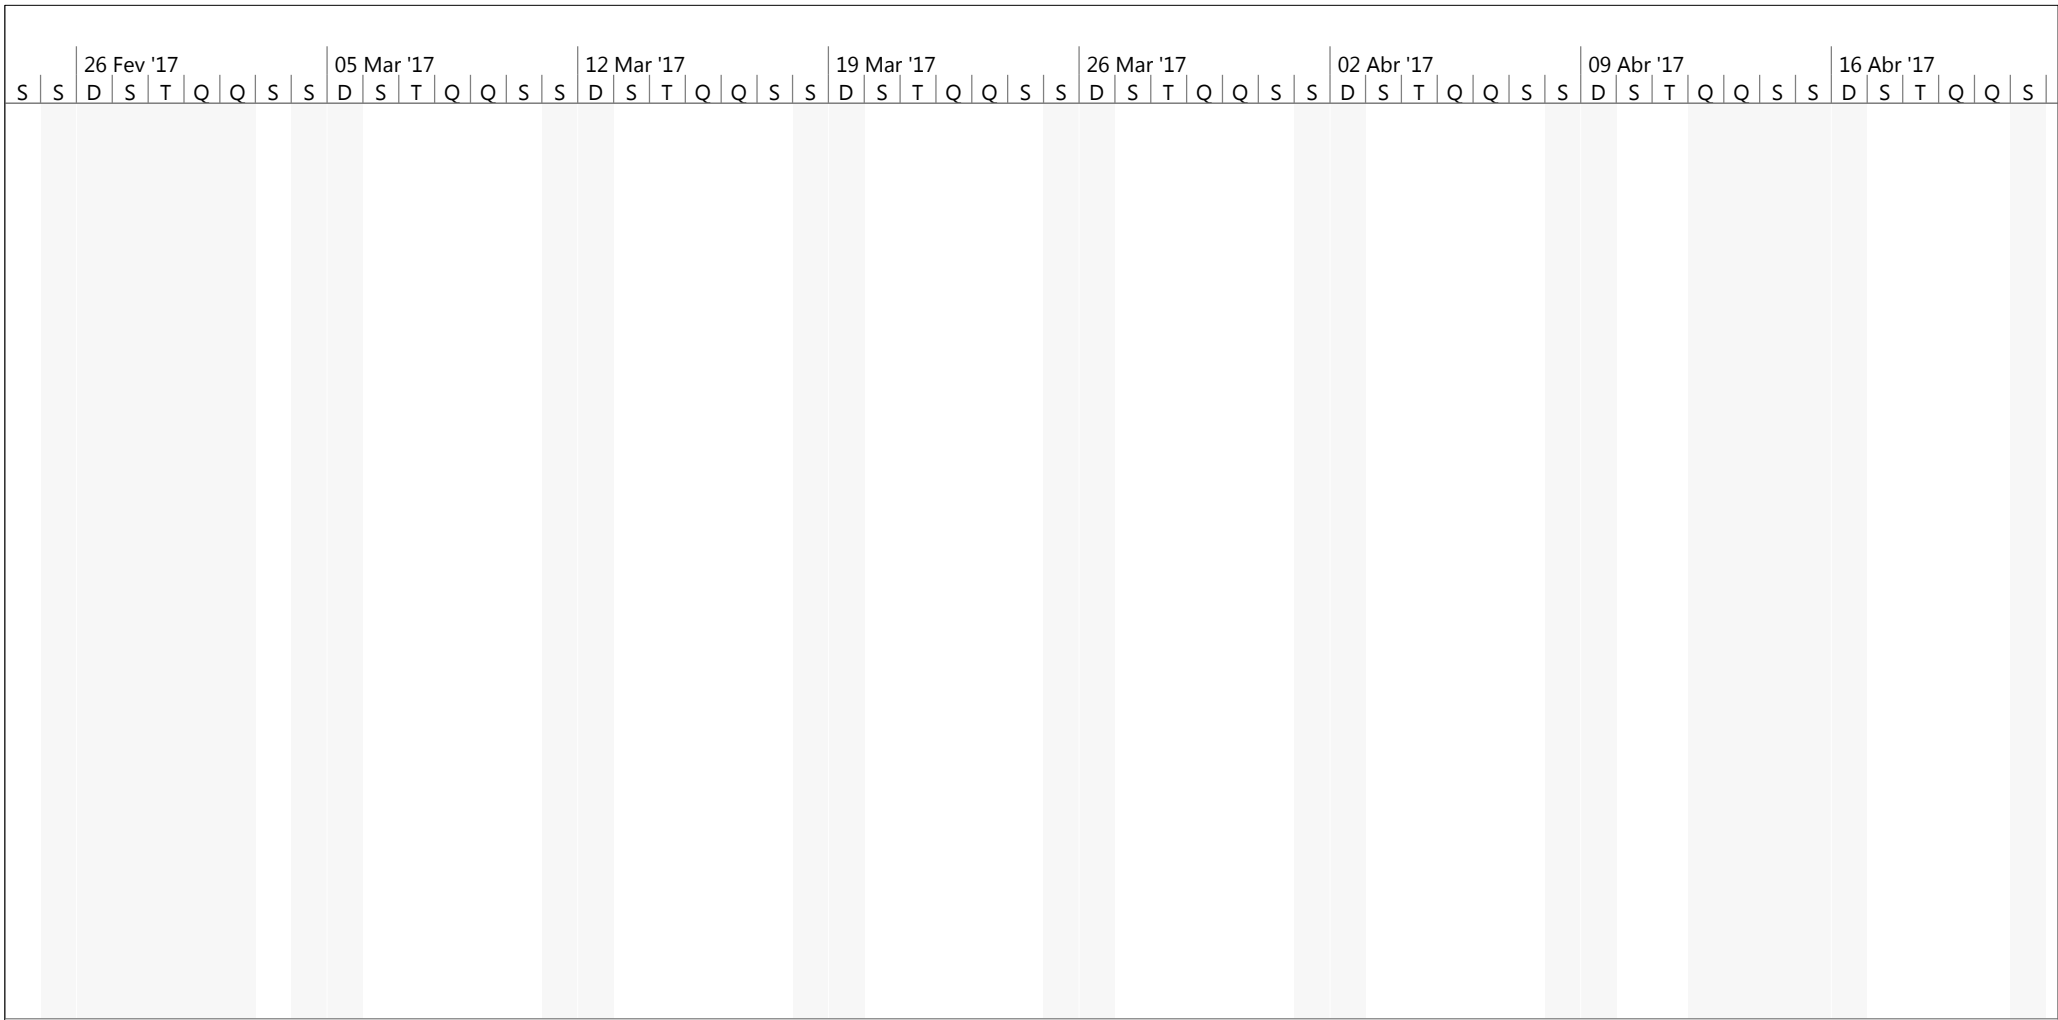


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

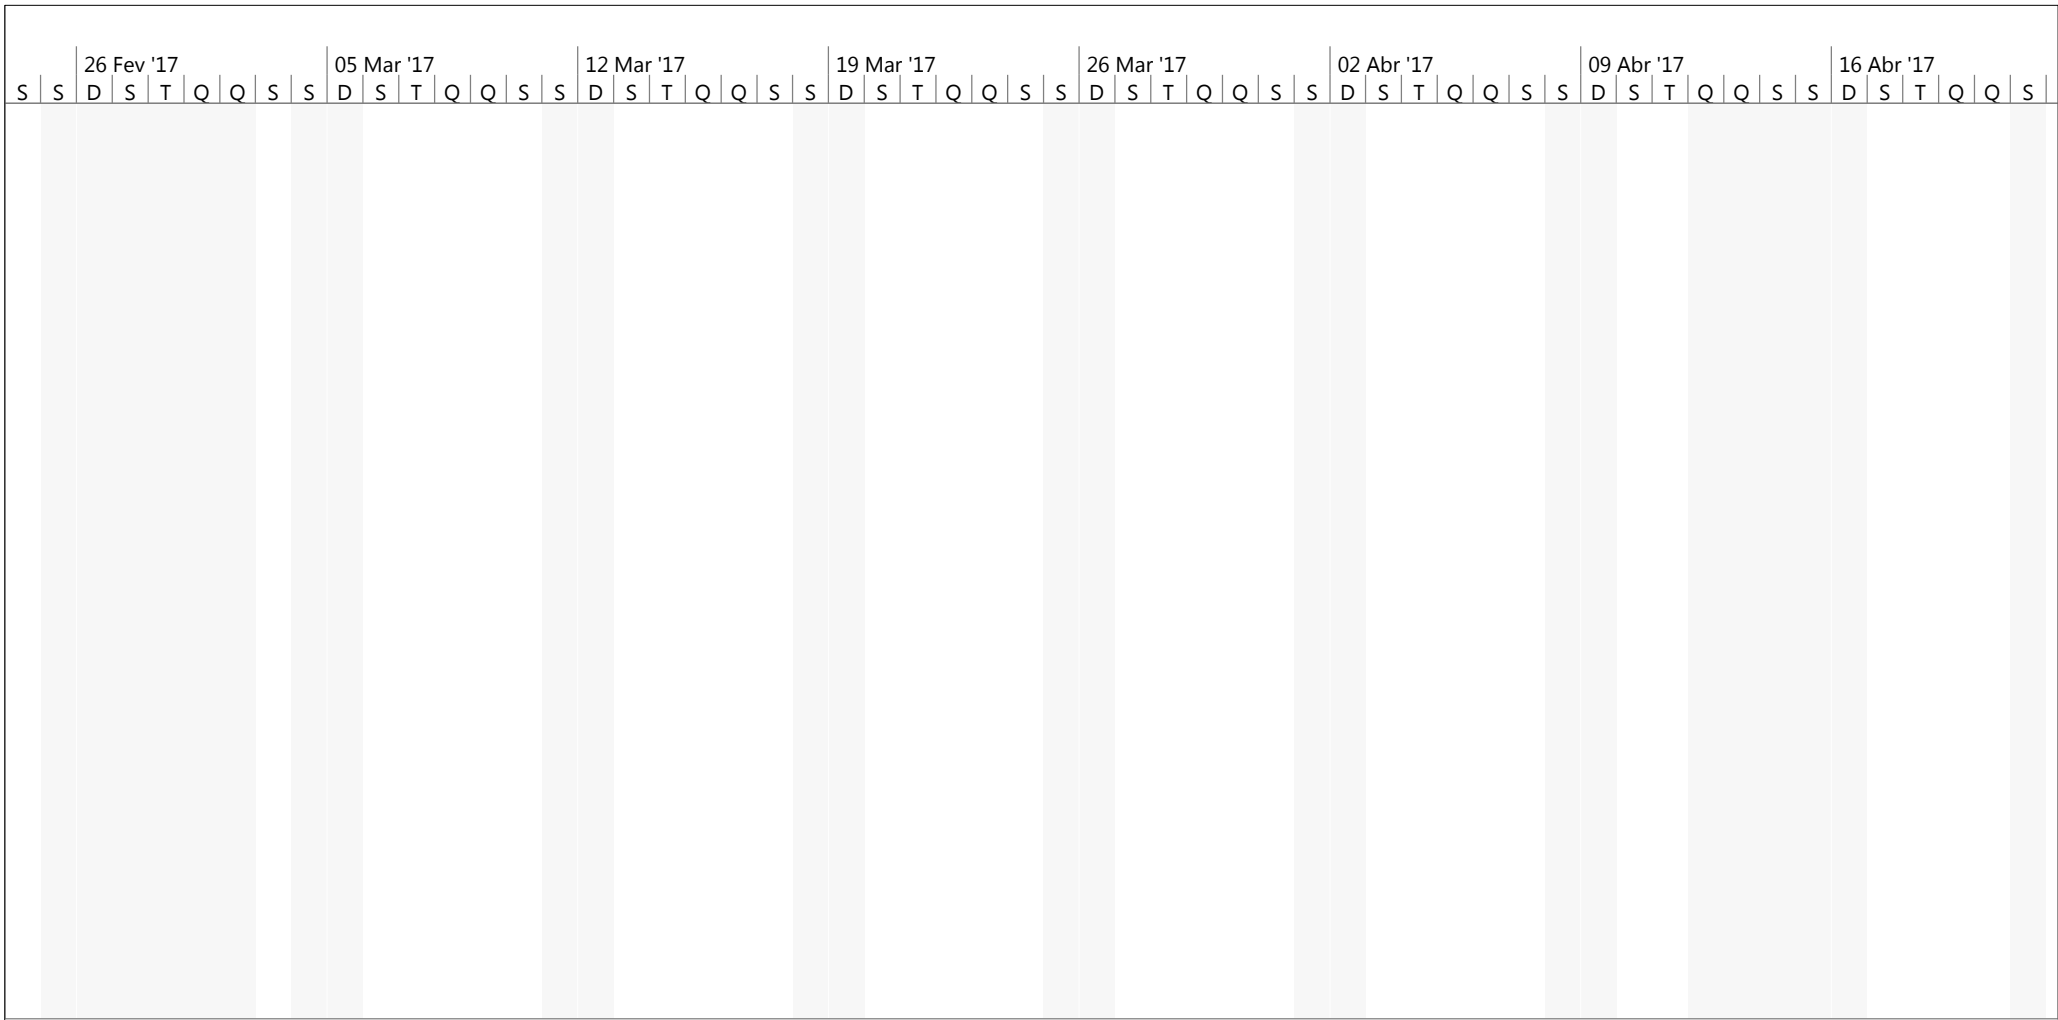


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

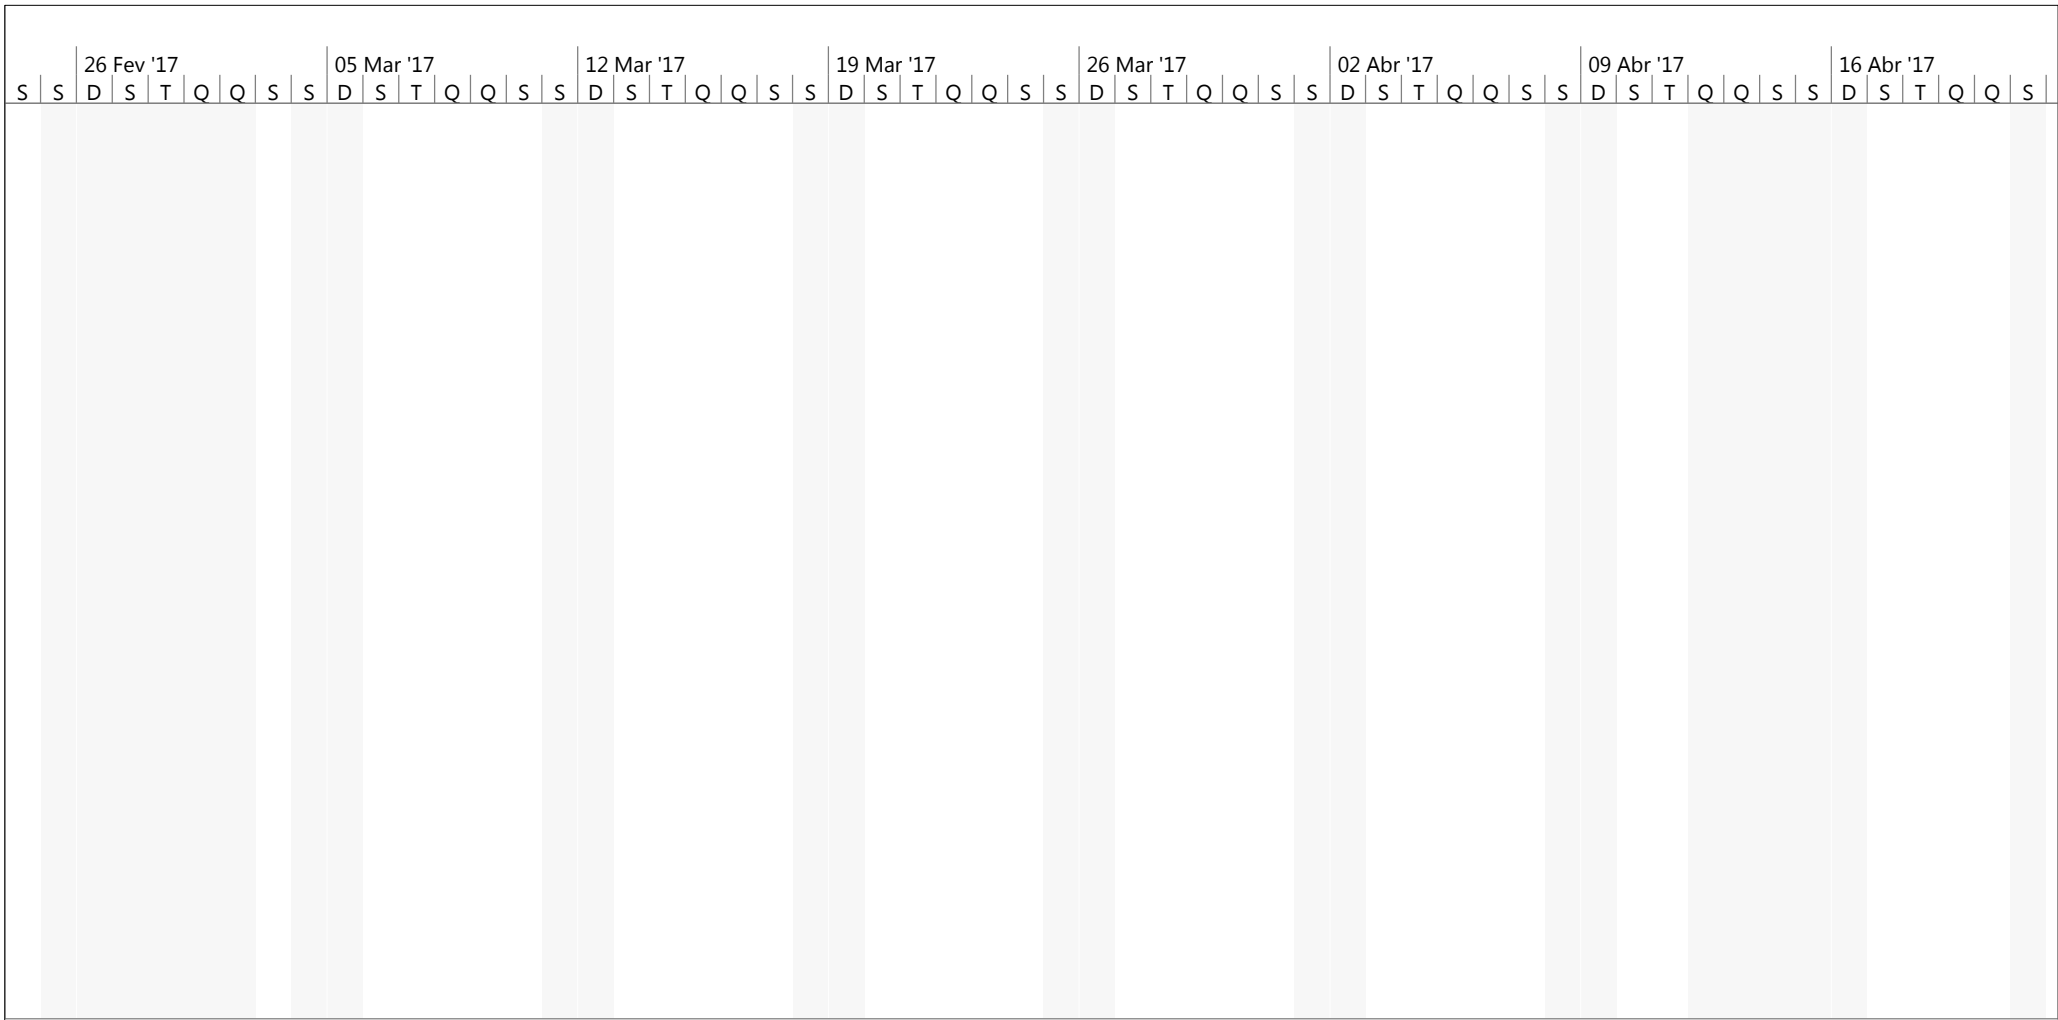


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

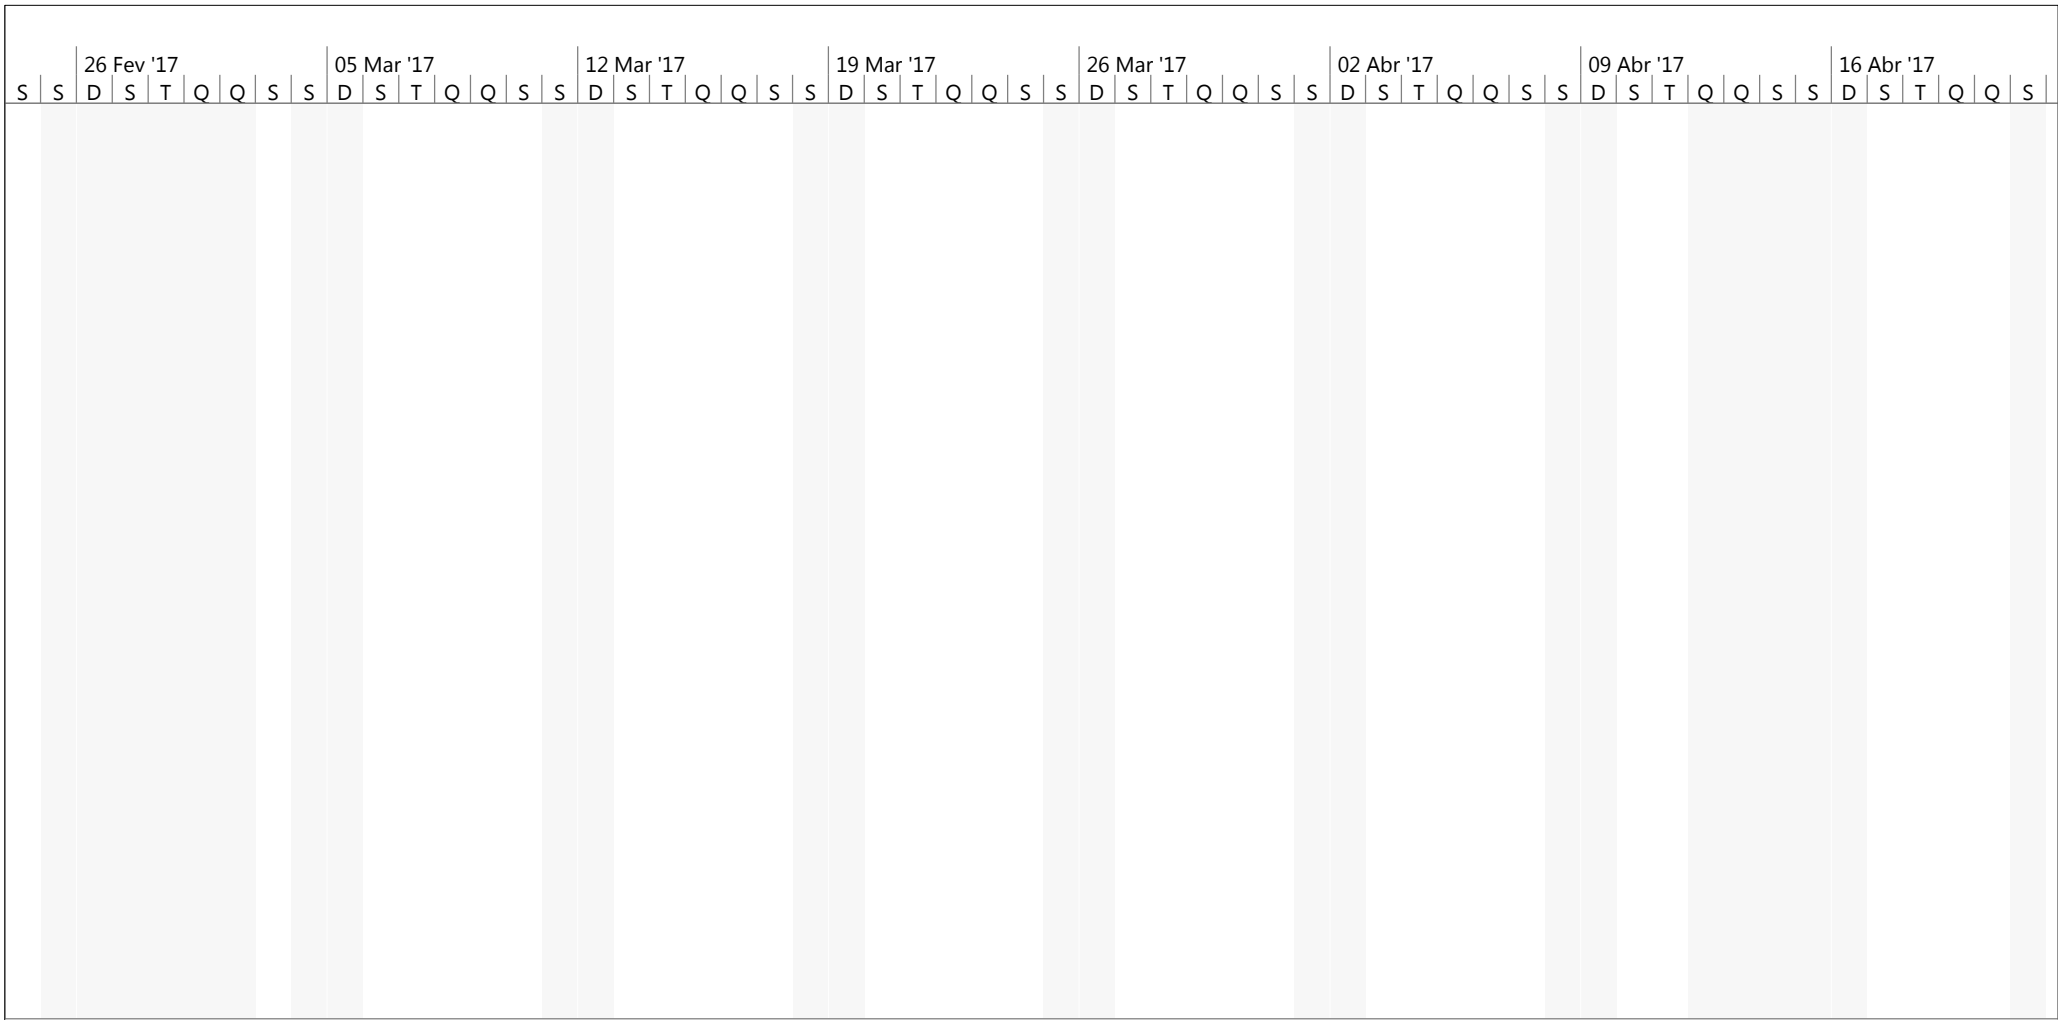

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

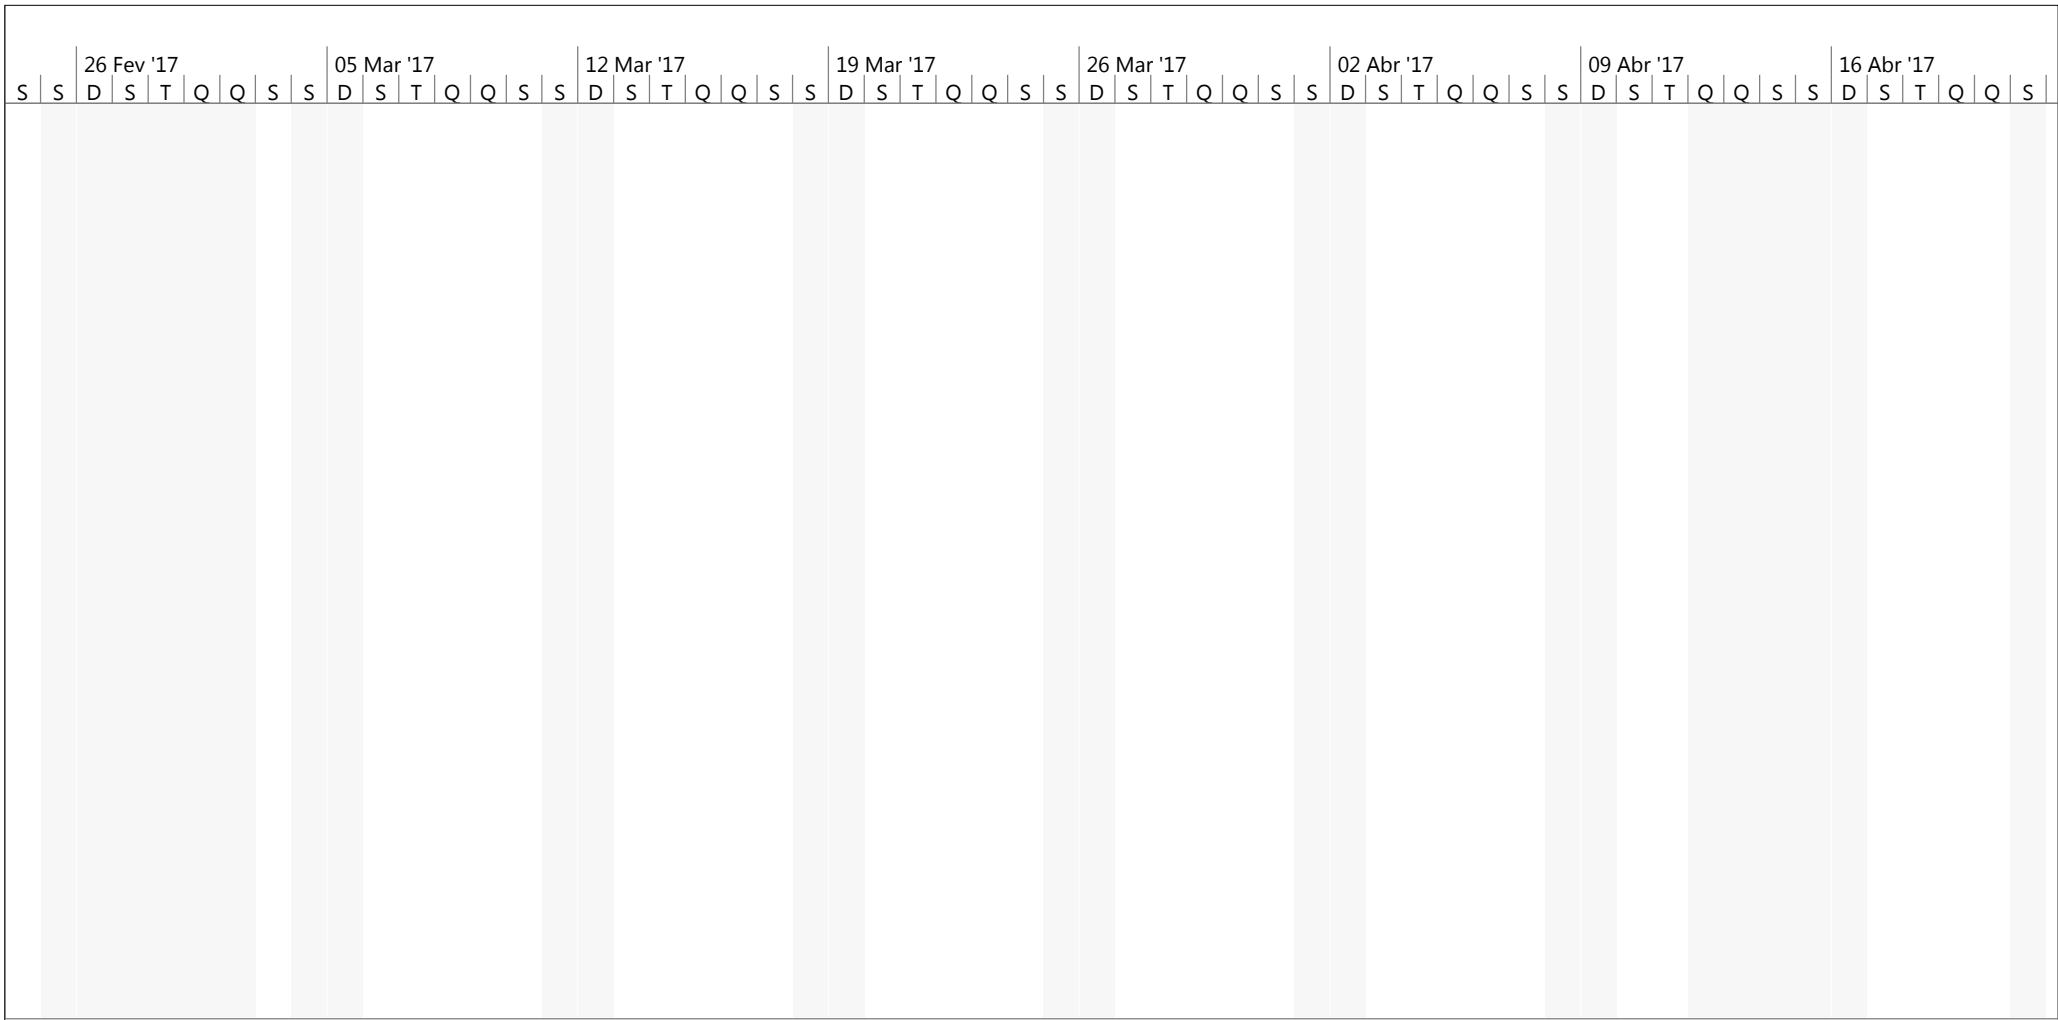


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

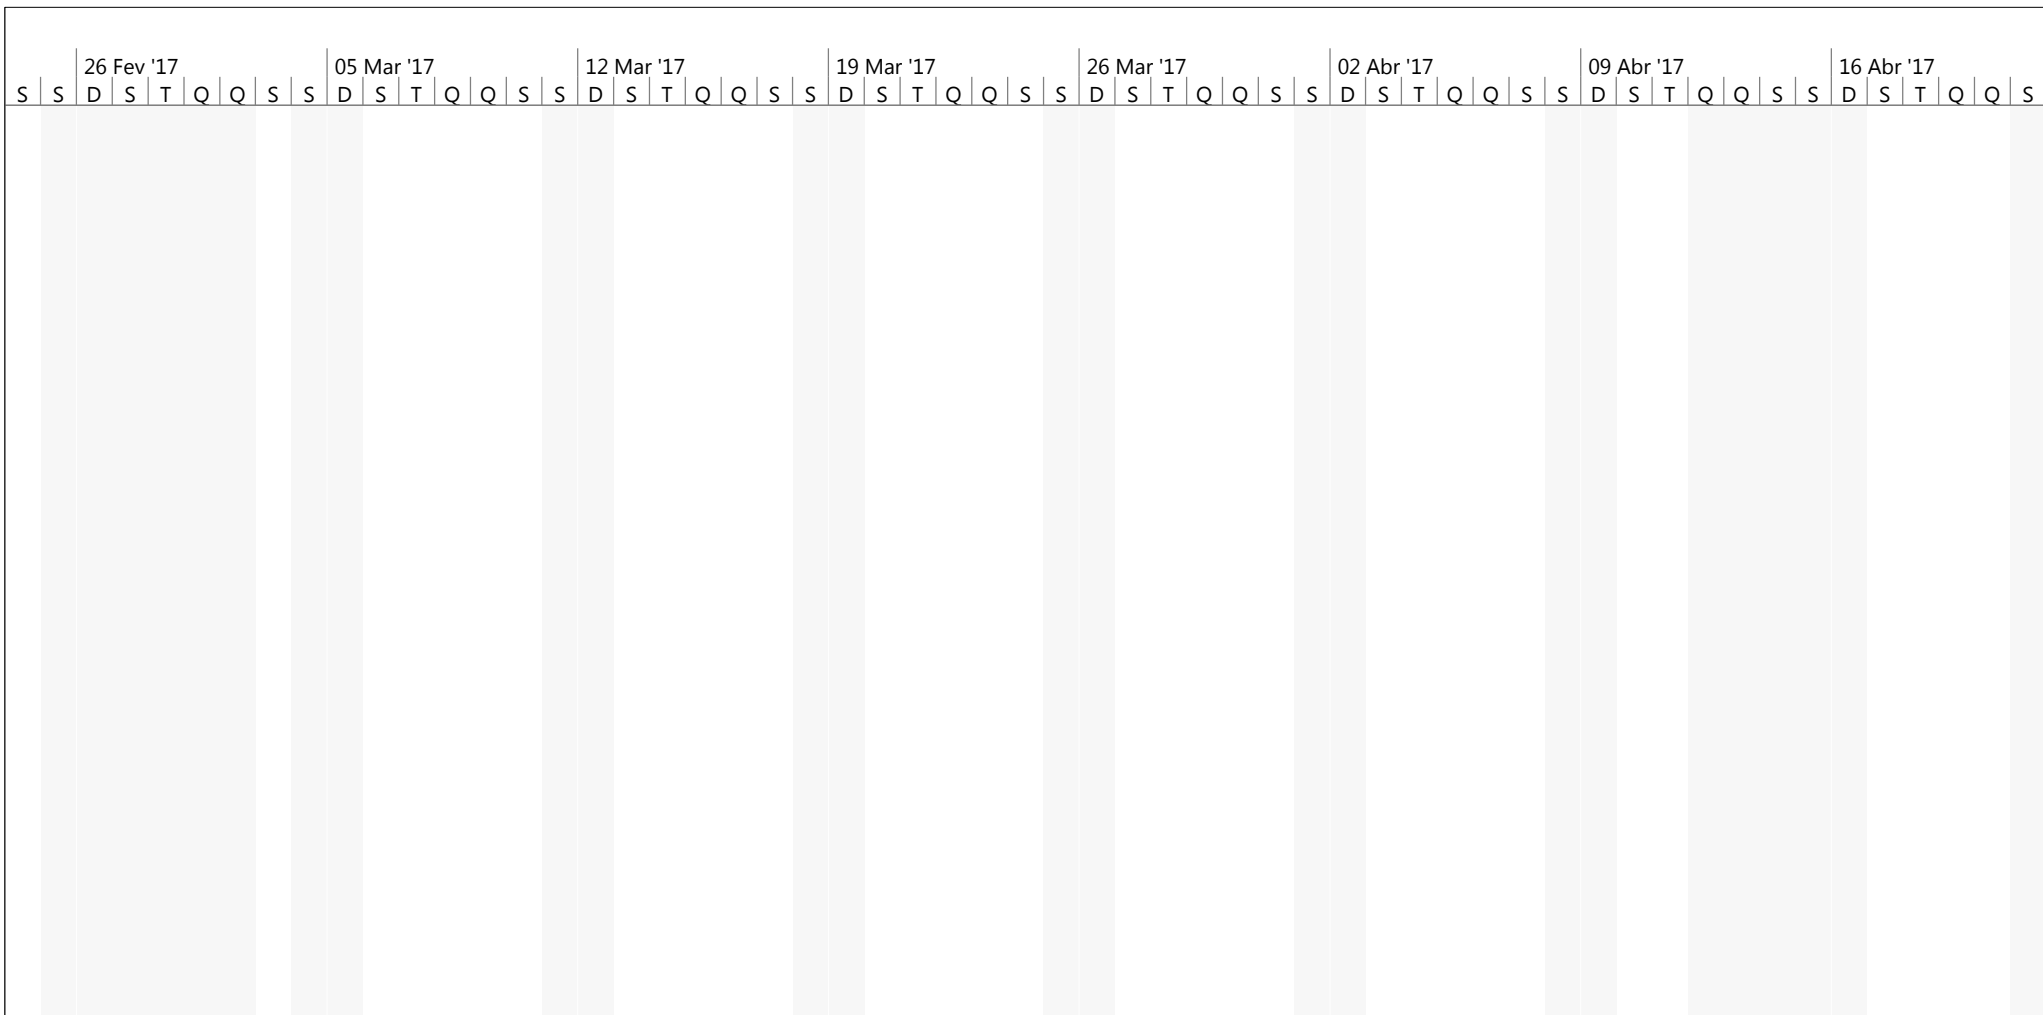


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


S S D S T Q Q S S 26 Fev '17 05 Mar '17 12 Mar '17 19 Mar '17 26 Mar '17 02 Abr '17 09 Abr '17 16 Abr '17

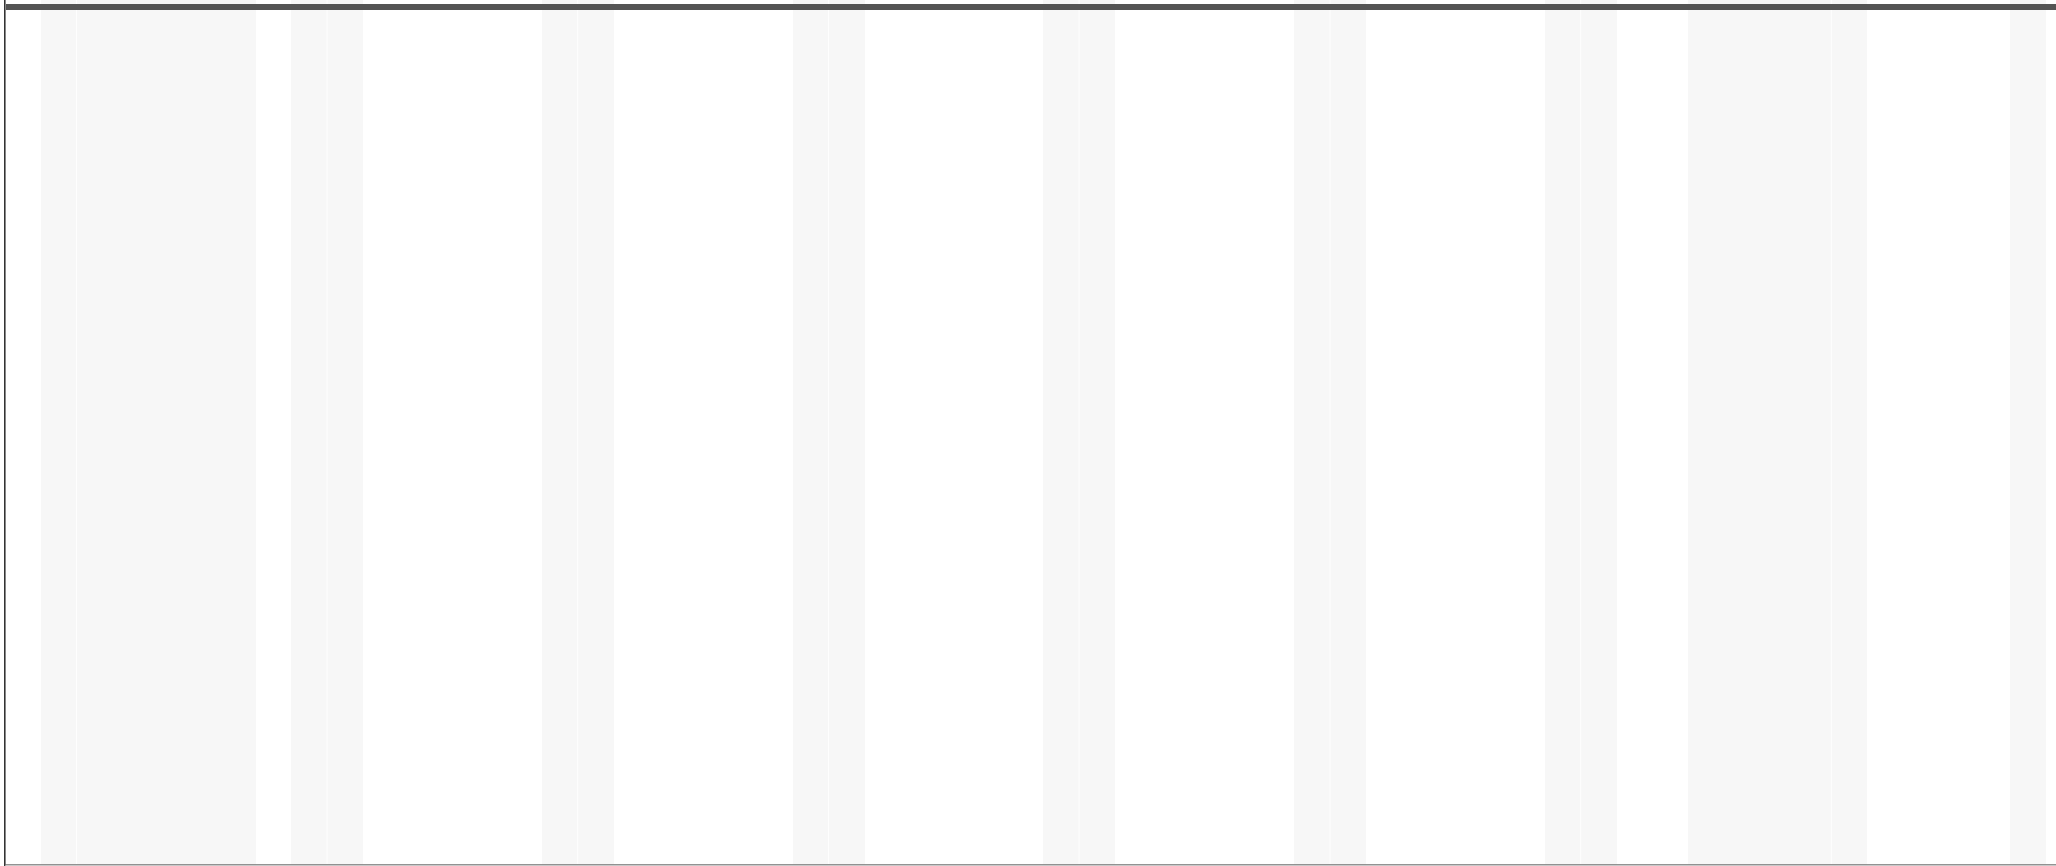


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

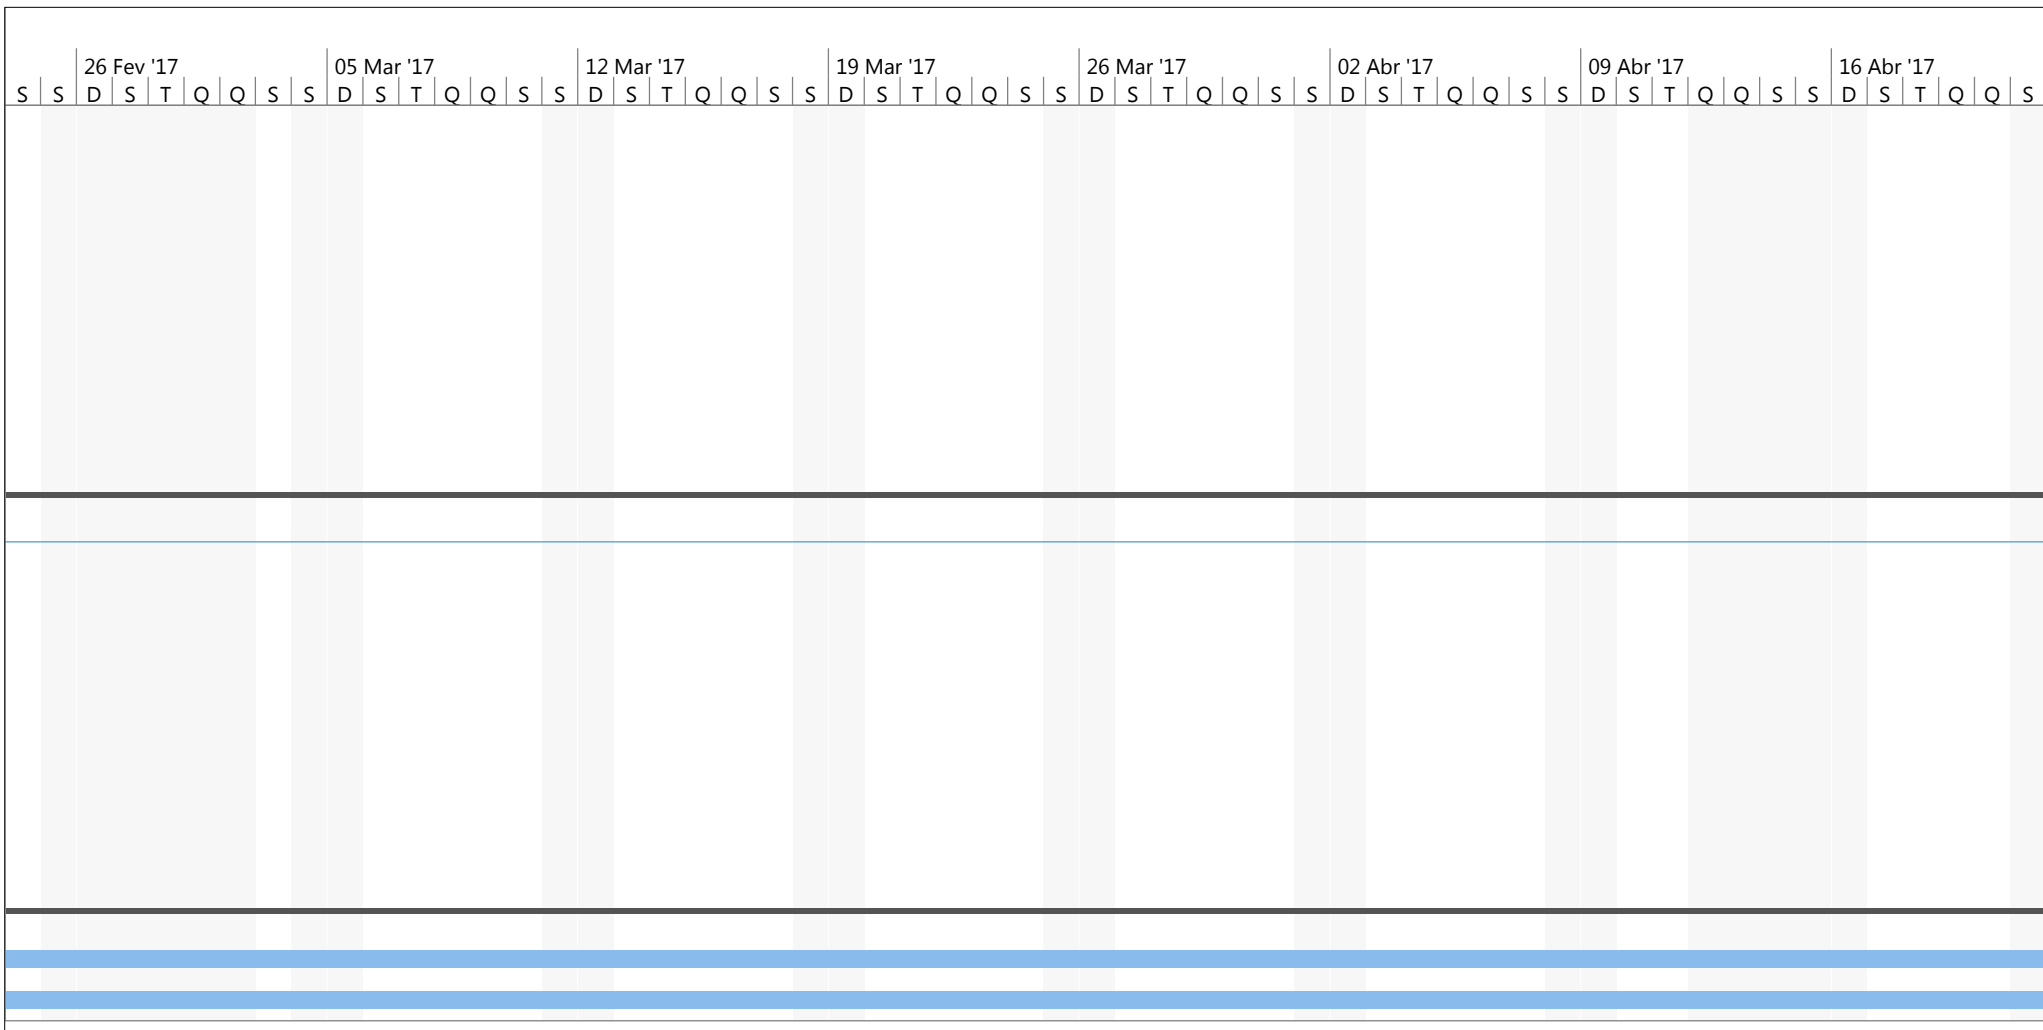


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

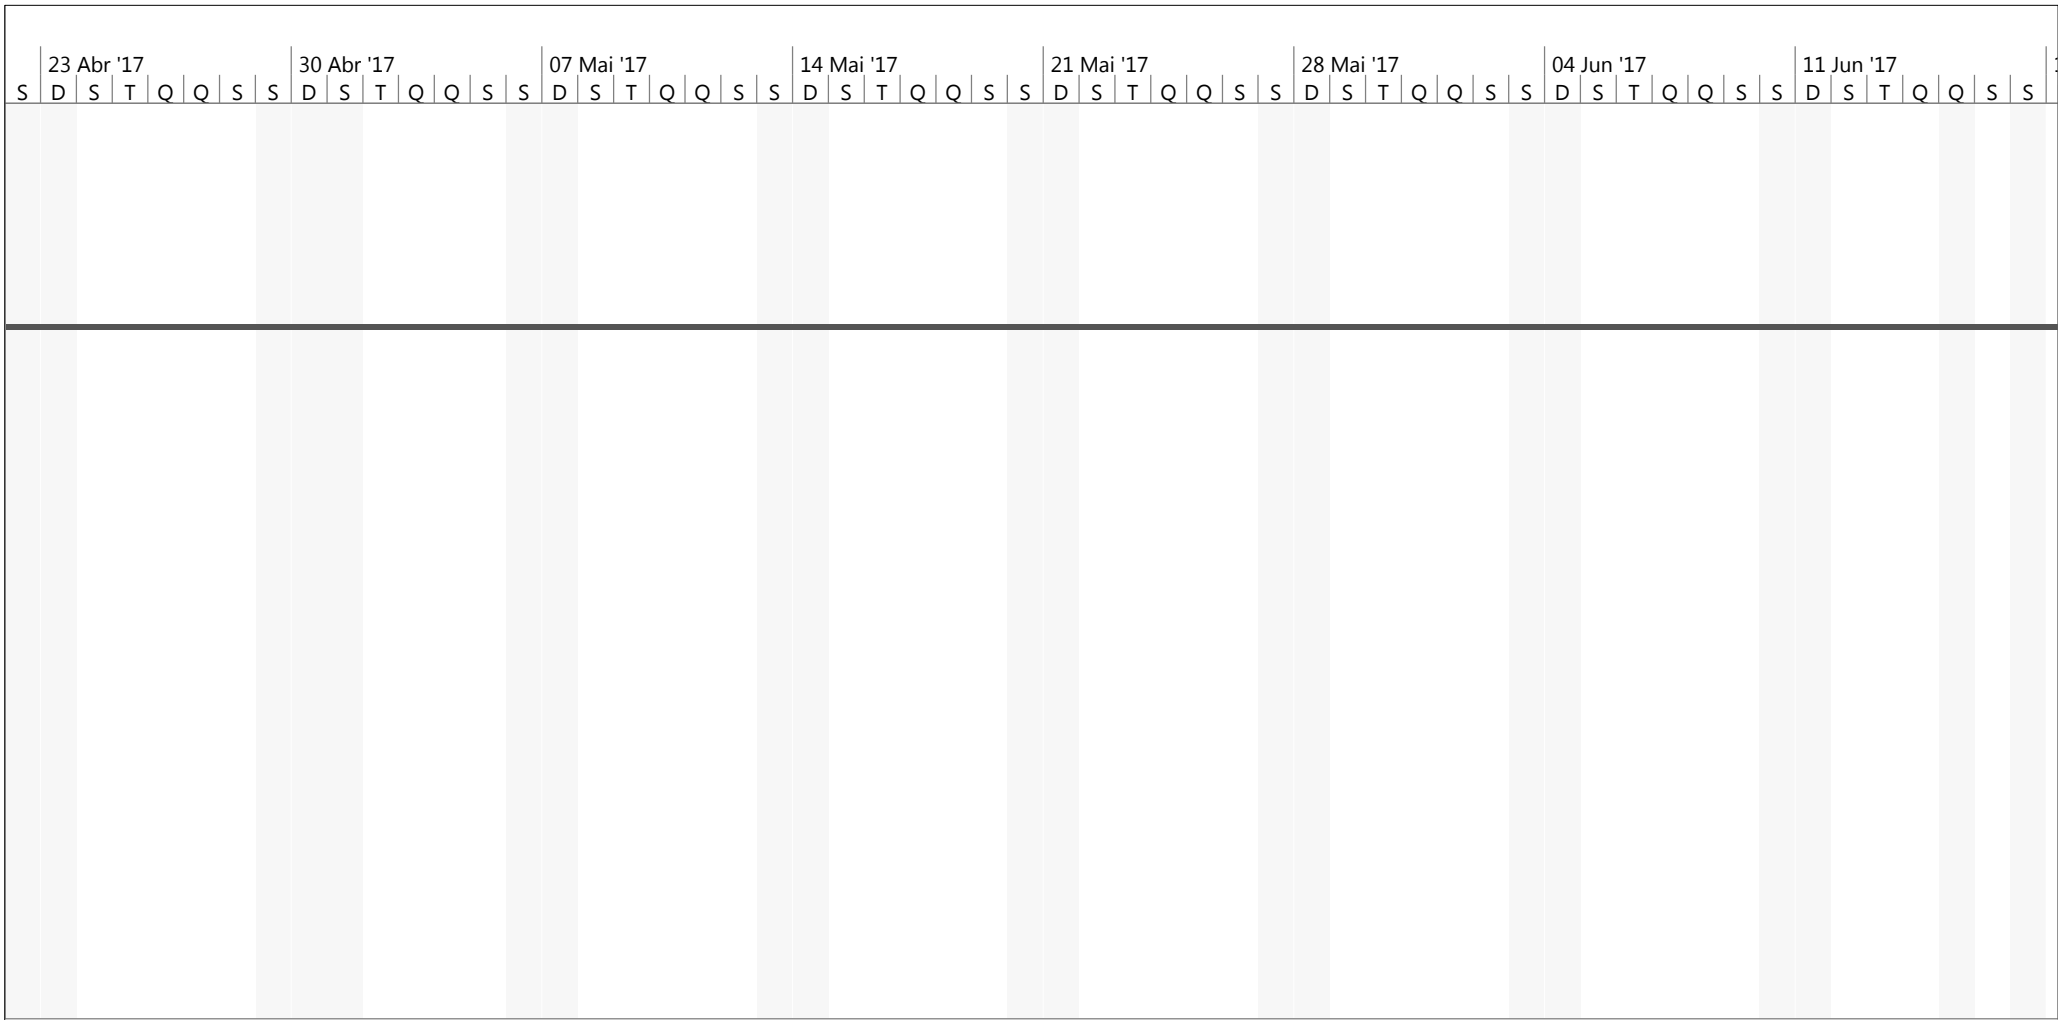


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

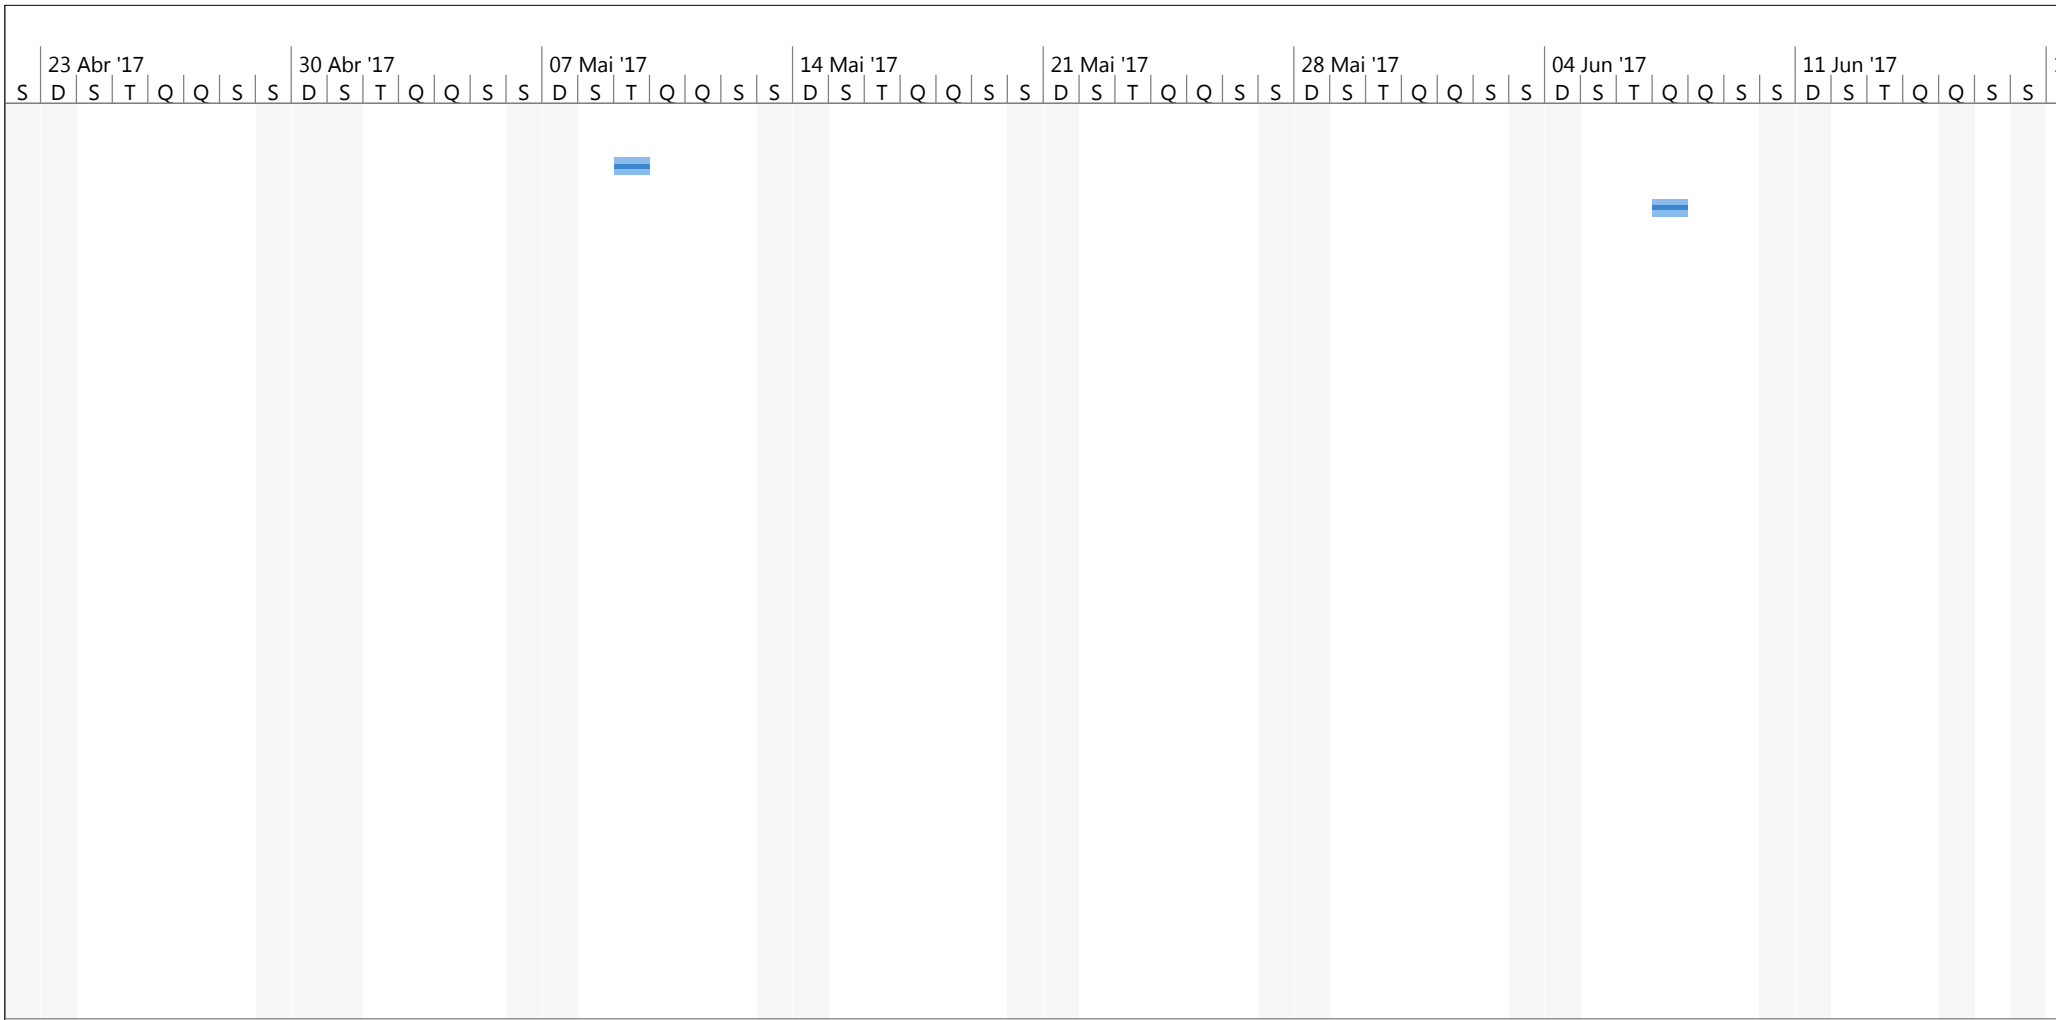


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

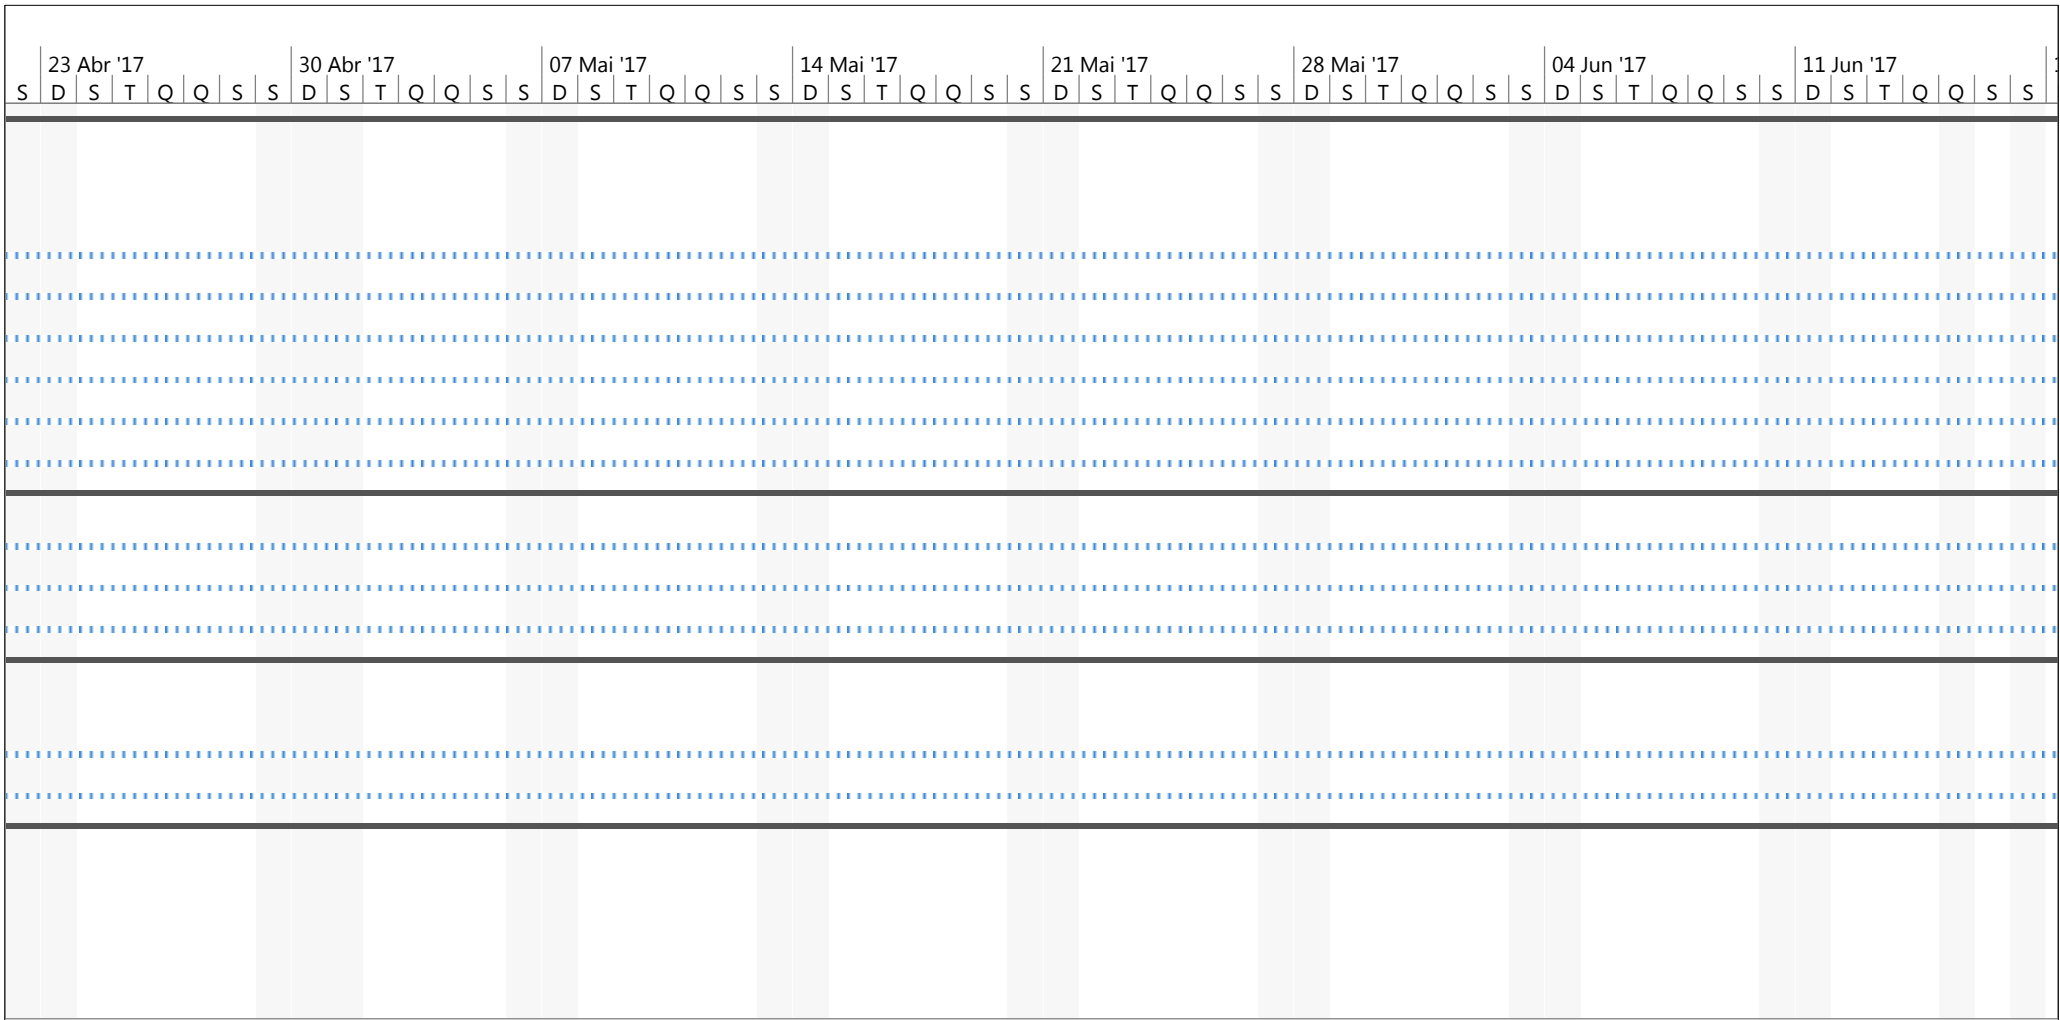


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

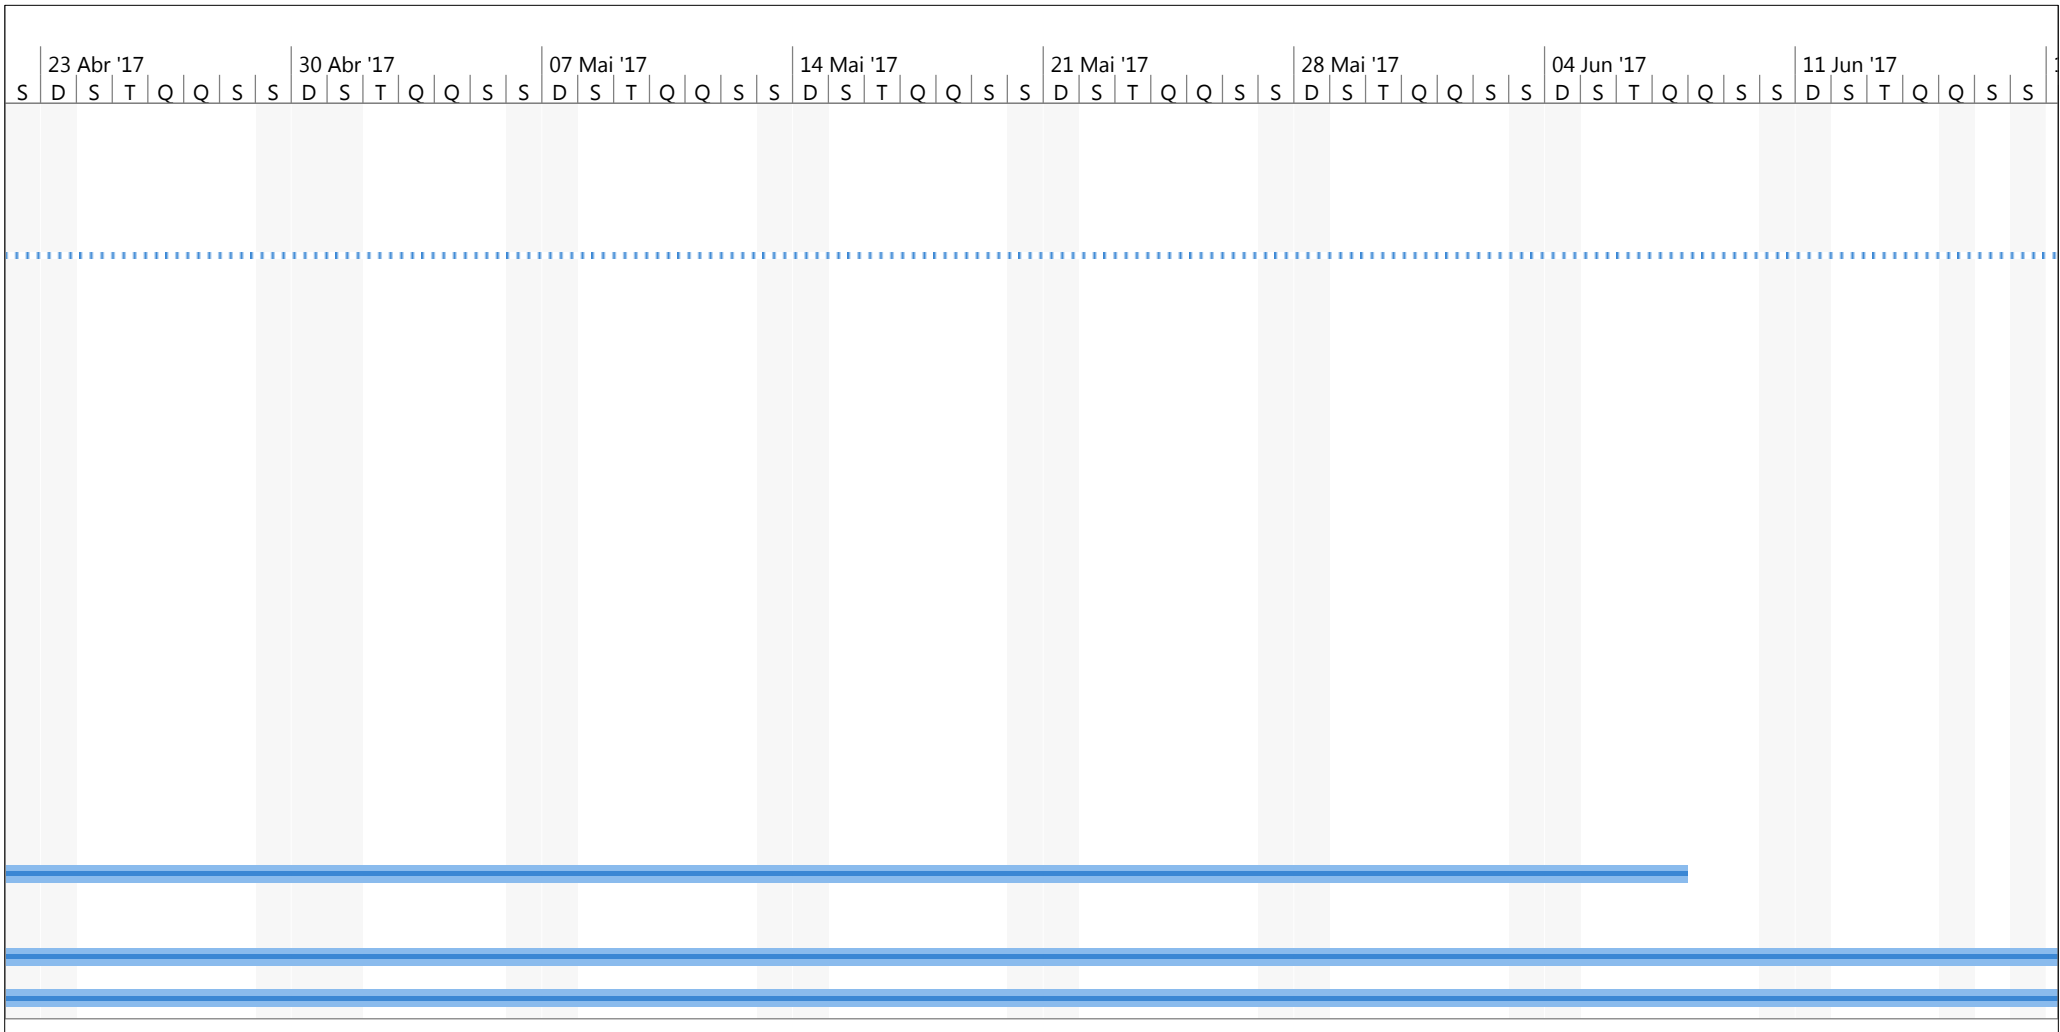


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

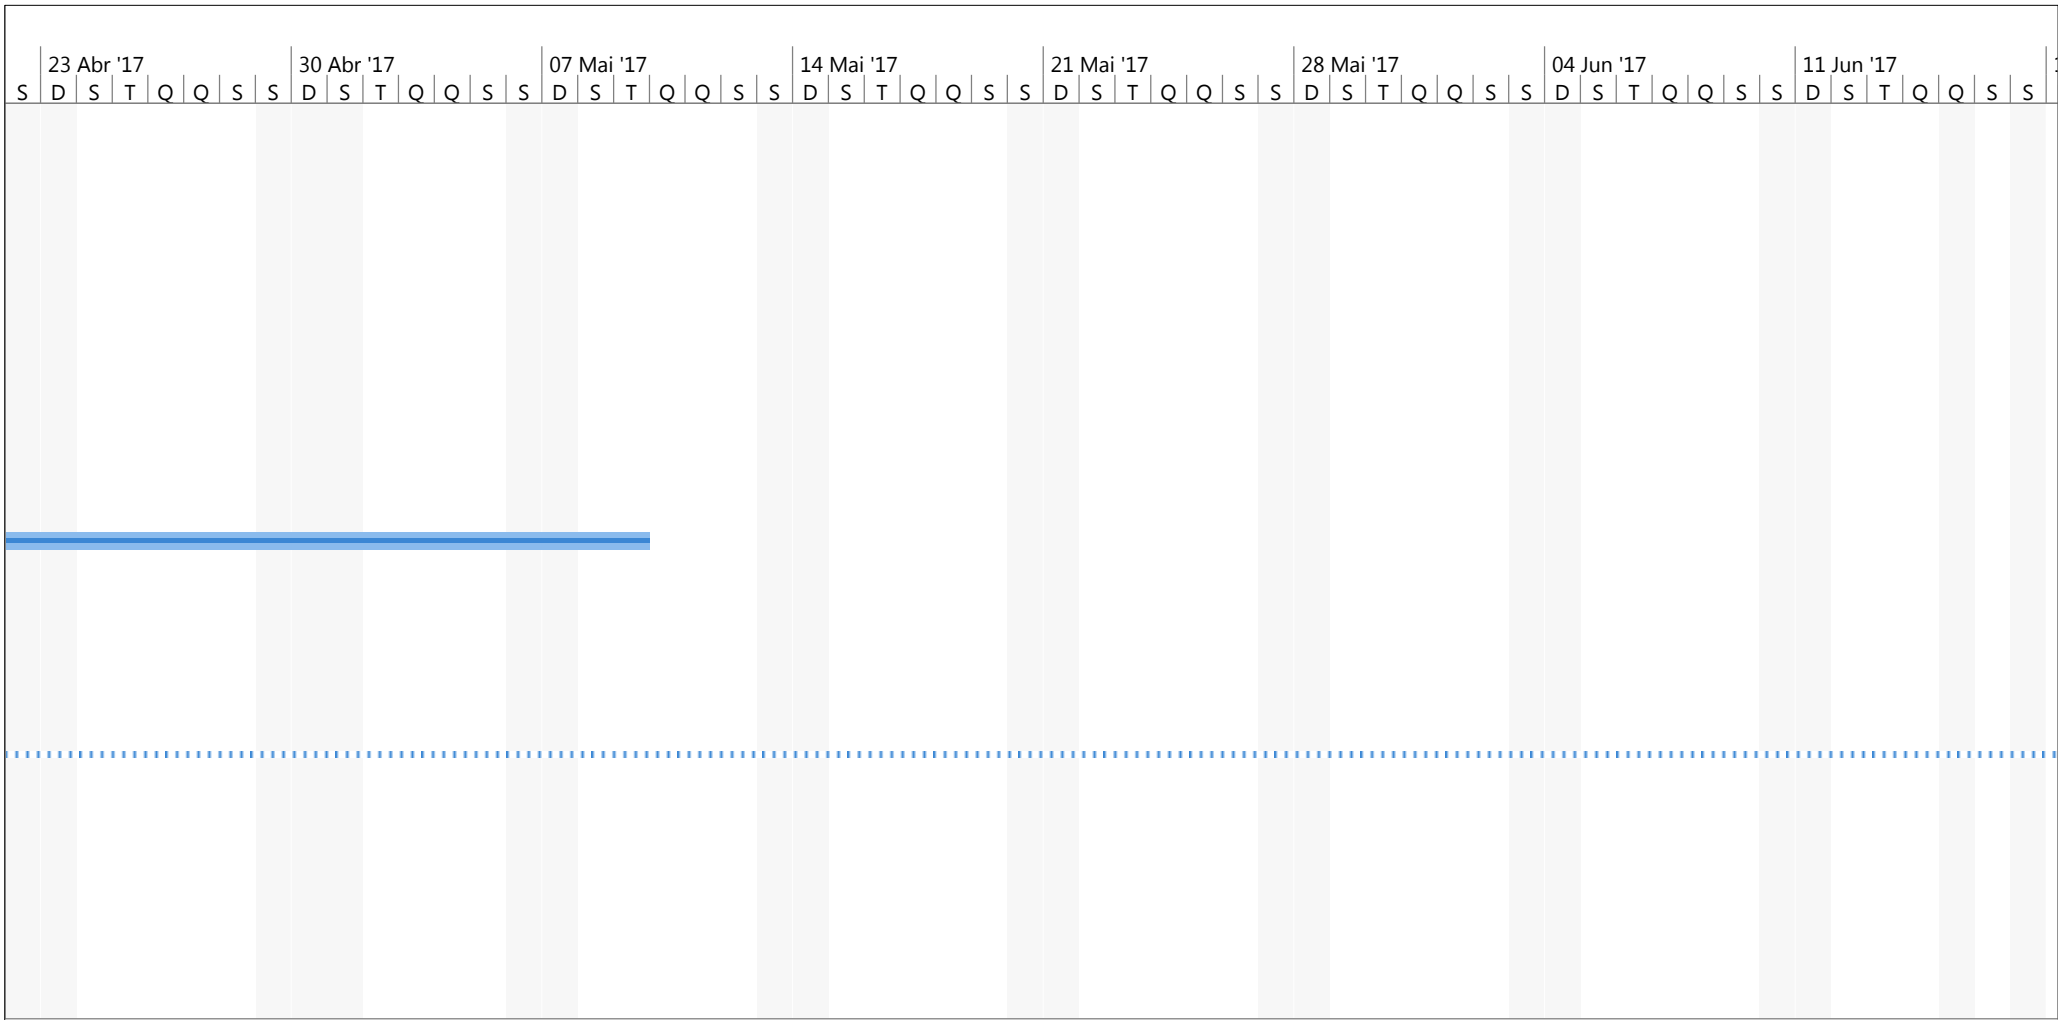


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

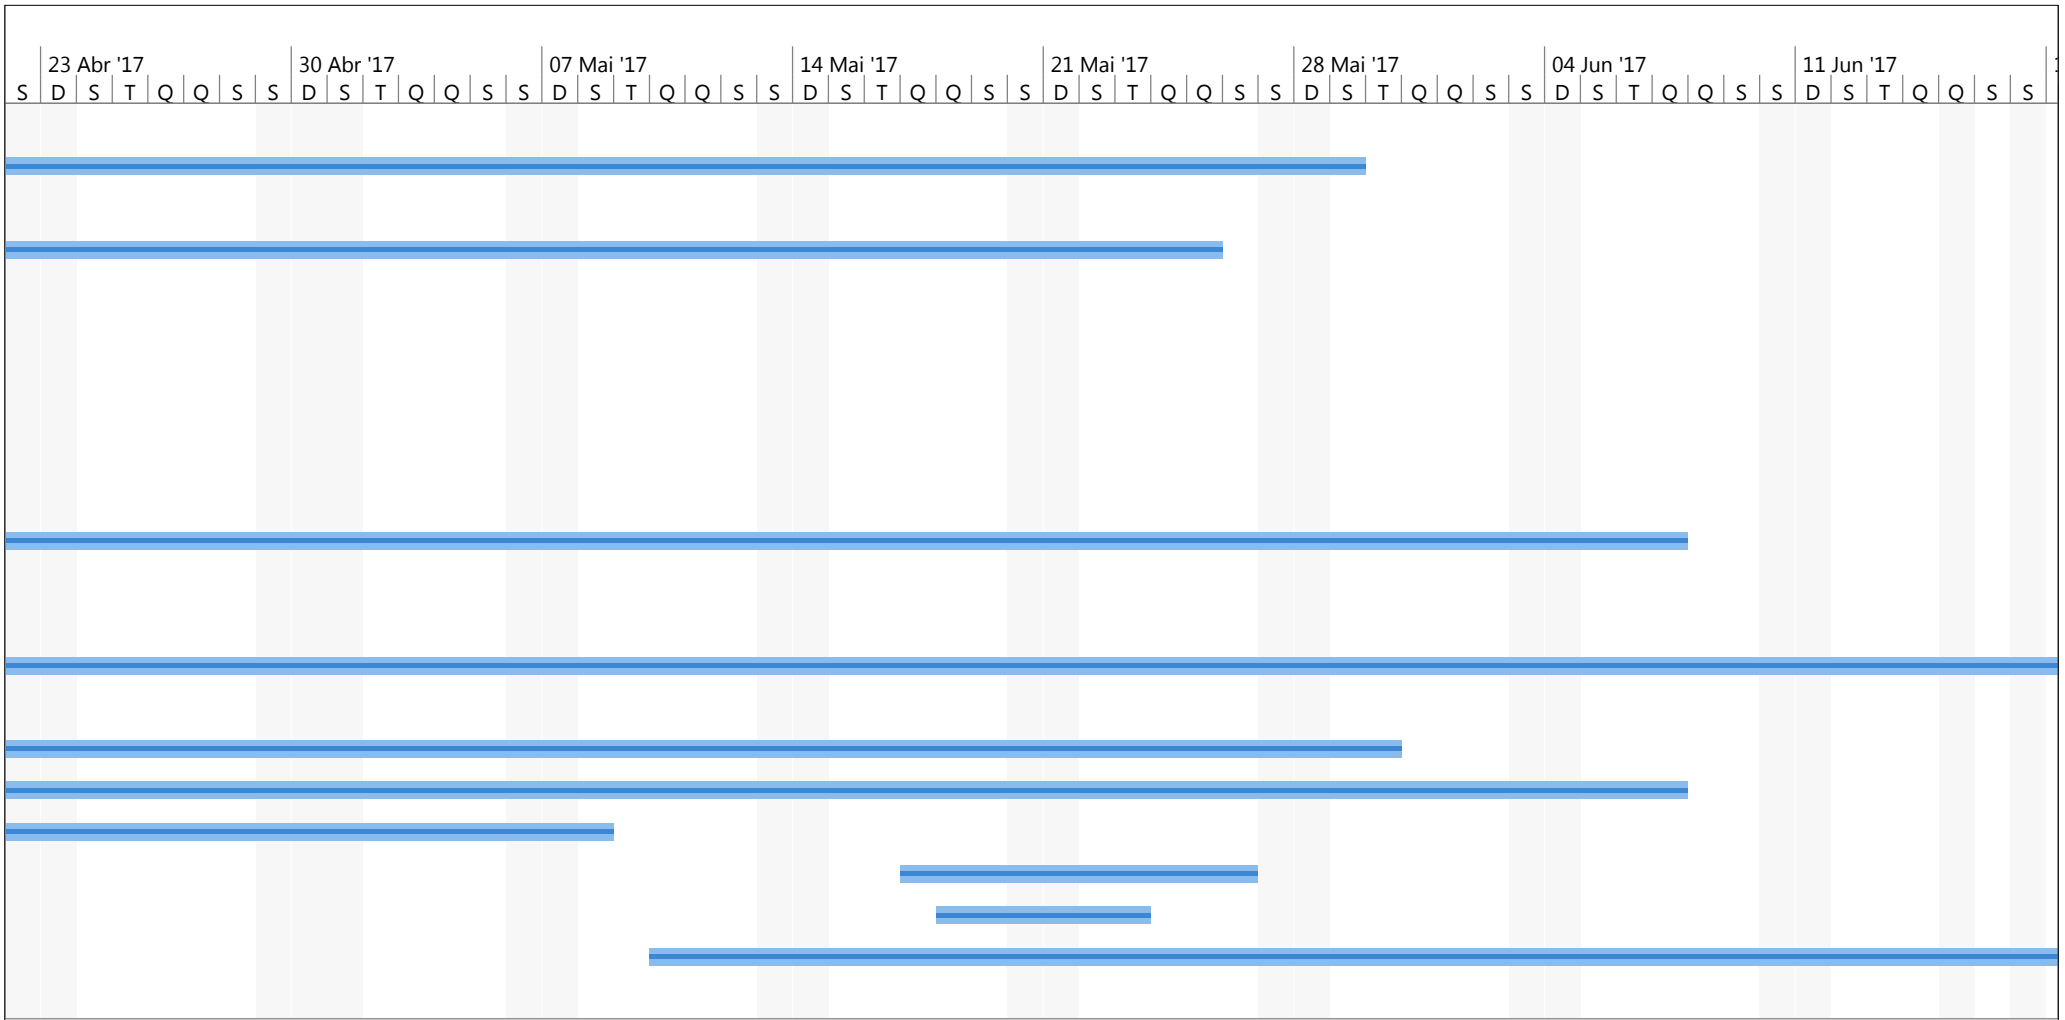


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

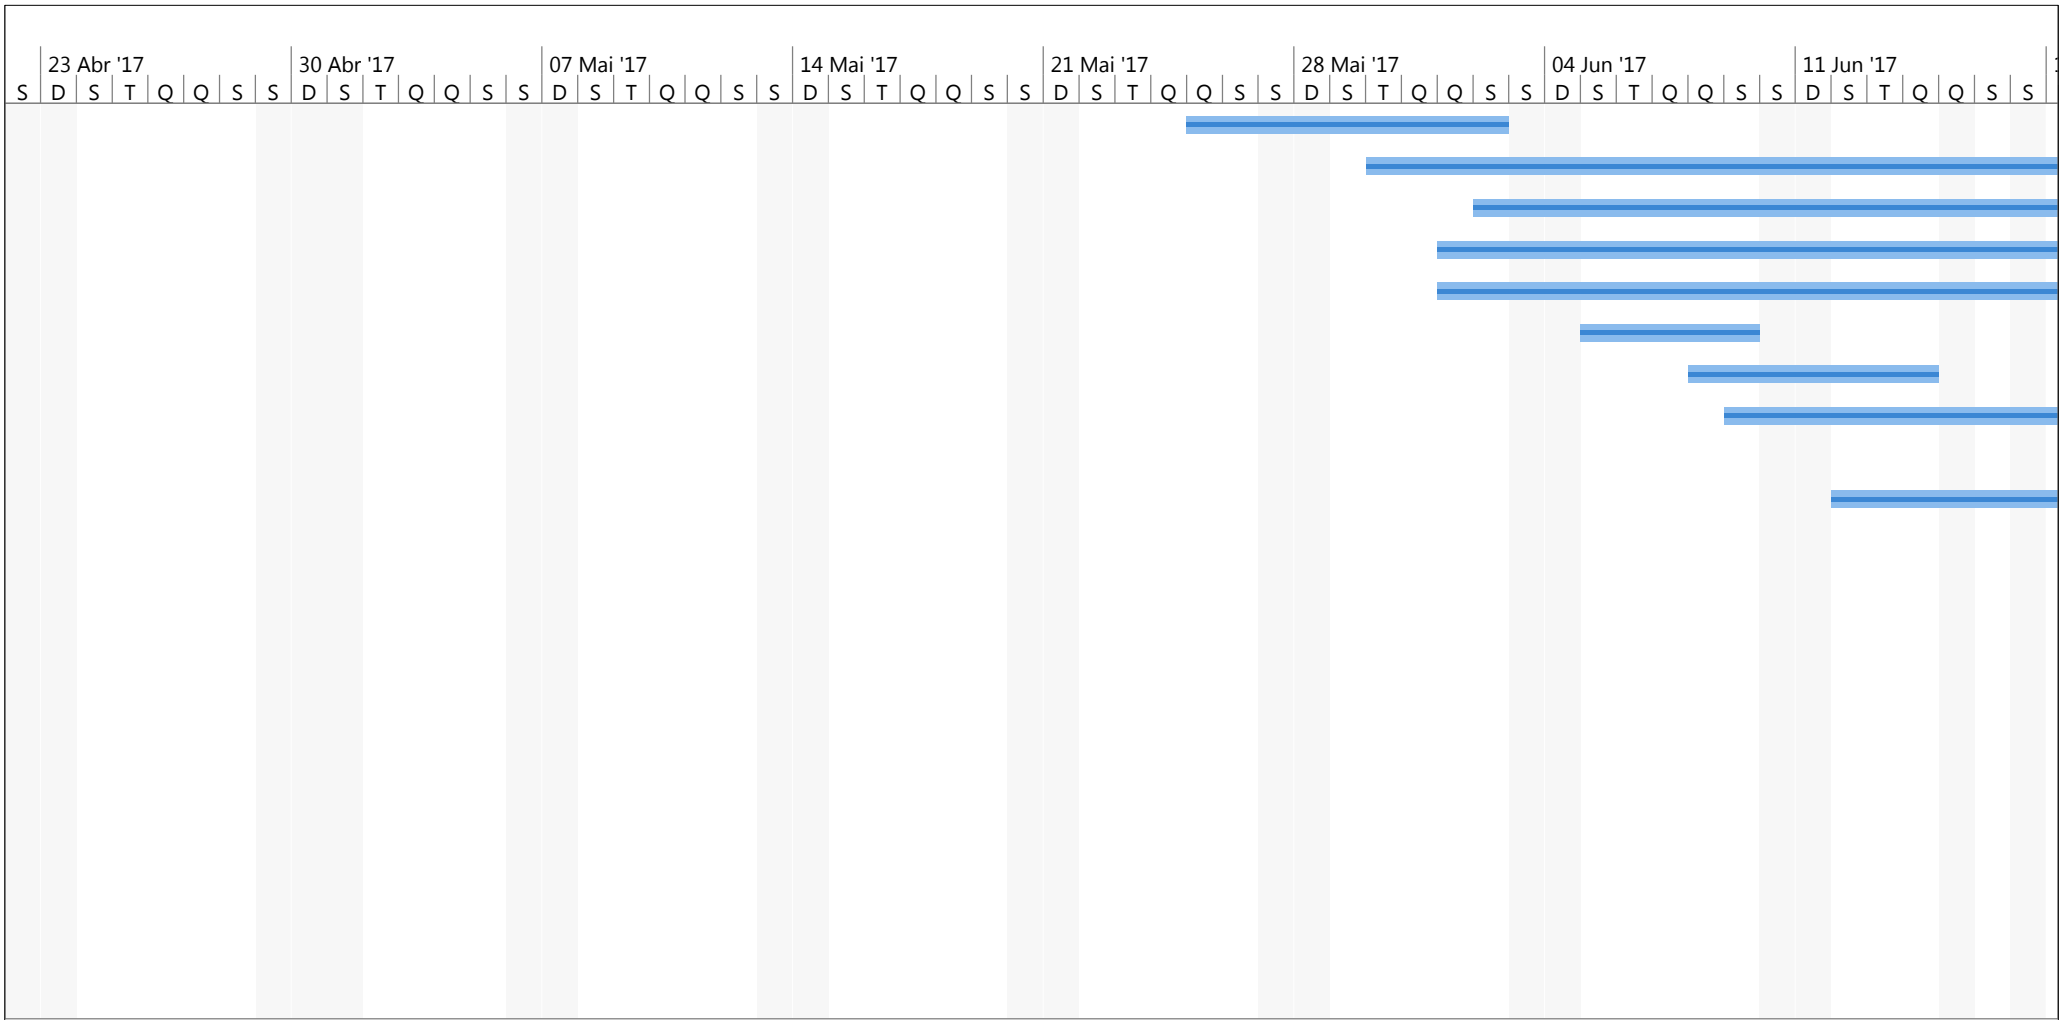


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

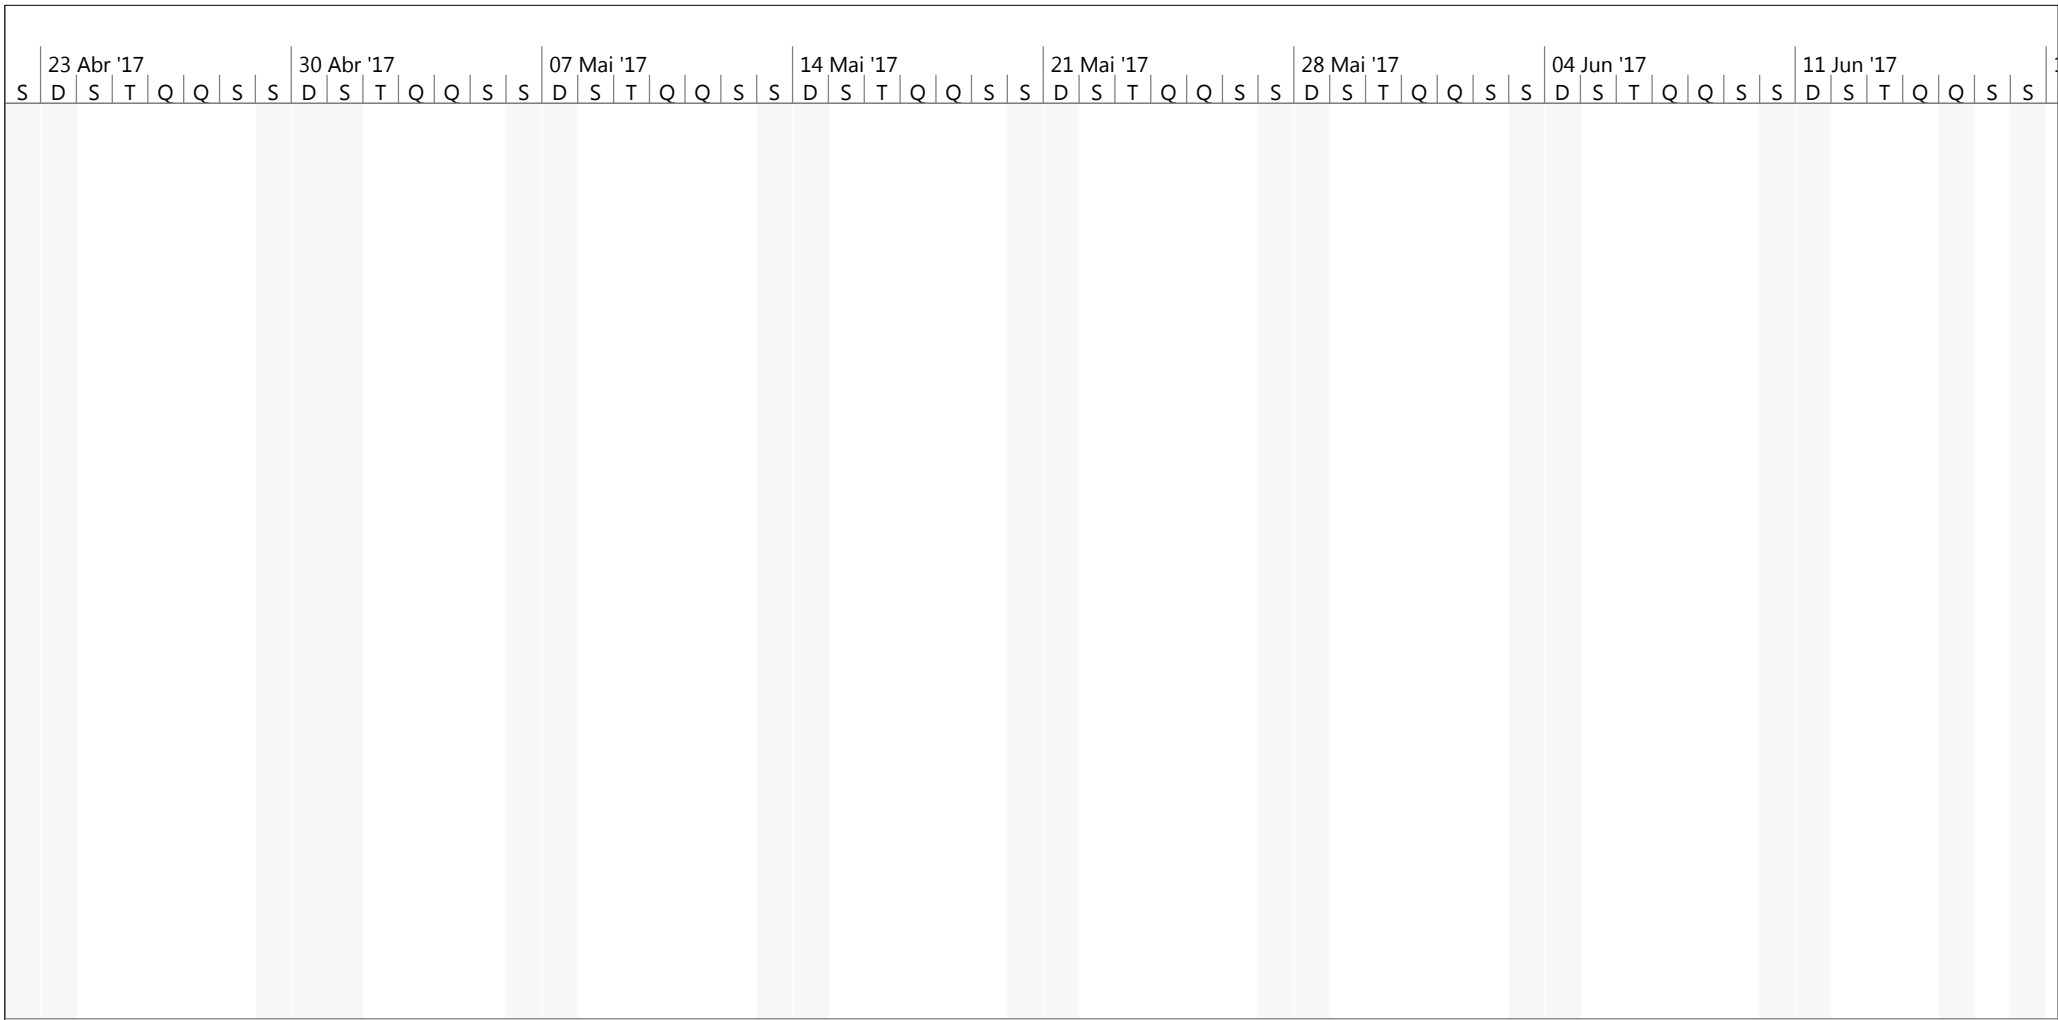


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

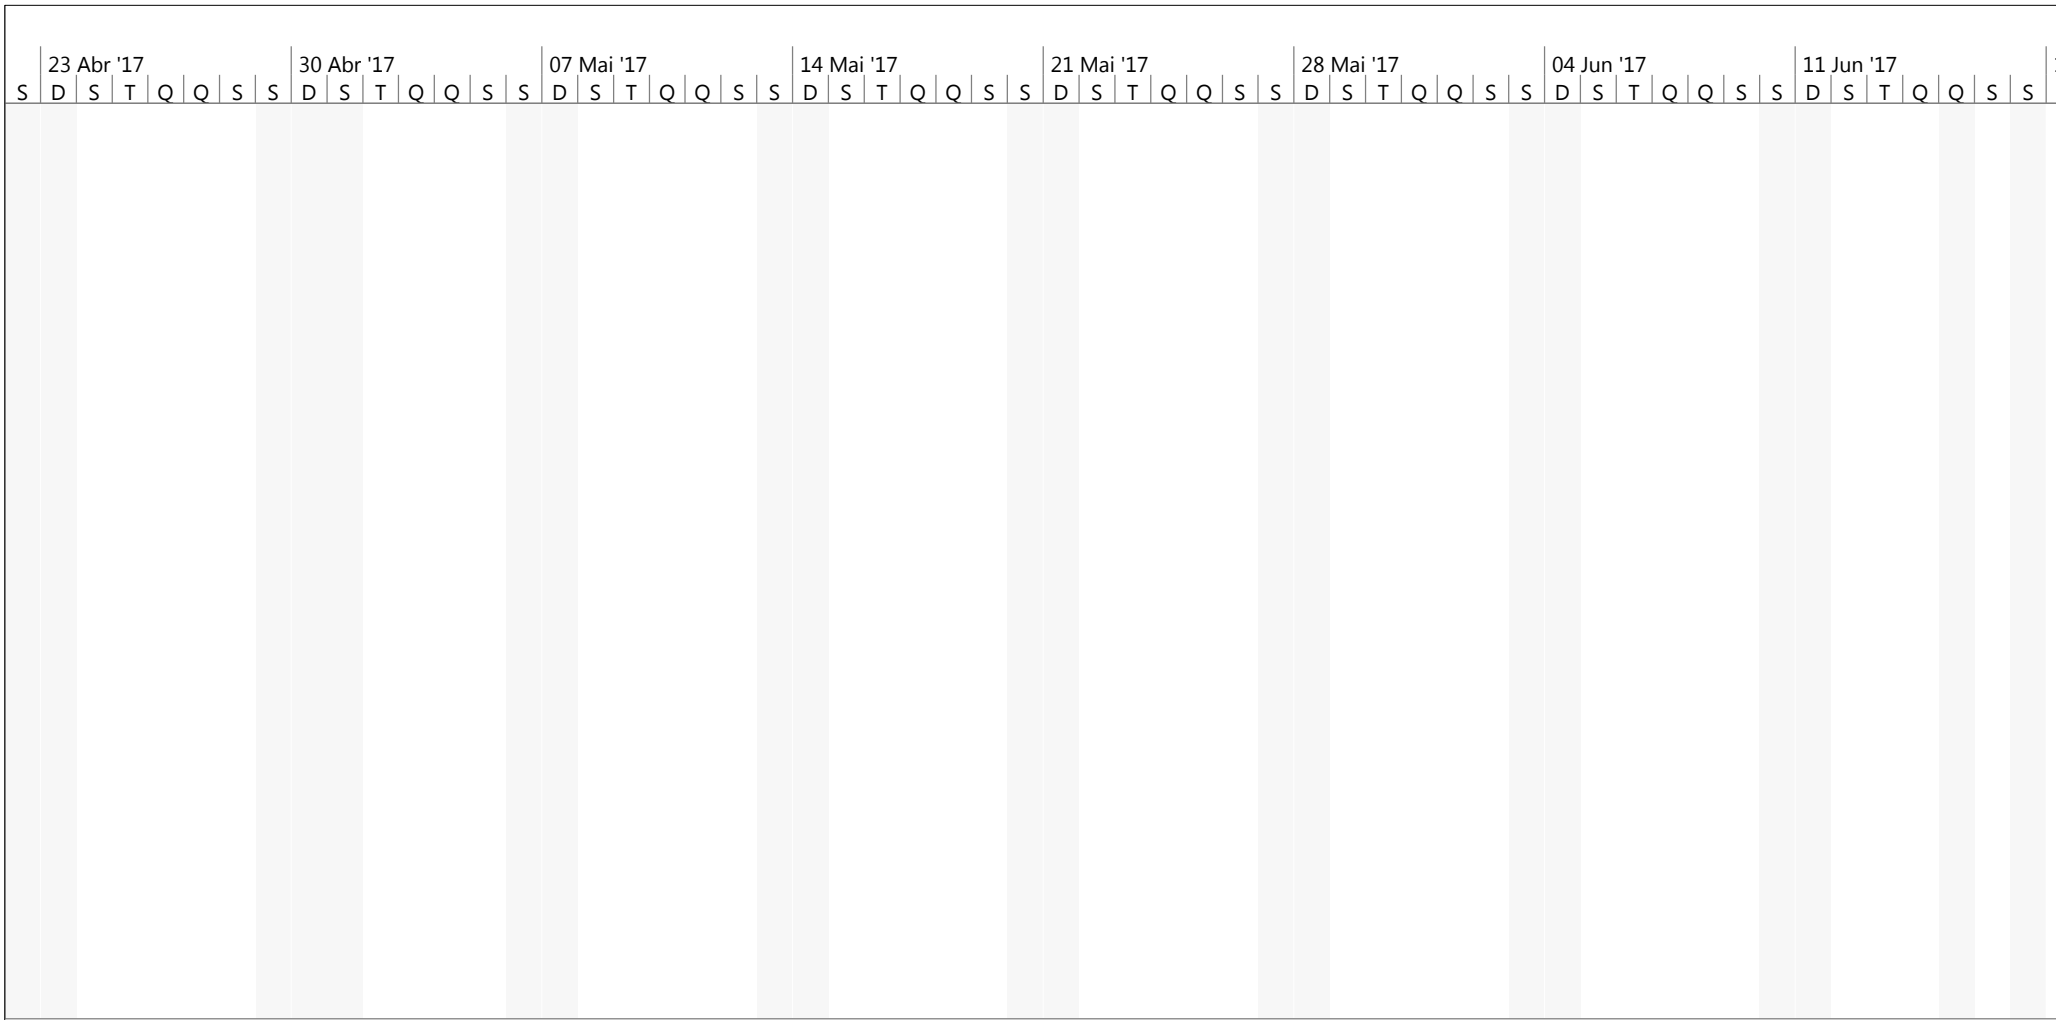


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

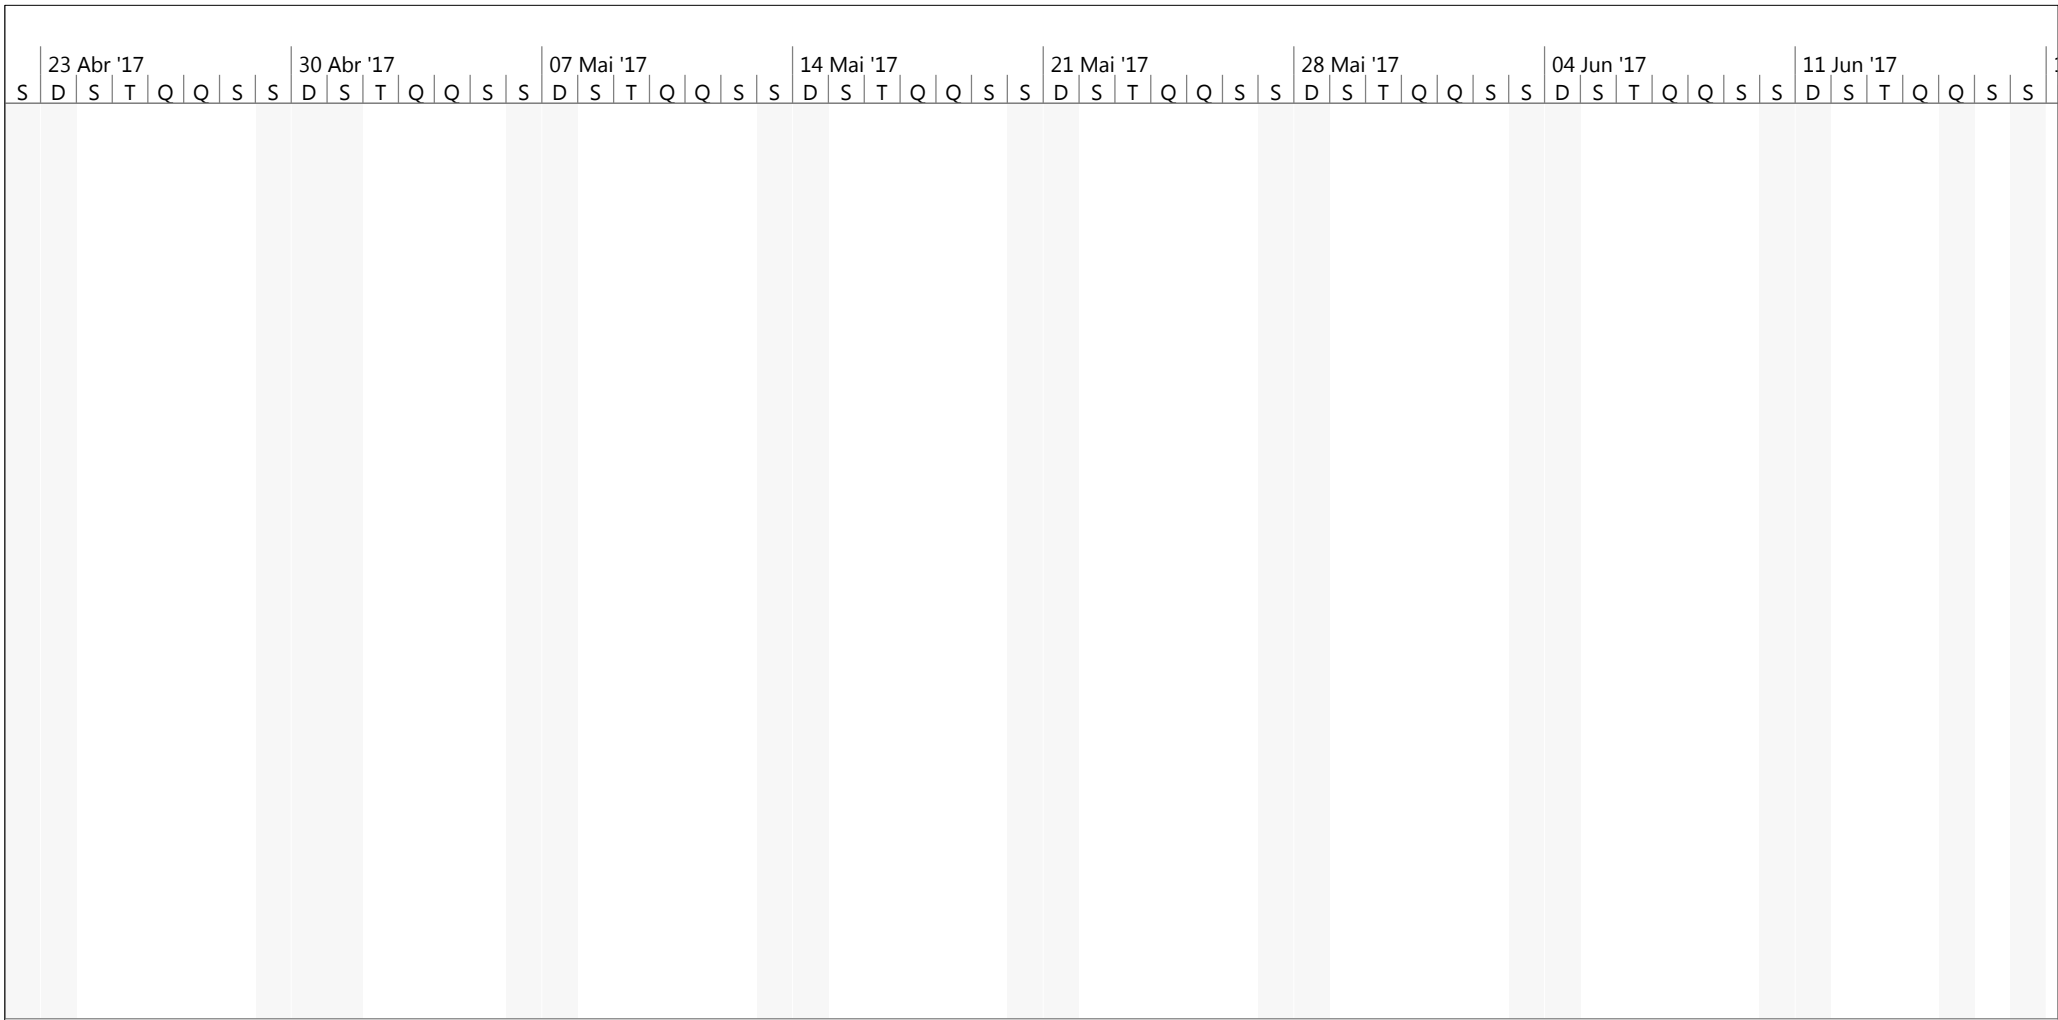


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

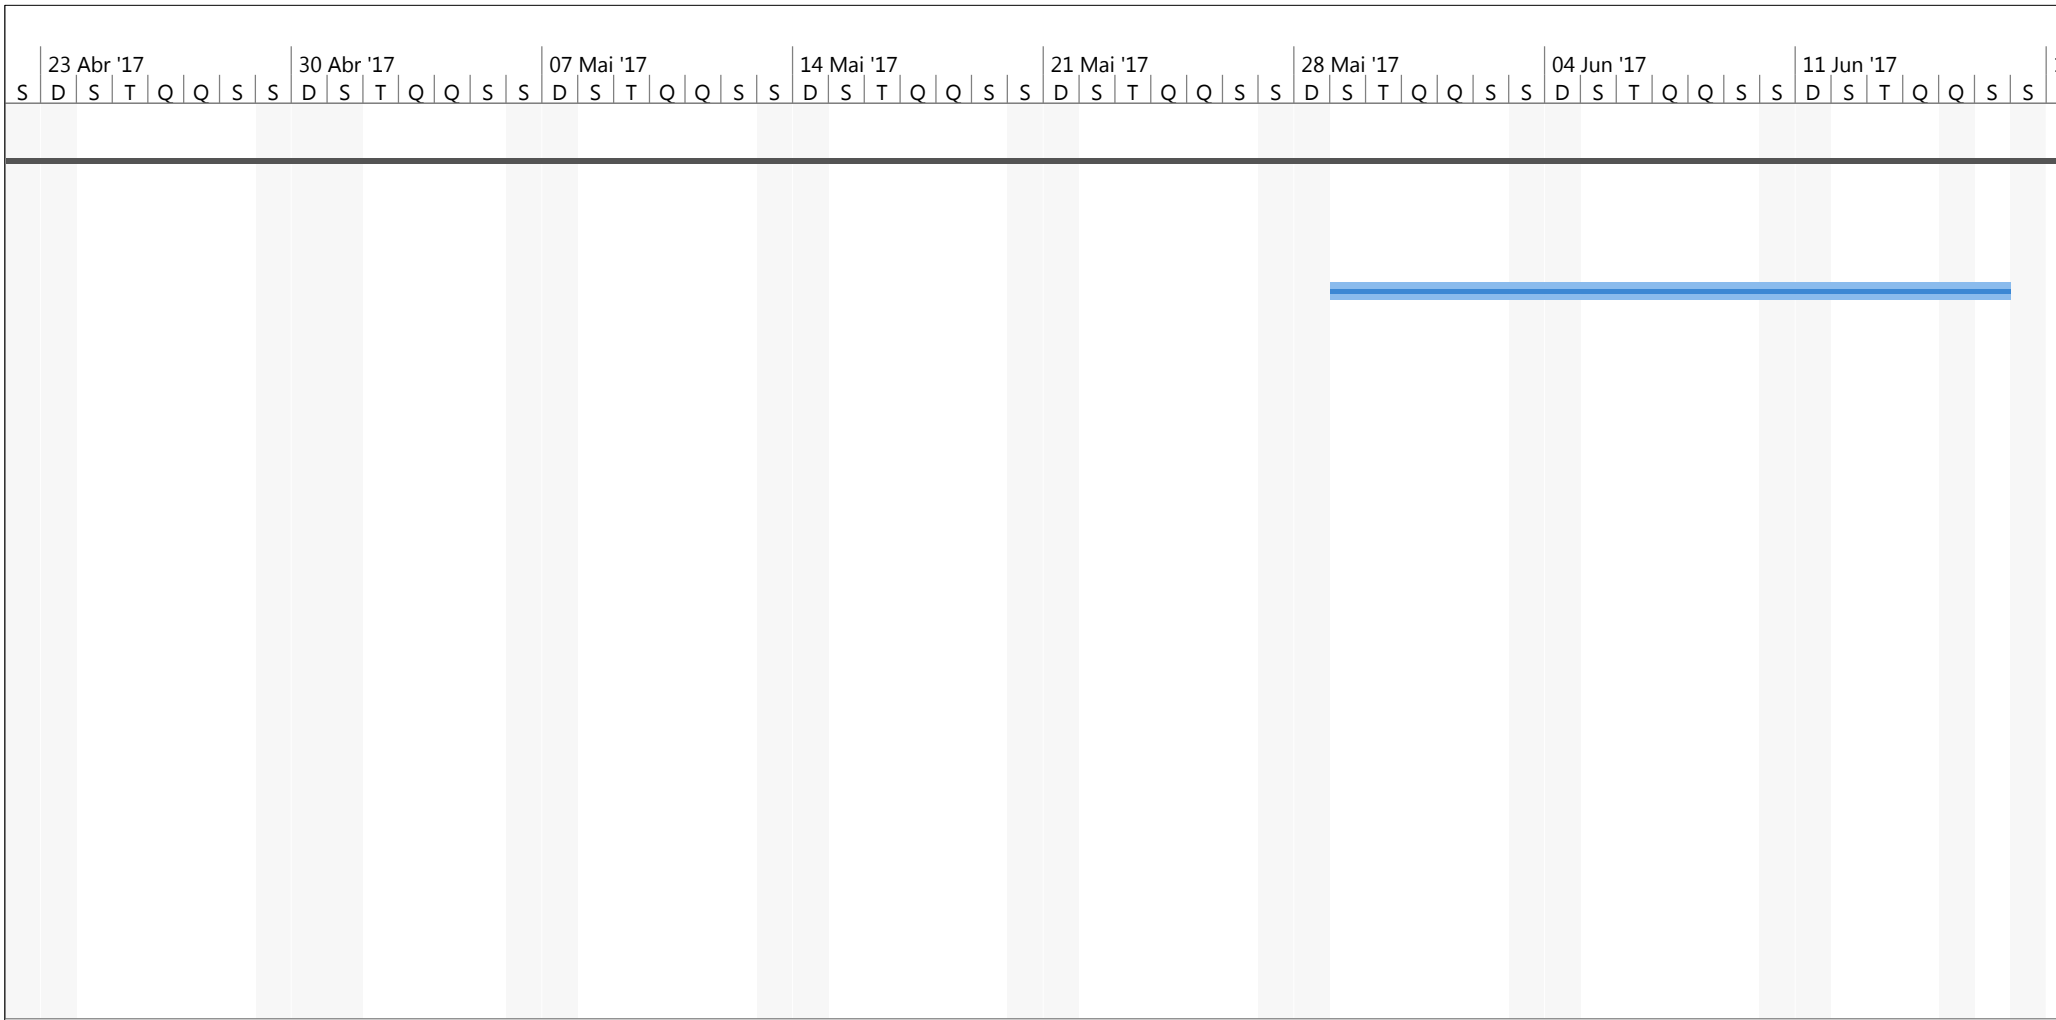

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

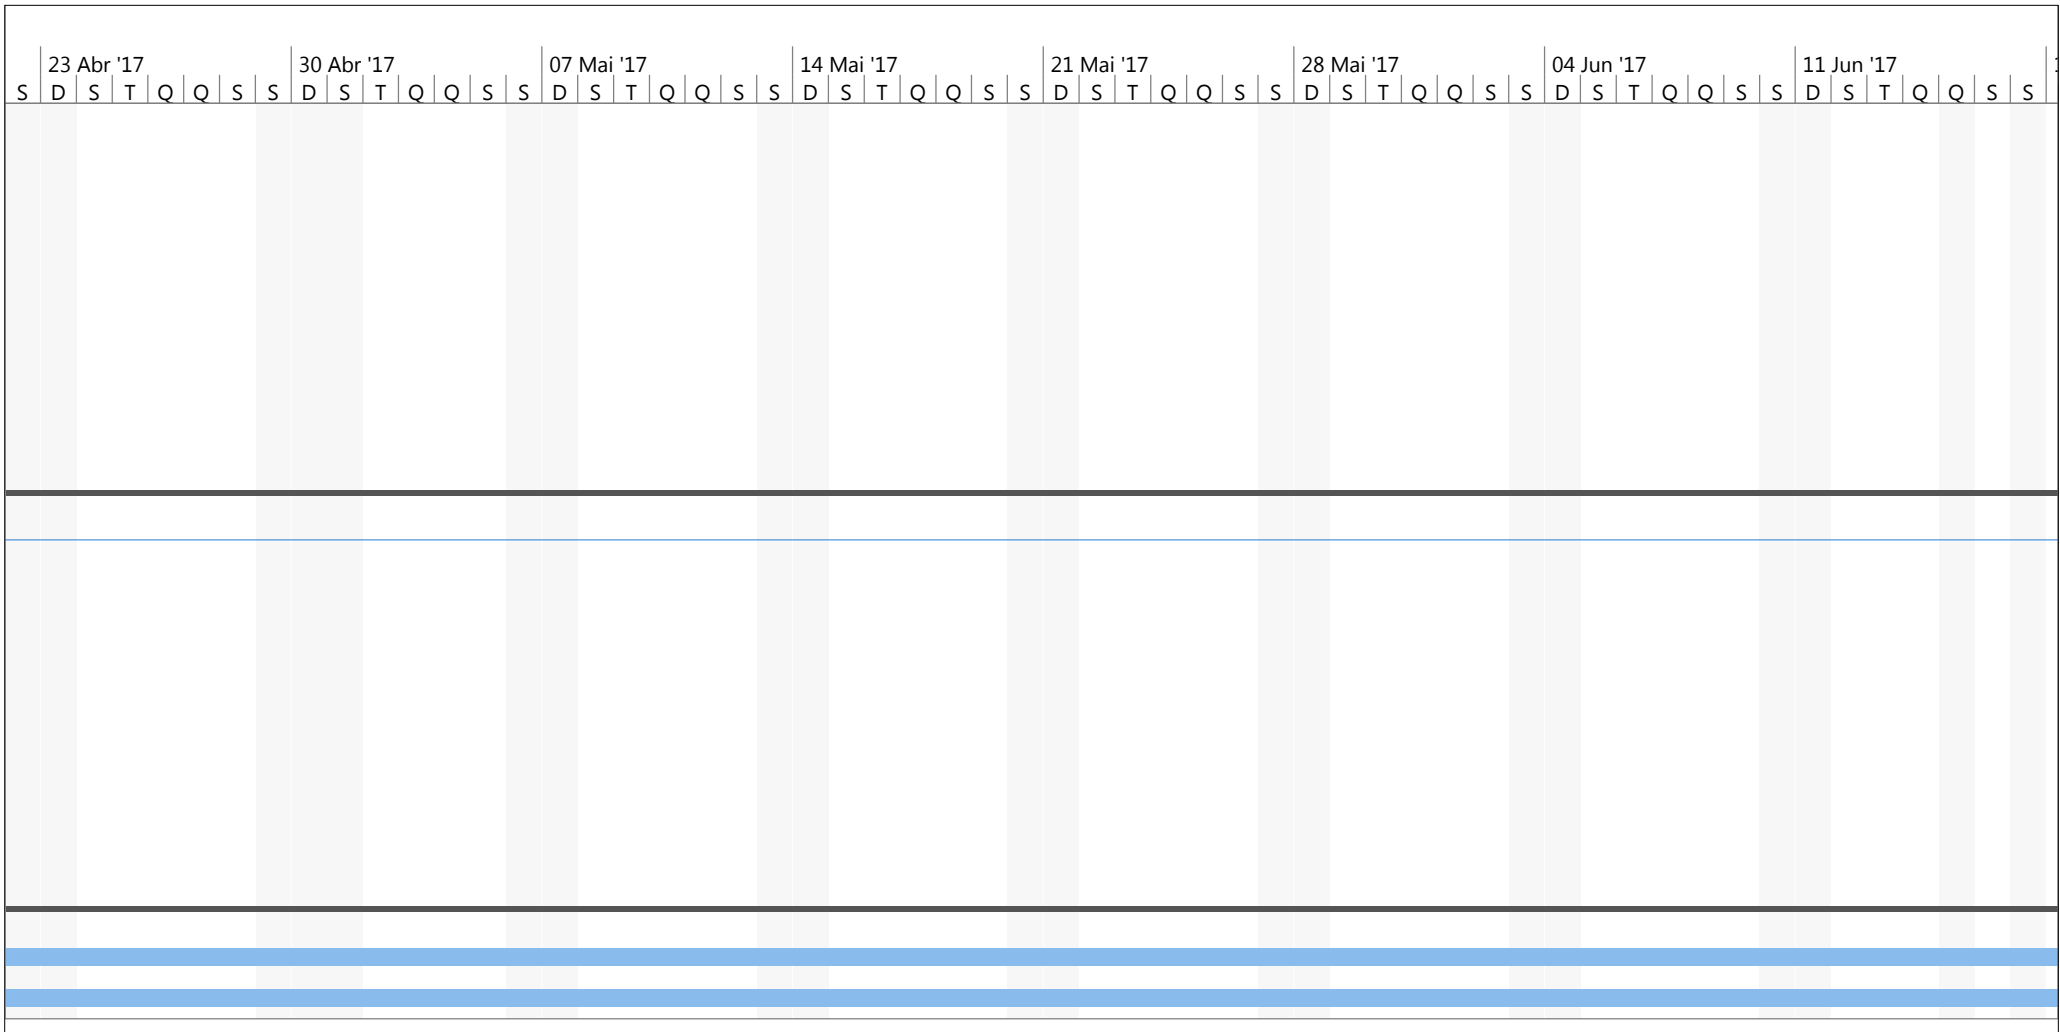


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

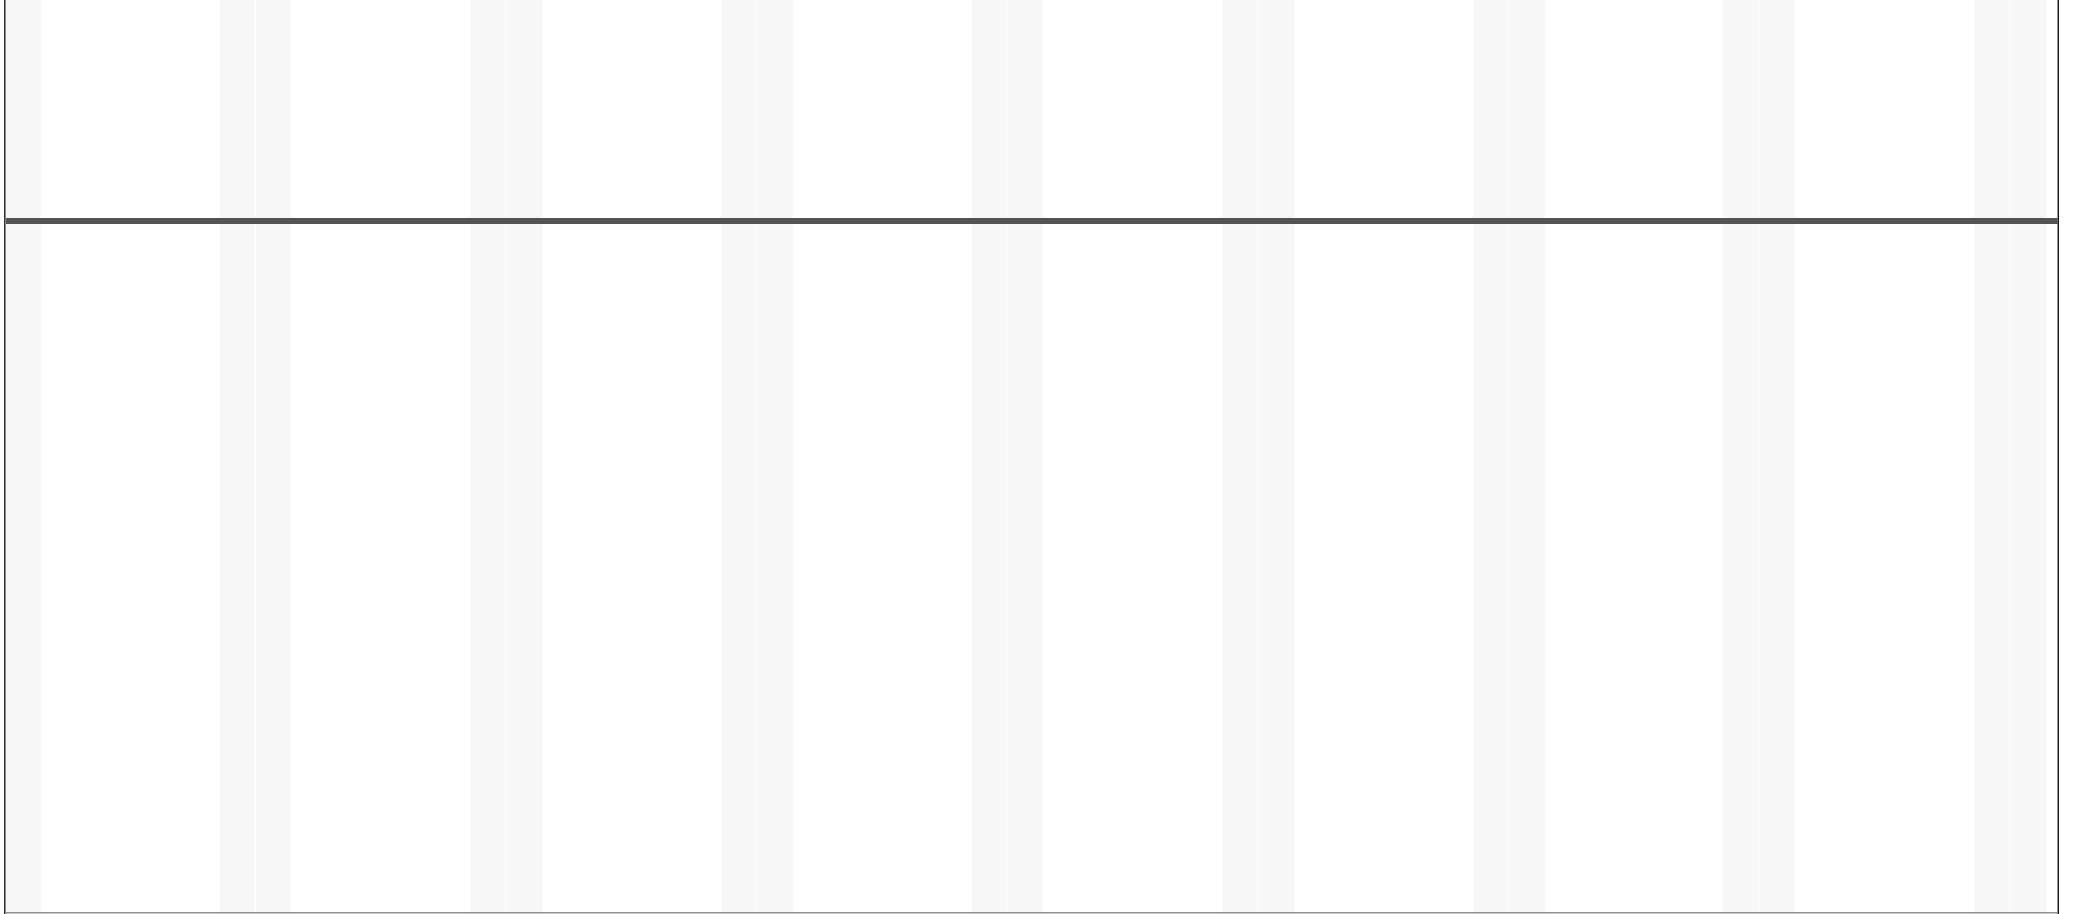

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

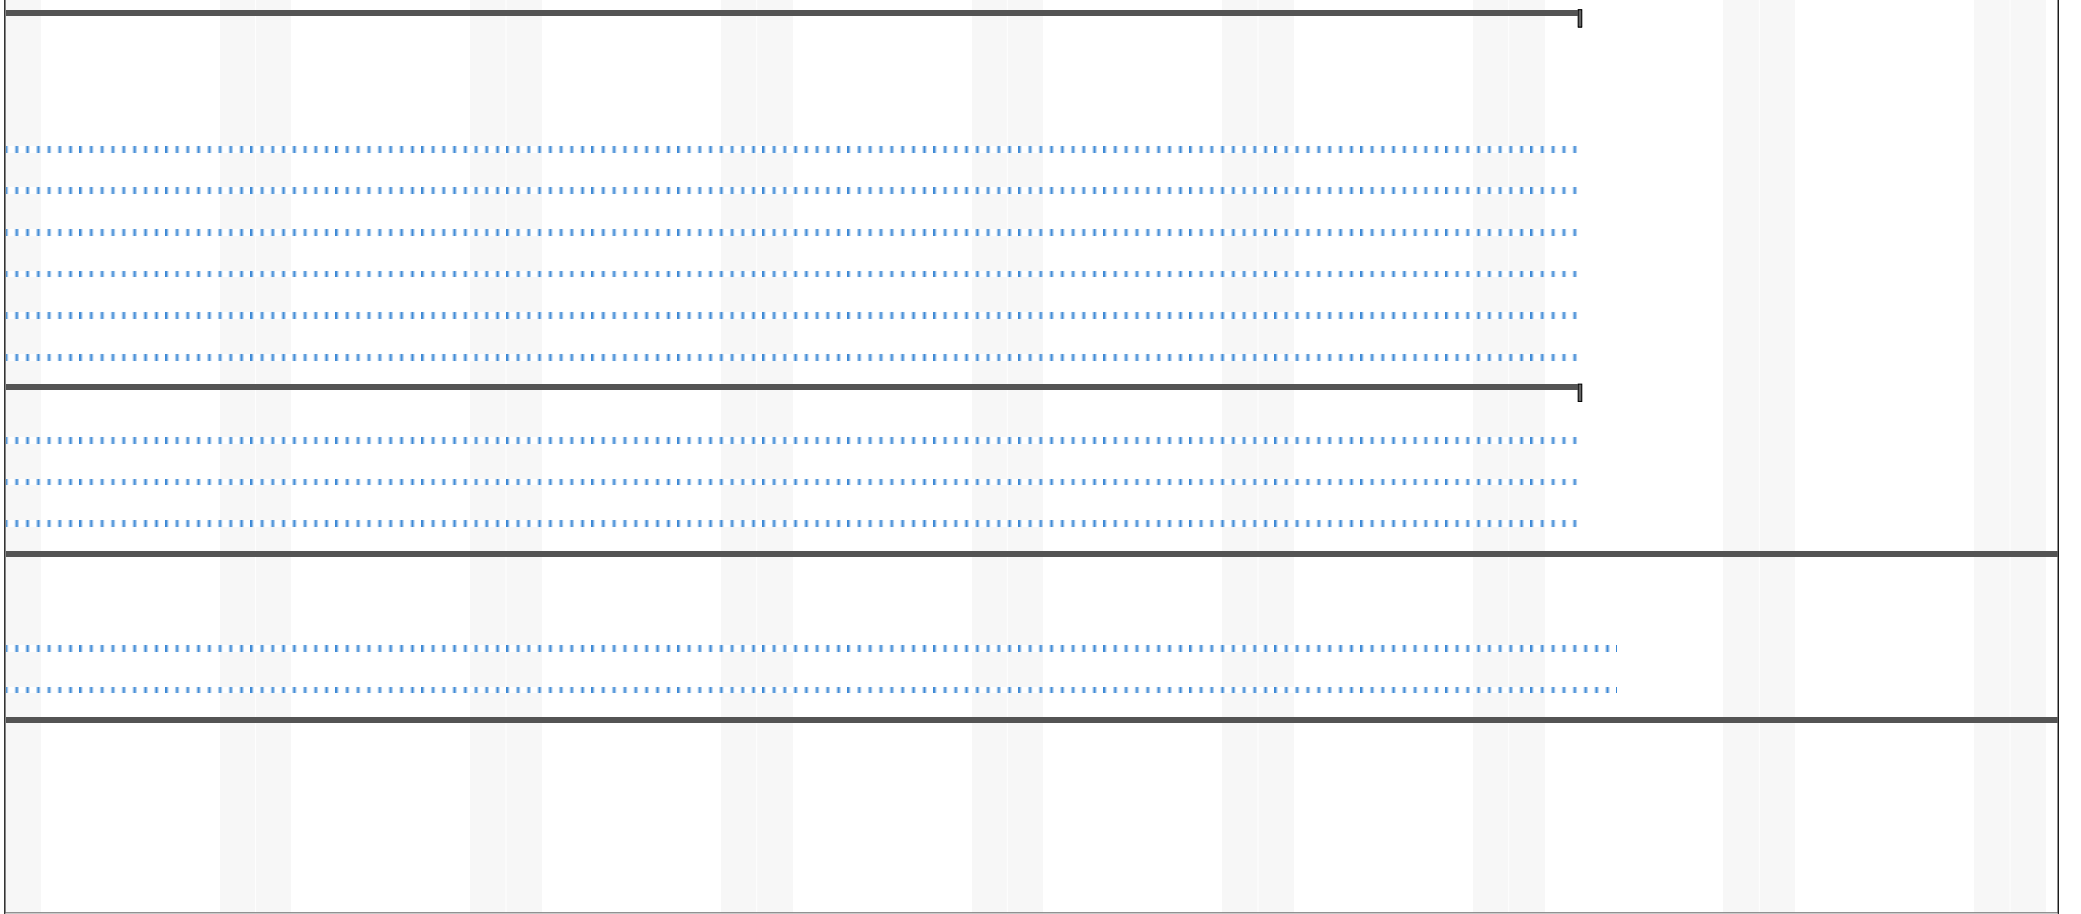

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

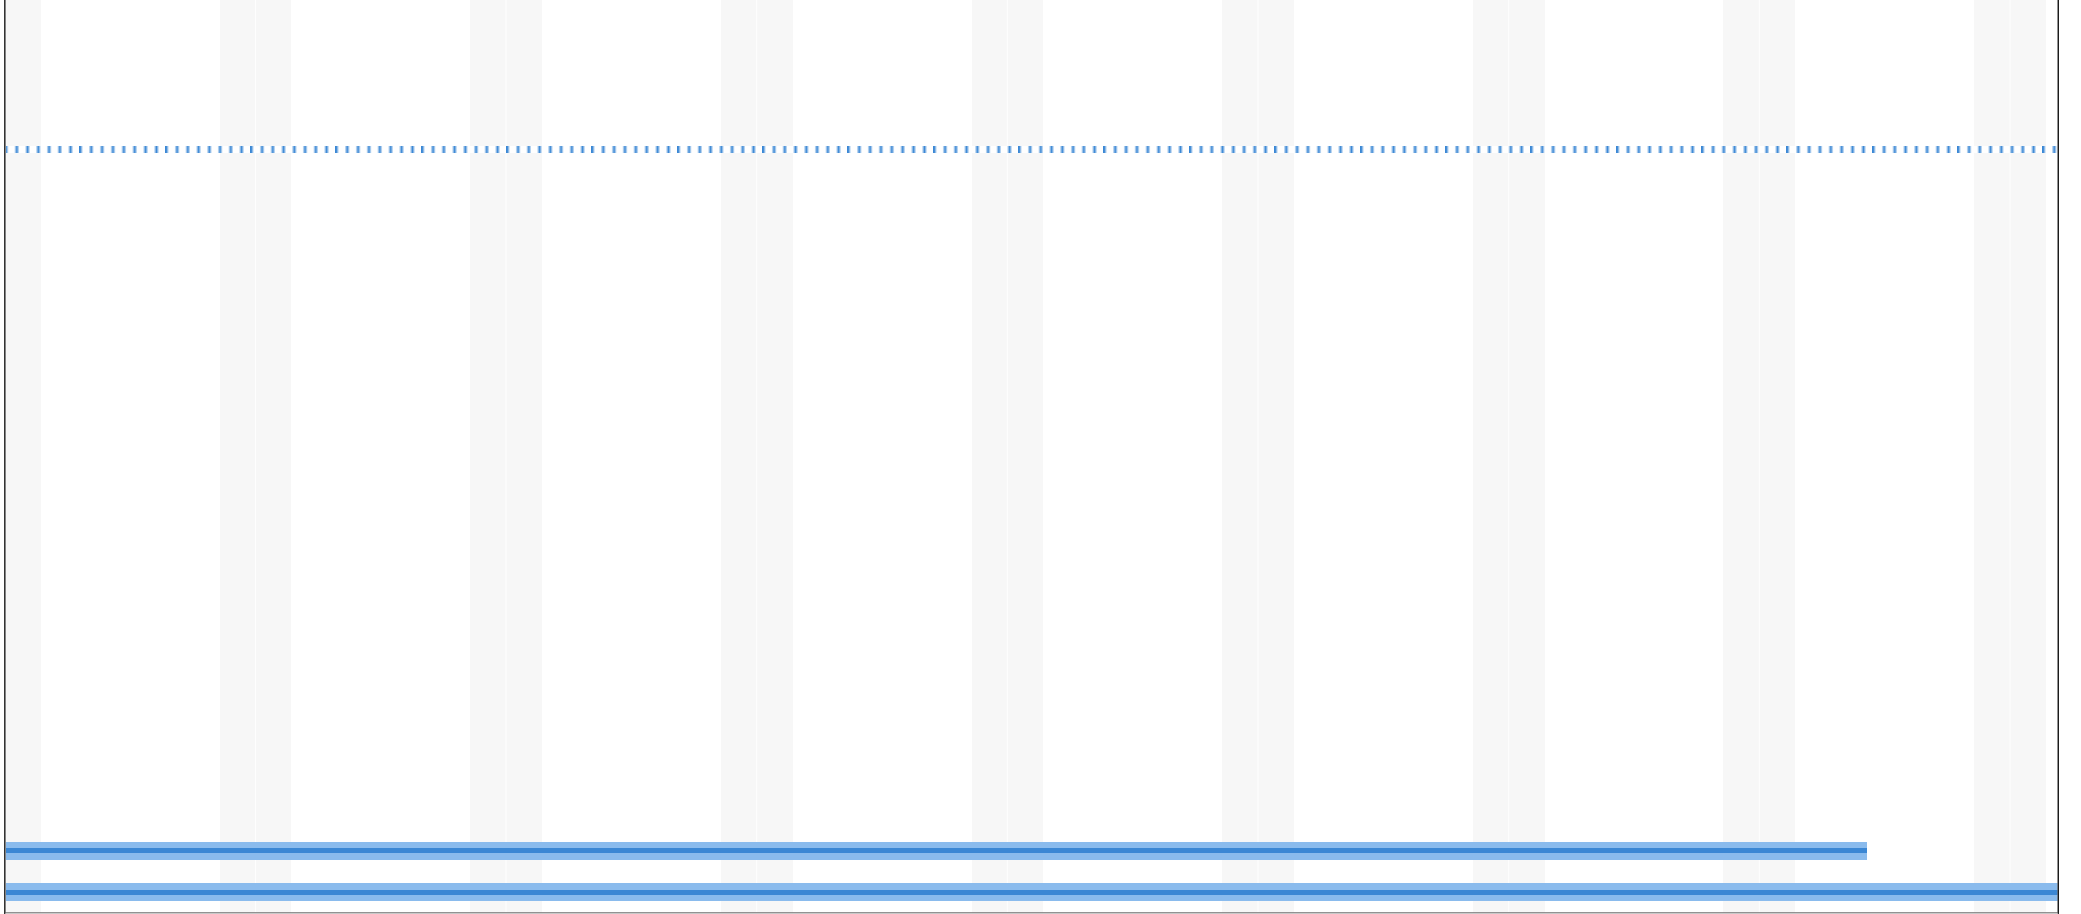


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

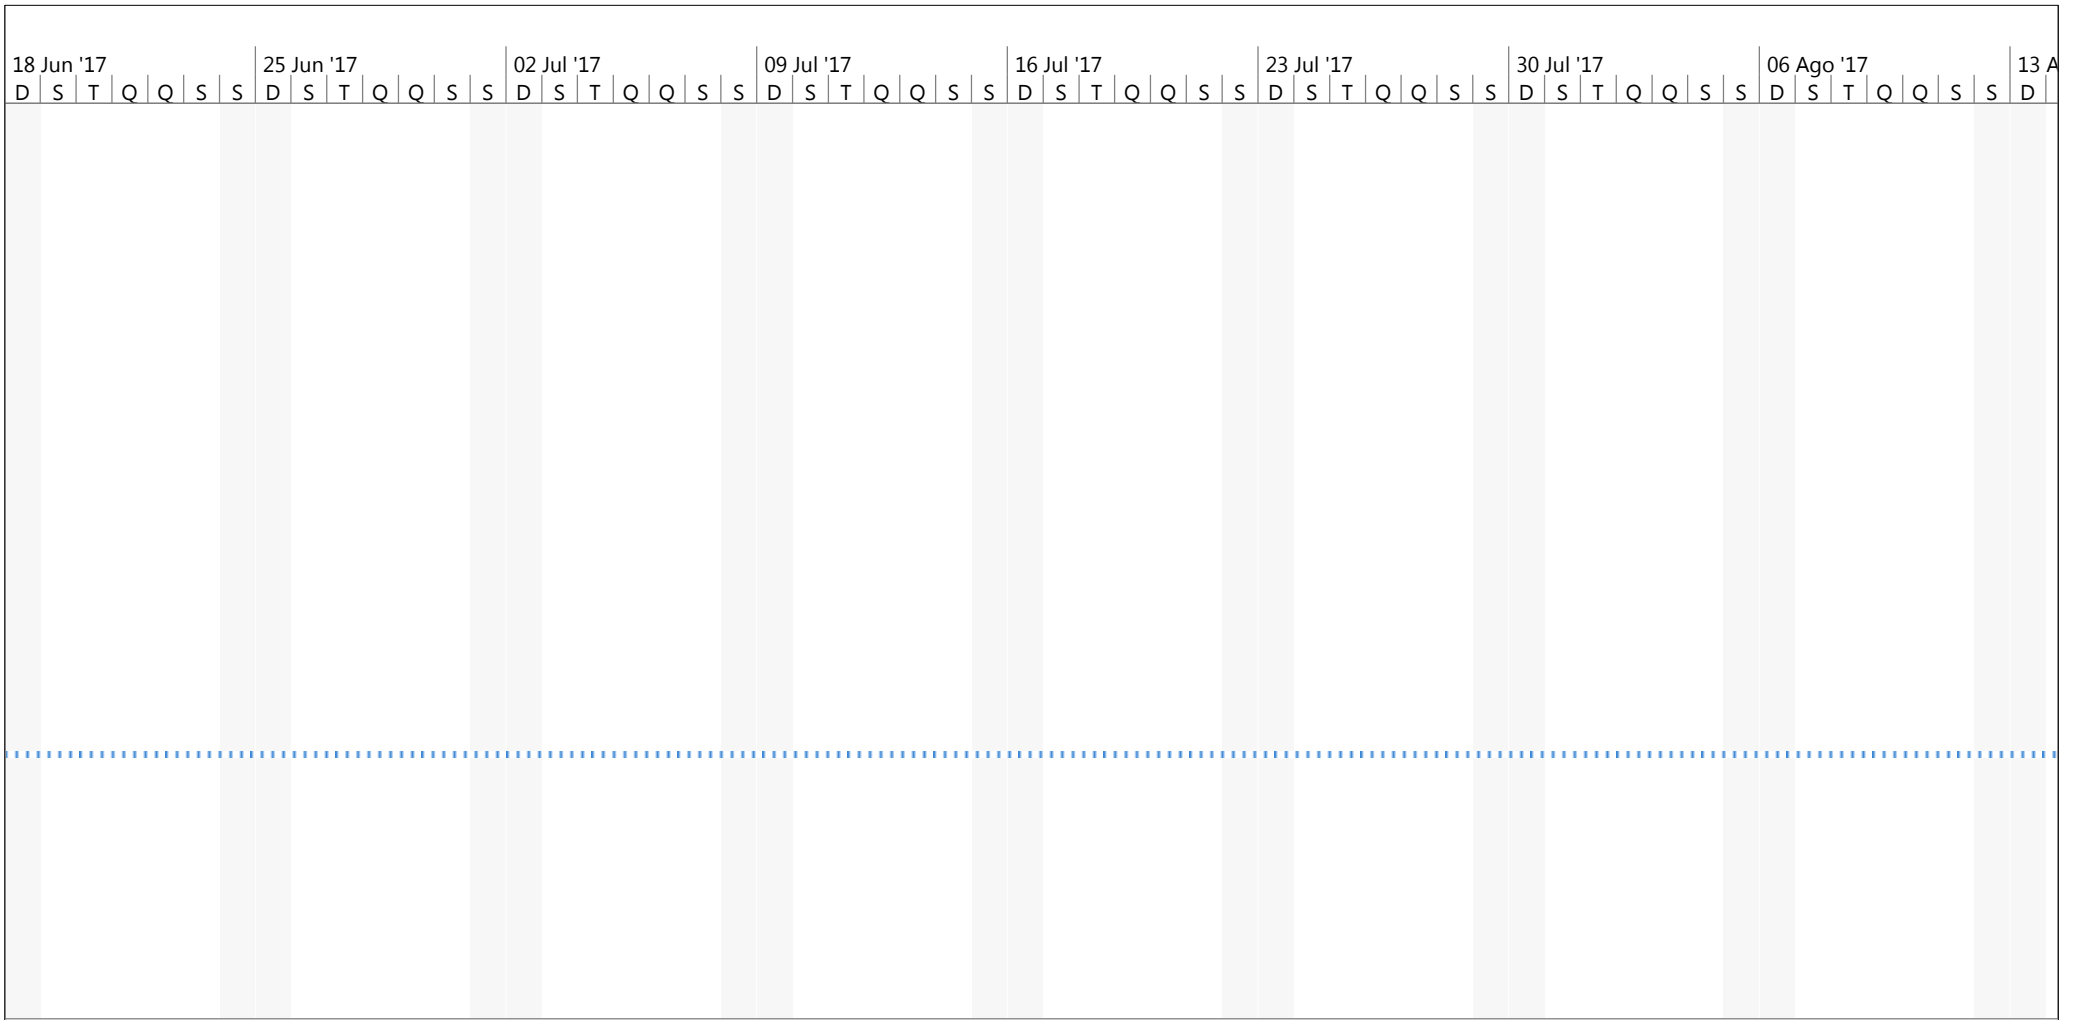


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

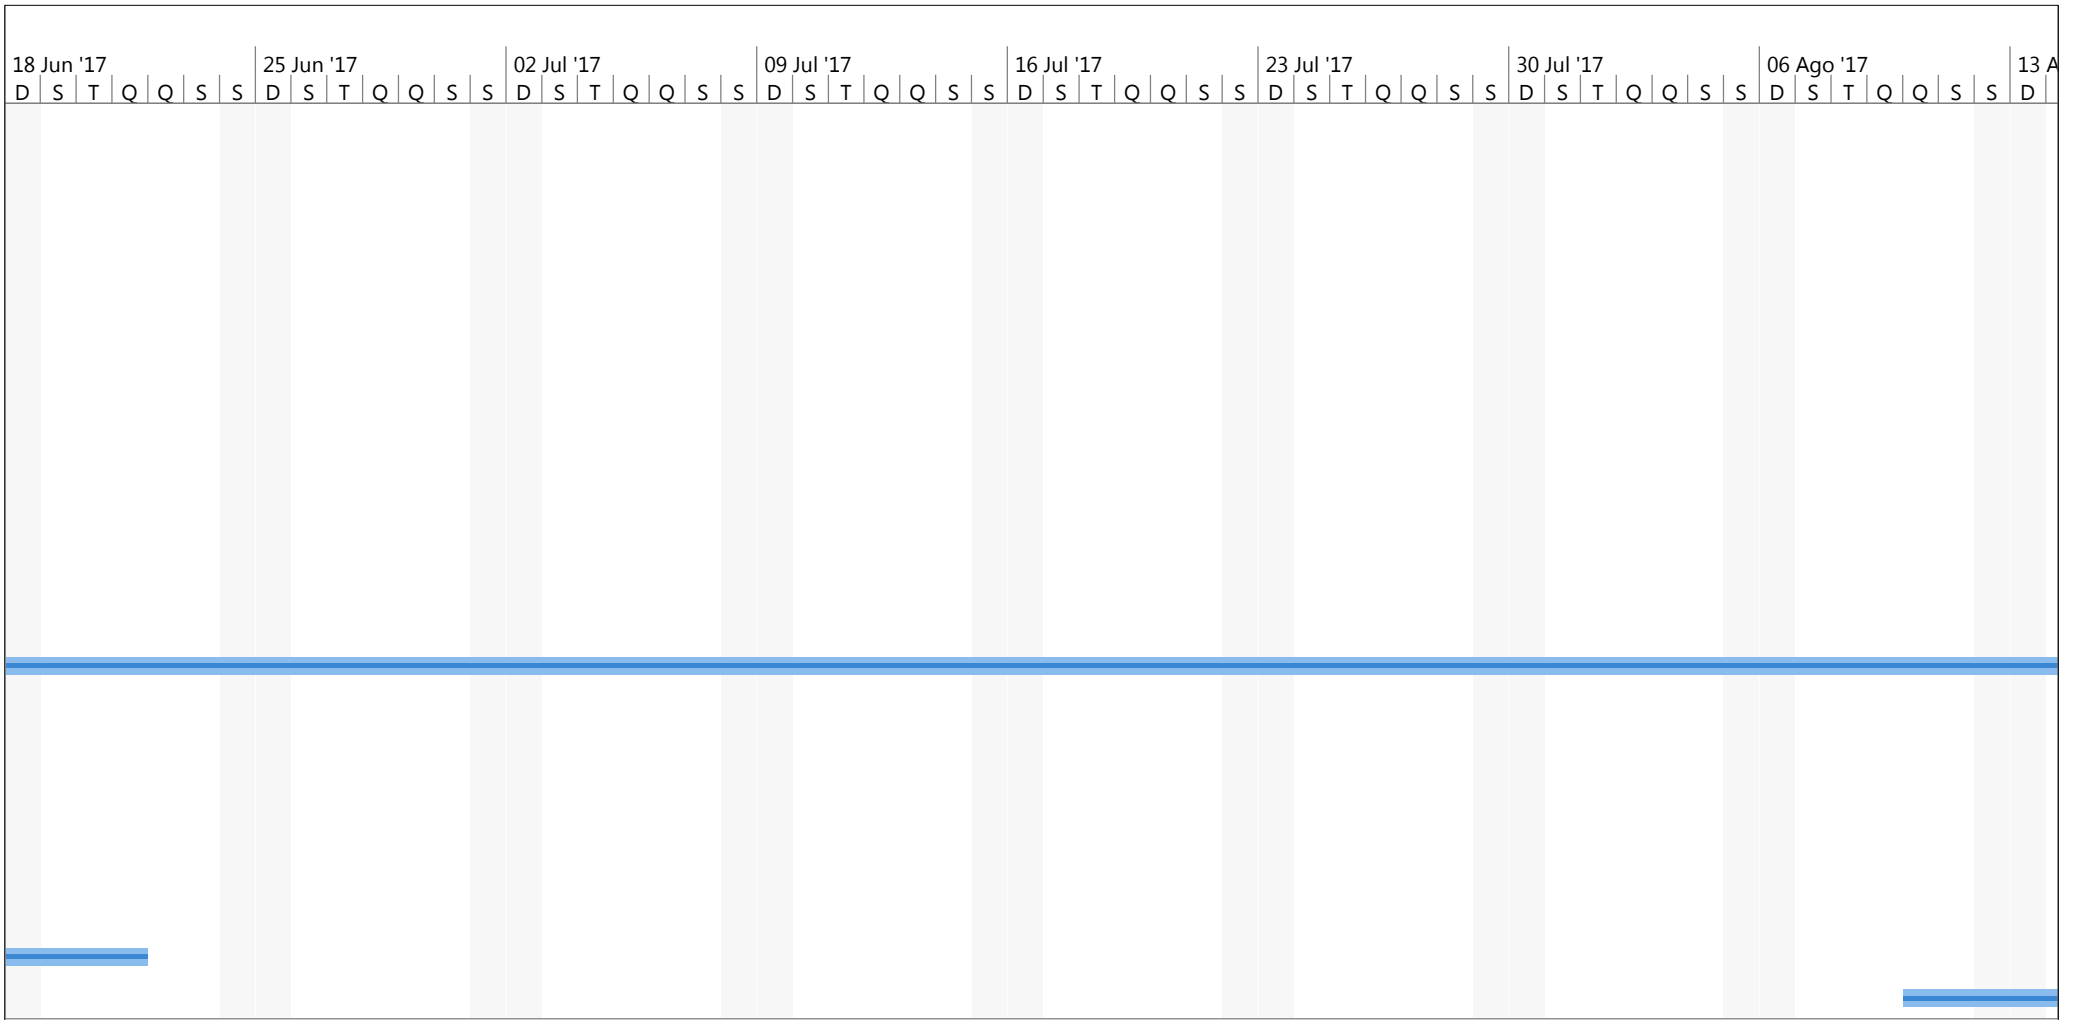


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

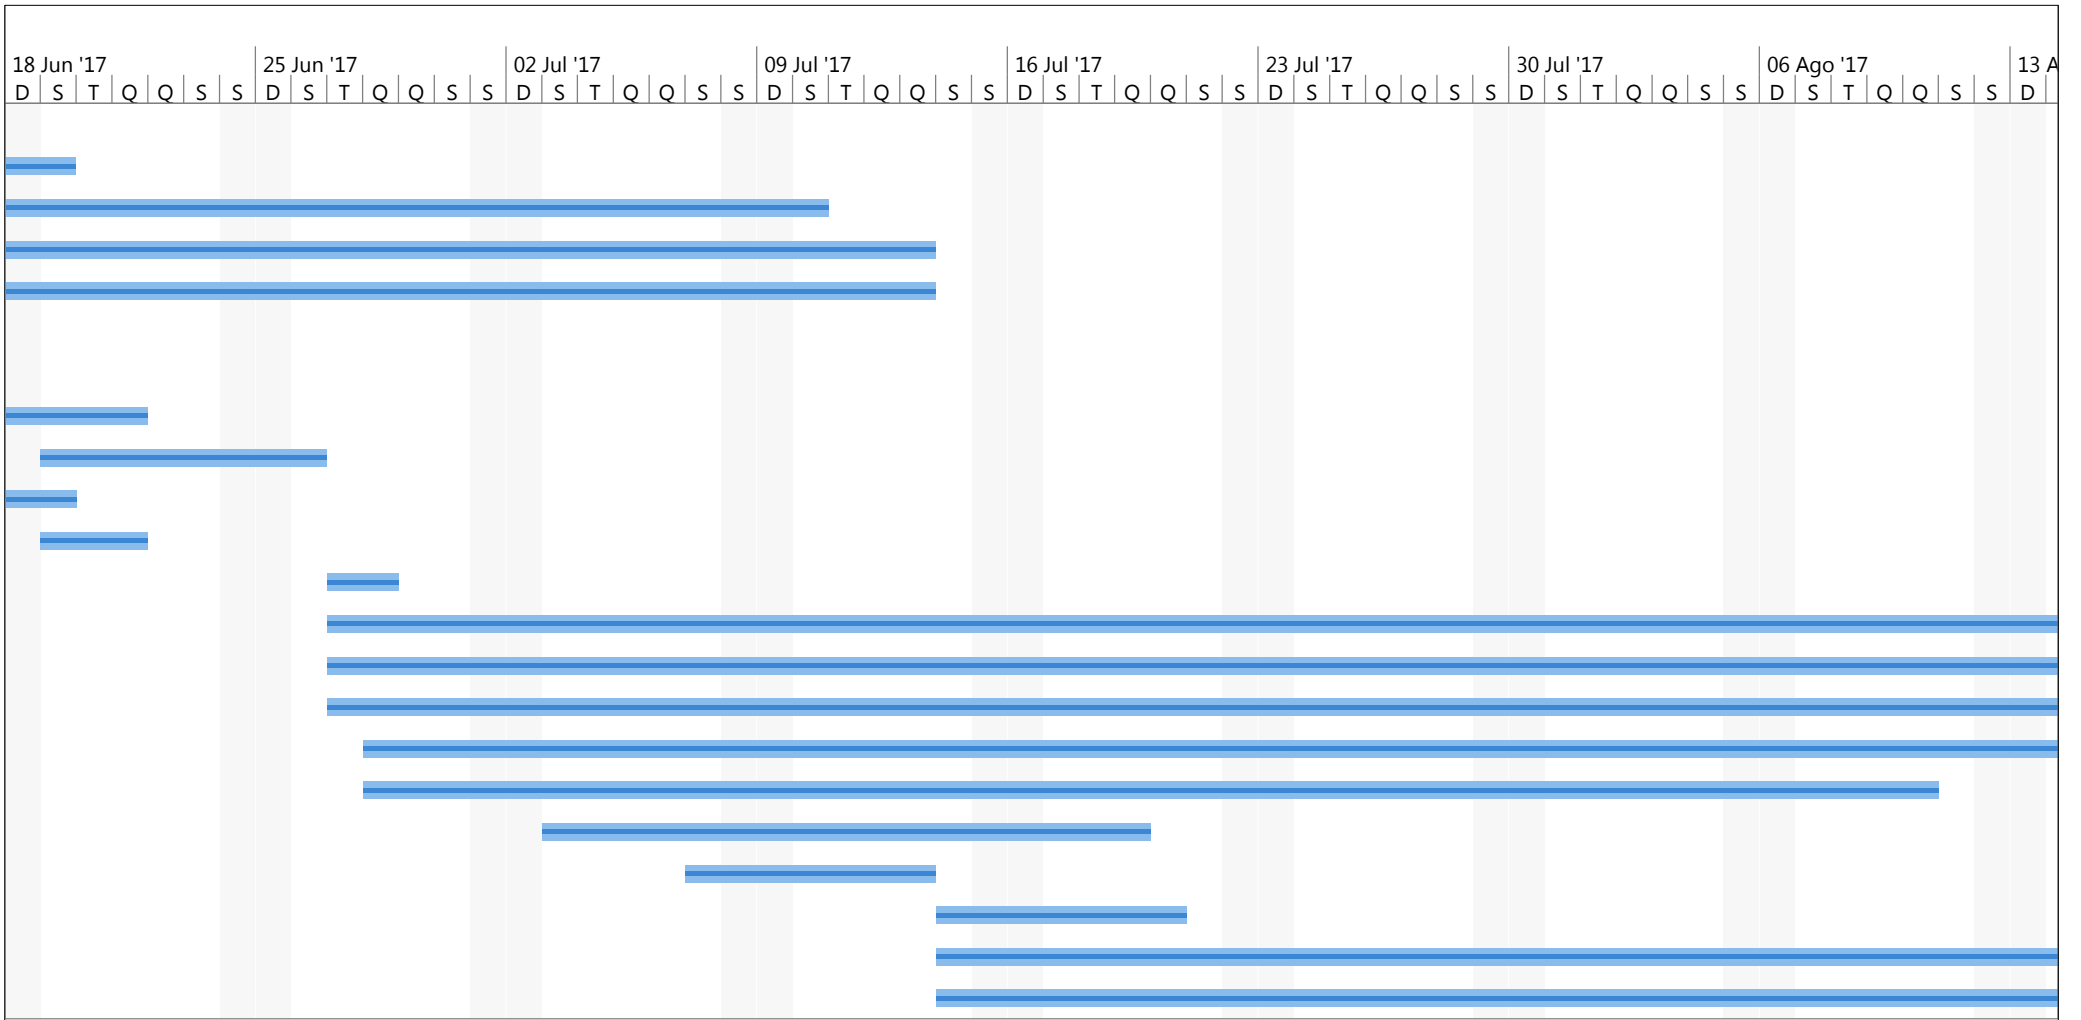

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

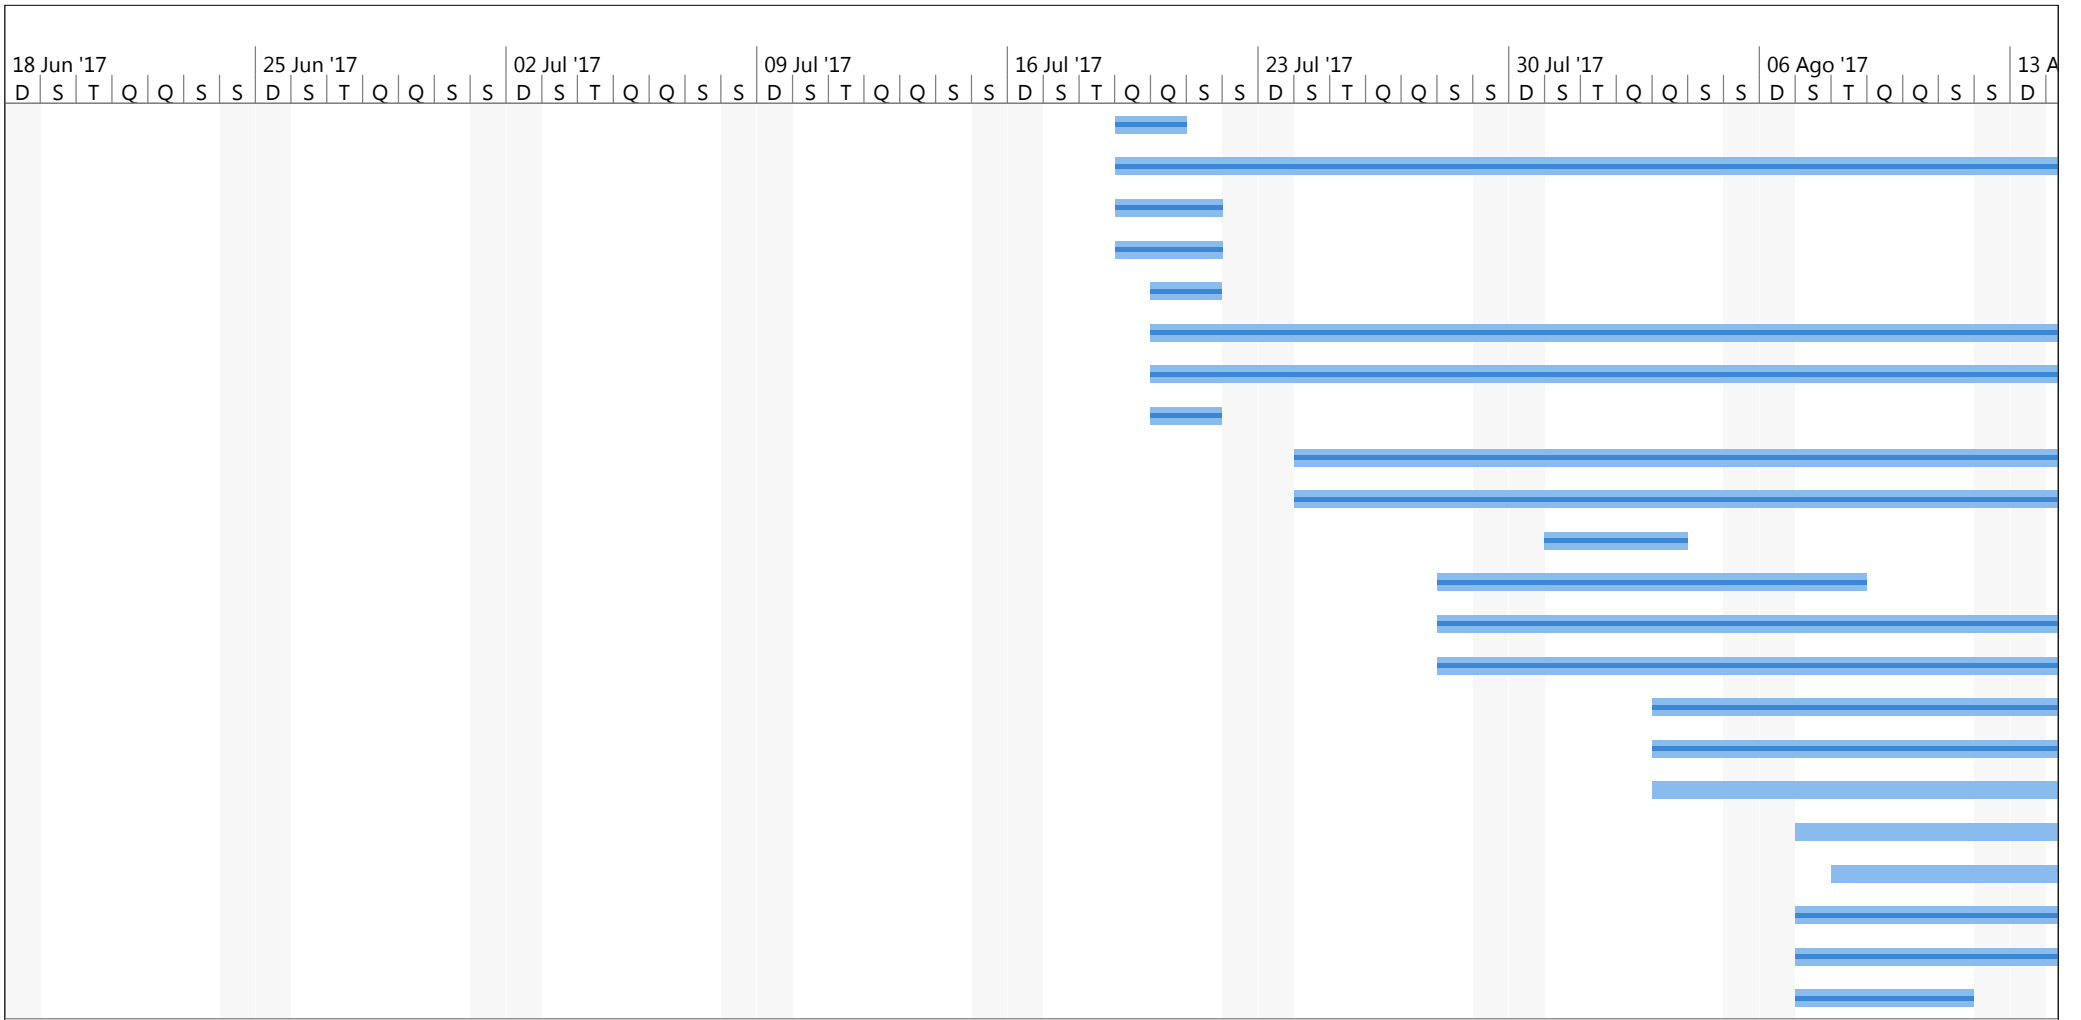

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

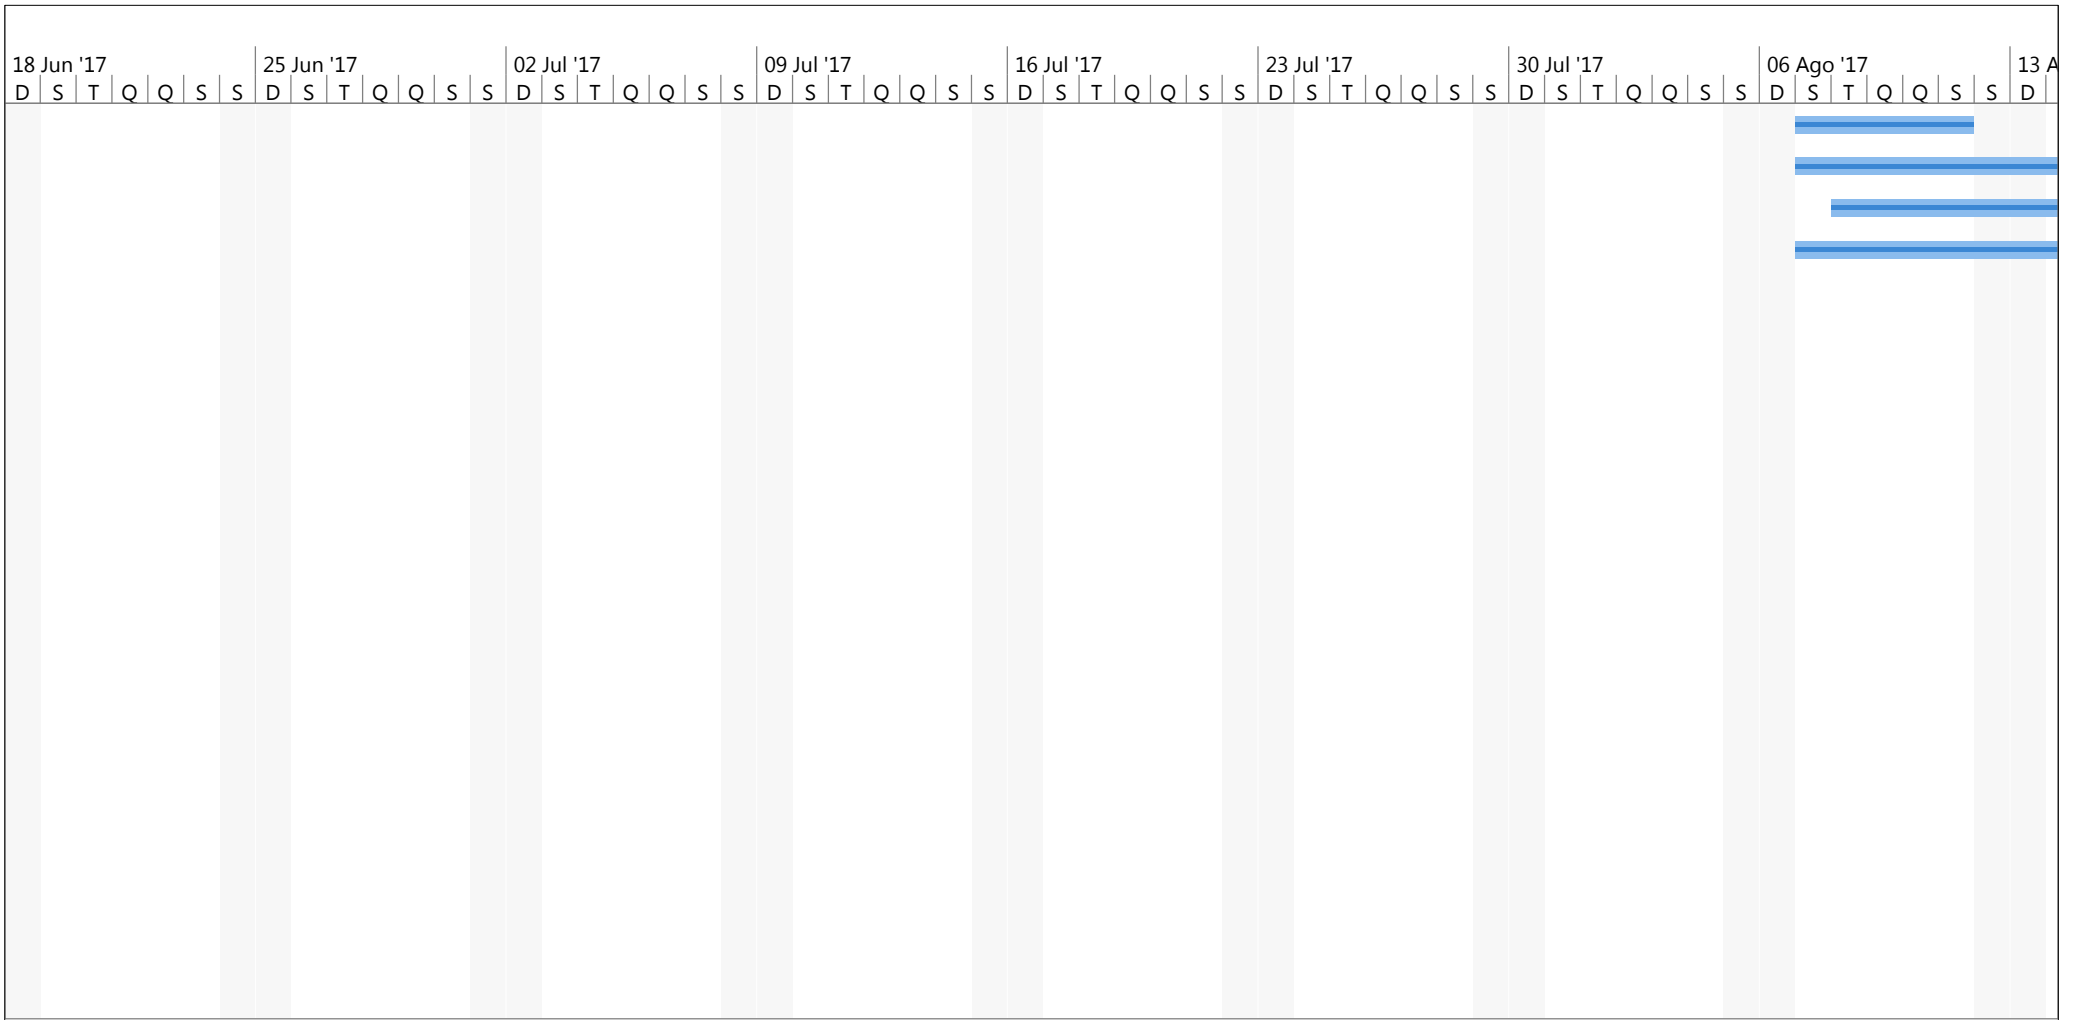

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

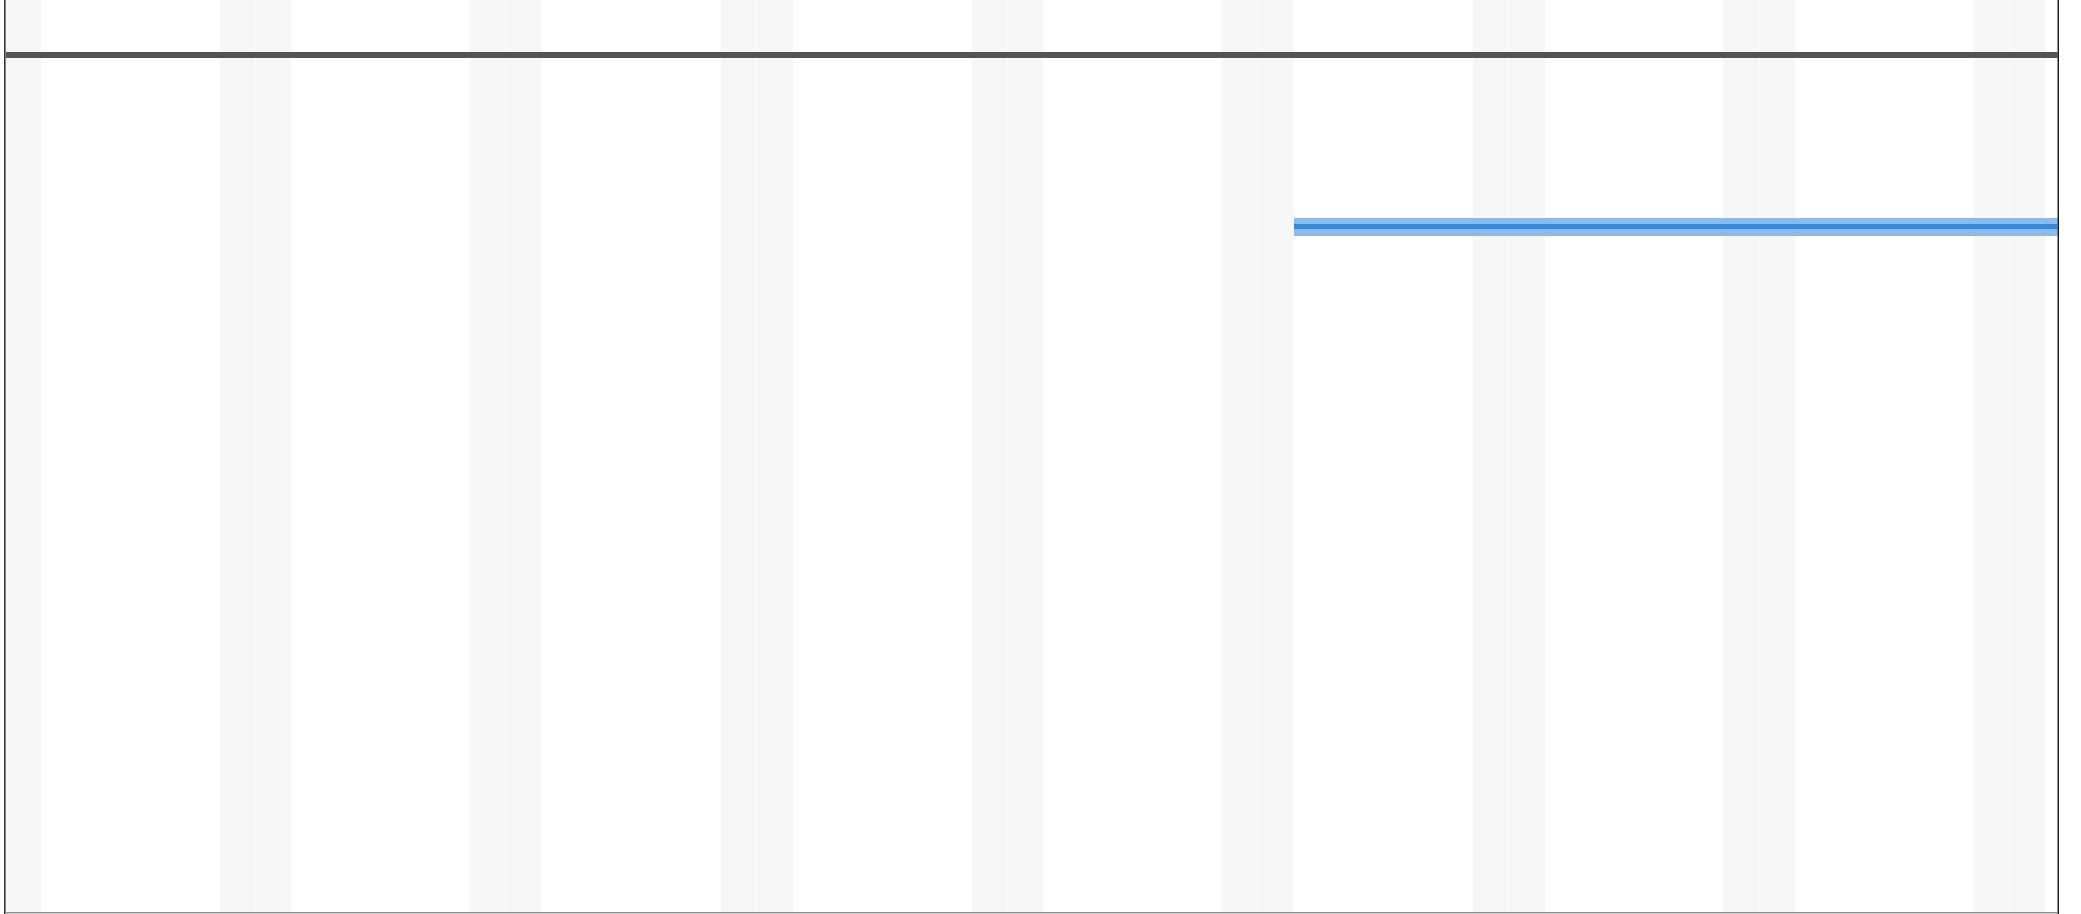


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

18 Jun '17 | 25 Jun '17 | 02 Jul '17 | 09 Jul '17 | 16 Jul '17 | 23 Jul '17 | 30 Jul '17 | 06 Ago '17 | 13 A

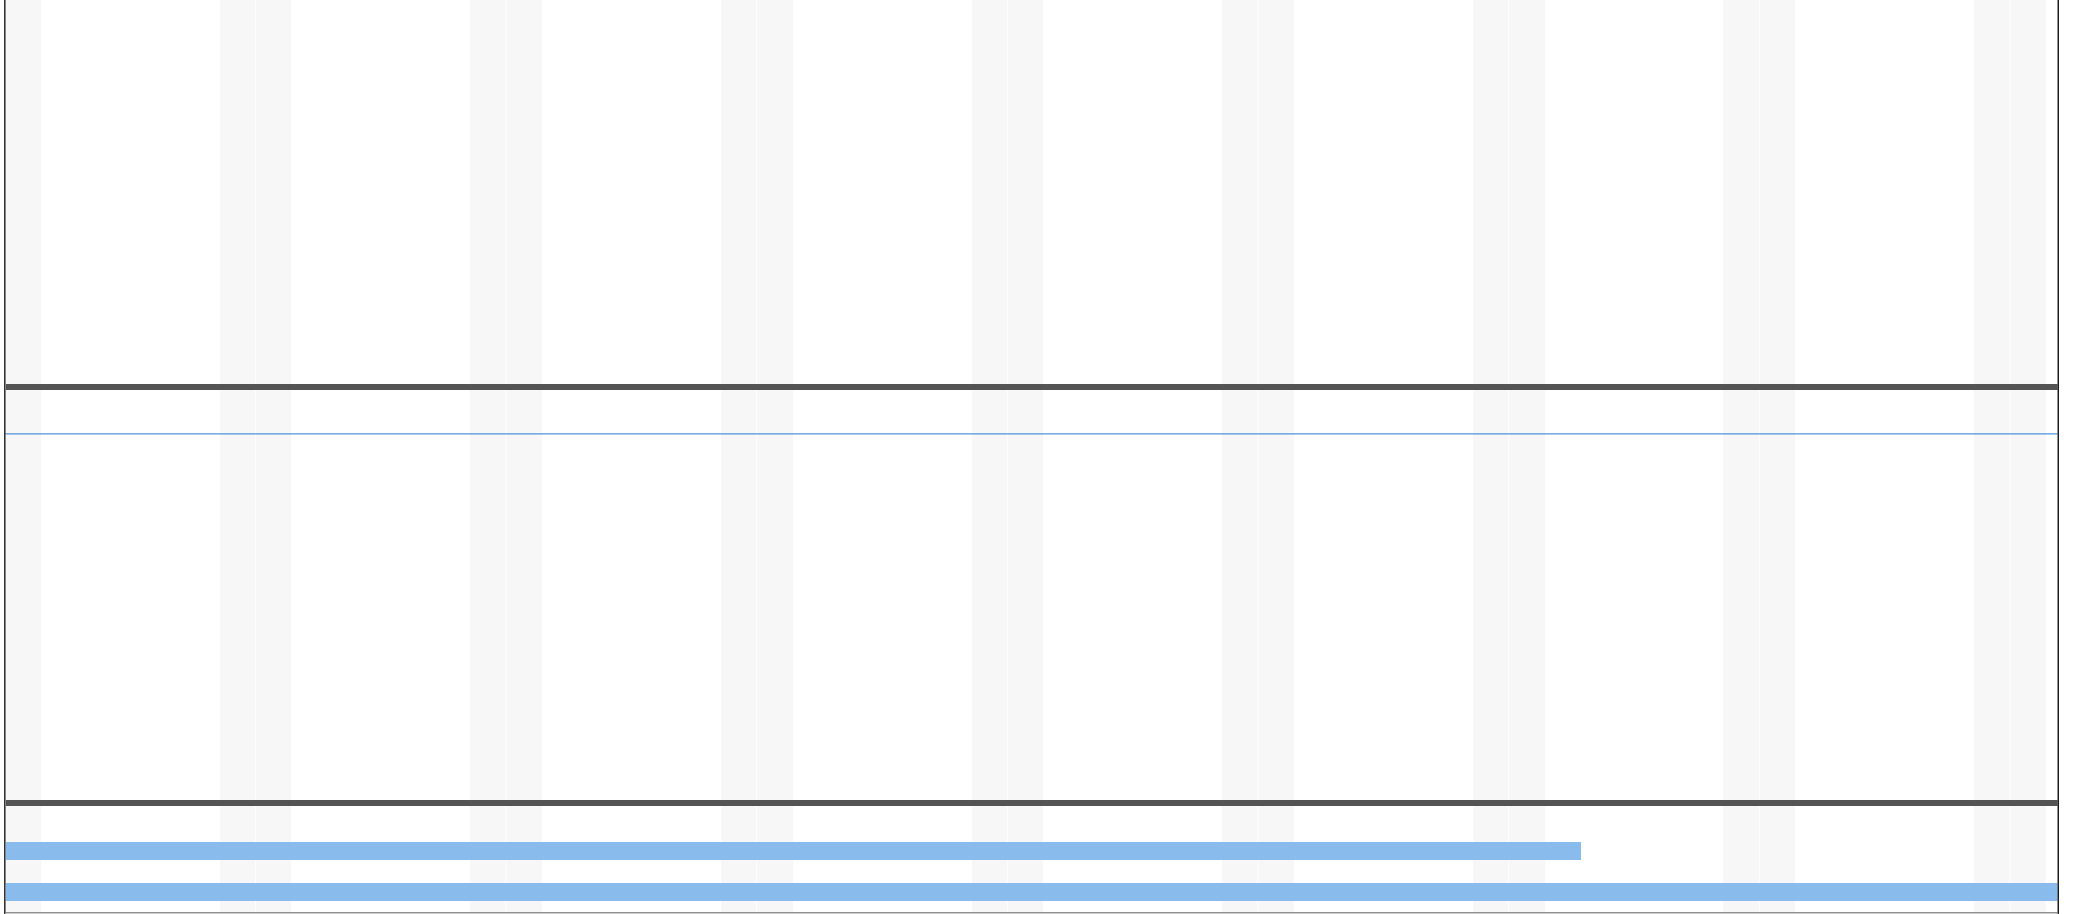


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Ago '17 20 Ago '17 27 Ago '17 03 Set '17 10 Set '17 17 Set '17 24 Set '17 01 Out '17 08 Out '17

S | T | Q | Q | S | S D | S | T | Q | Q | S | S D | S | T | Q | Q | S | S D | S | T | Q | Q | S | S D | S | T | Q | Q | S | S D | S | T | Q | Q | S | S D | S | T | Q | Q | S | S D | S | T | Q | Q | S | S D | S | T | Q | Q | S | S

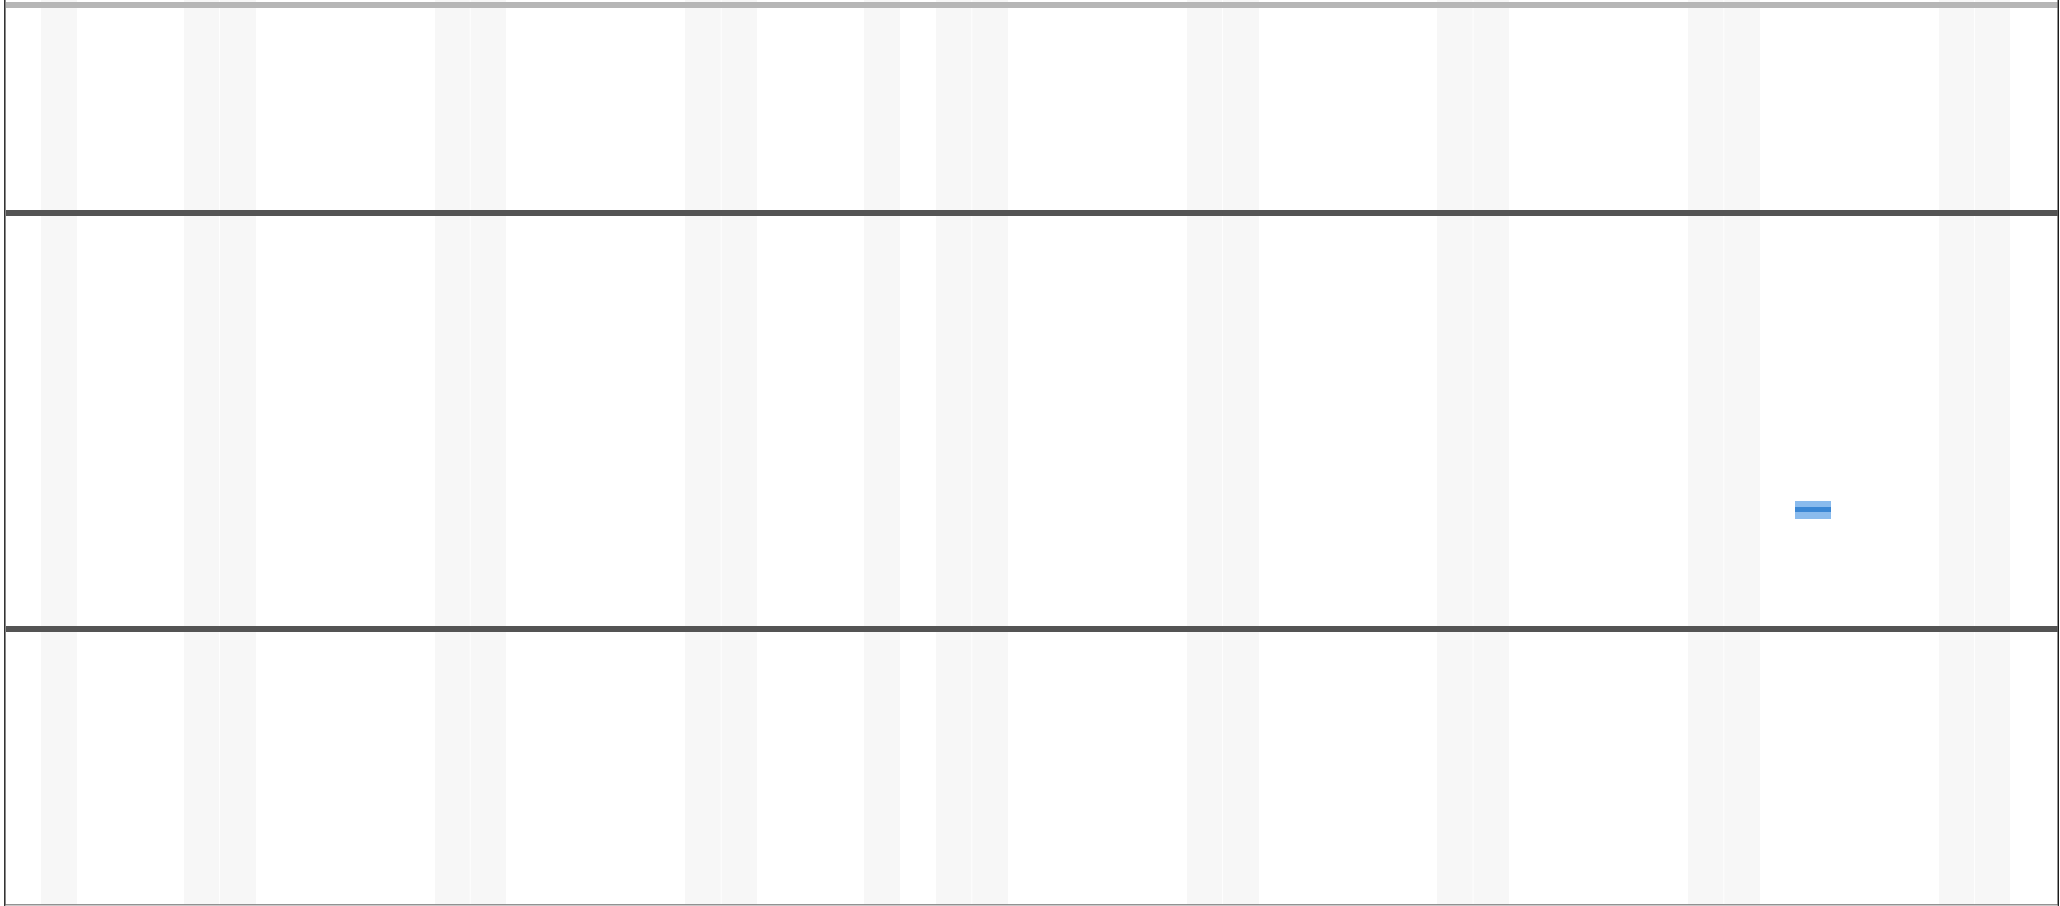


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

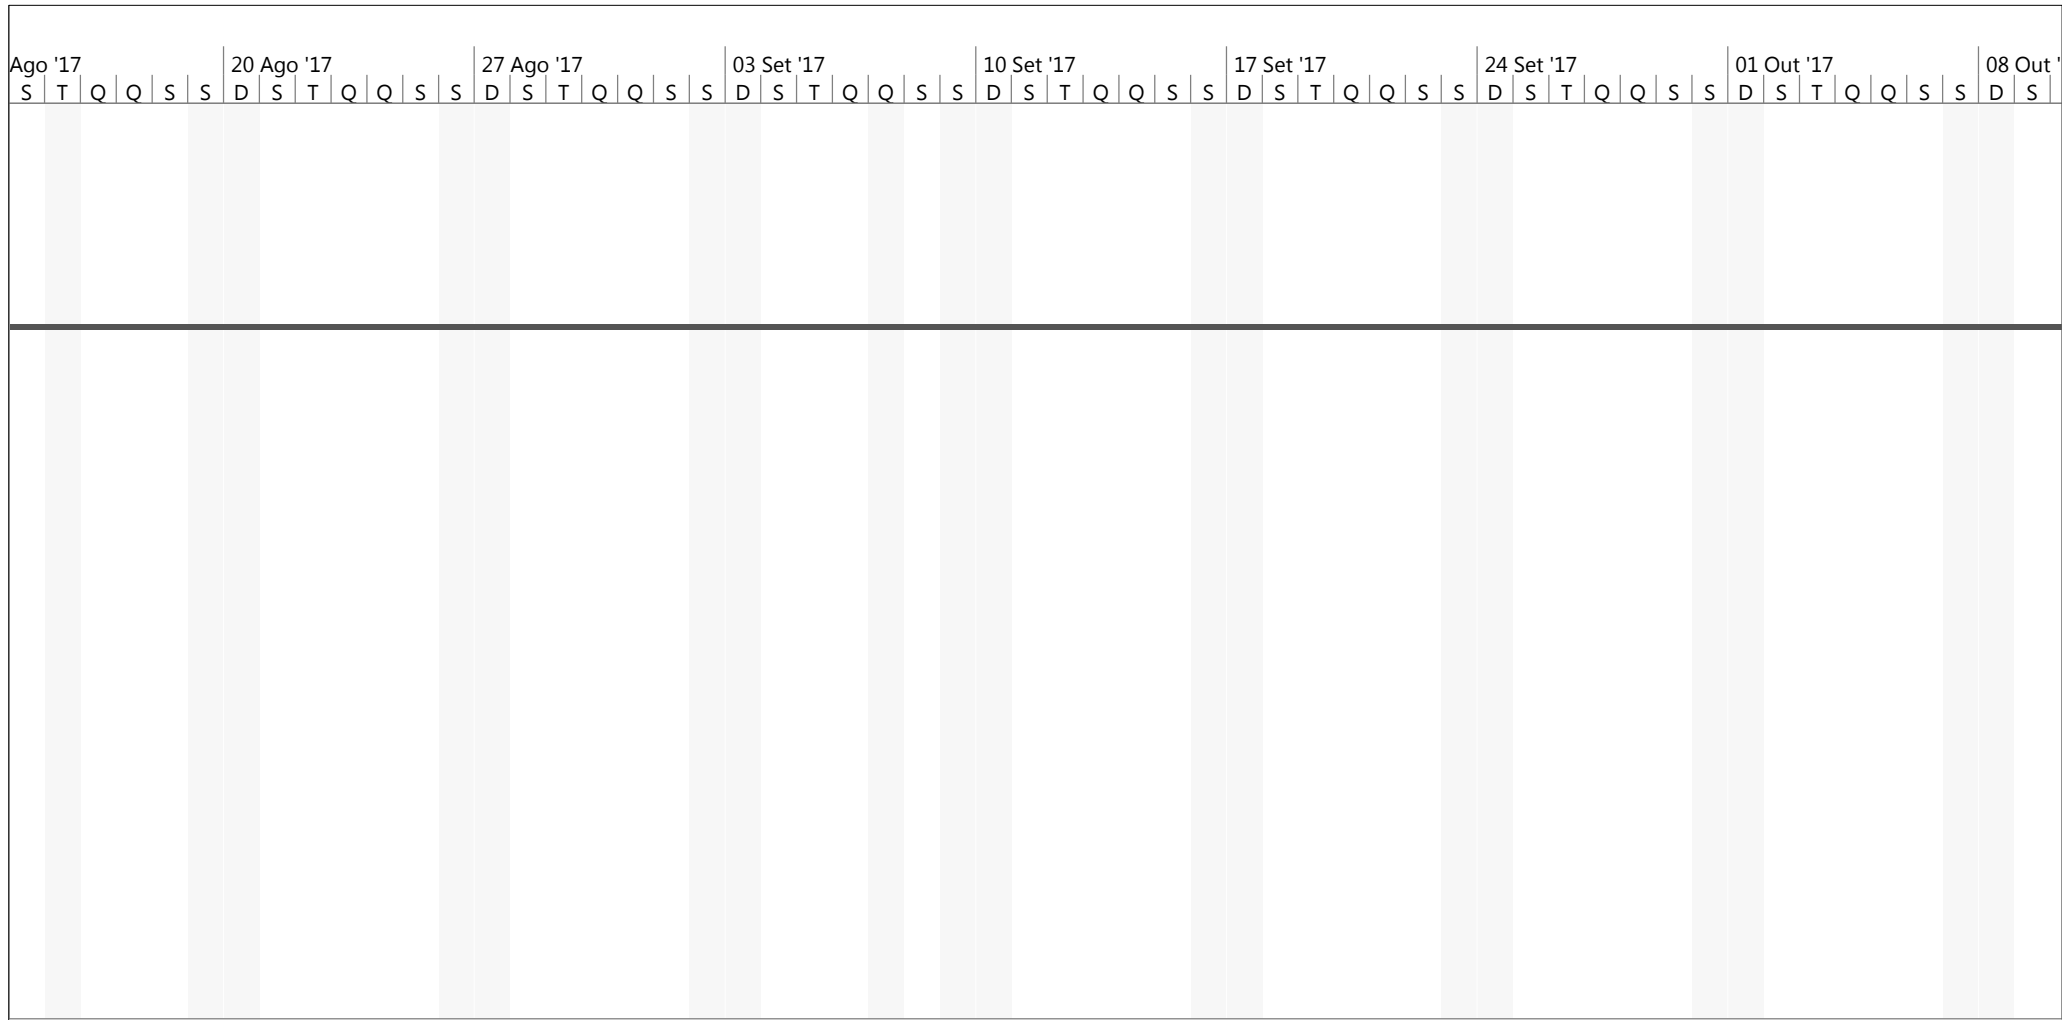


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

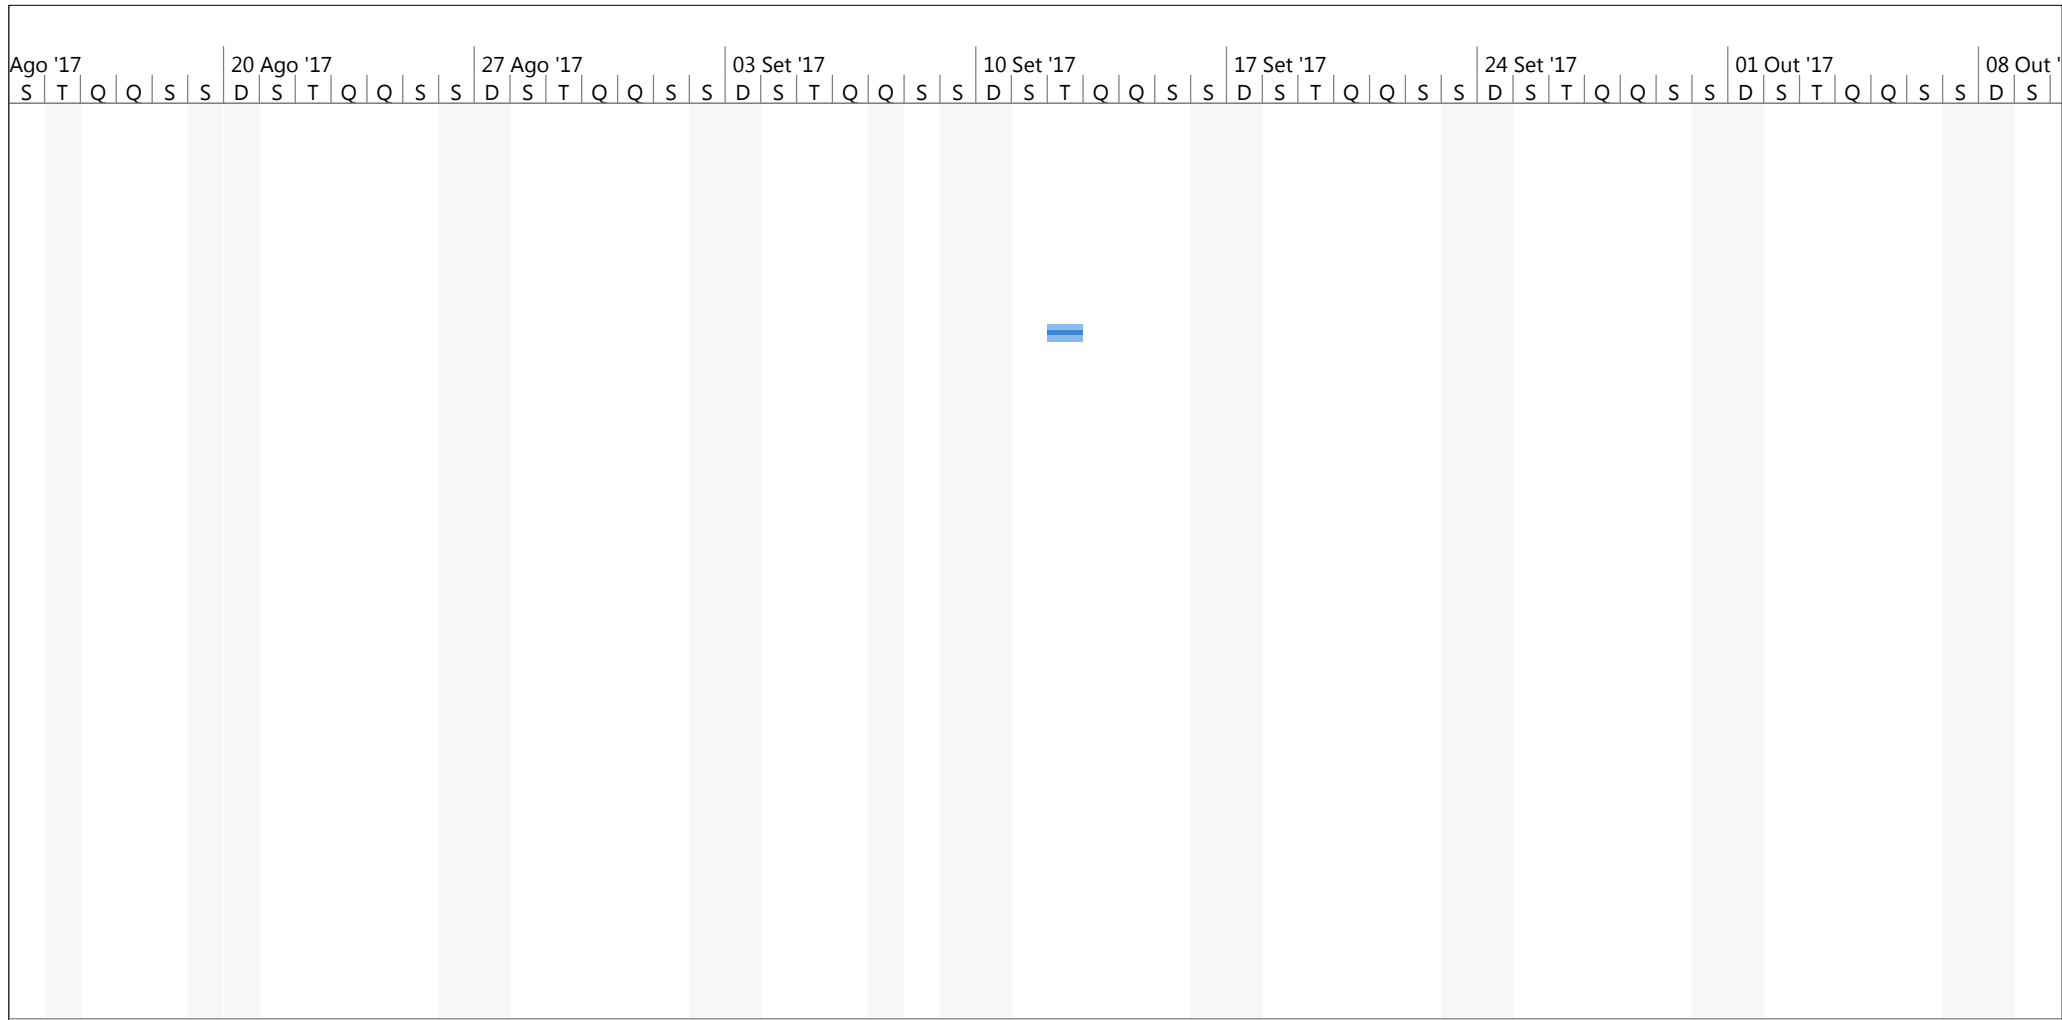


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

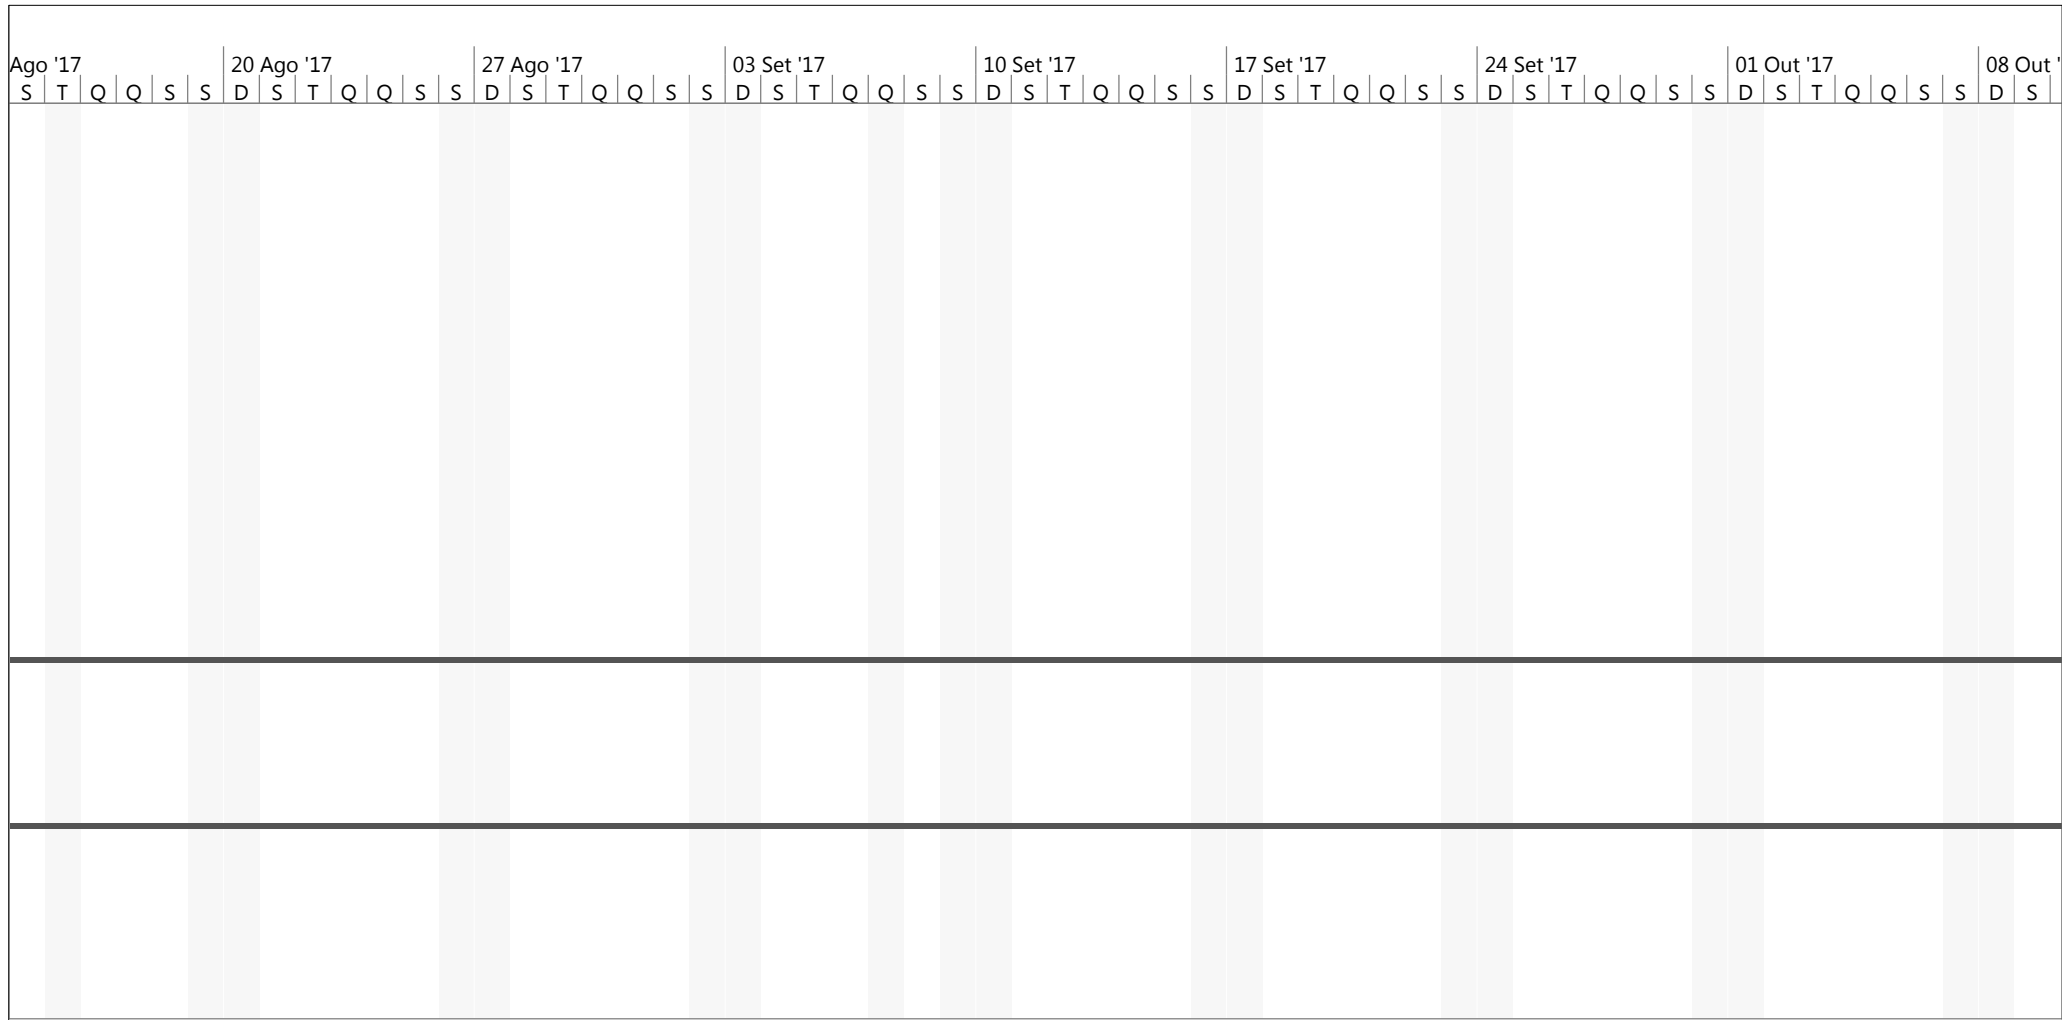

Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

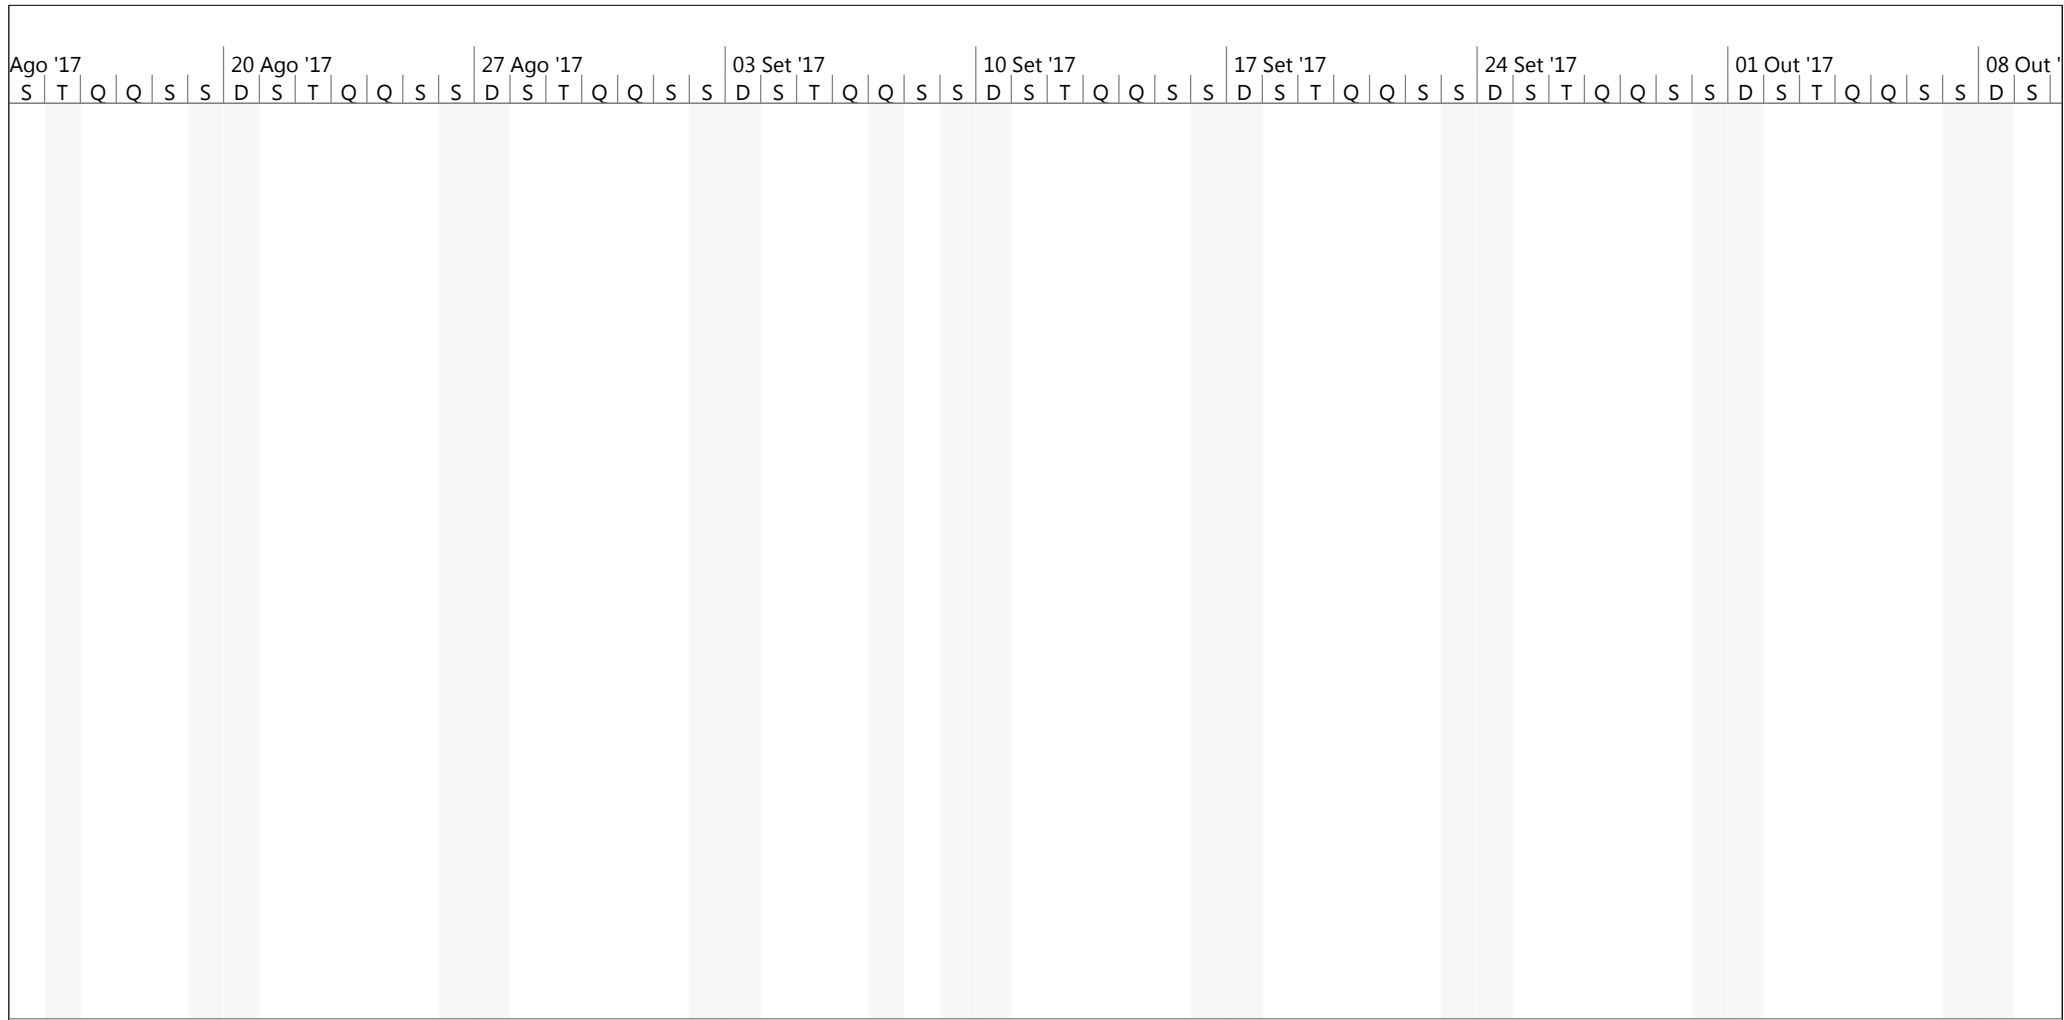


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Ago '17 | 20 Ago '17 | 27 Ago '17 | 03 Set '17 | 10 Set '17 | 17 Set '17 | 24 Set '17 | 01 Out '17 | 08 Out '17

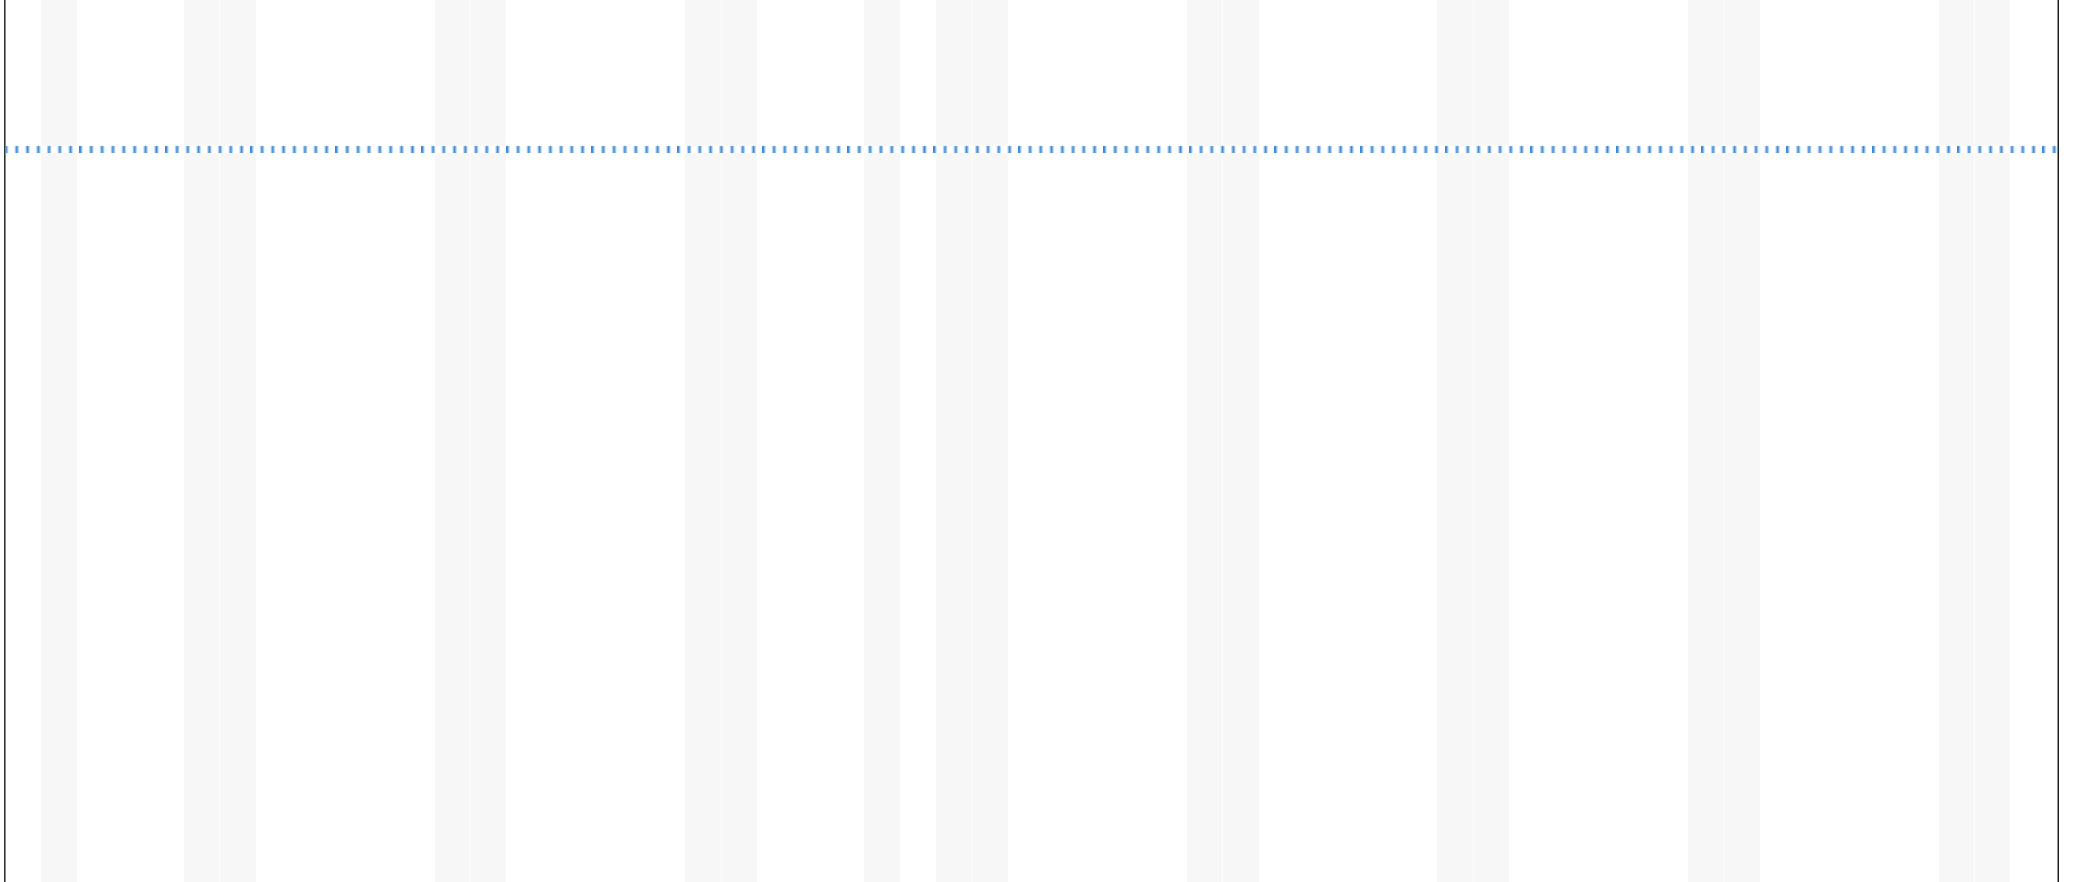


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

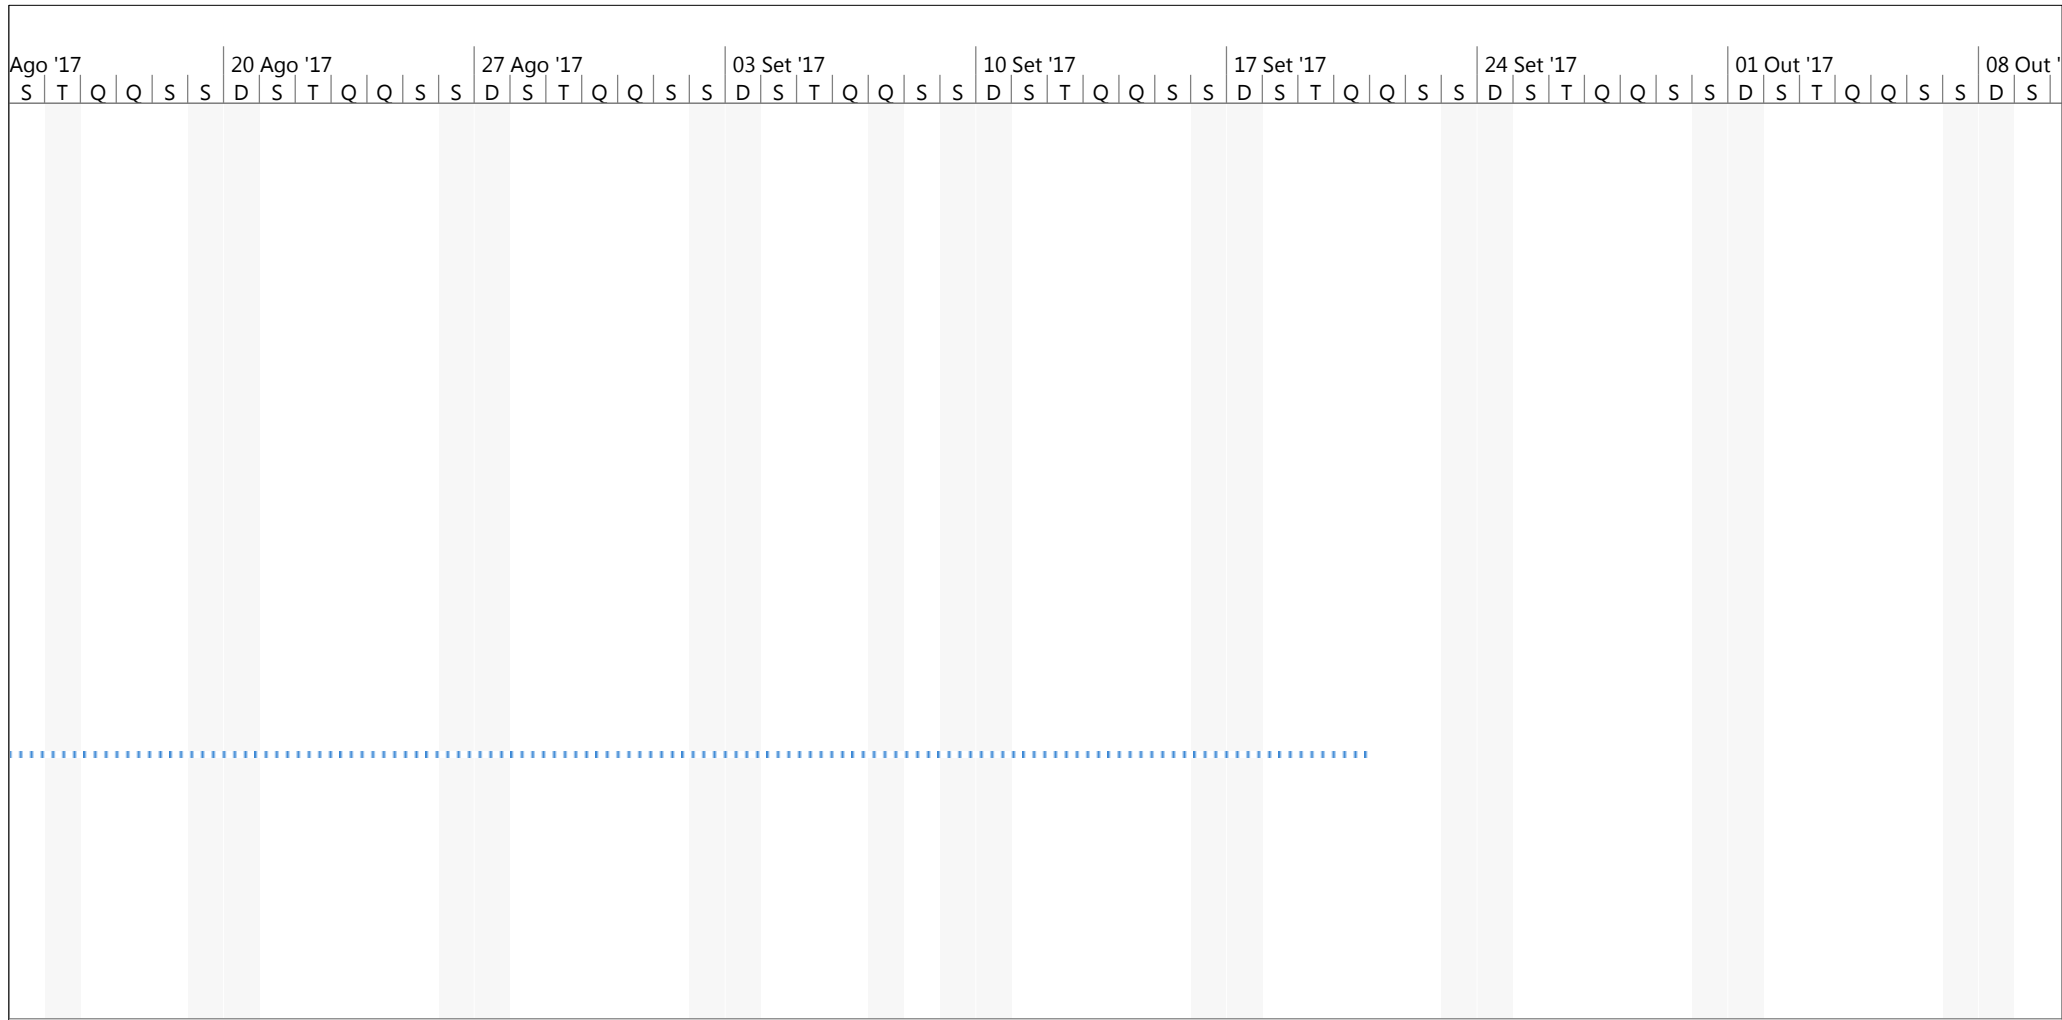


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

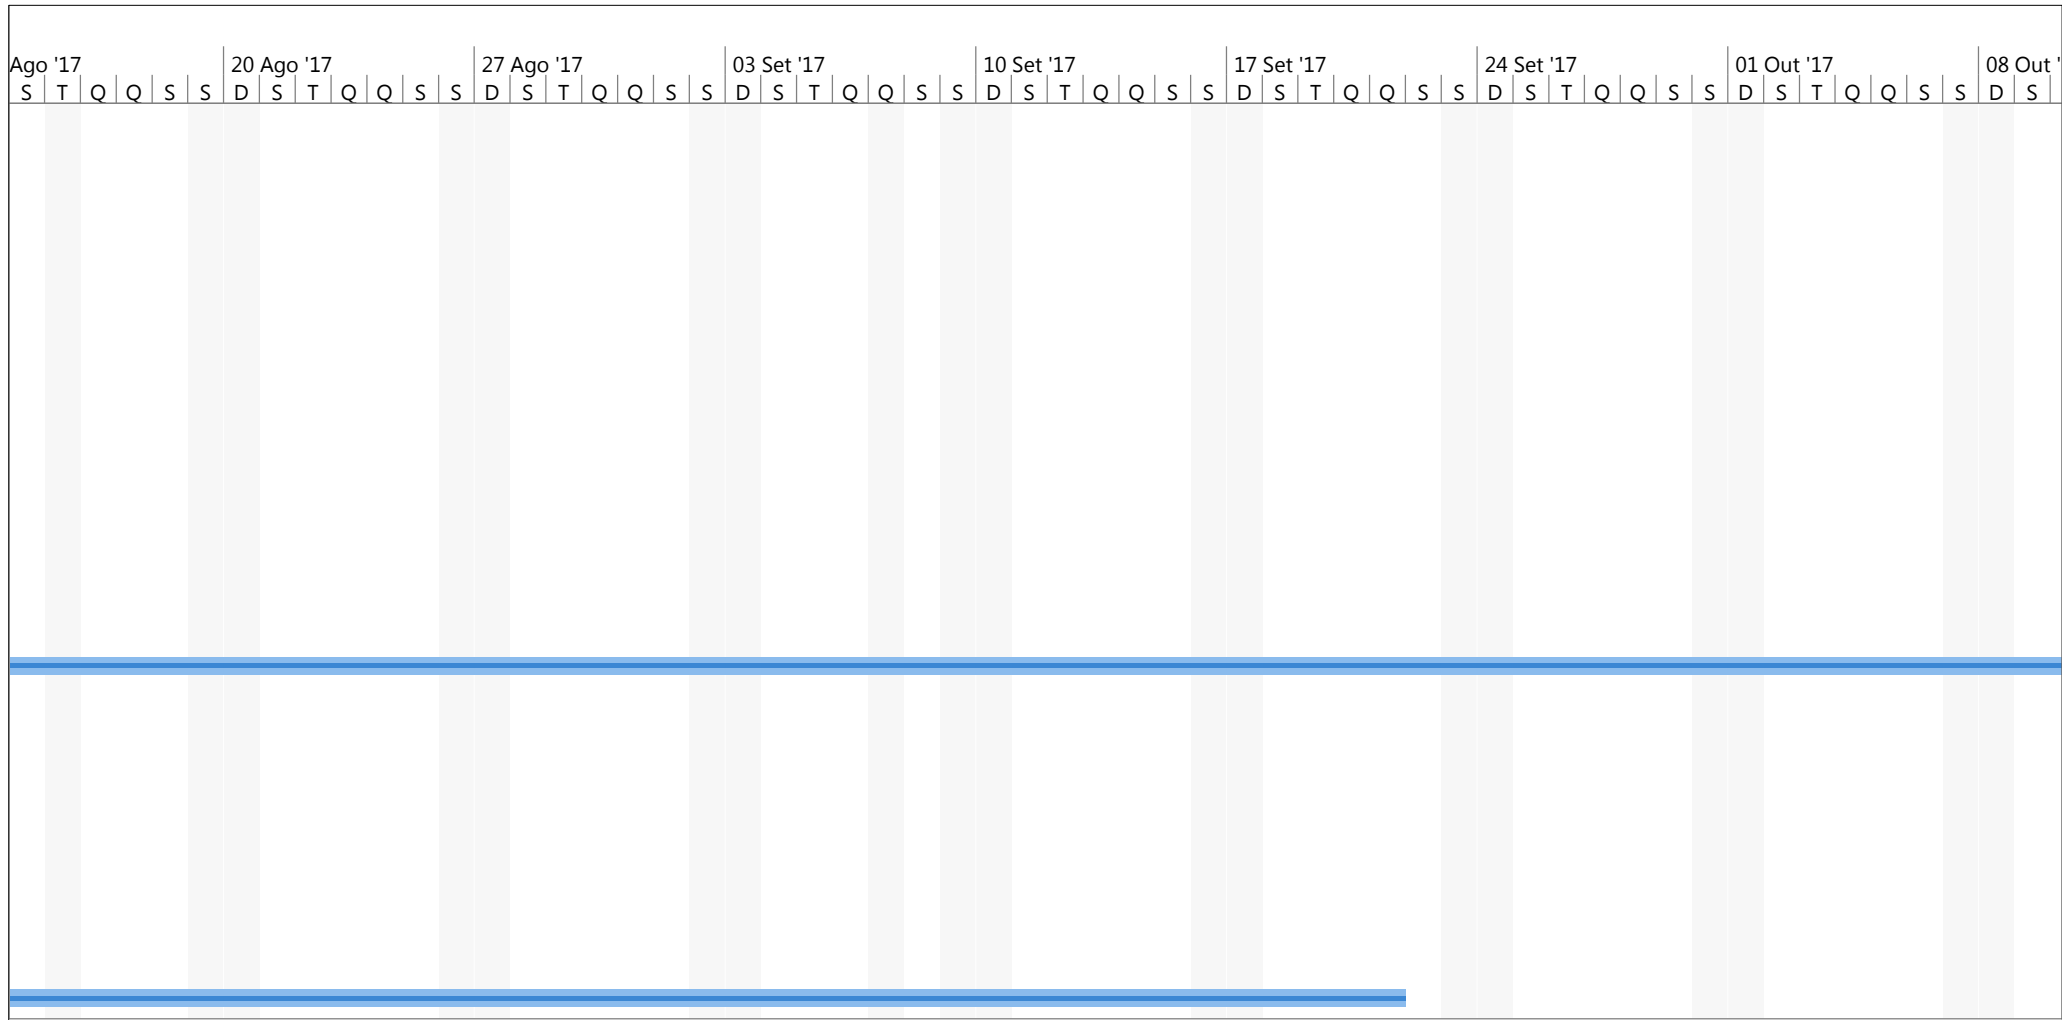


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

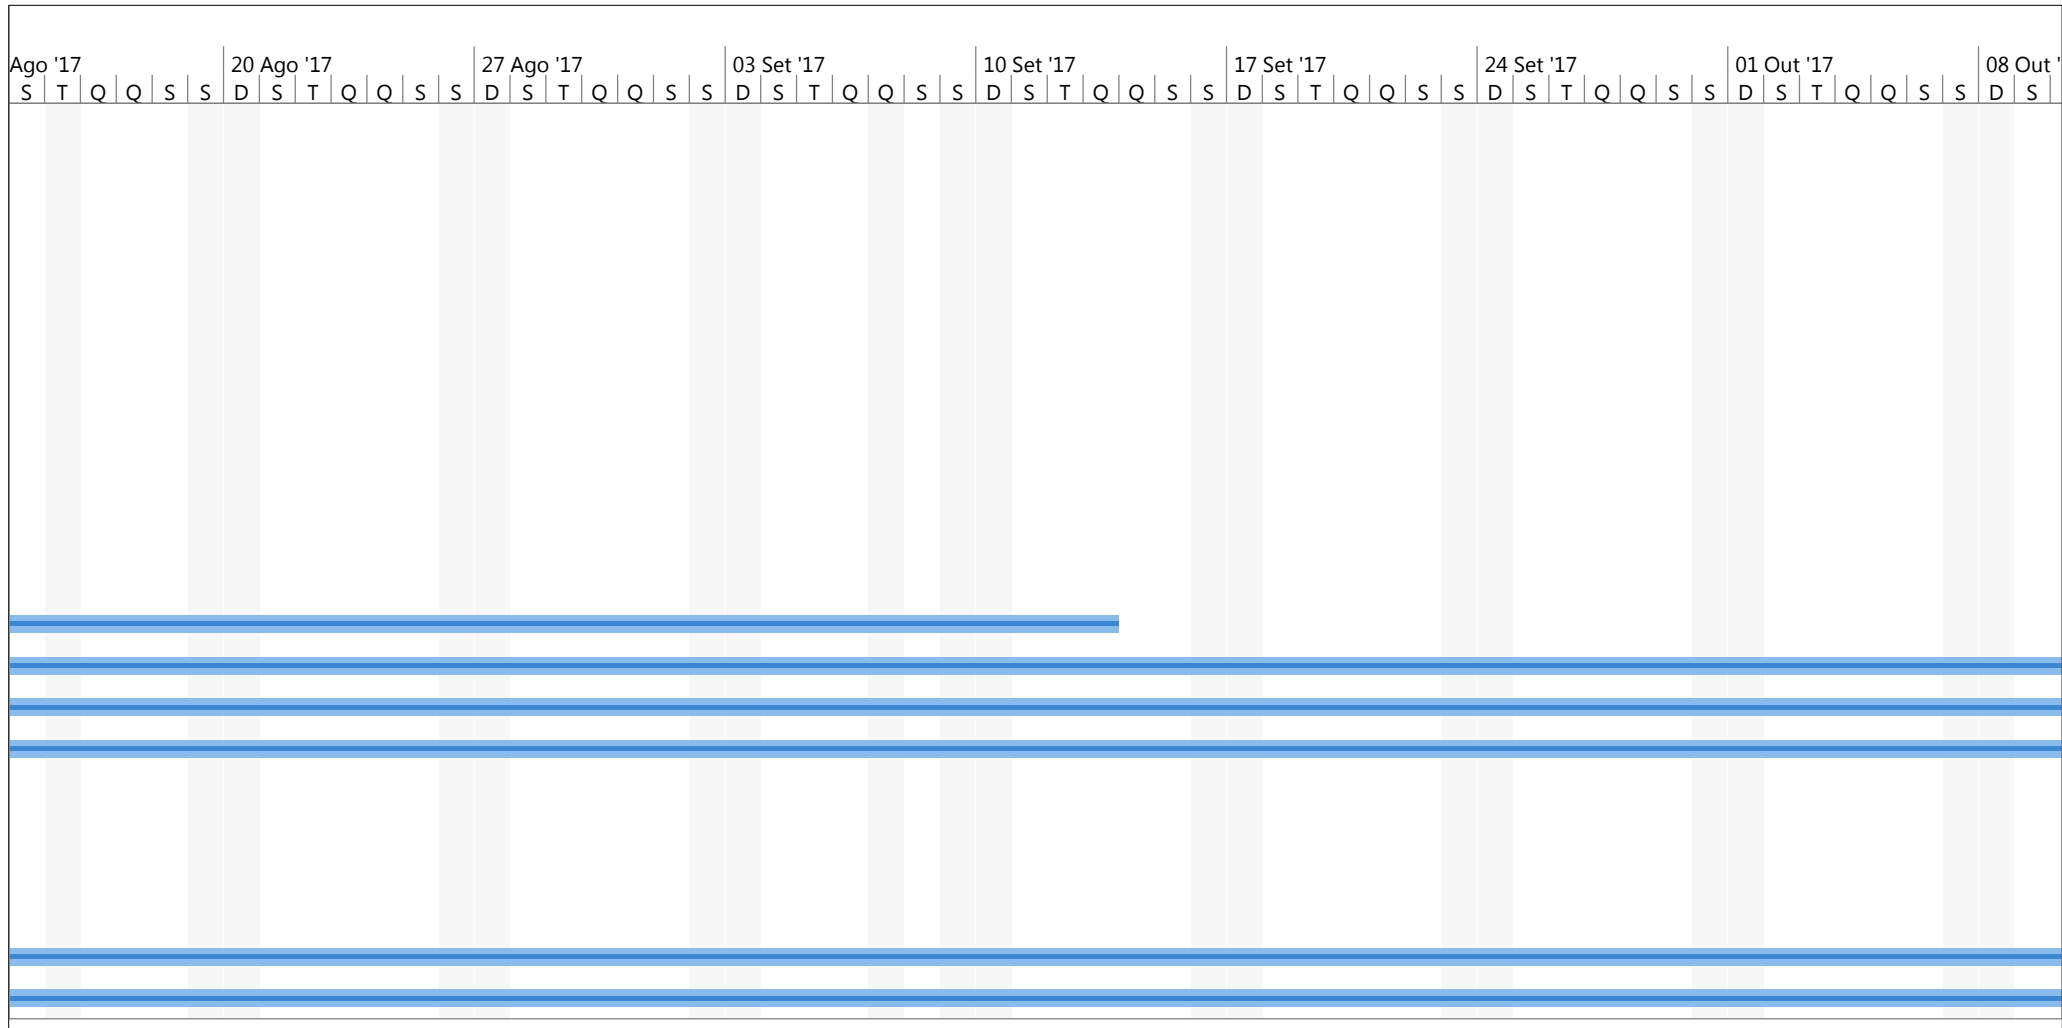


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

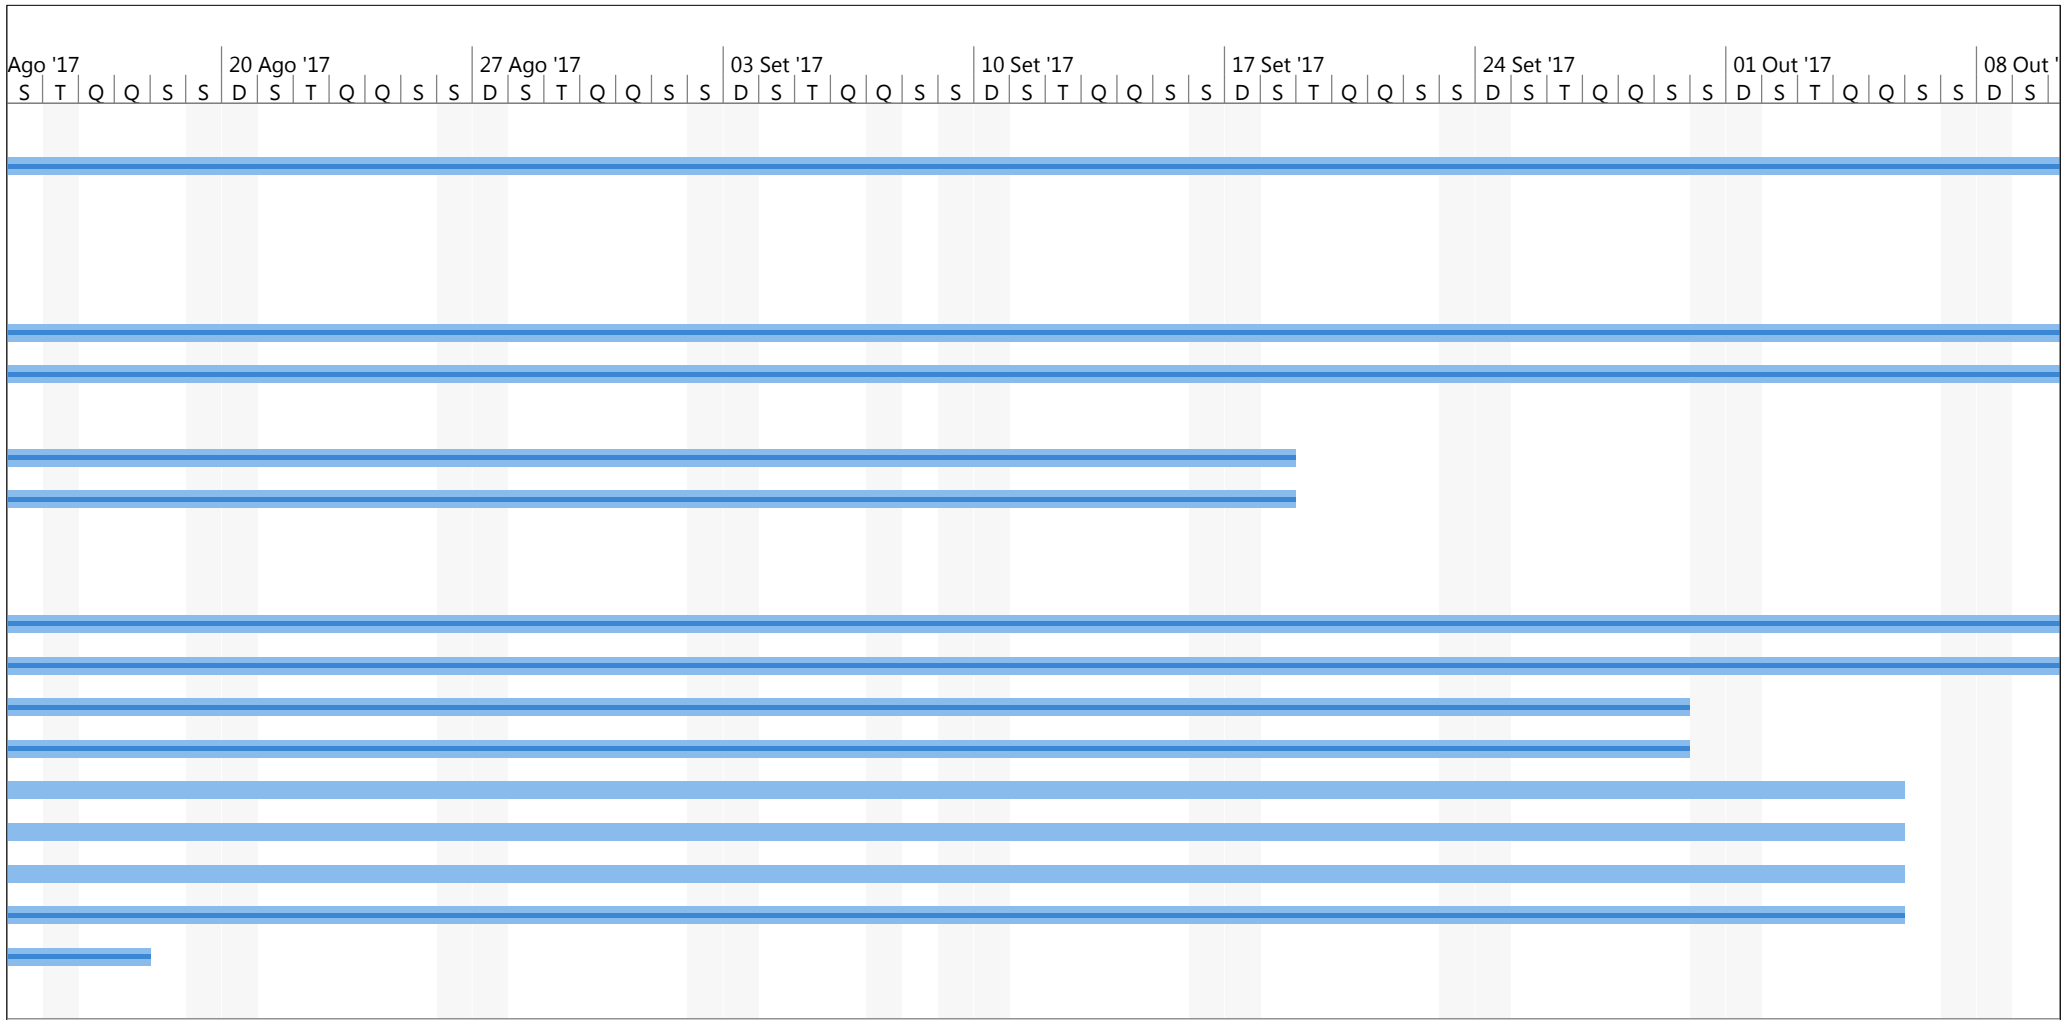

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

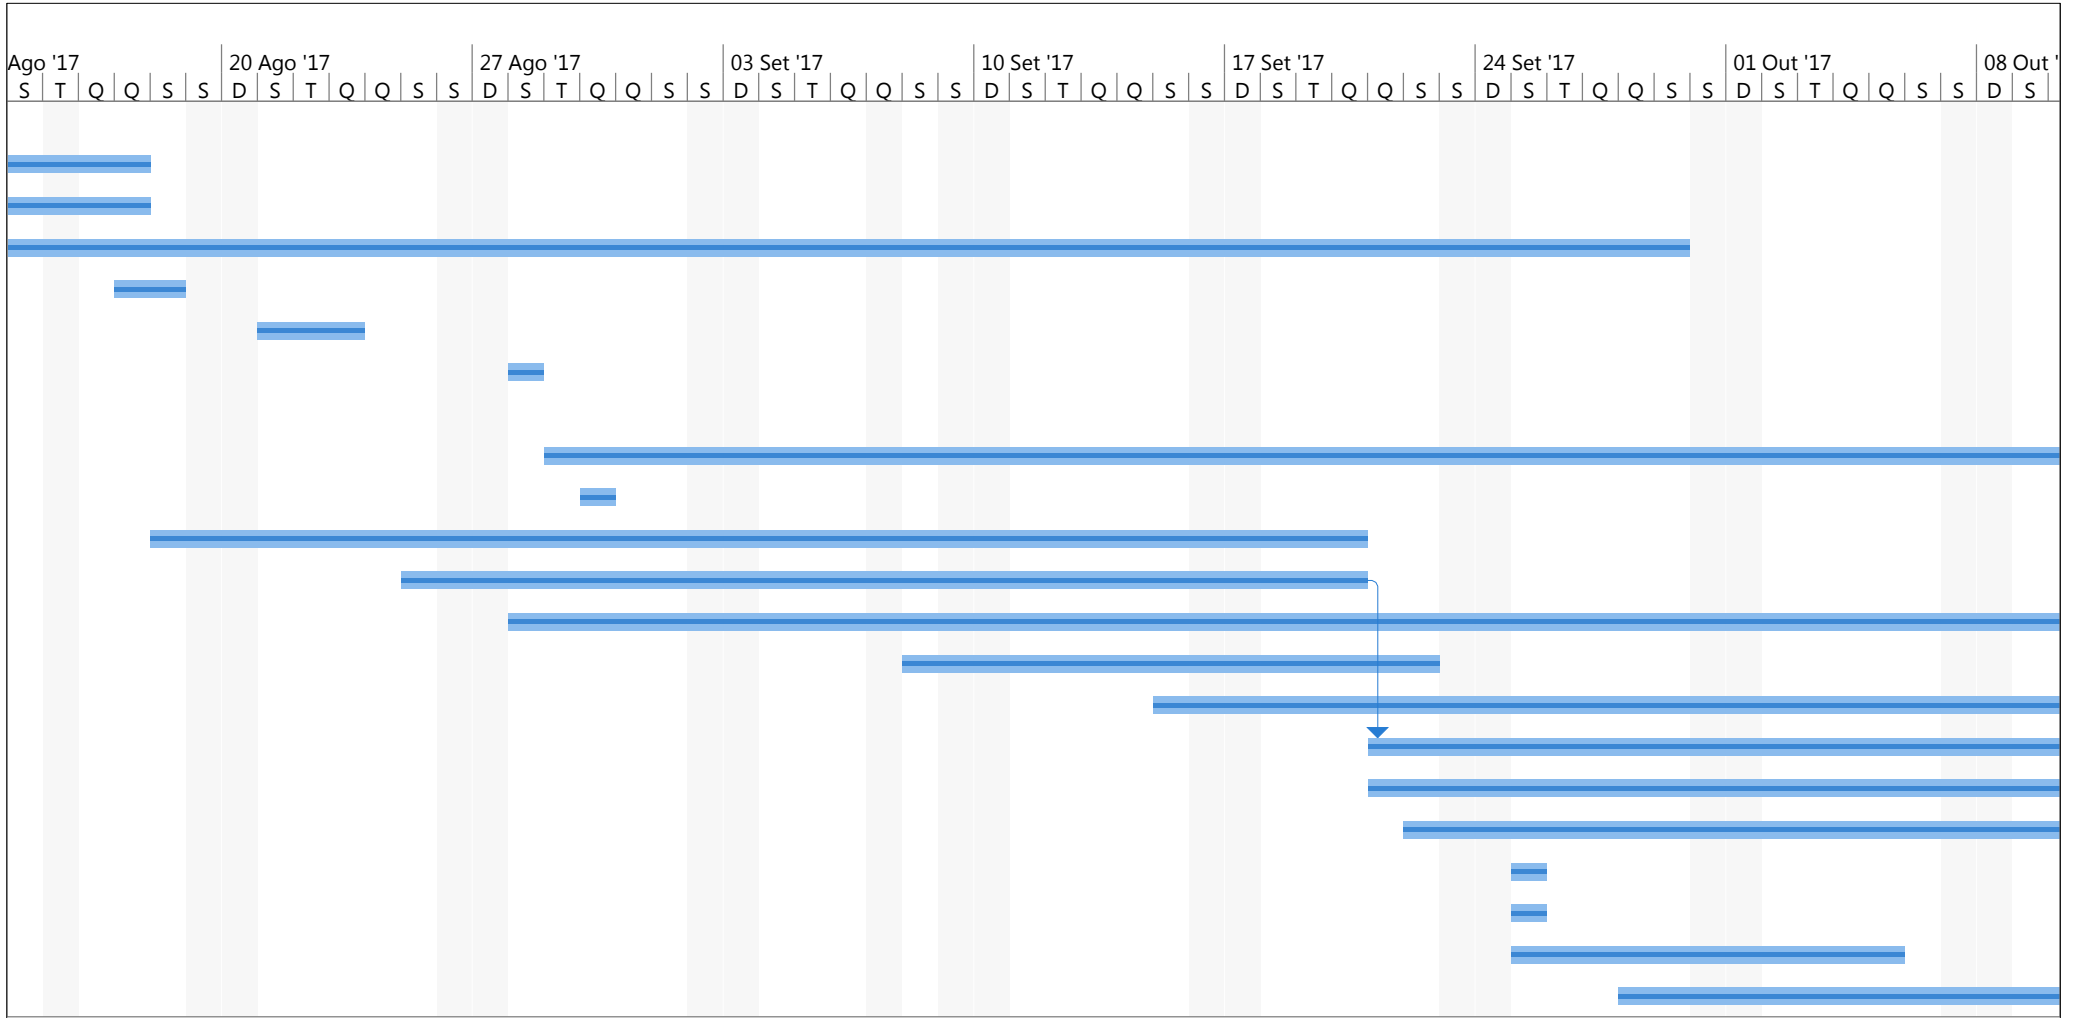


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

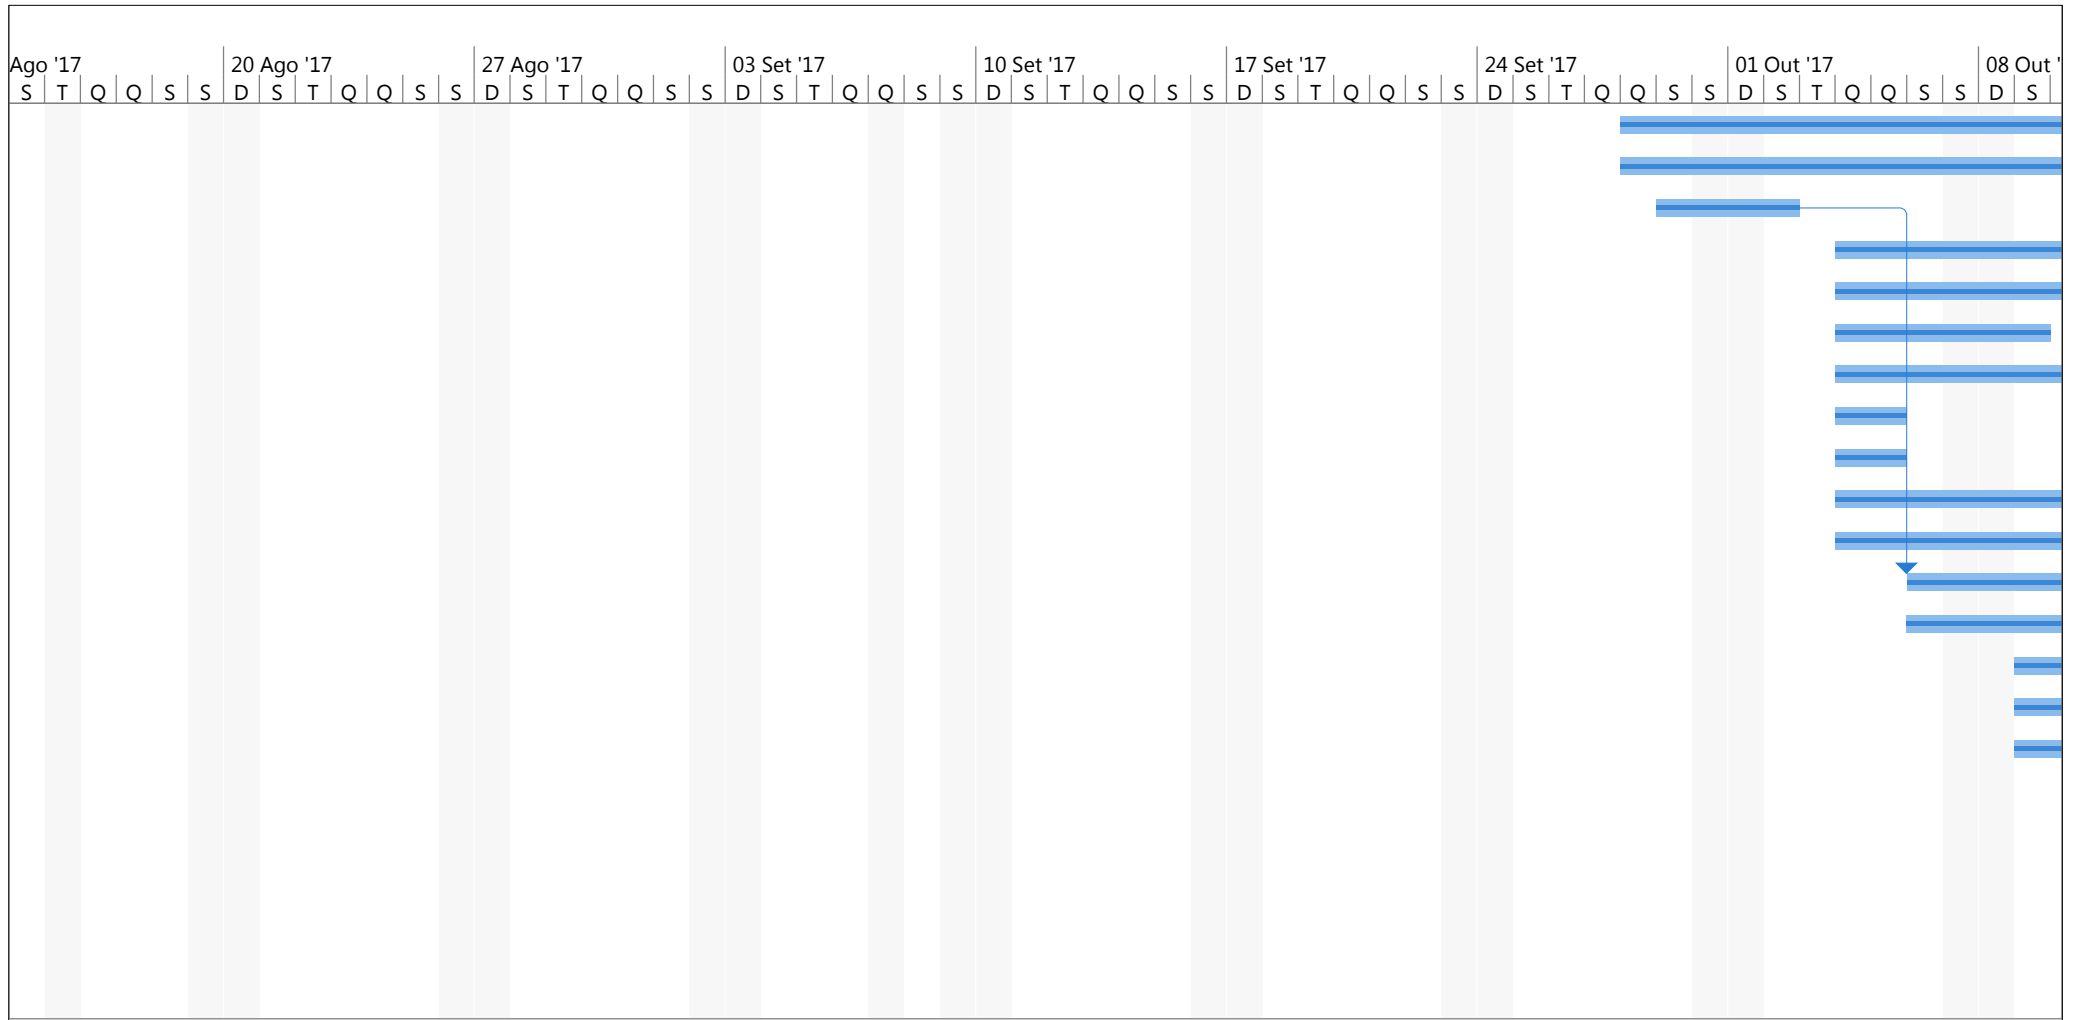


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

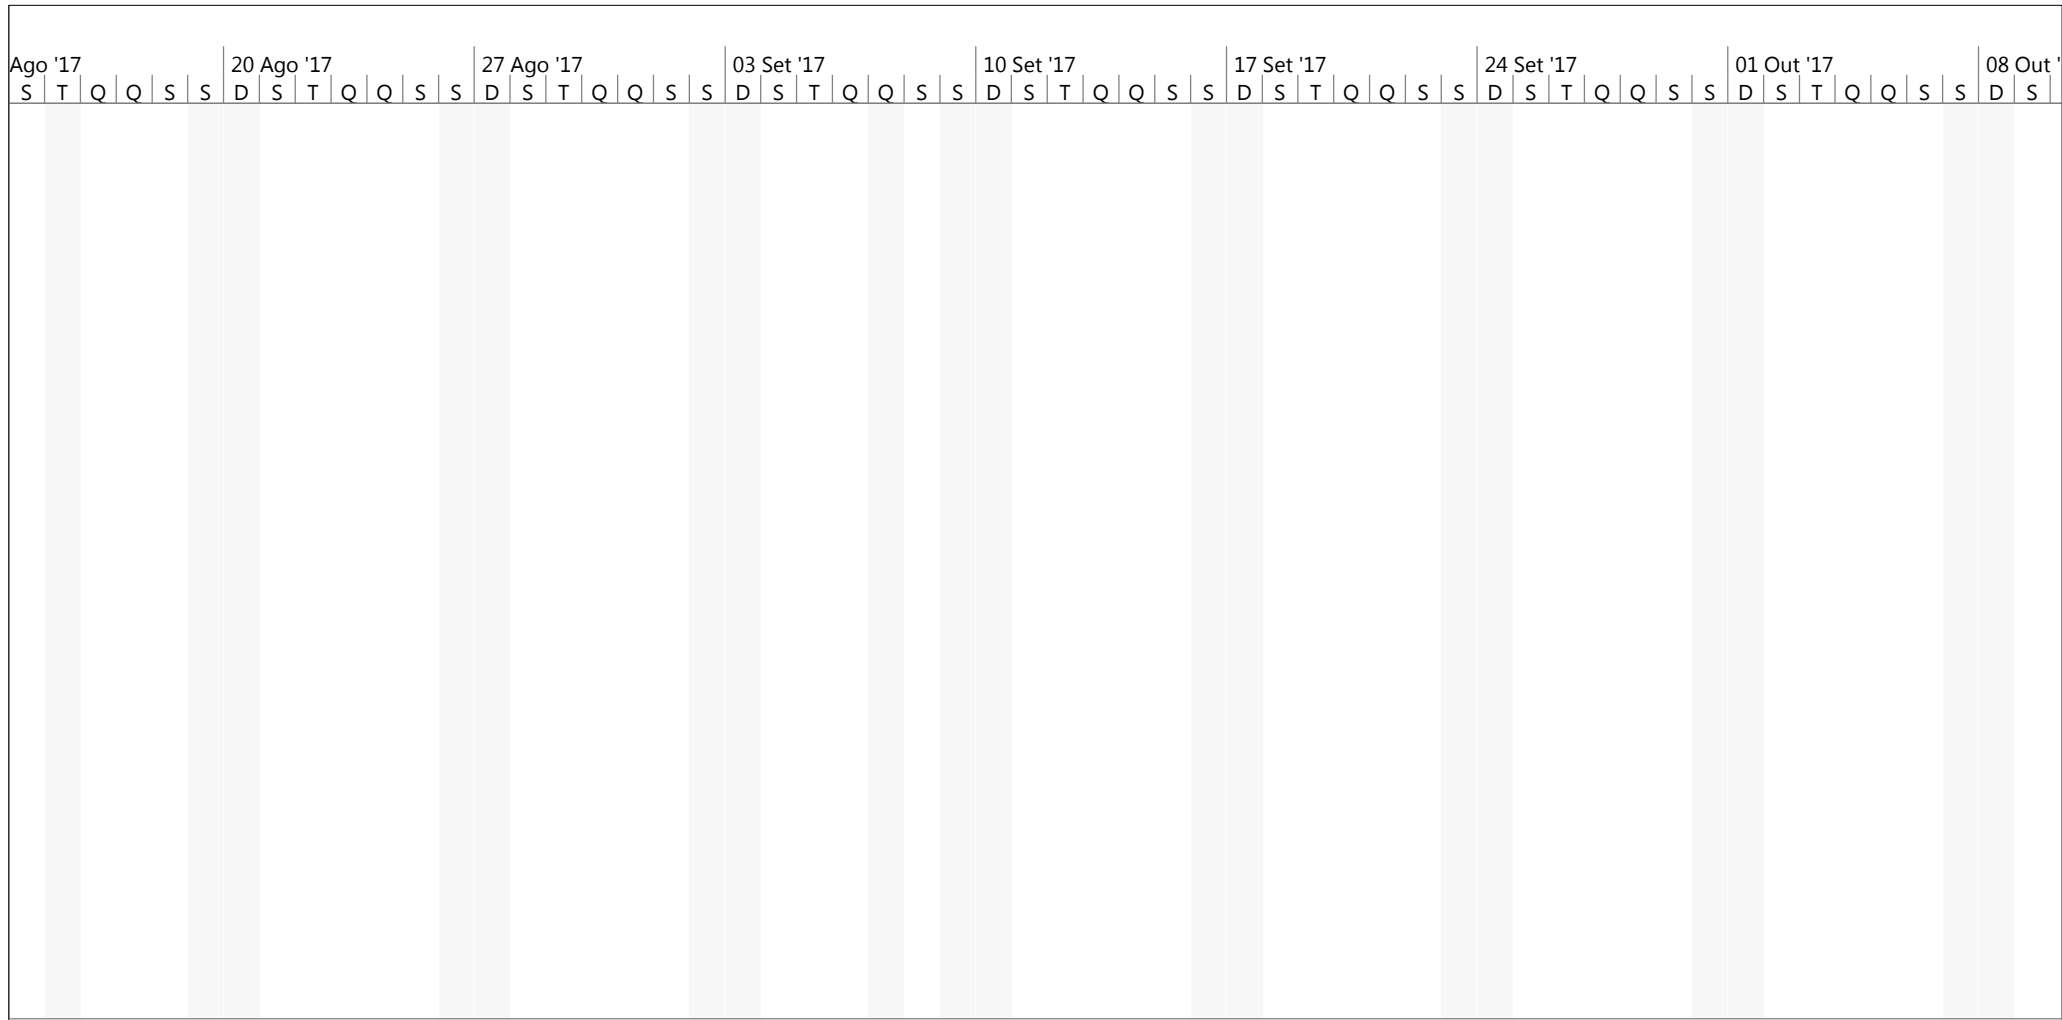

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

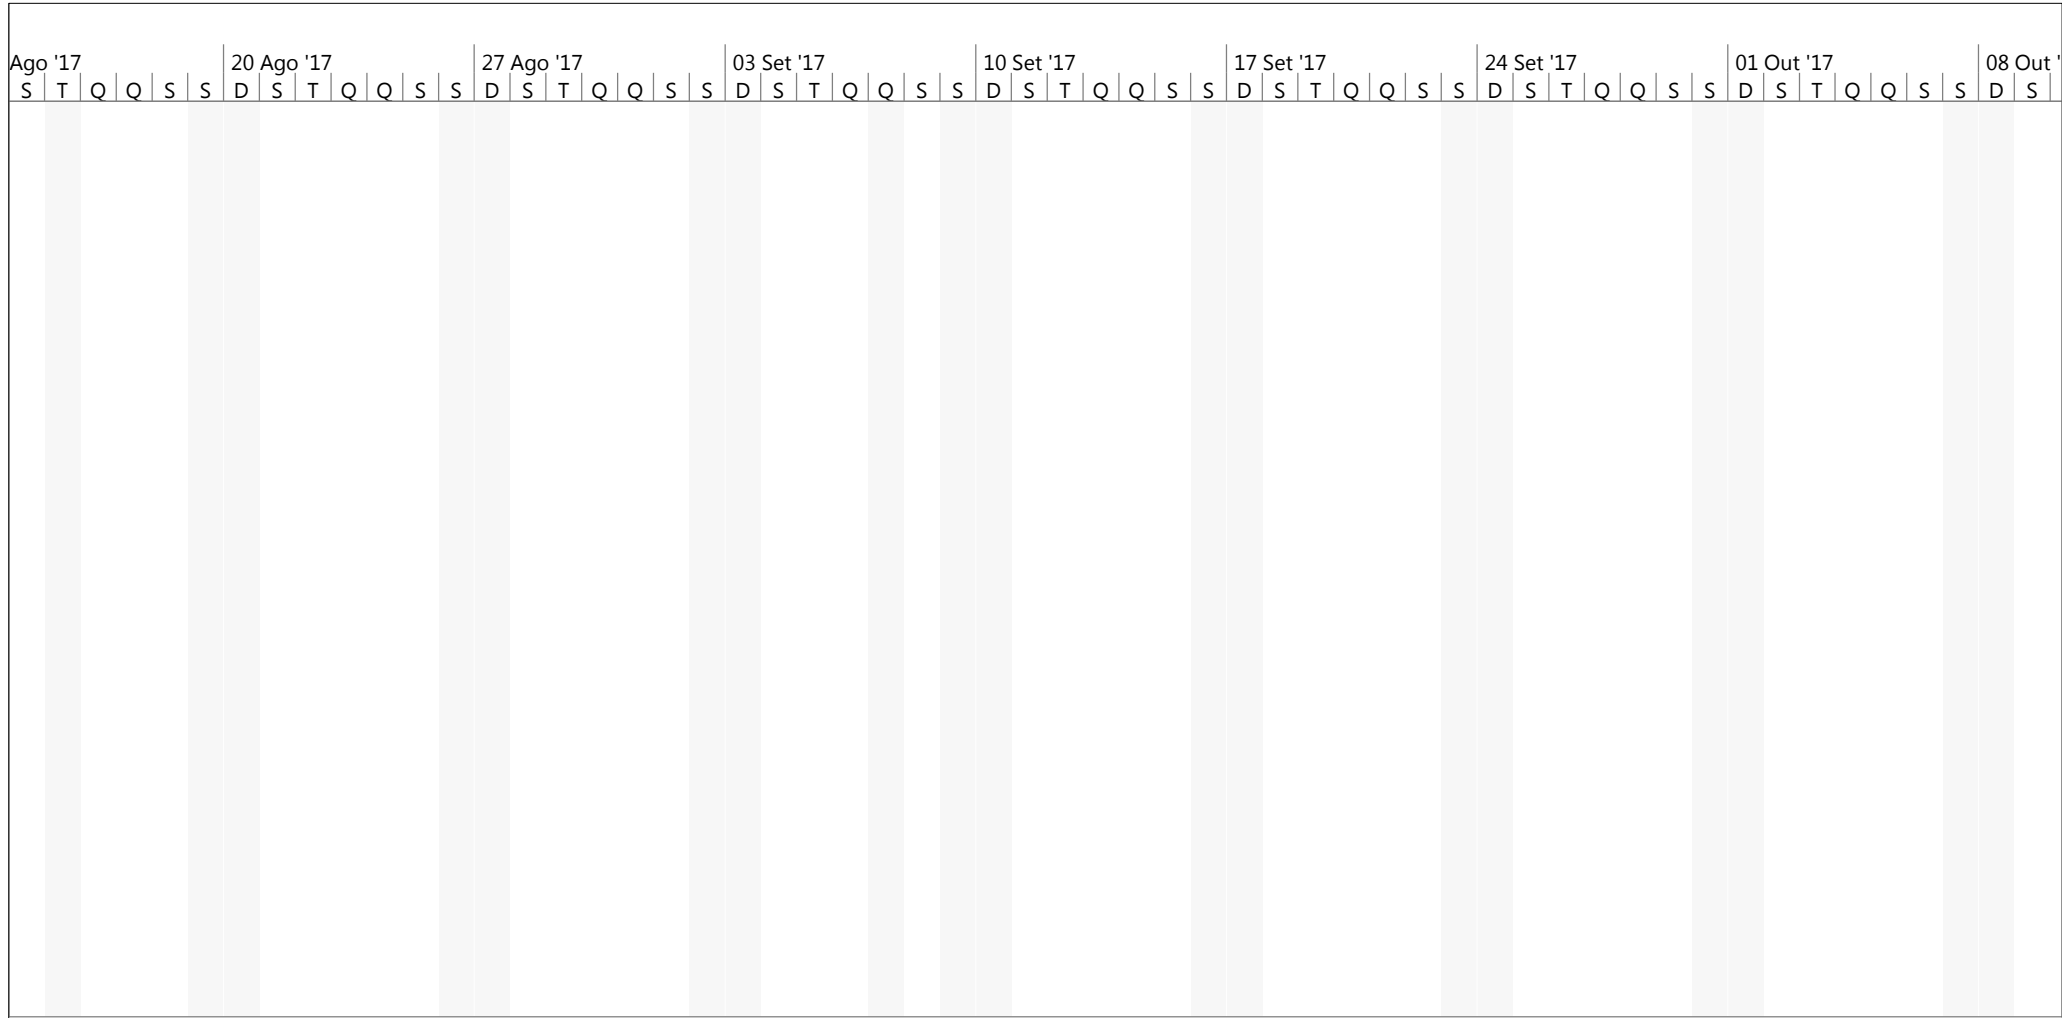


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

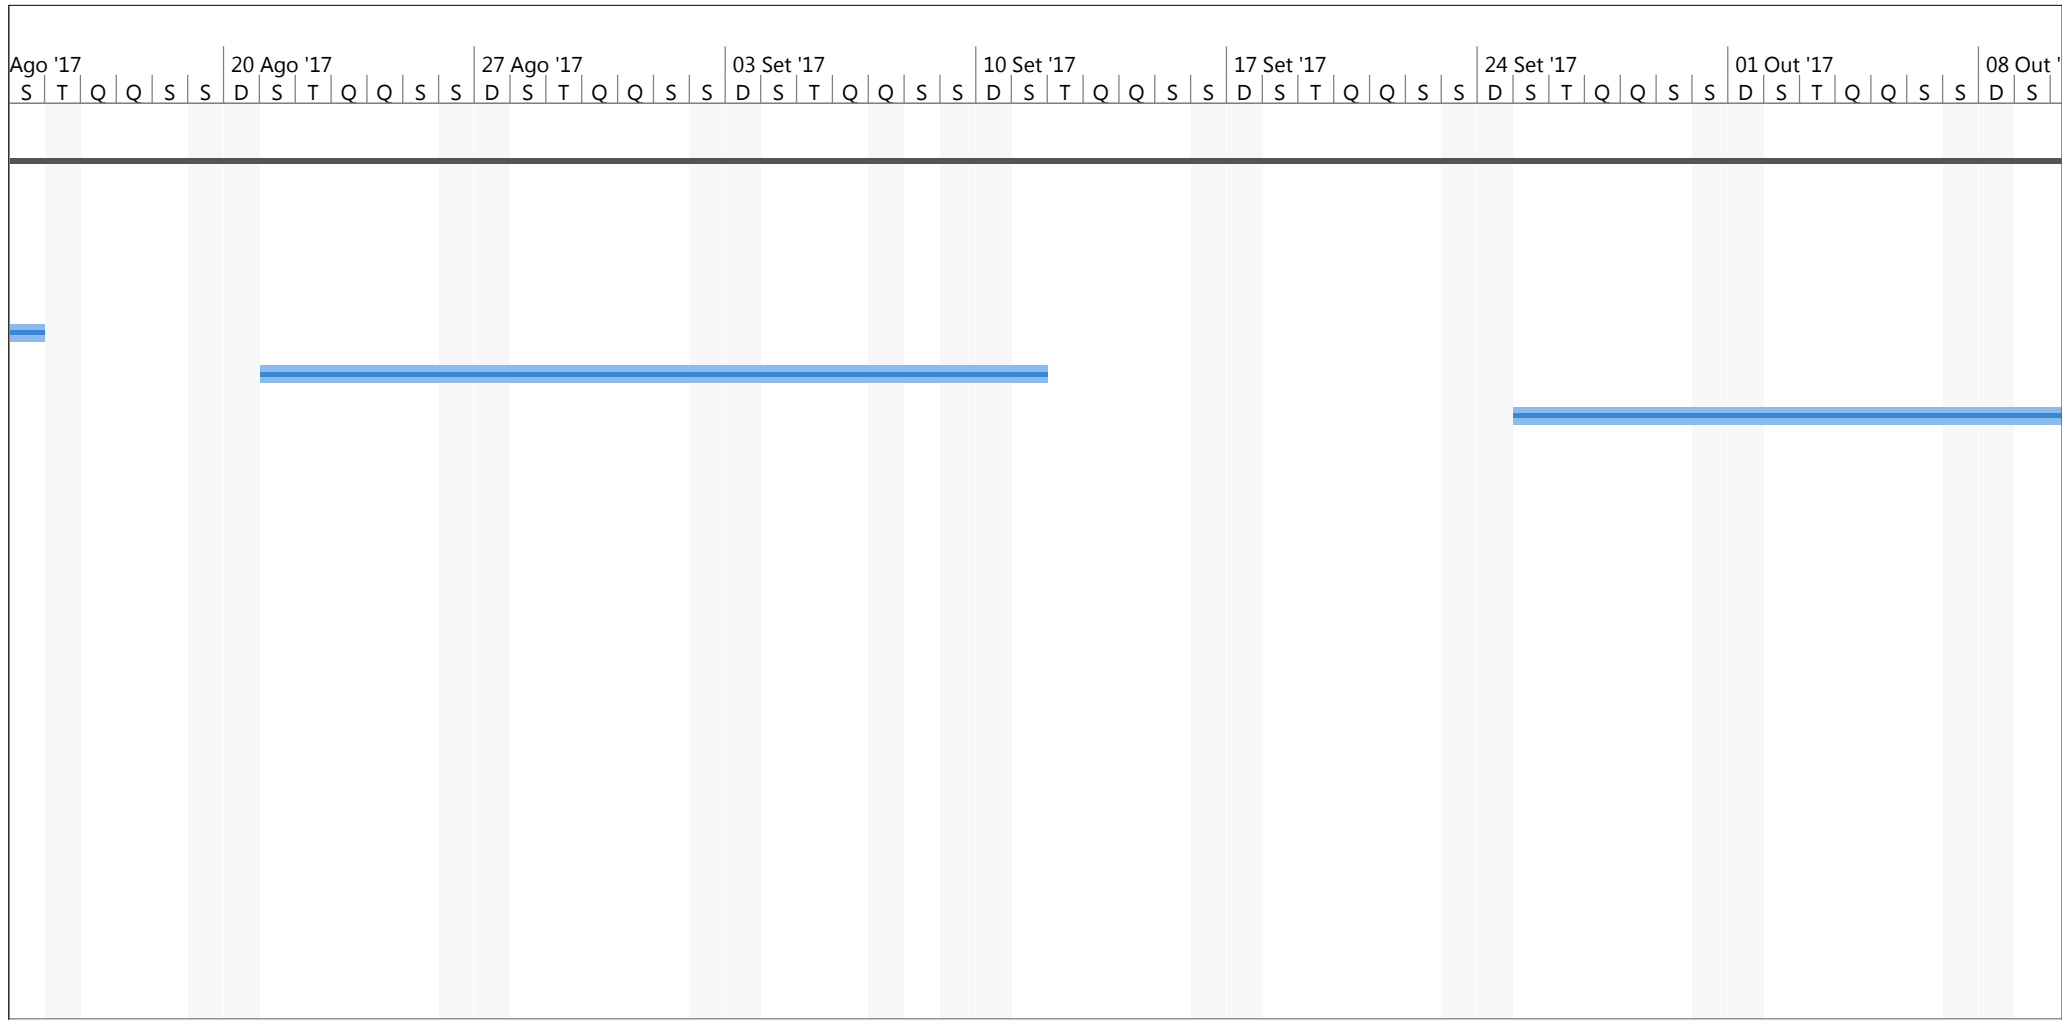


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

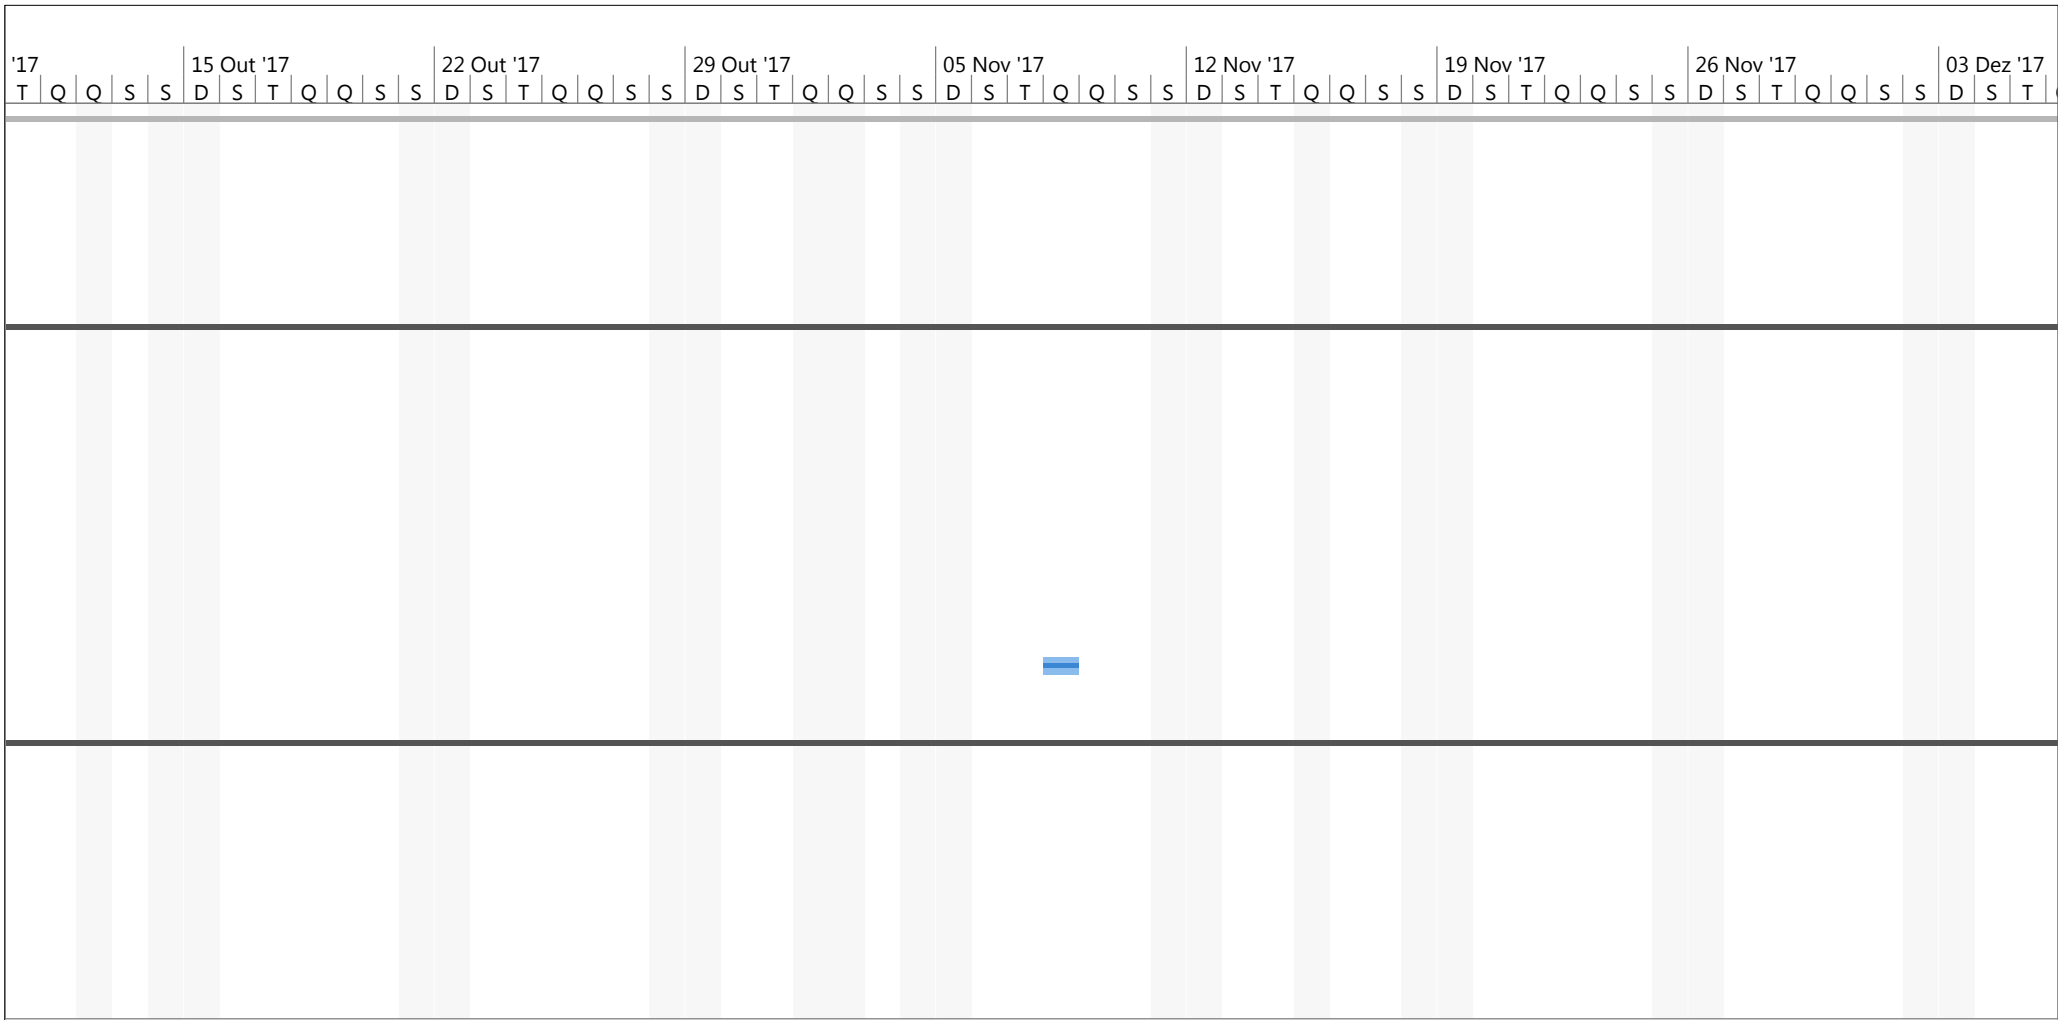


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

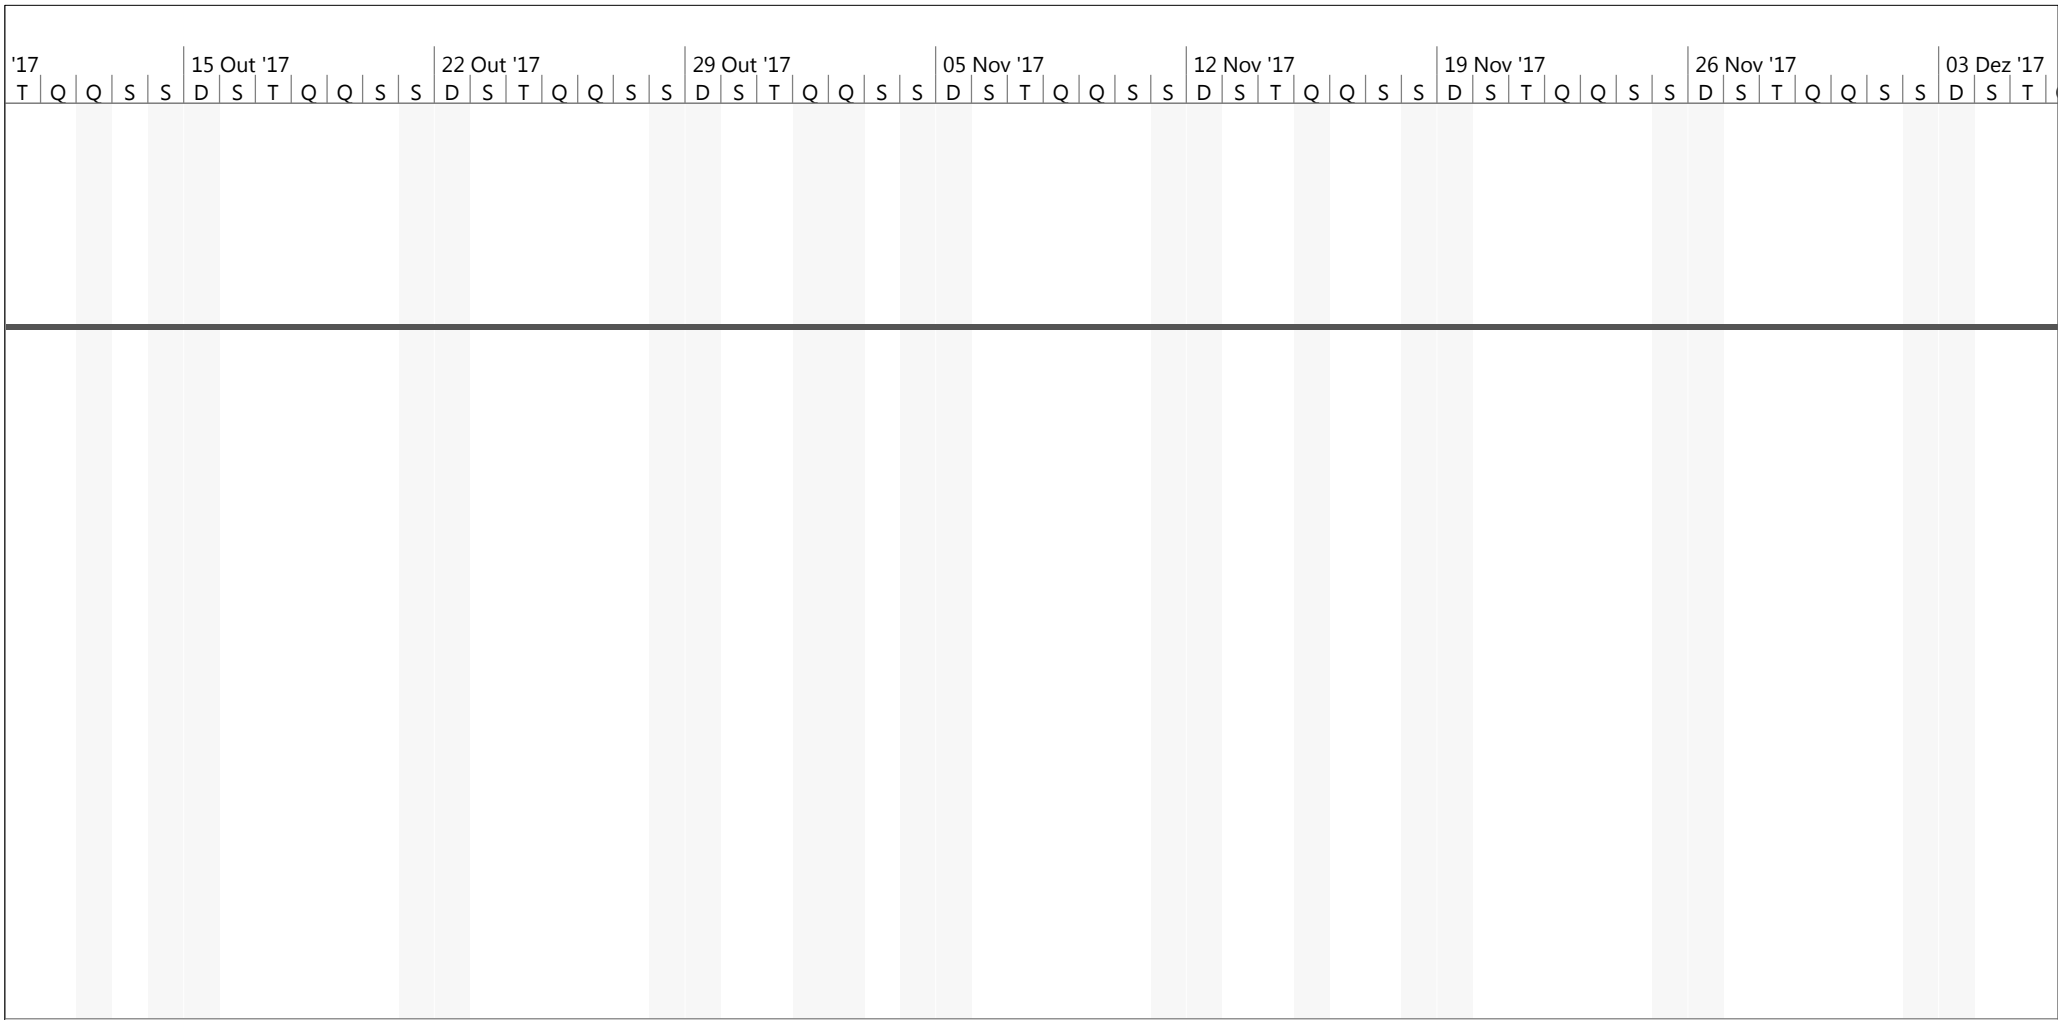


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

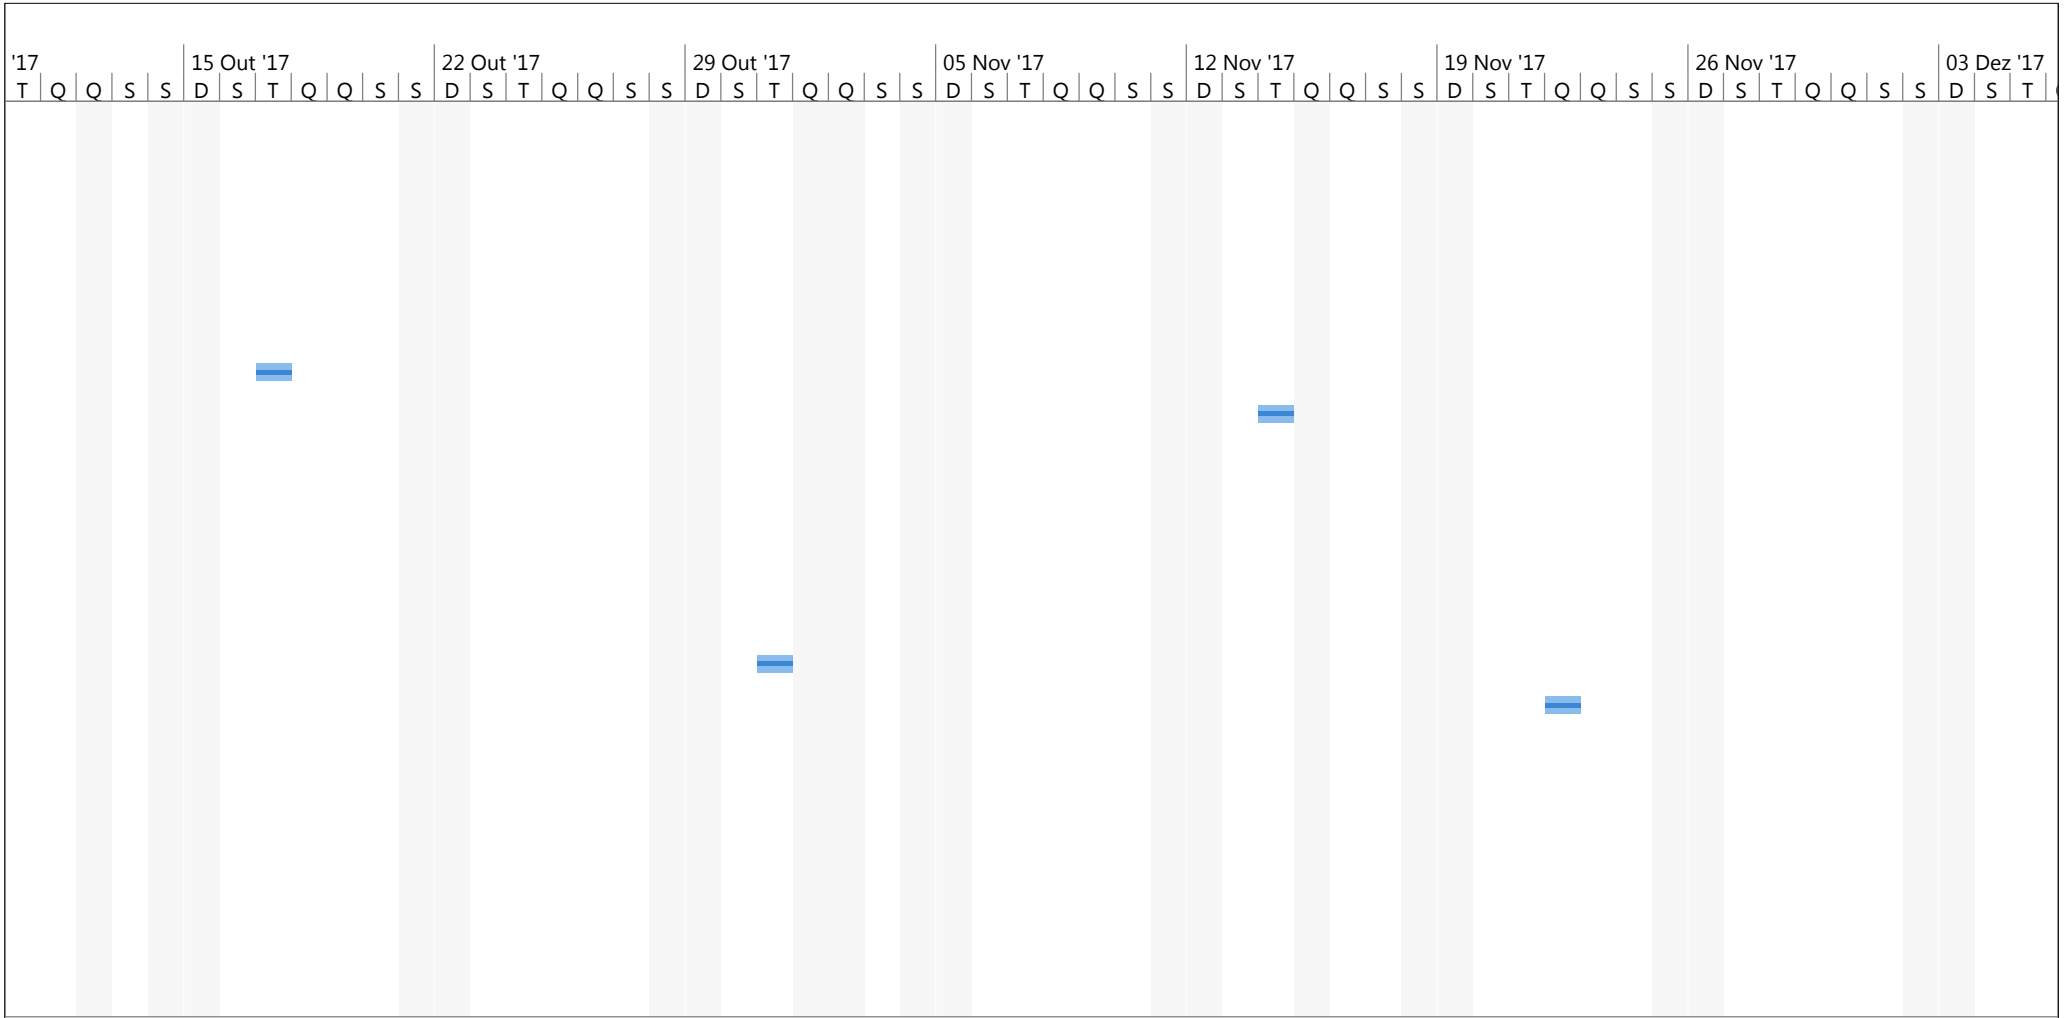


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

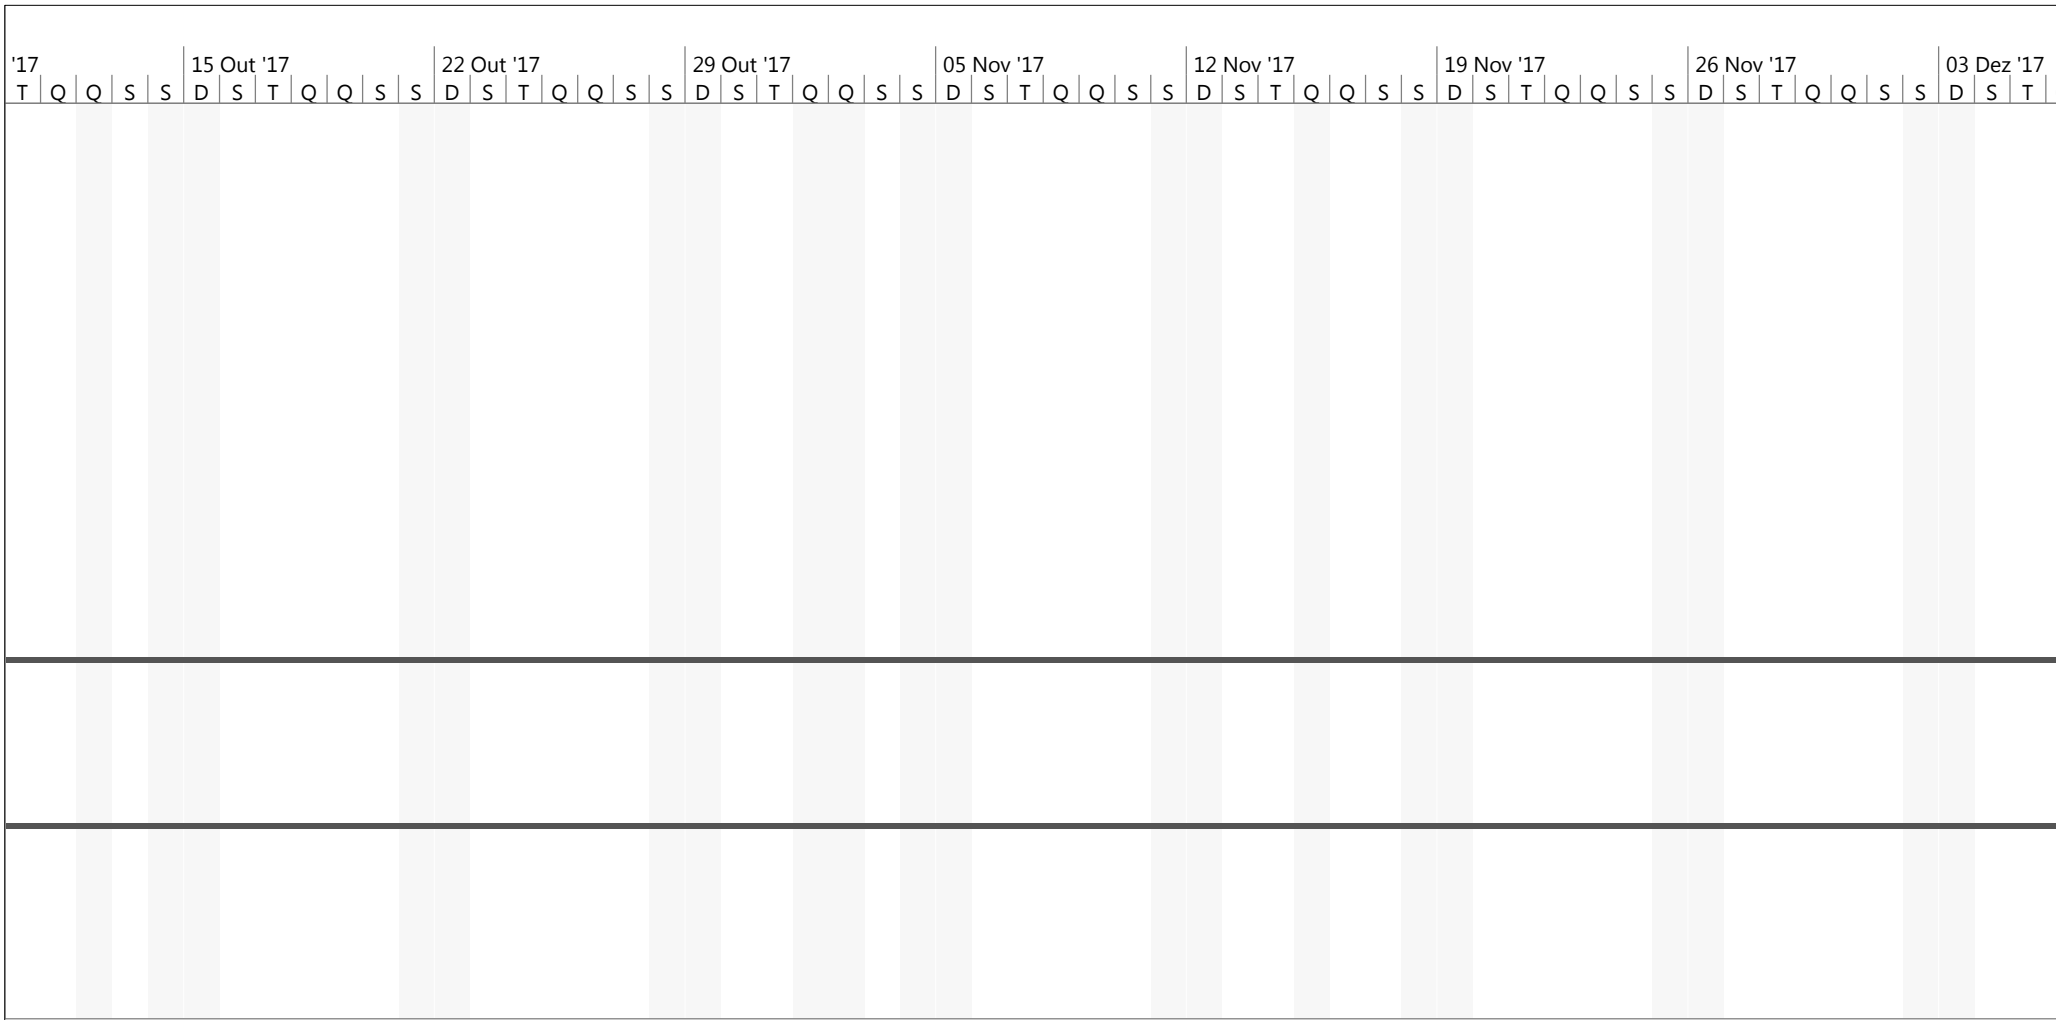


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

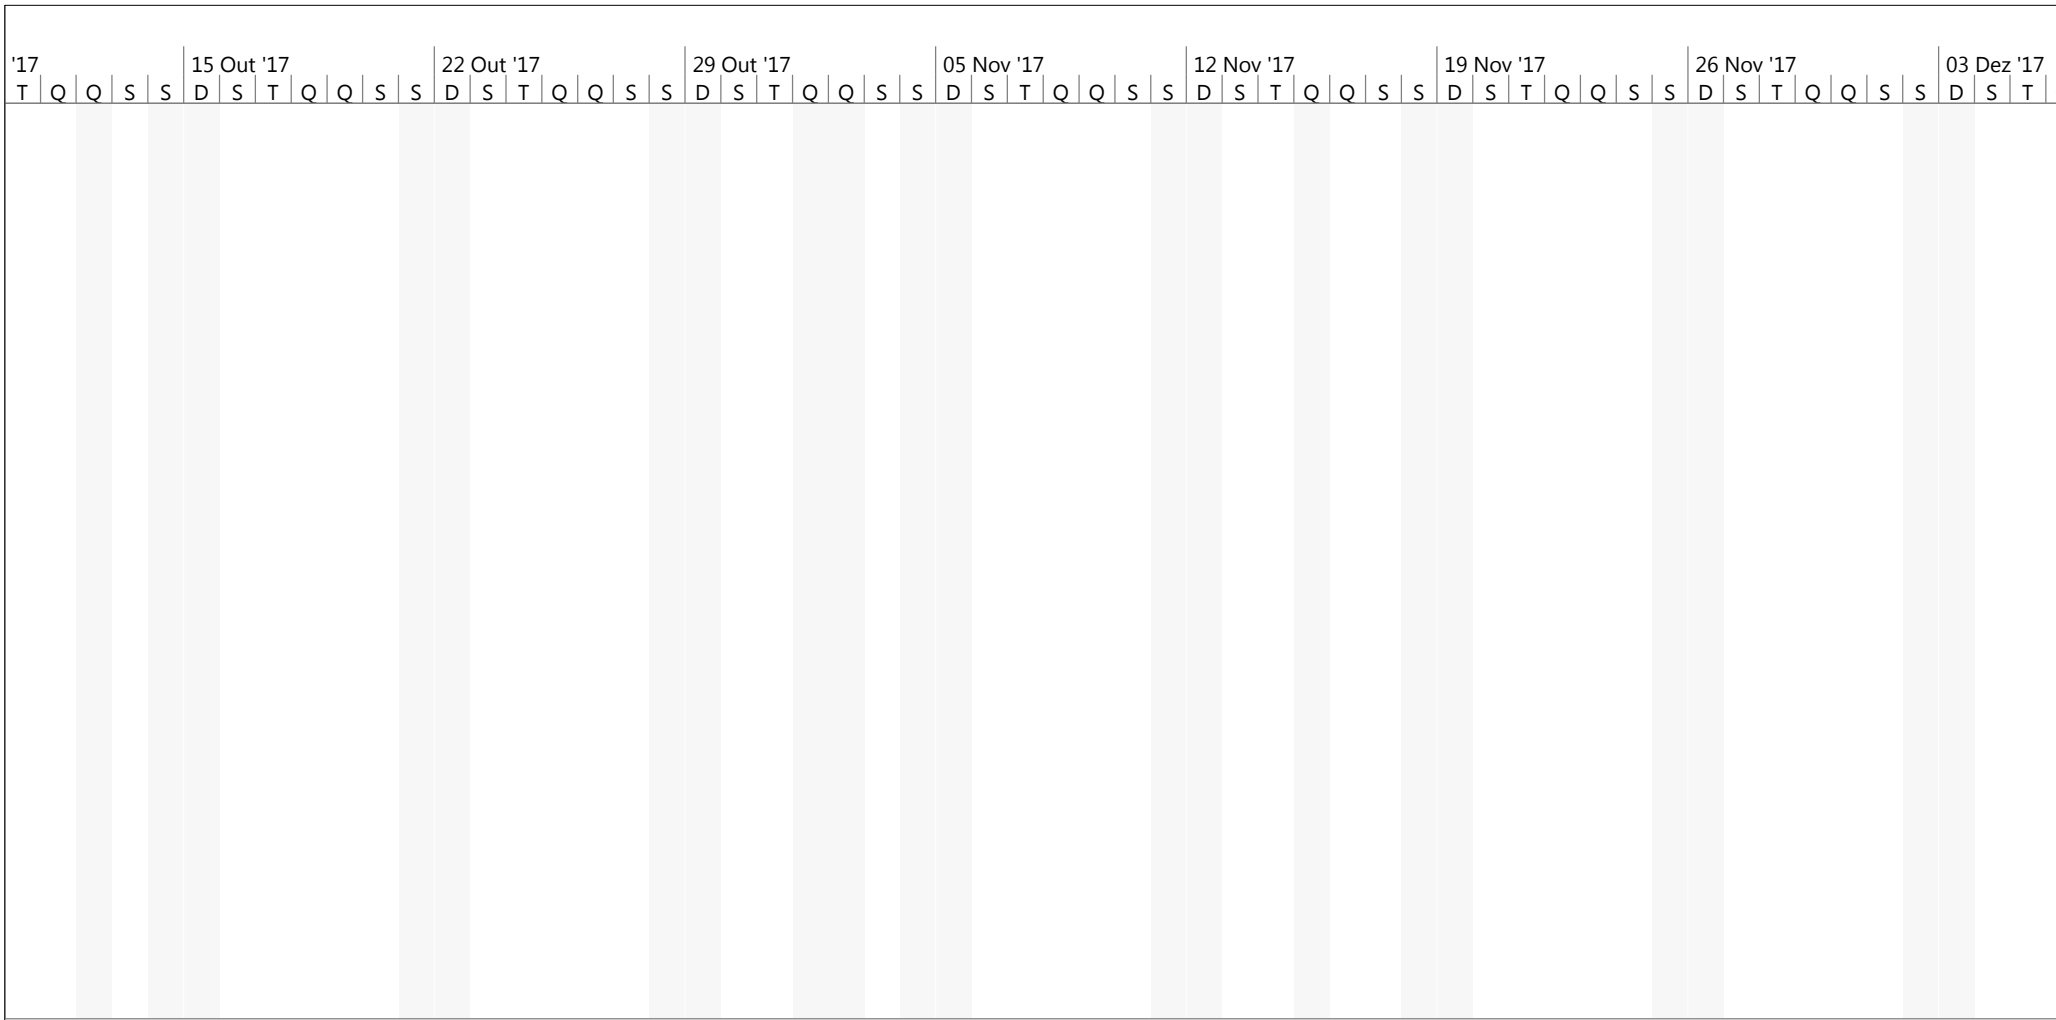


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

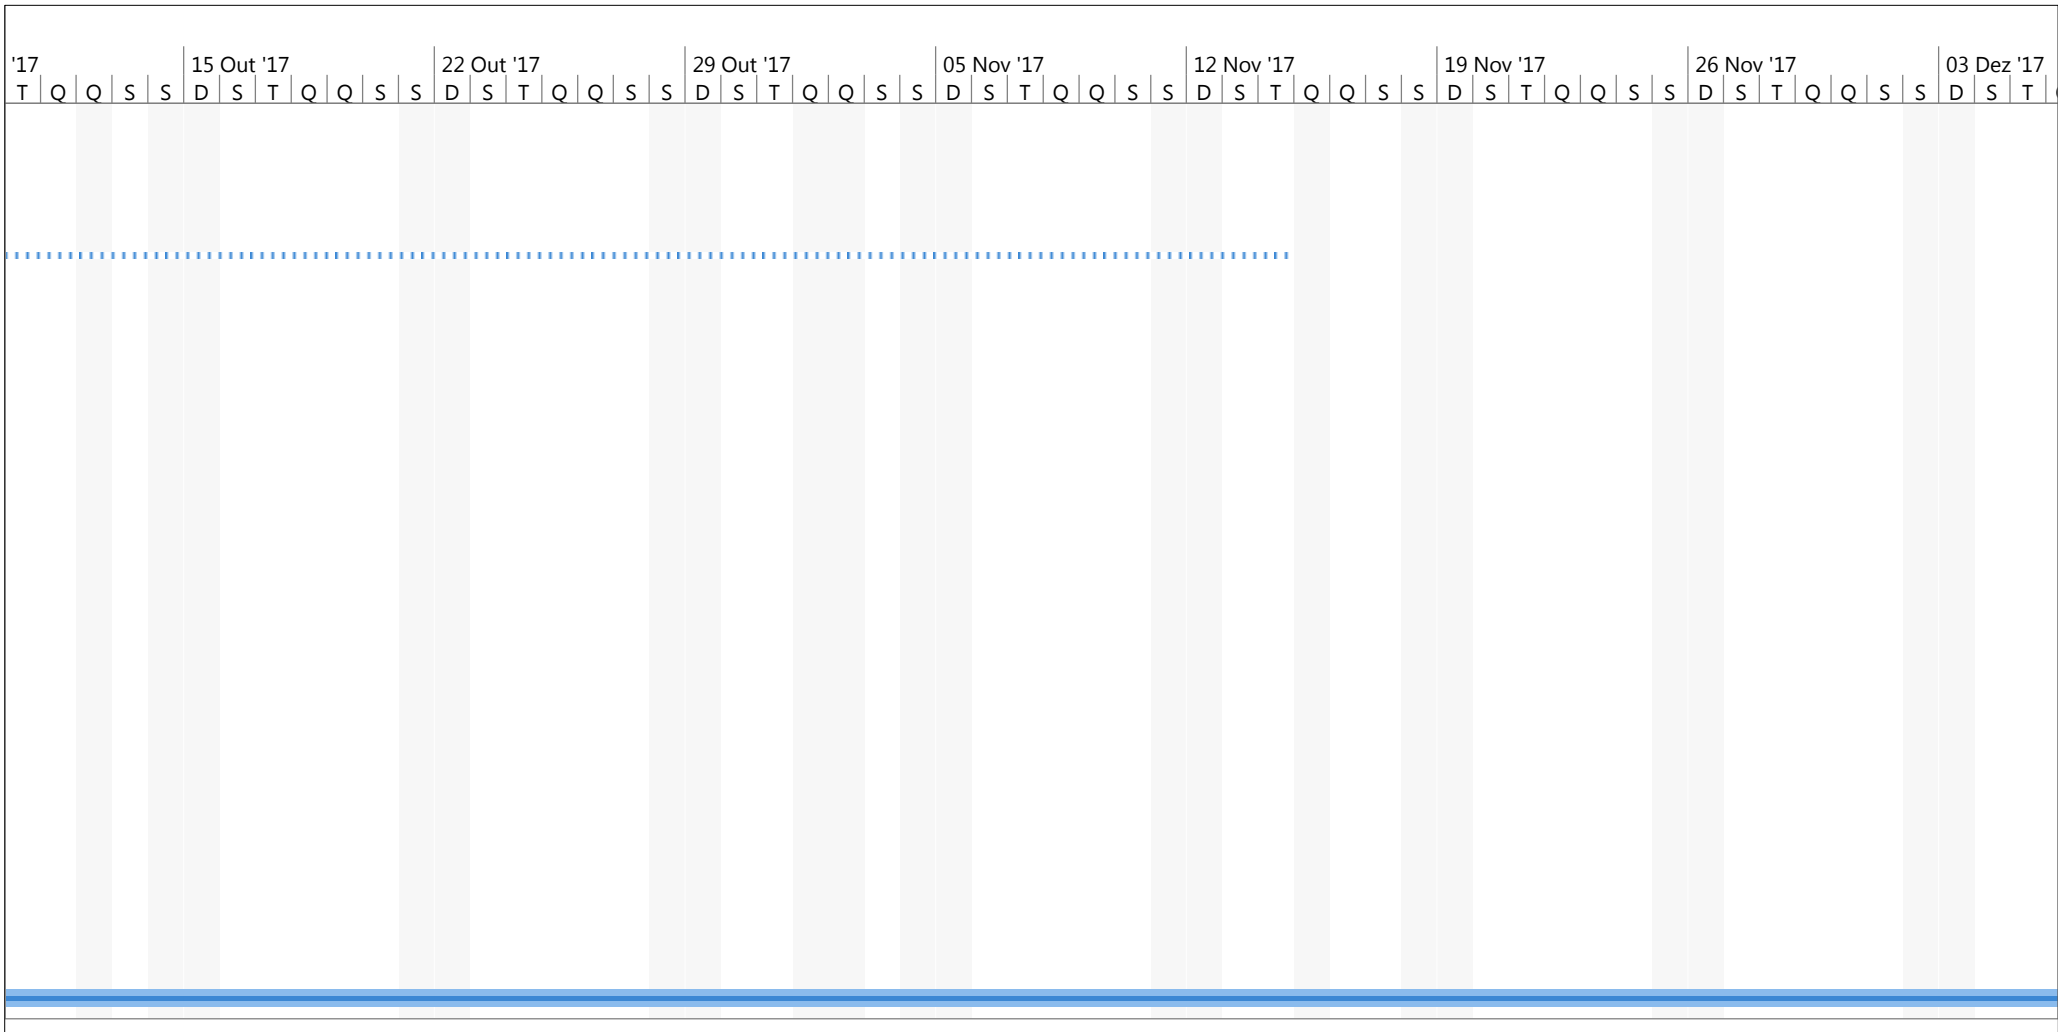


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

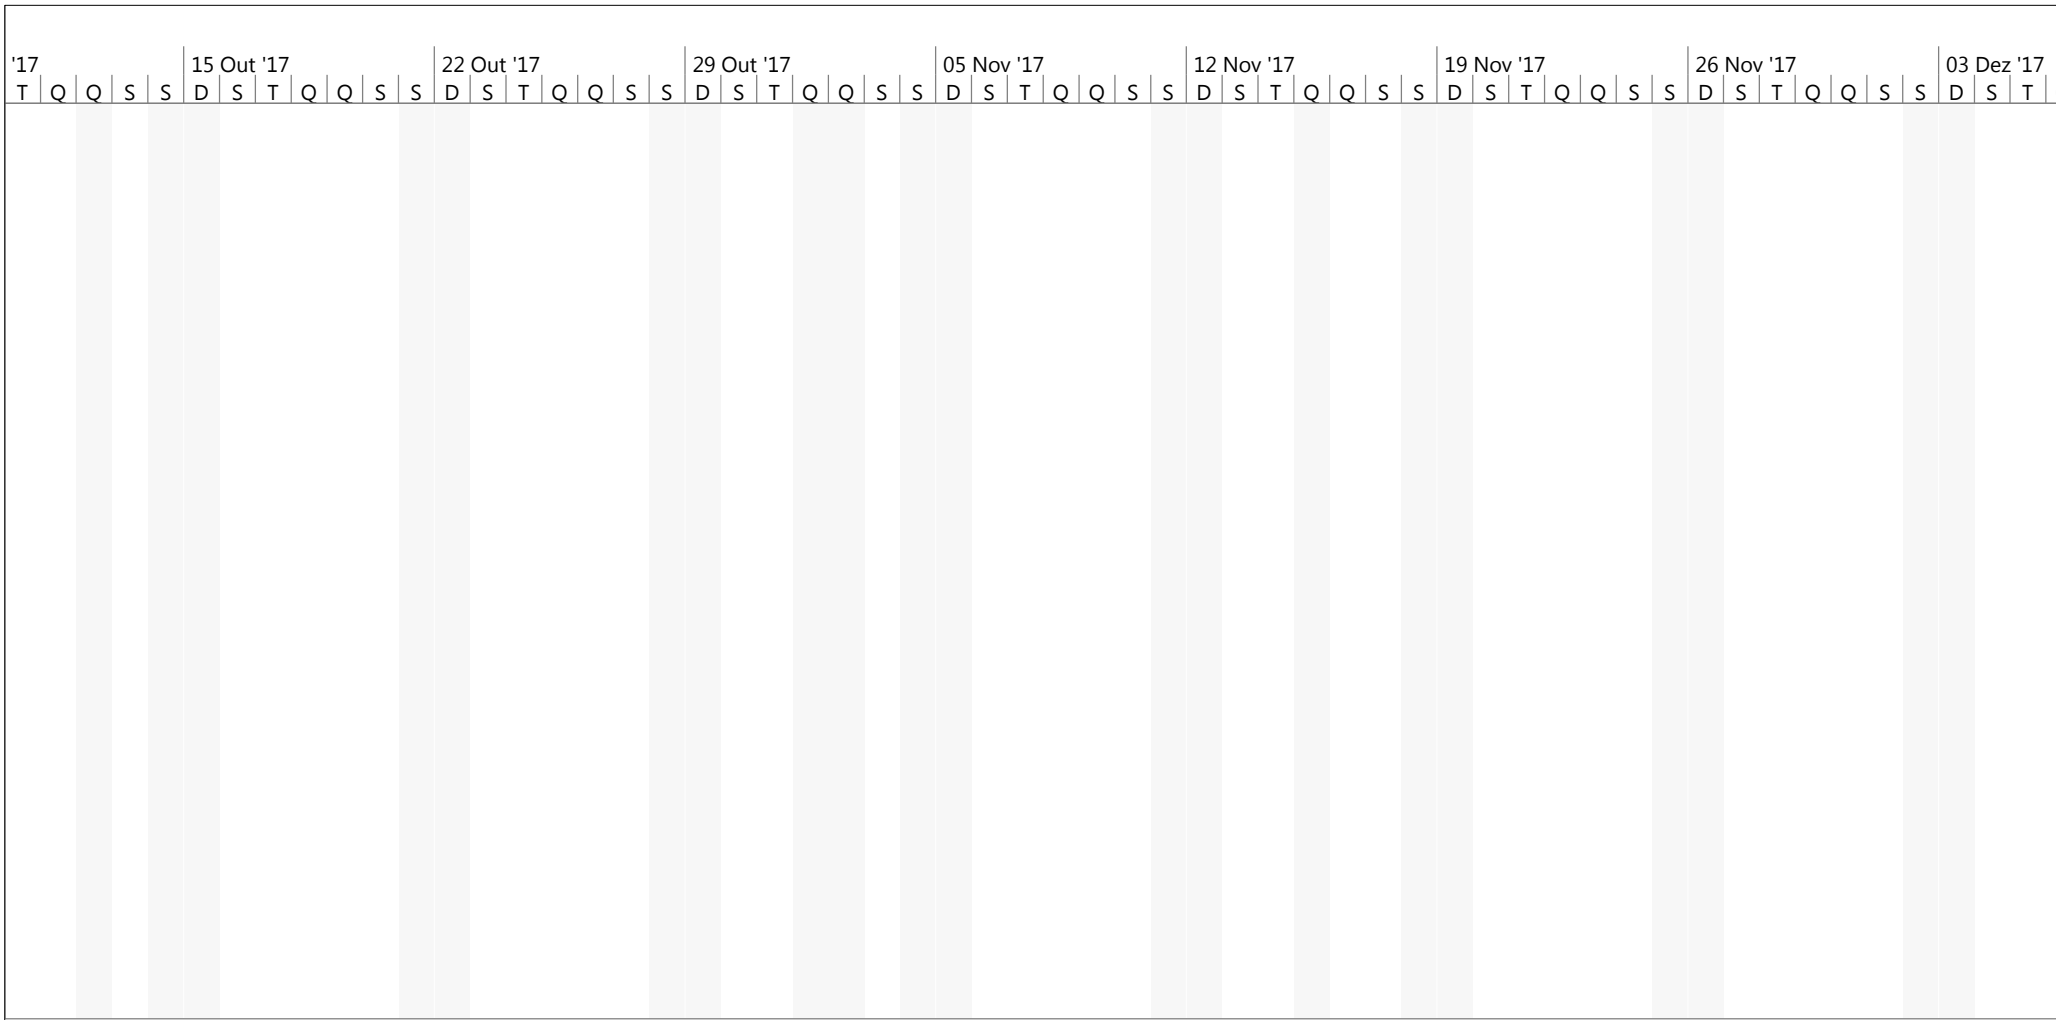


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

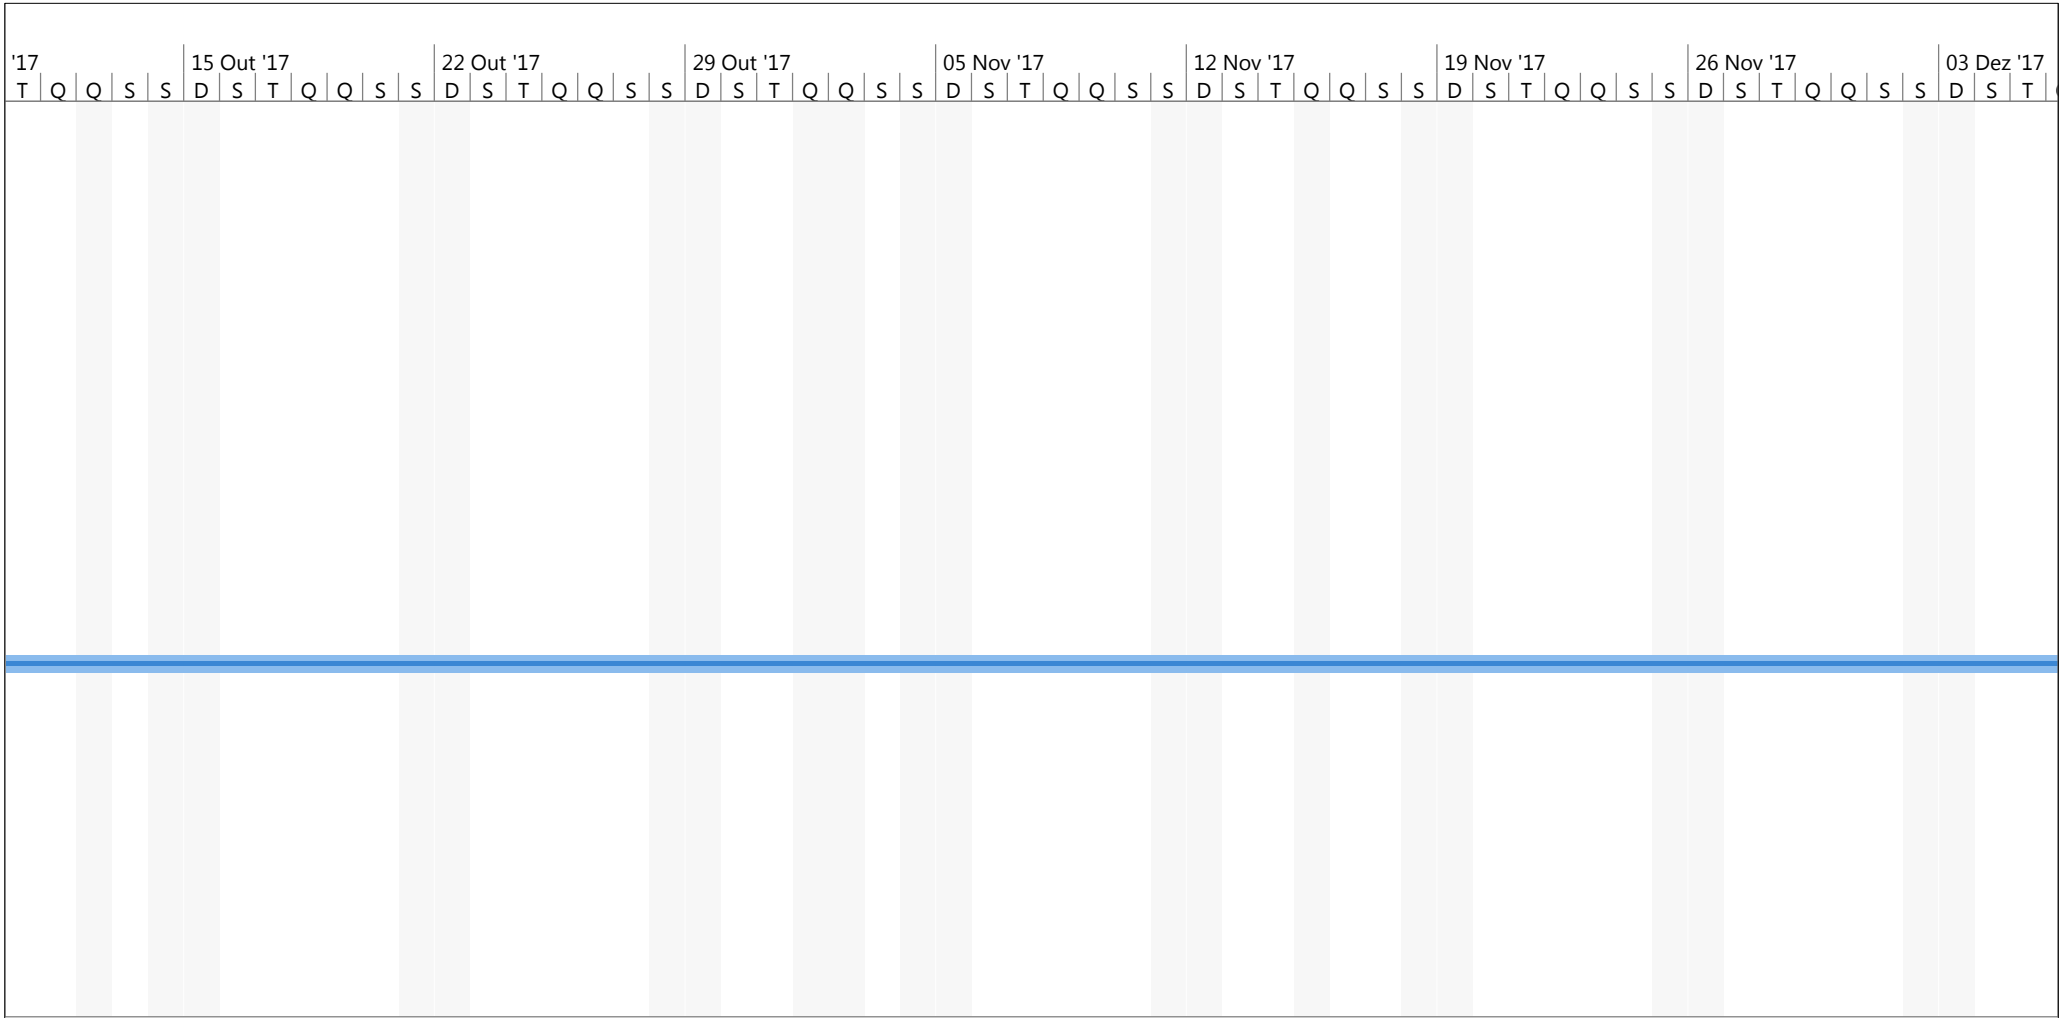


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

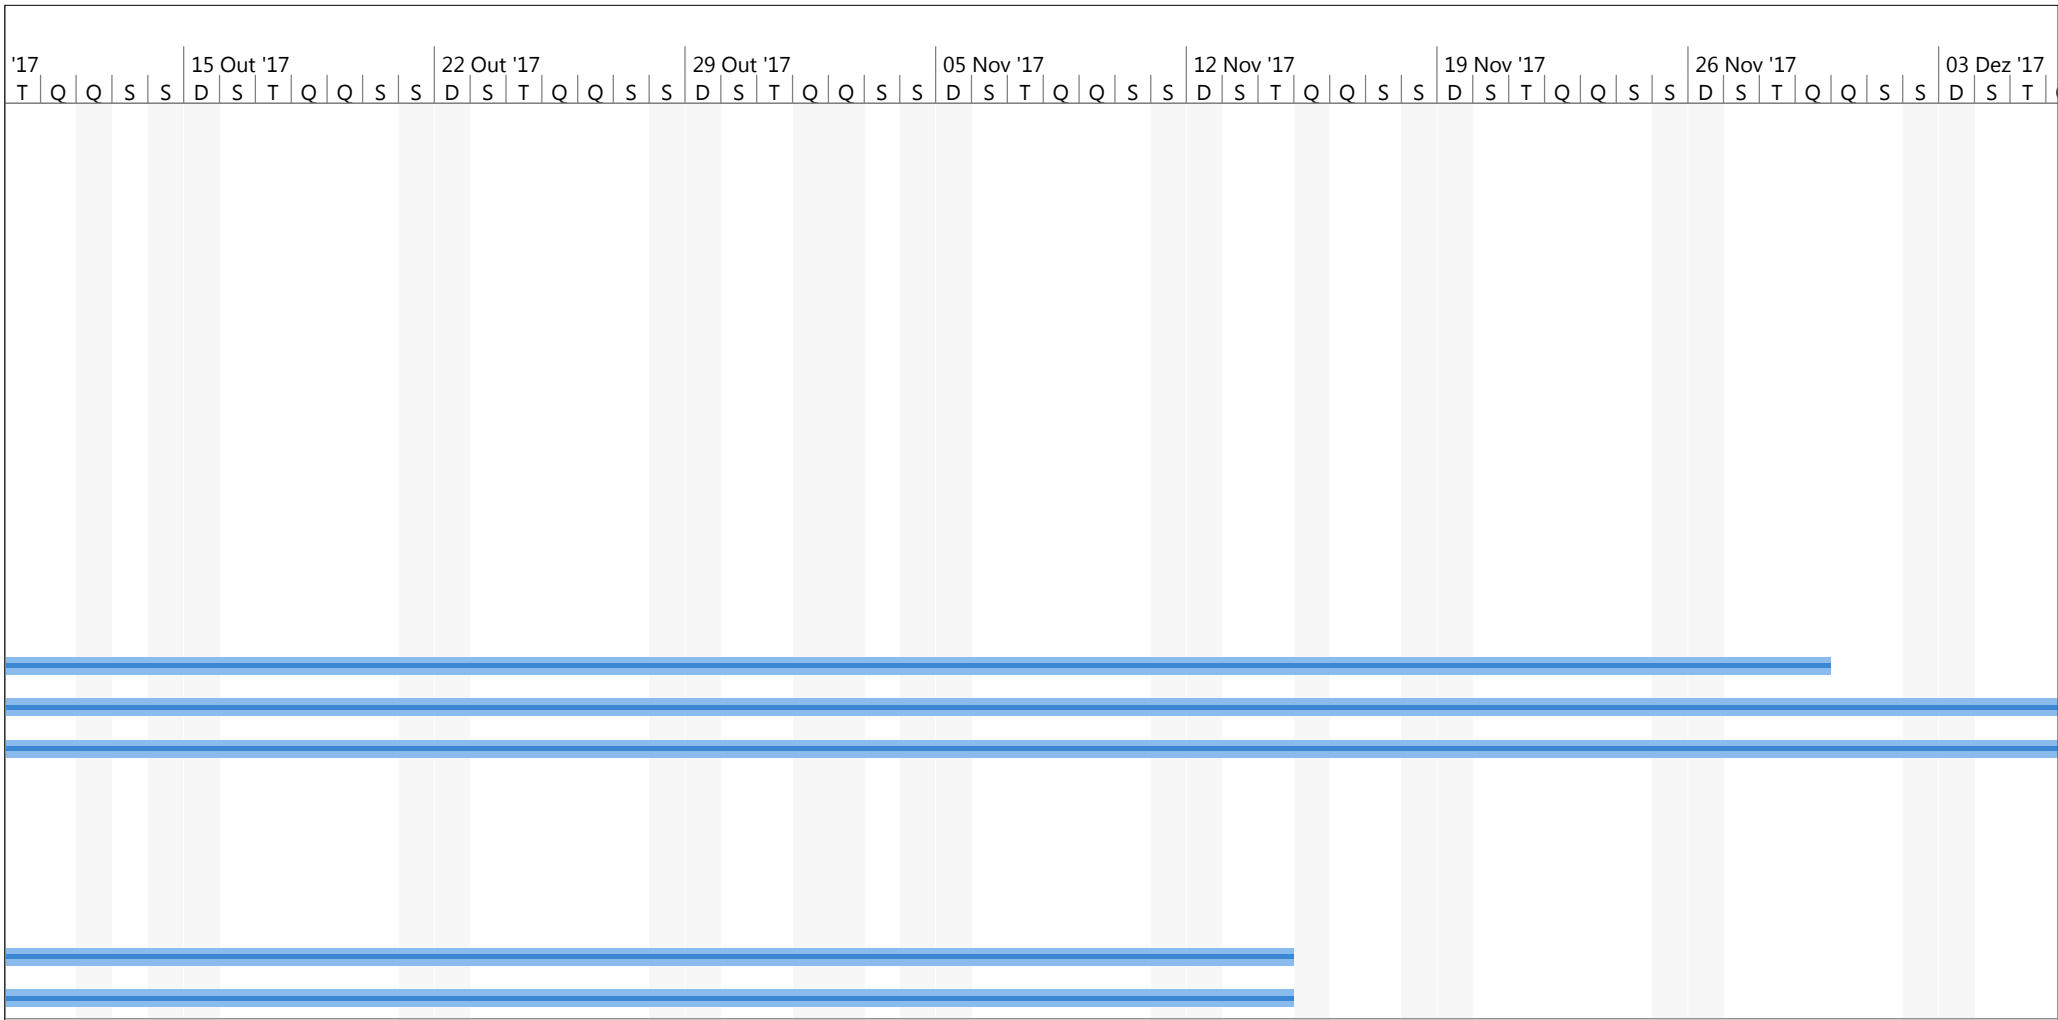


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

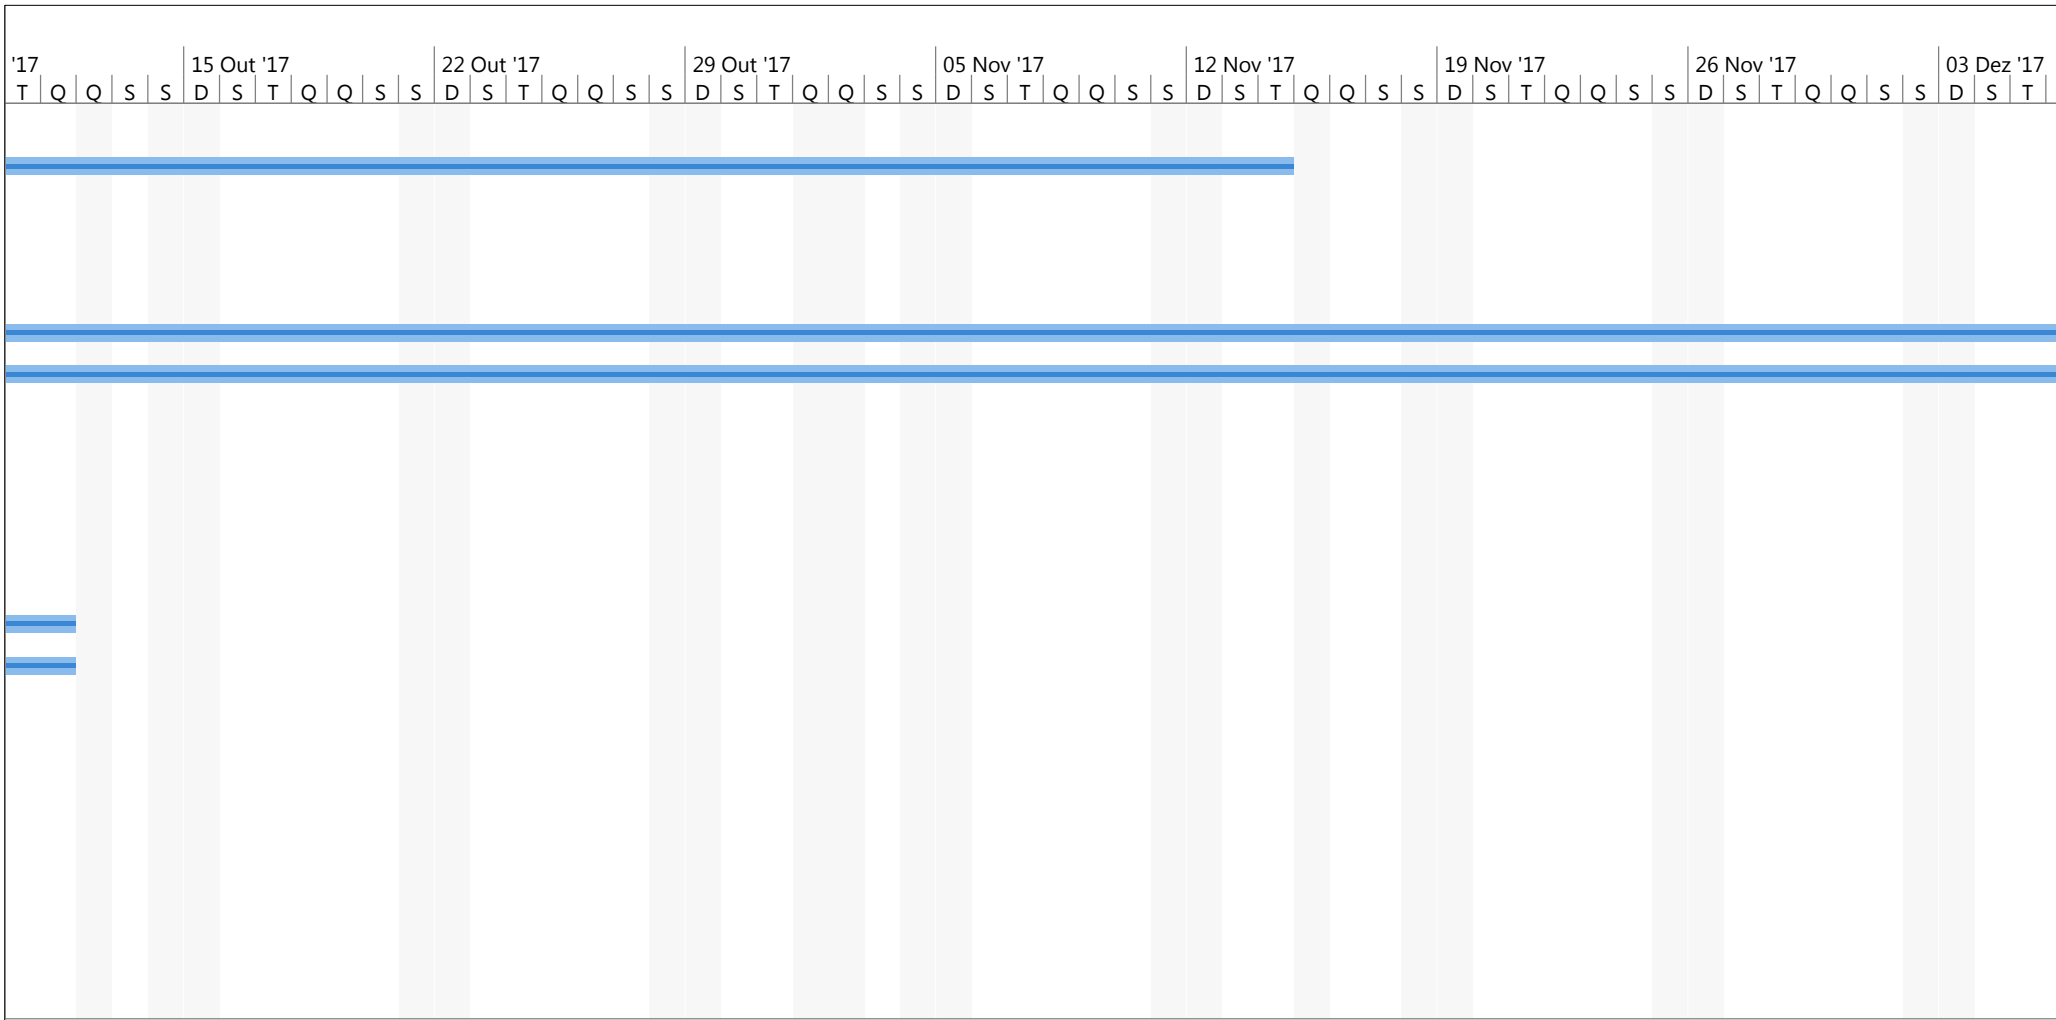


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

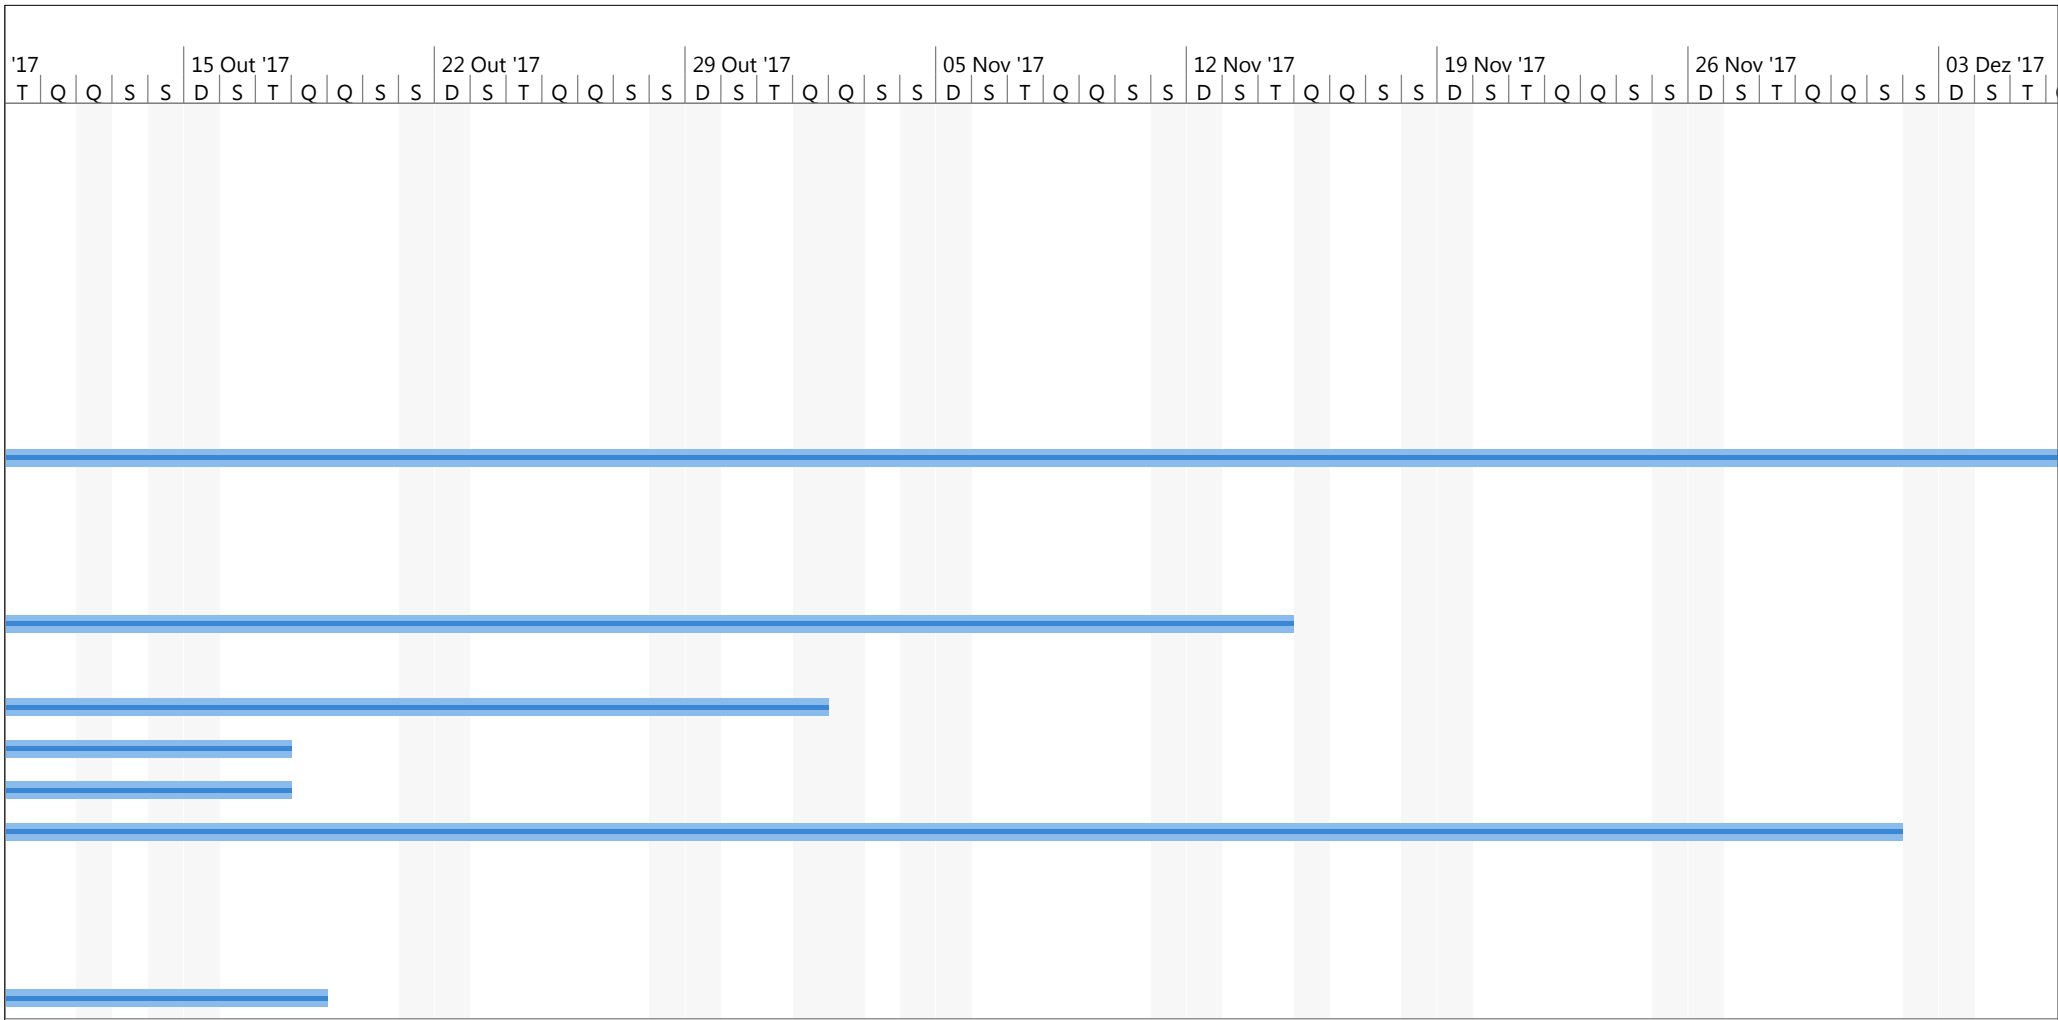


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

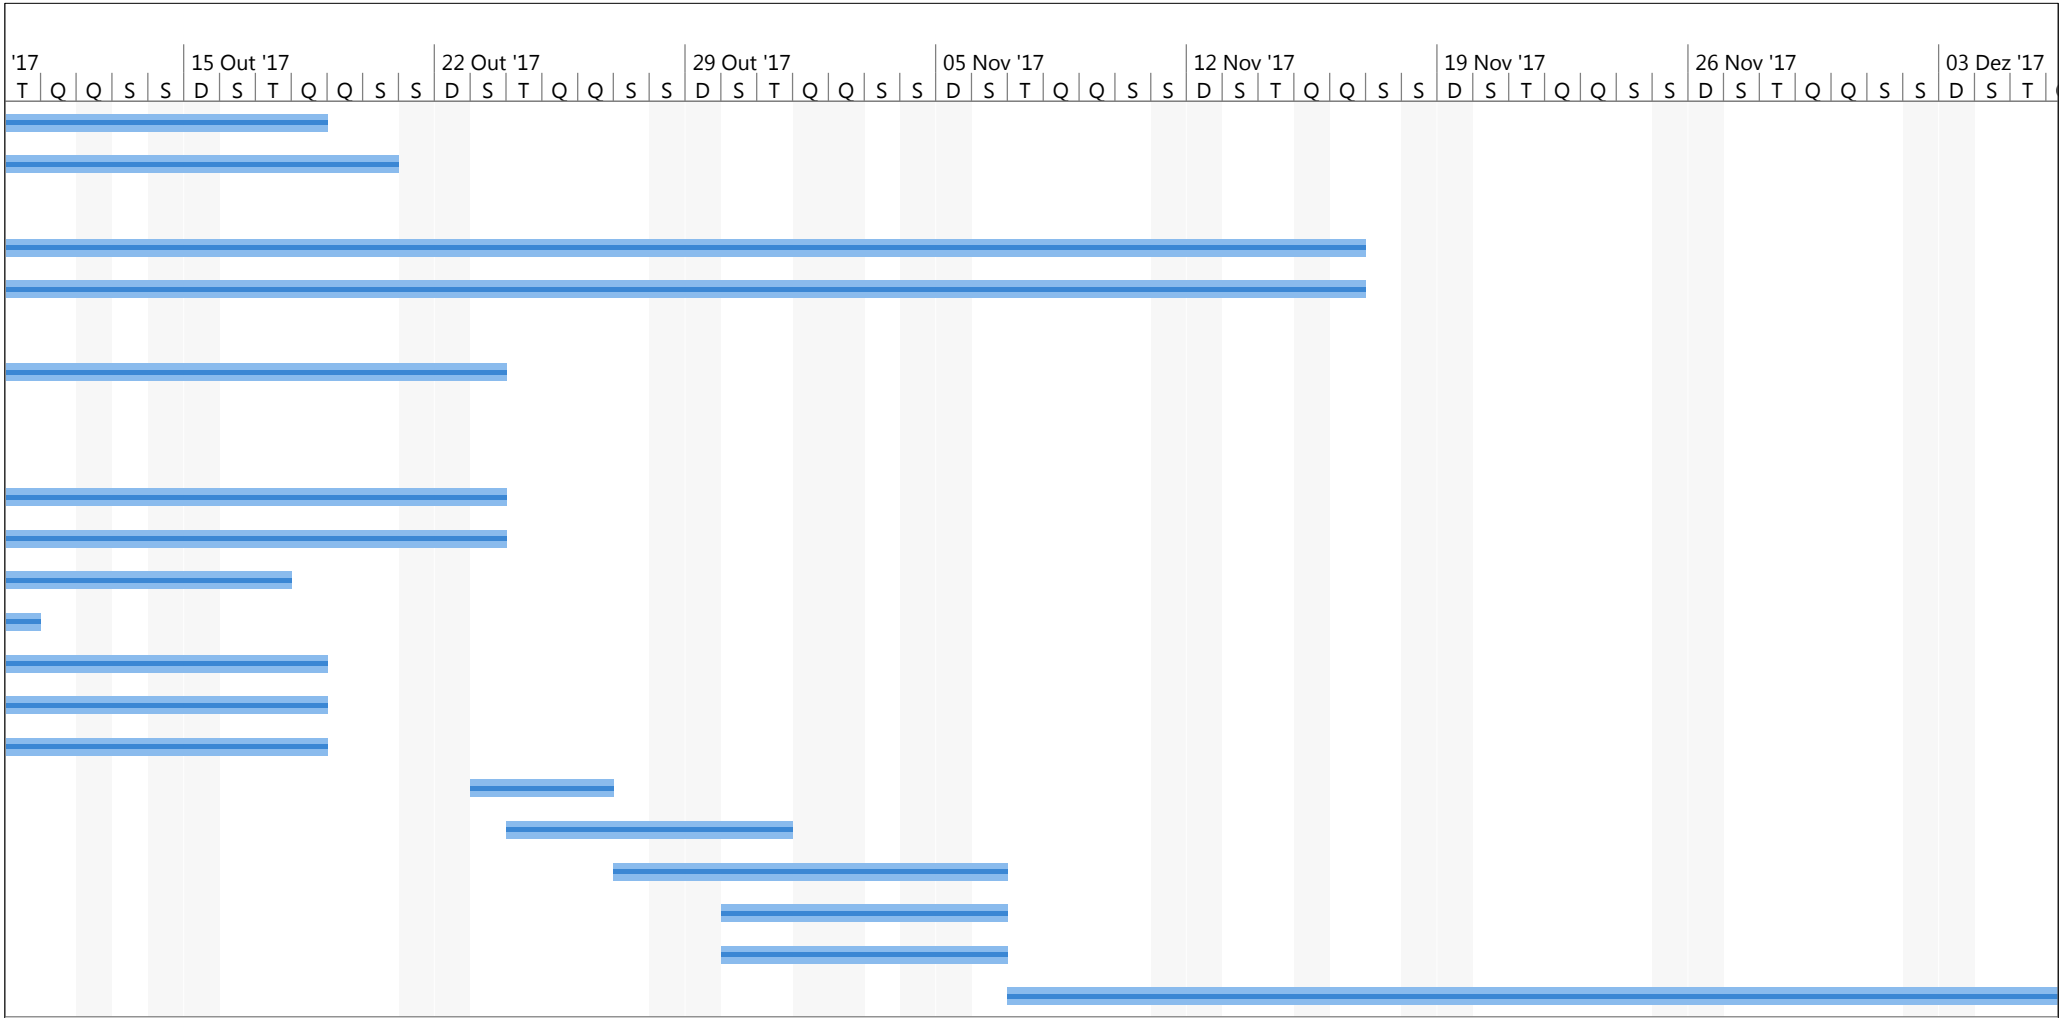


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

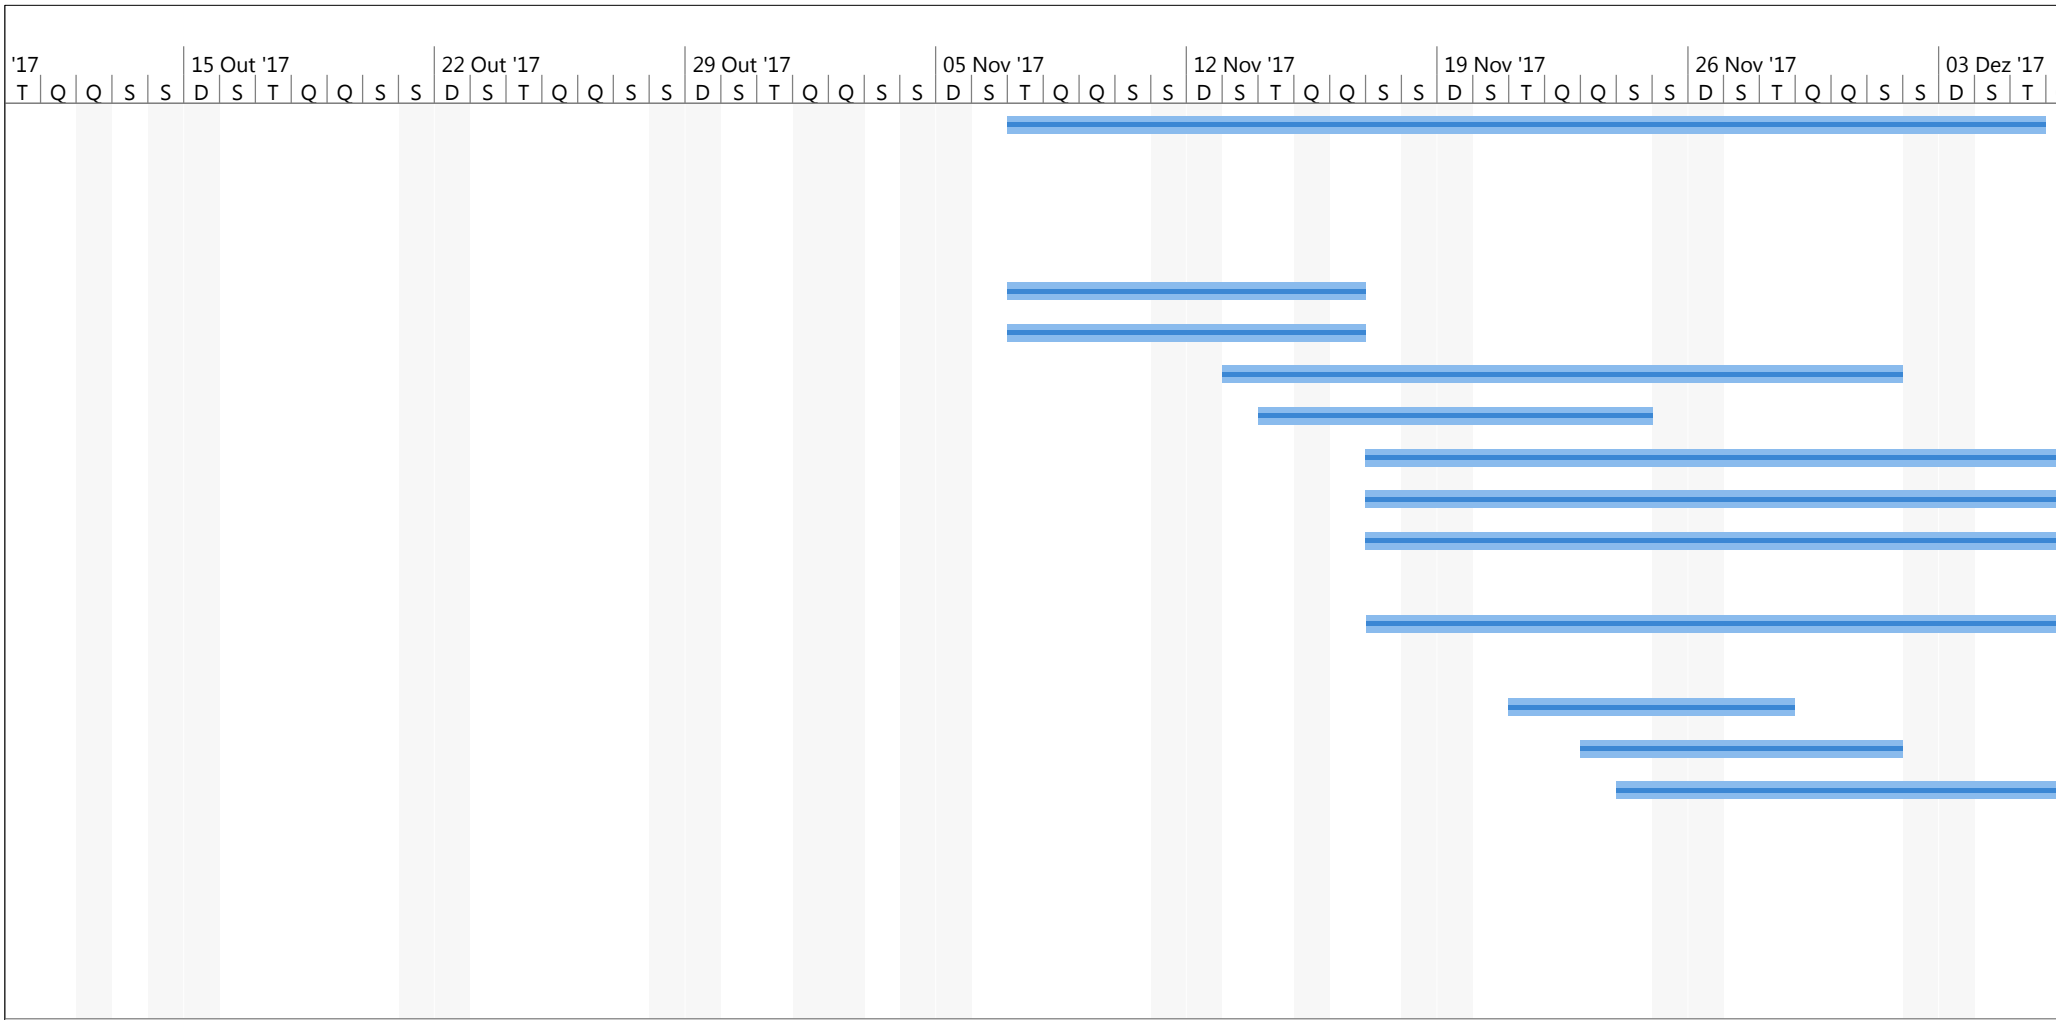


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

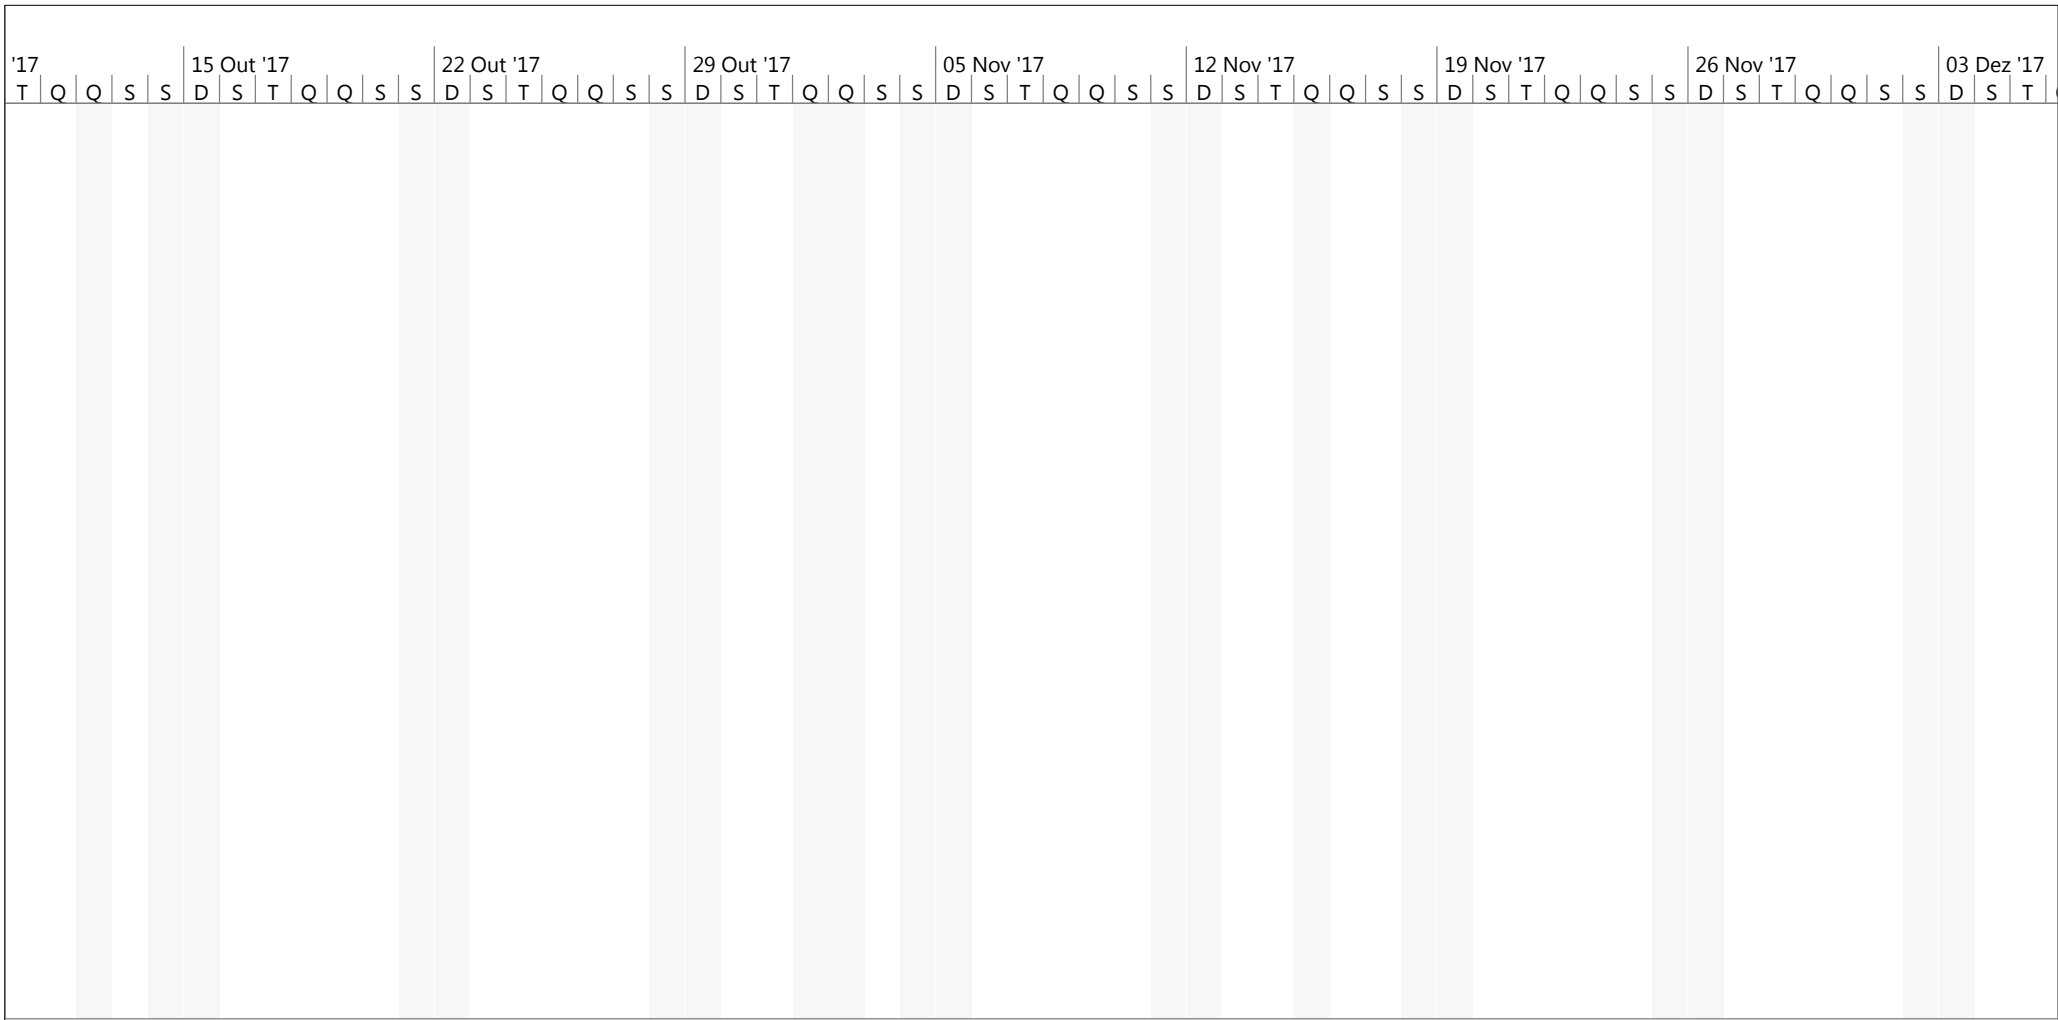


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

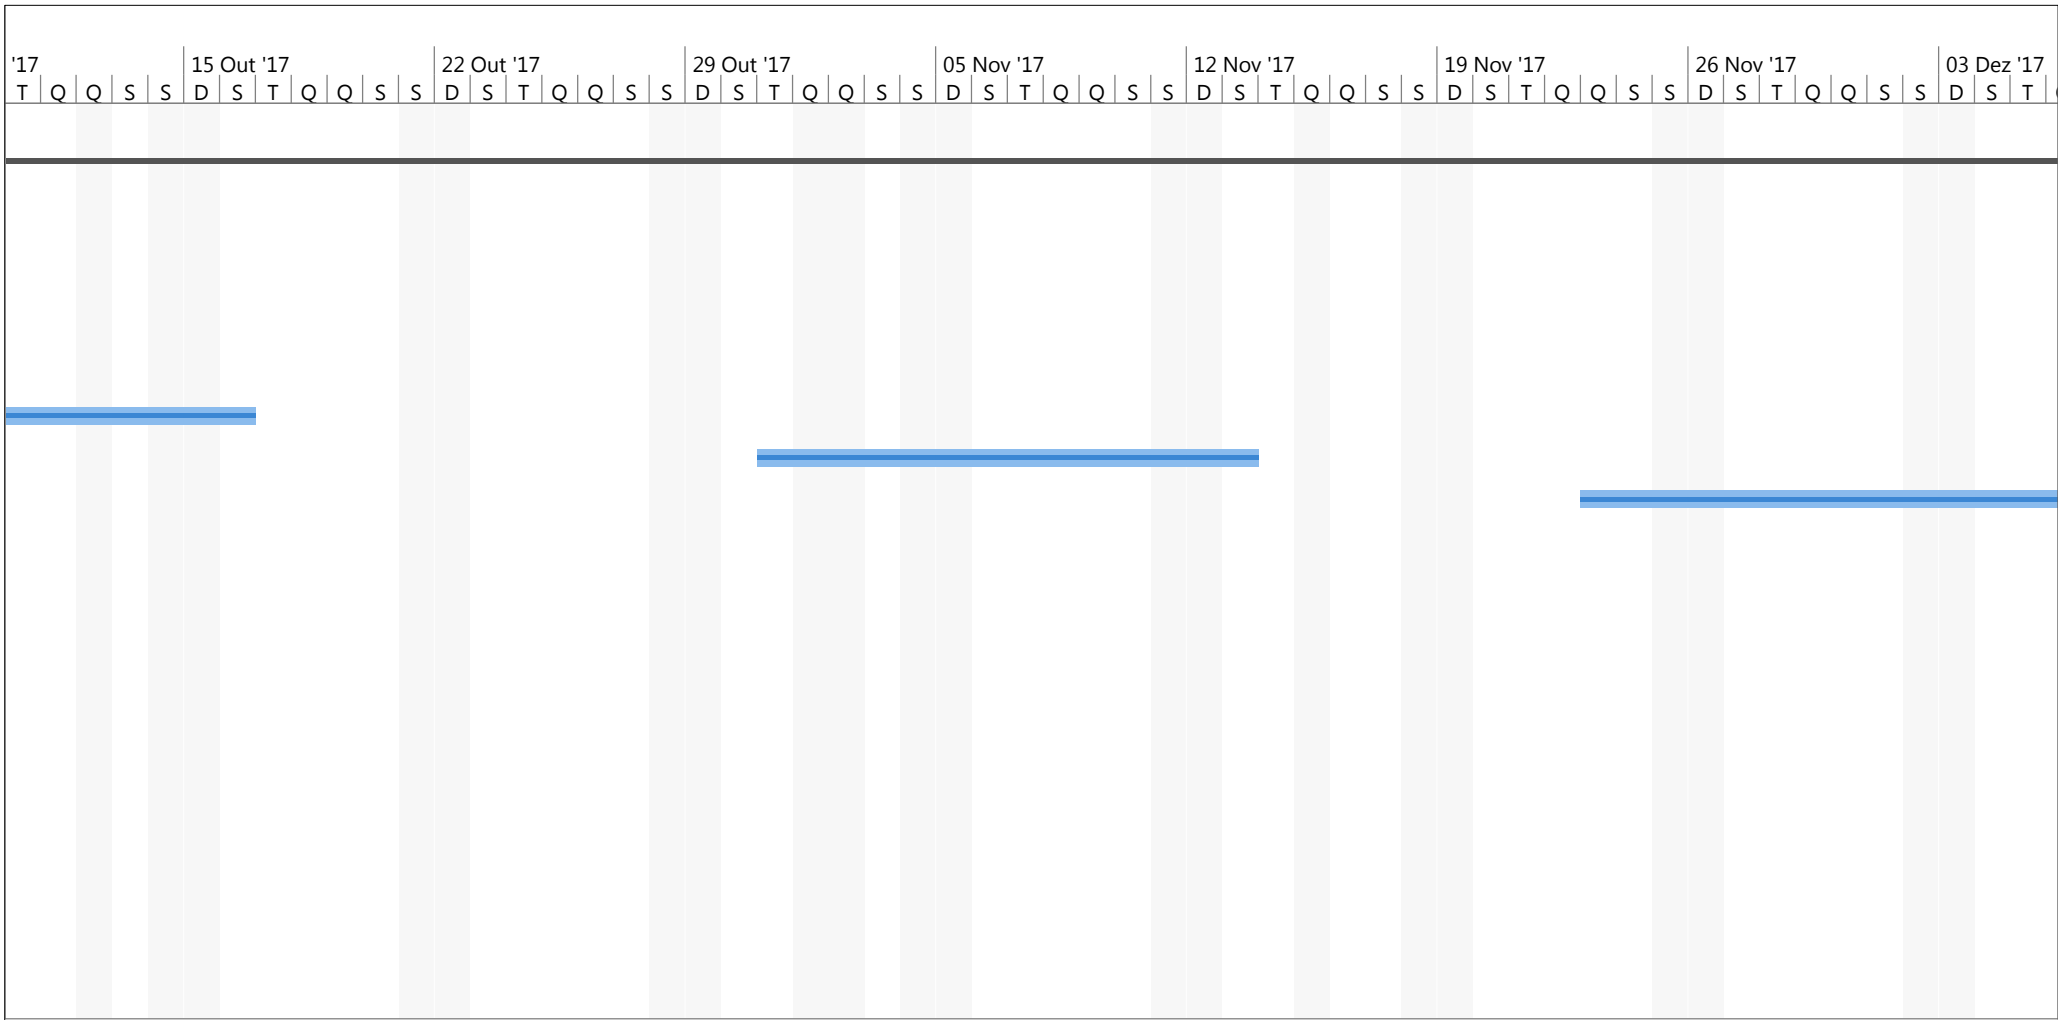


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

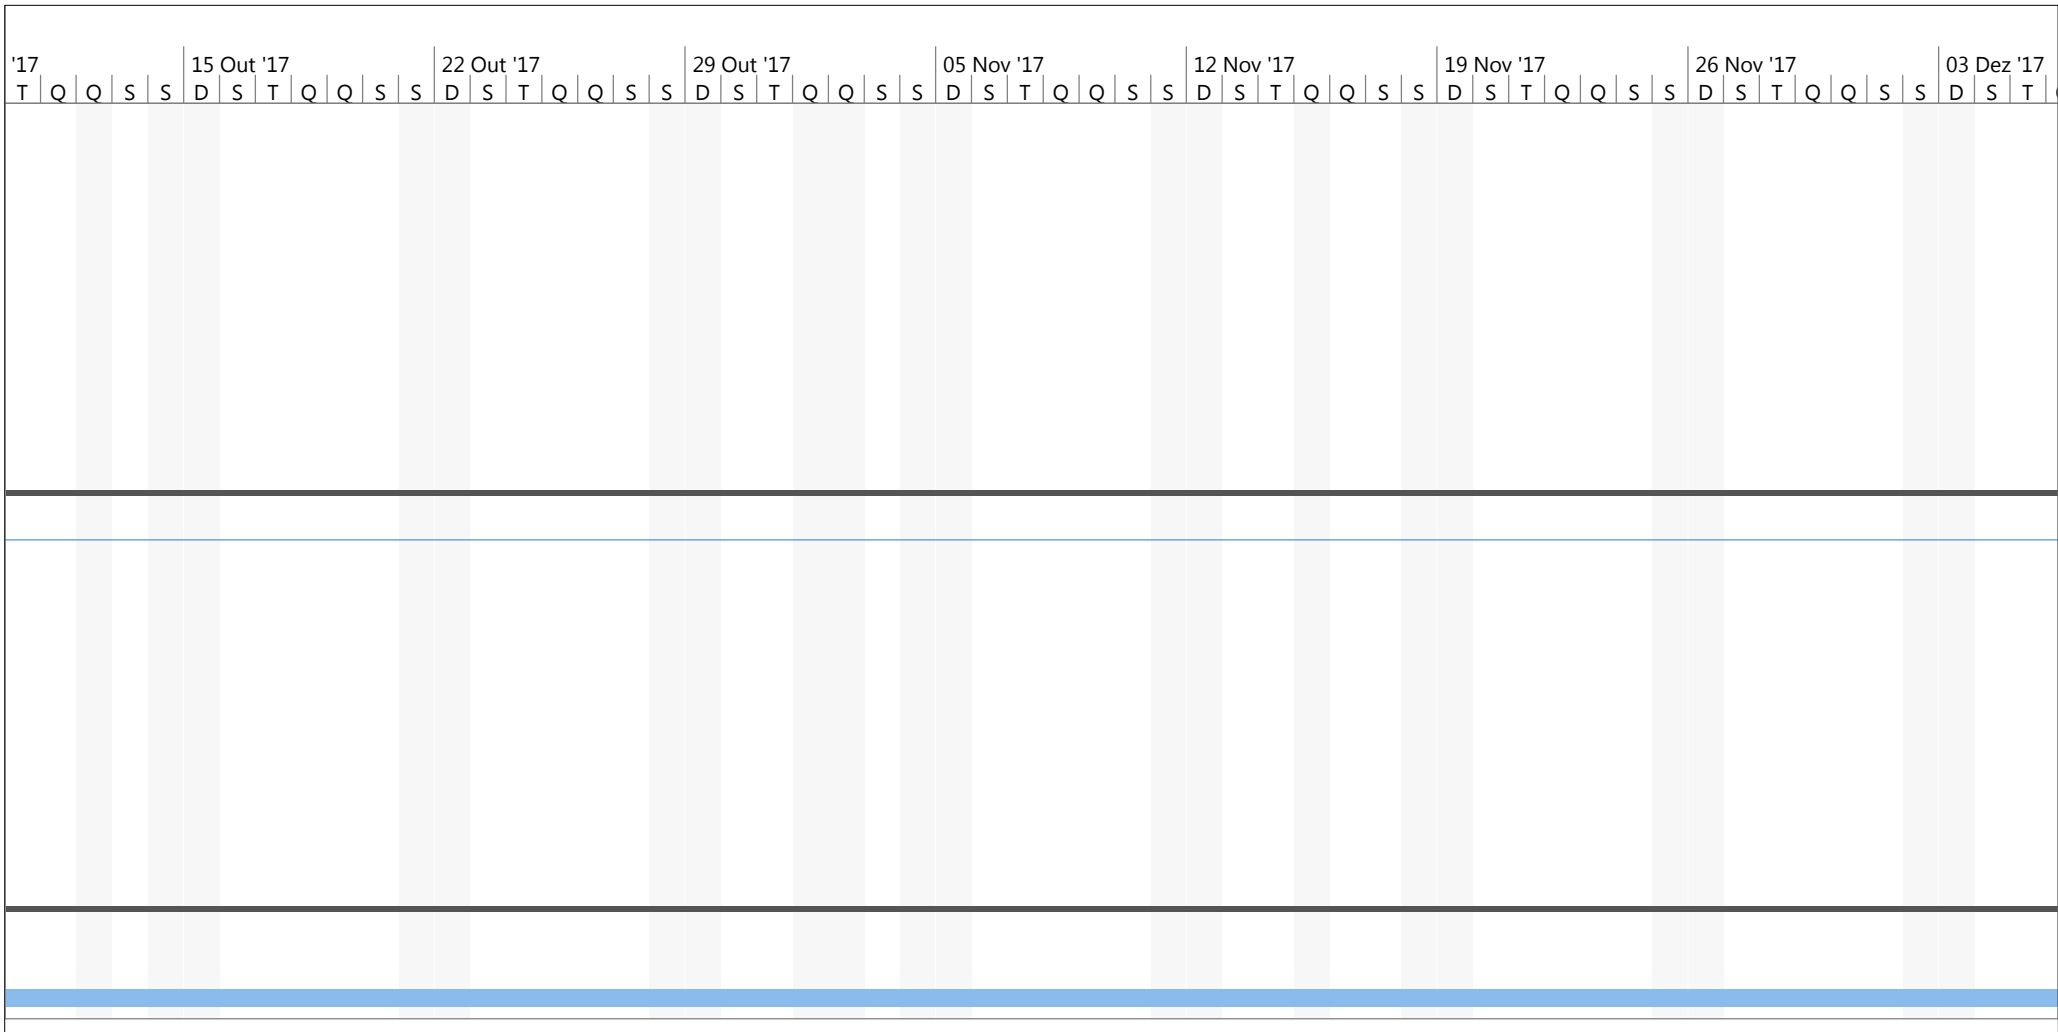


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

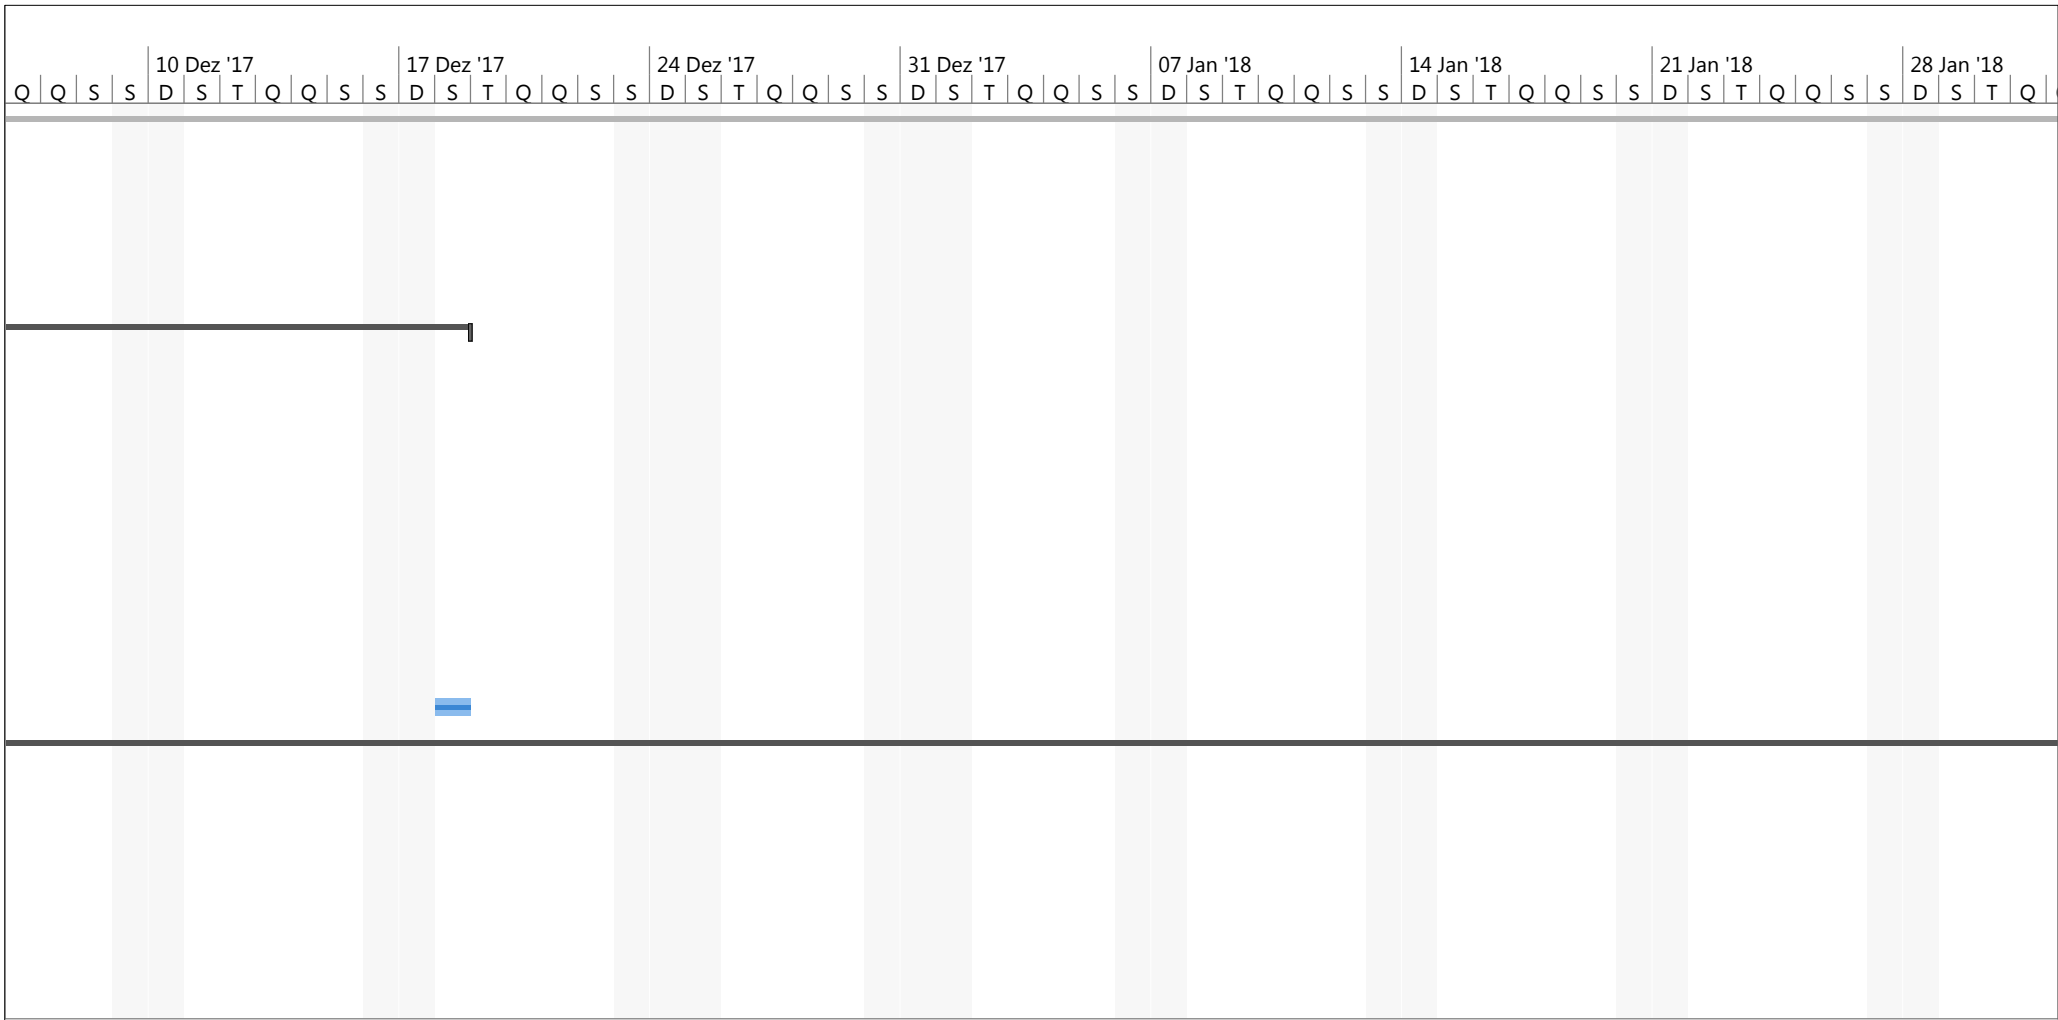


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

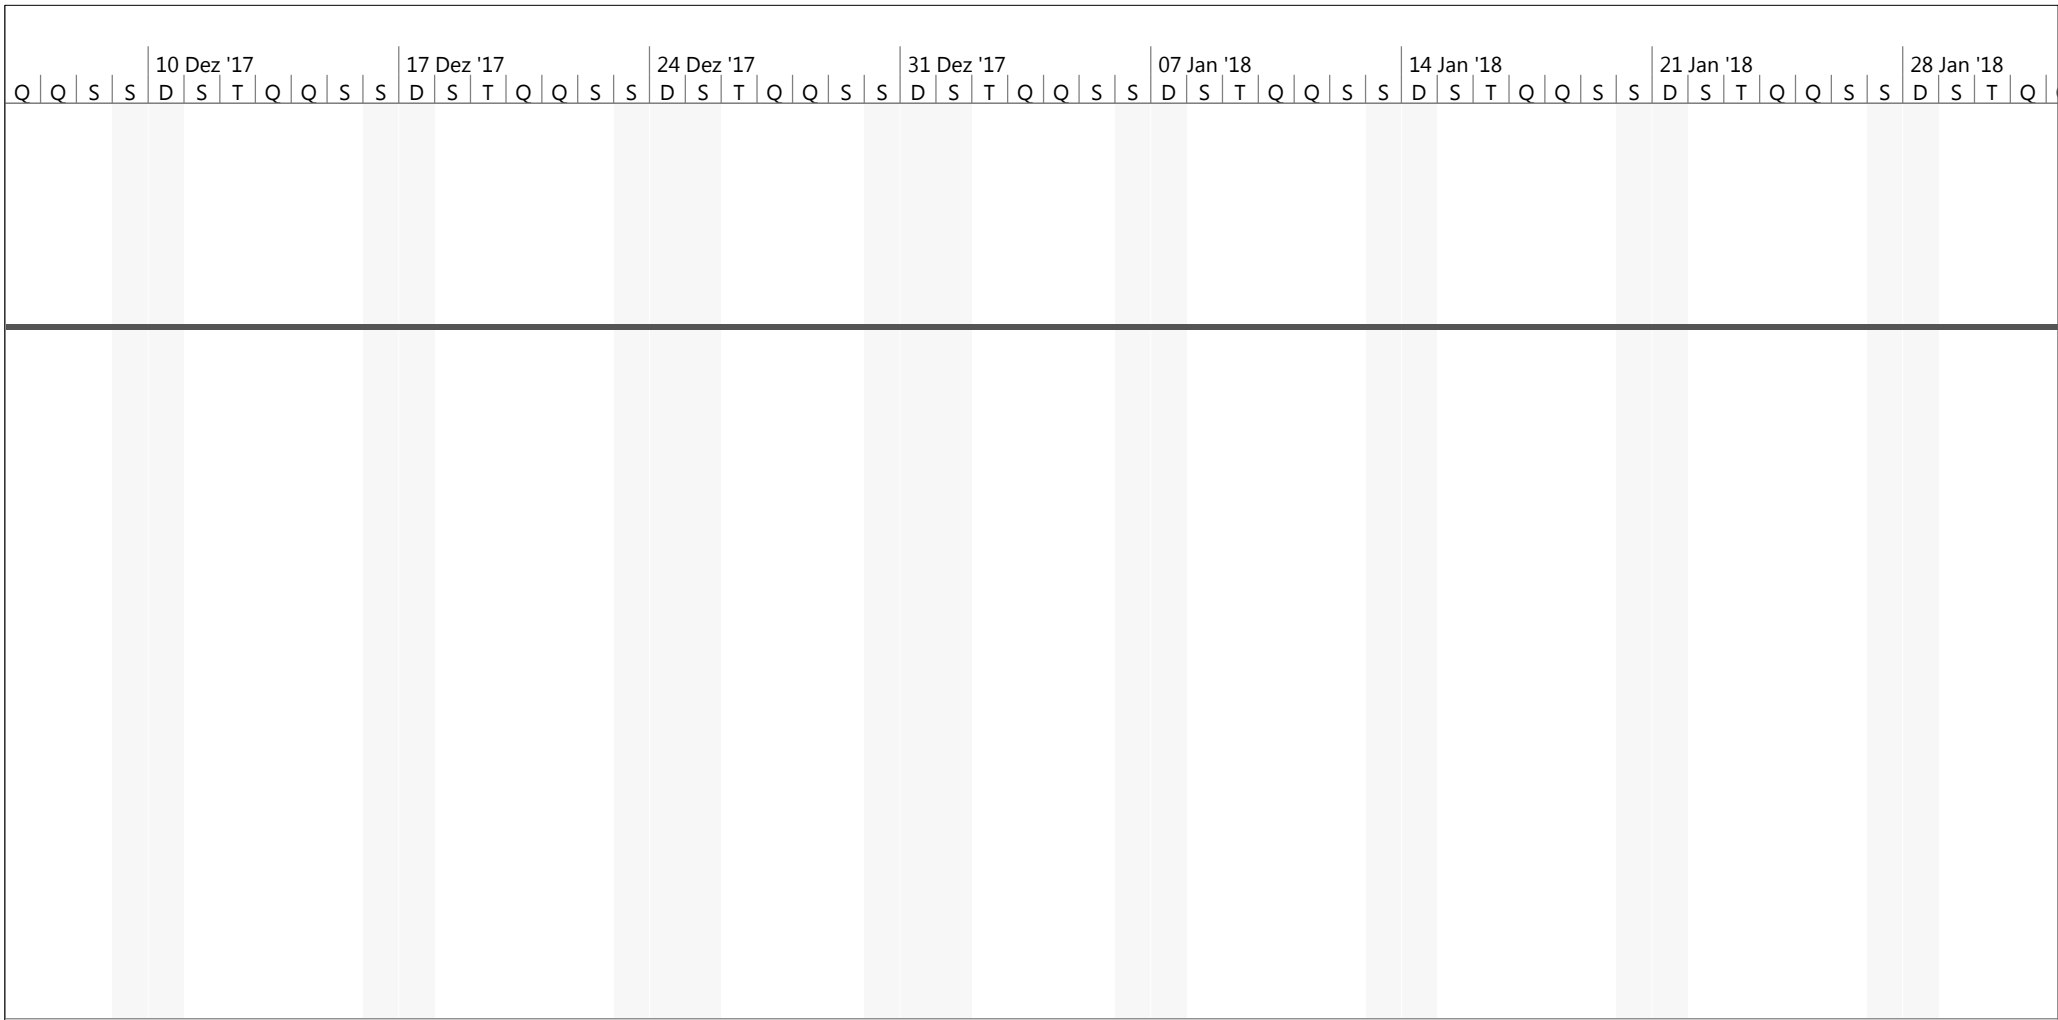


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

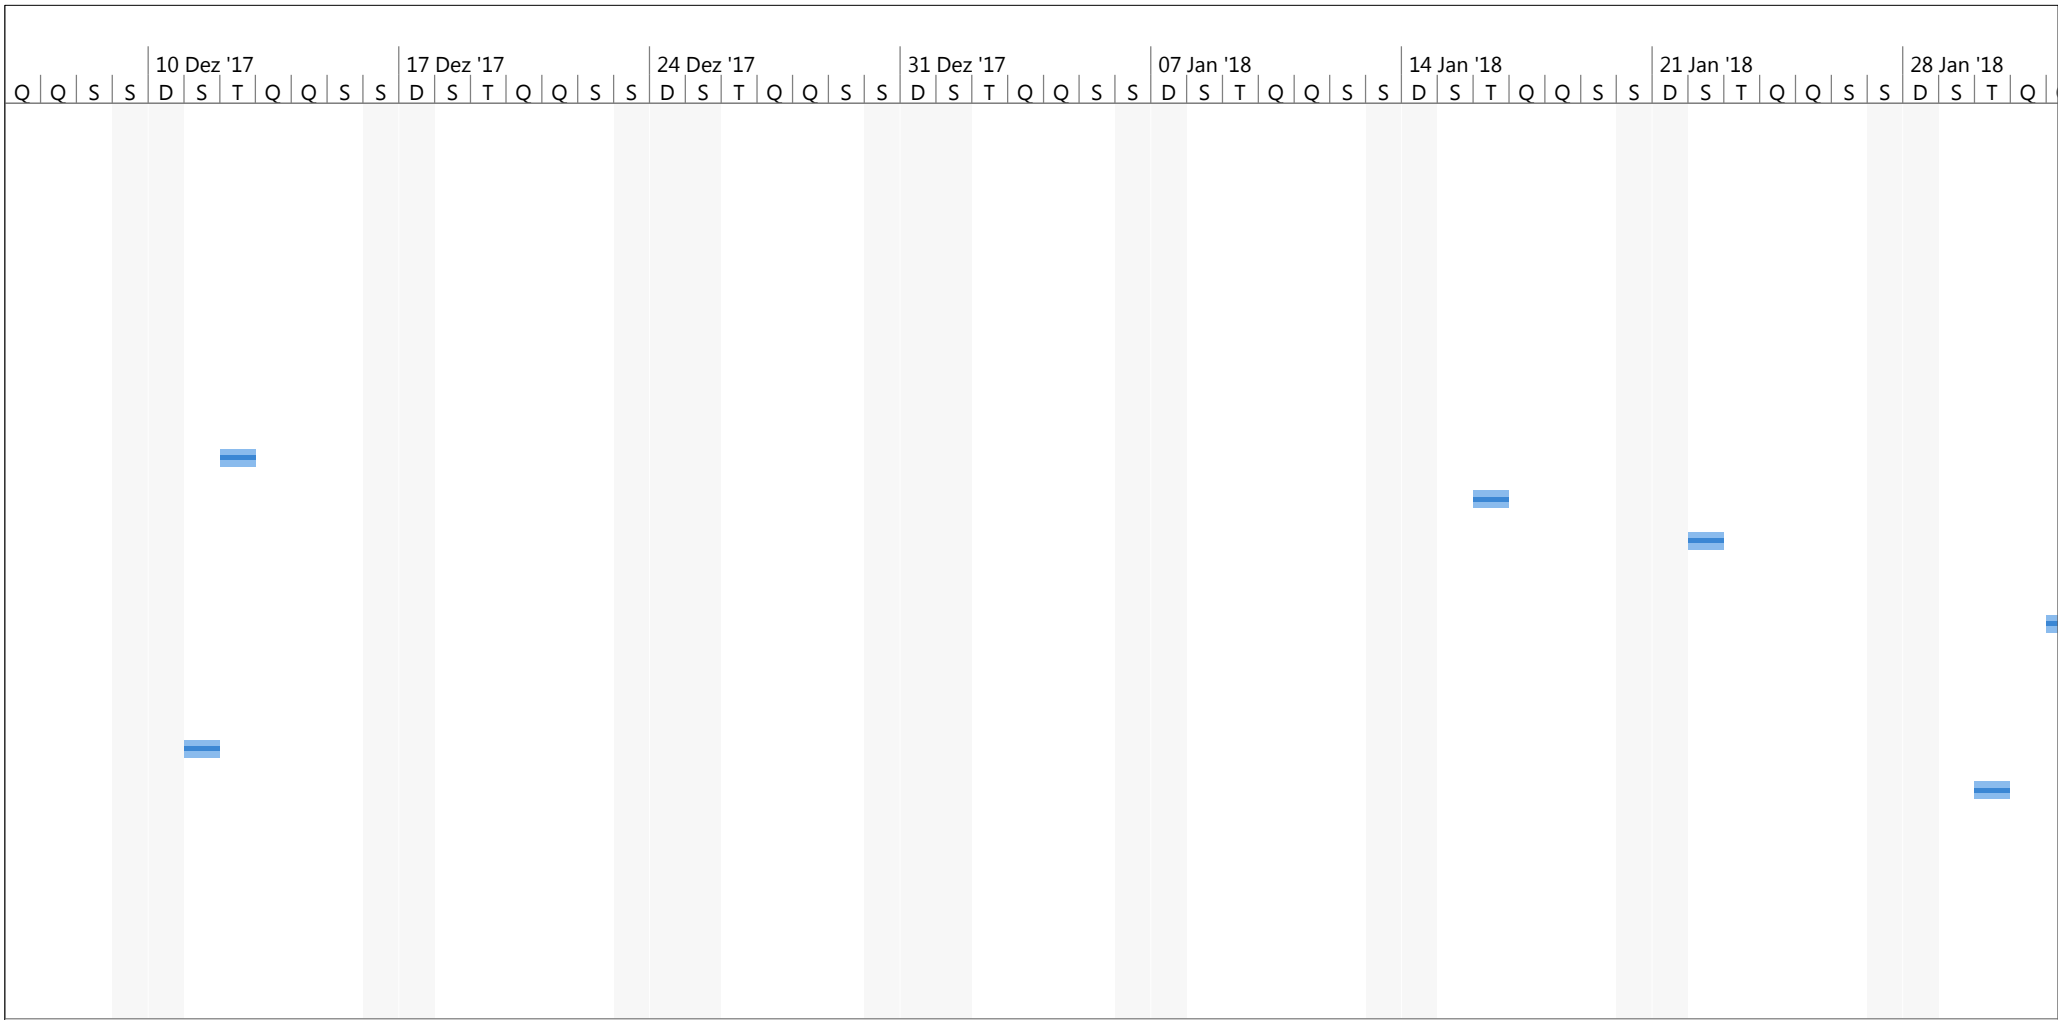


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

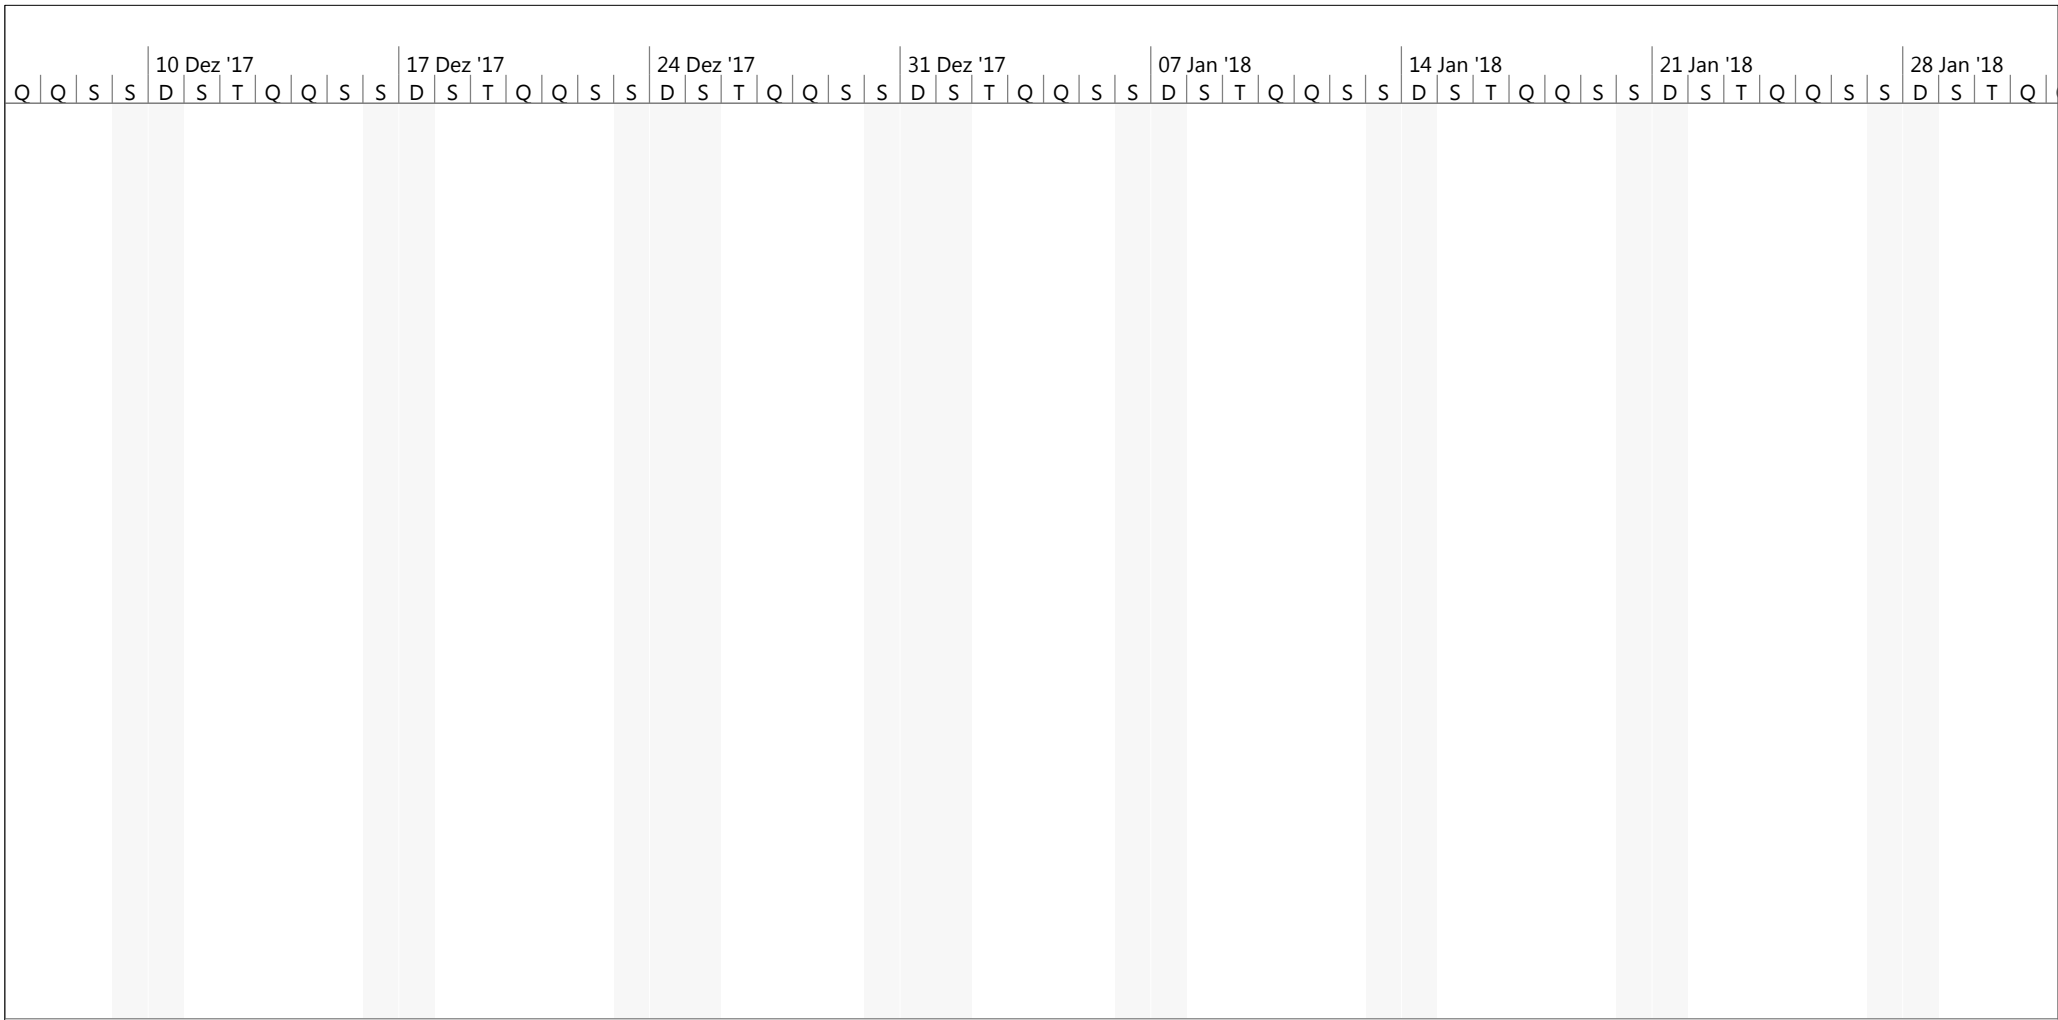


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

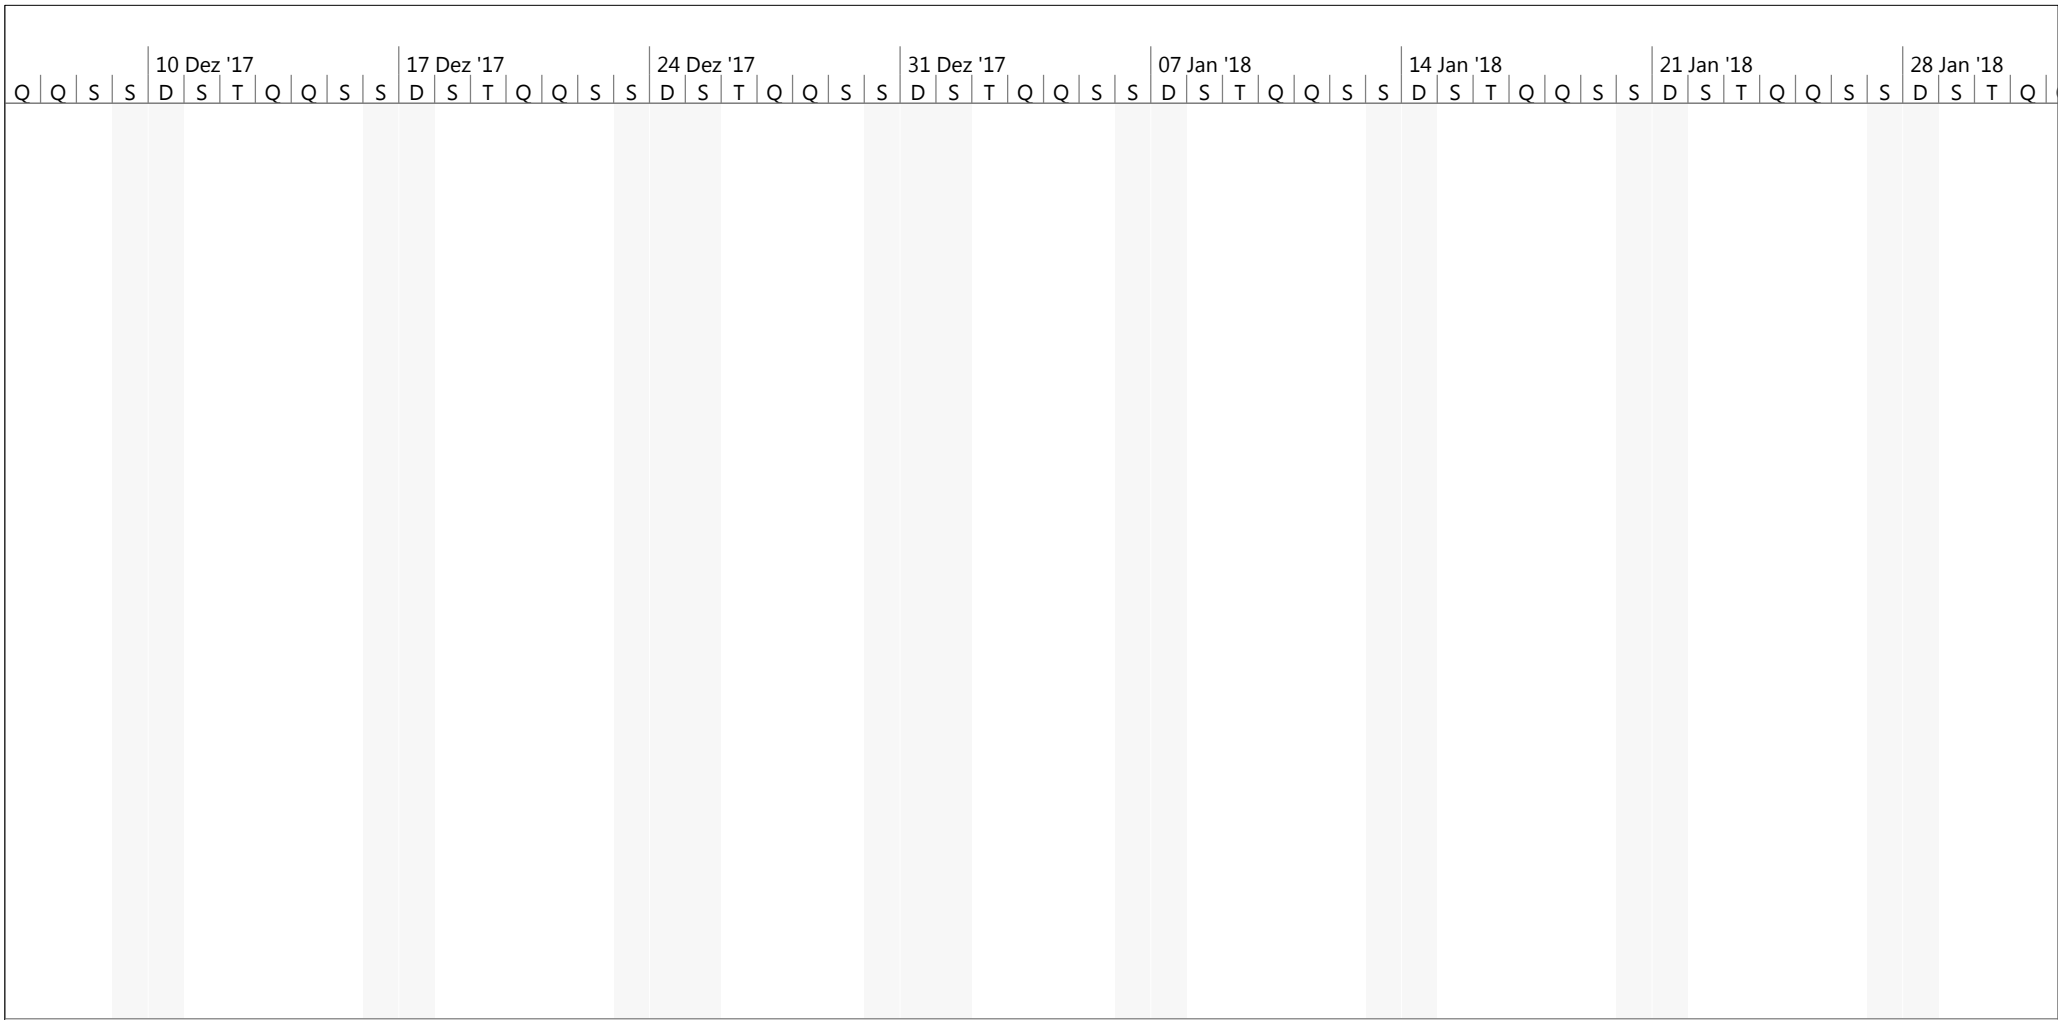


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

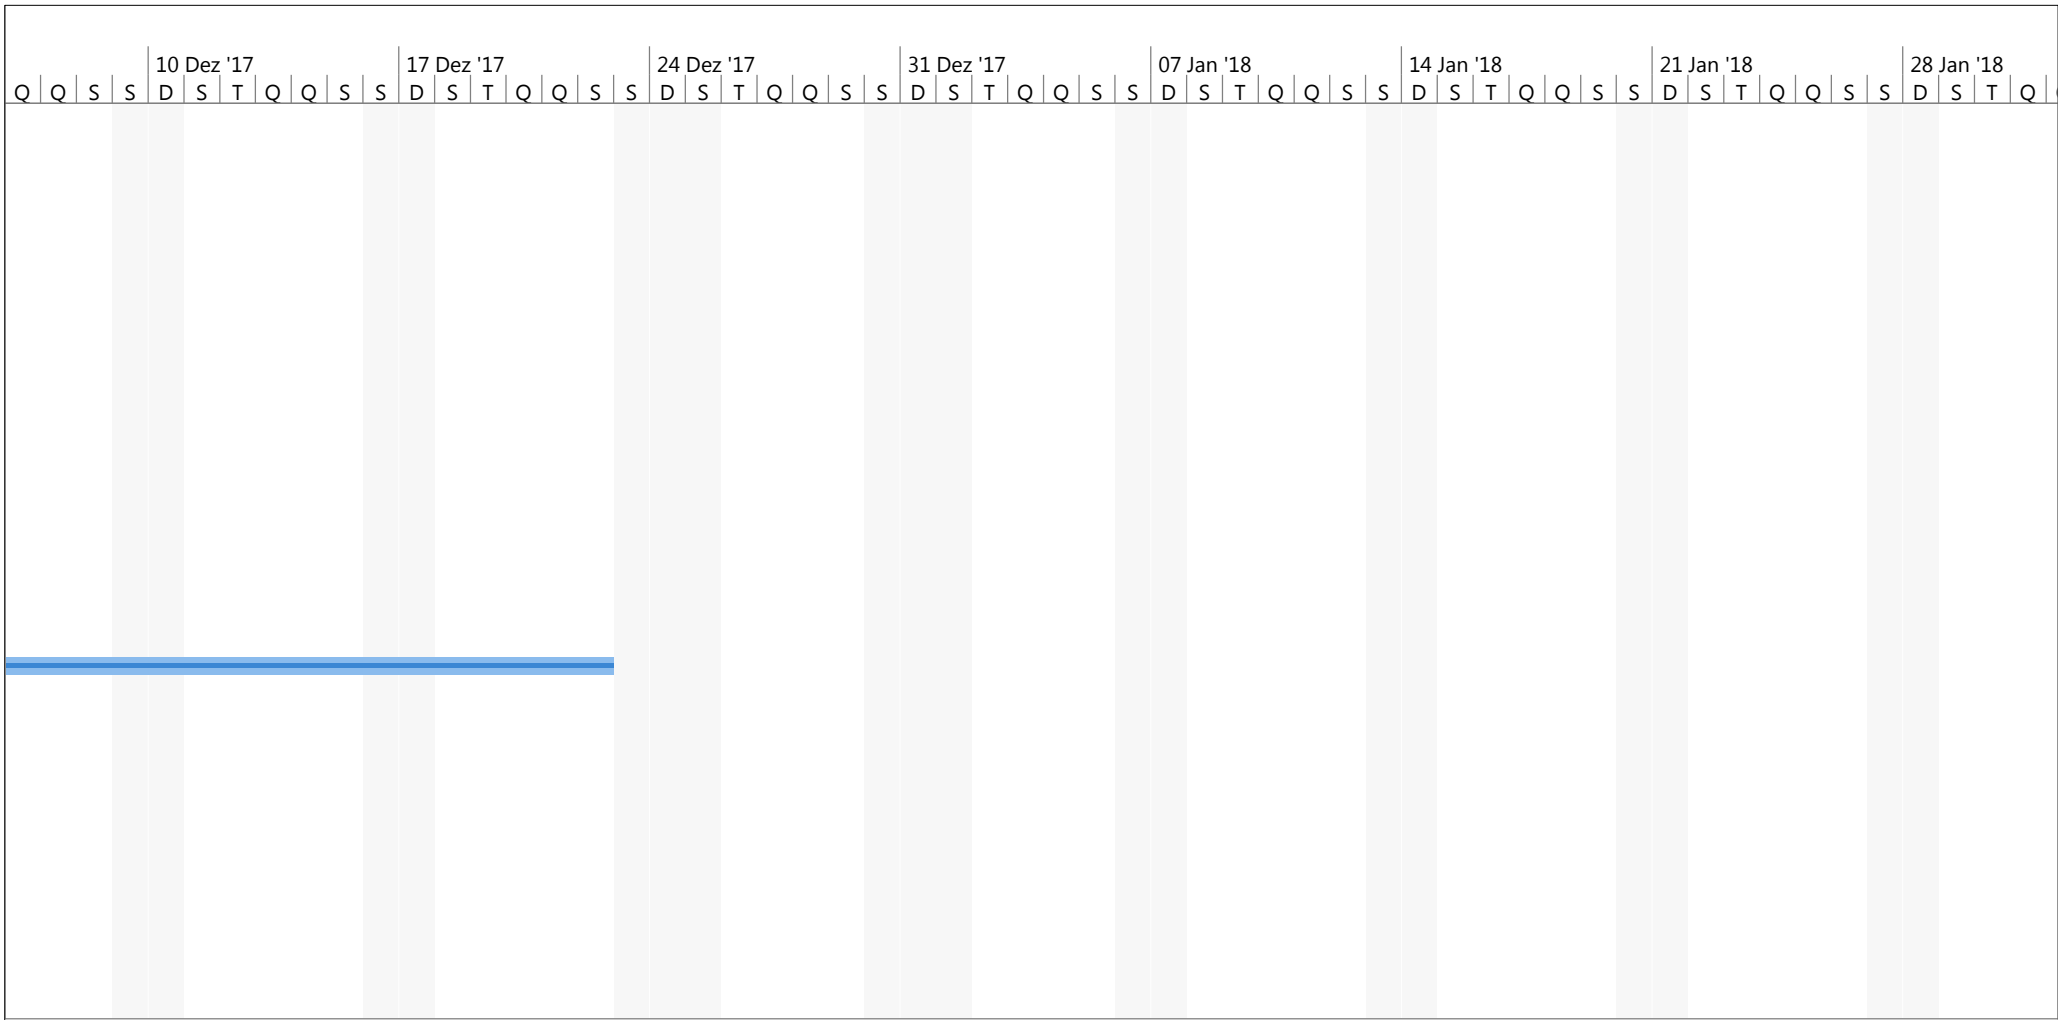


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

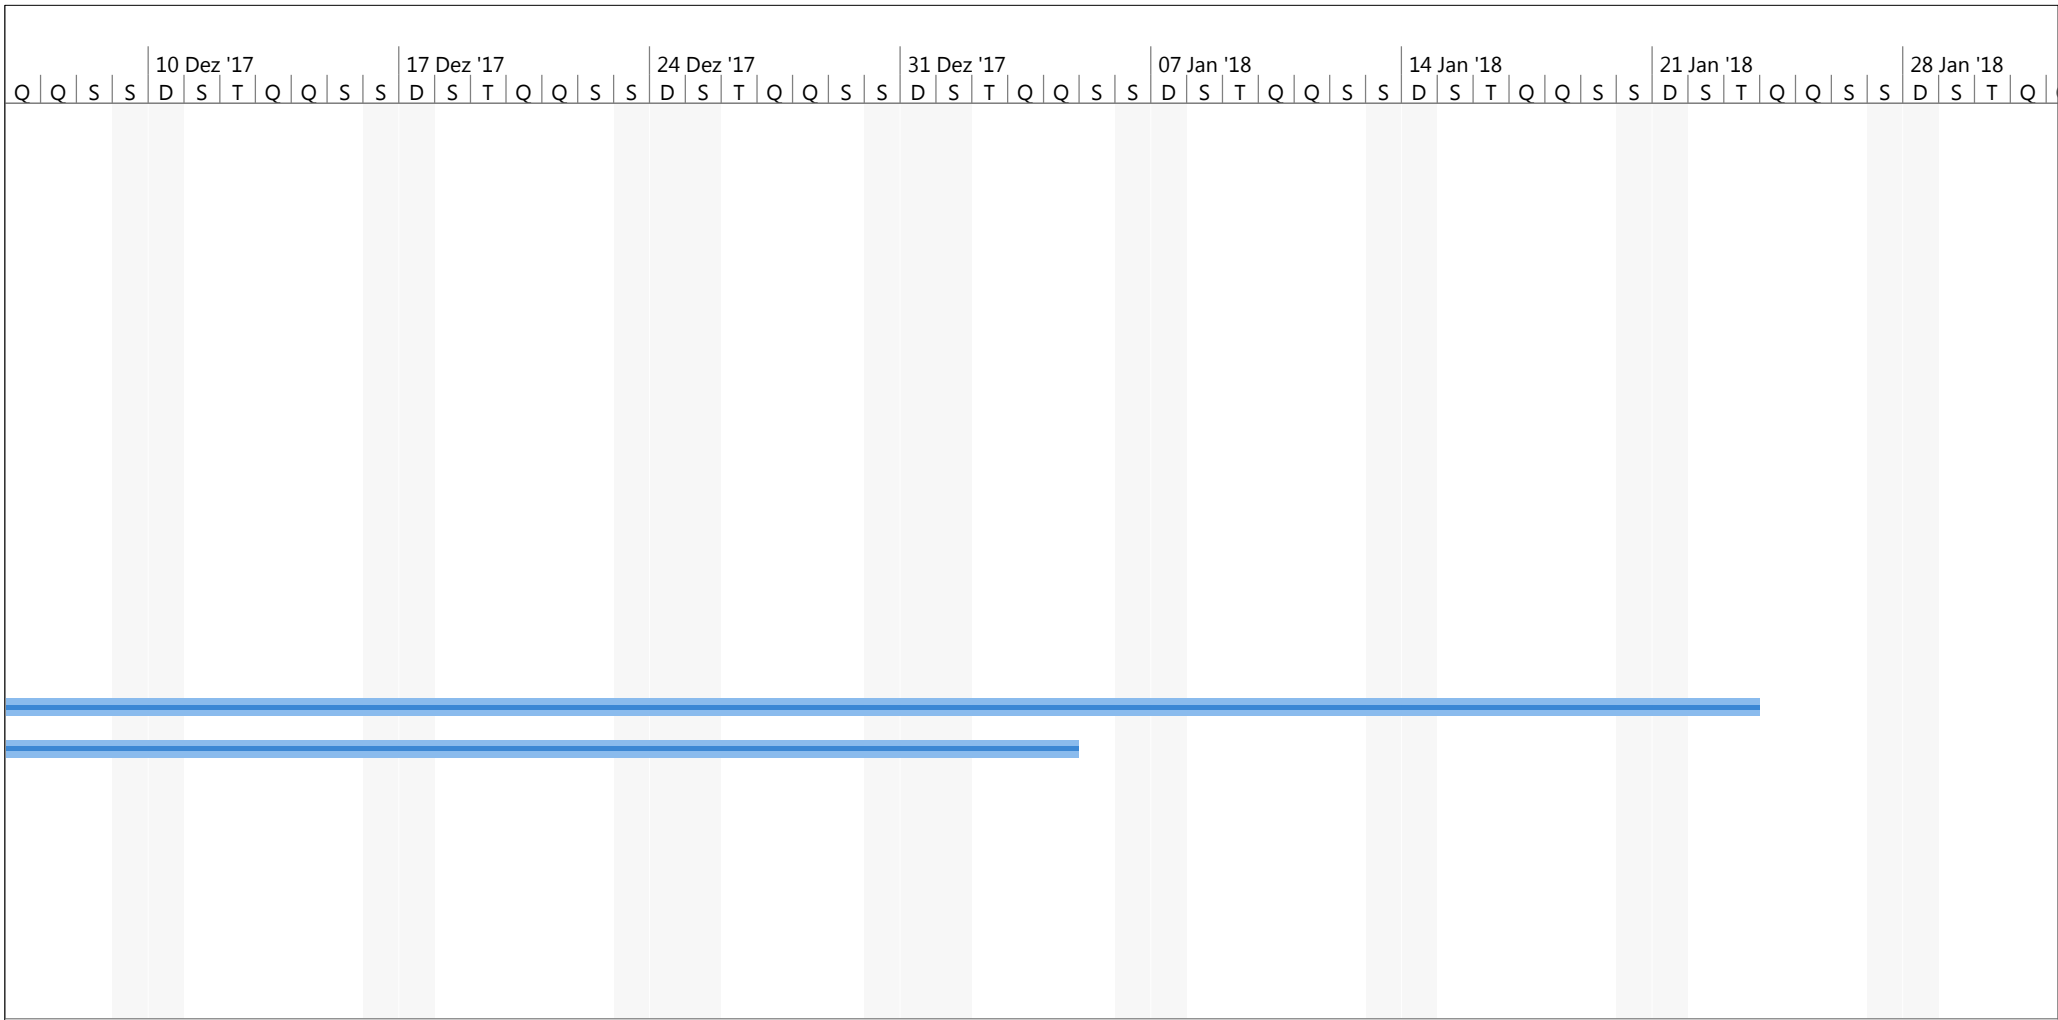


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

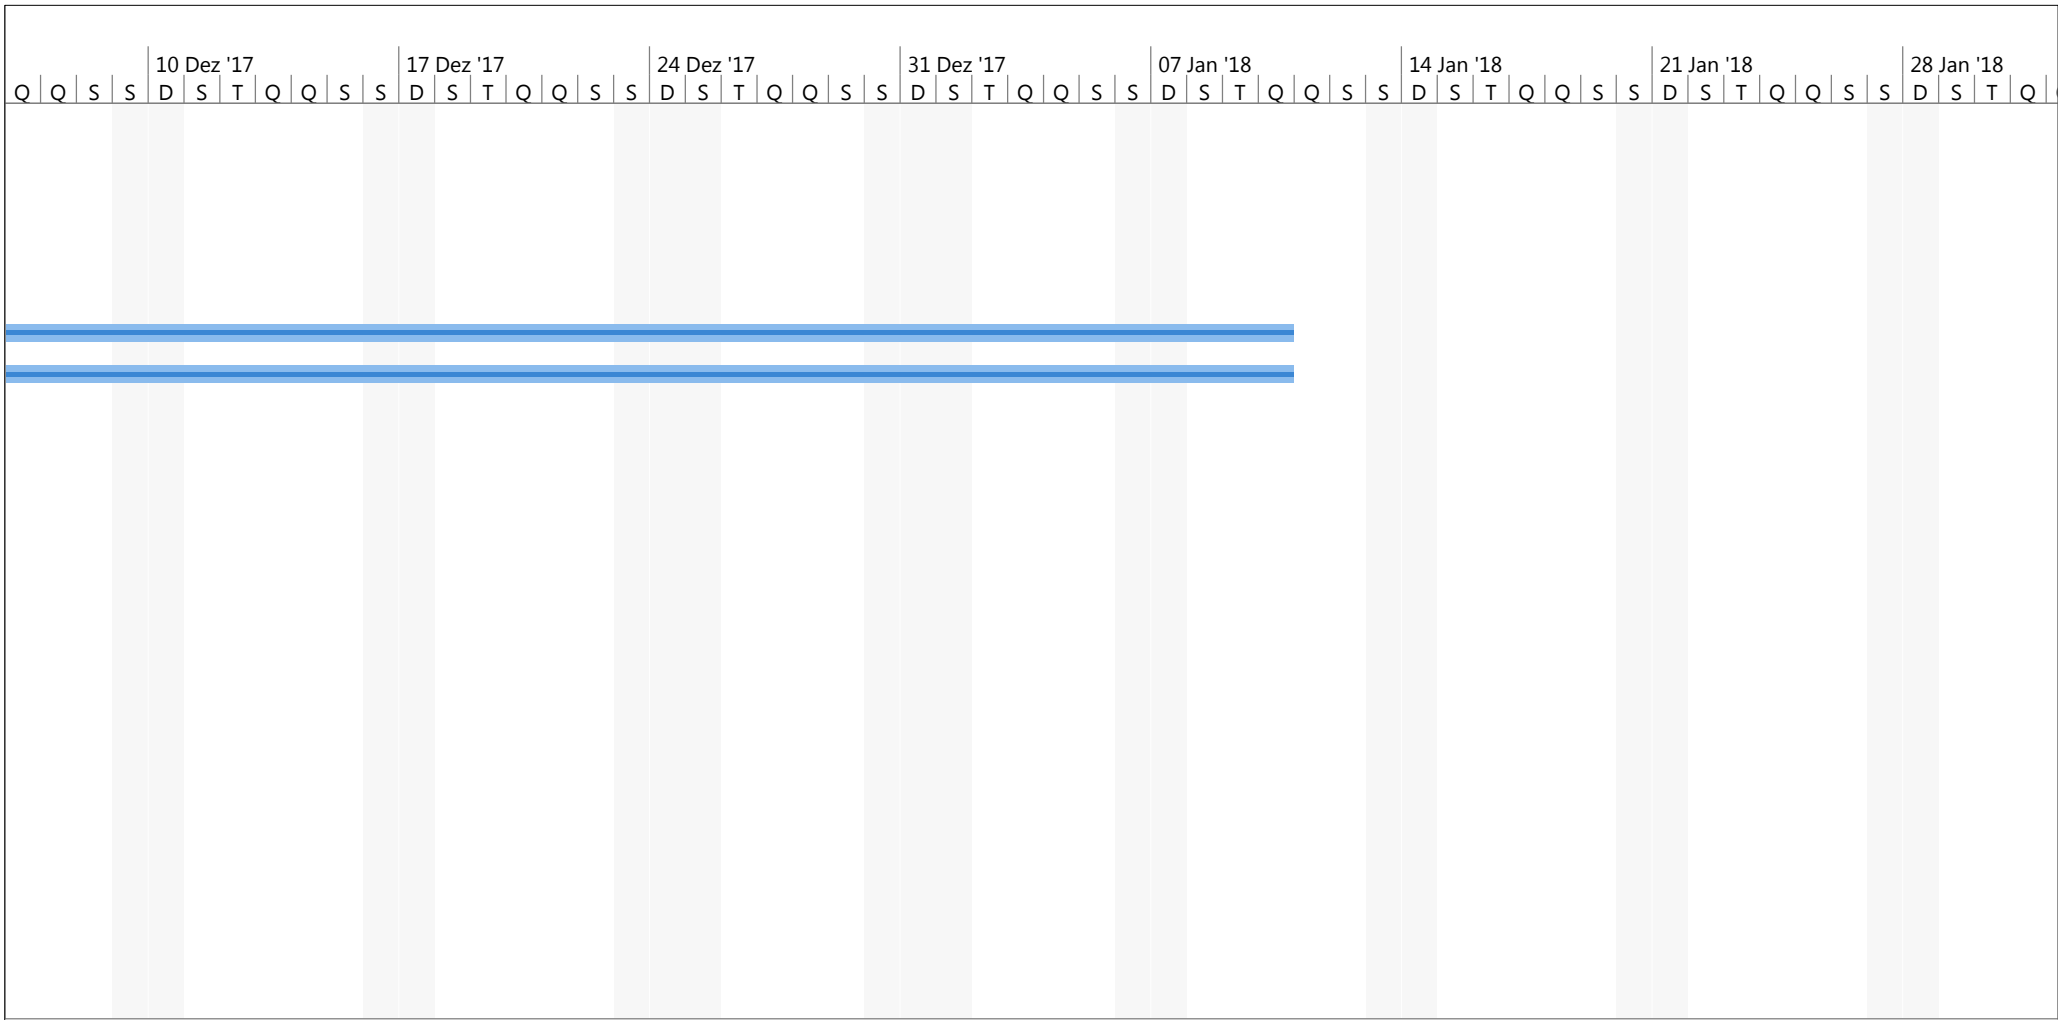


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

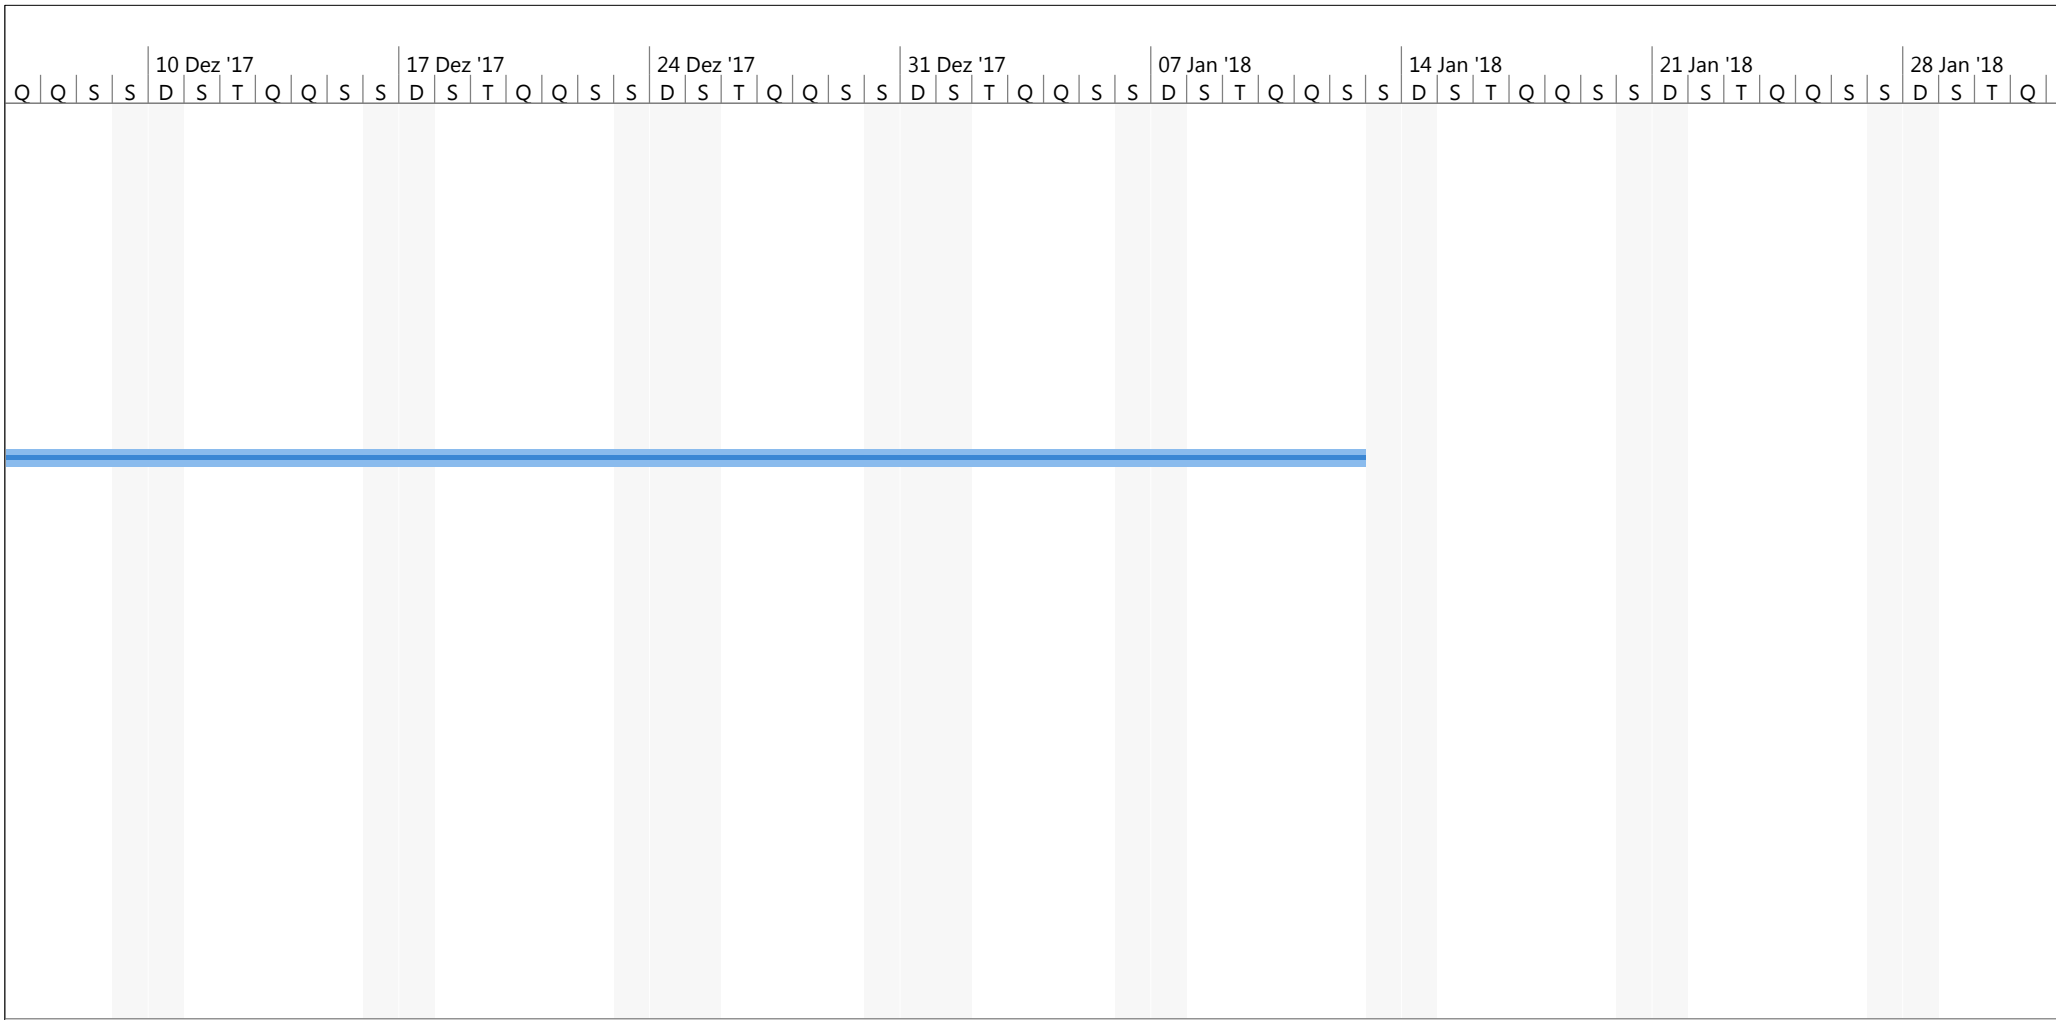


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

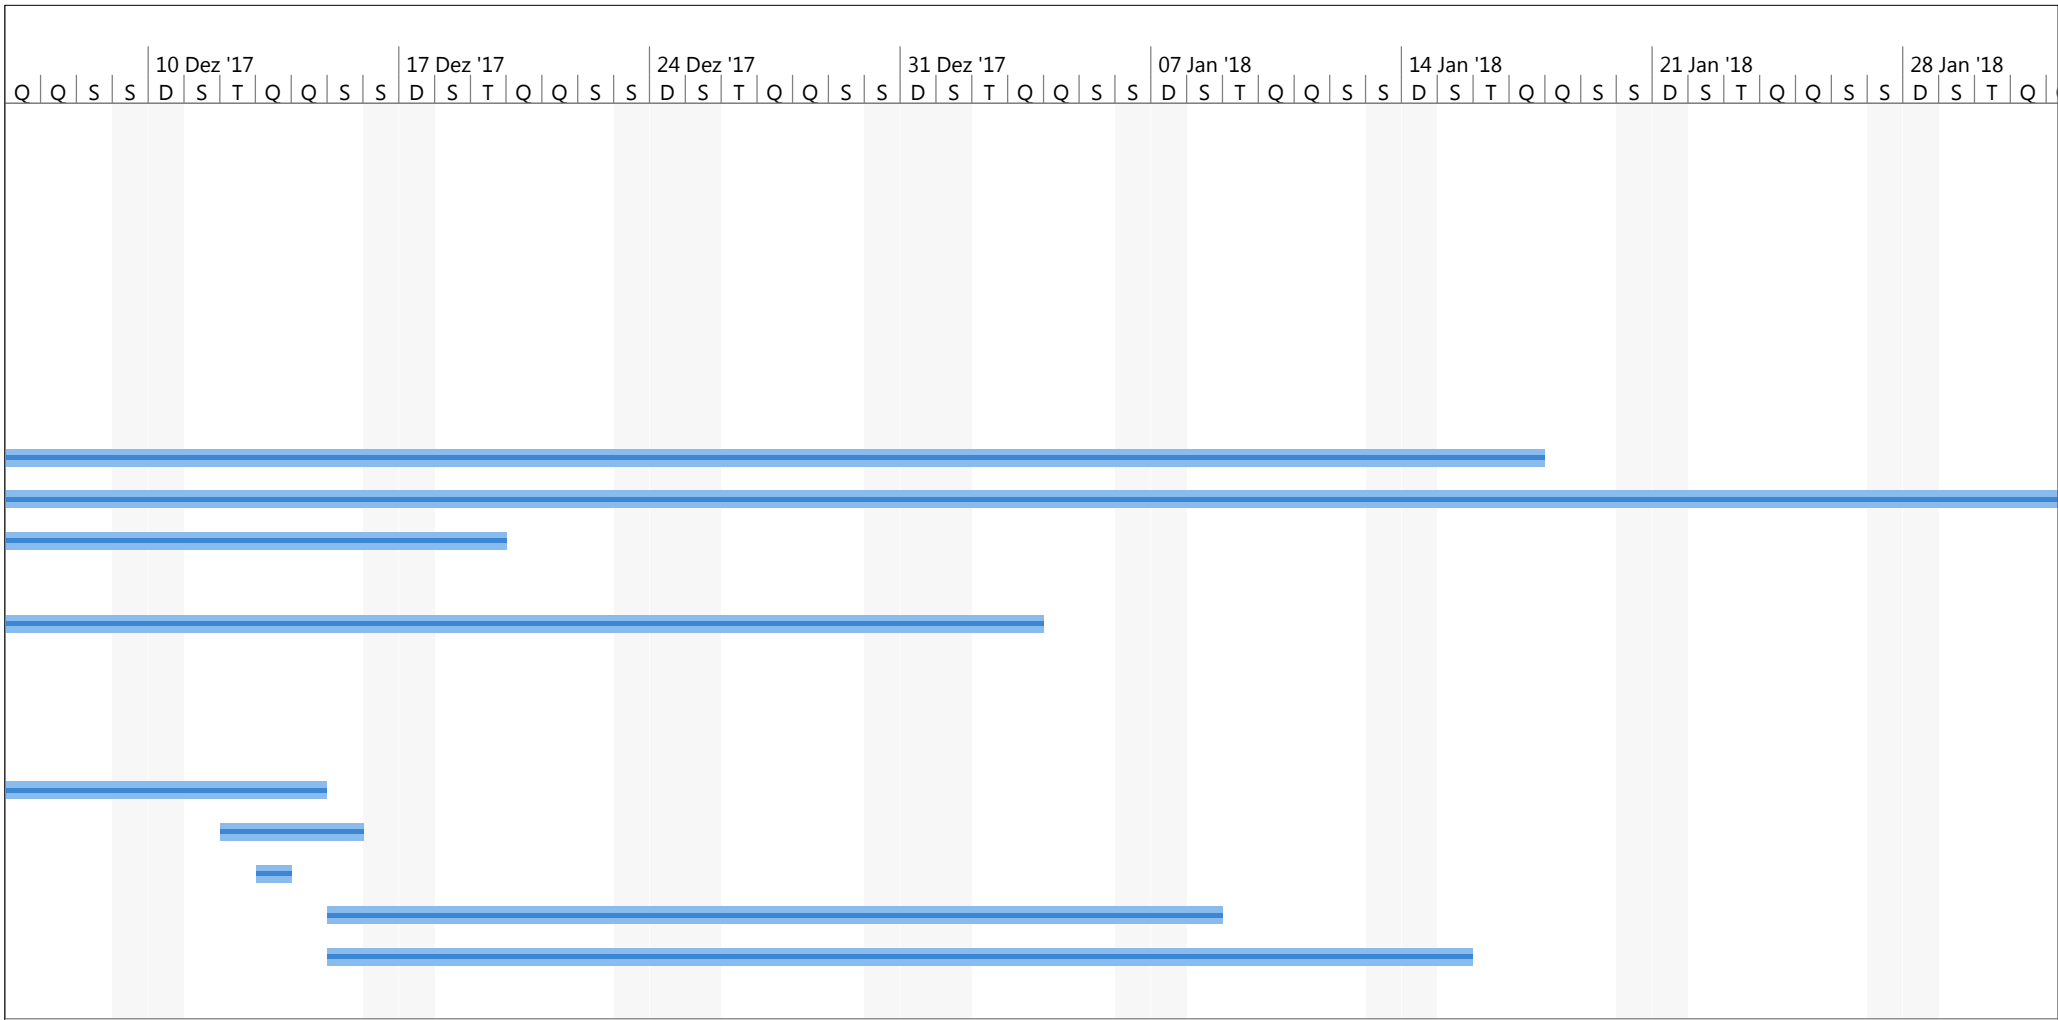


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

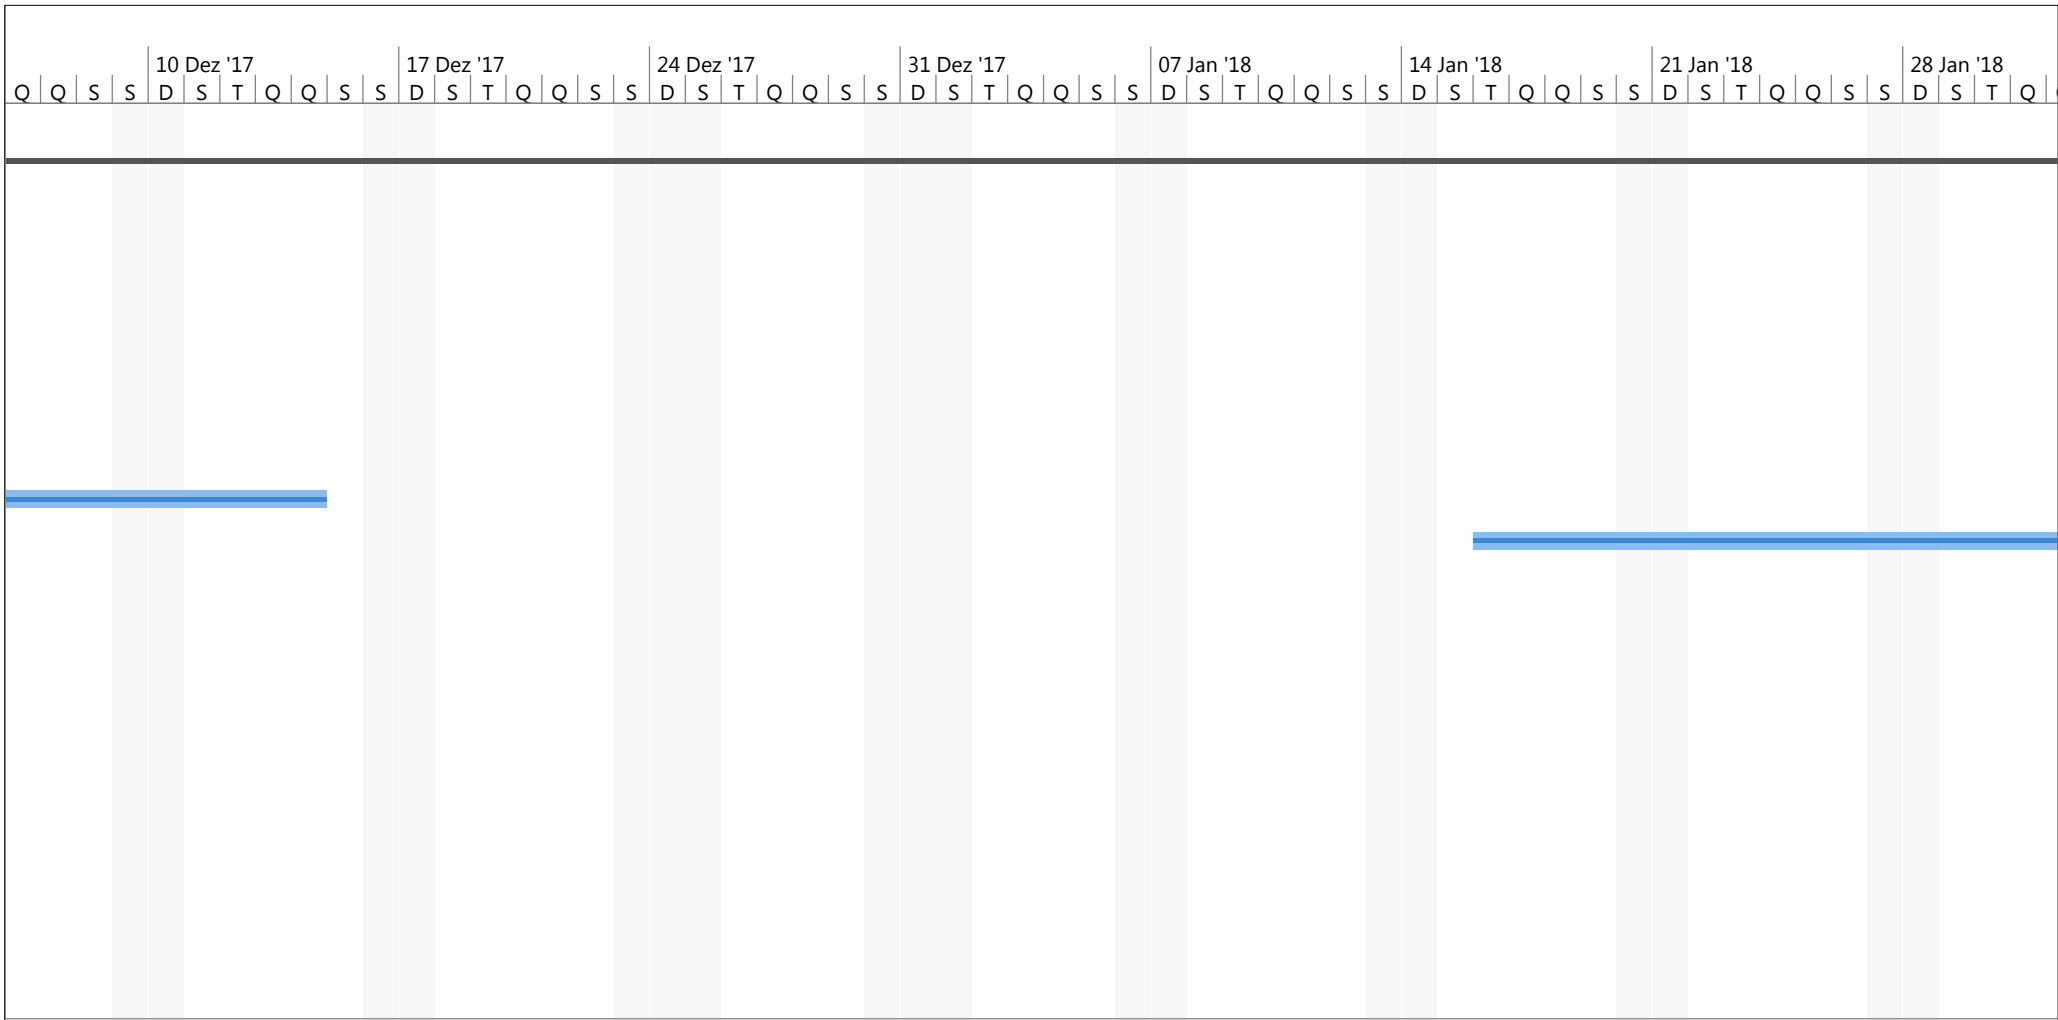


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

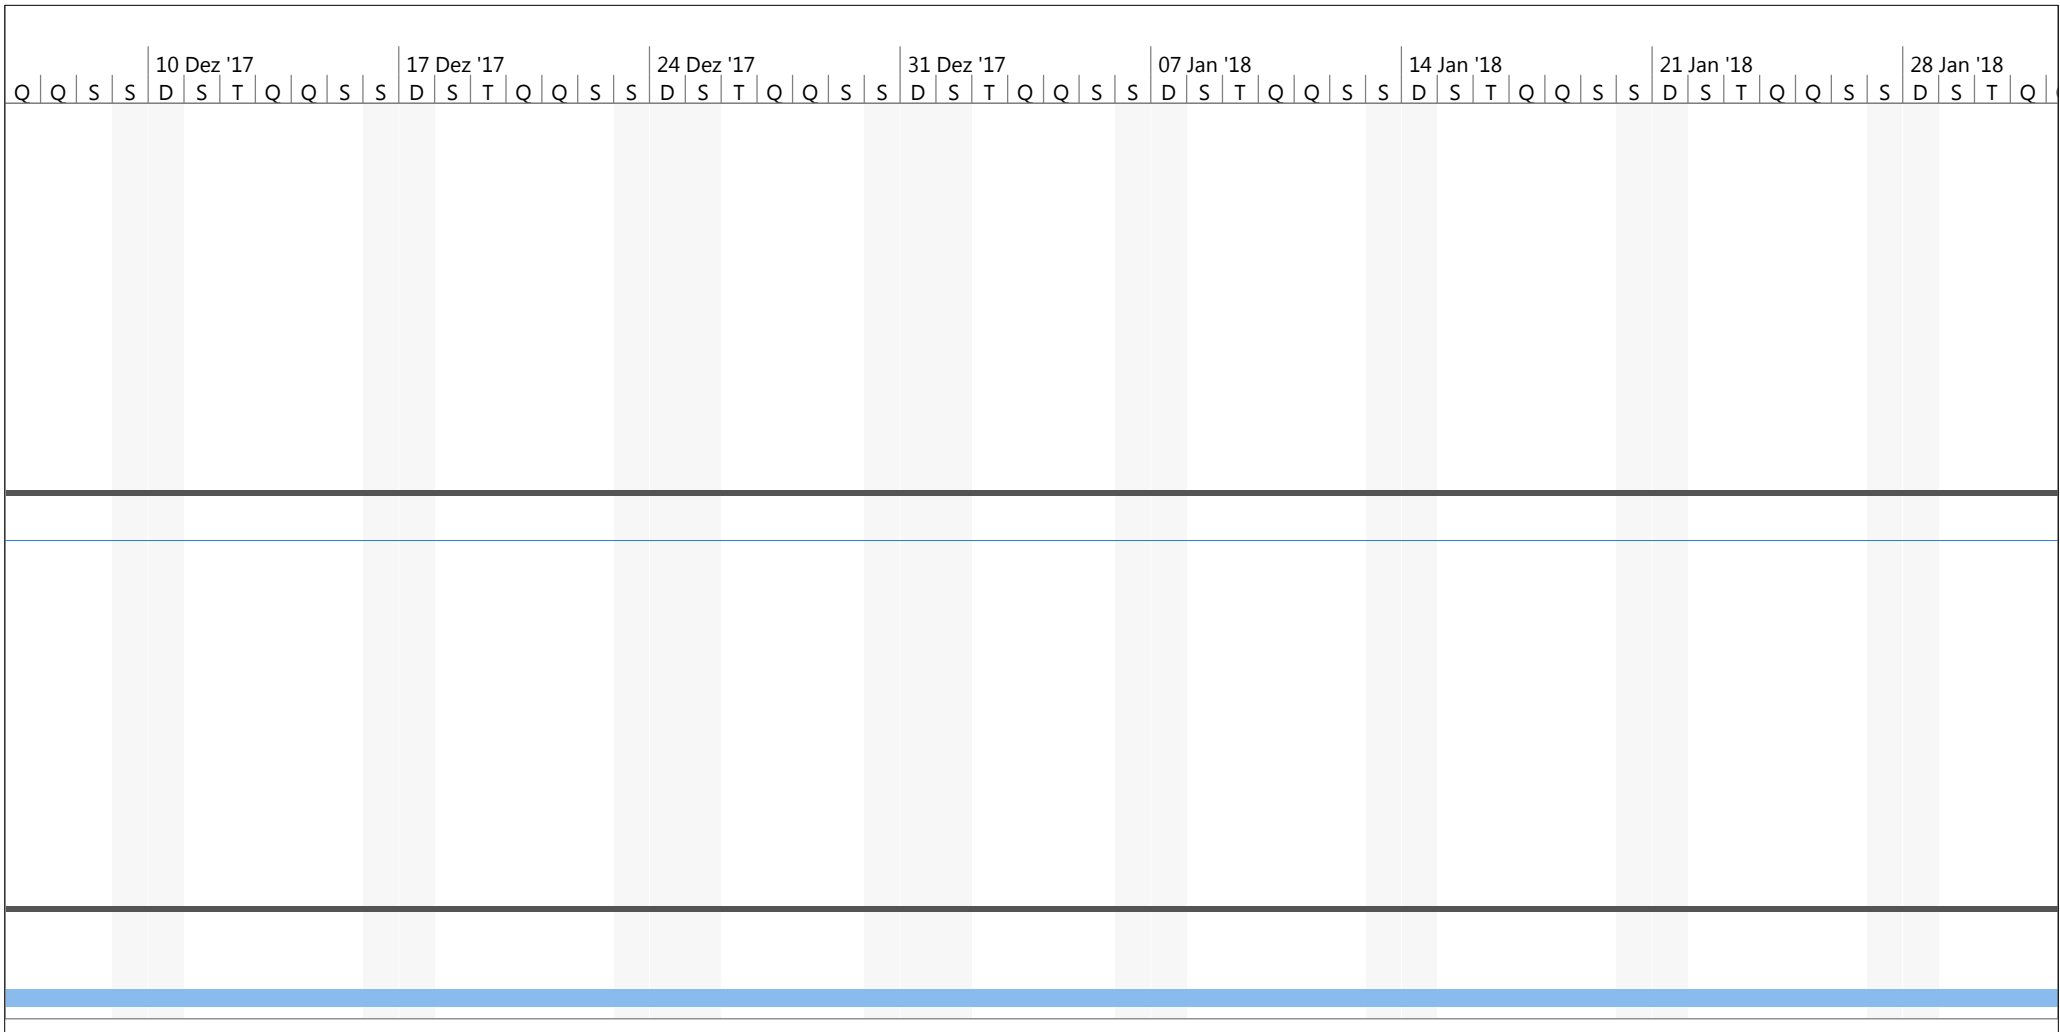


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

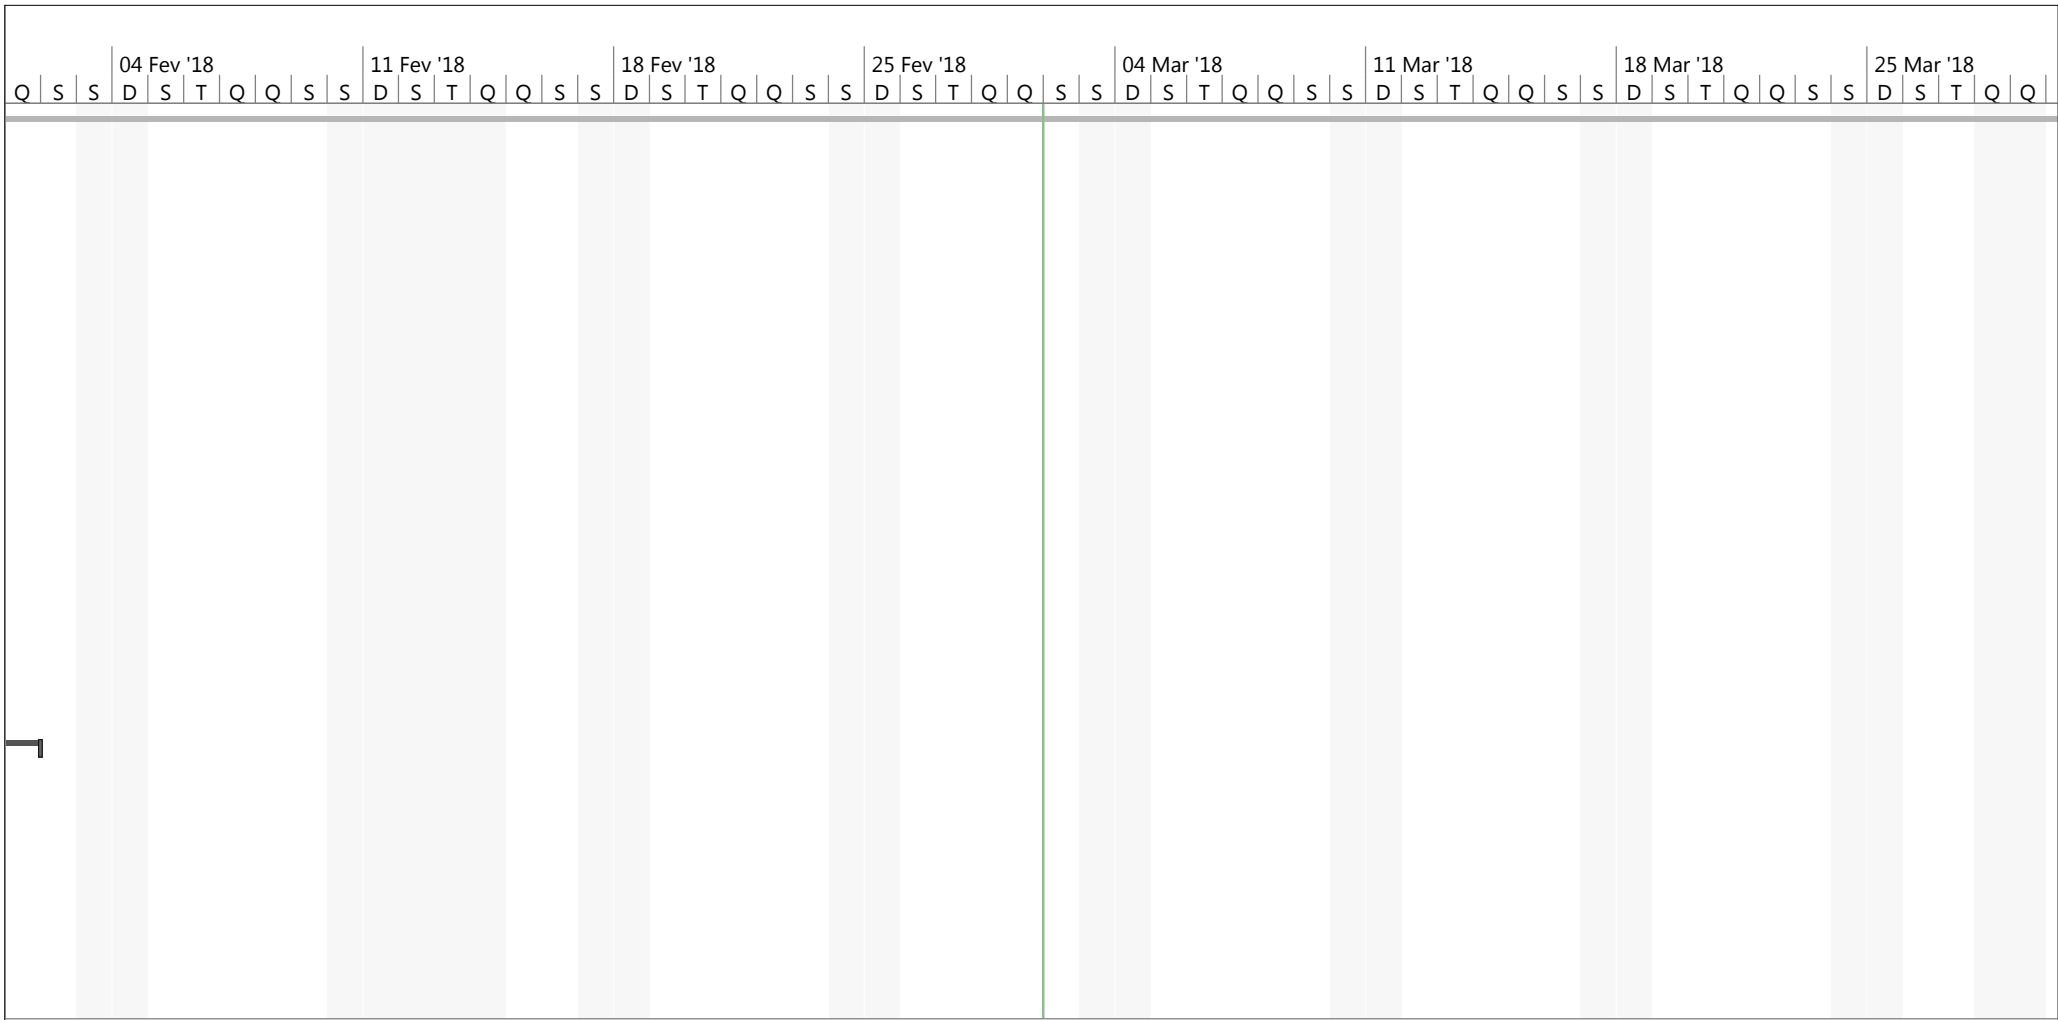


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

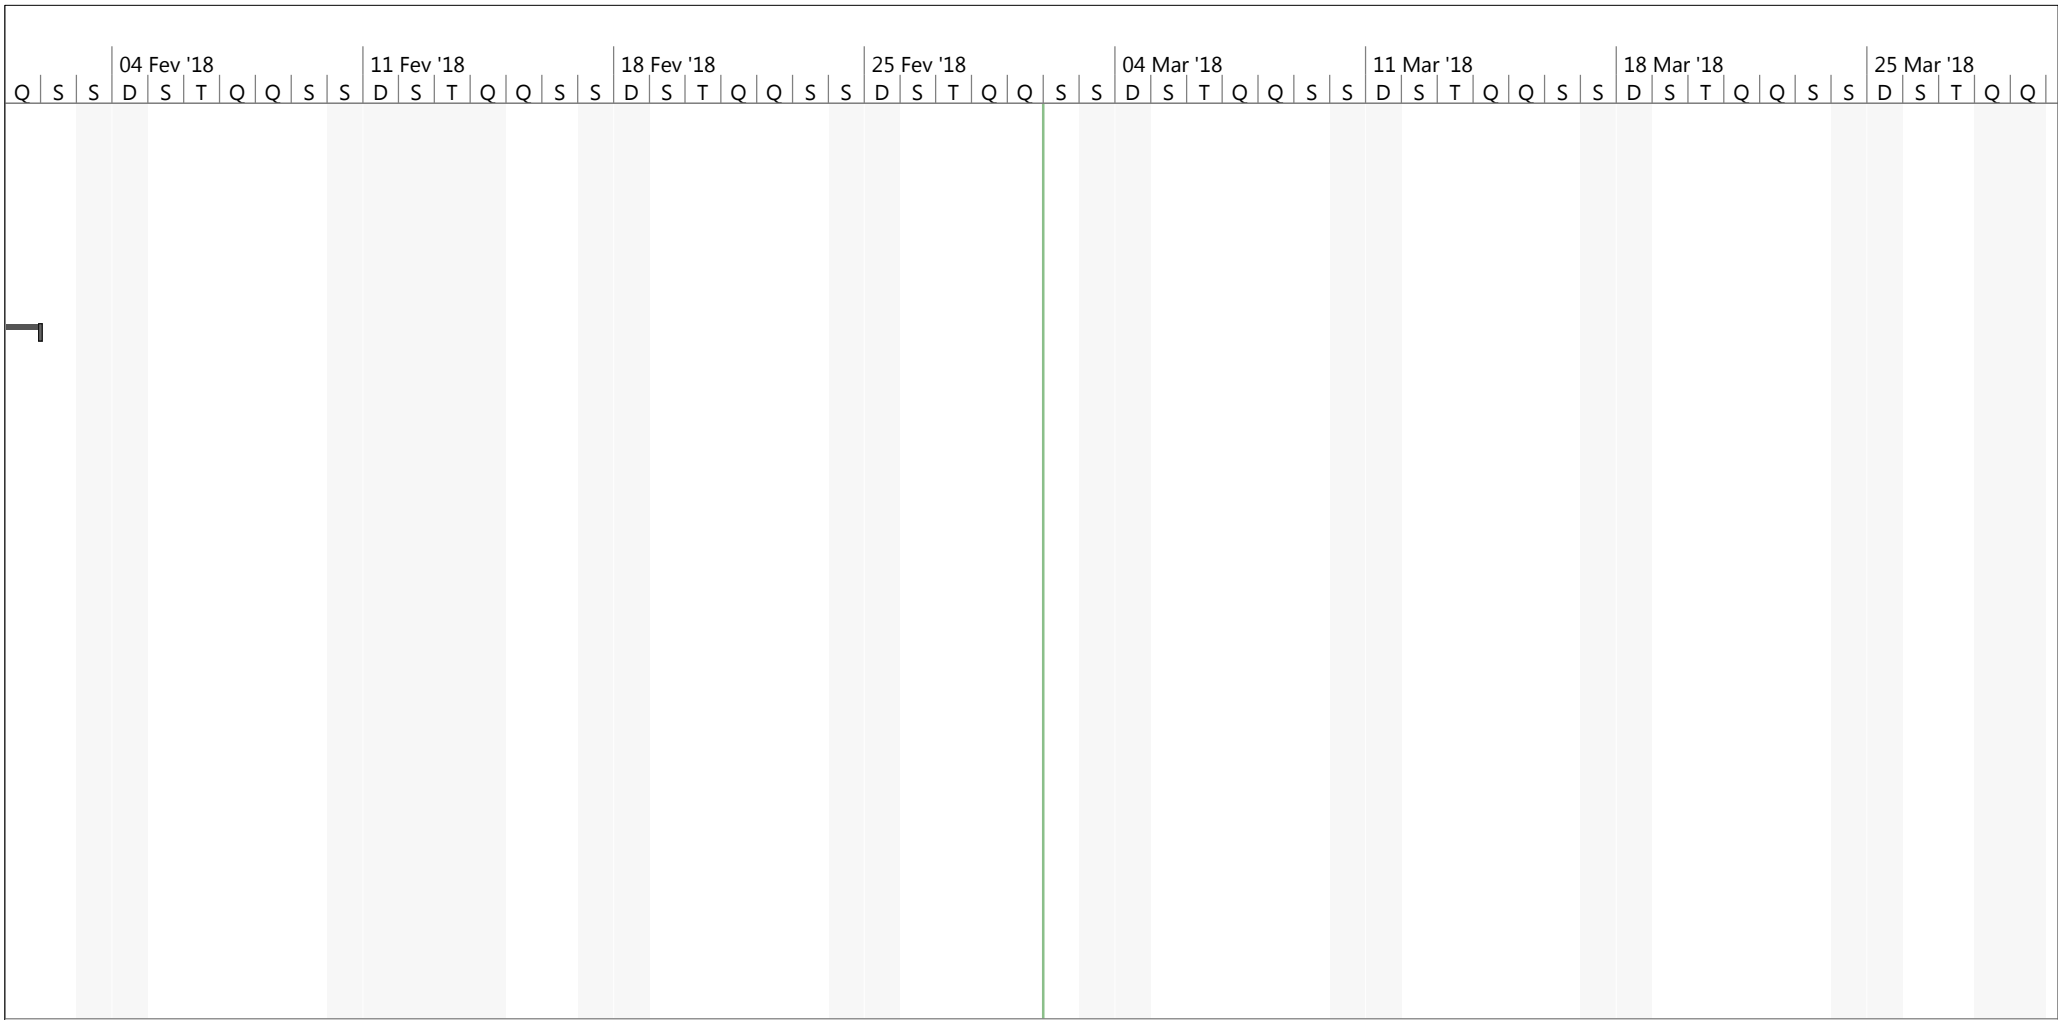


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

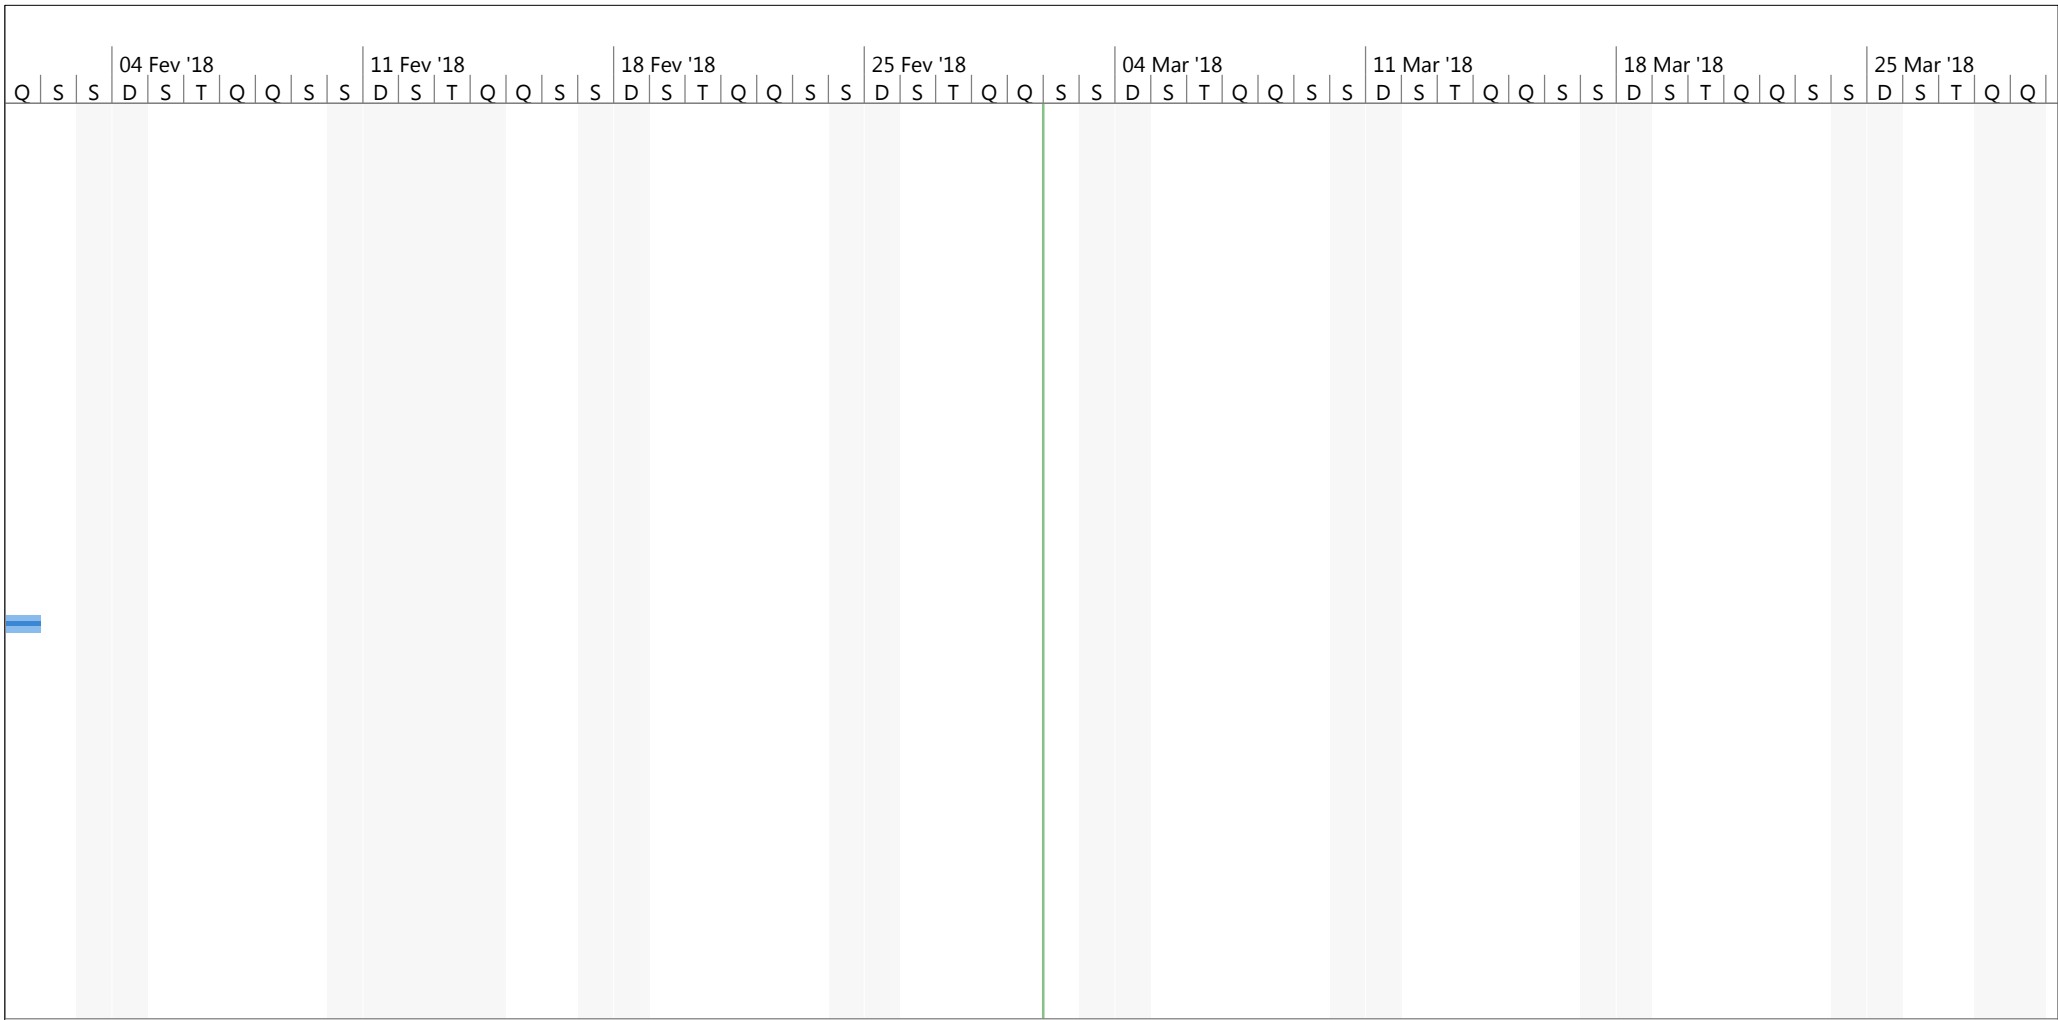


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

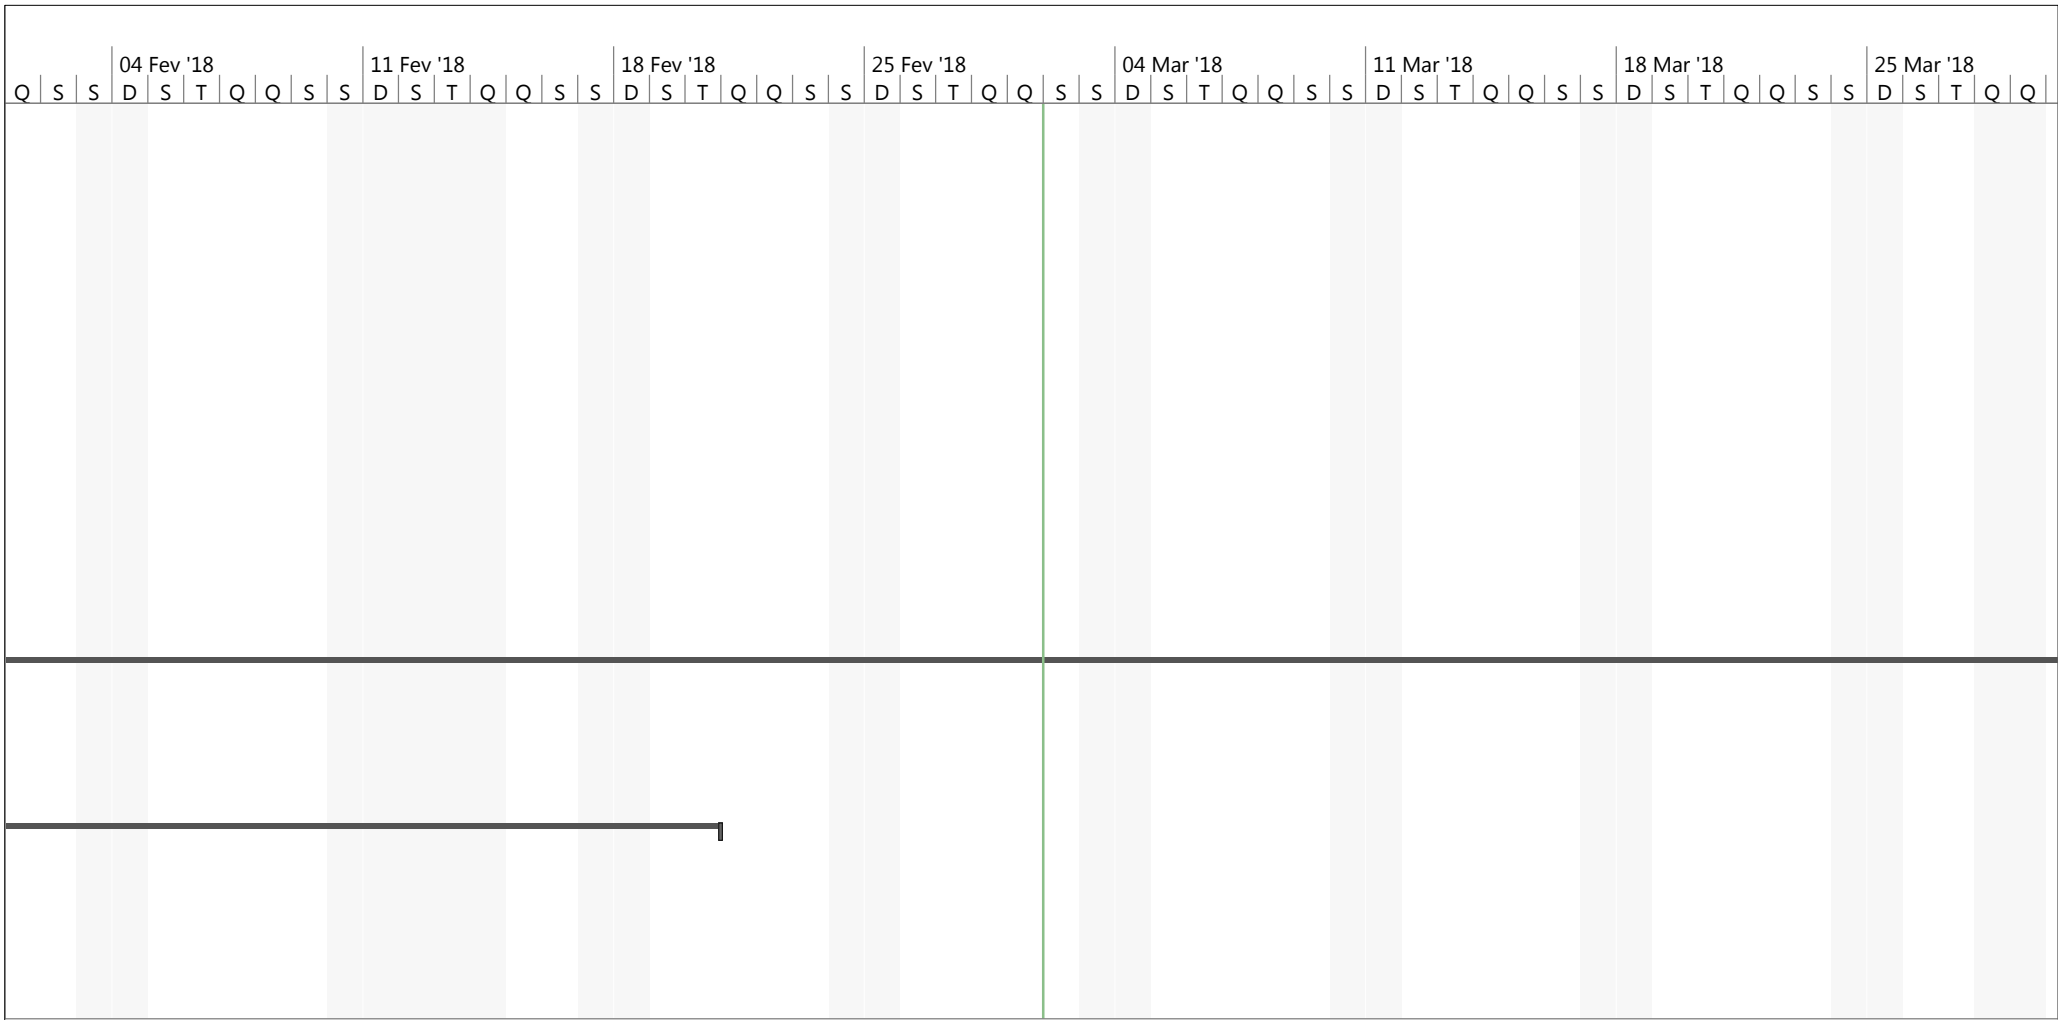


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

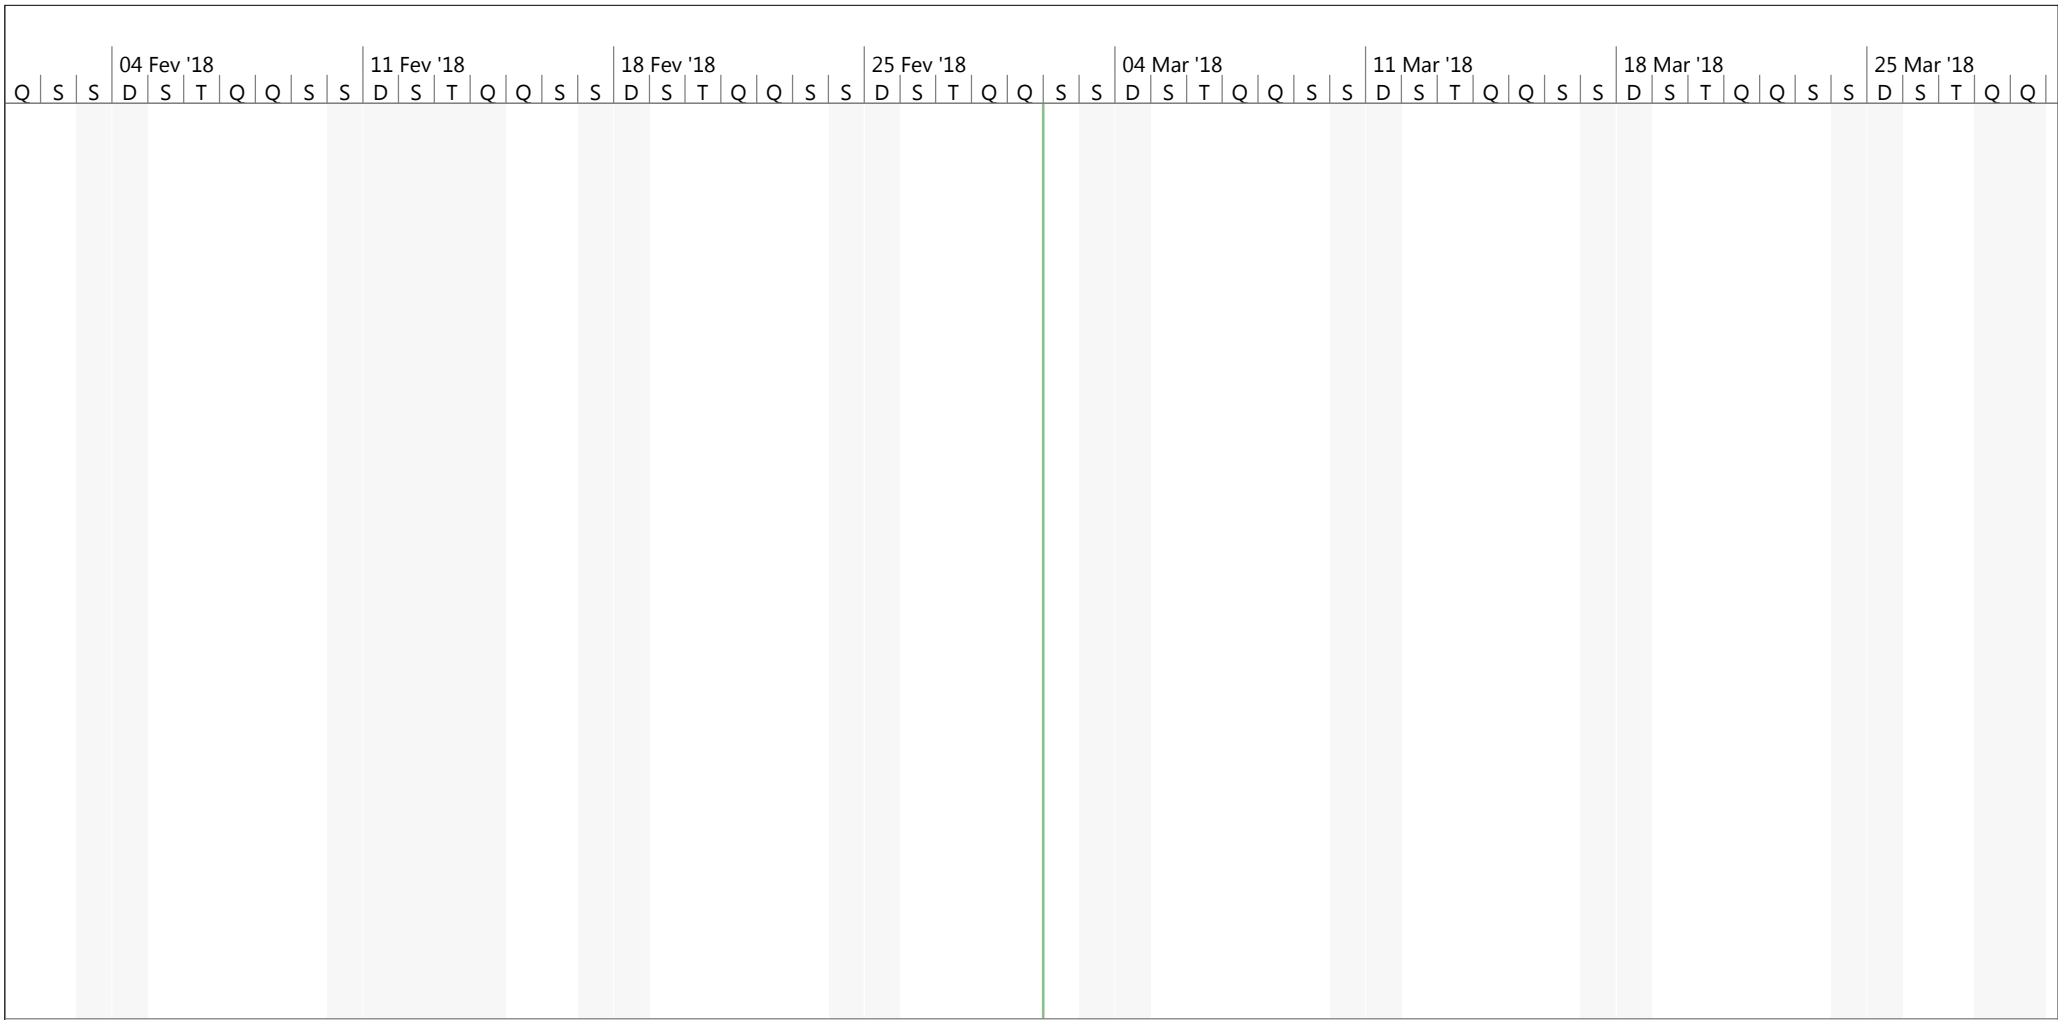


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

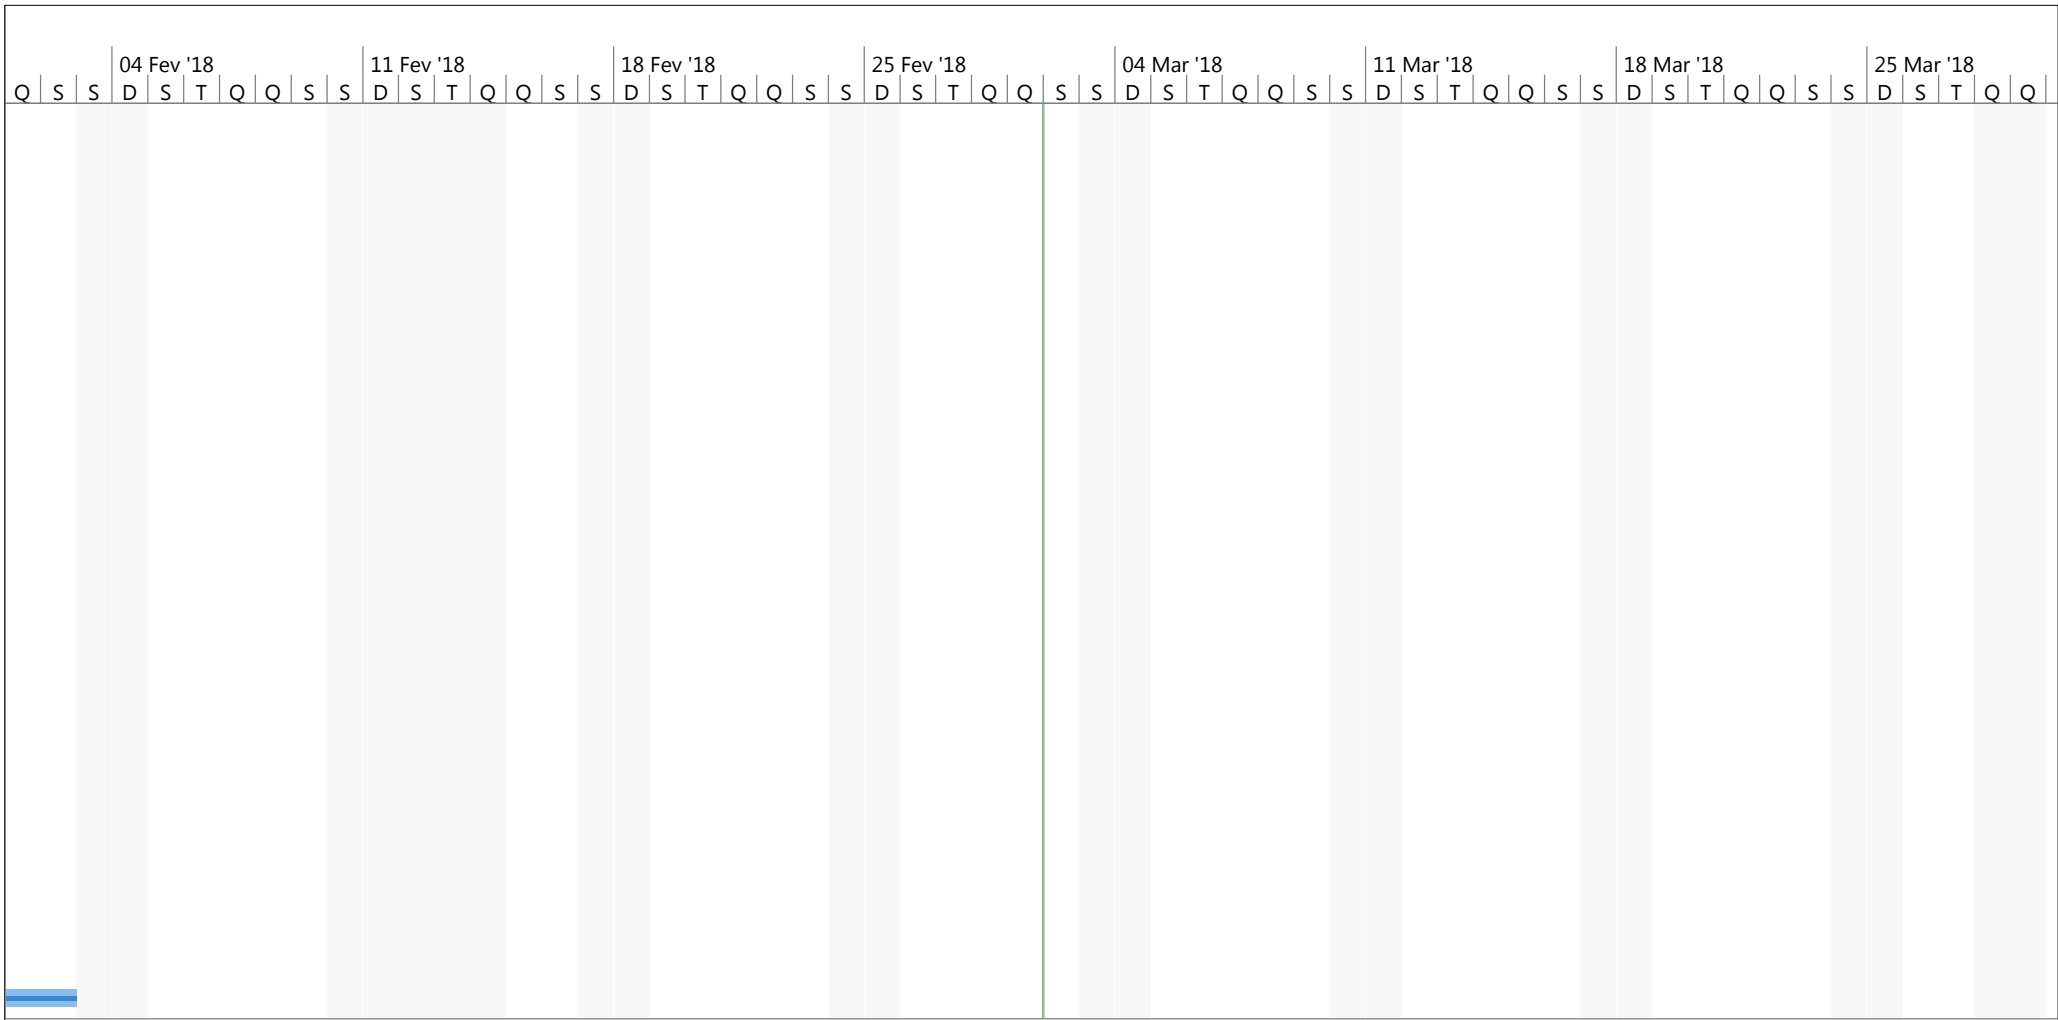


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

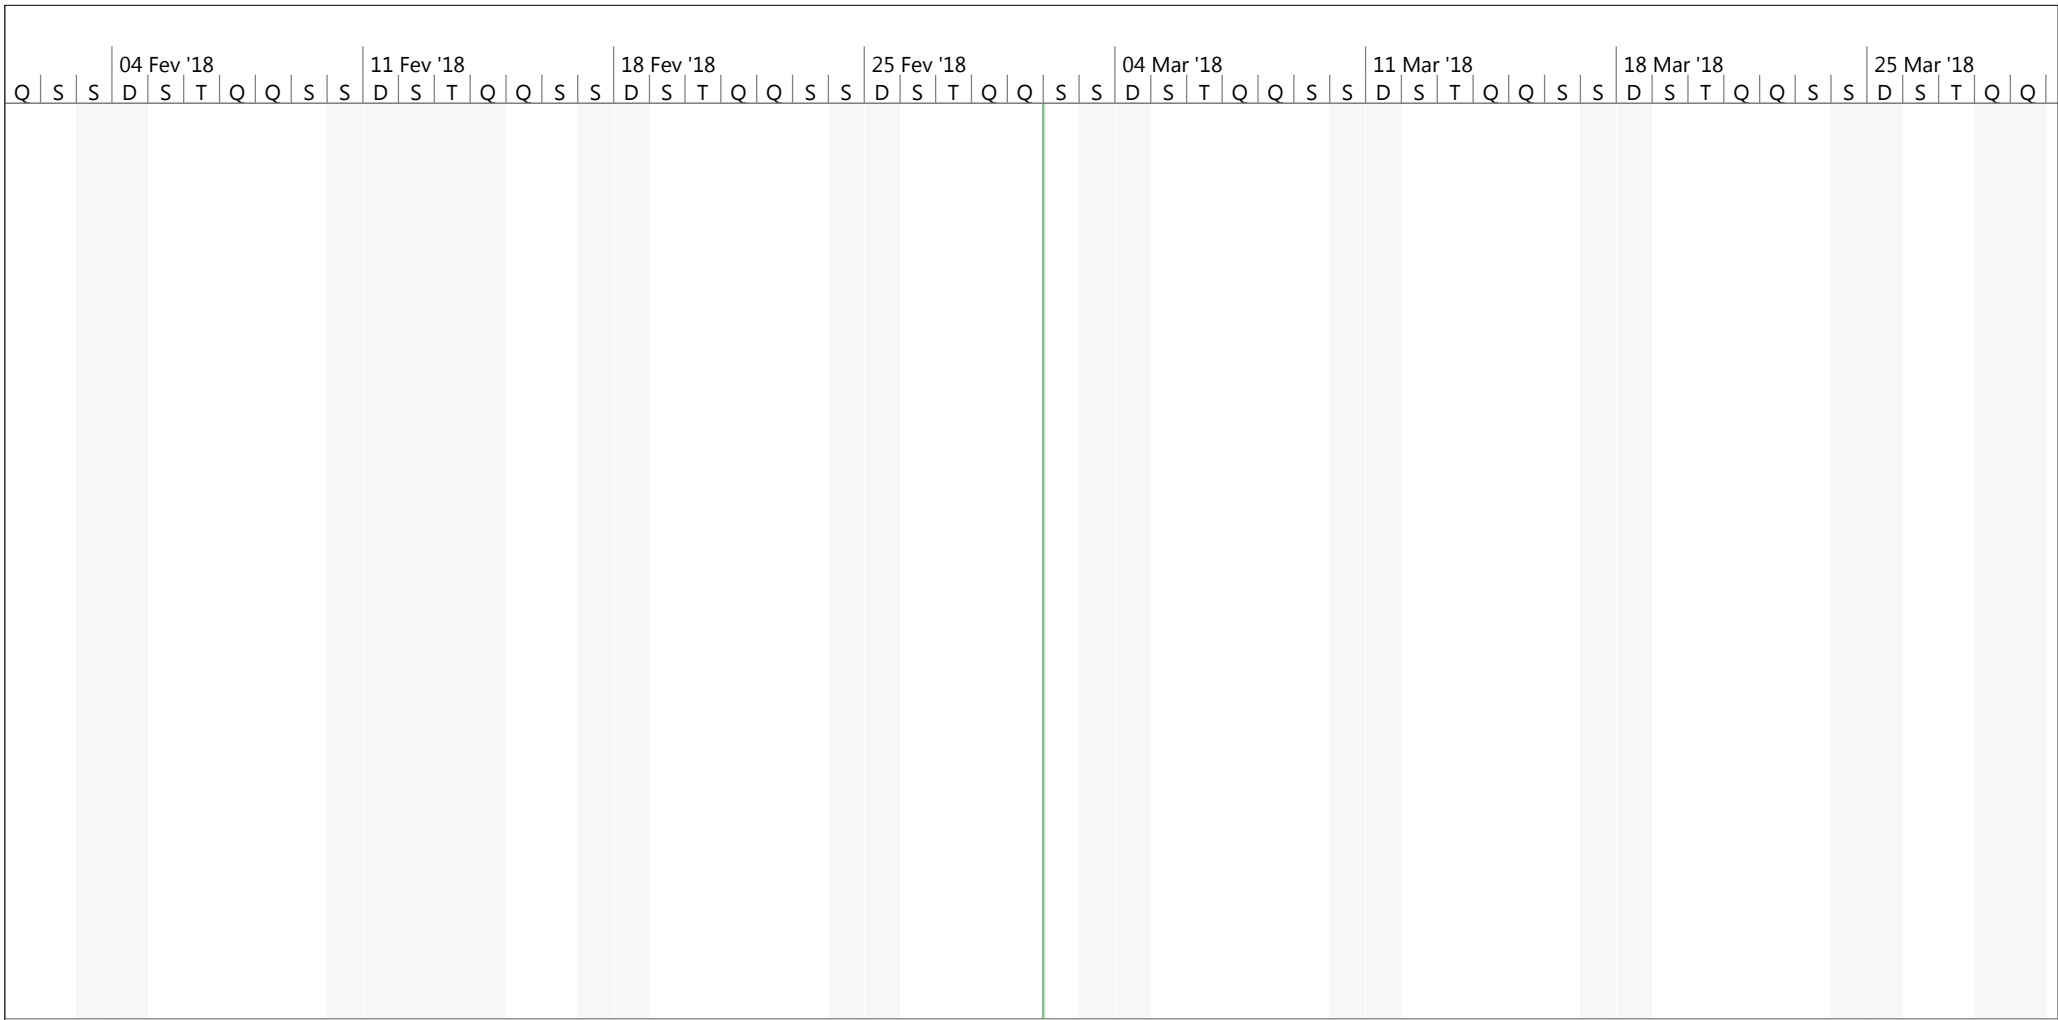


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

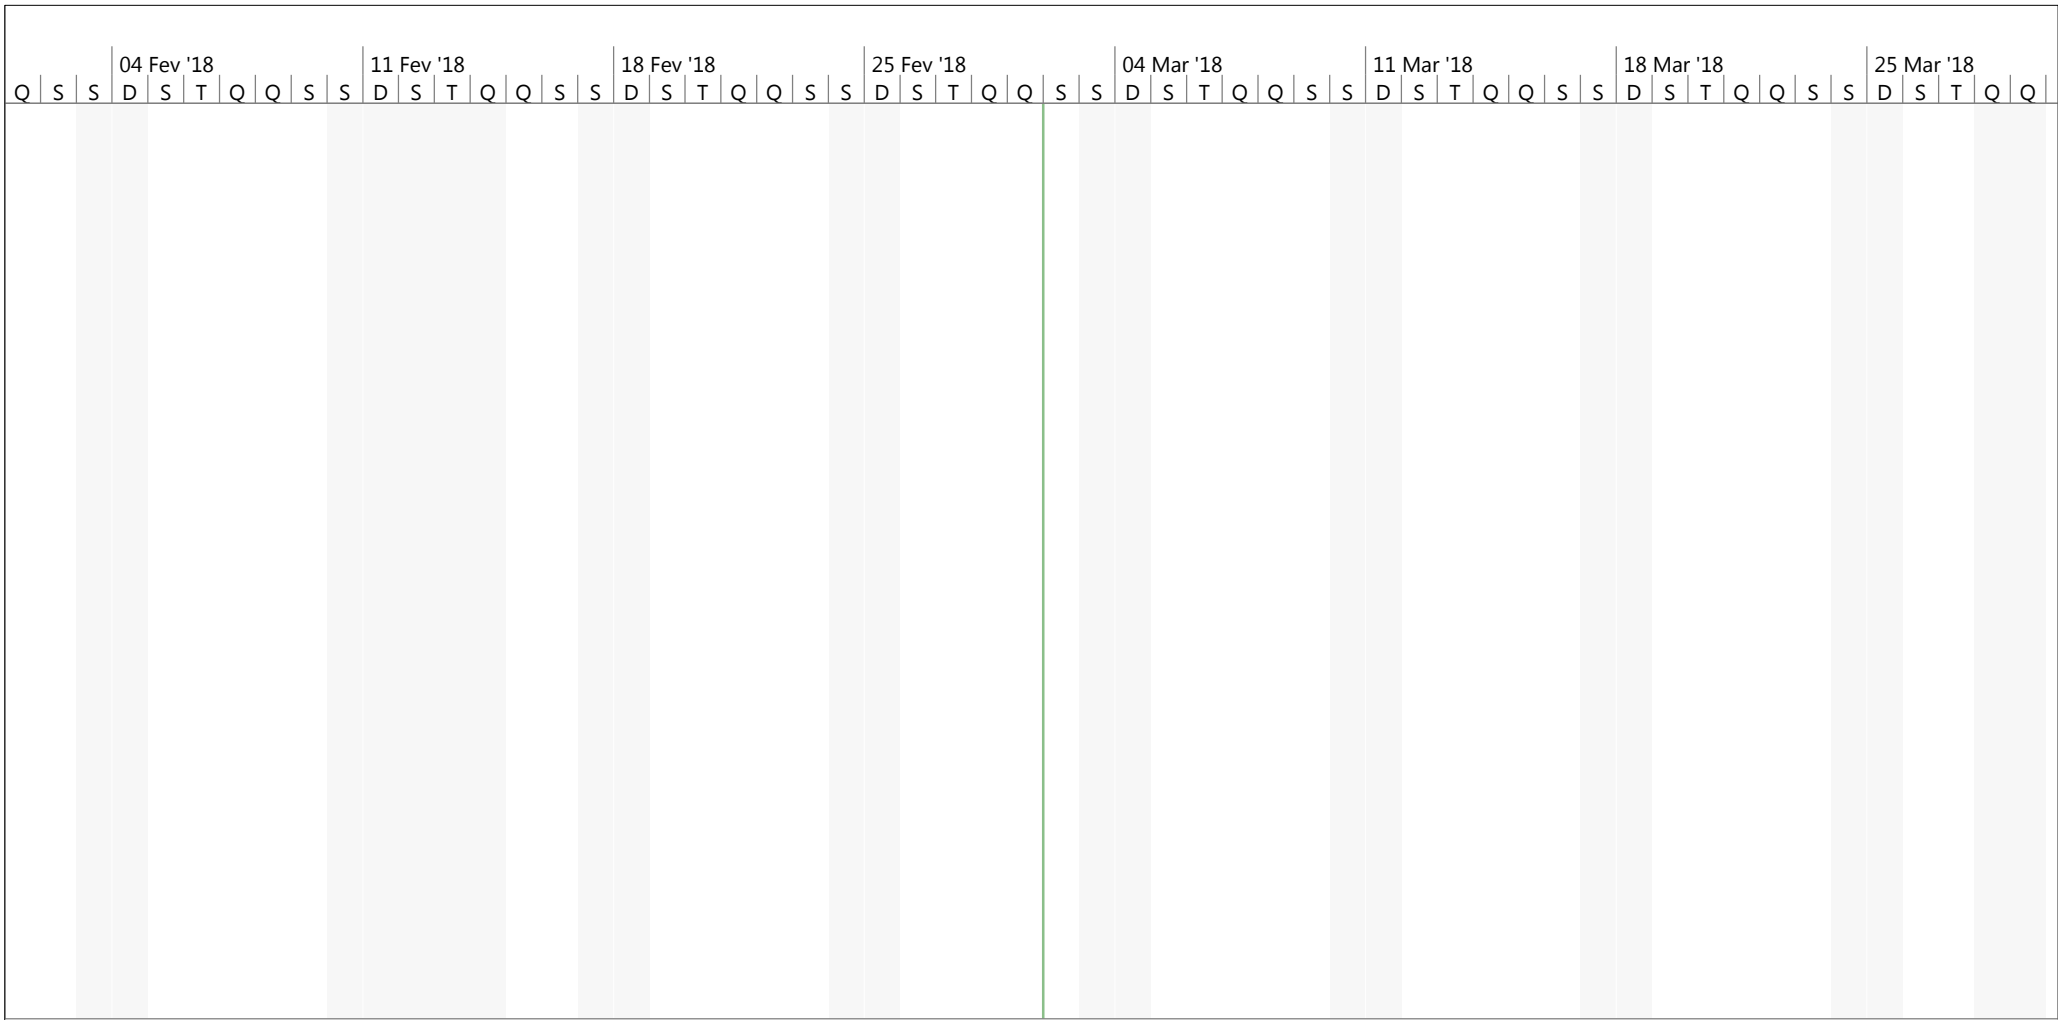


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

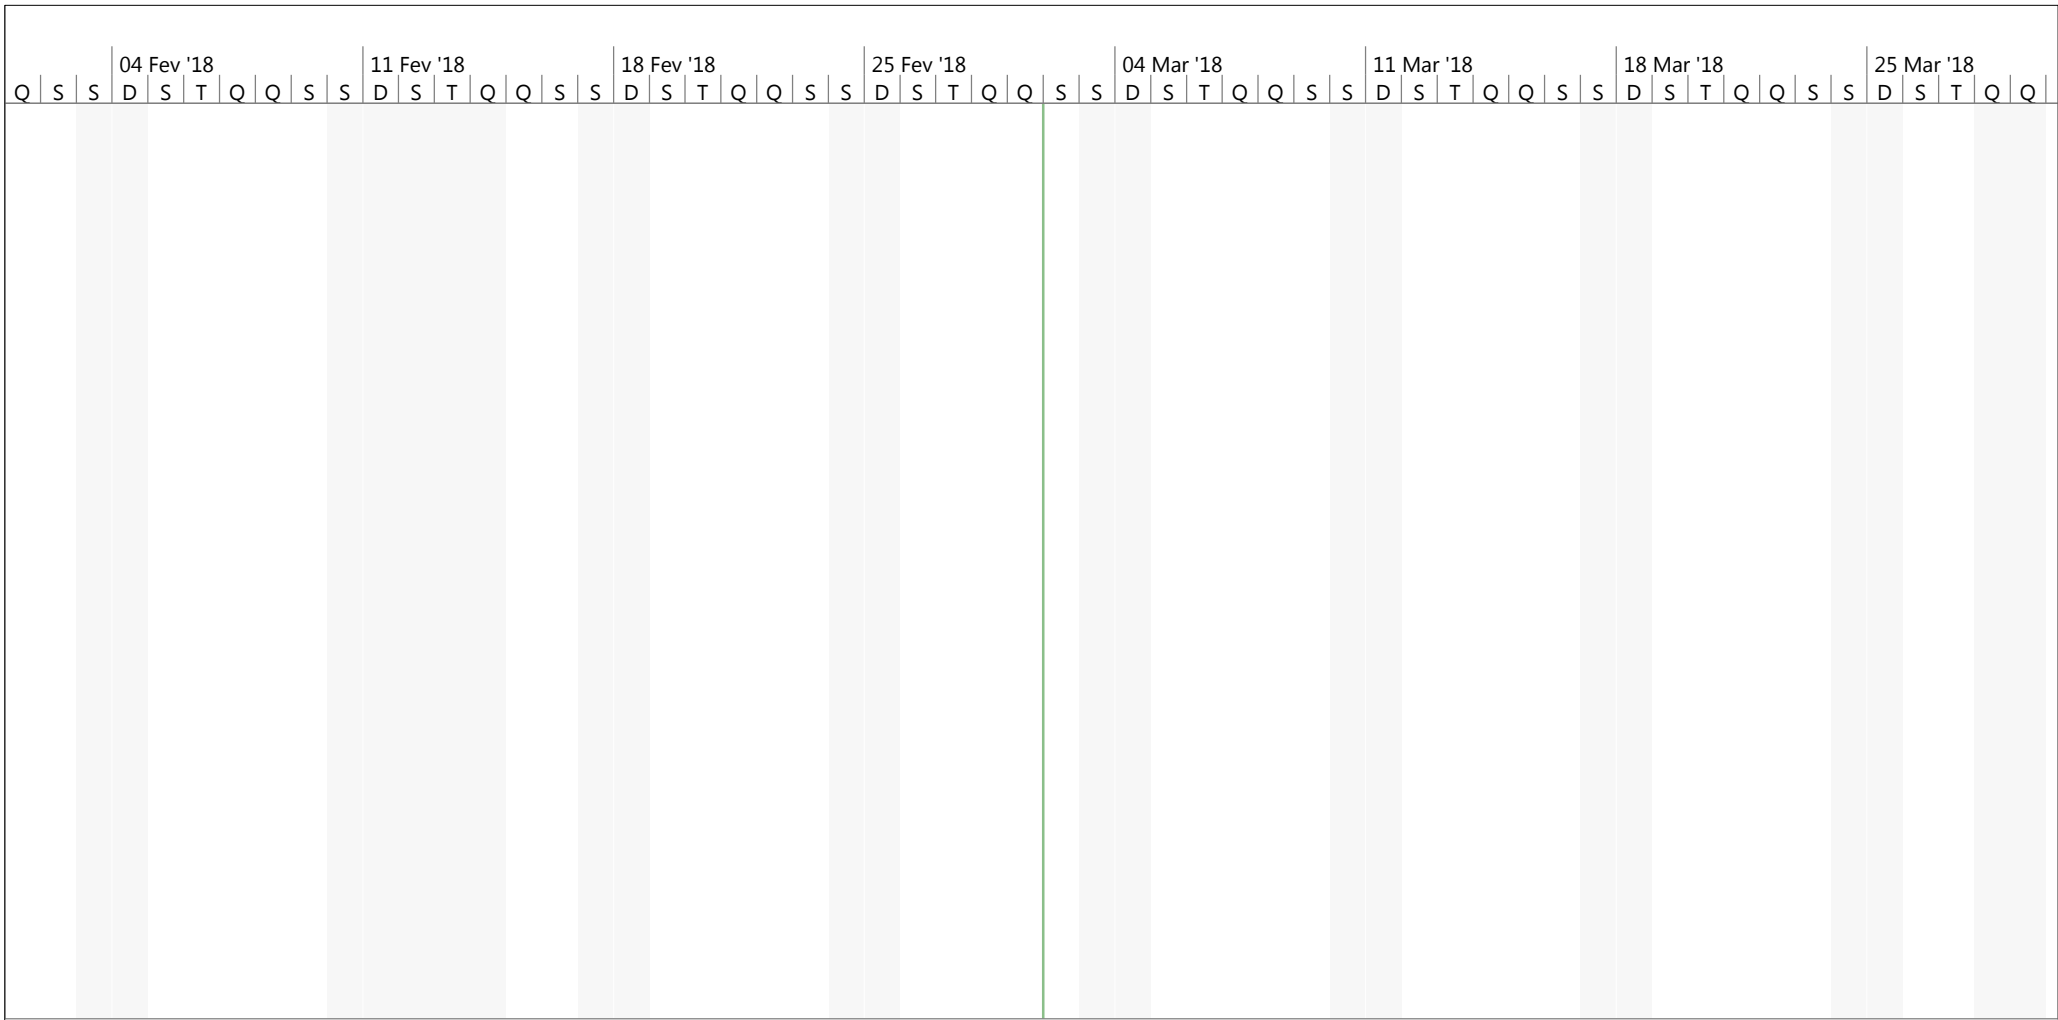


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

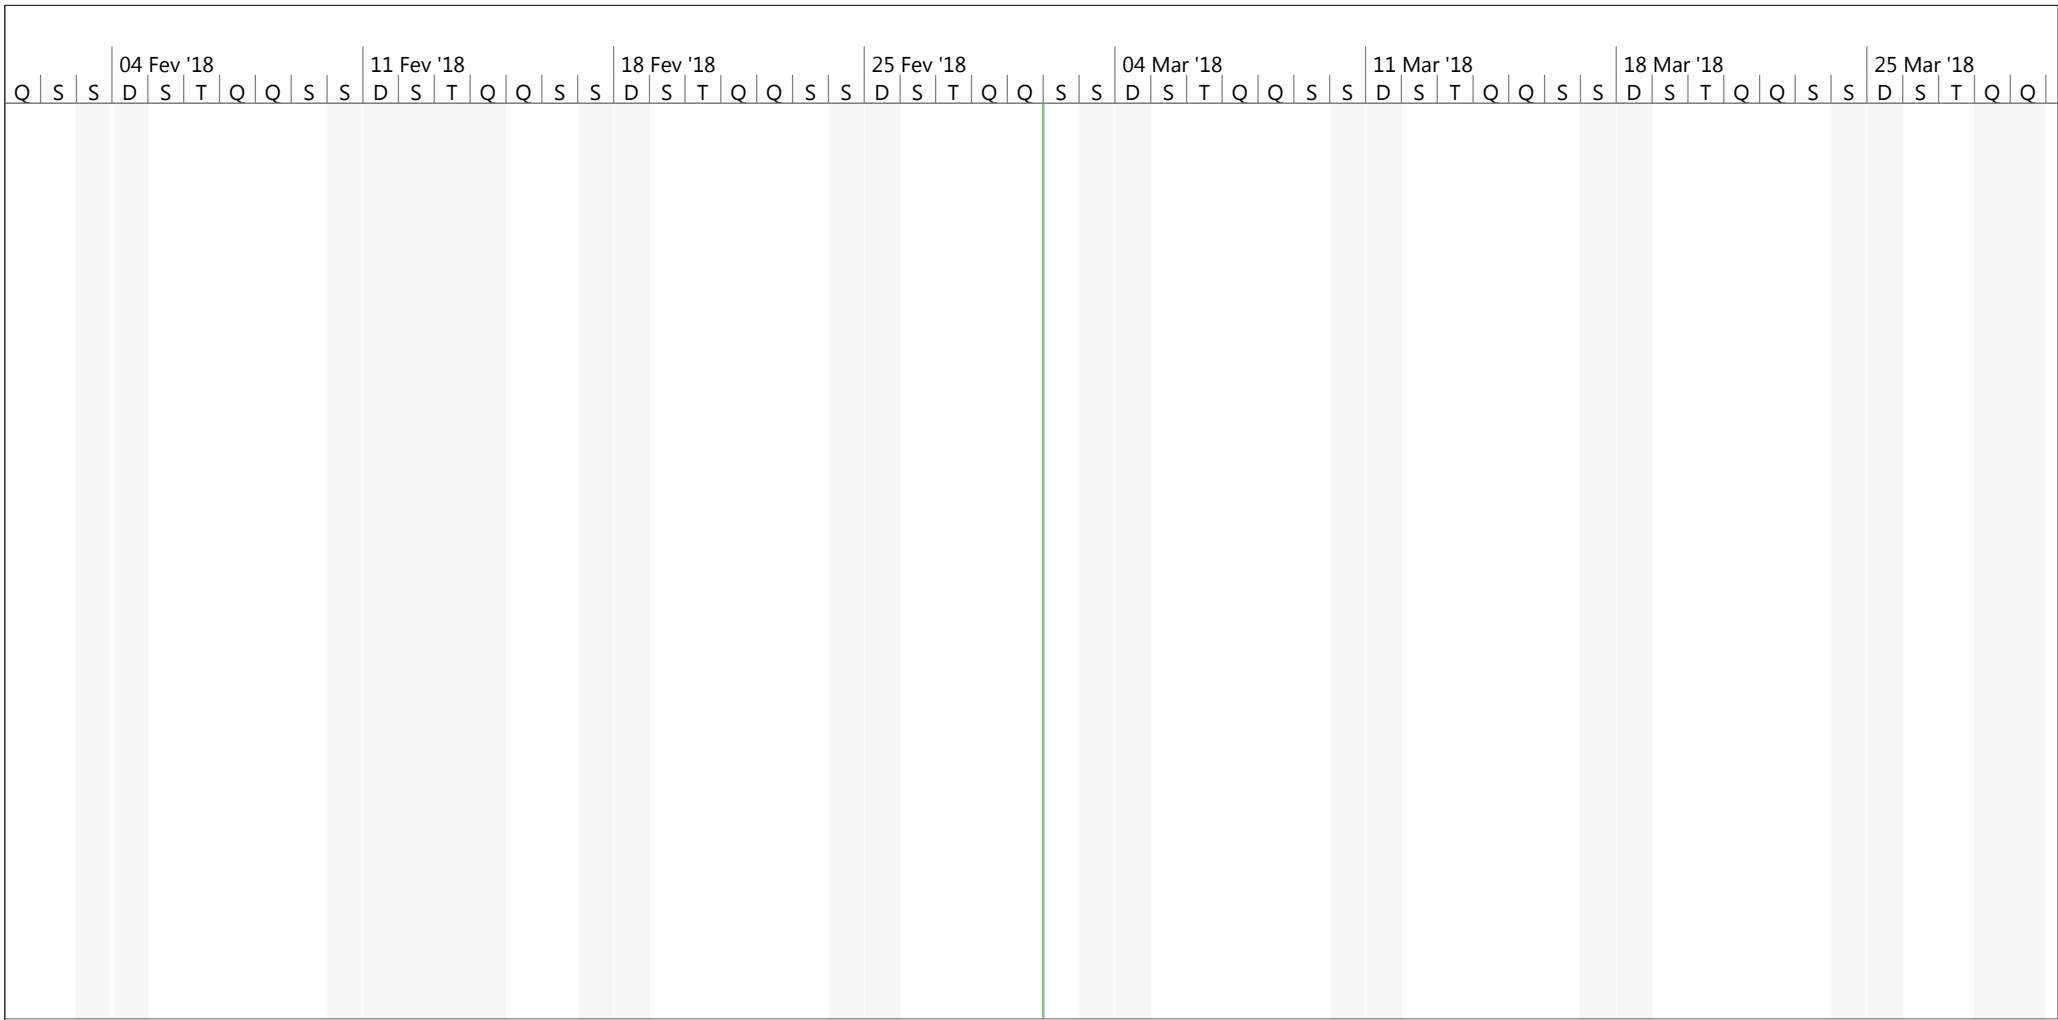


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

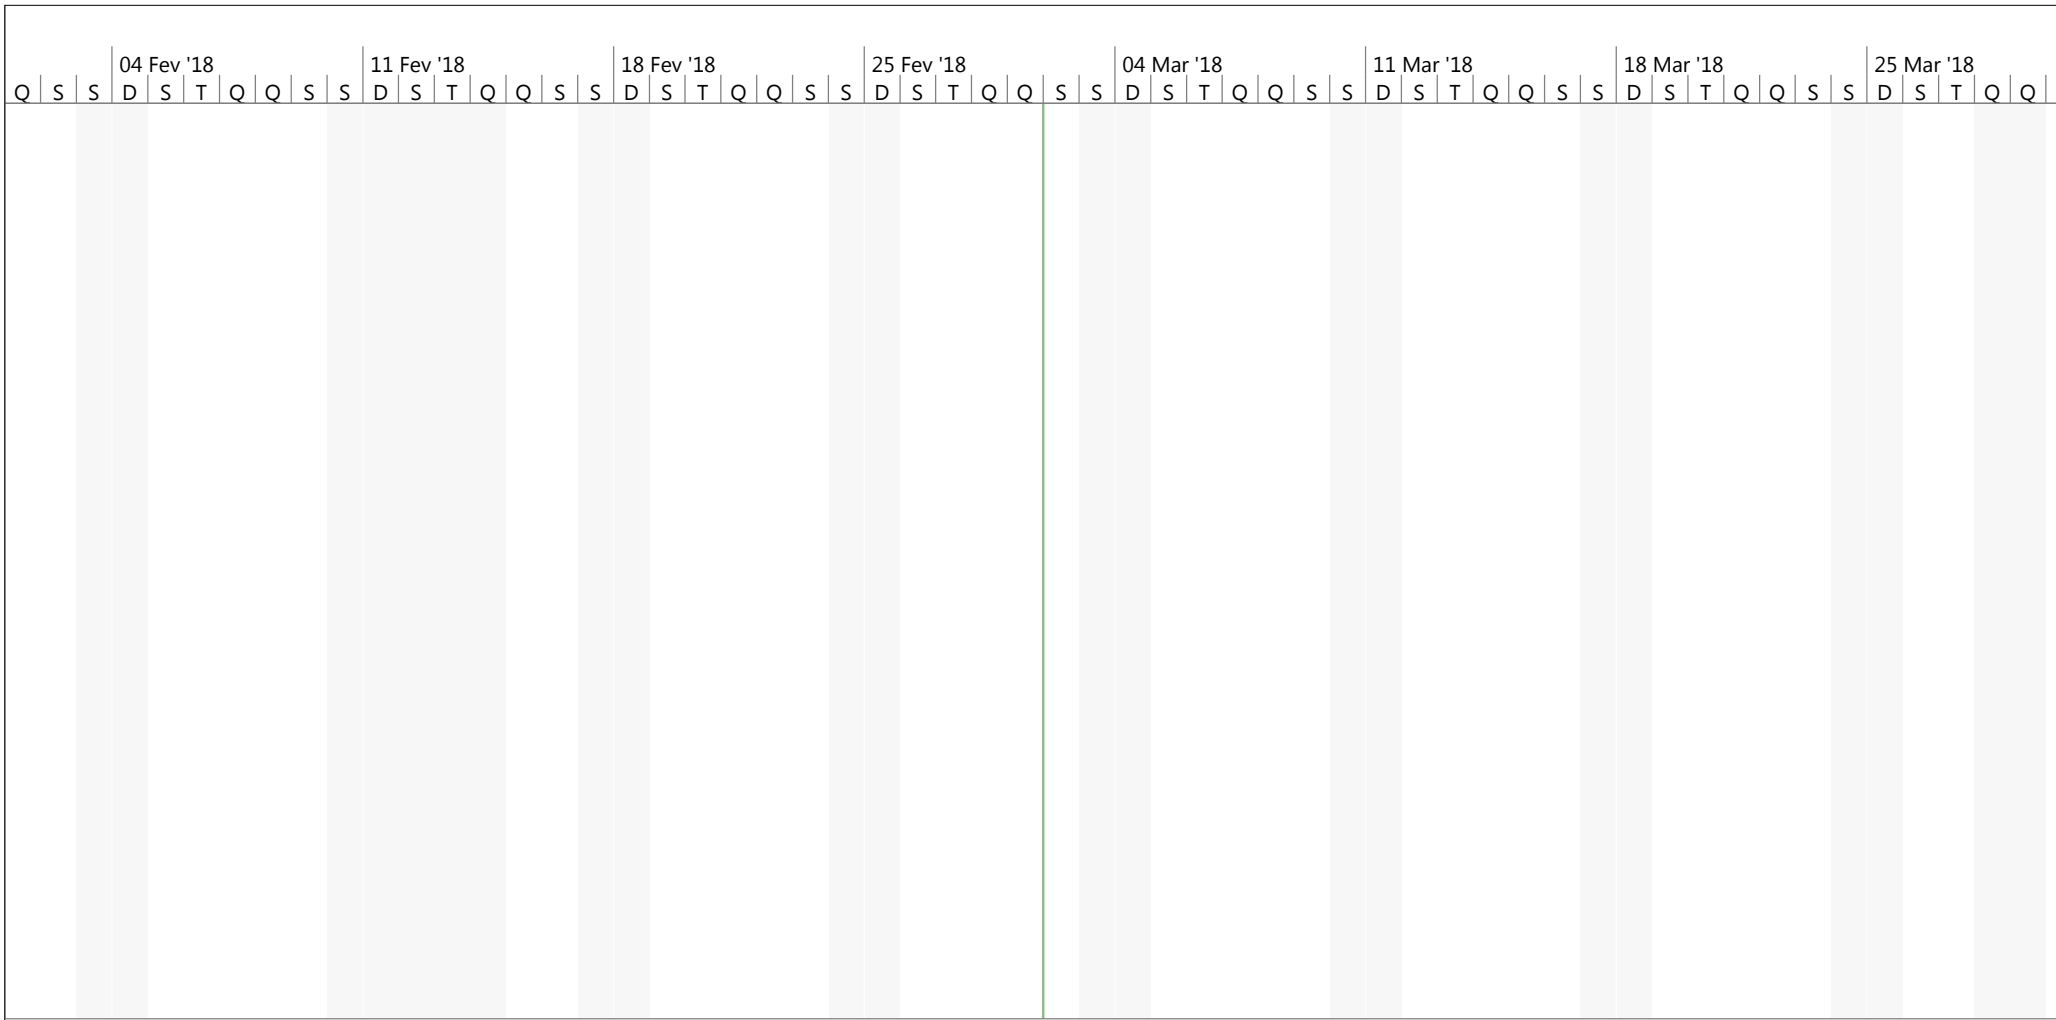


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

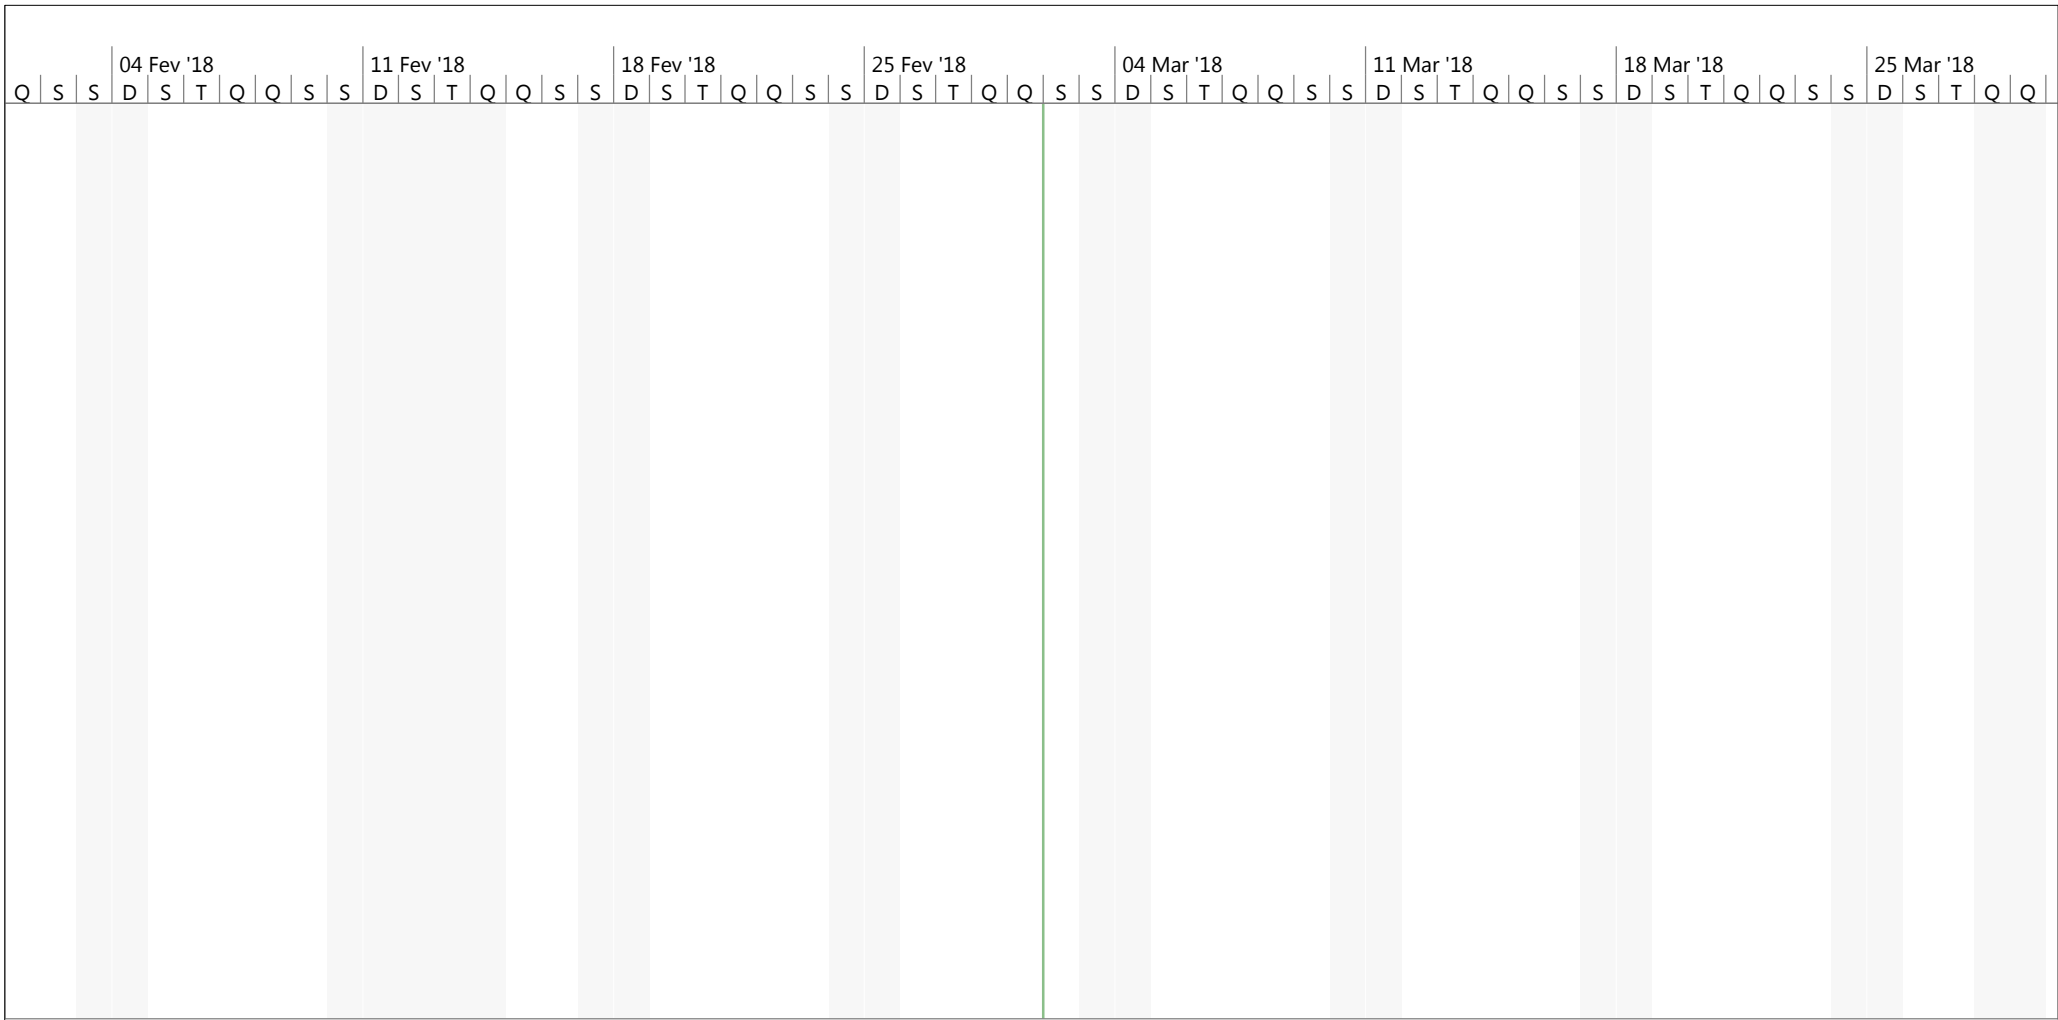


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

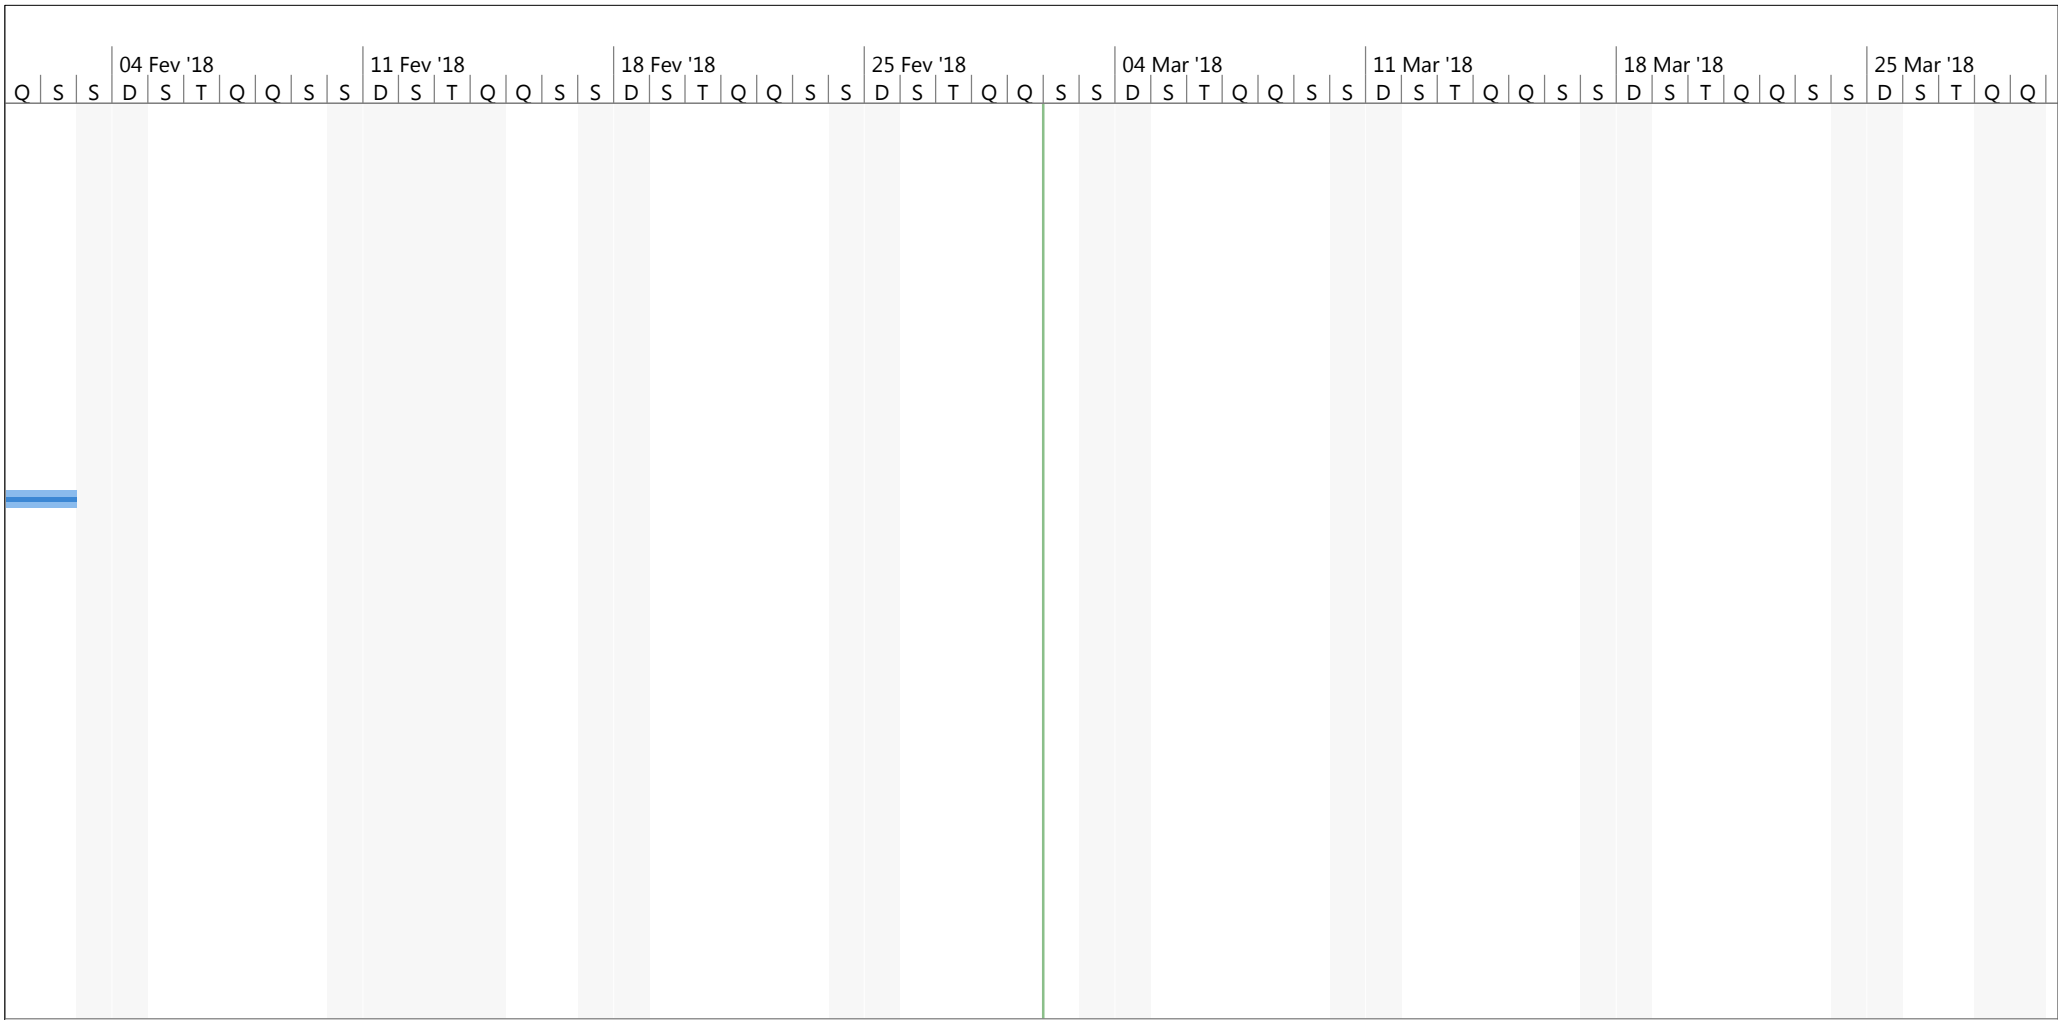


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

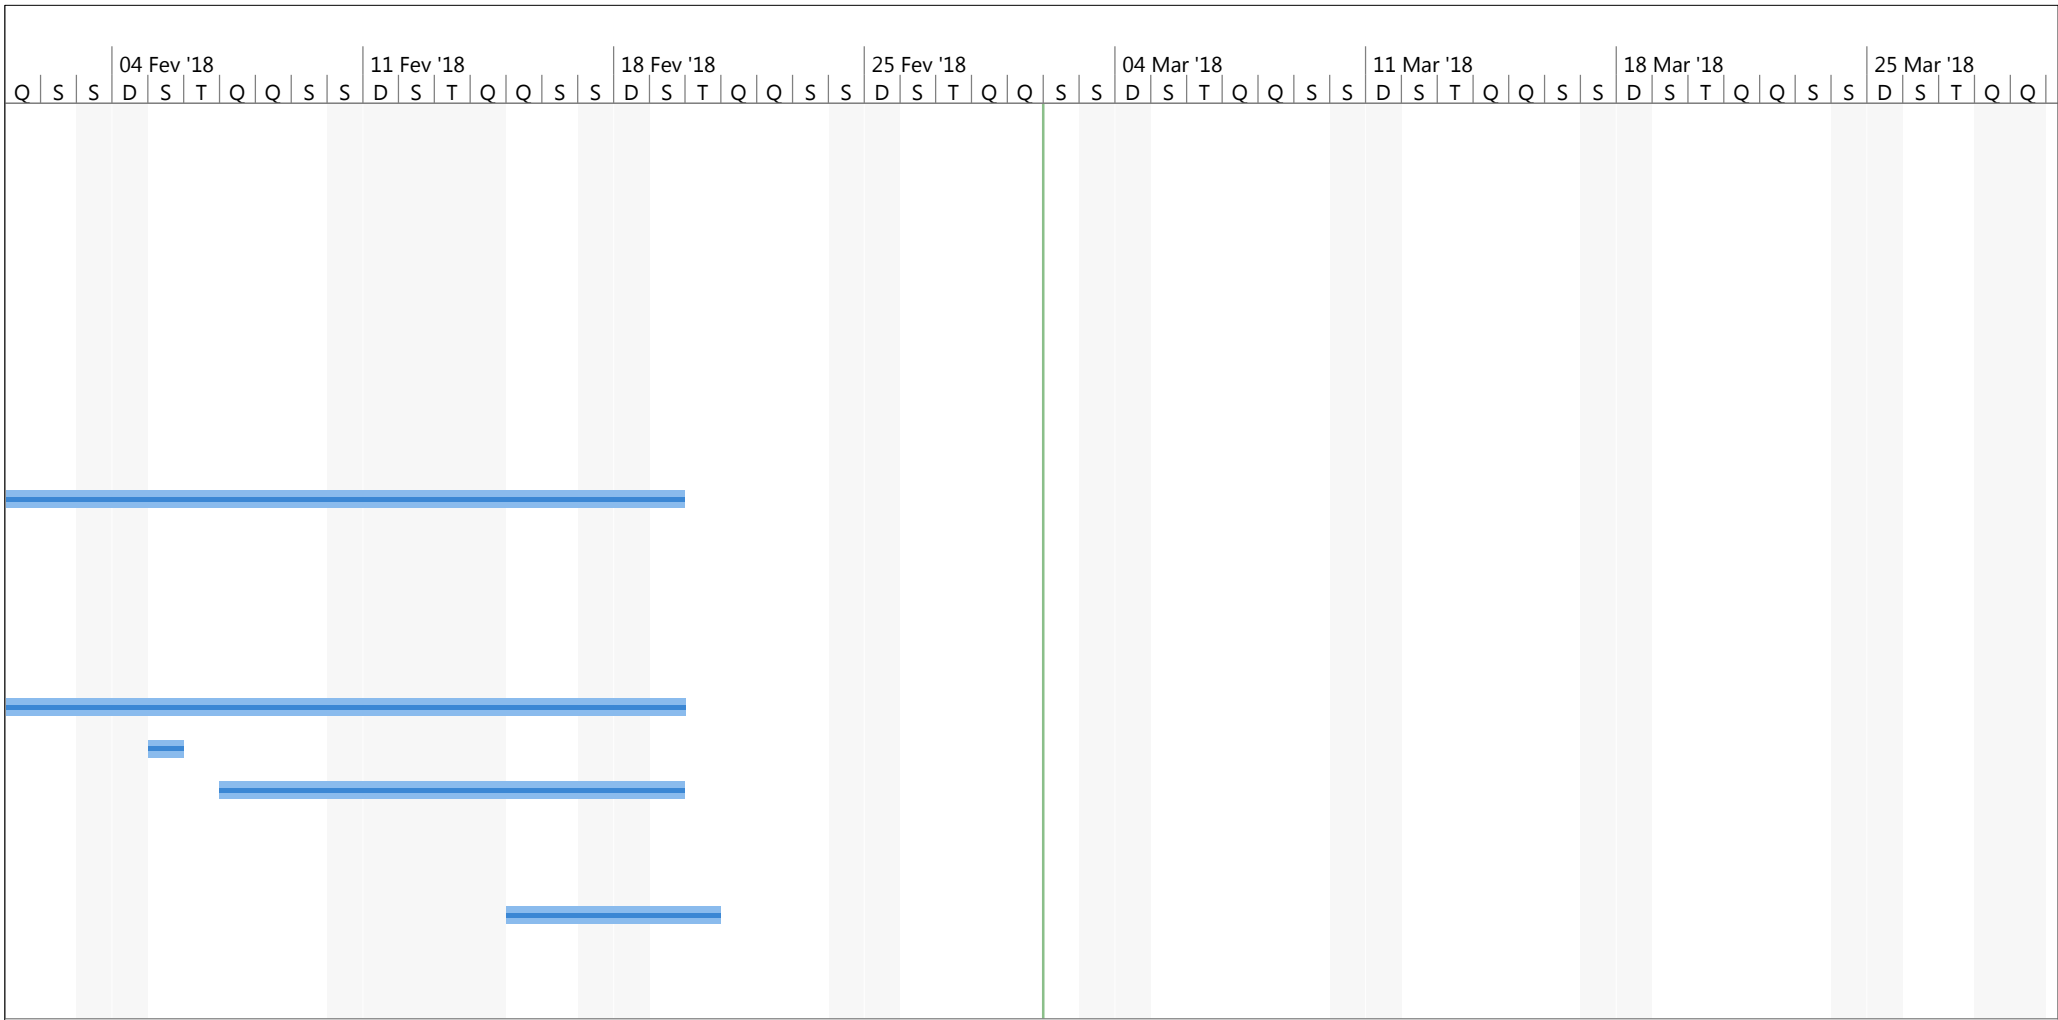


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

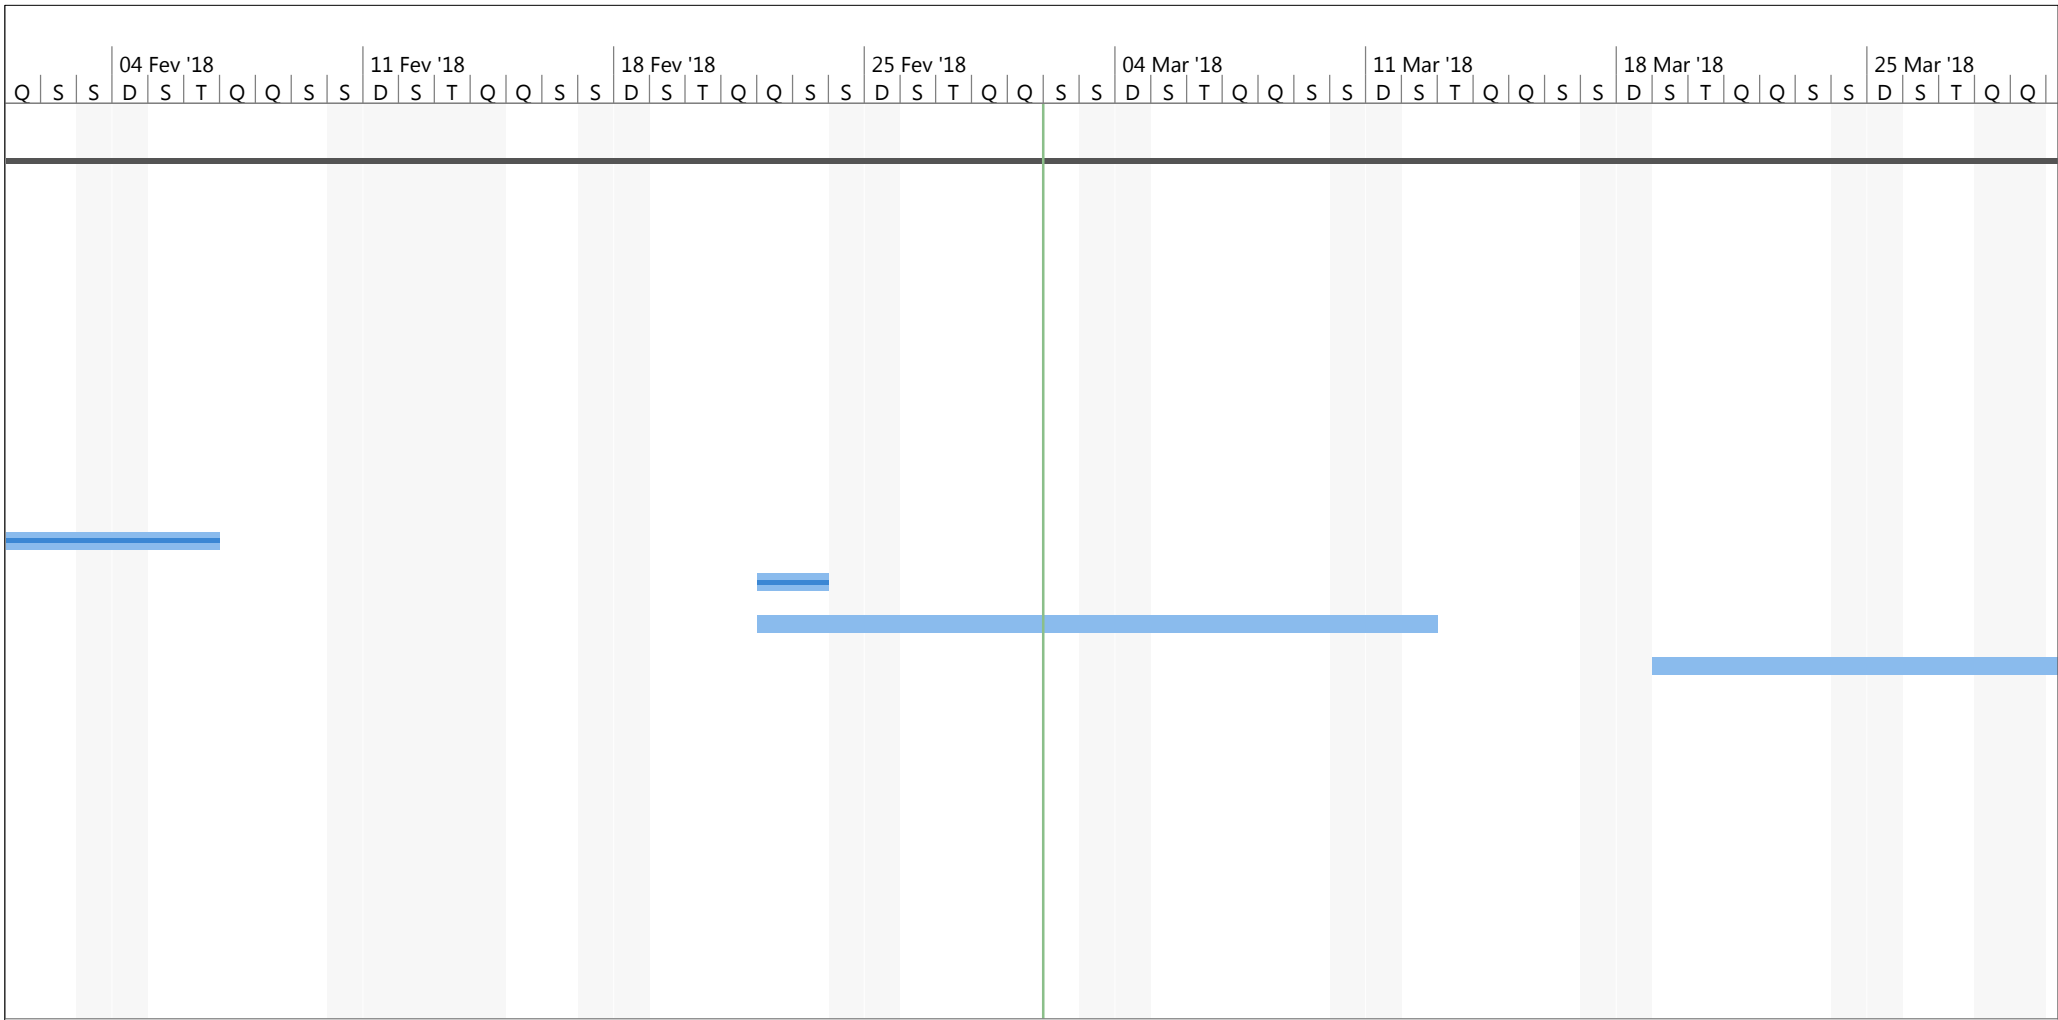


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término				

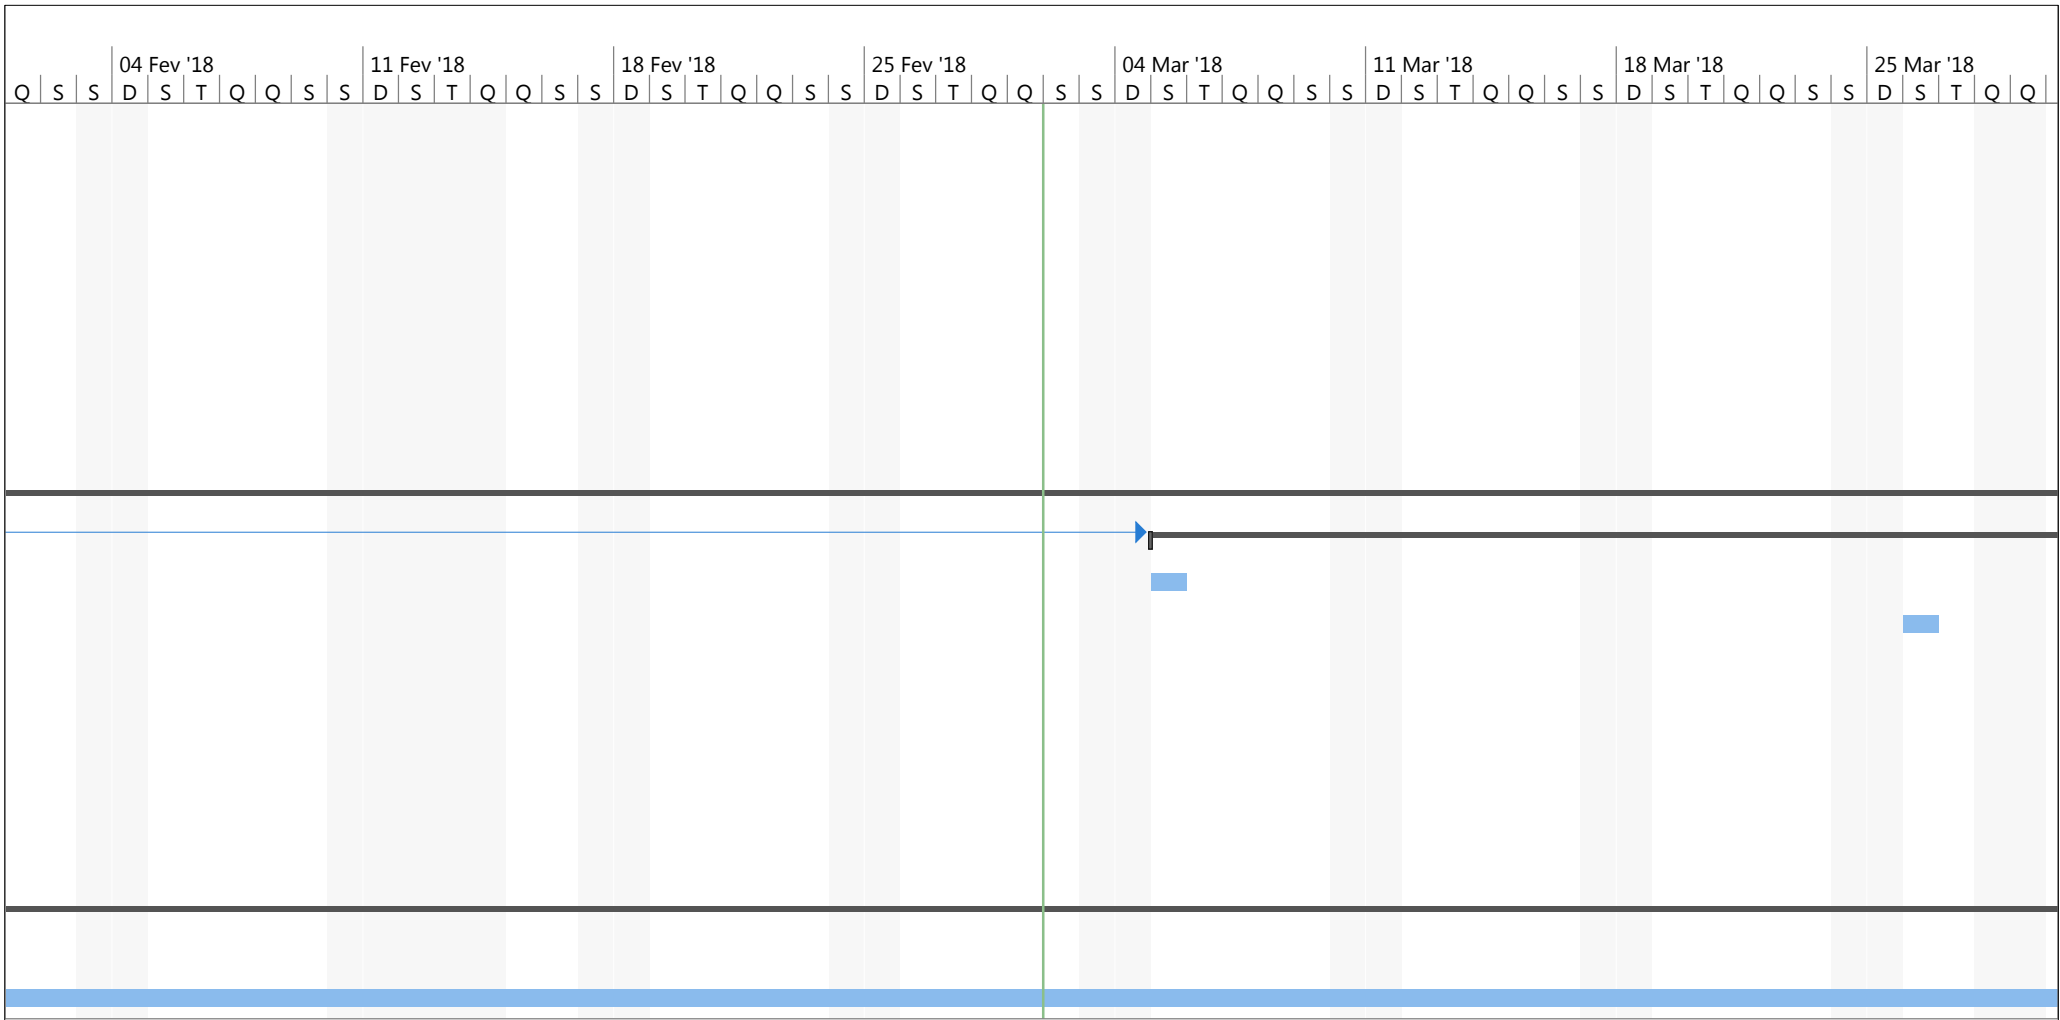


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

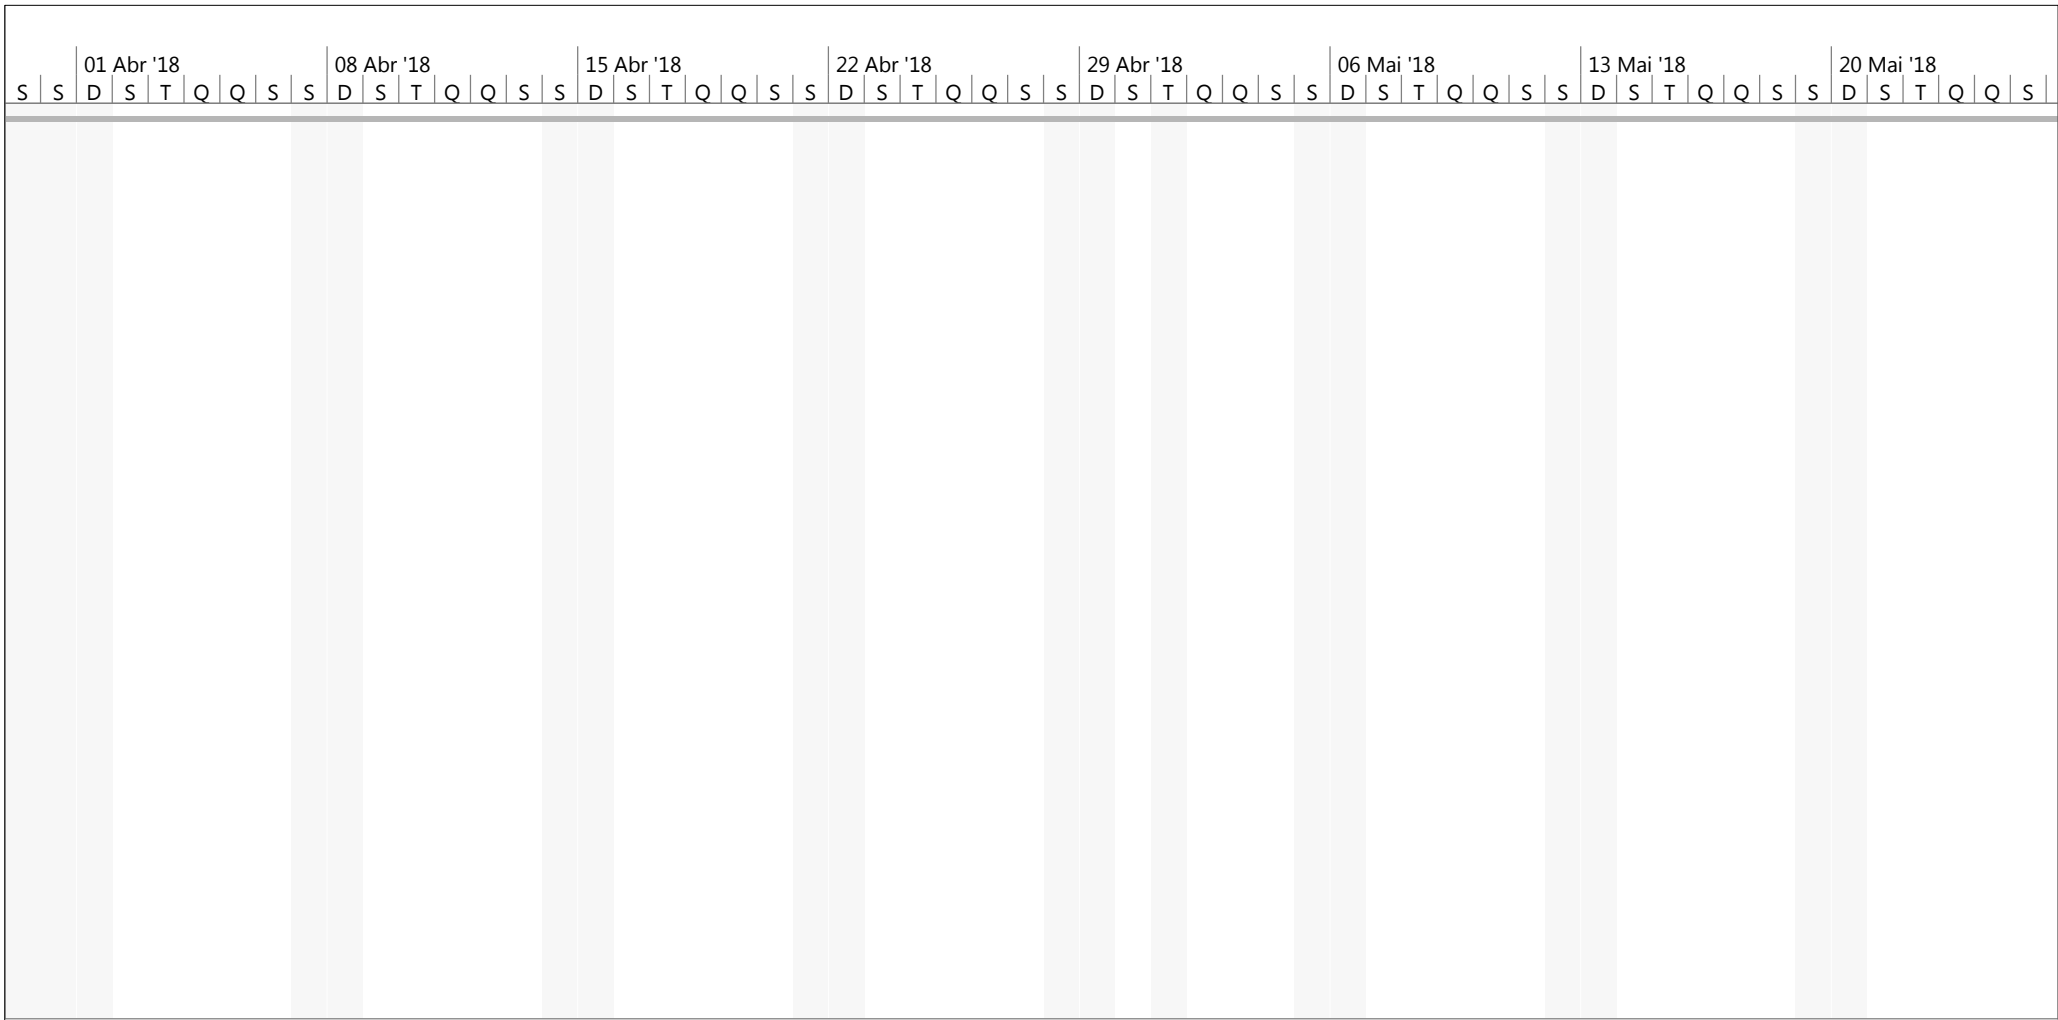


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

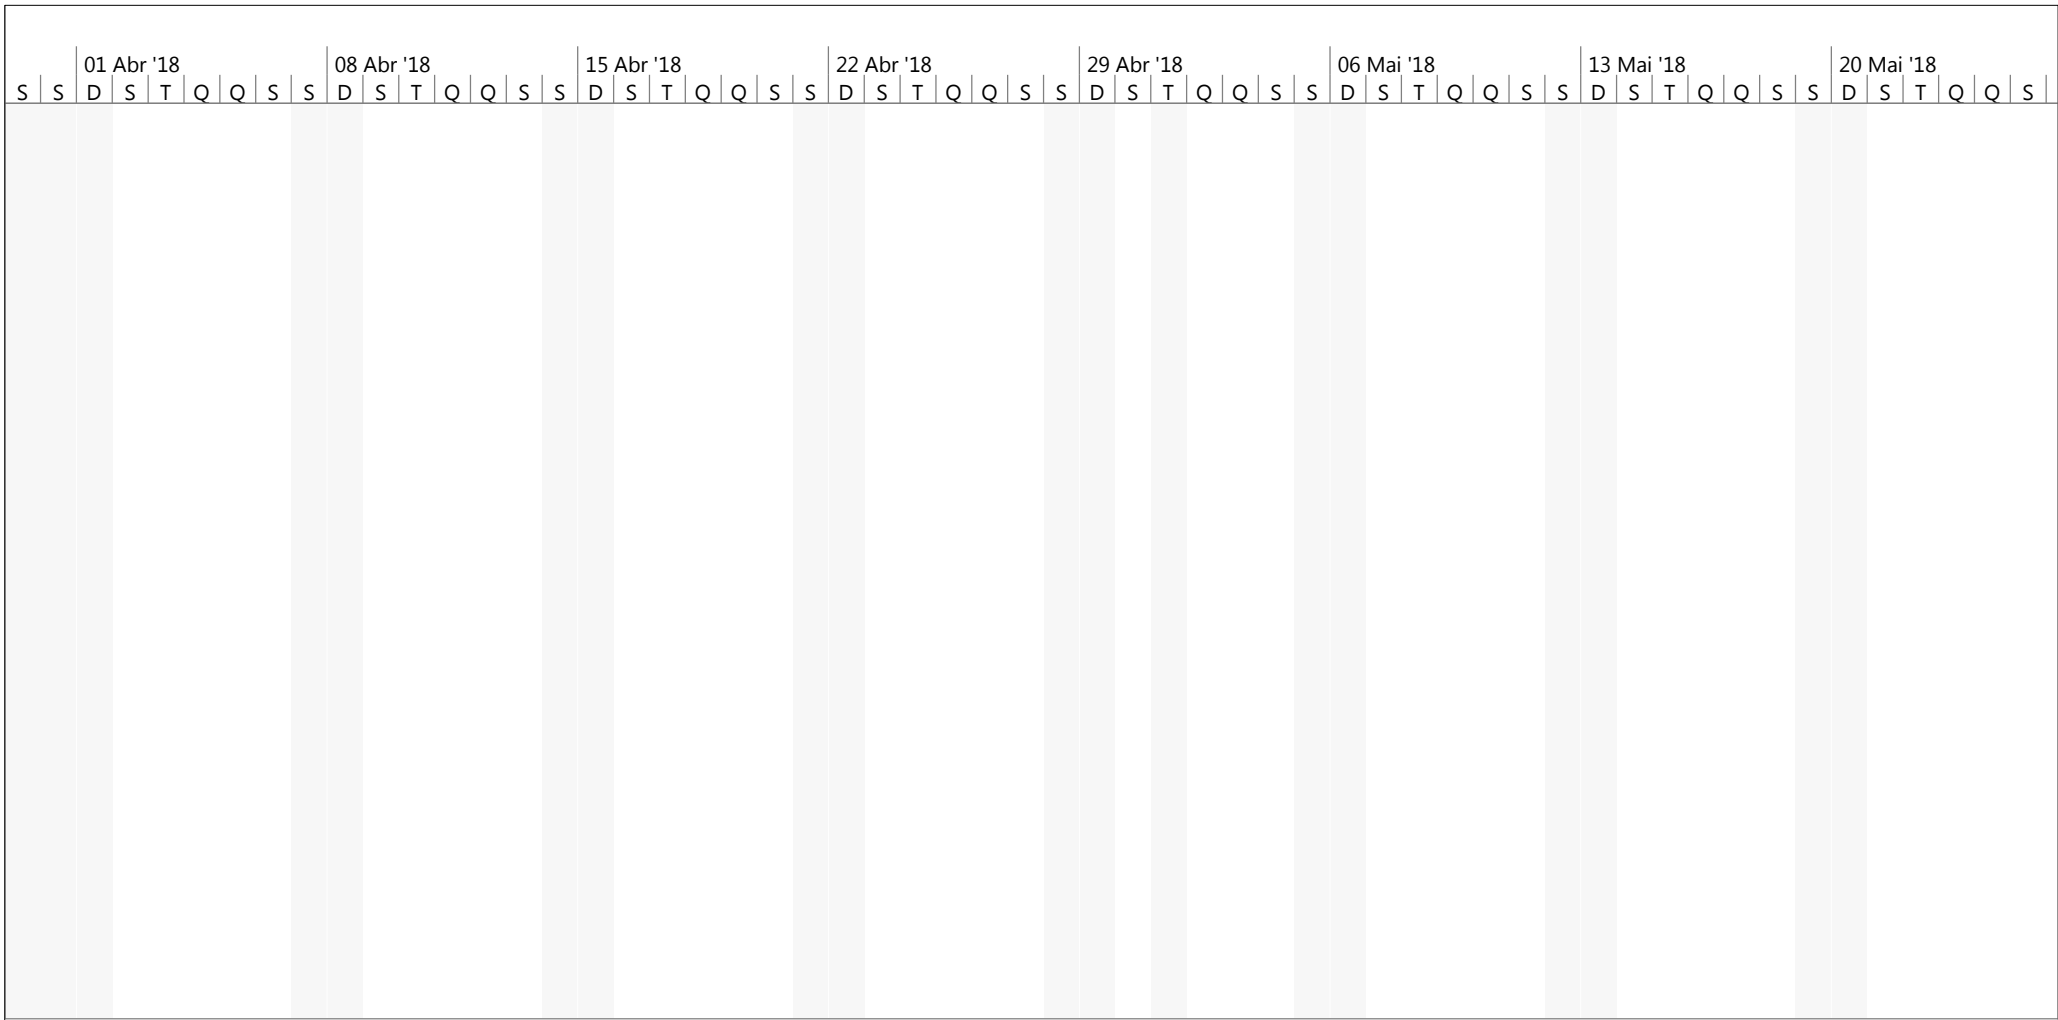


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

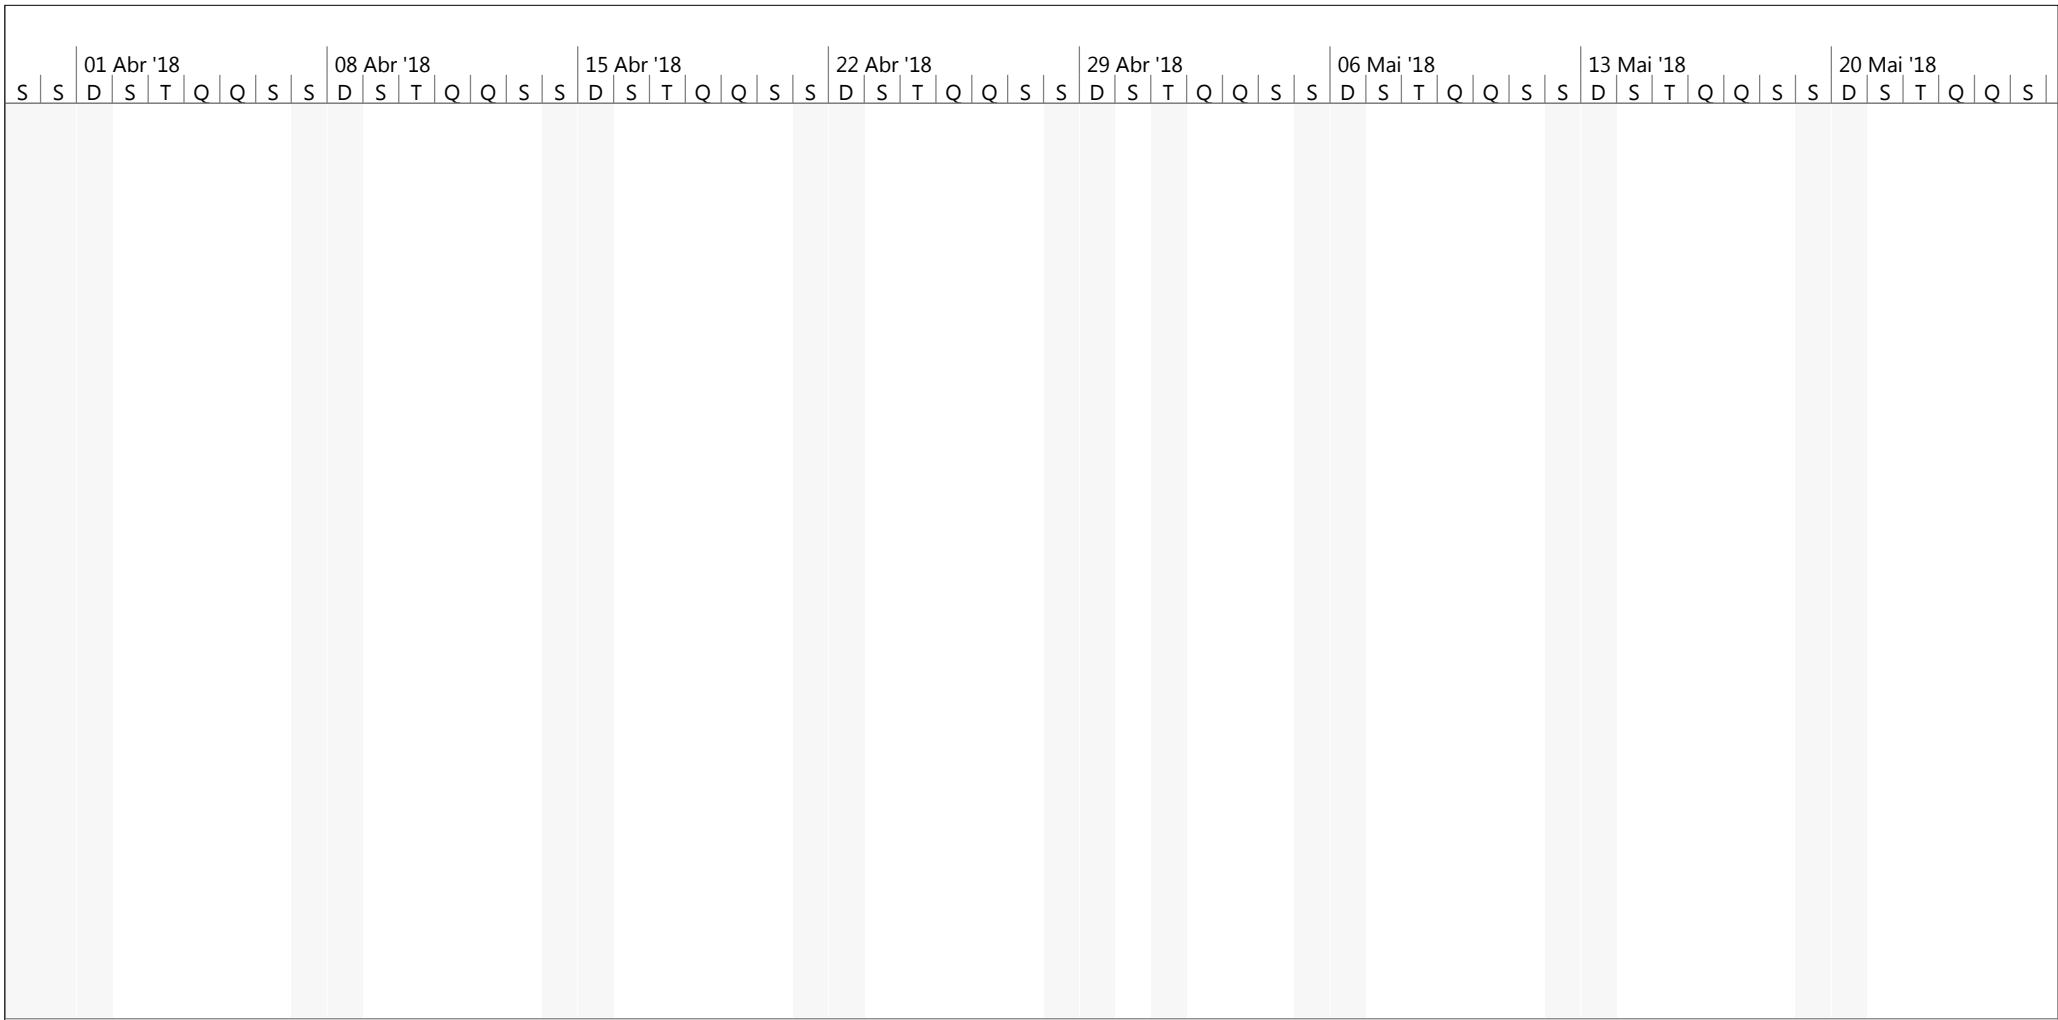


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

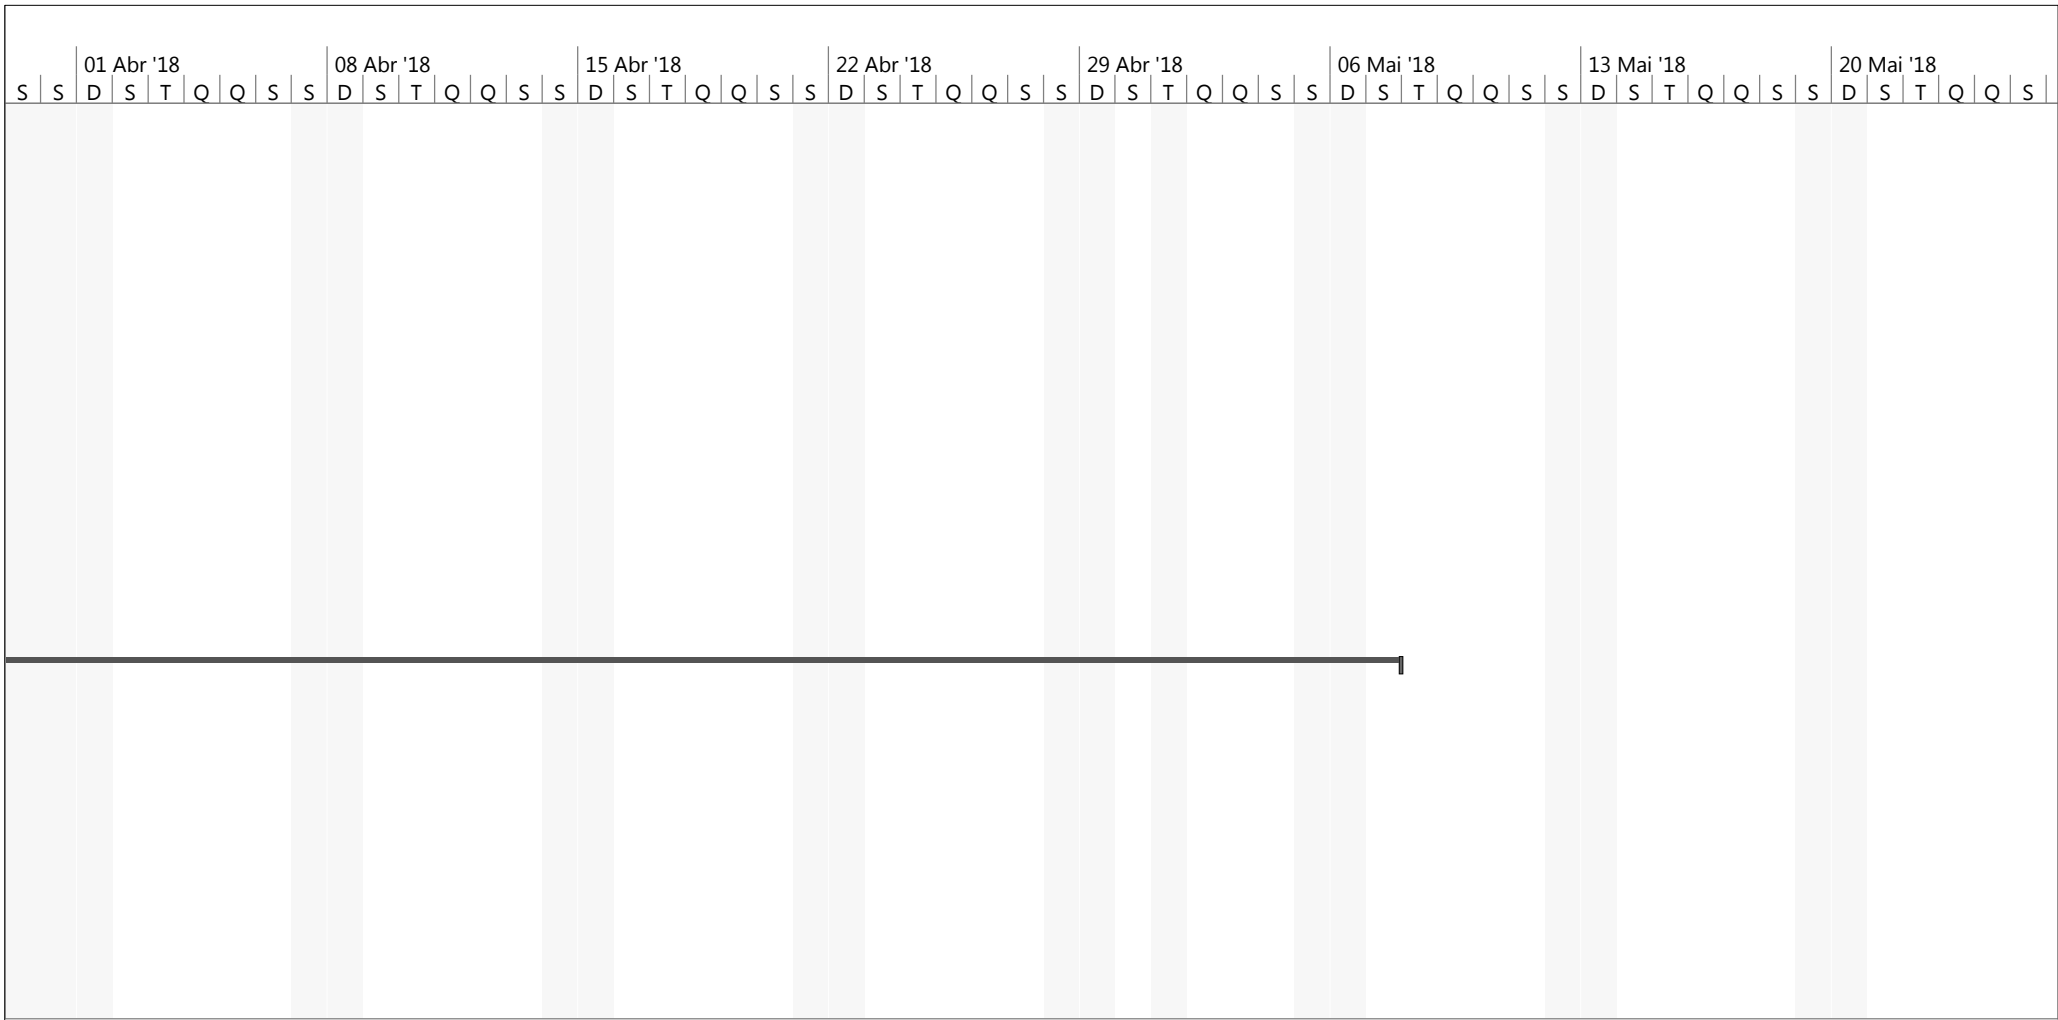


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

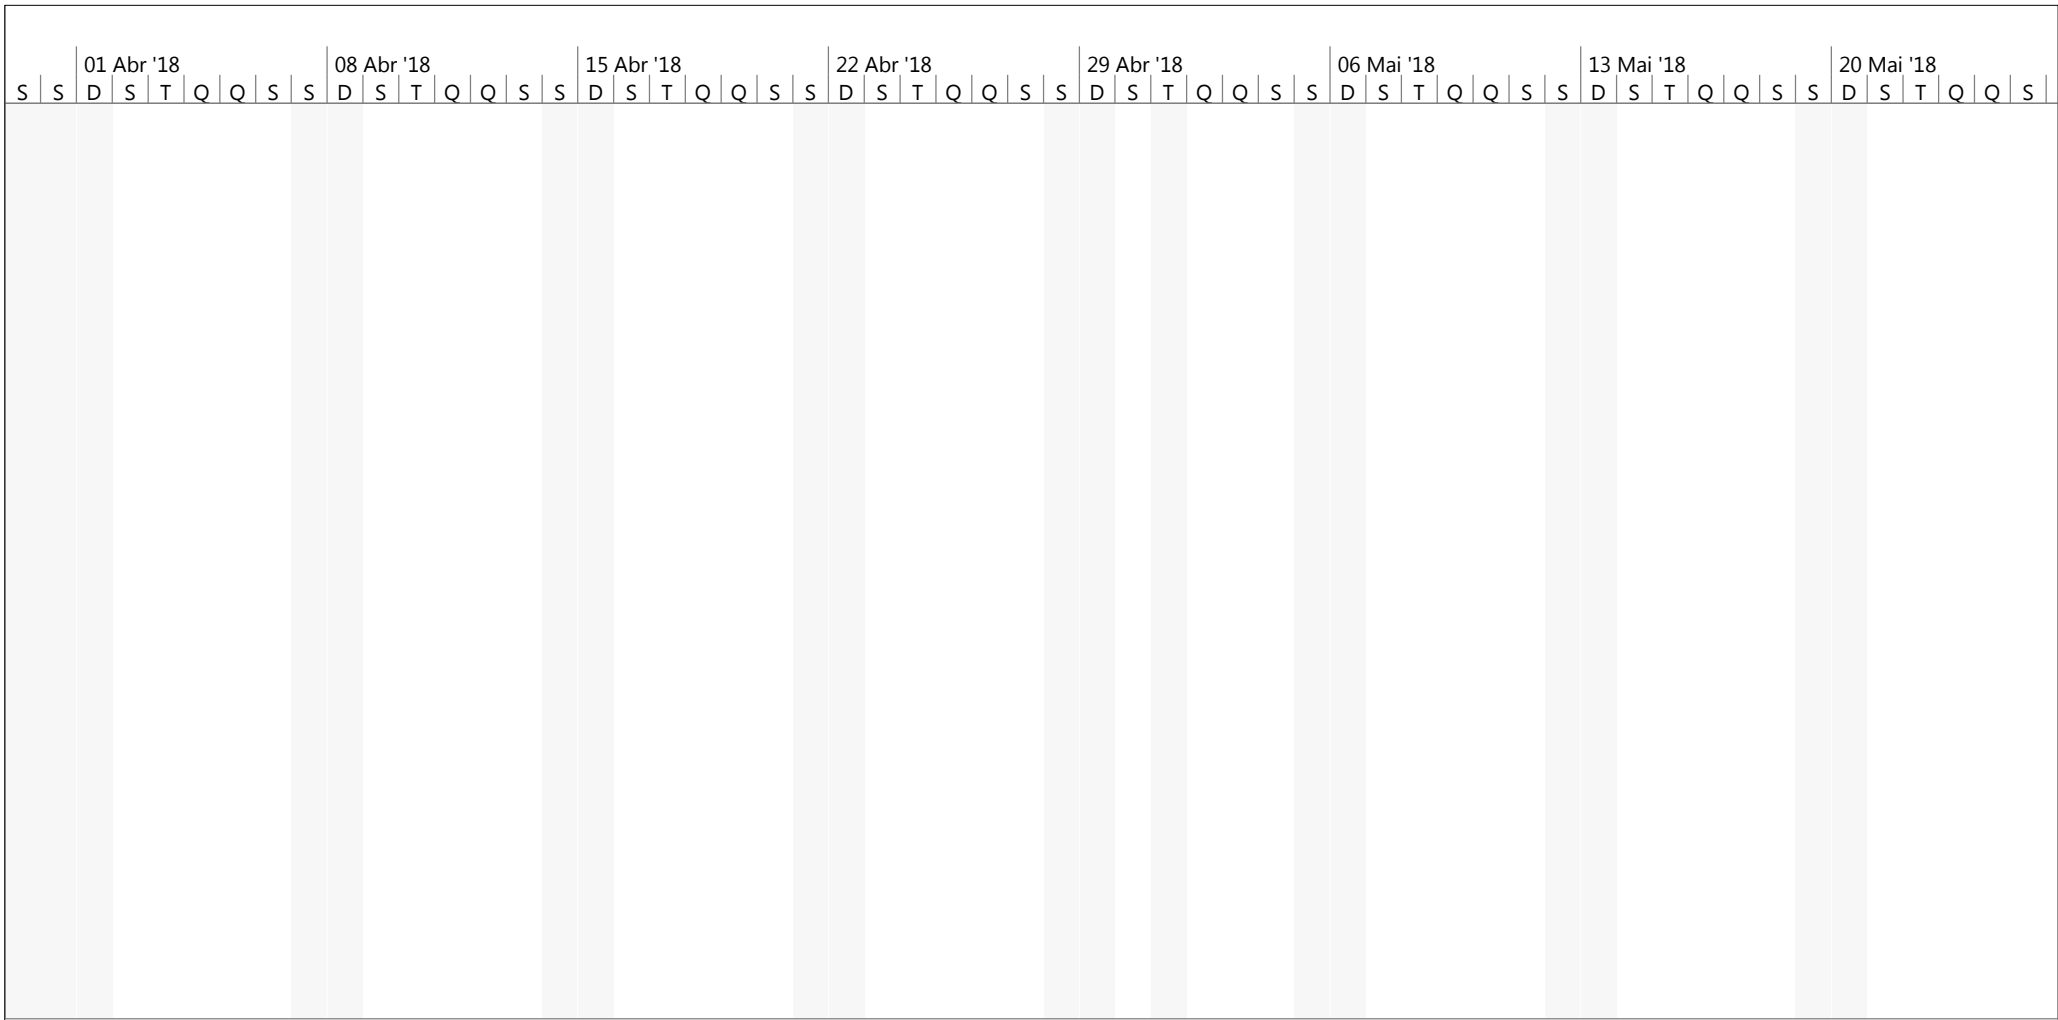


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

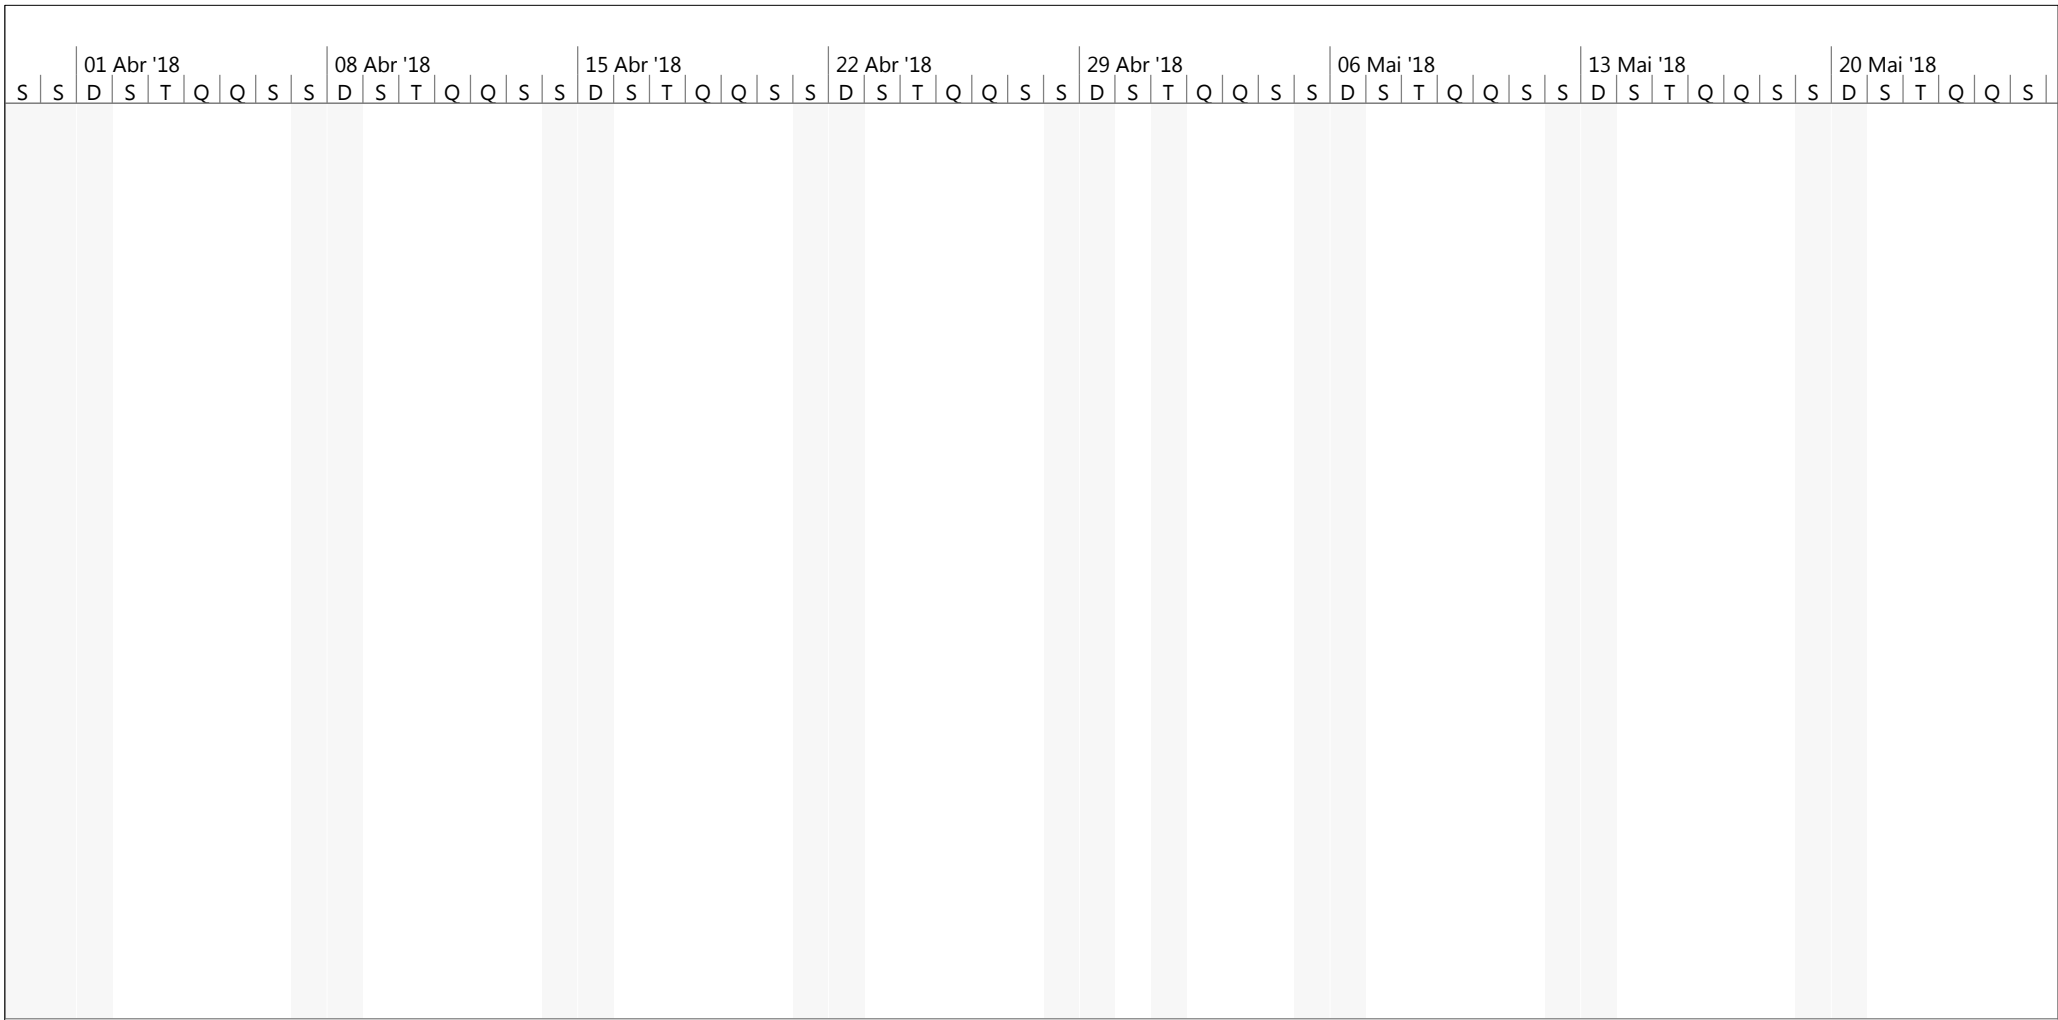


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

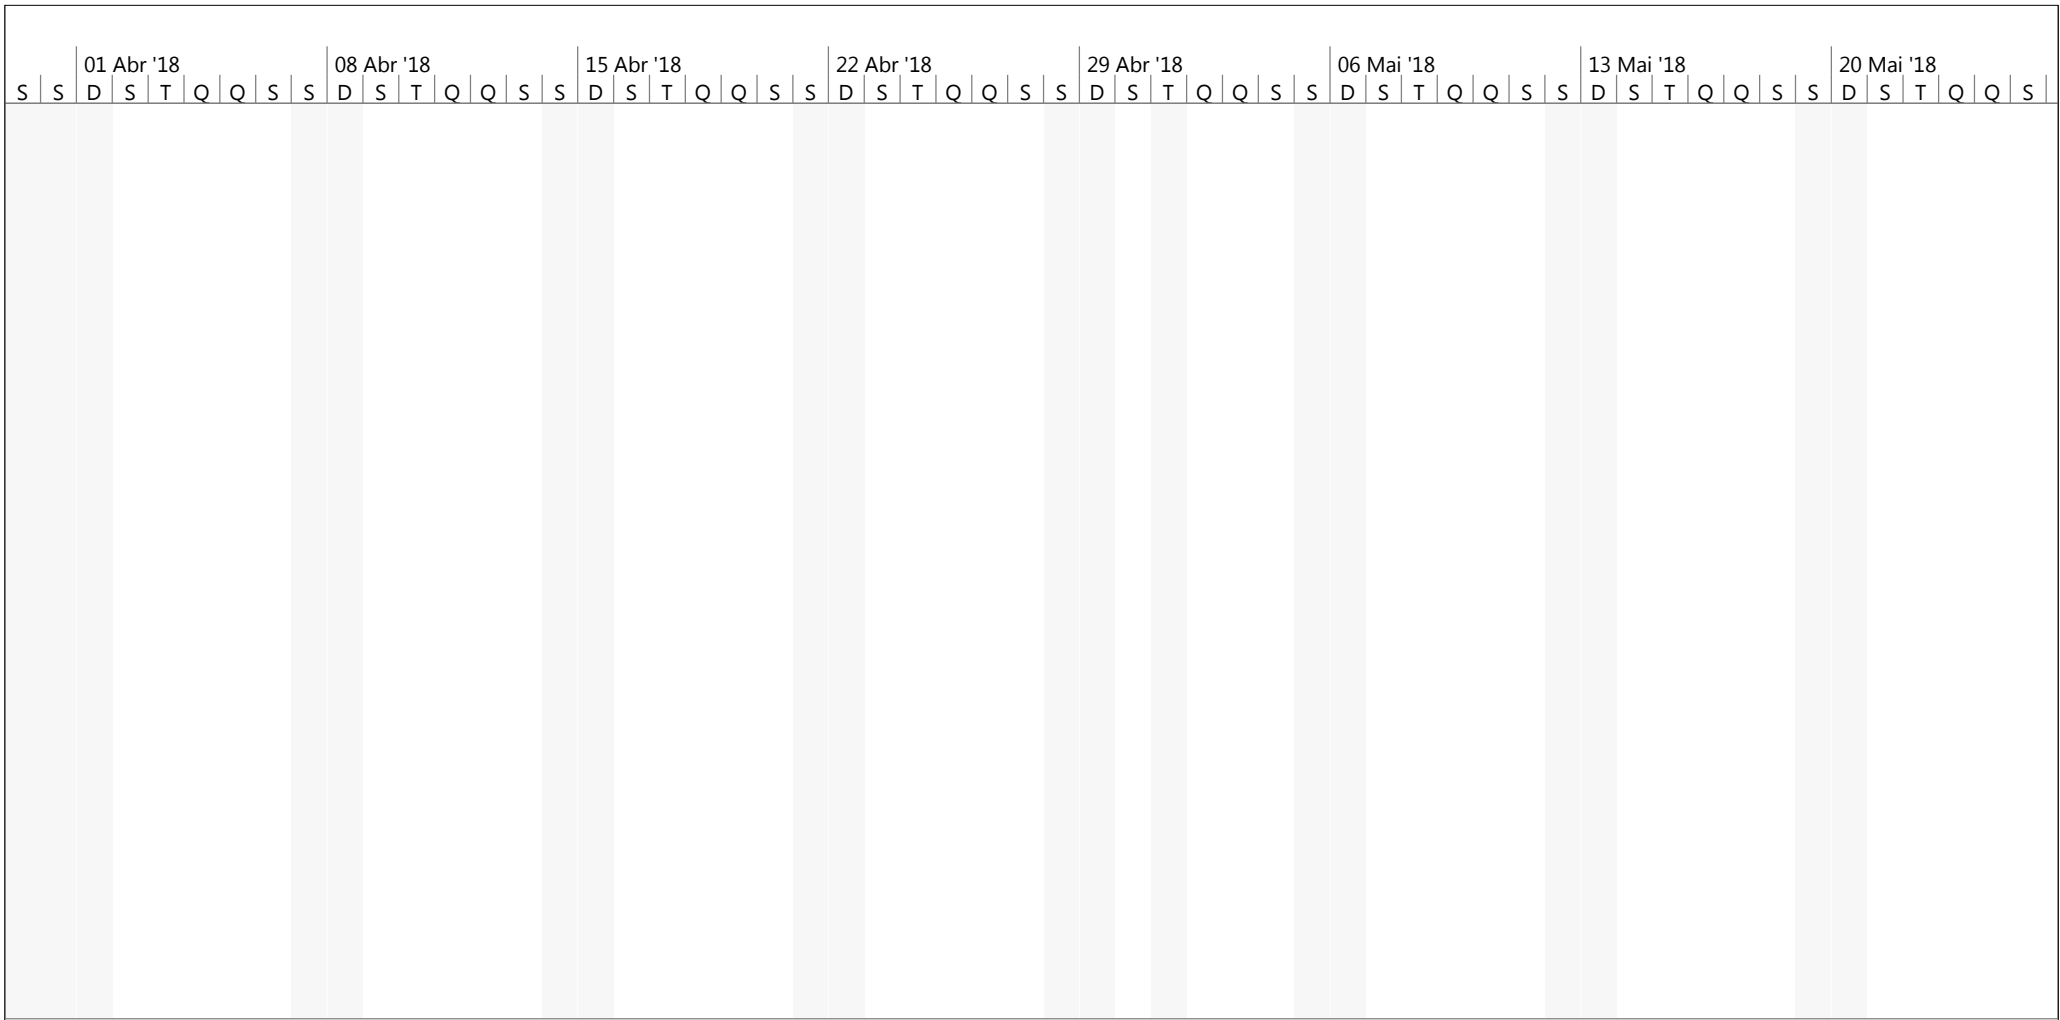


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

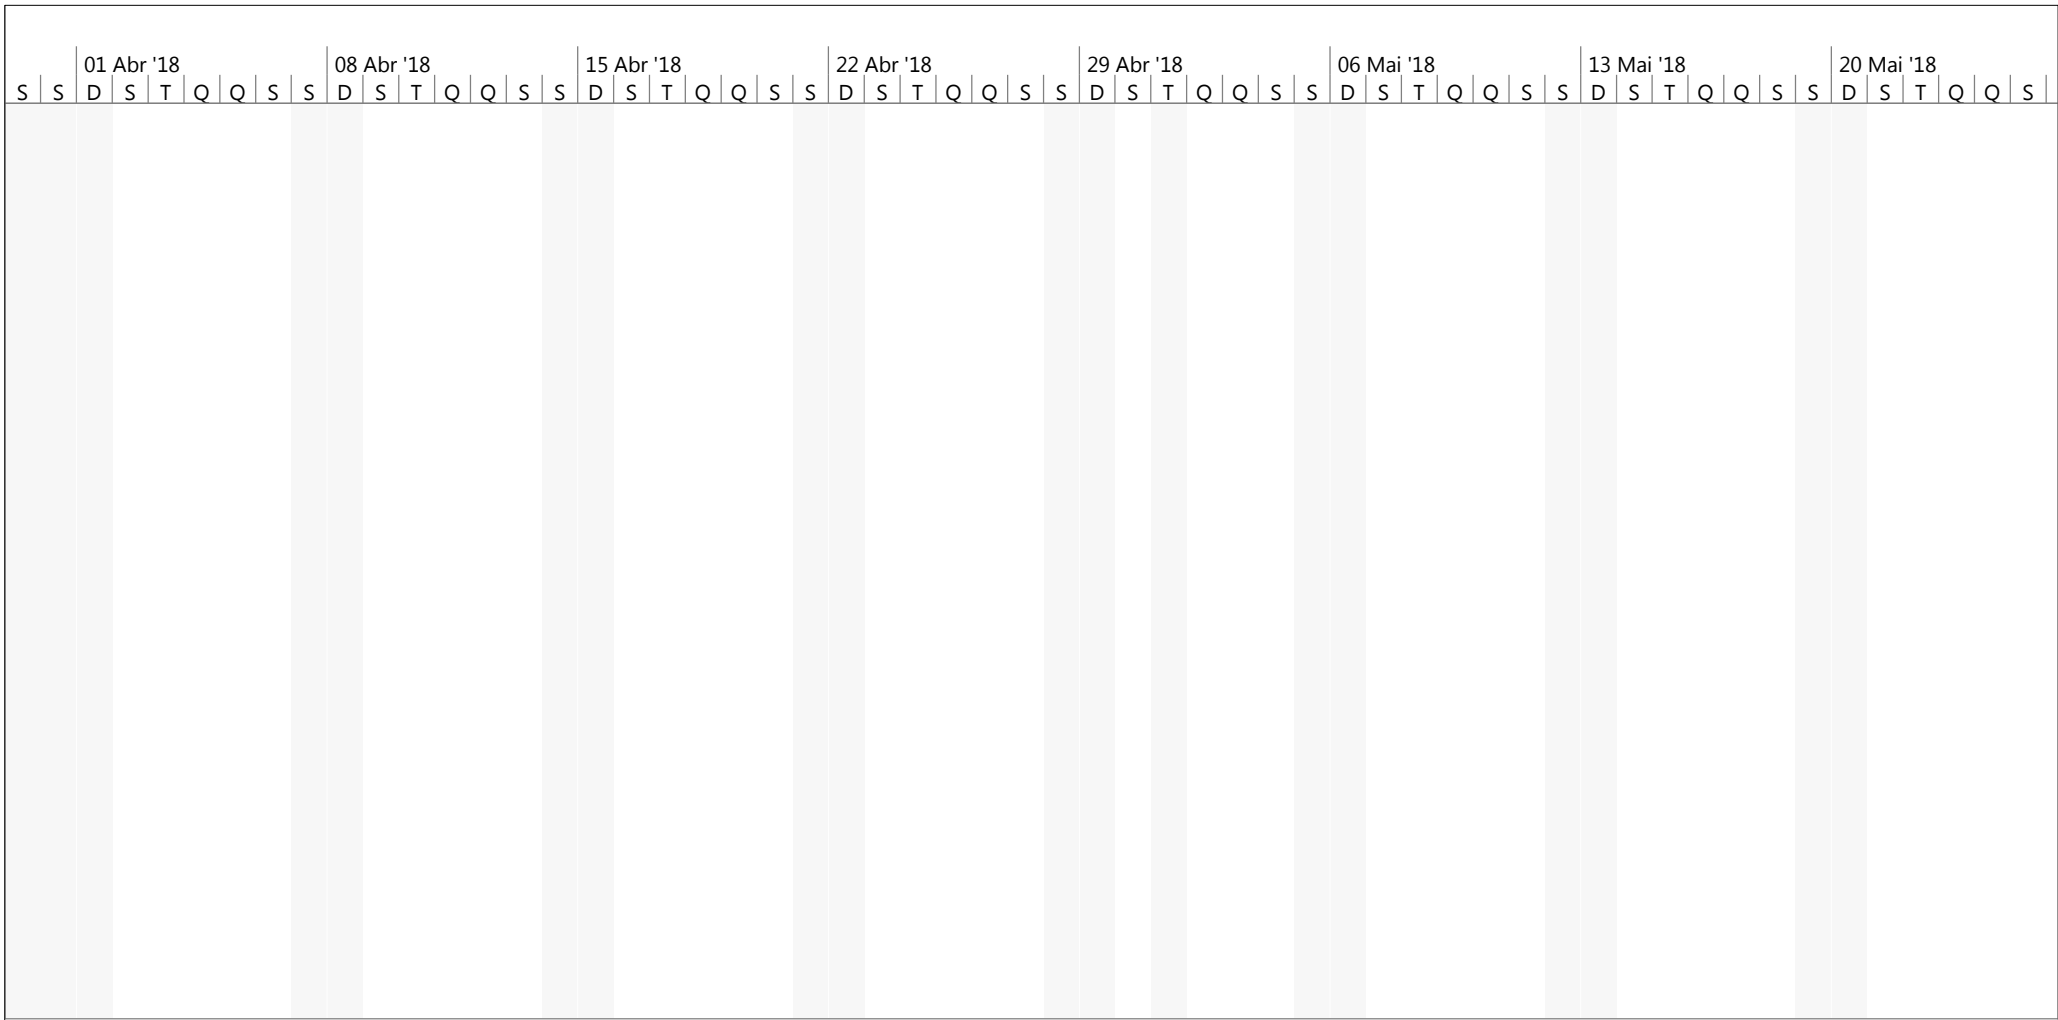


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

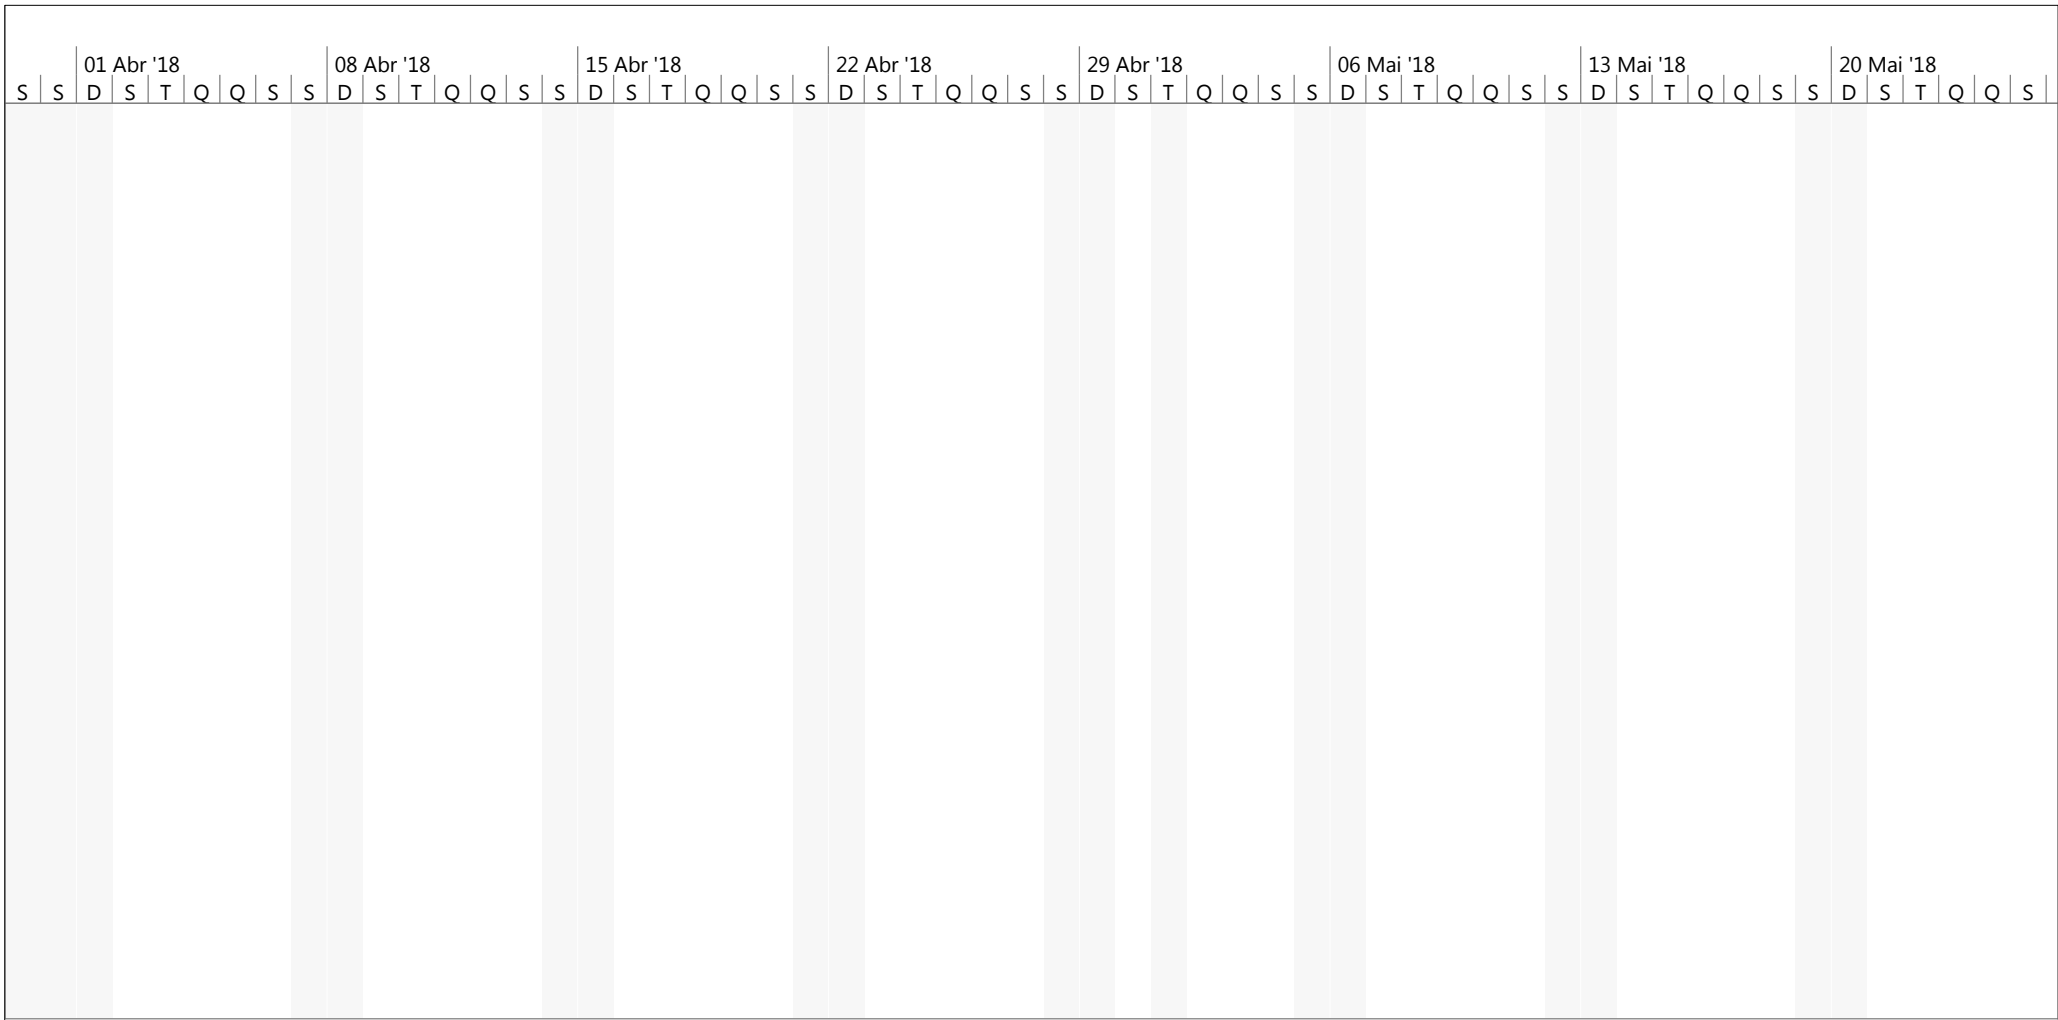


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

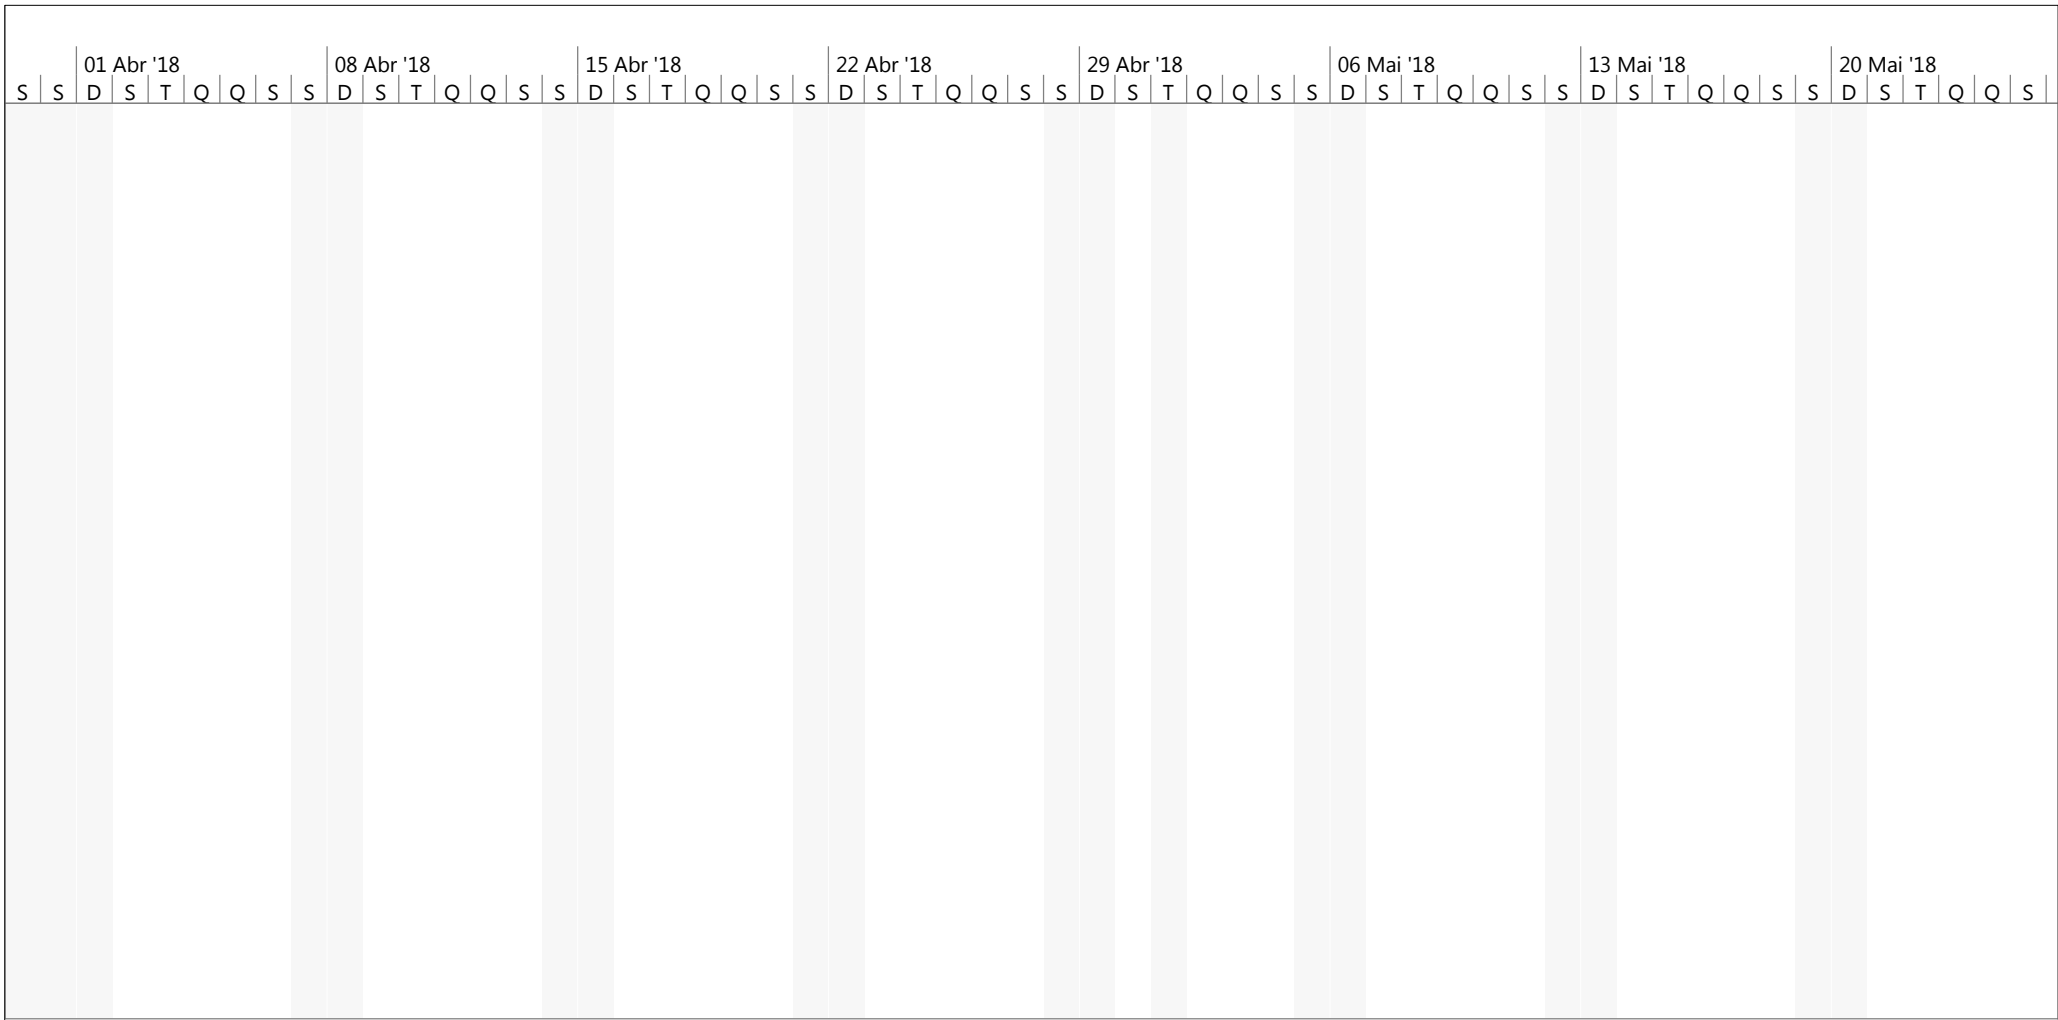


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

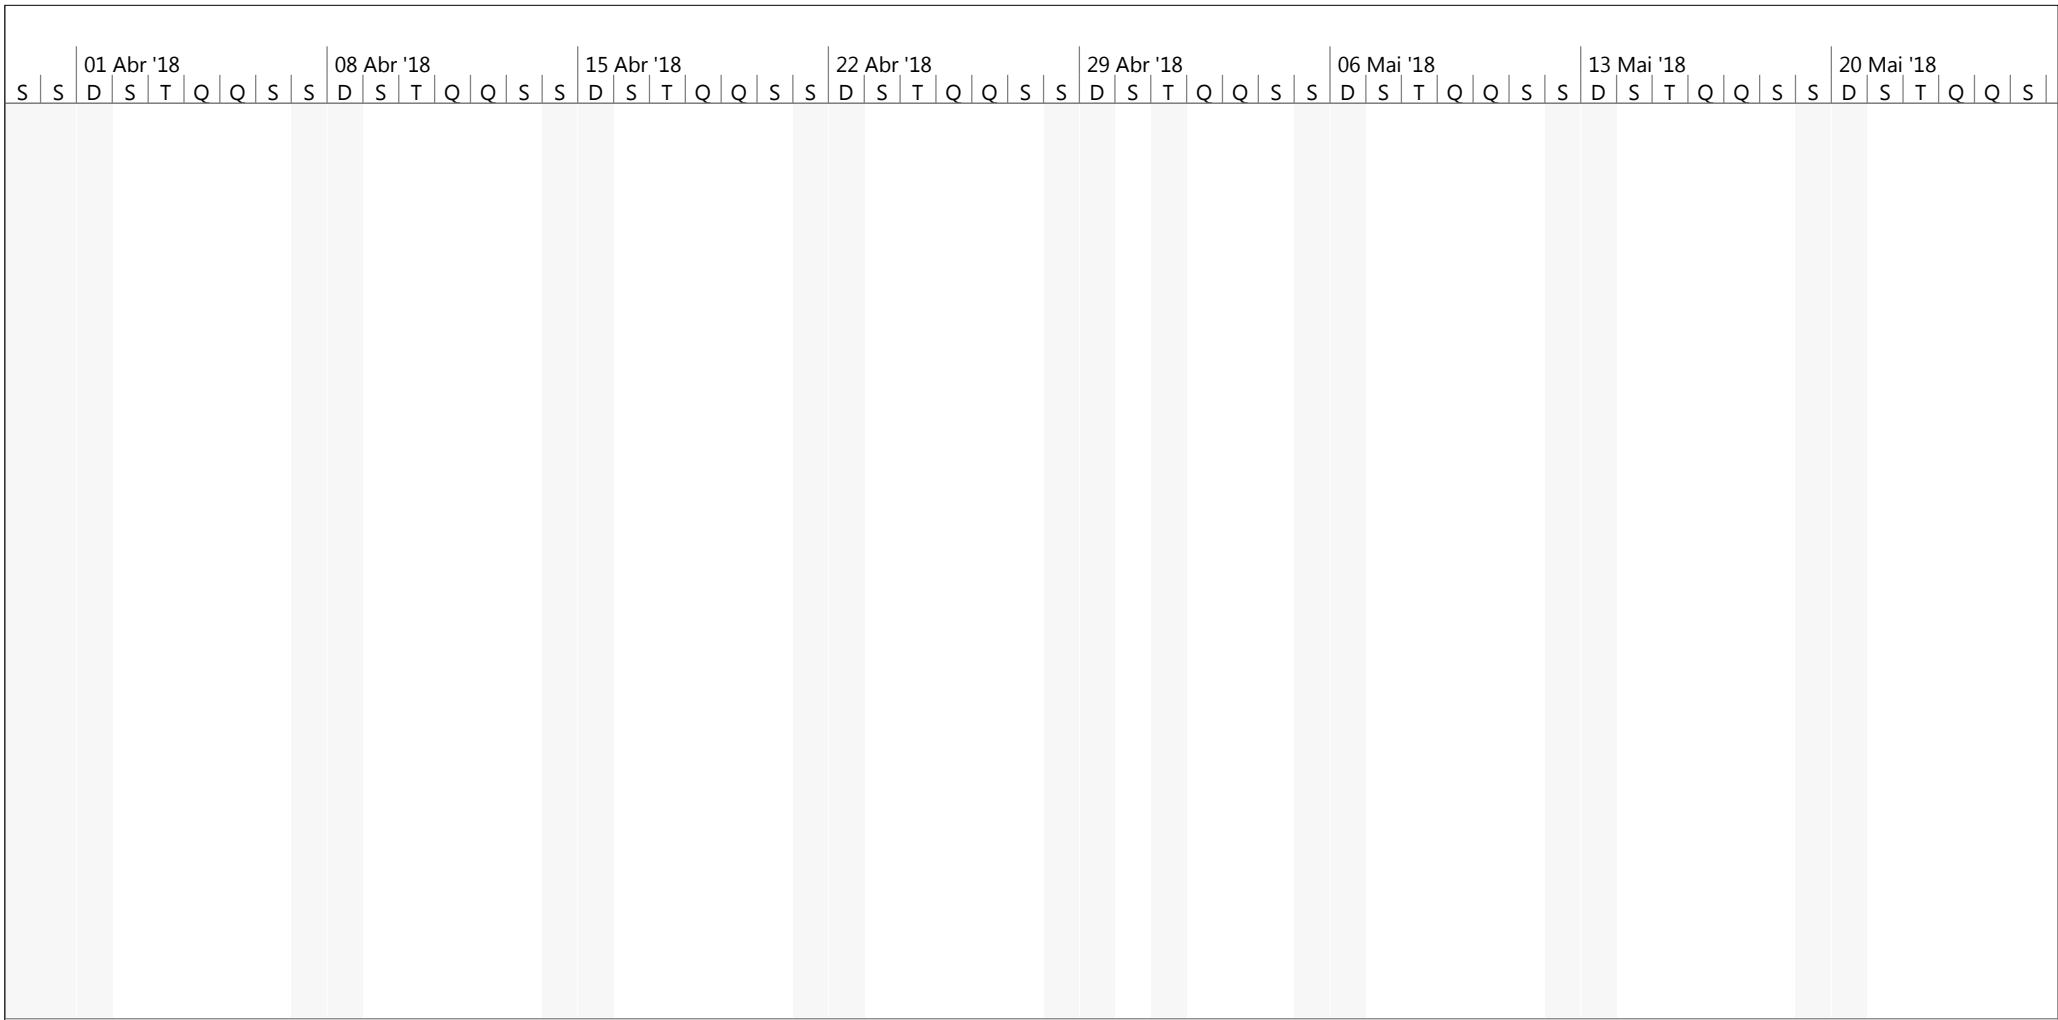


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

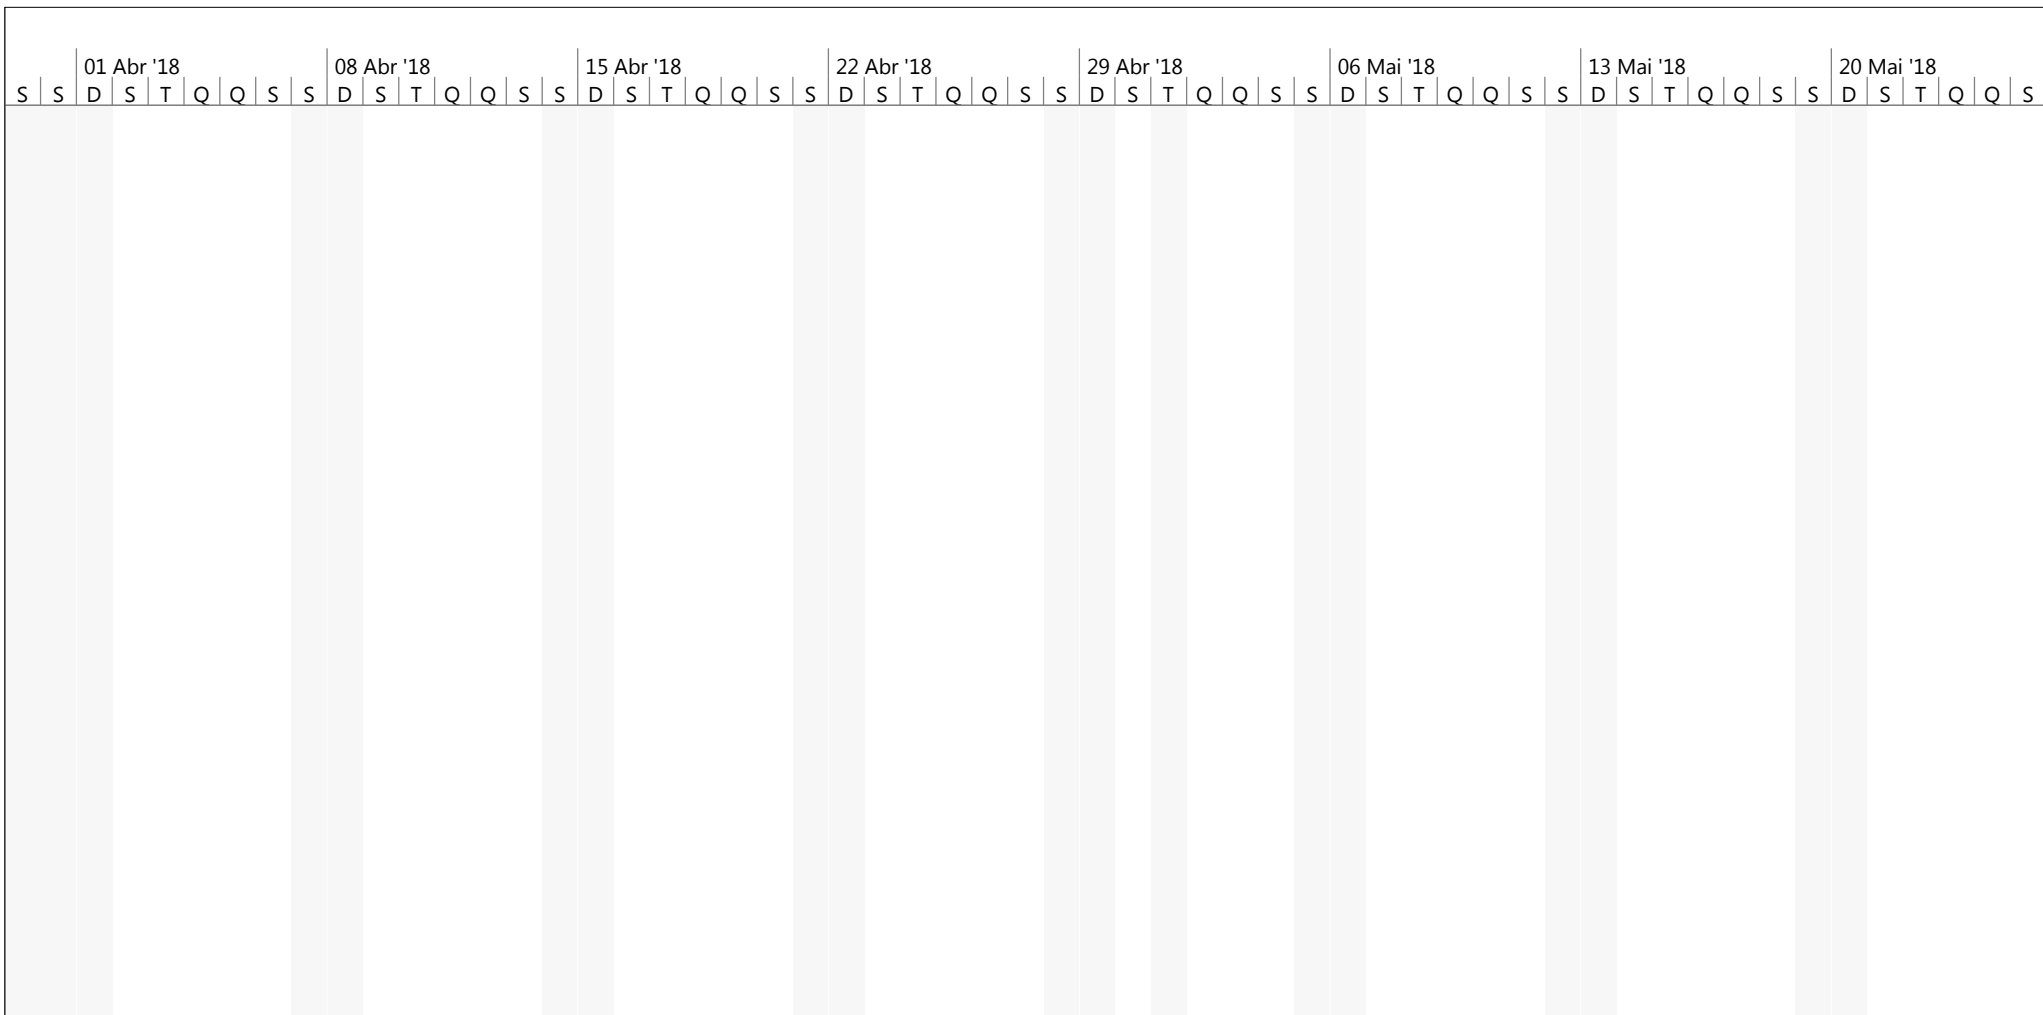


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

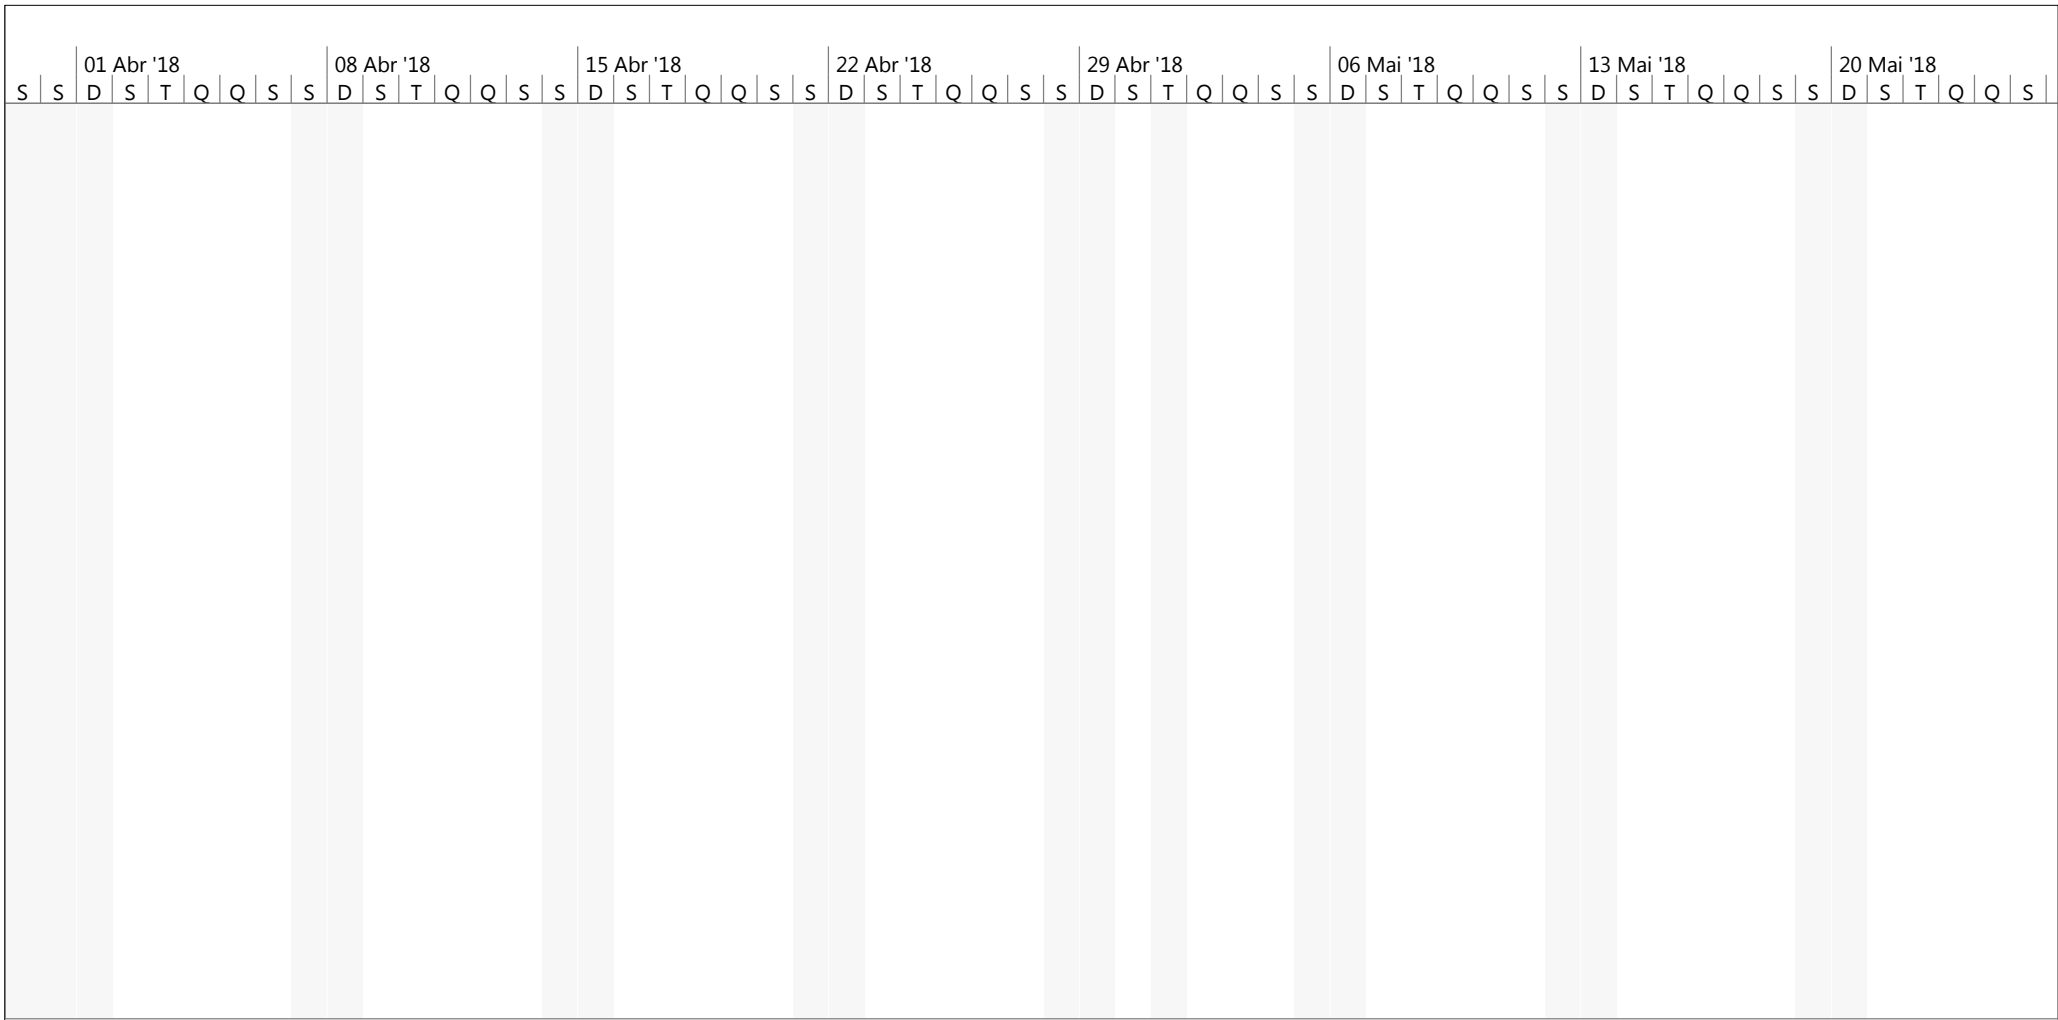



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

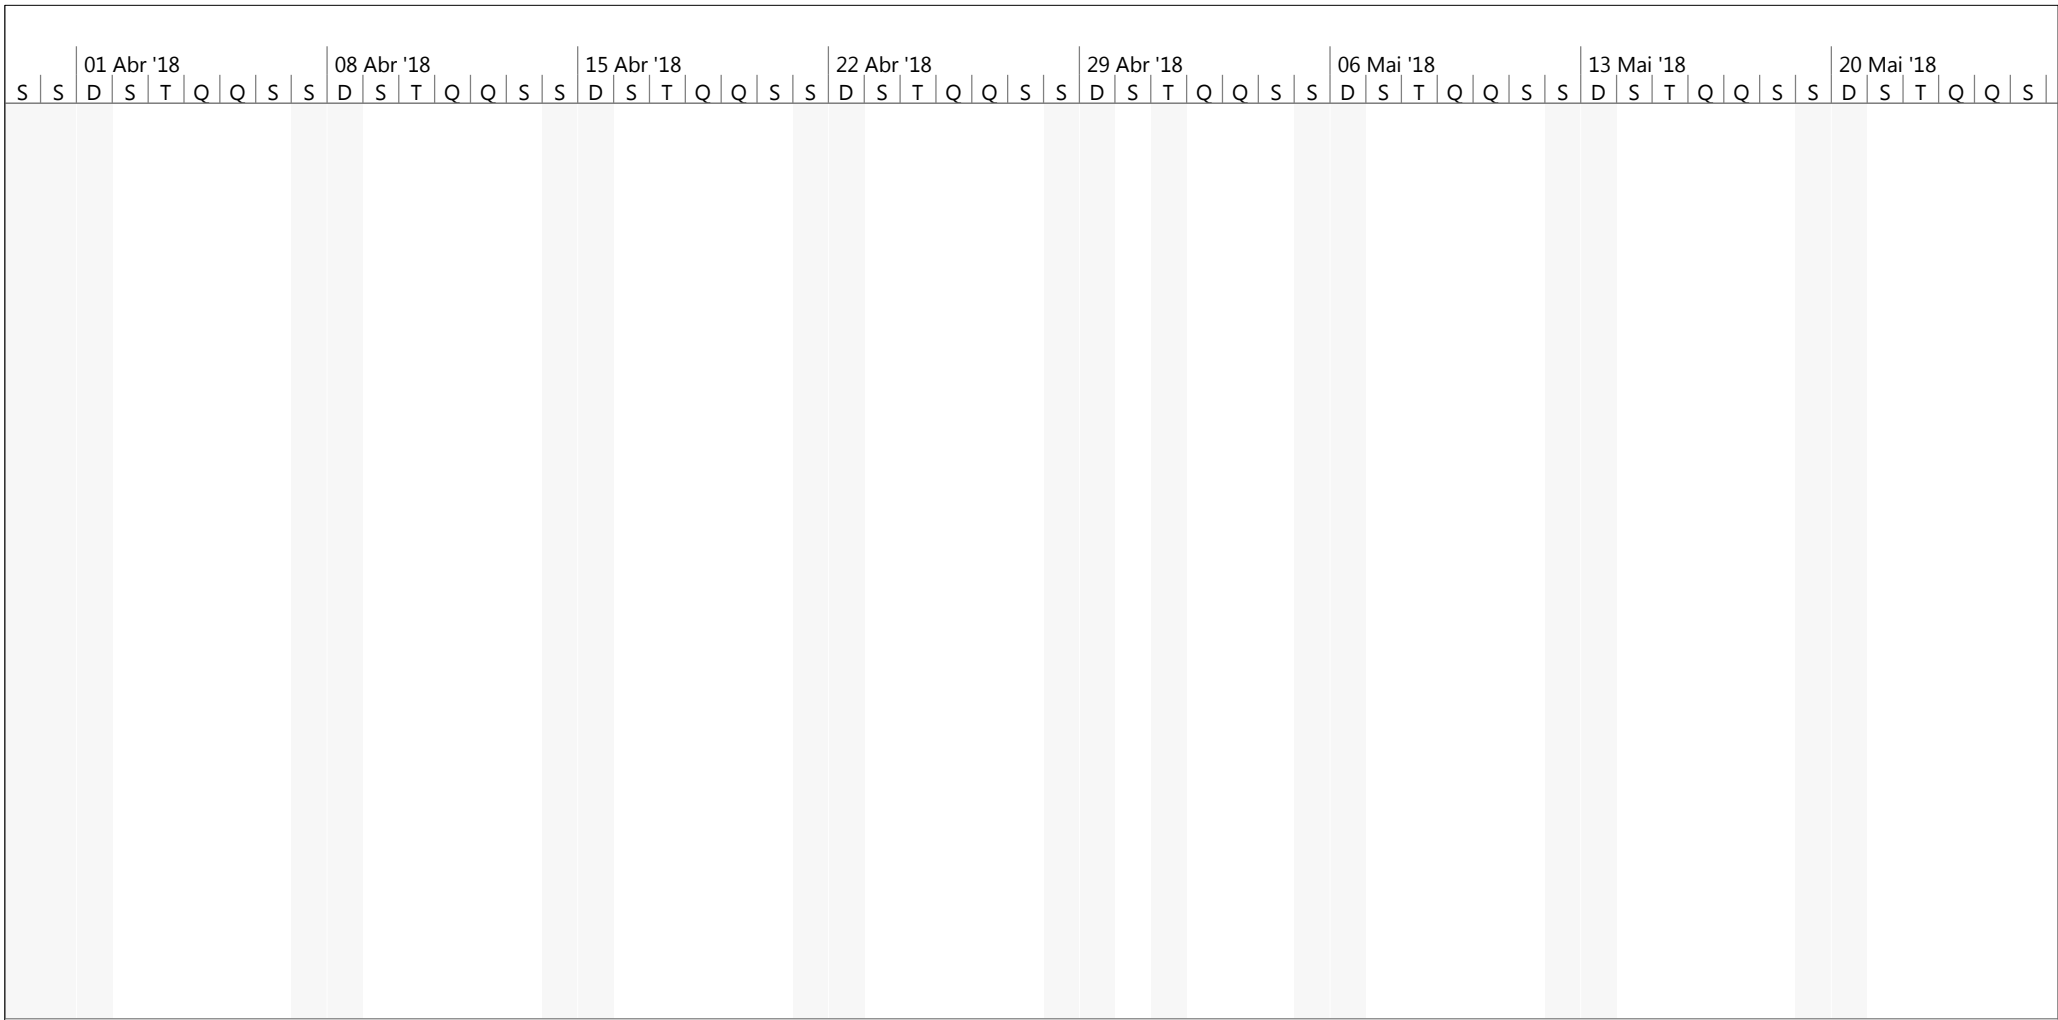


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

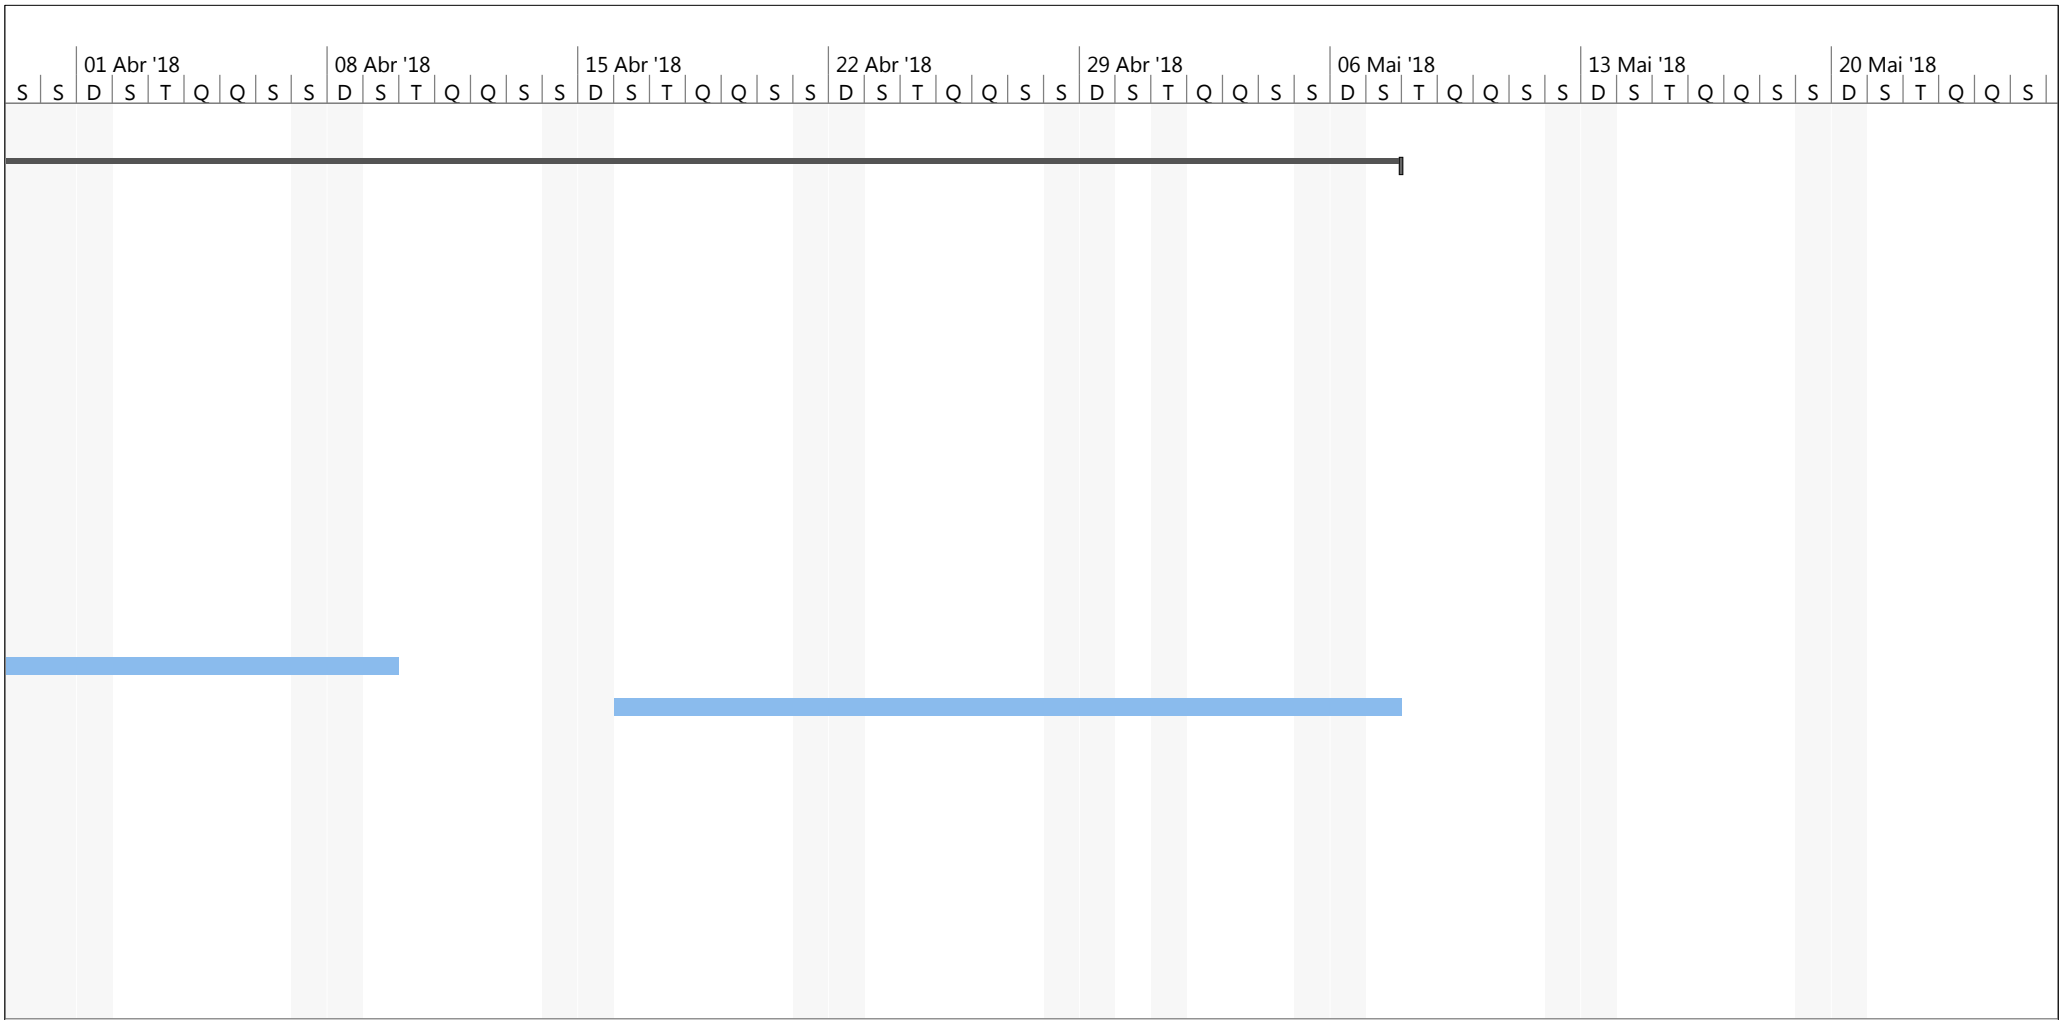


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

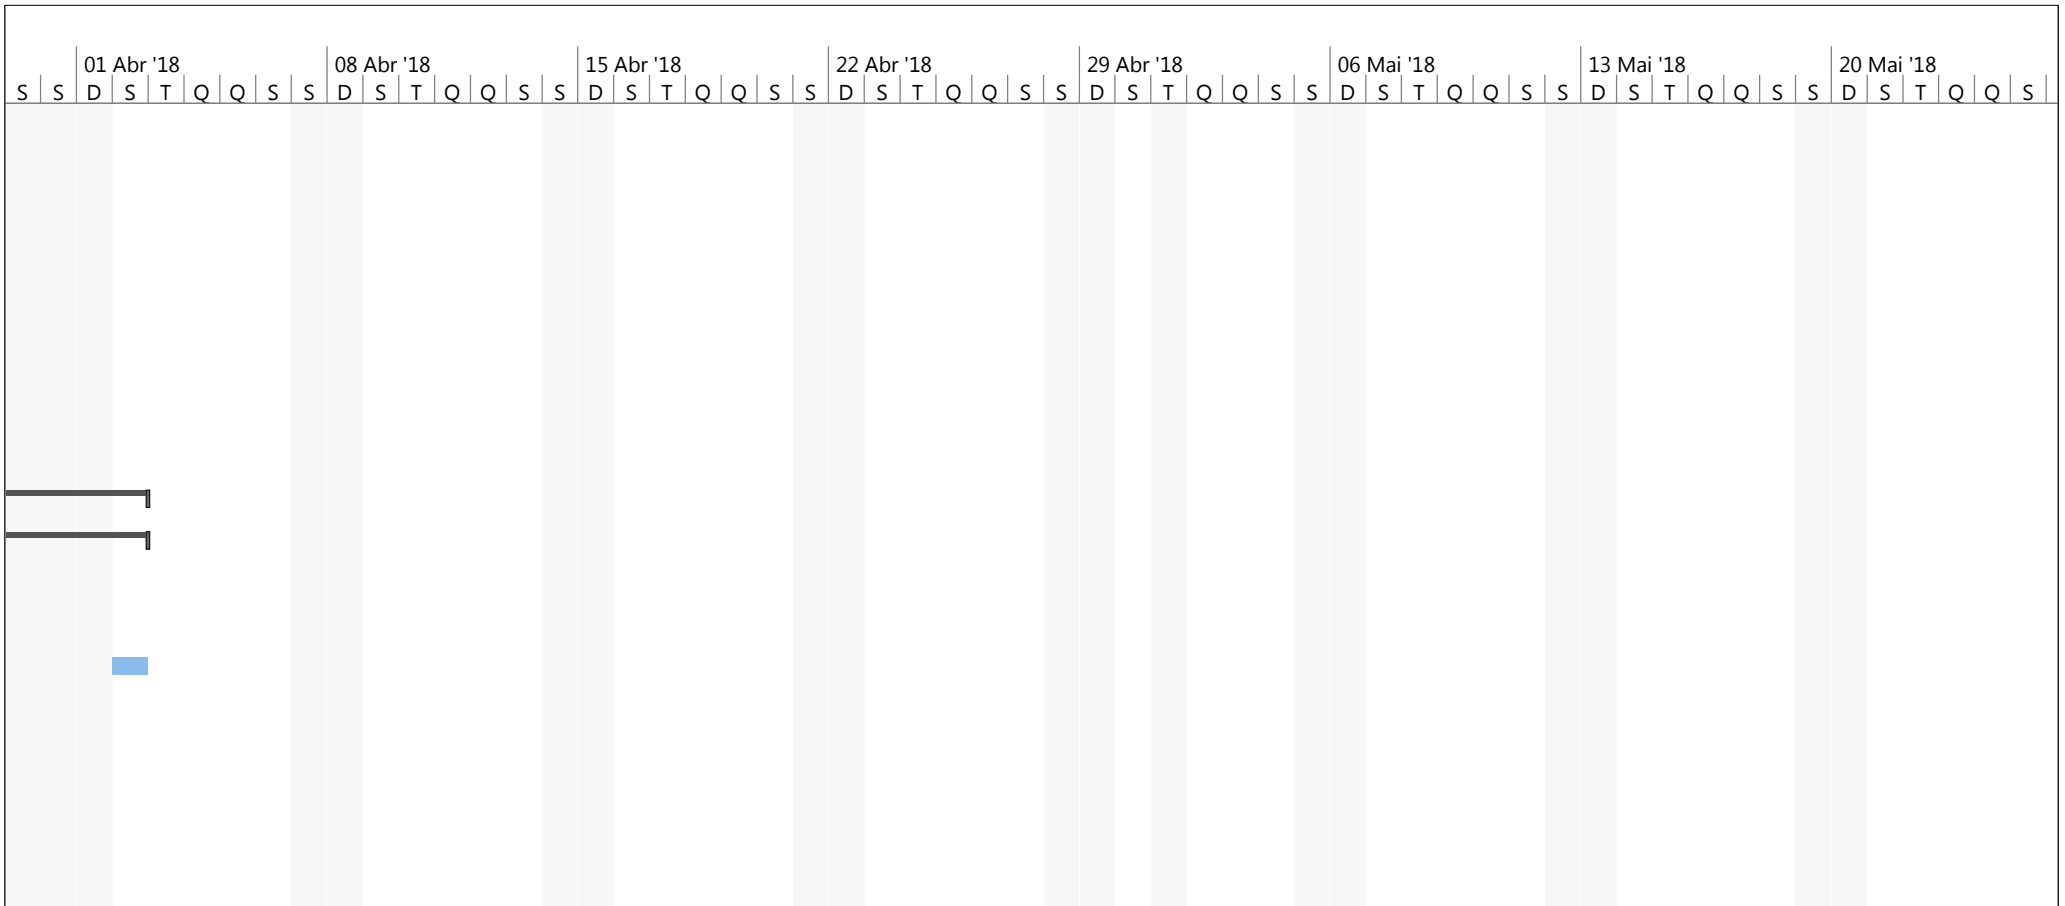


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

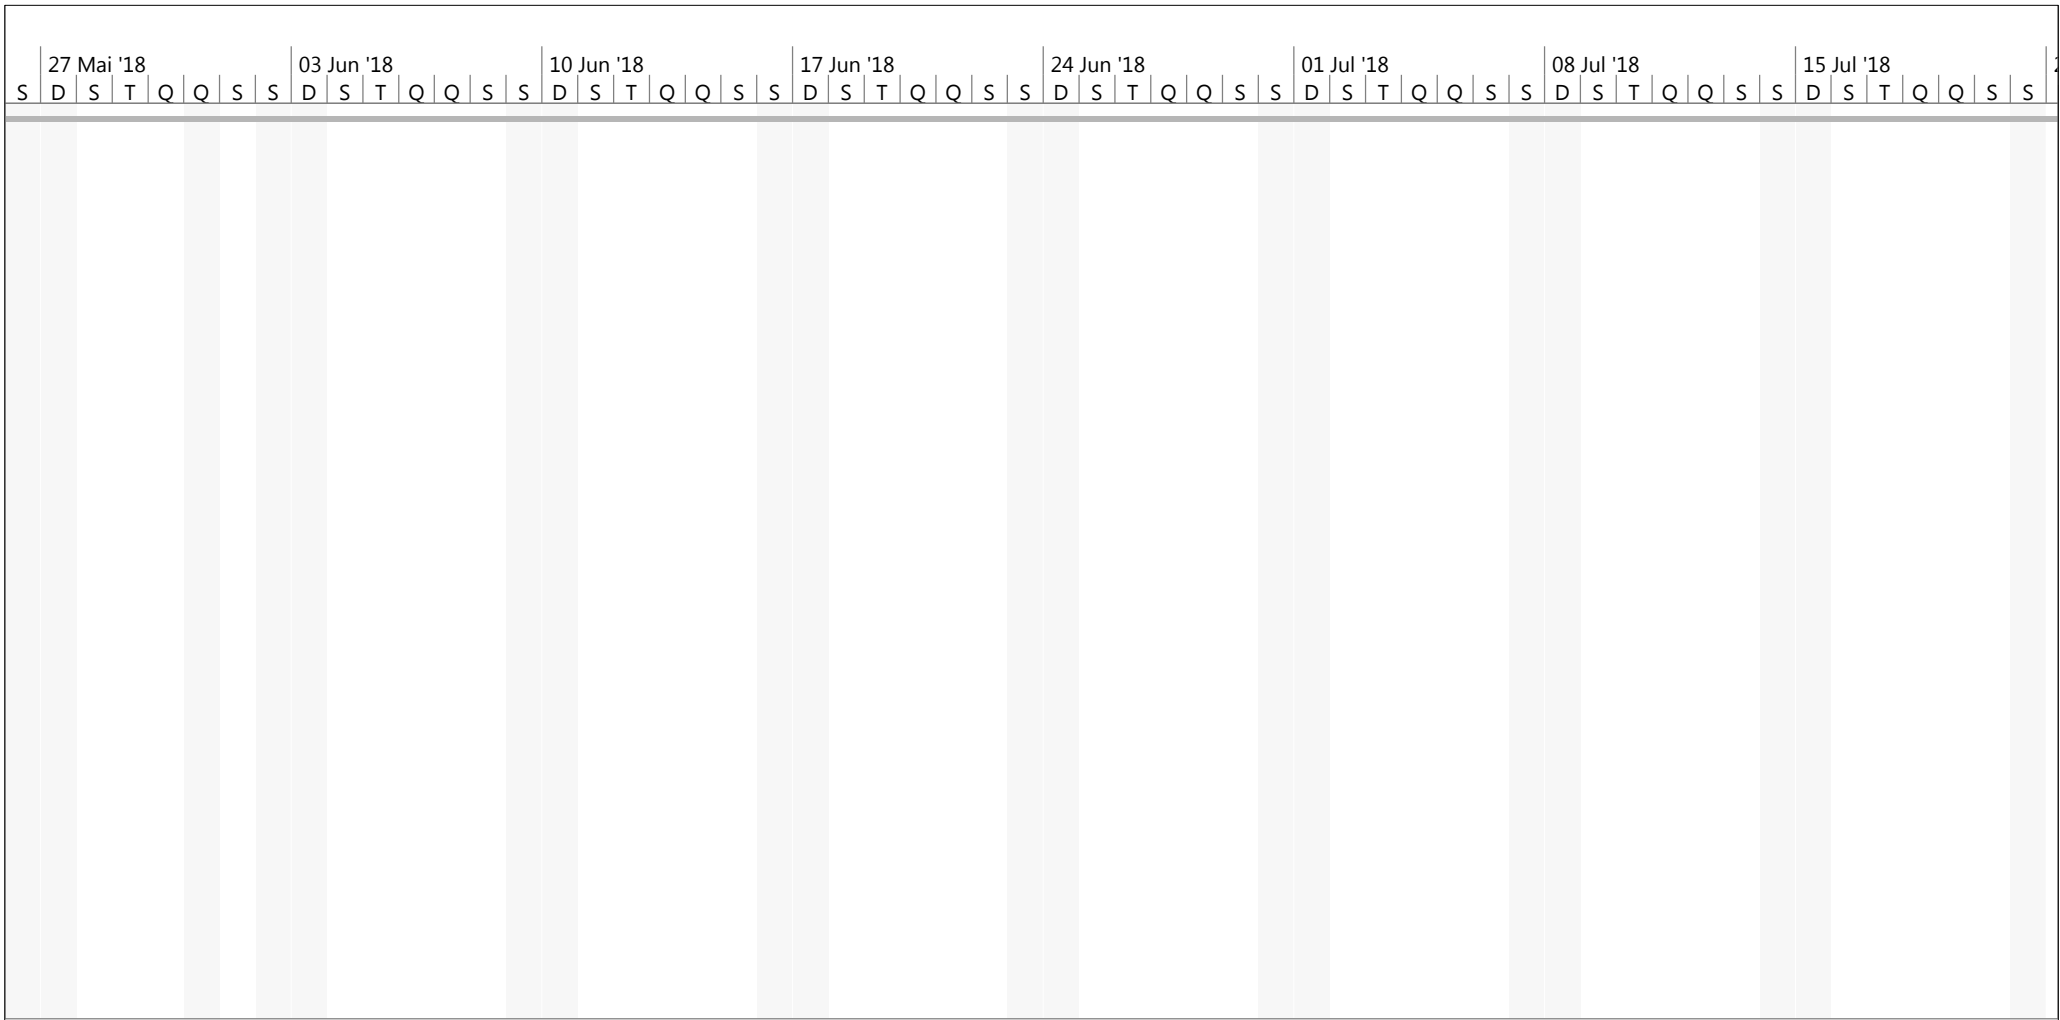


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

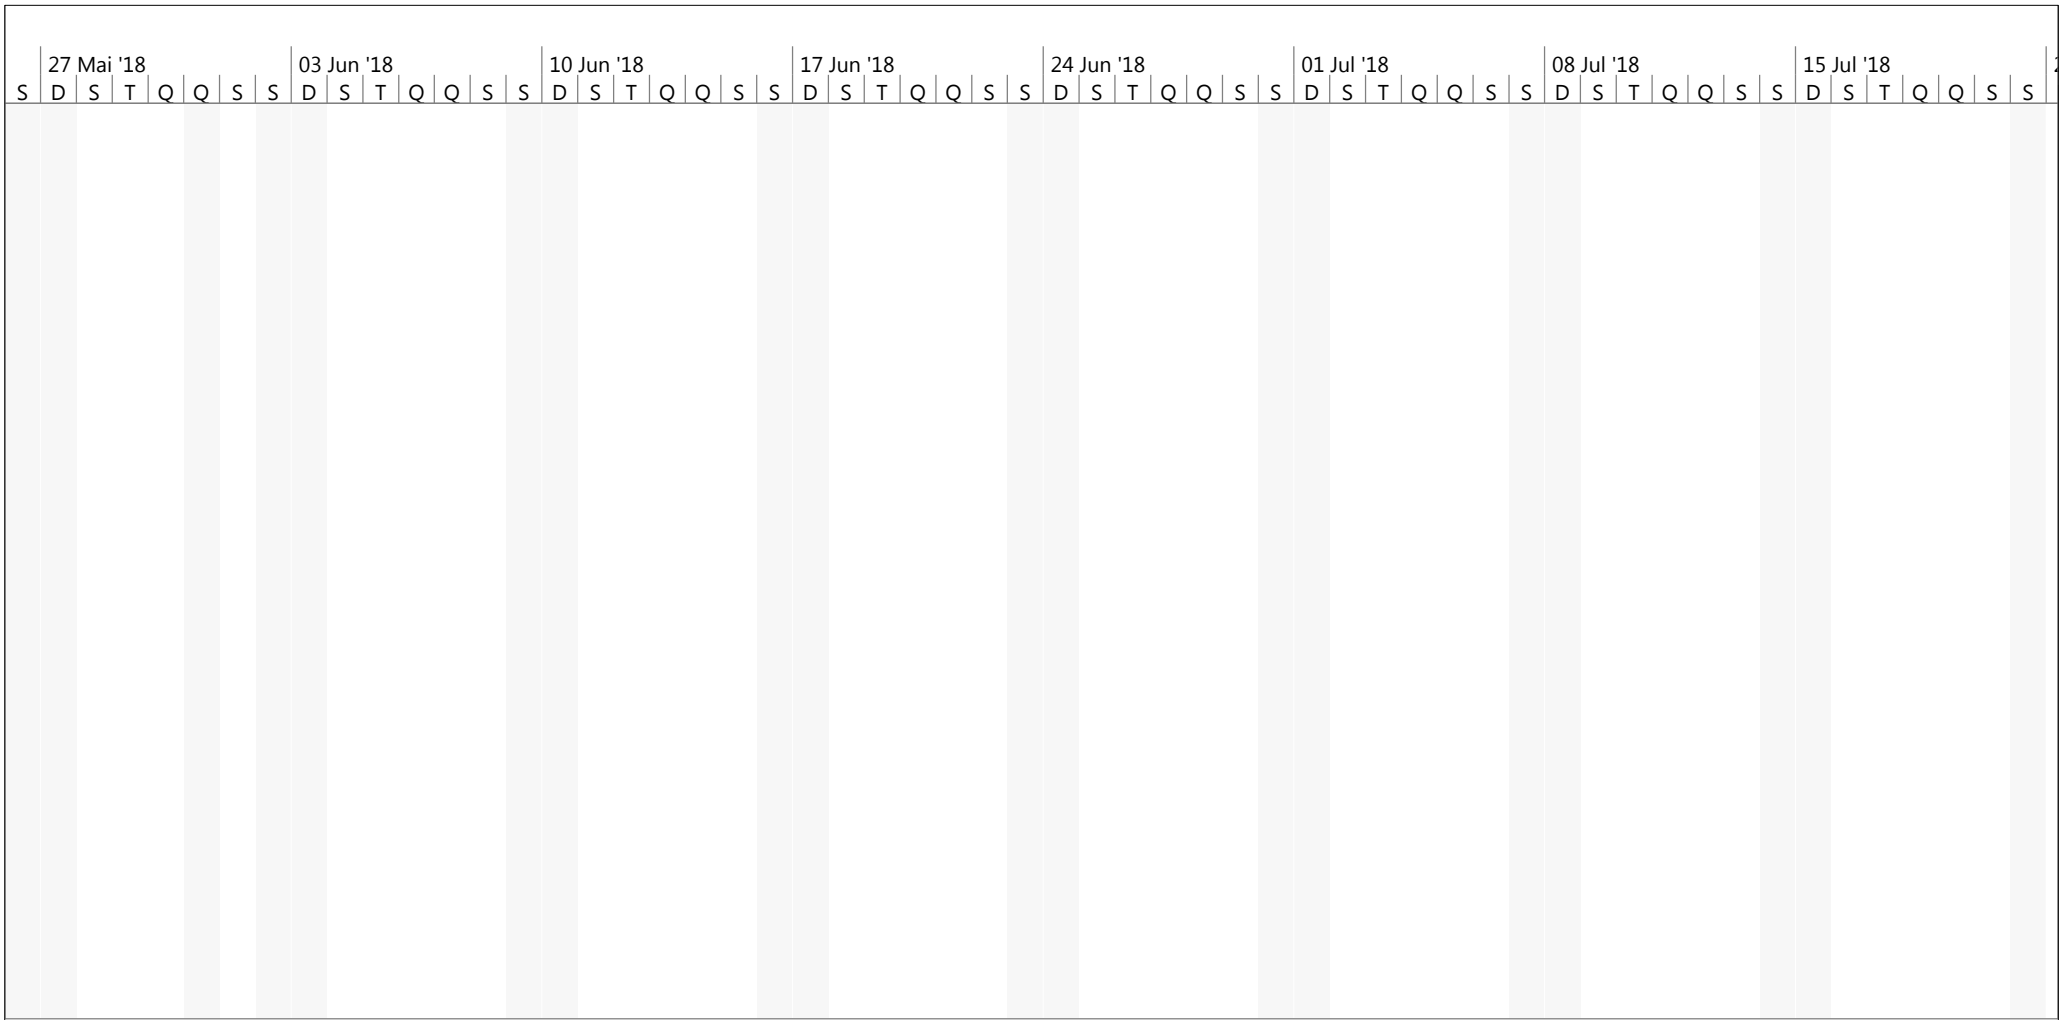


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

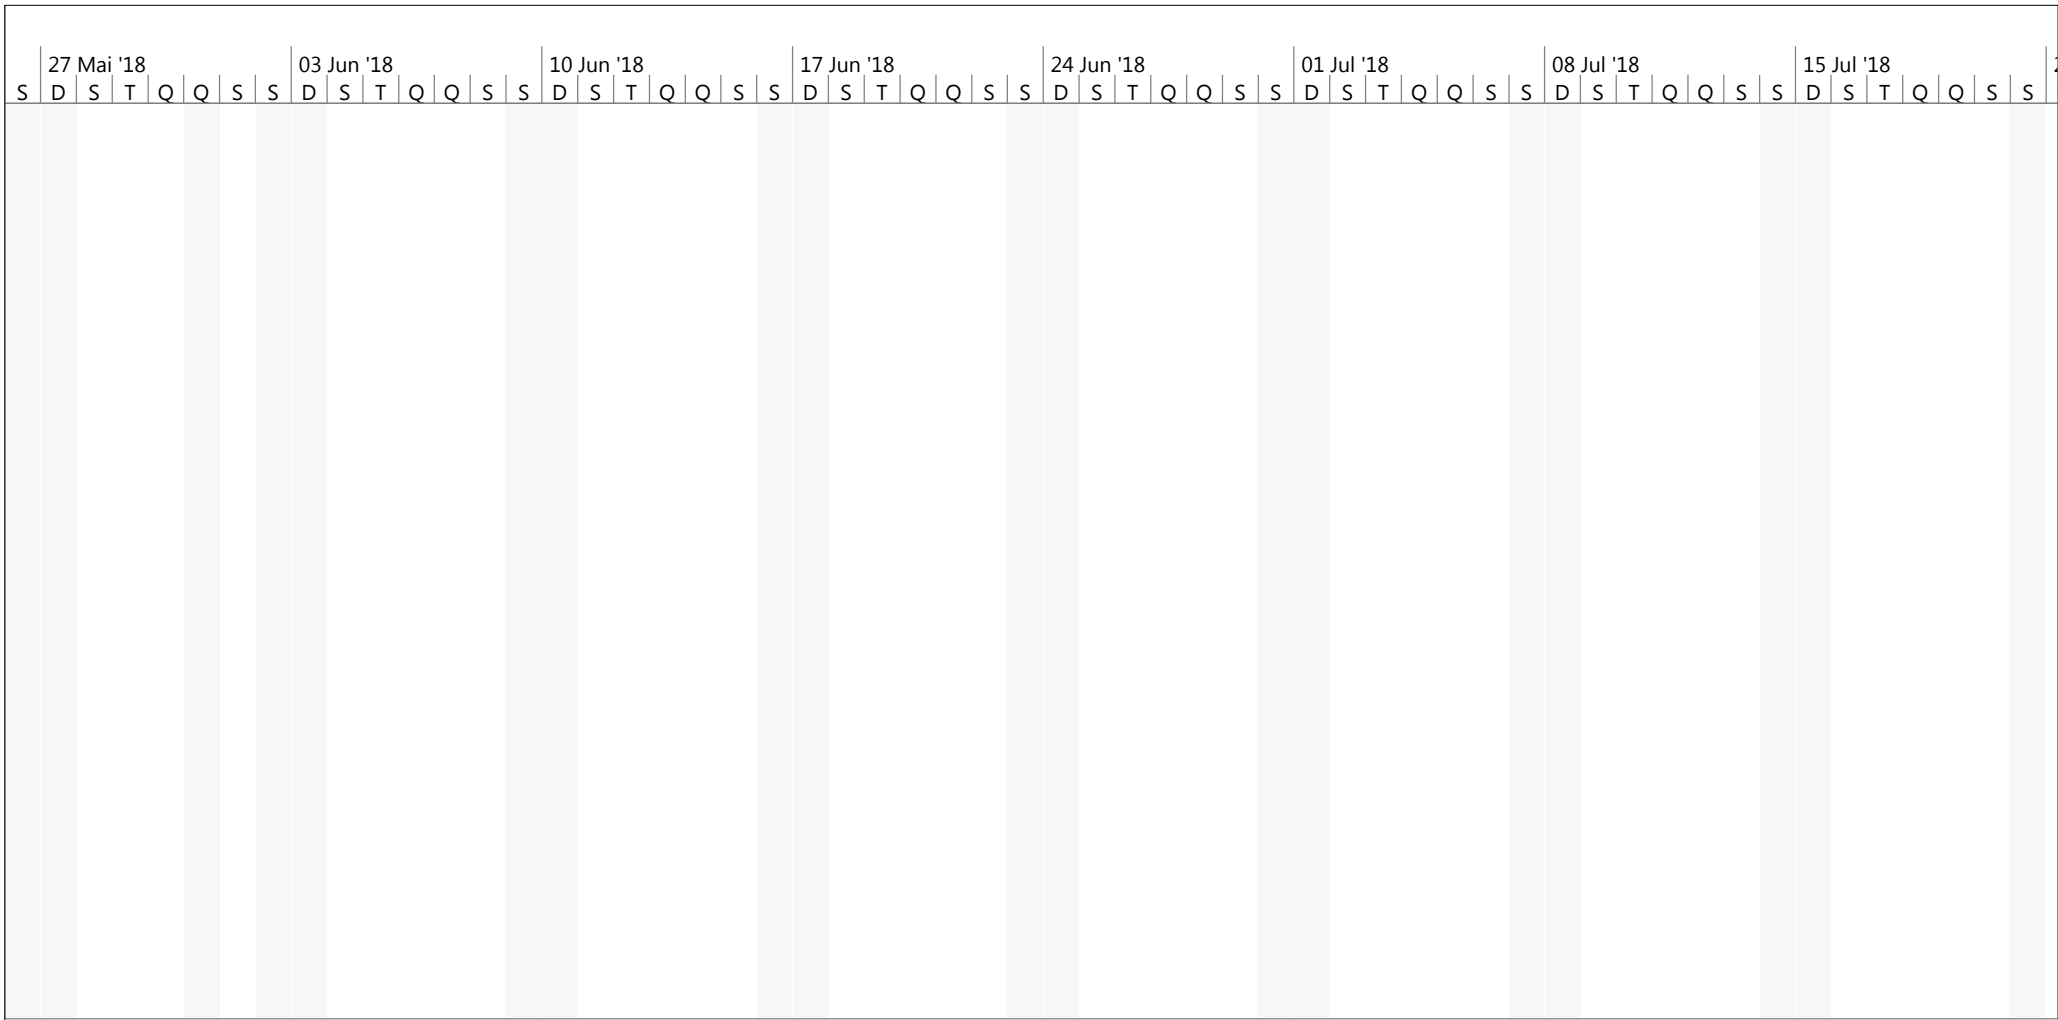


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

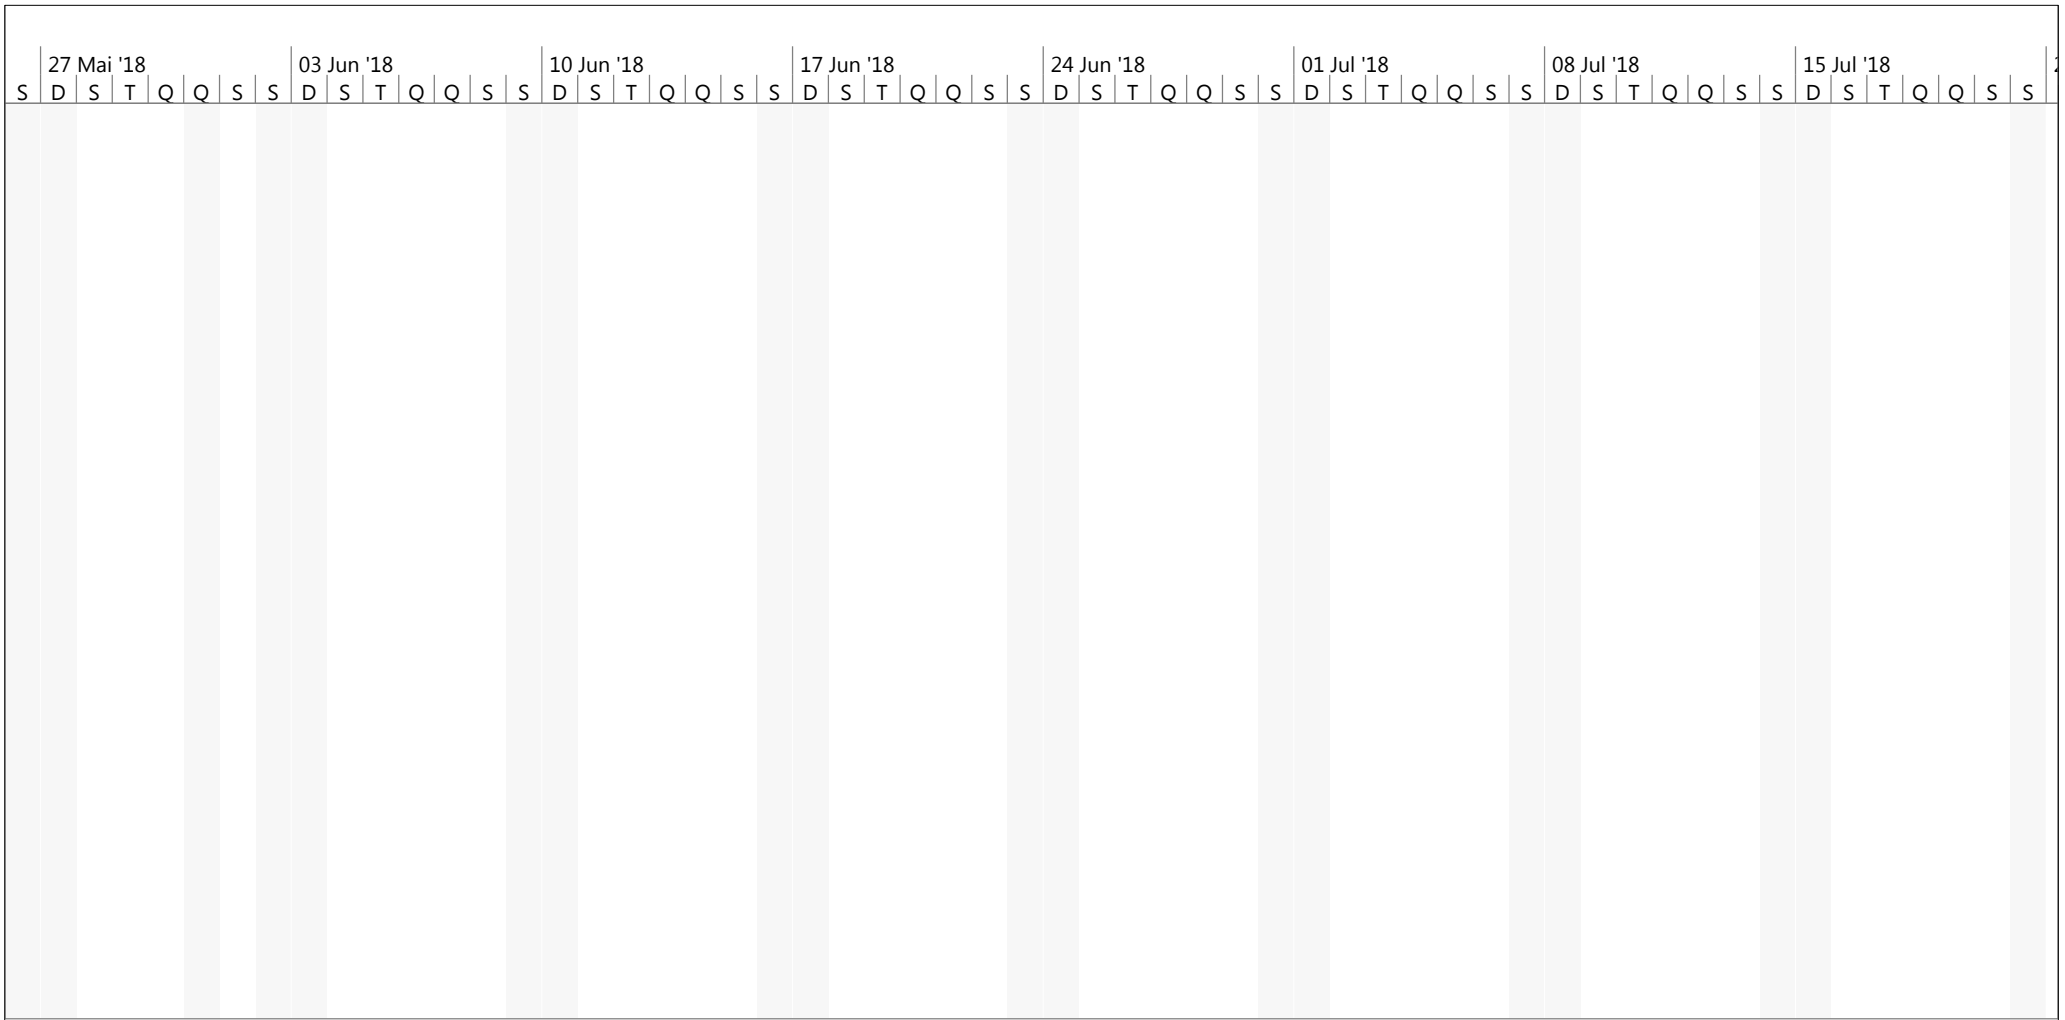


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

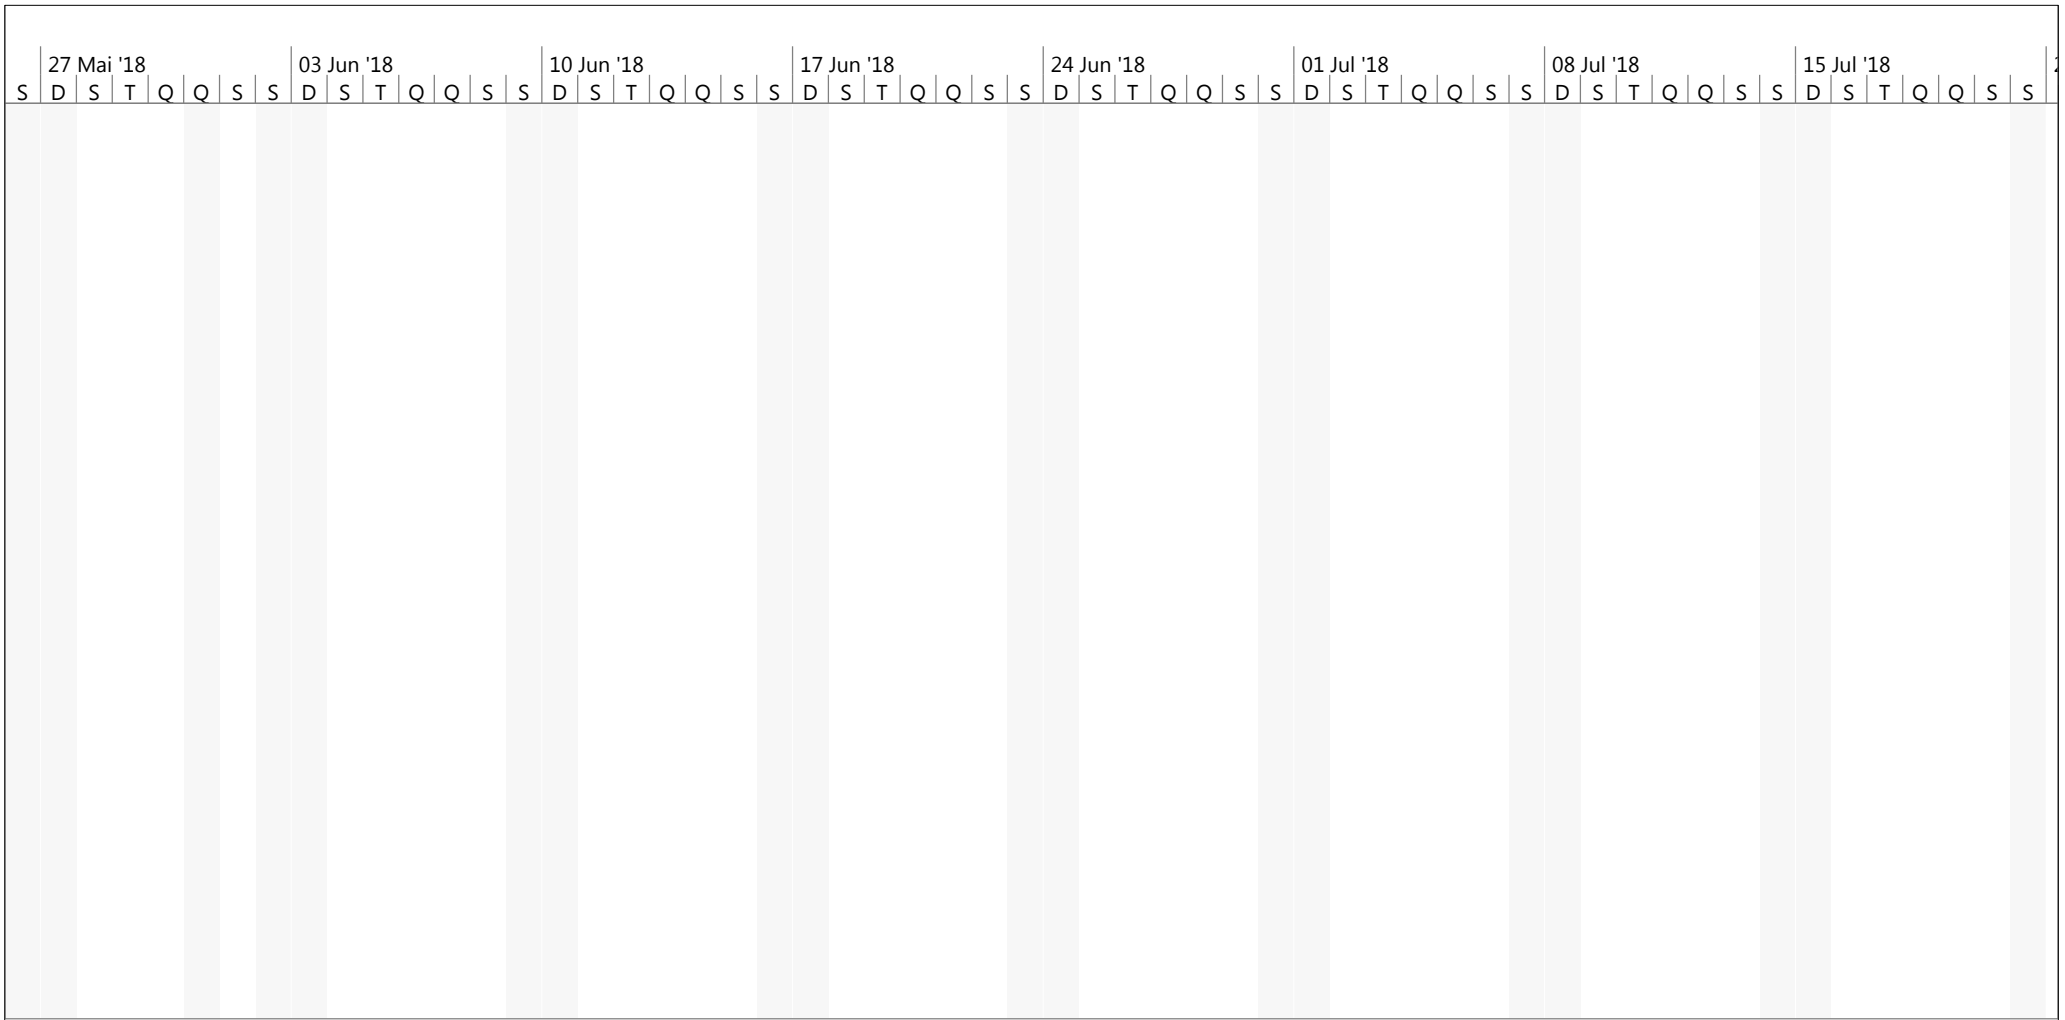


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

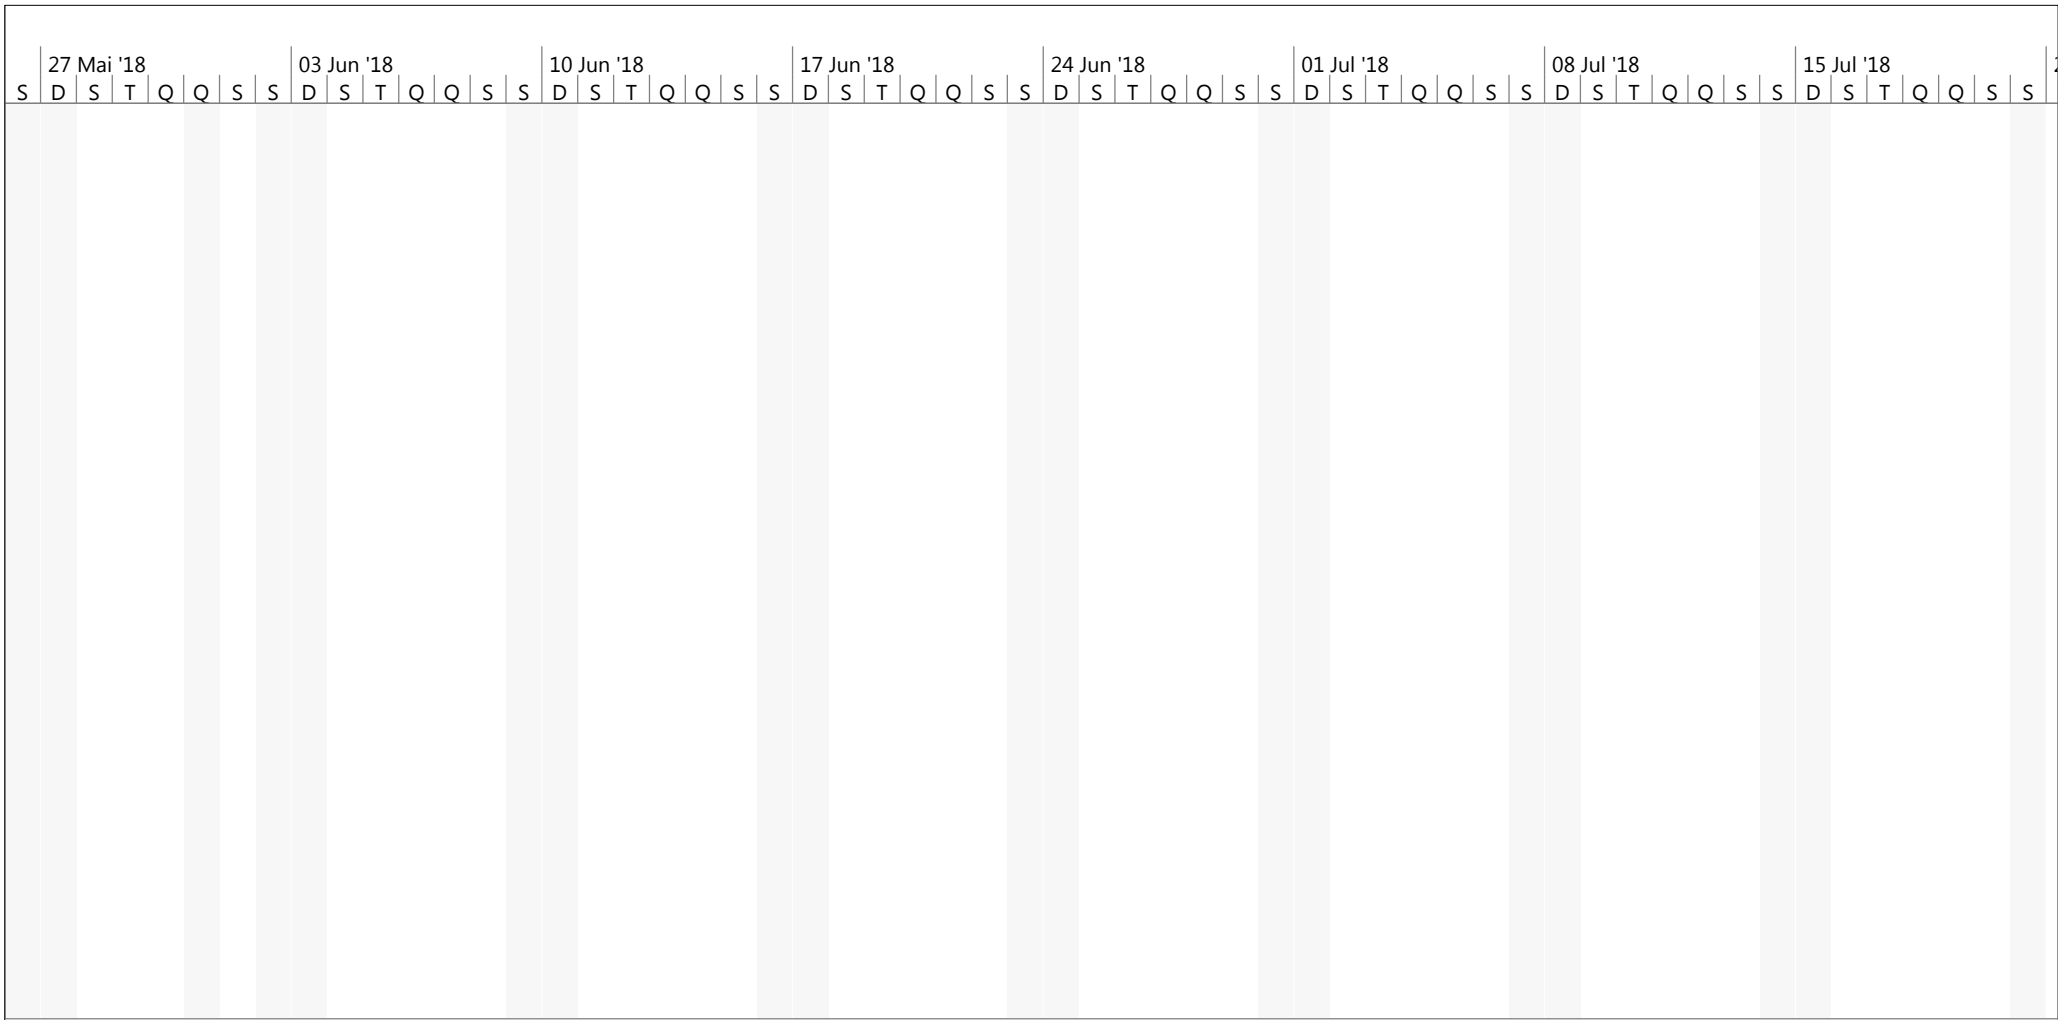


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

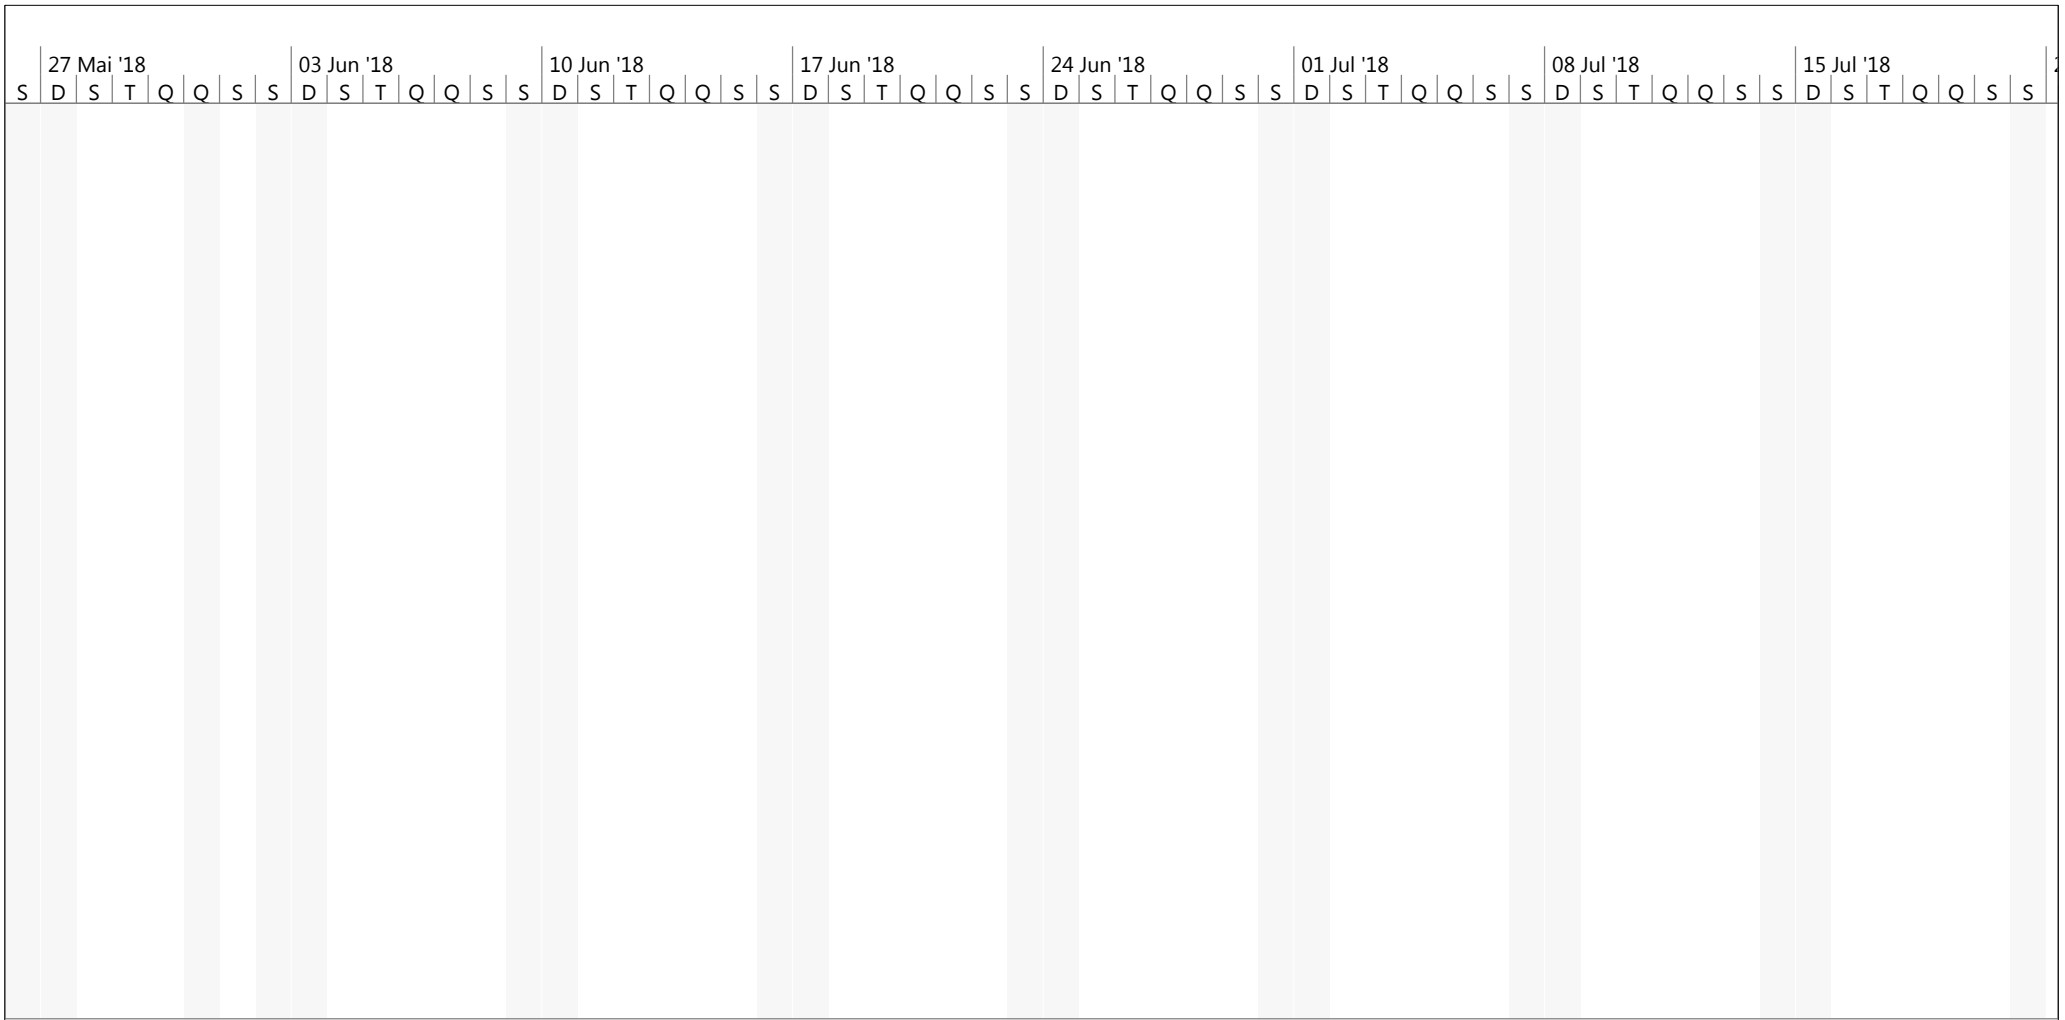


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

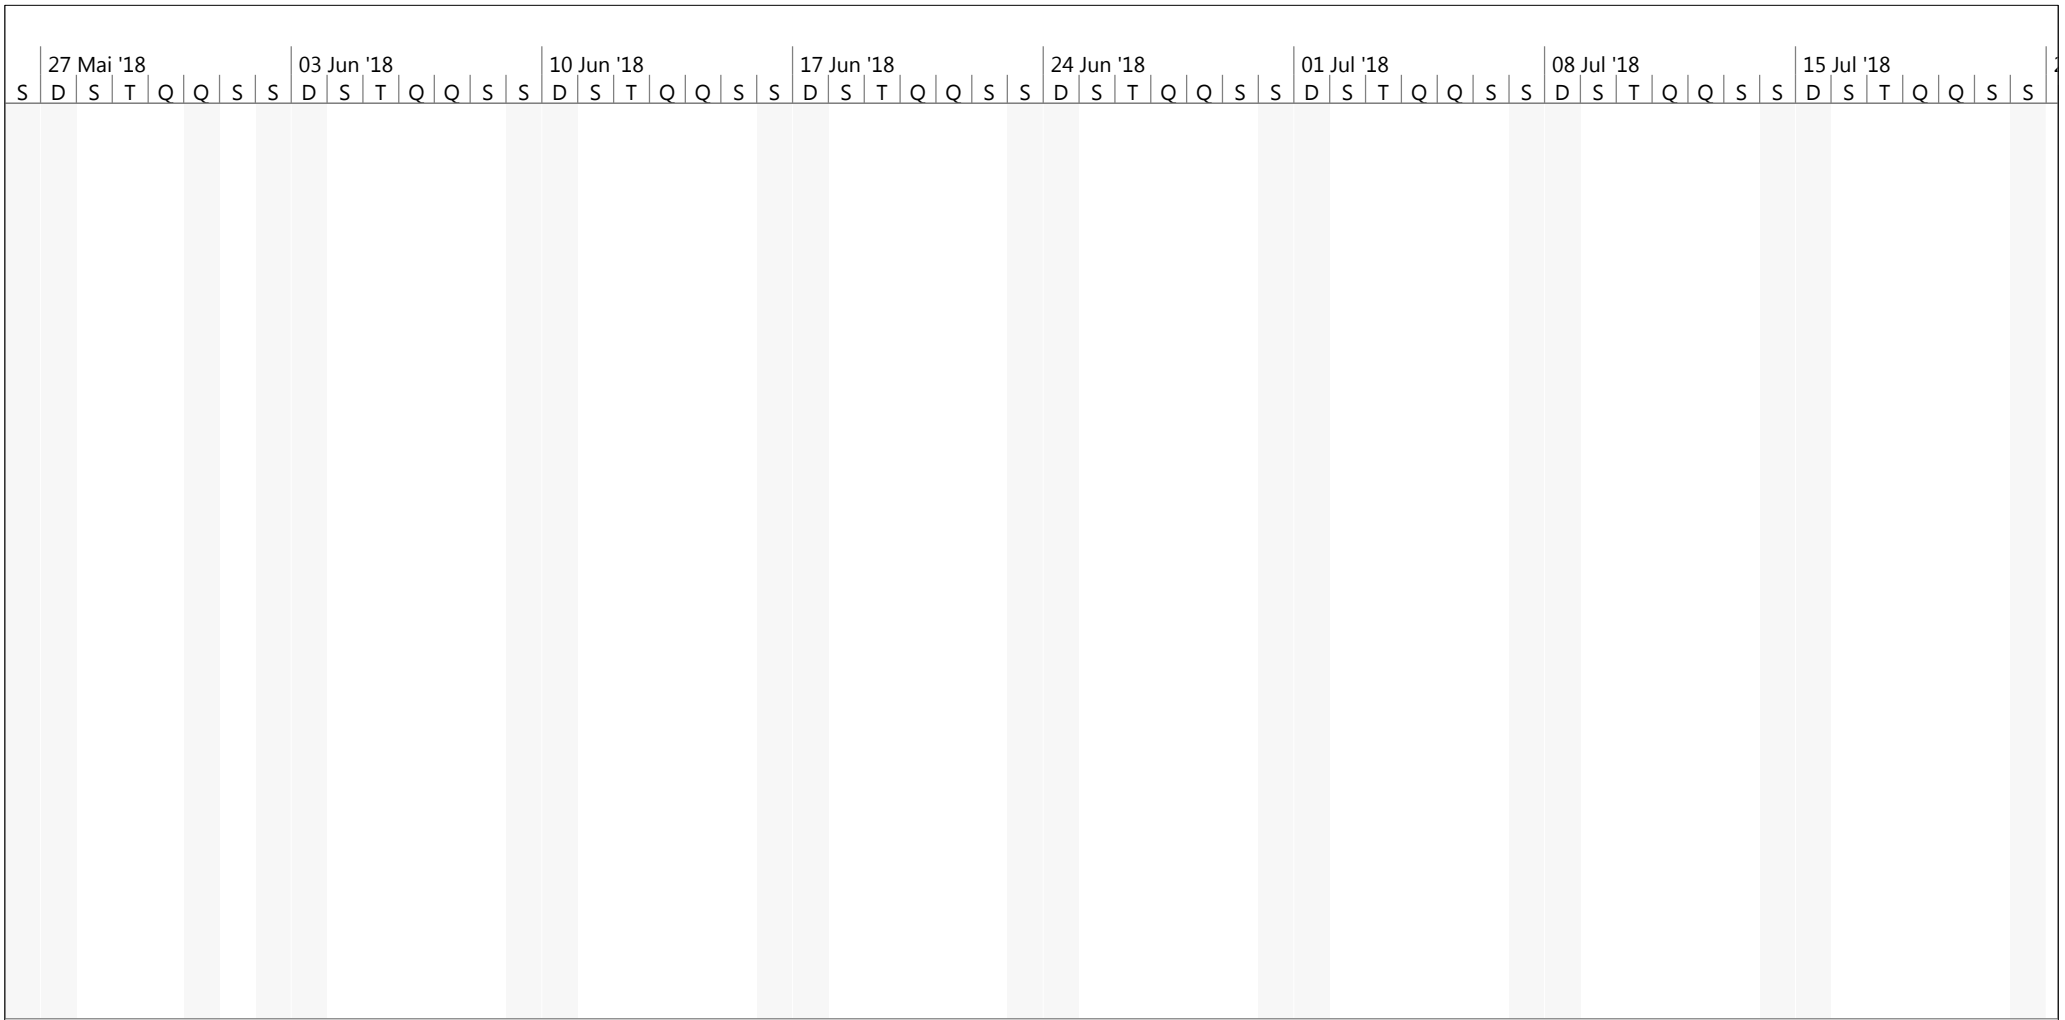


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

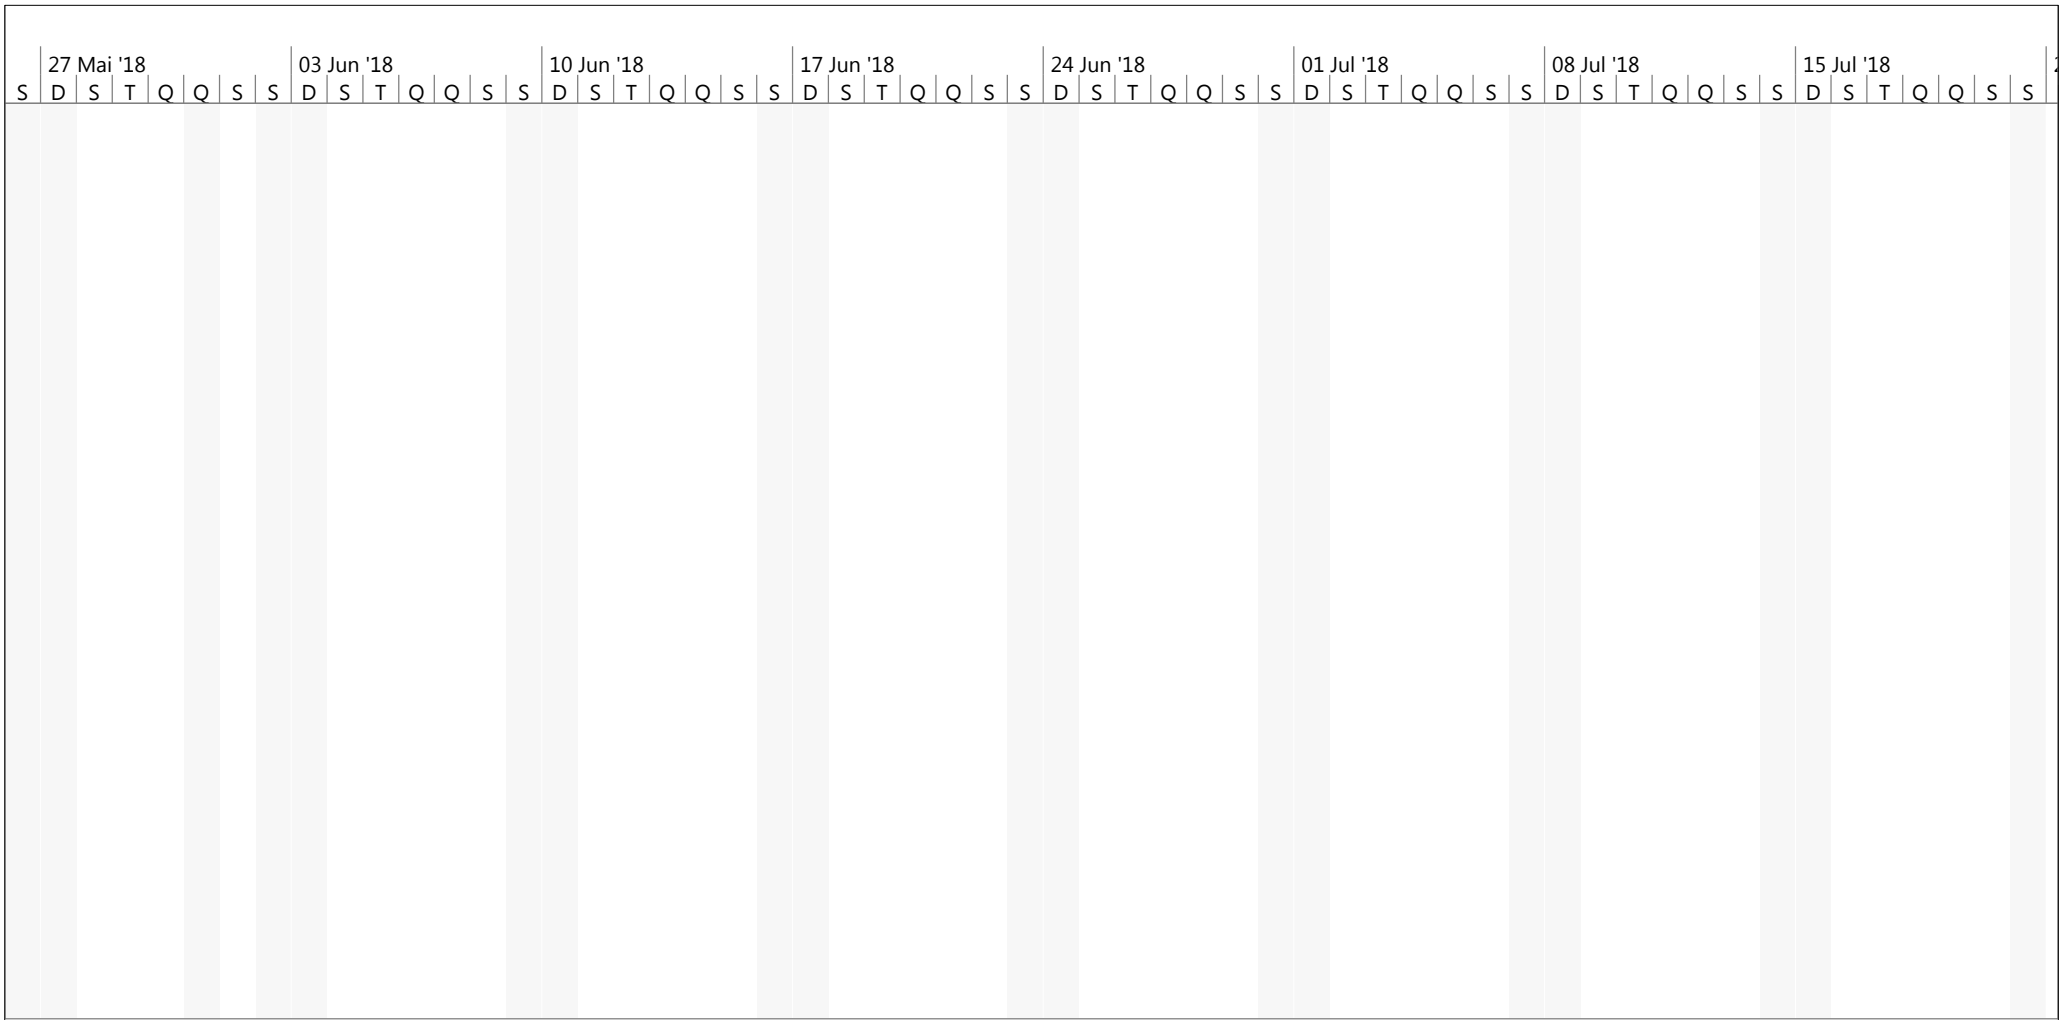


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

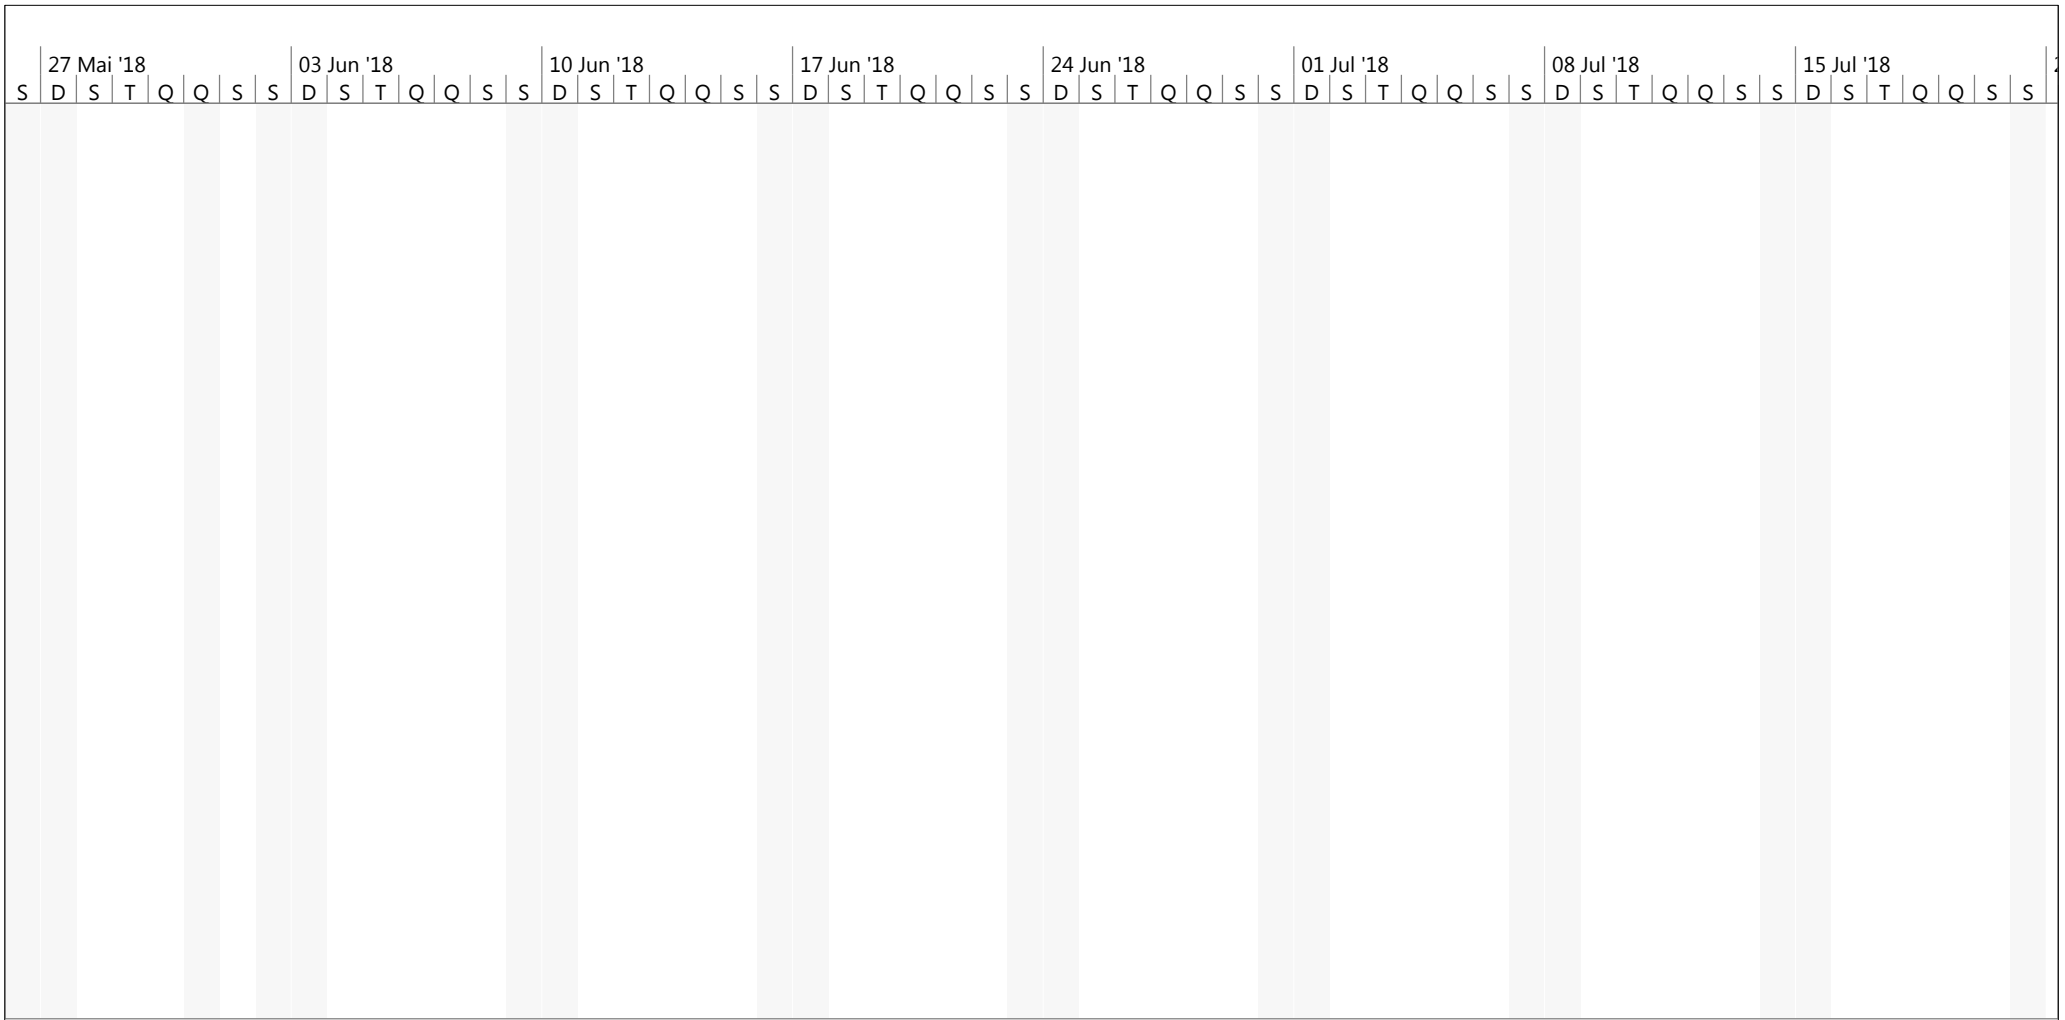


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

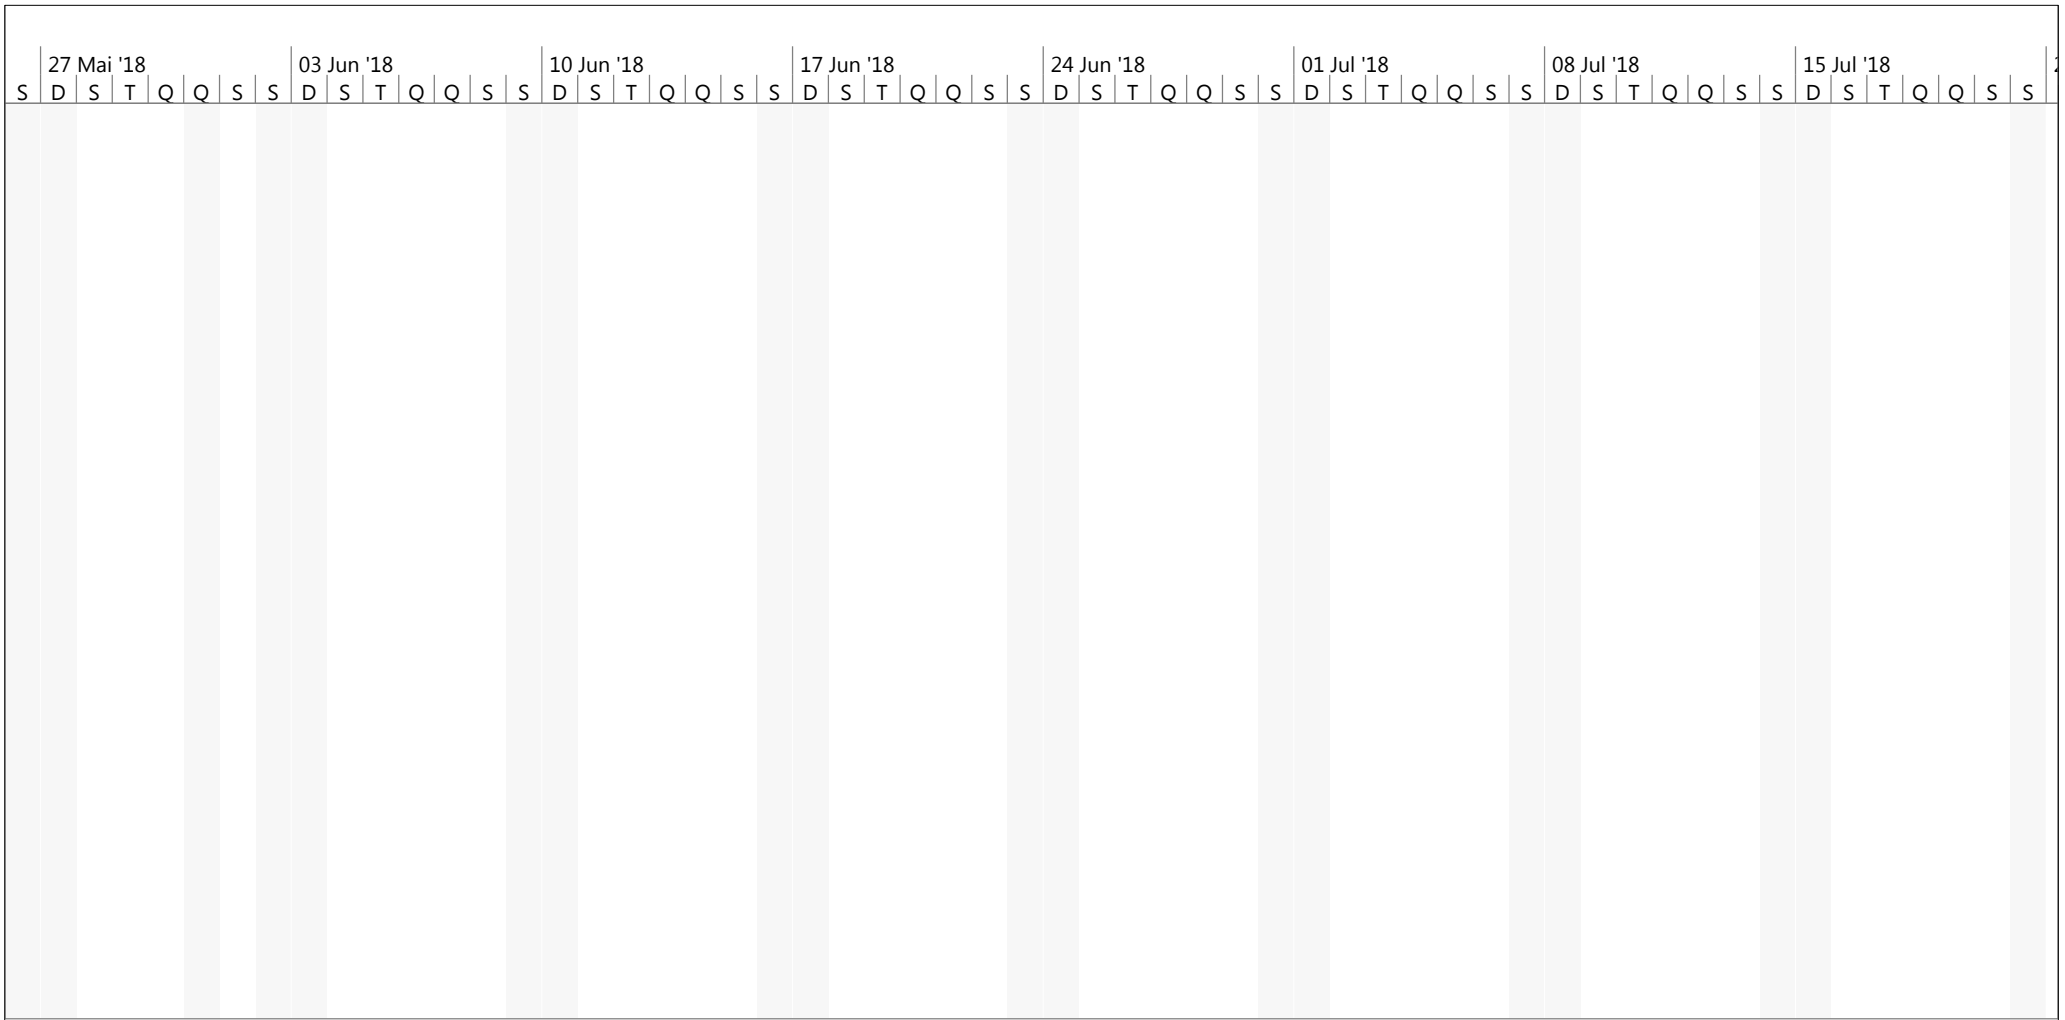


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

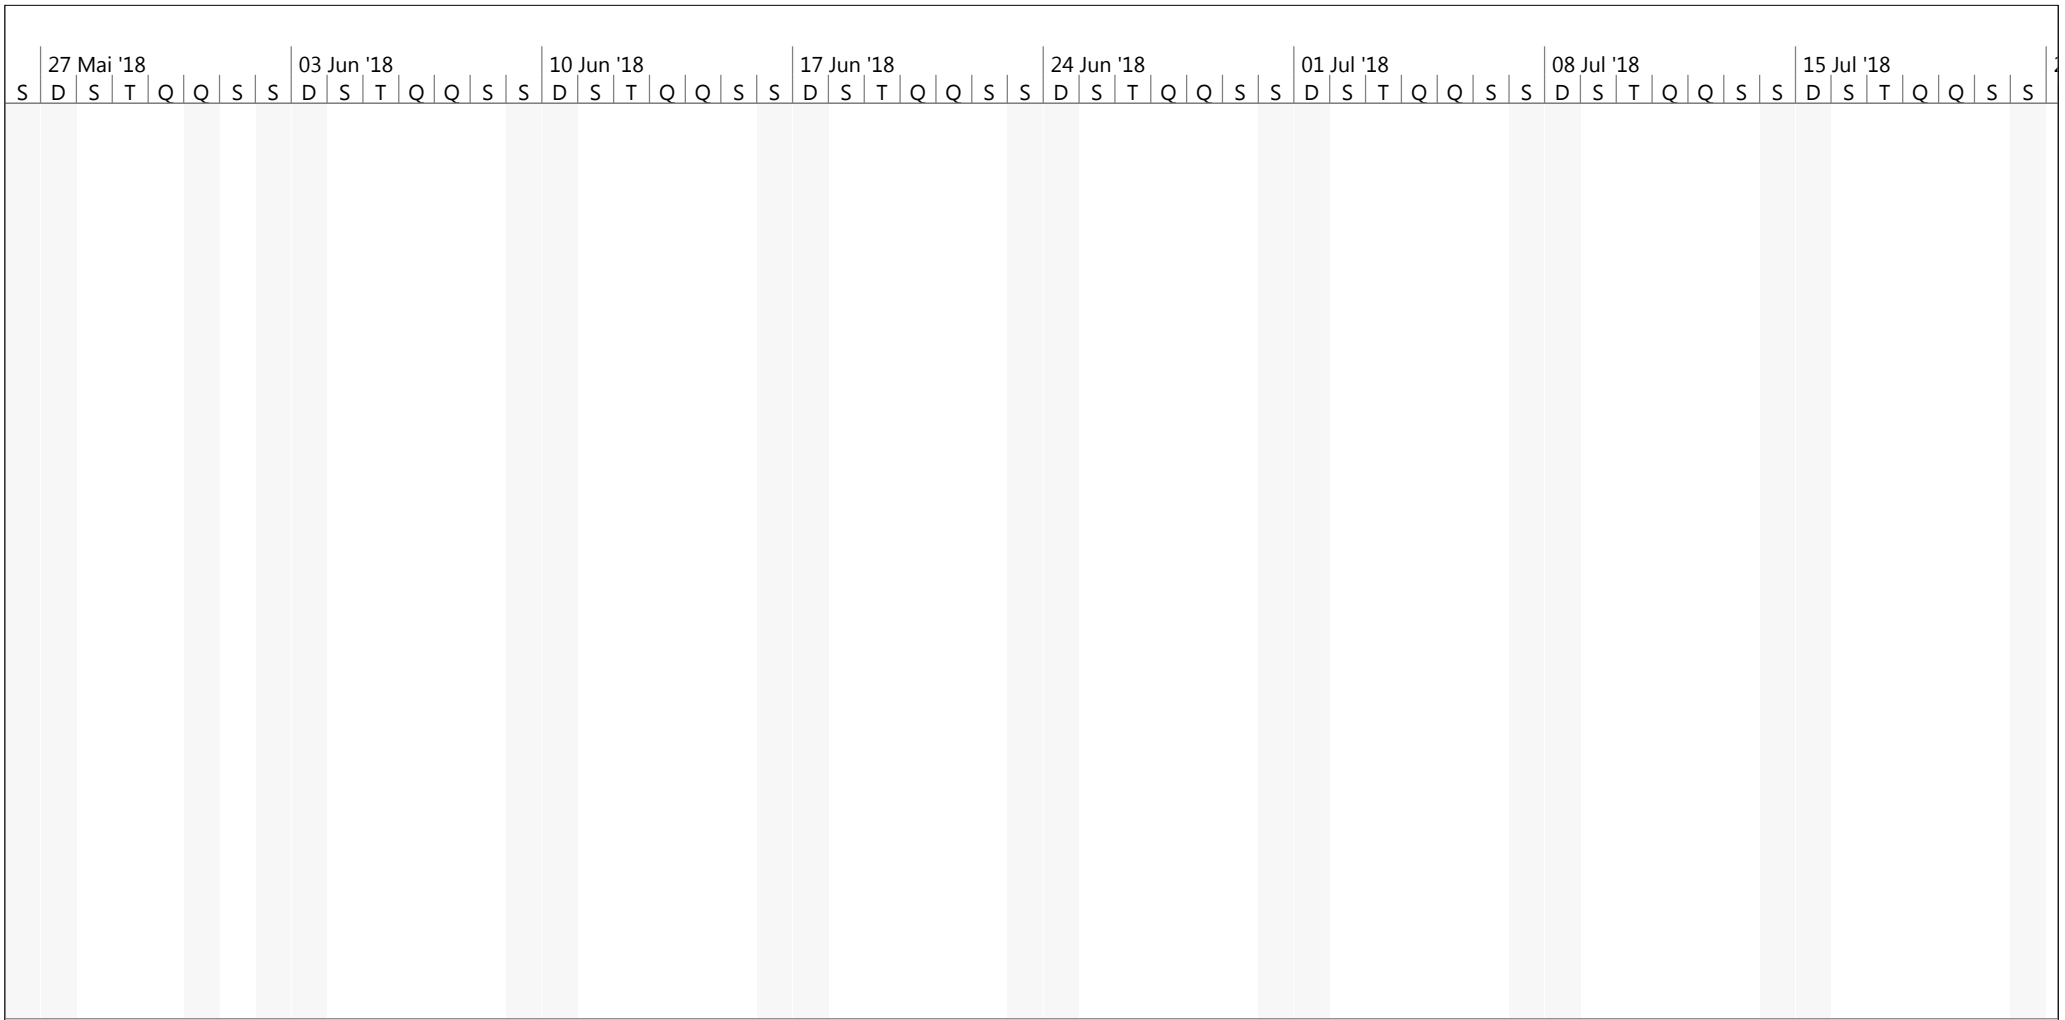



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

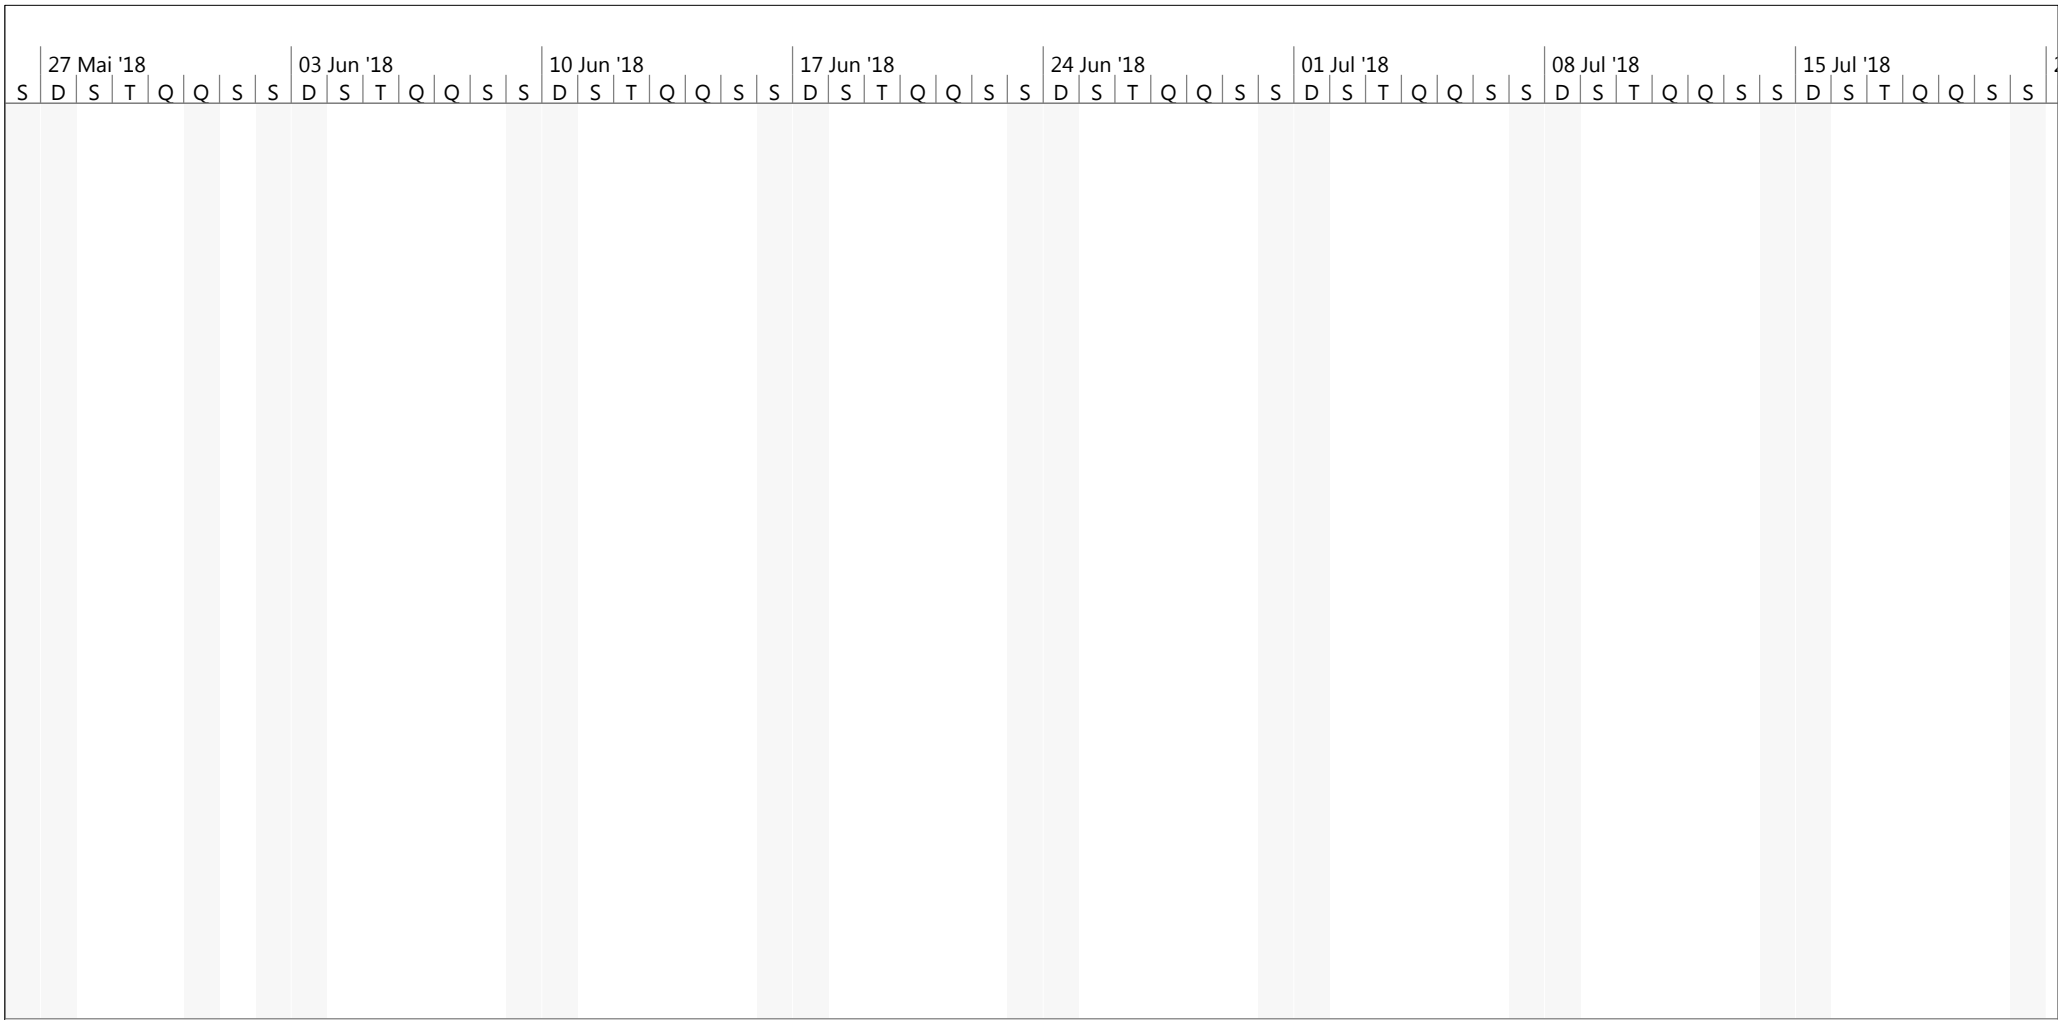


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

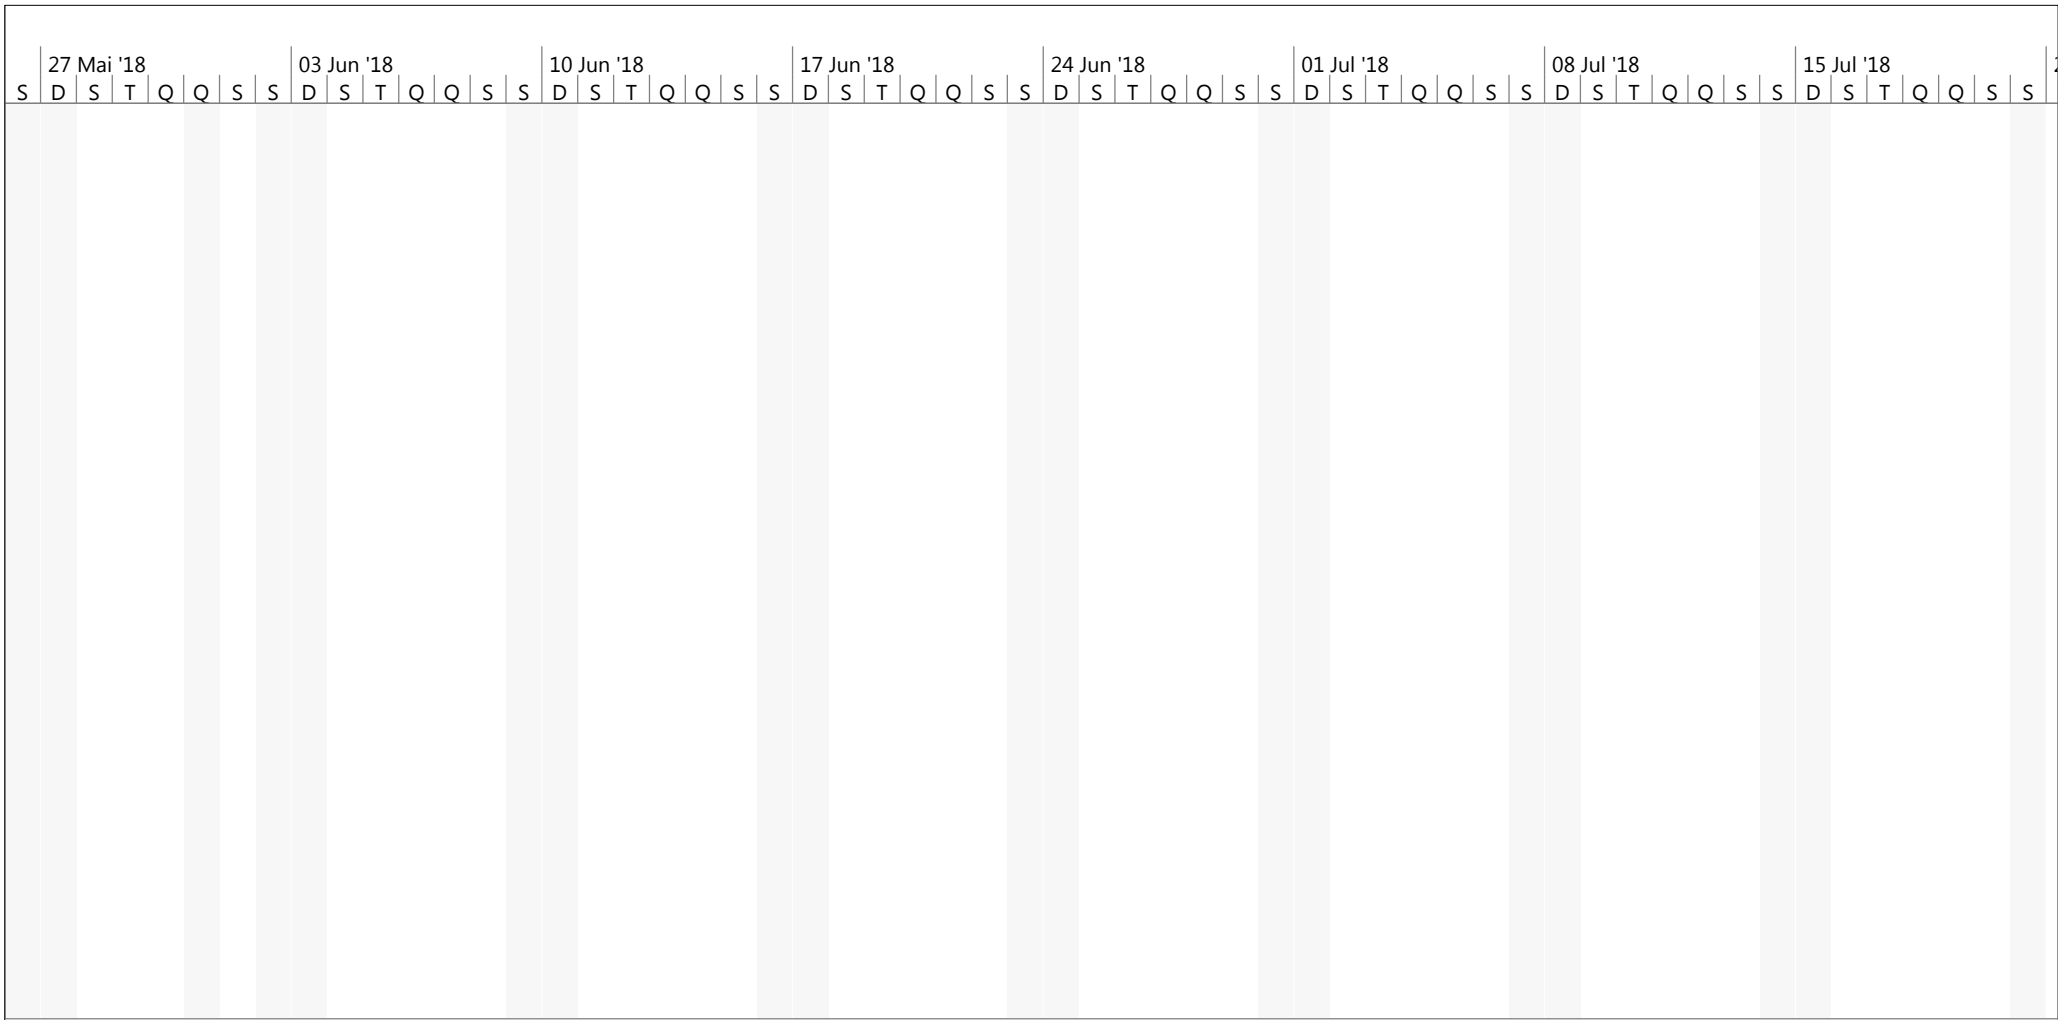

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

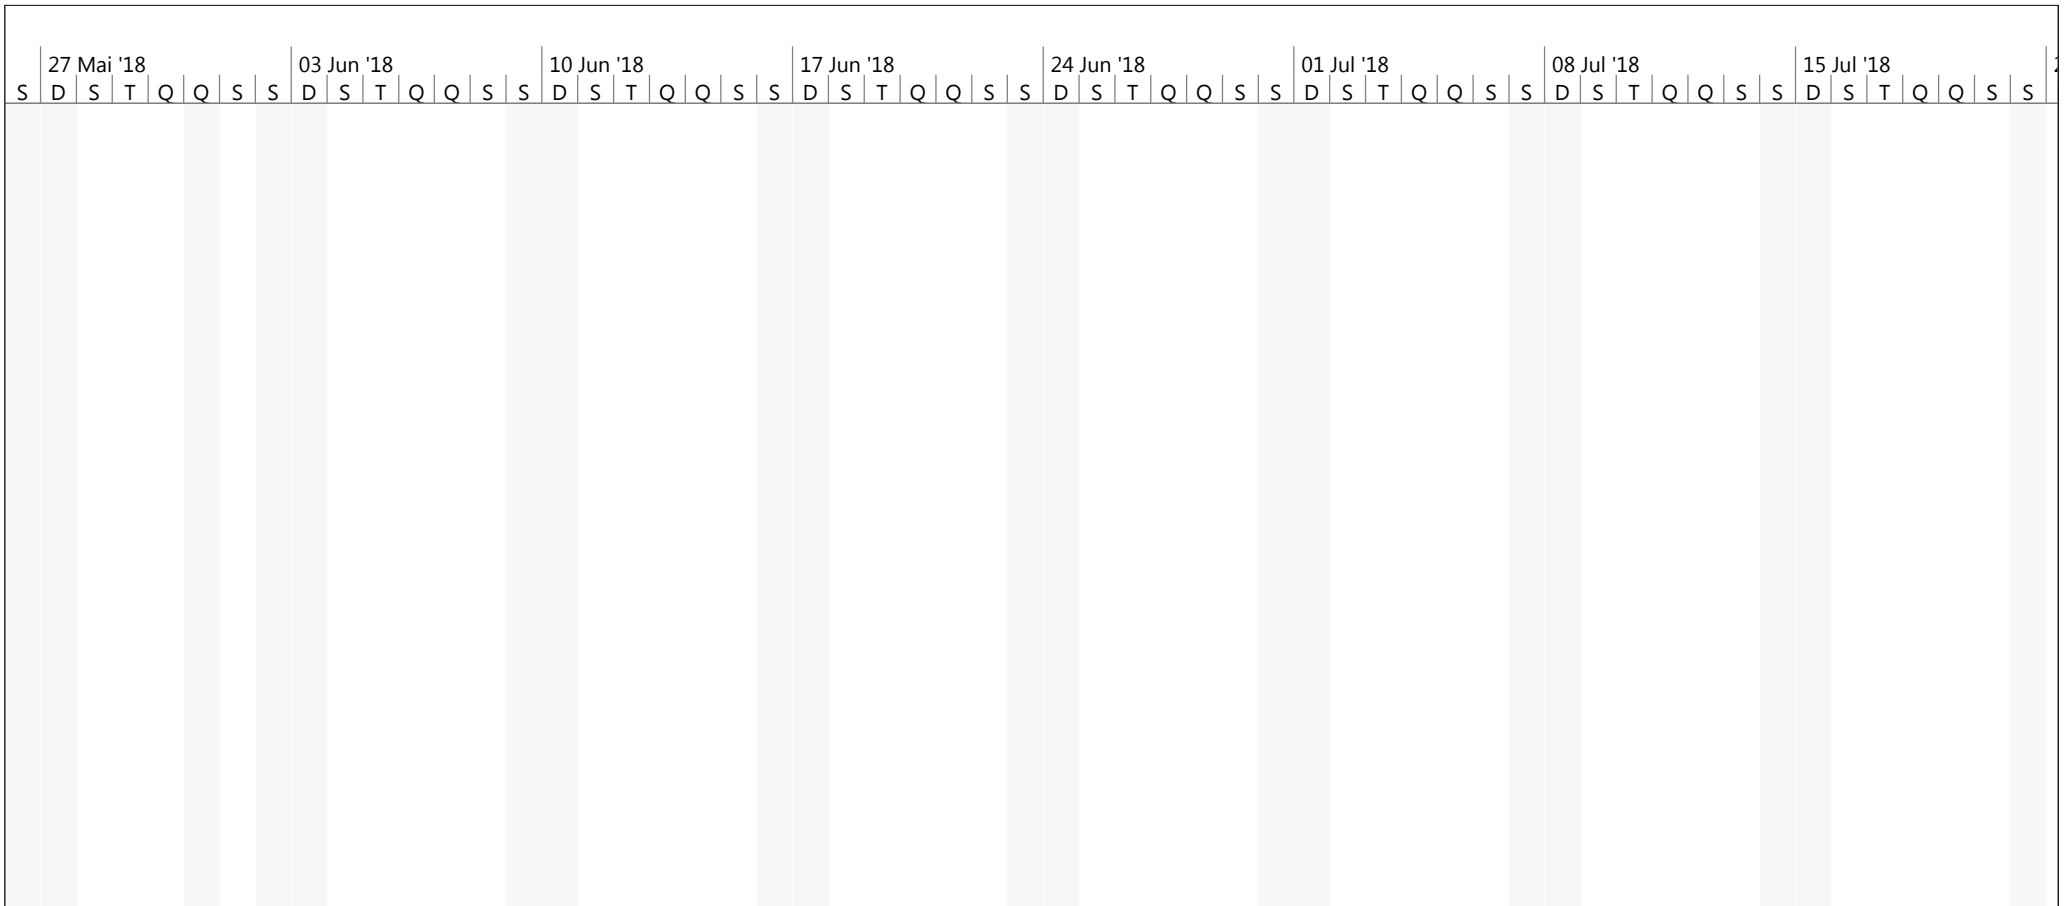


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

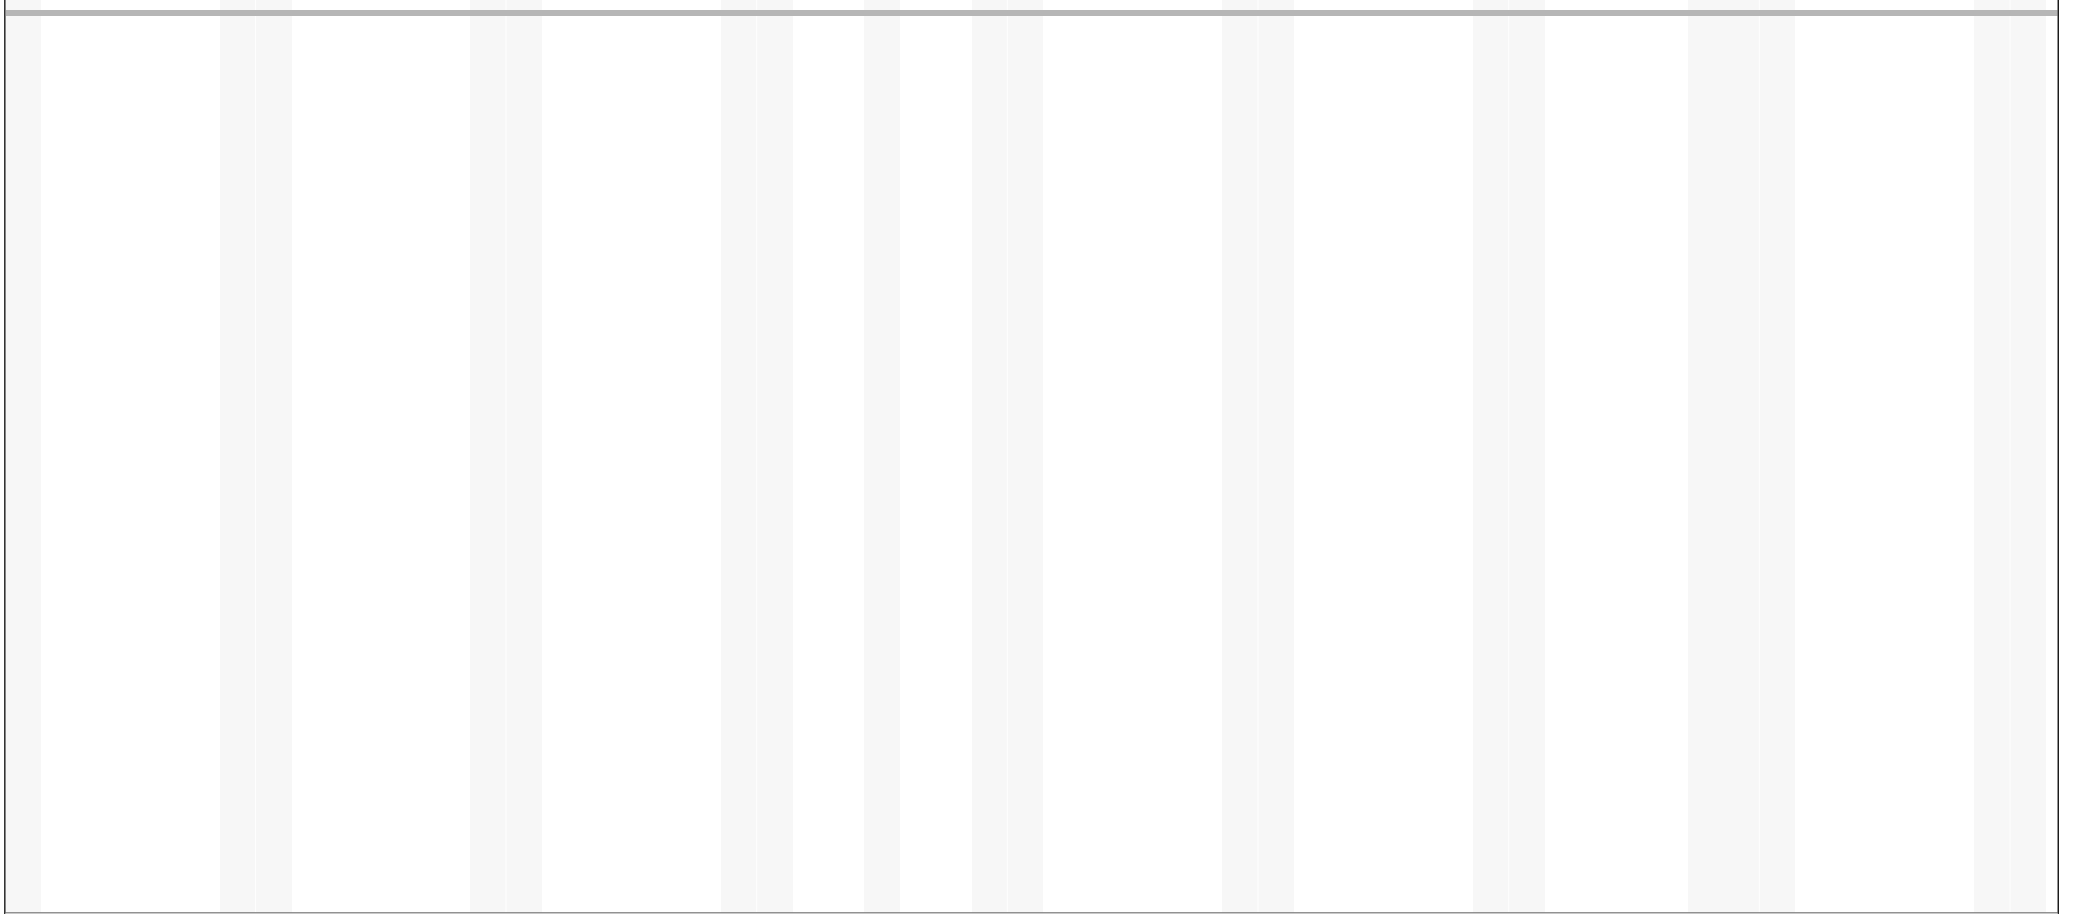

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

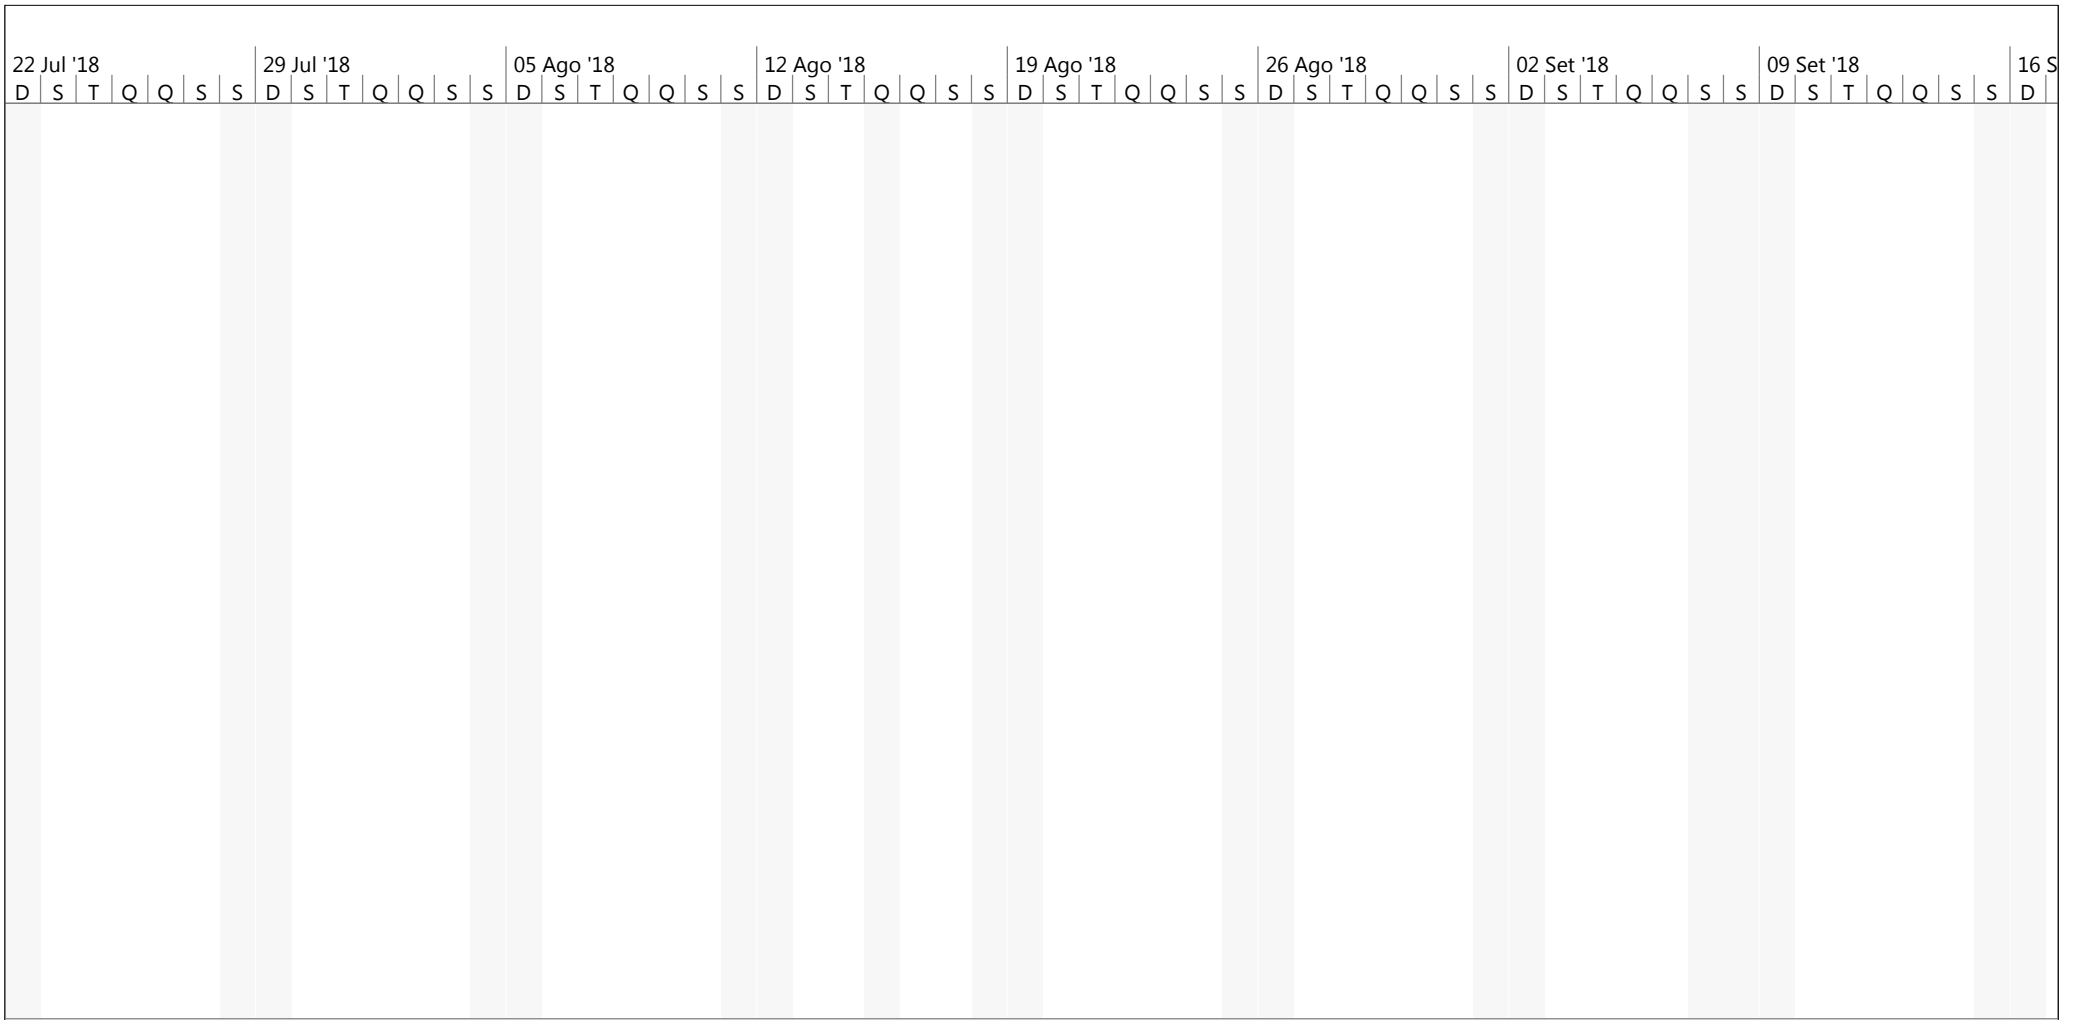

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

22 Jul '18 | 29 Jul '18 | 05 Ago '18 | 12 Ago '18 | 19 Ago '18 | 26 Ago '18 | 02 Set '18 | 09 Set '18 | 16 S


D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

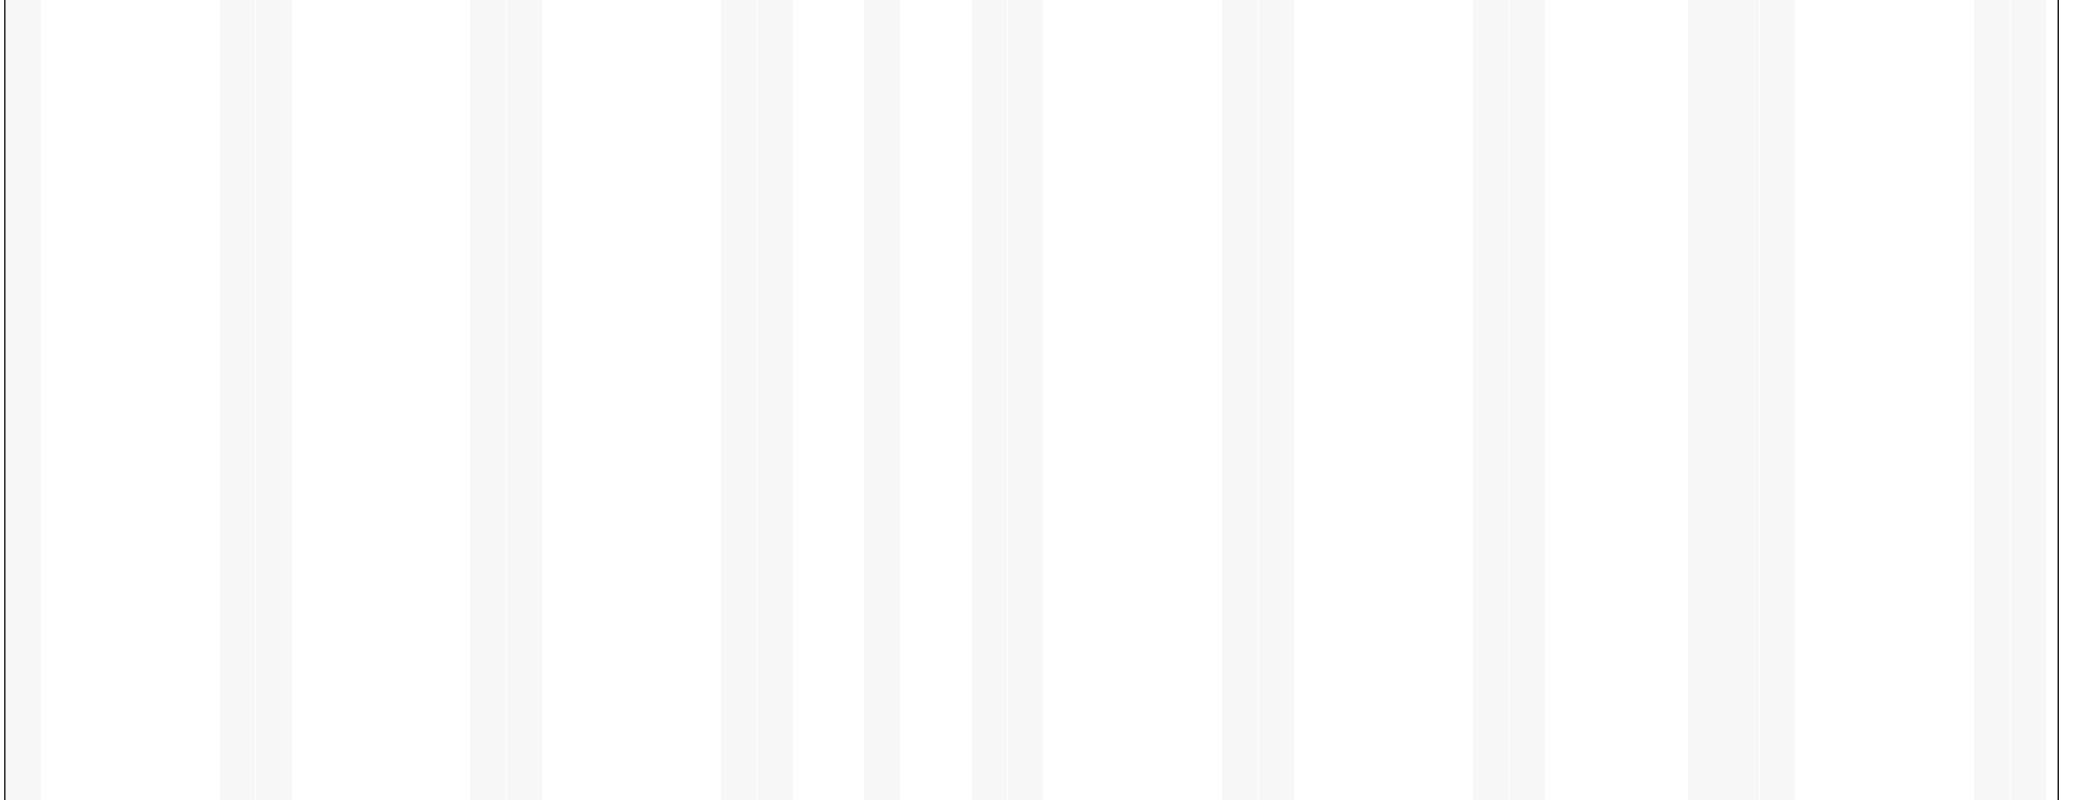


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Set '18 23 Set '18 30 Set '18 07 Out '18 14 Out '18 21 Out '18 28 Out '18 04 Nov '18 11 Nov

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

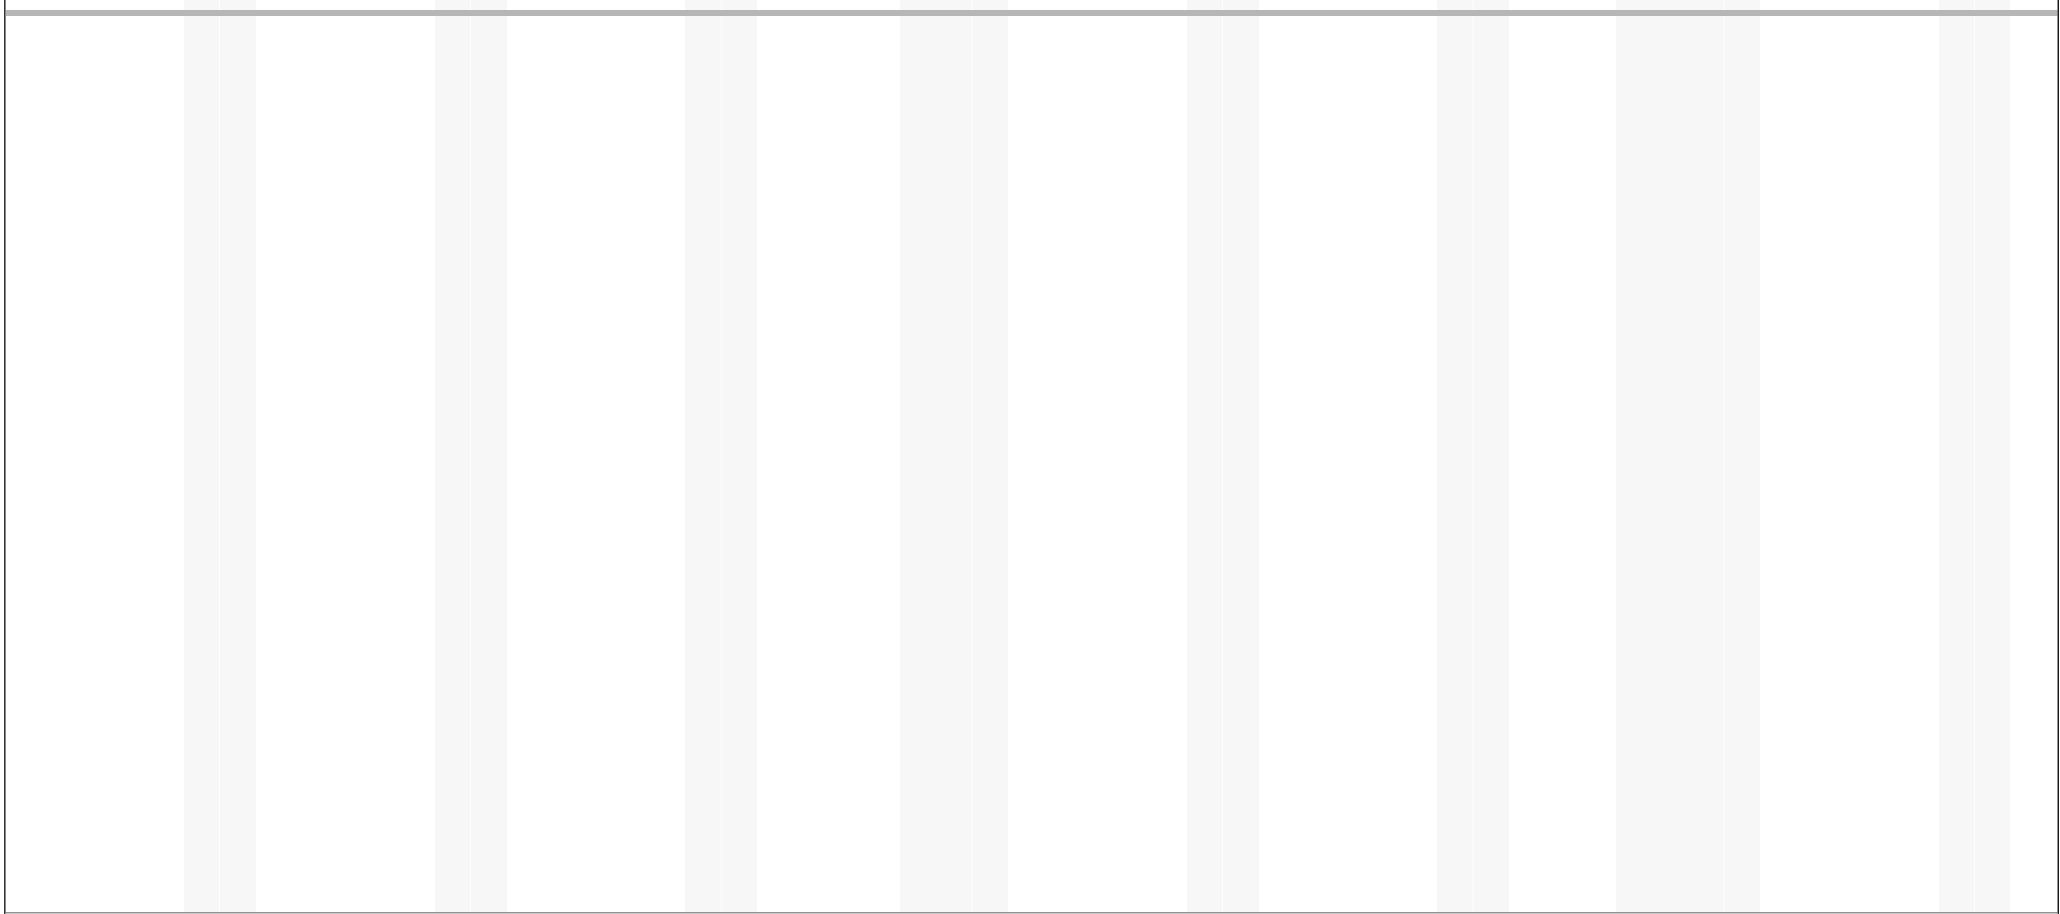


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

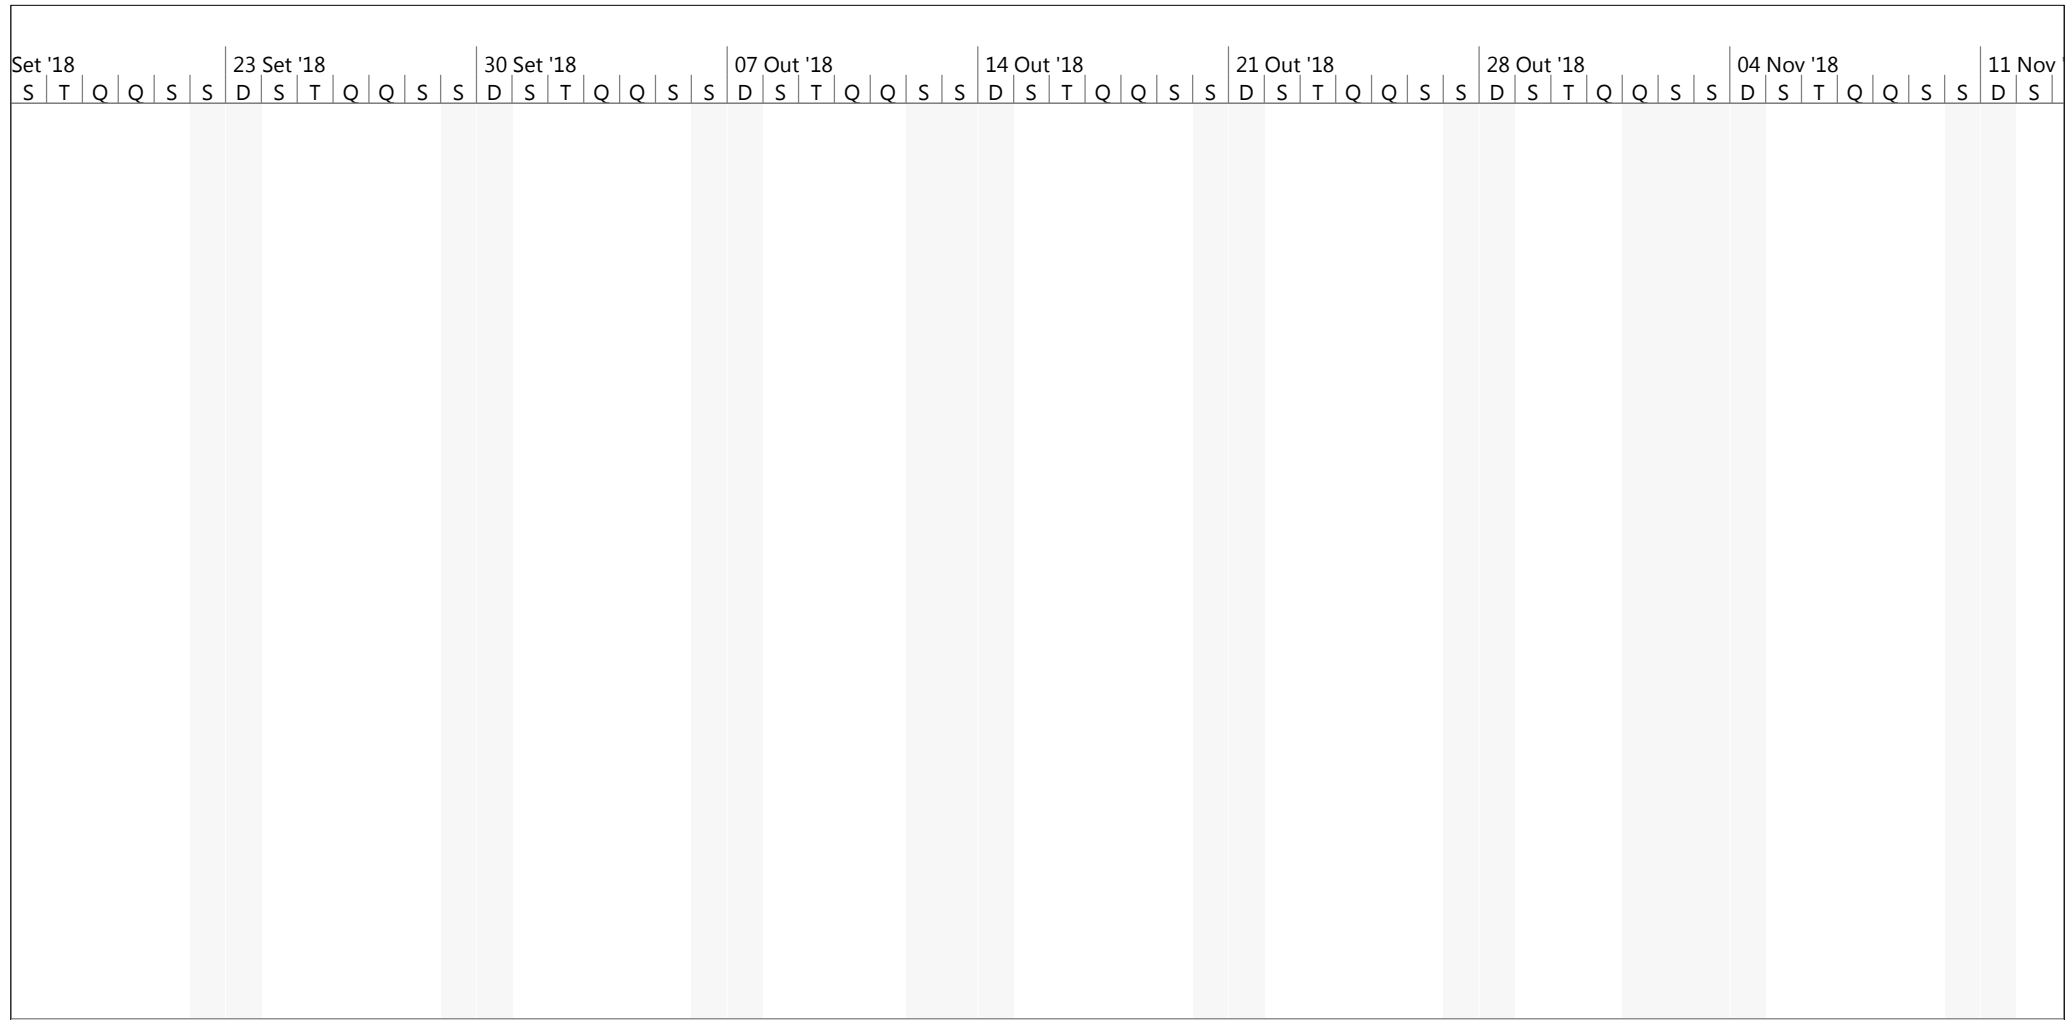

Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

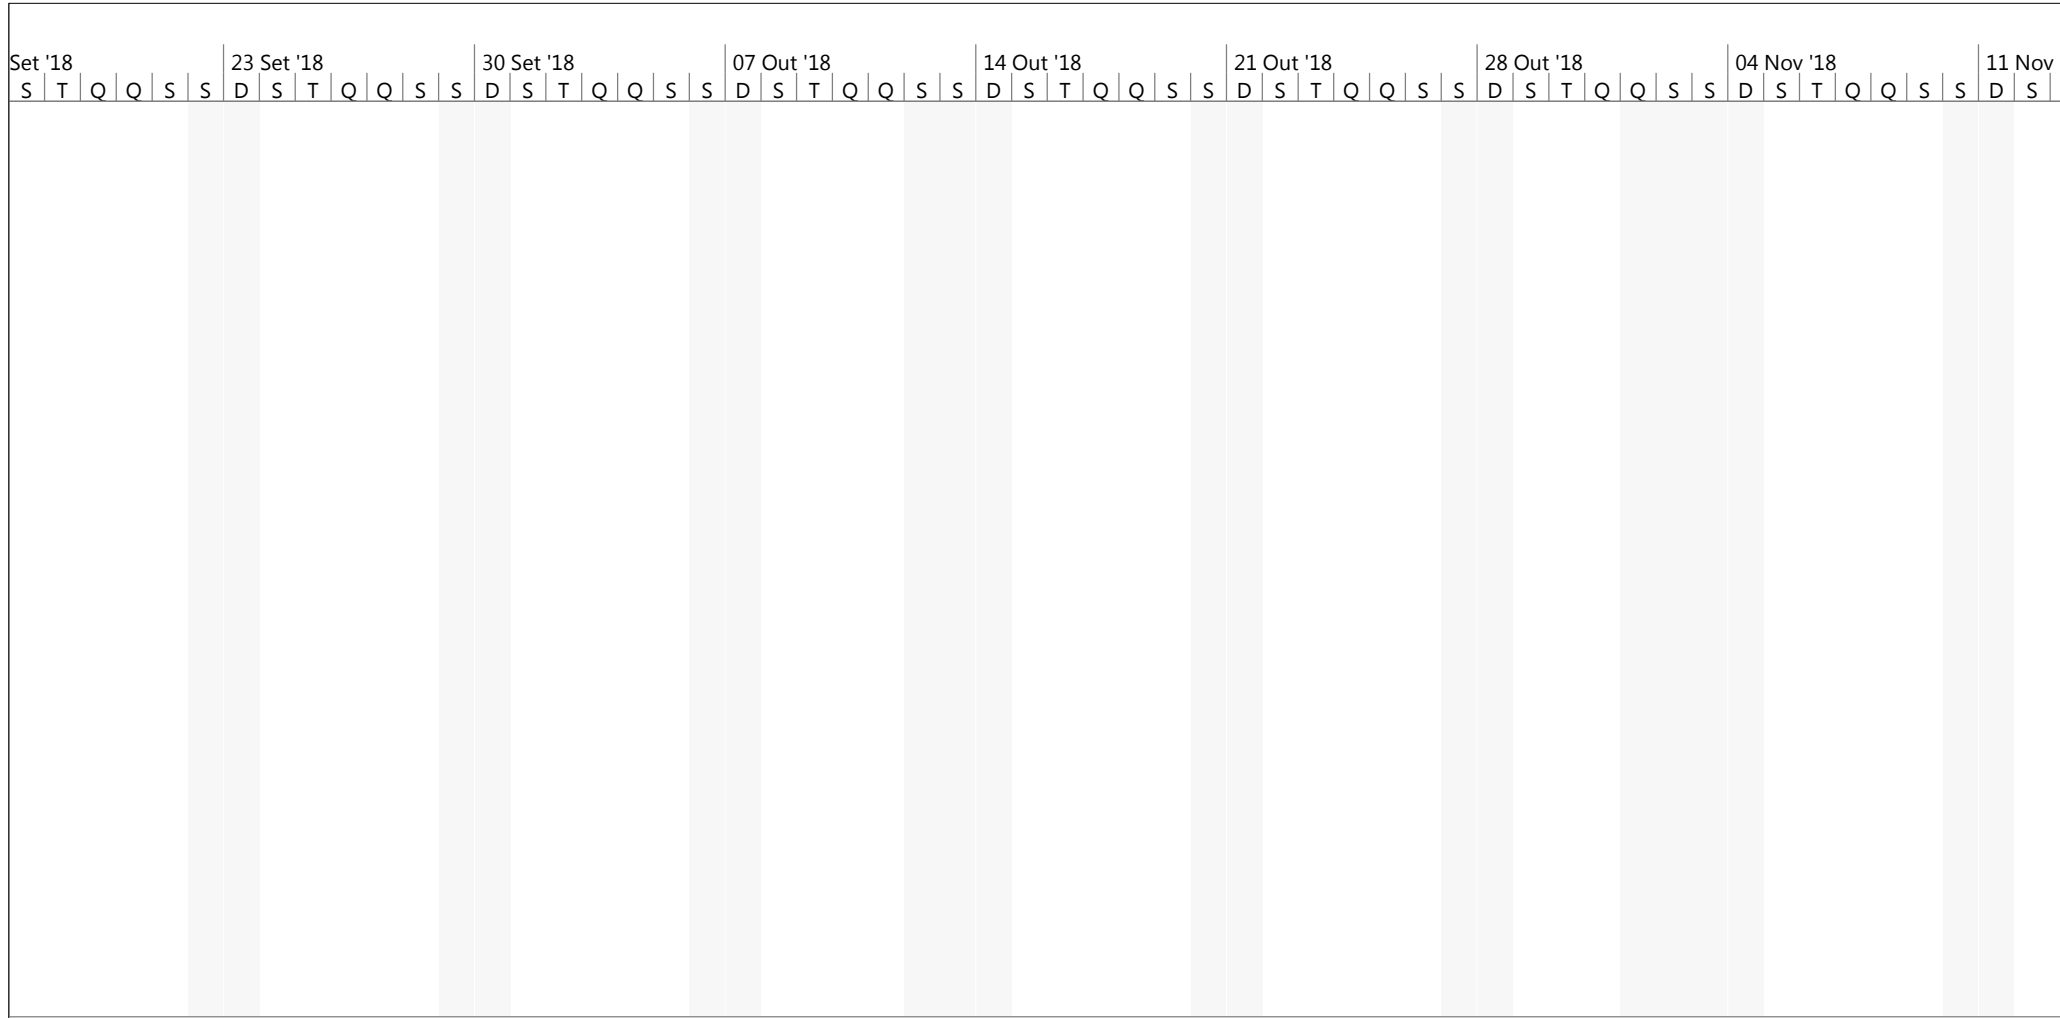


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Set '18 23 Set '18 30 Set '18 07 Out '18 14 Out '18 21 Out '18 28 Out '18 04 Nov '18 11 Nov
 S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

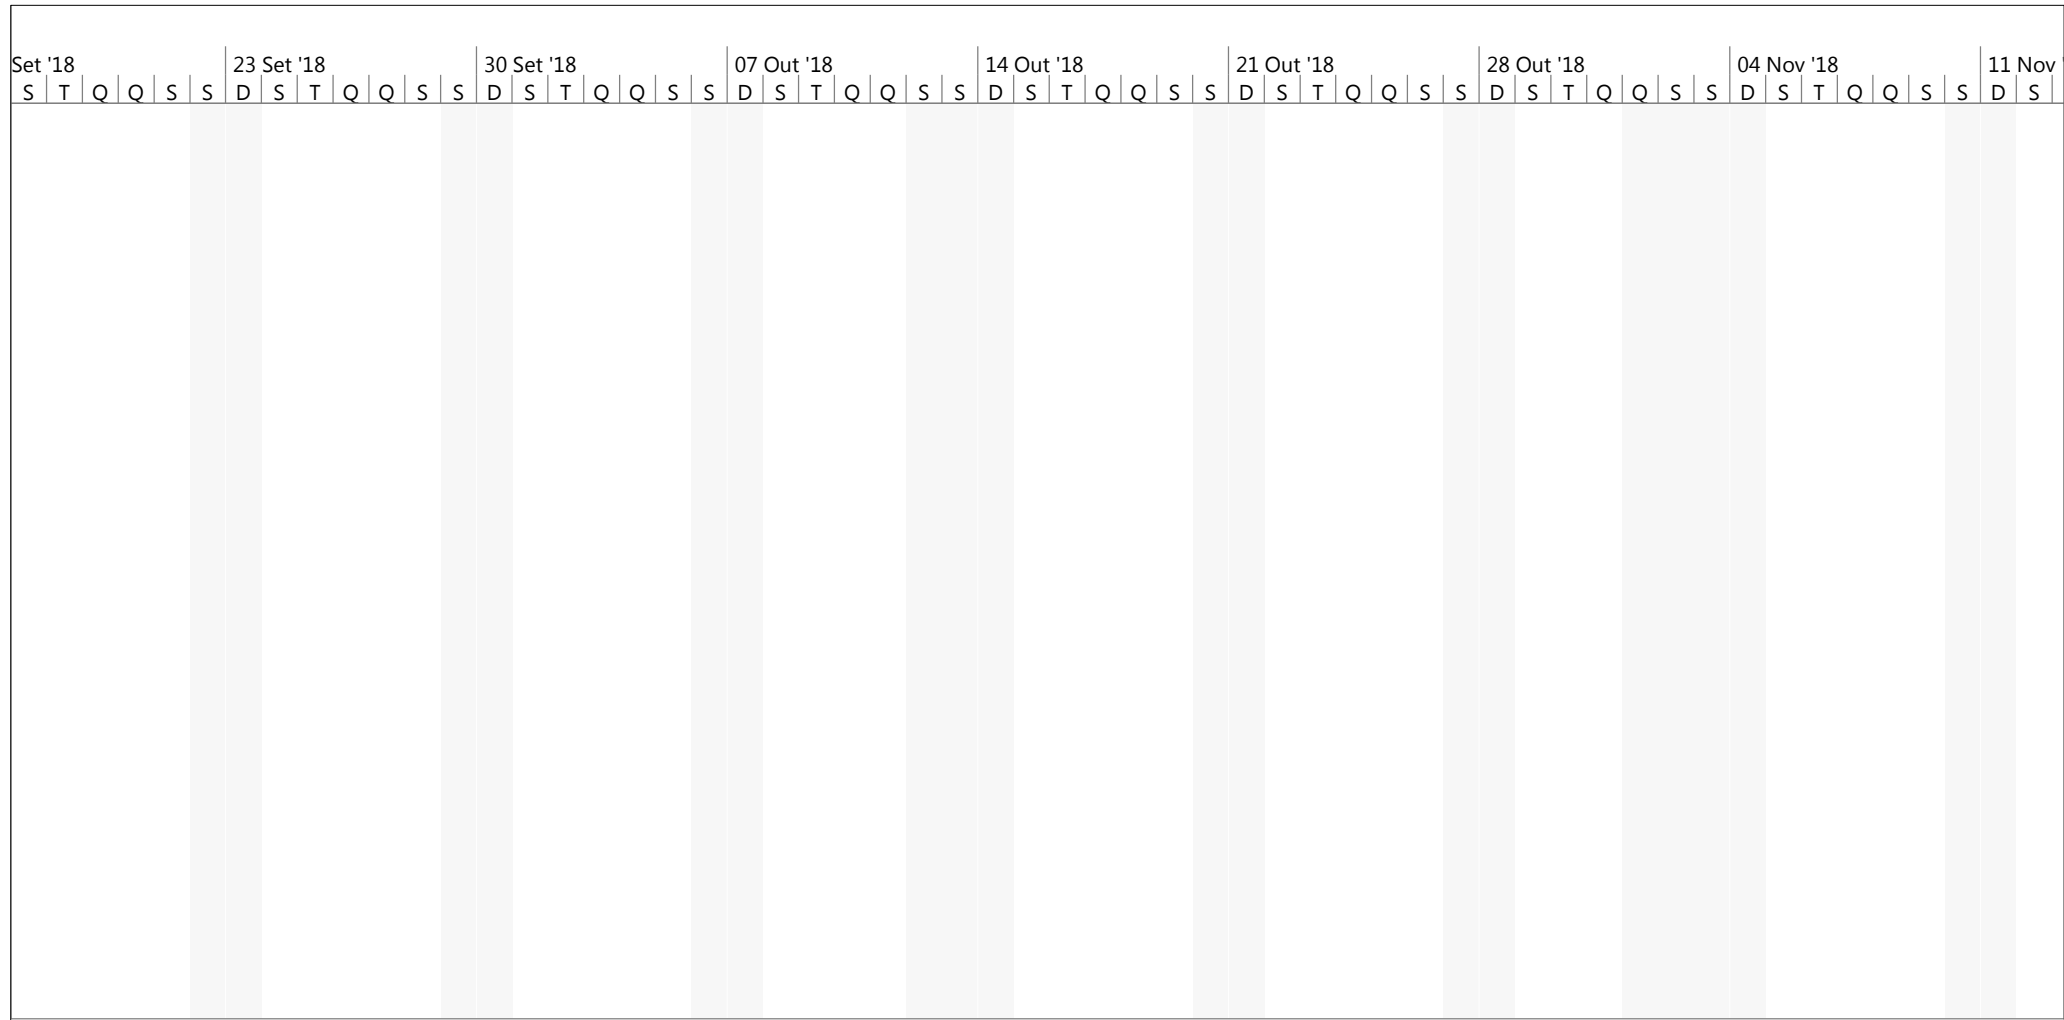


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

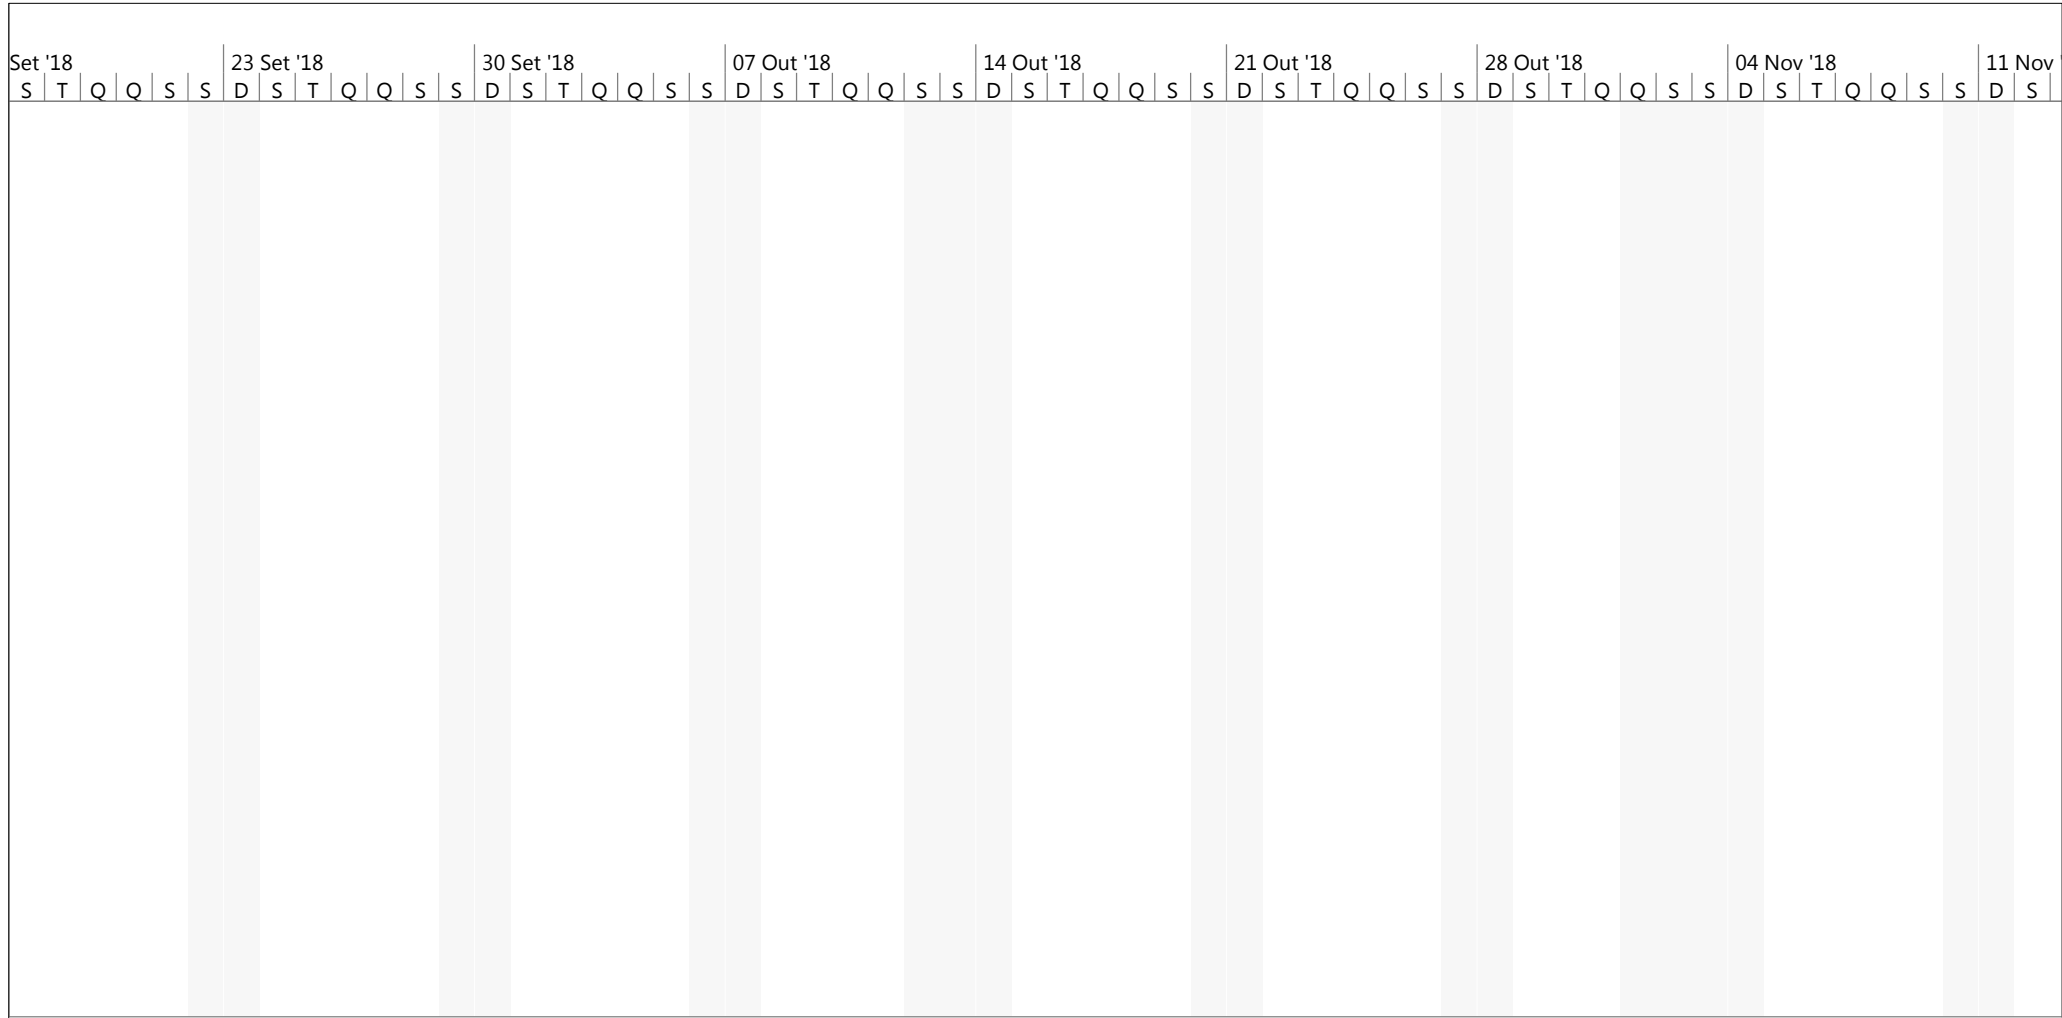


Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

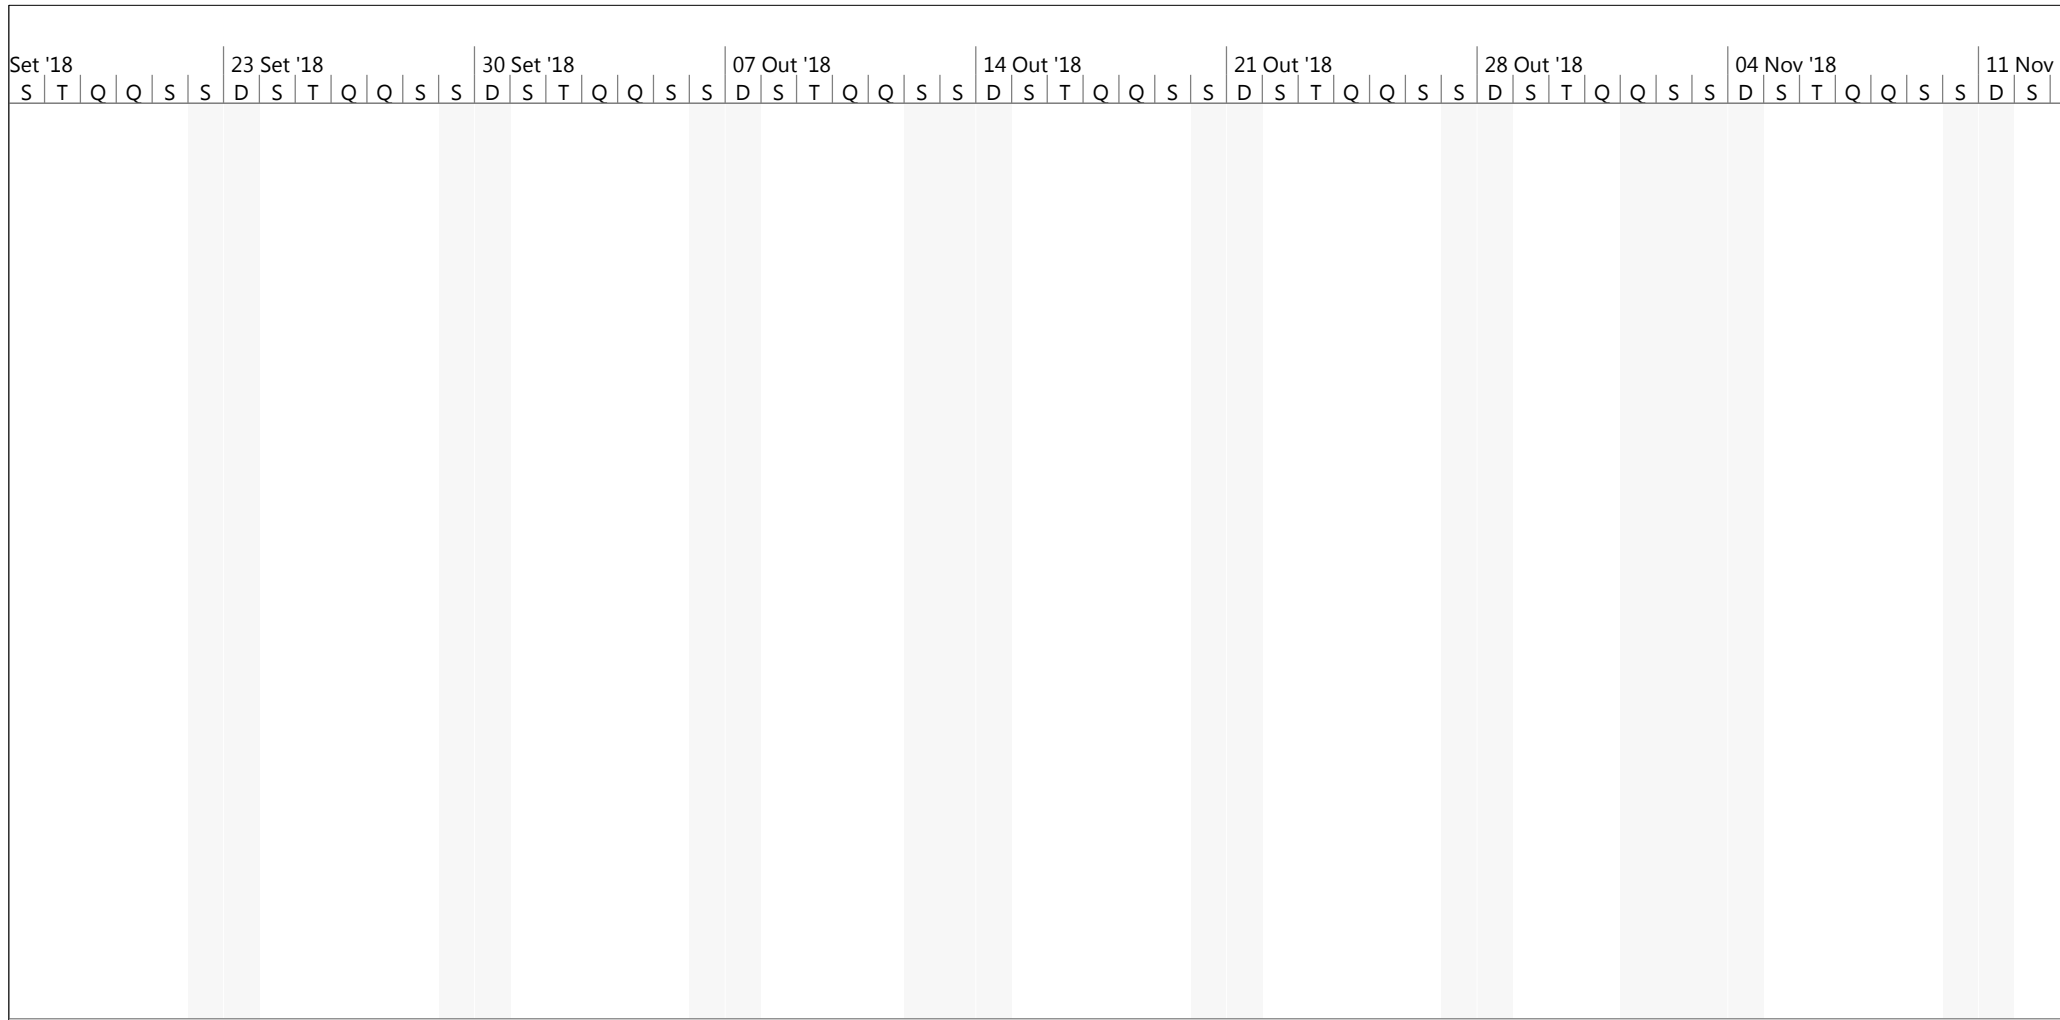

Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

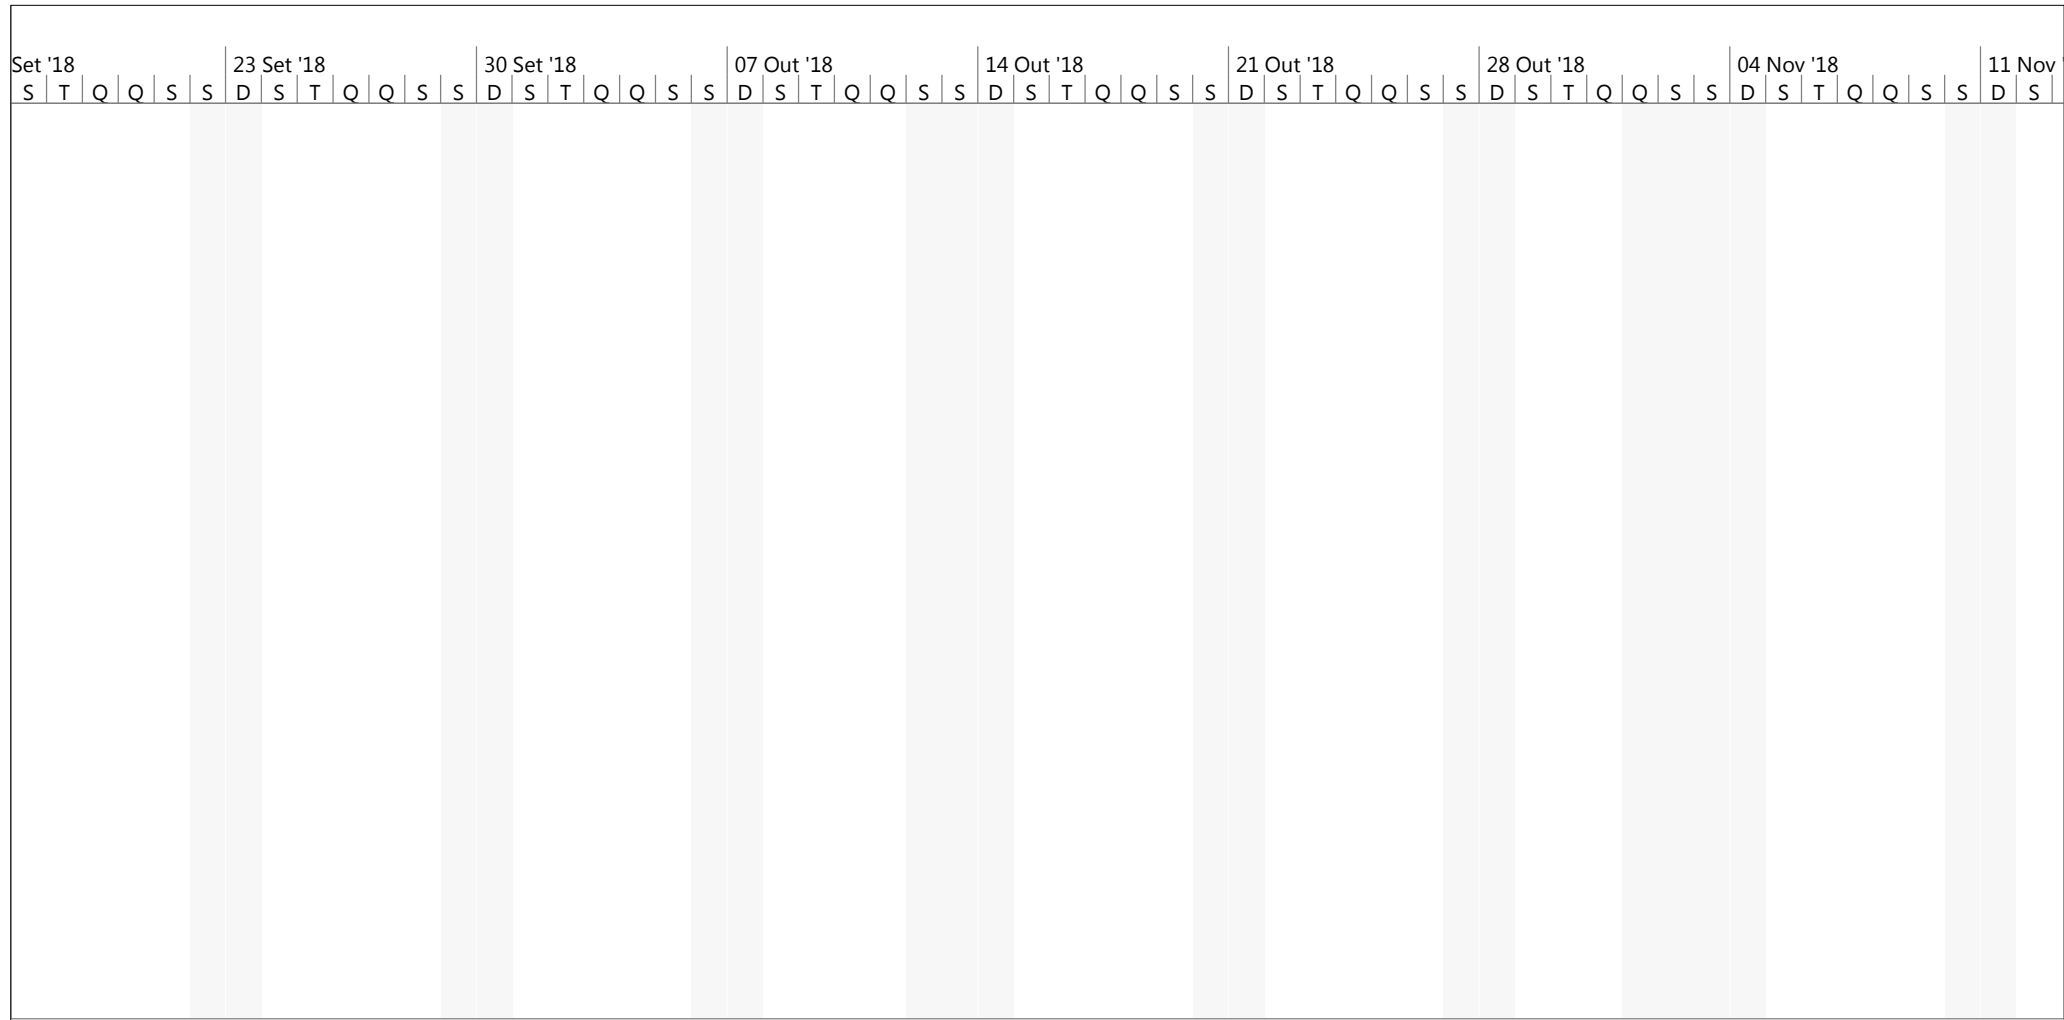

Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Set '18 23 Set '18 30 Set '18 07 Out '18 14 Out '18 21 Out '18 28 Out '18 04 Nov '18 11 Nov

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

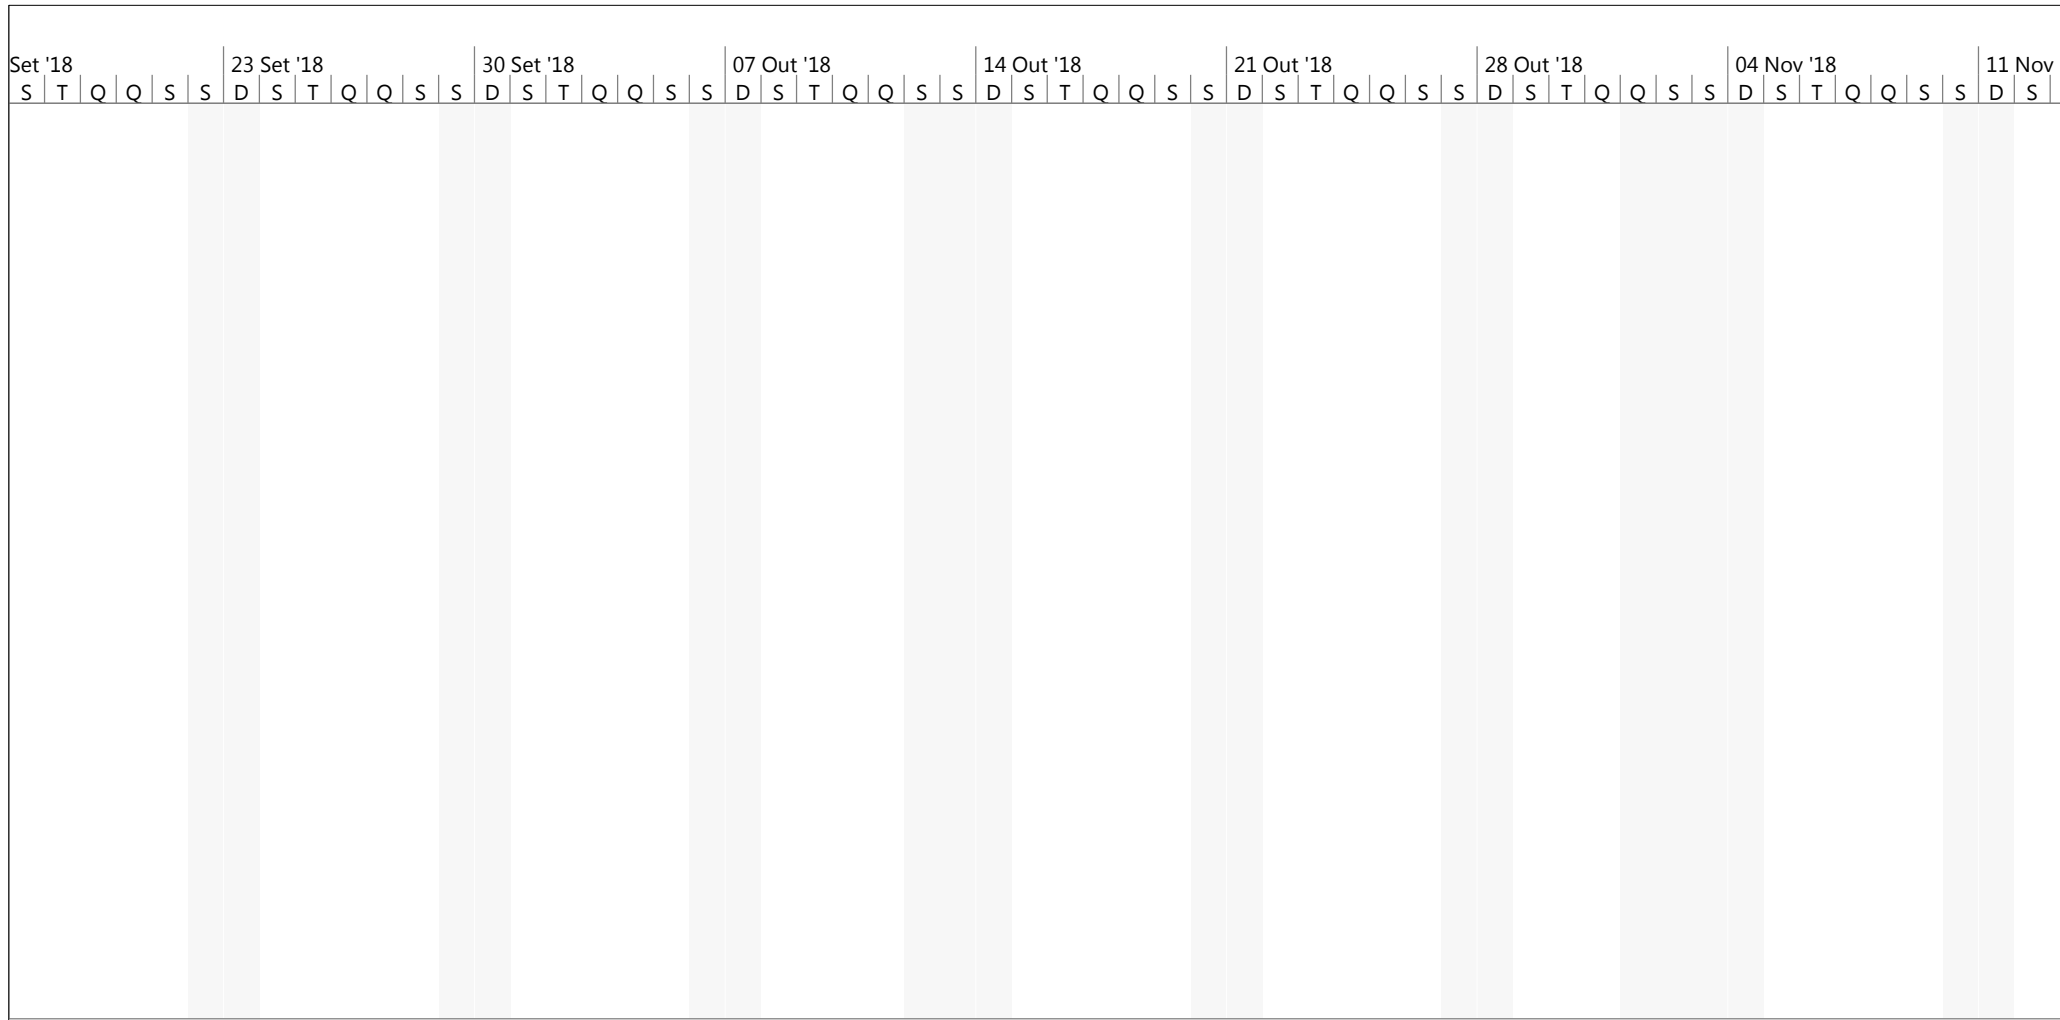







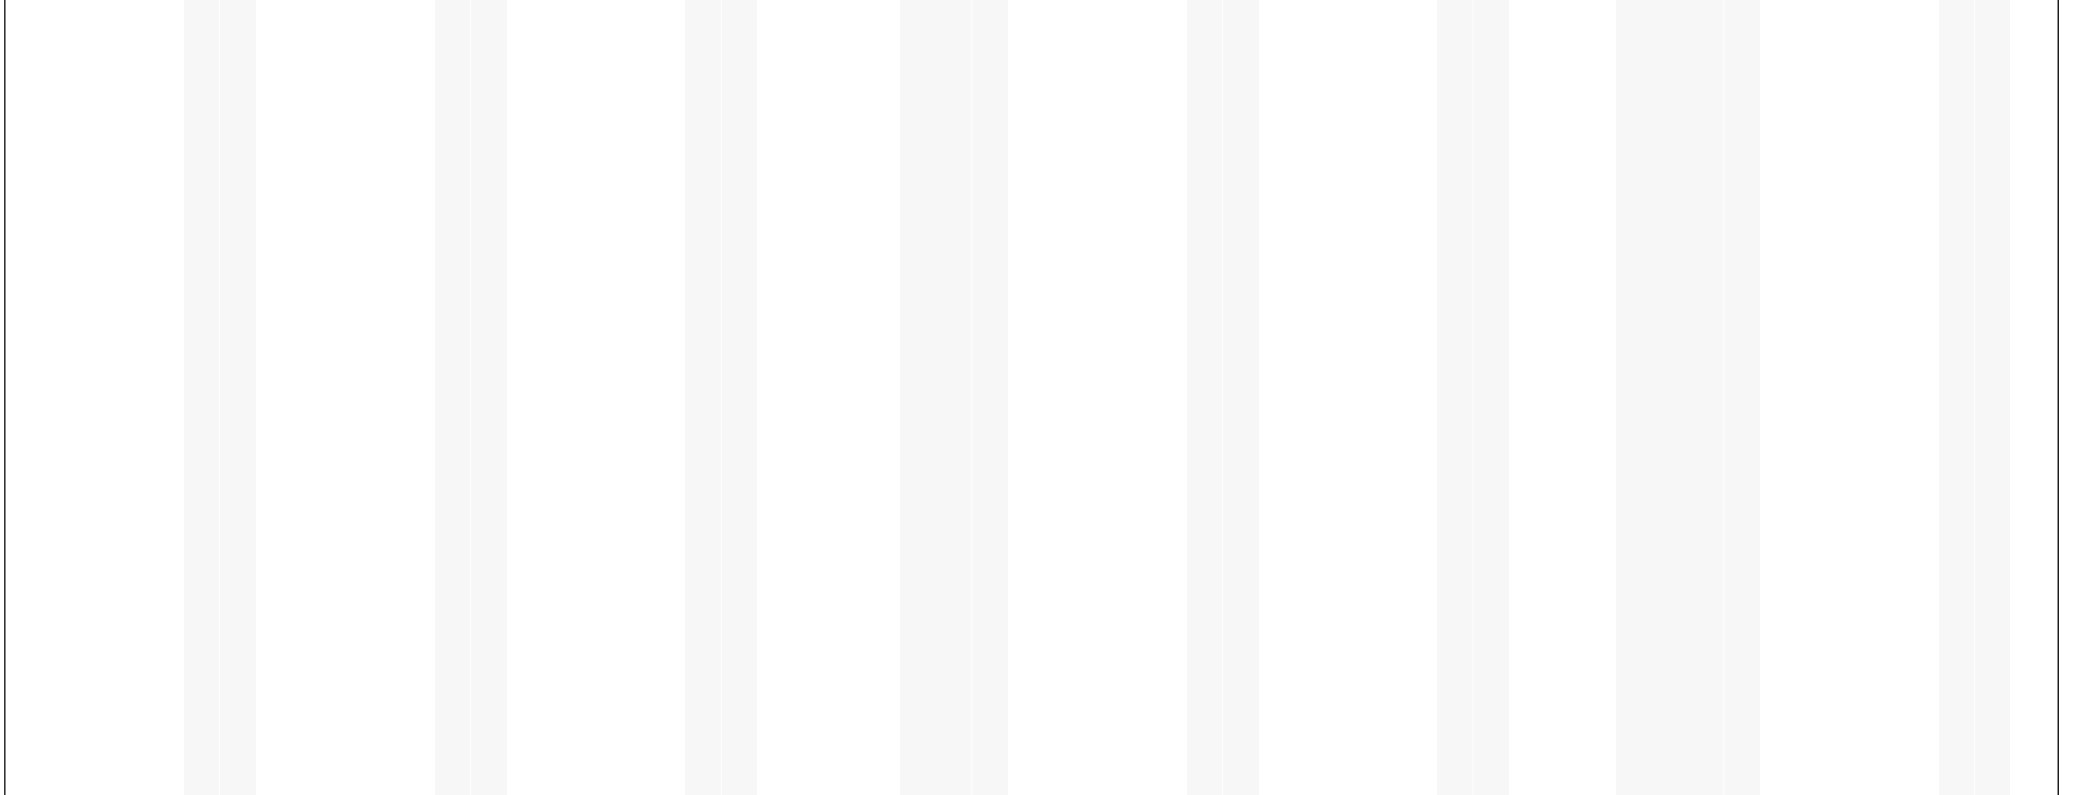












Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Set '18 23 Set '18 30 Set '18 07 Out '18 14 Out '18 21 Out '18 28 Out '18 04 Nov '18 11 Nov




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016
 Data: Sex 02/03/18


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

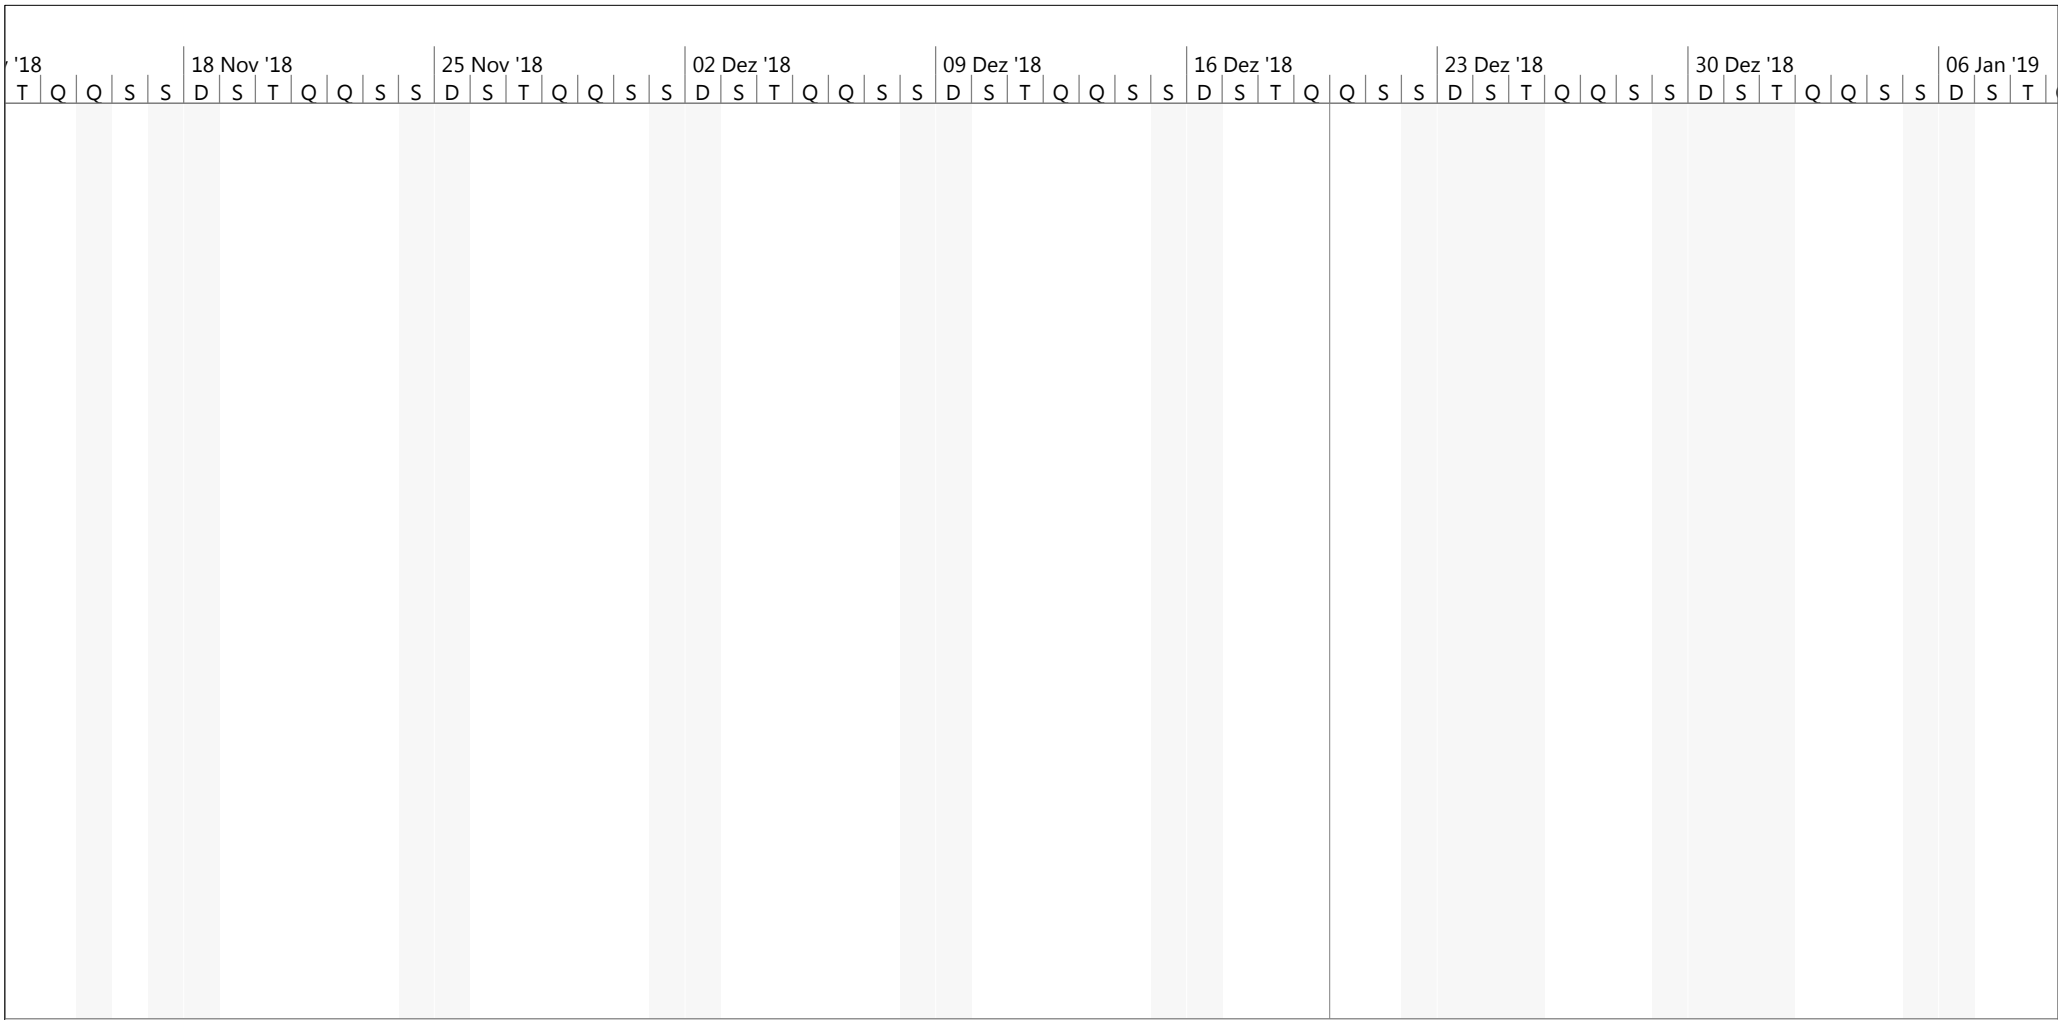


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

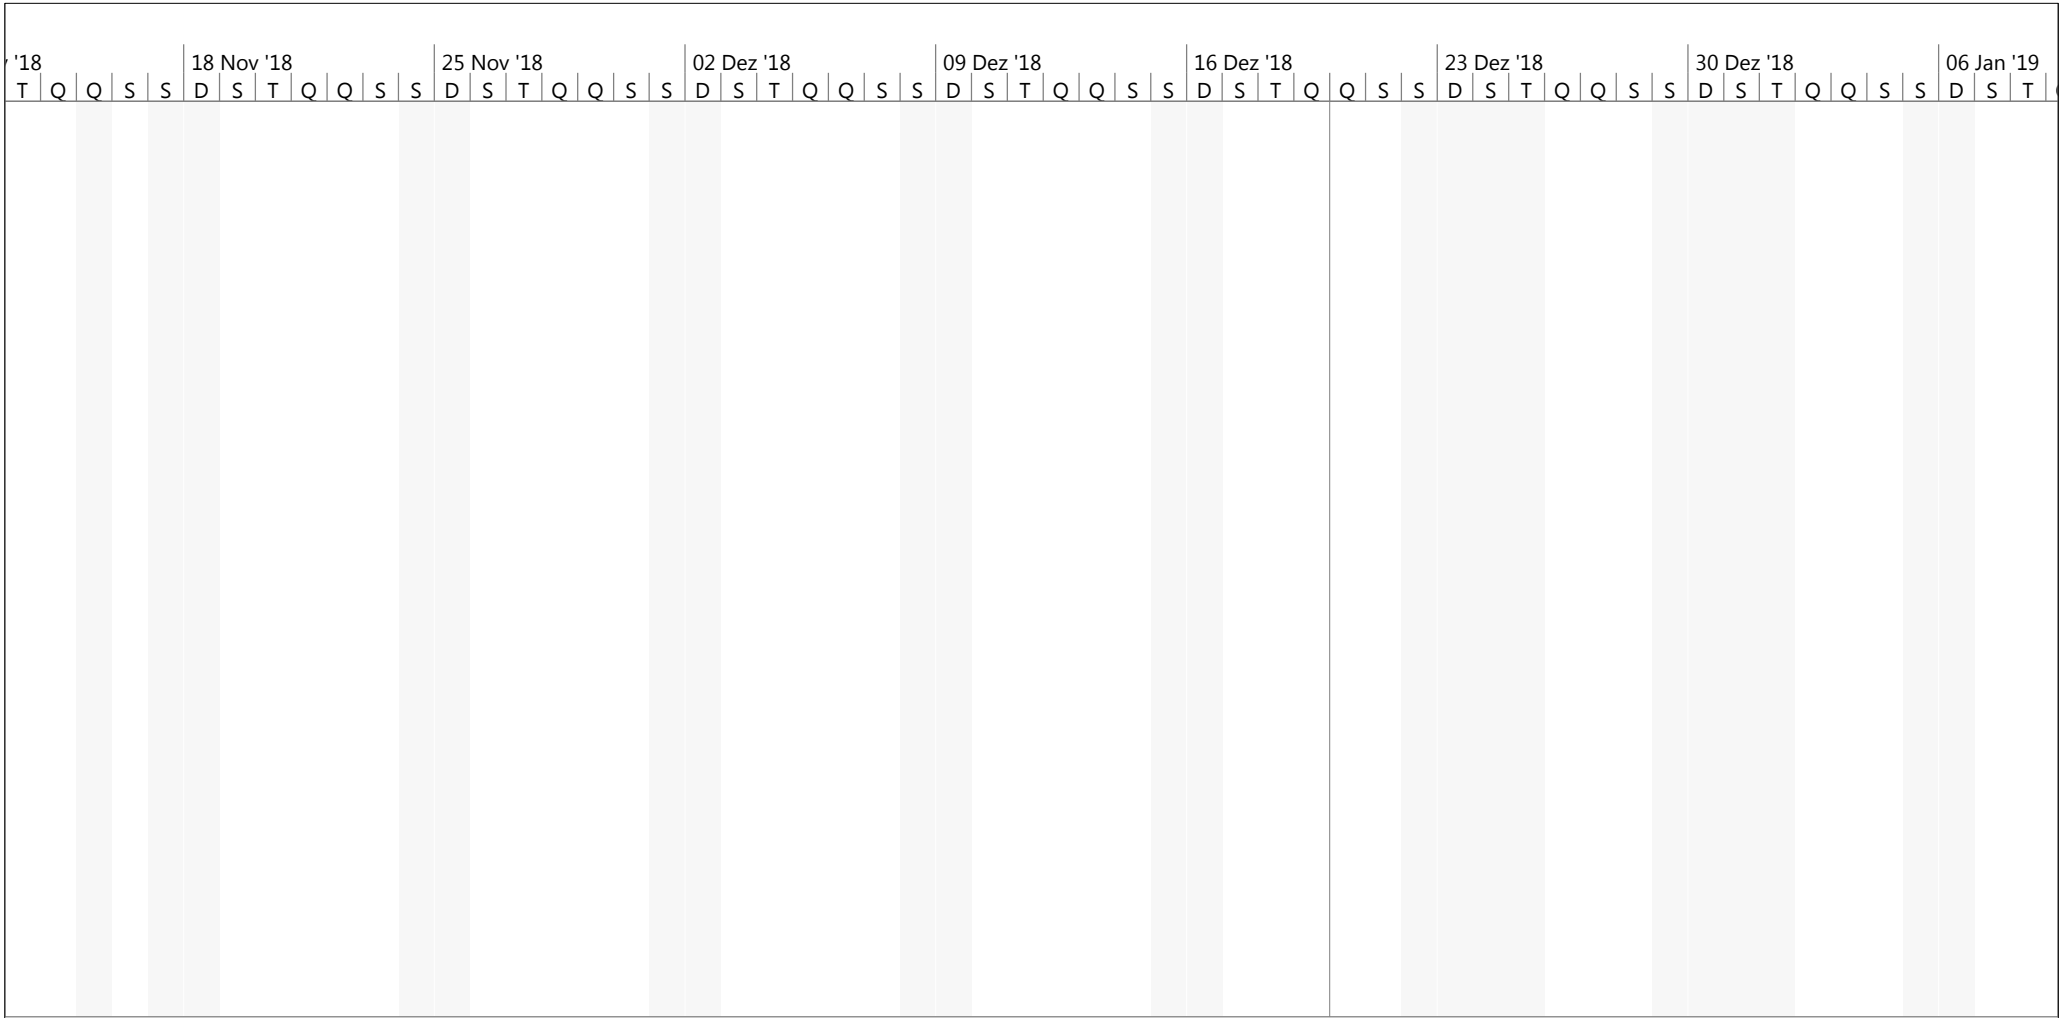


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

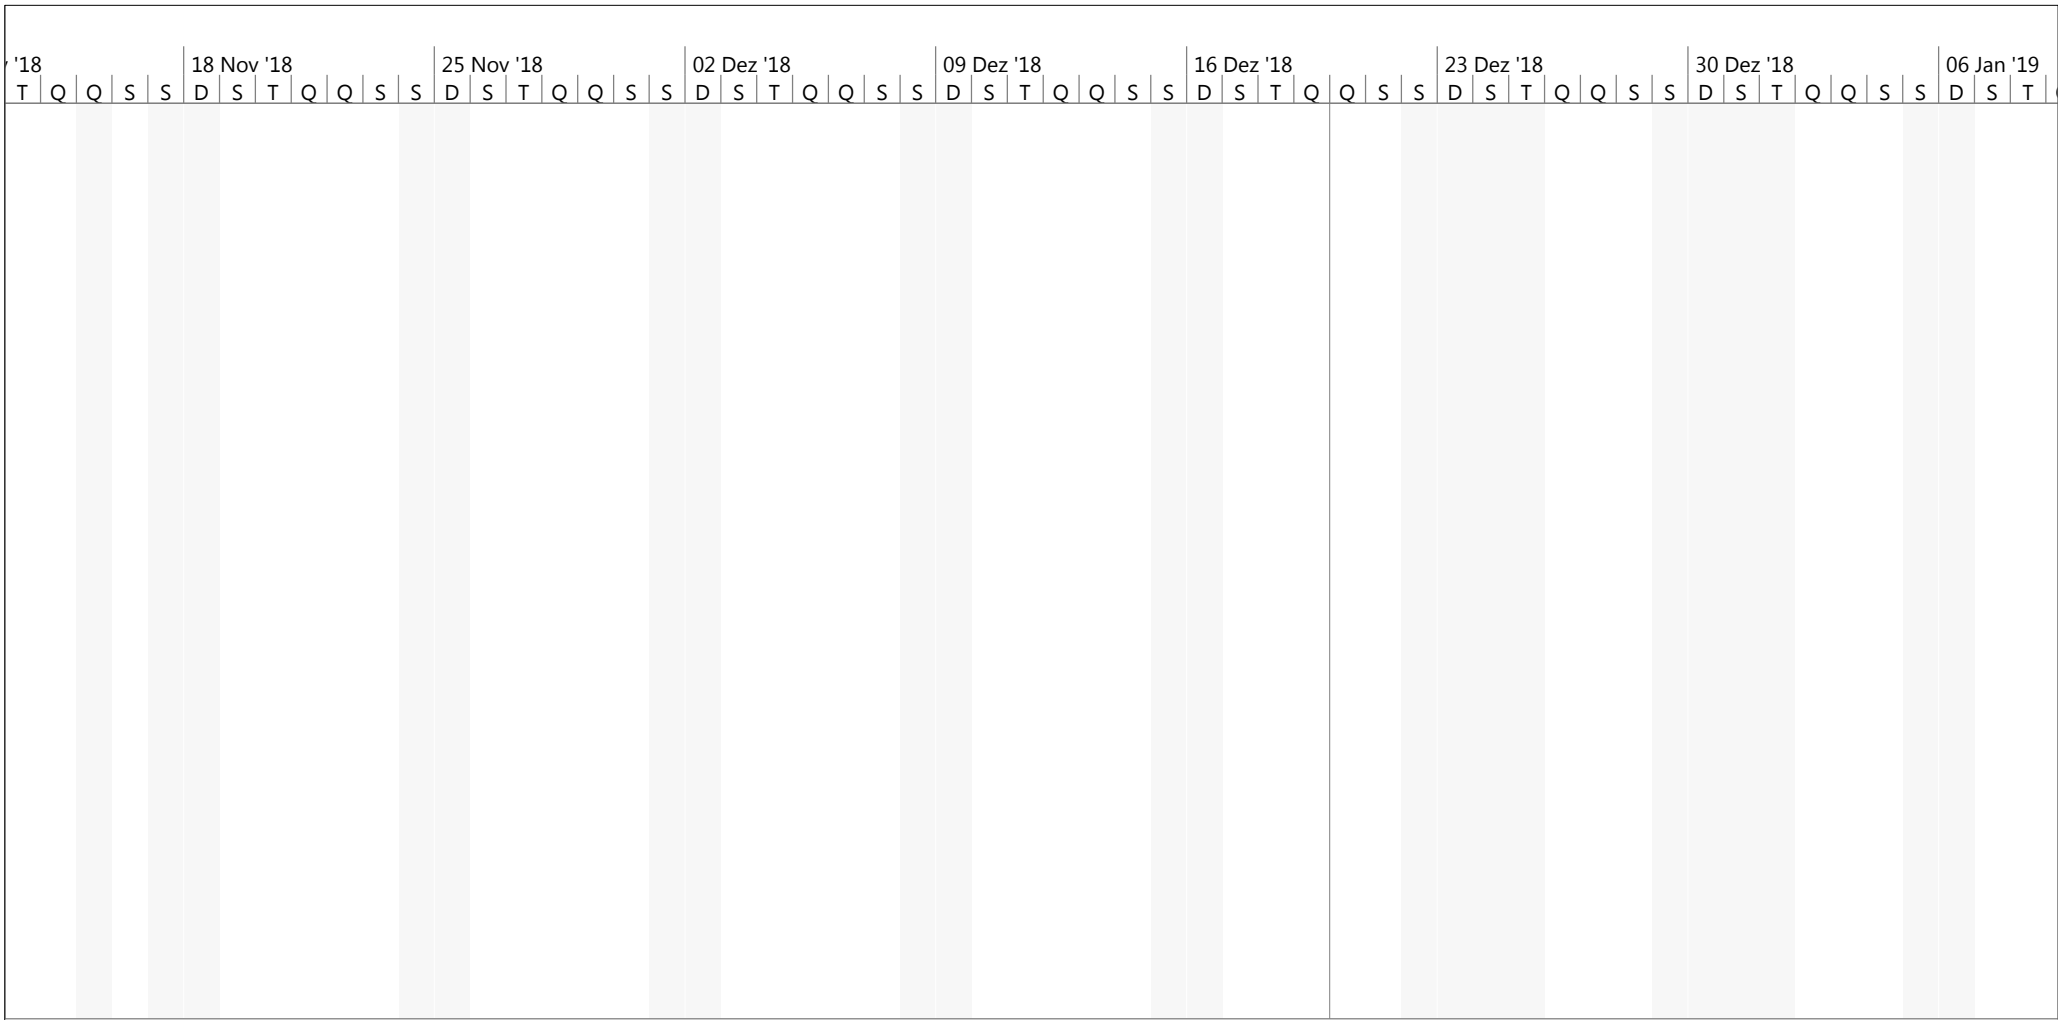


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

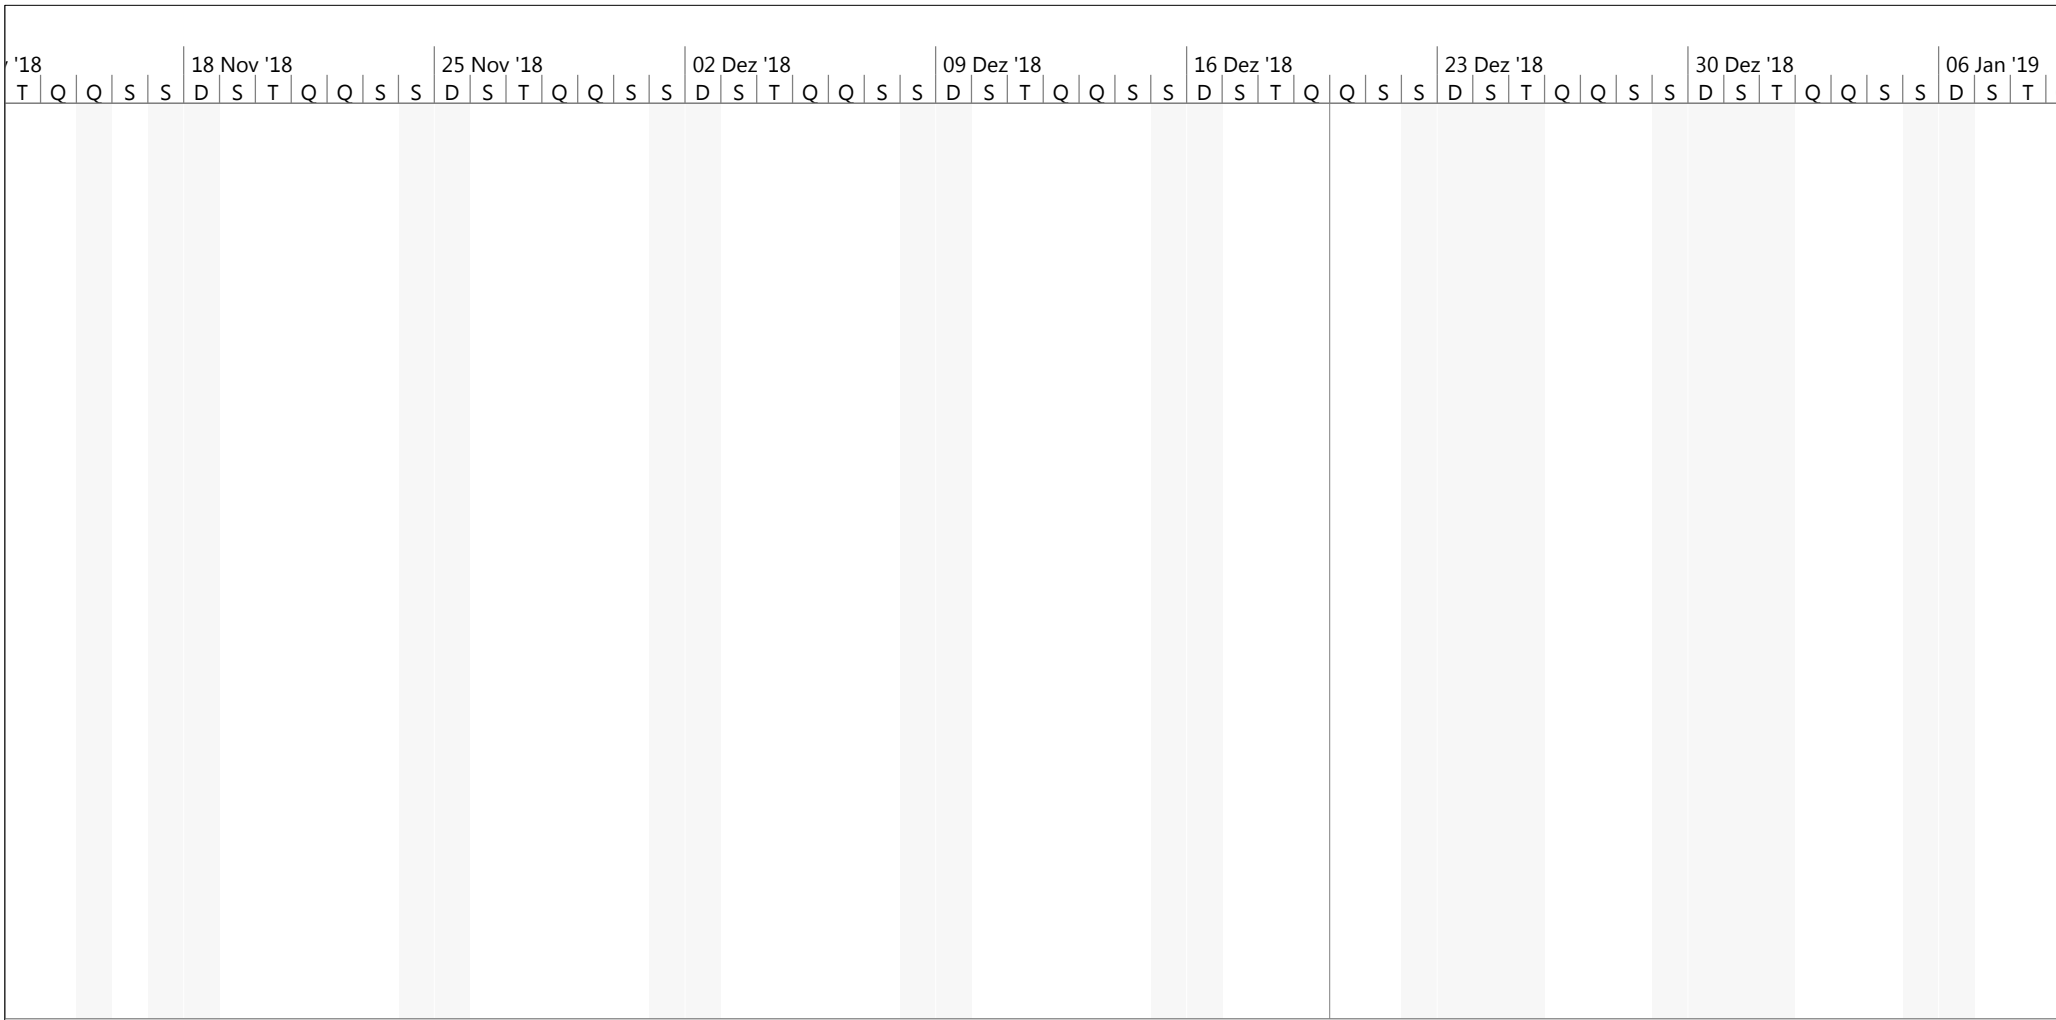


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

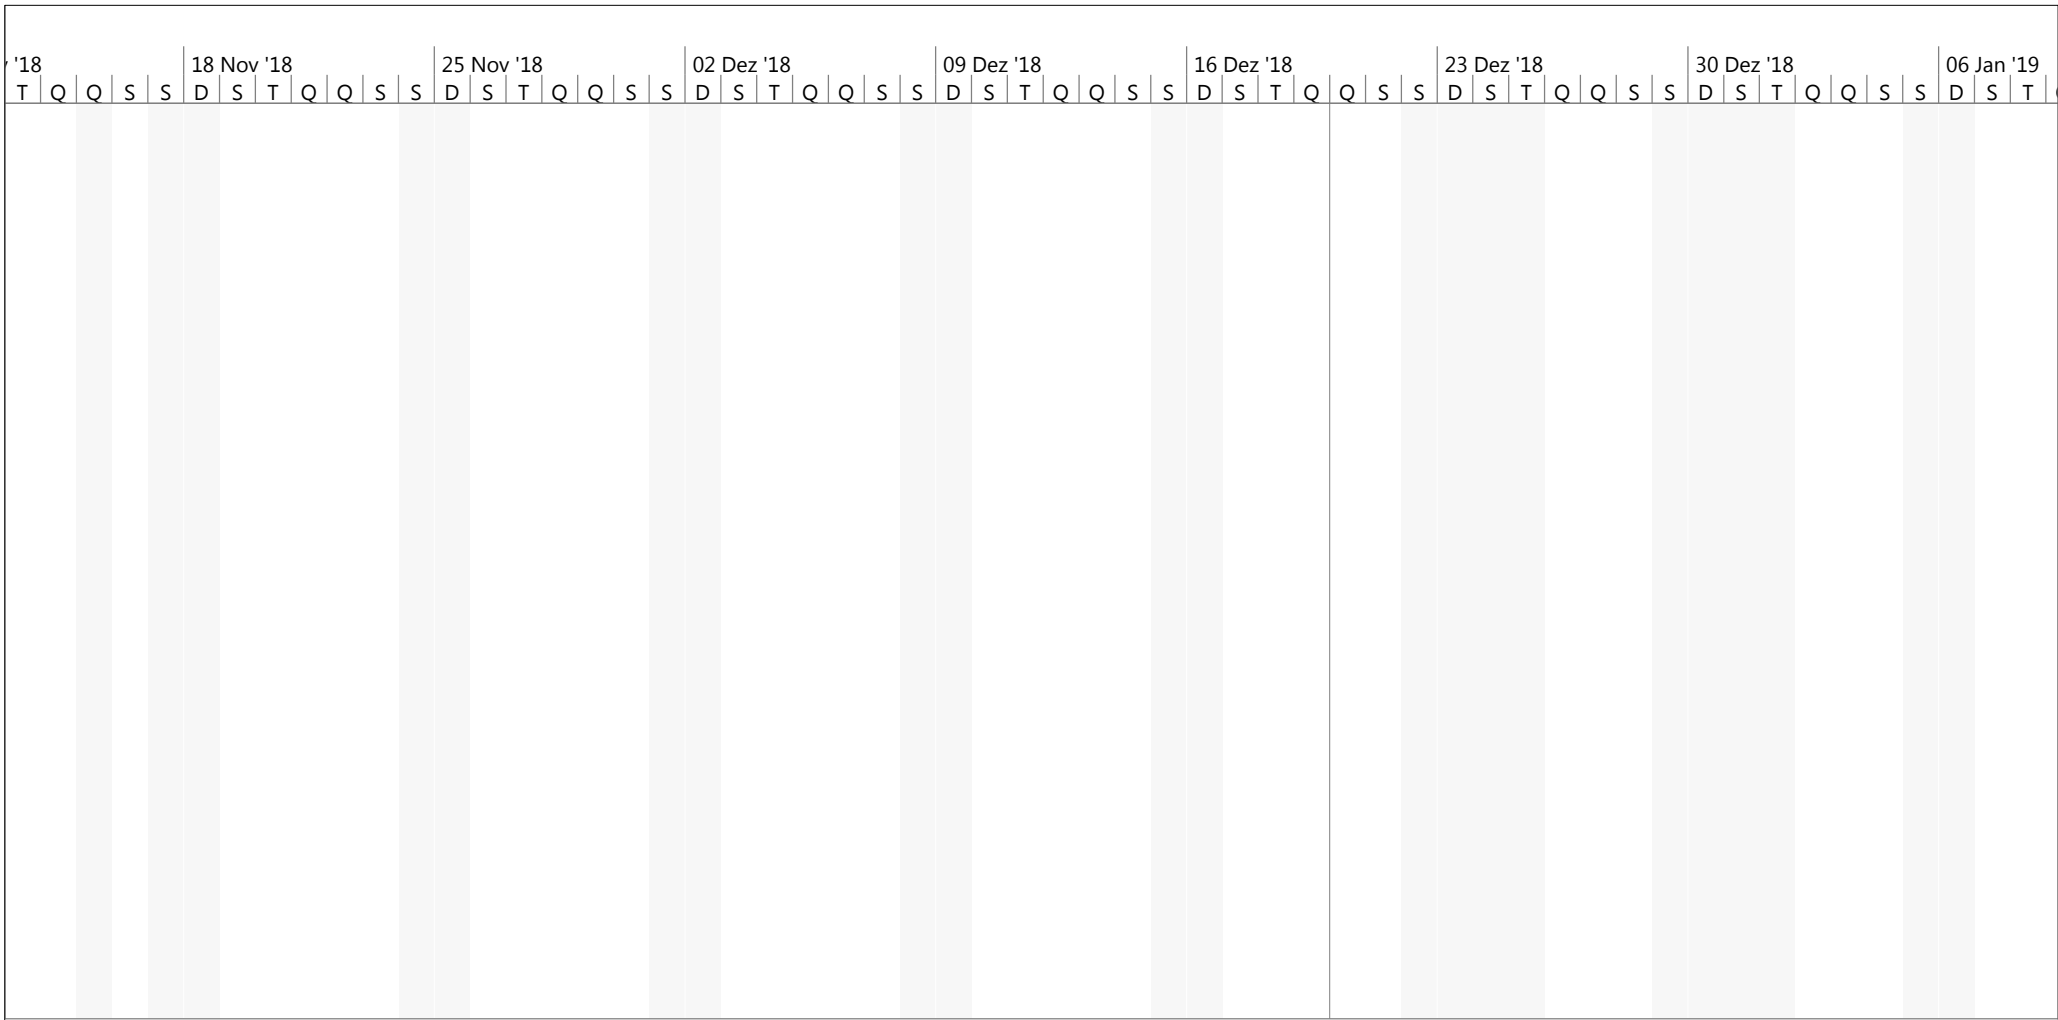


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

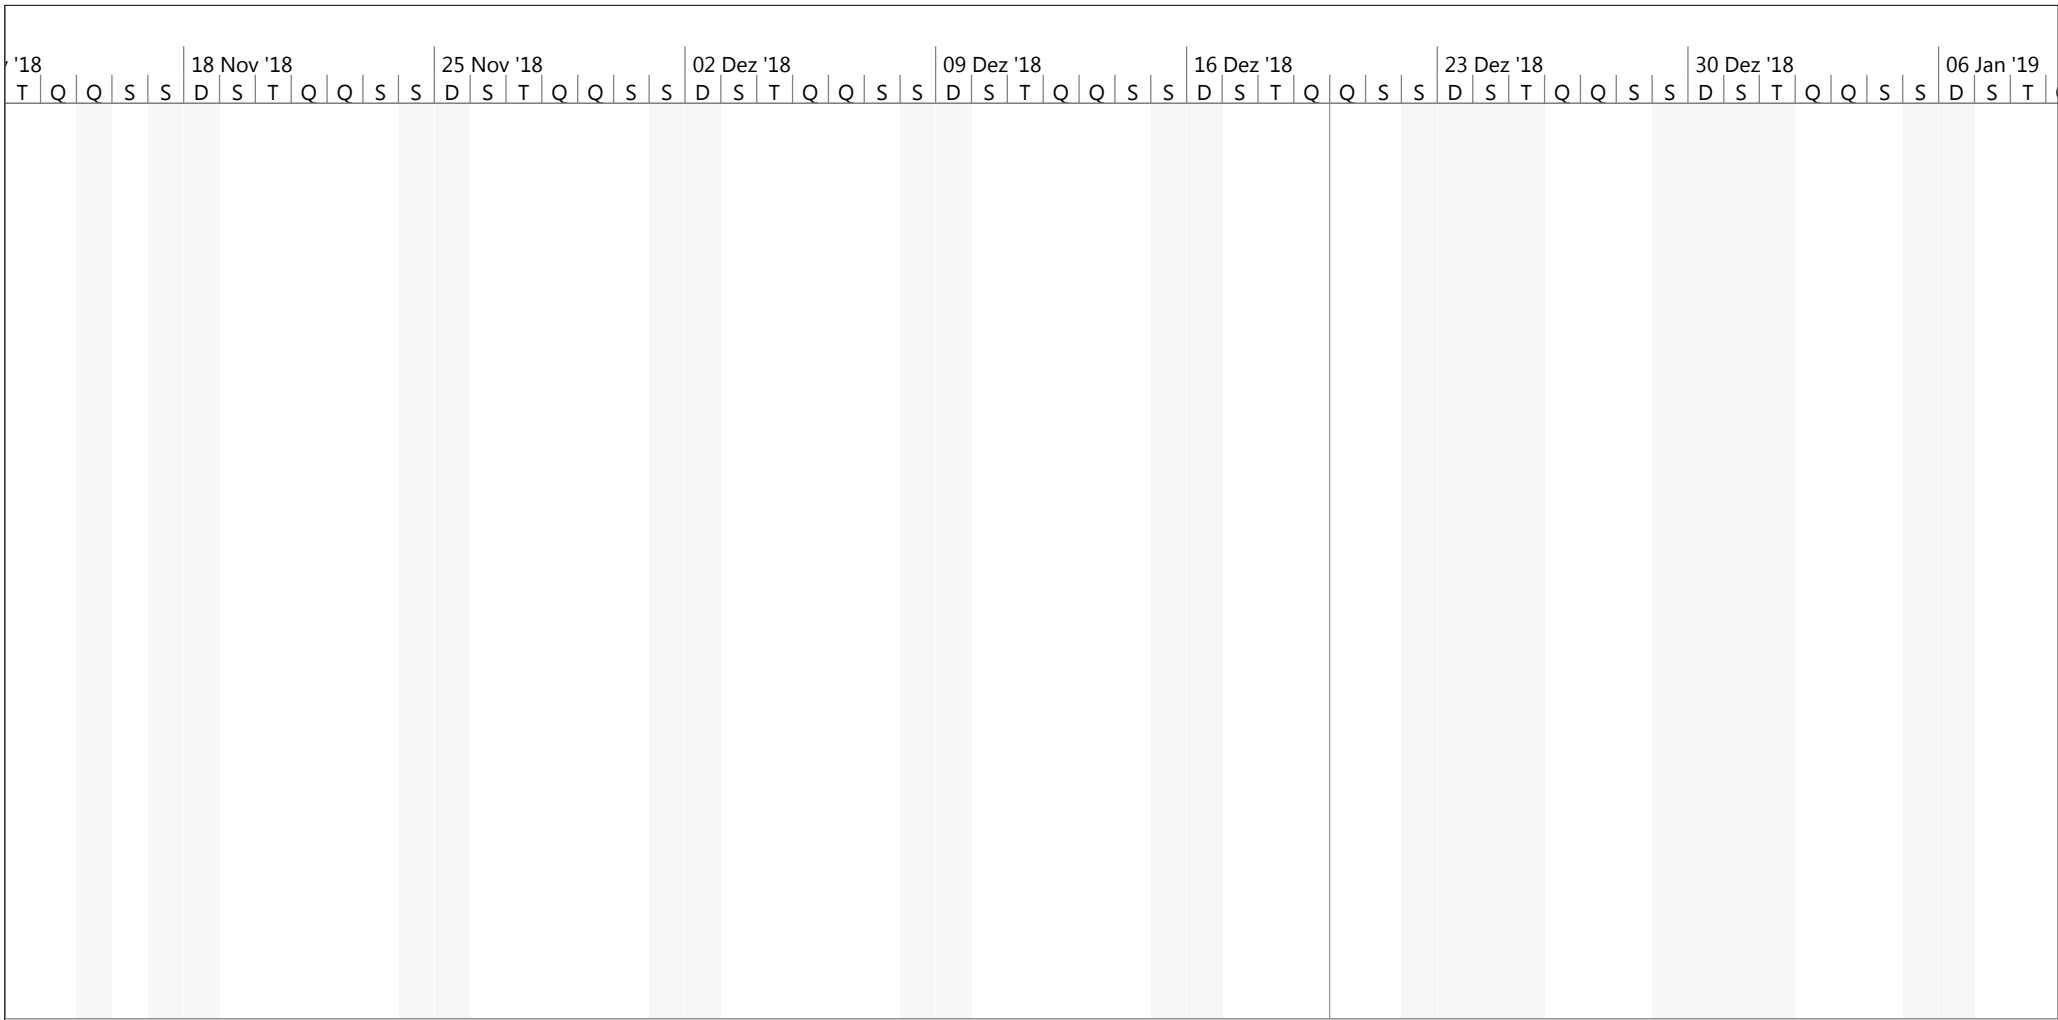


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

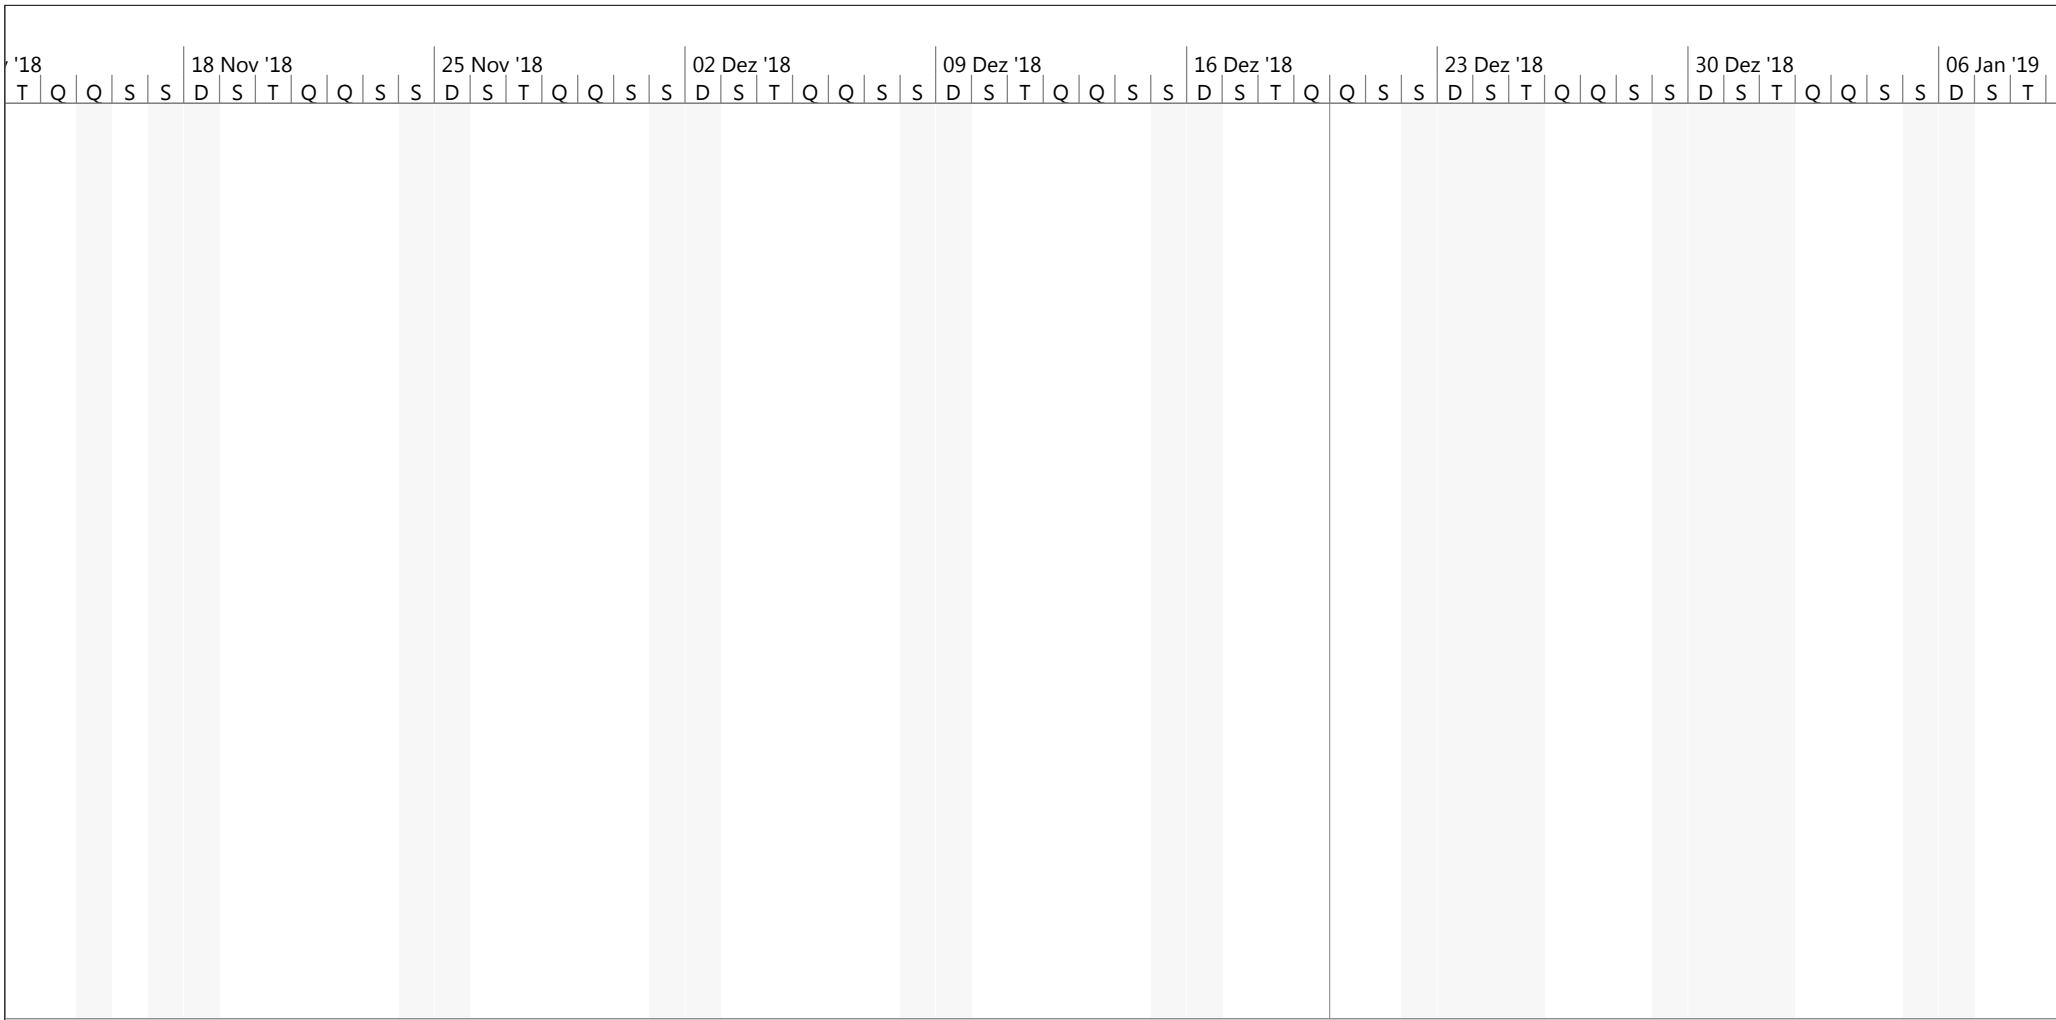


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

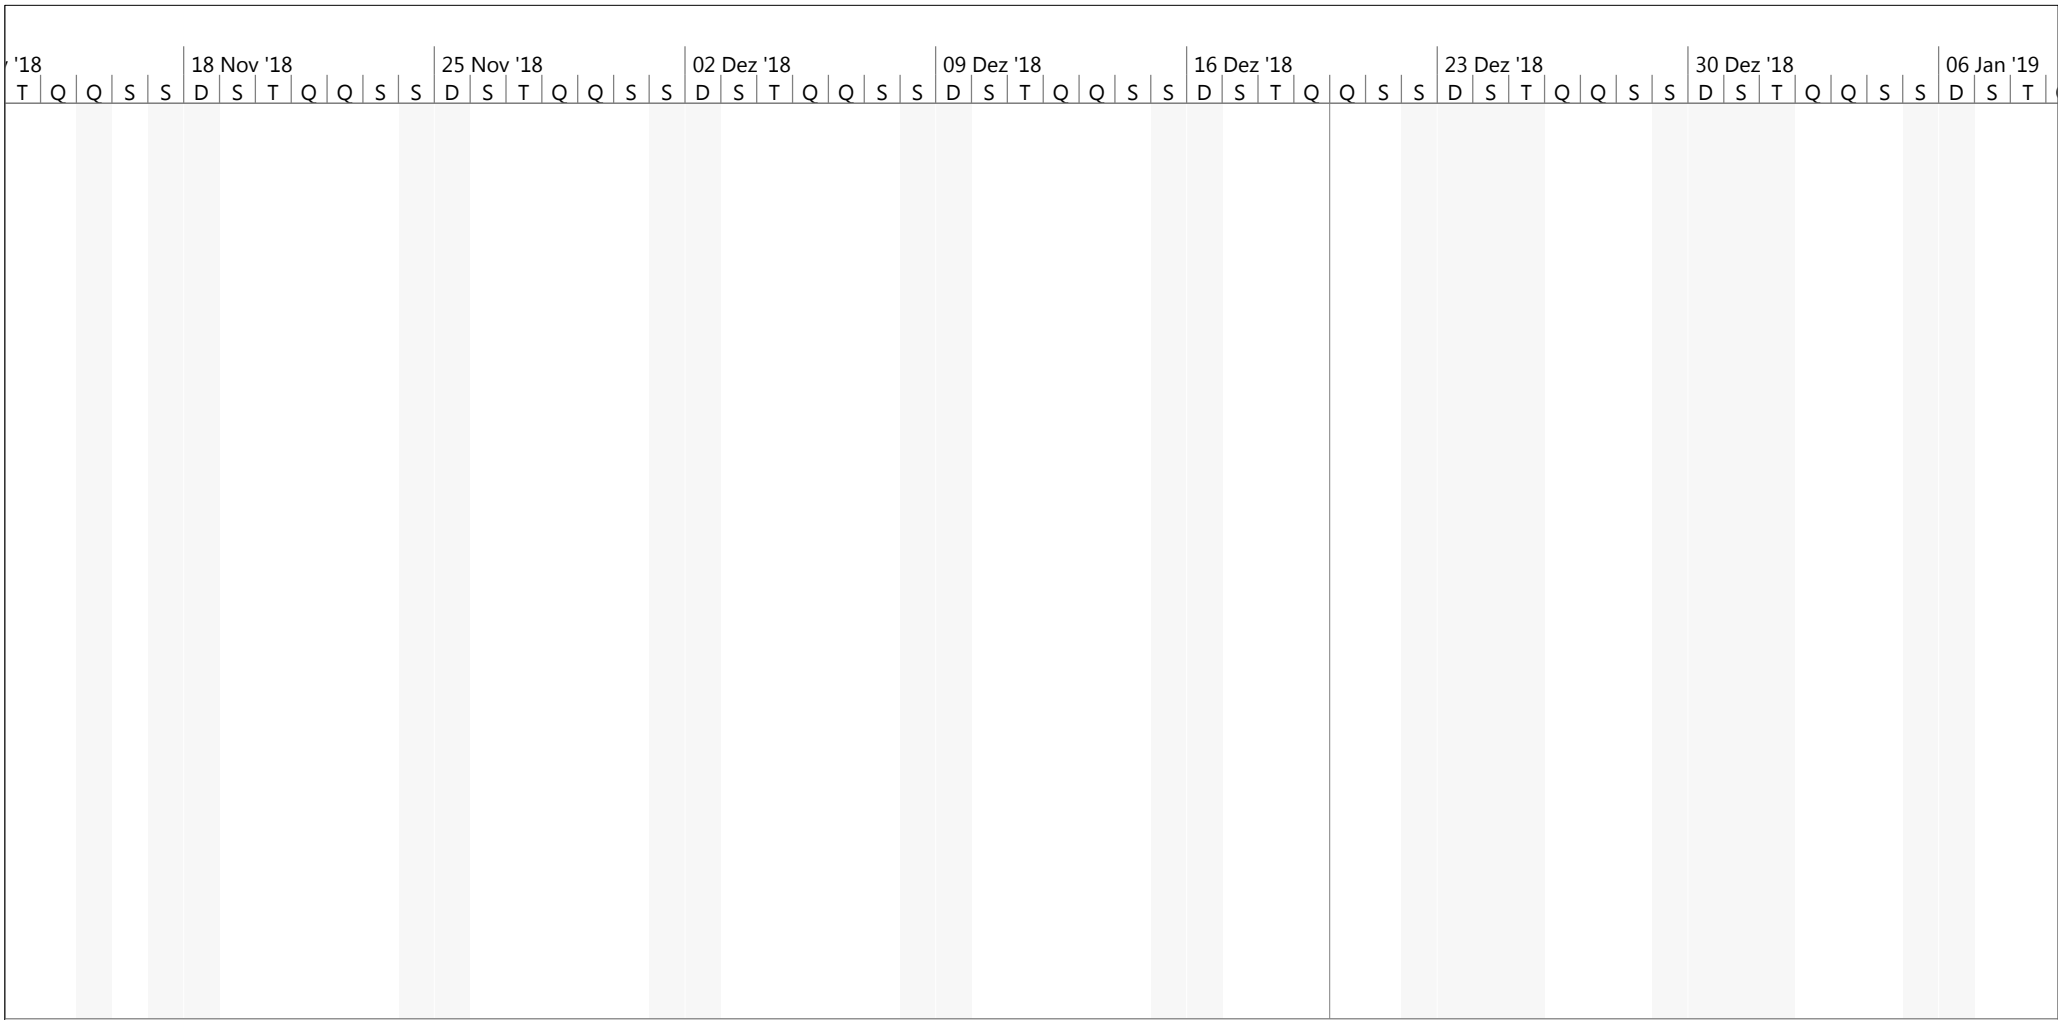


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

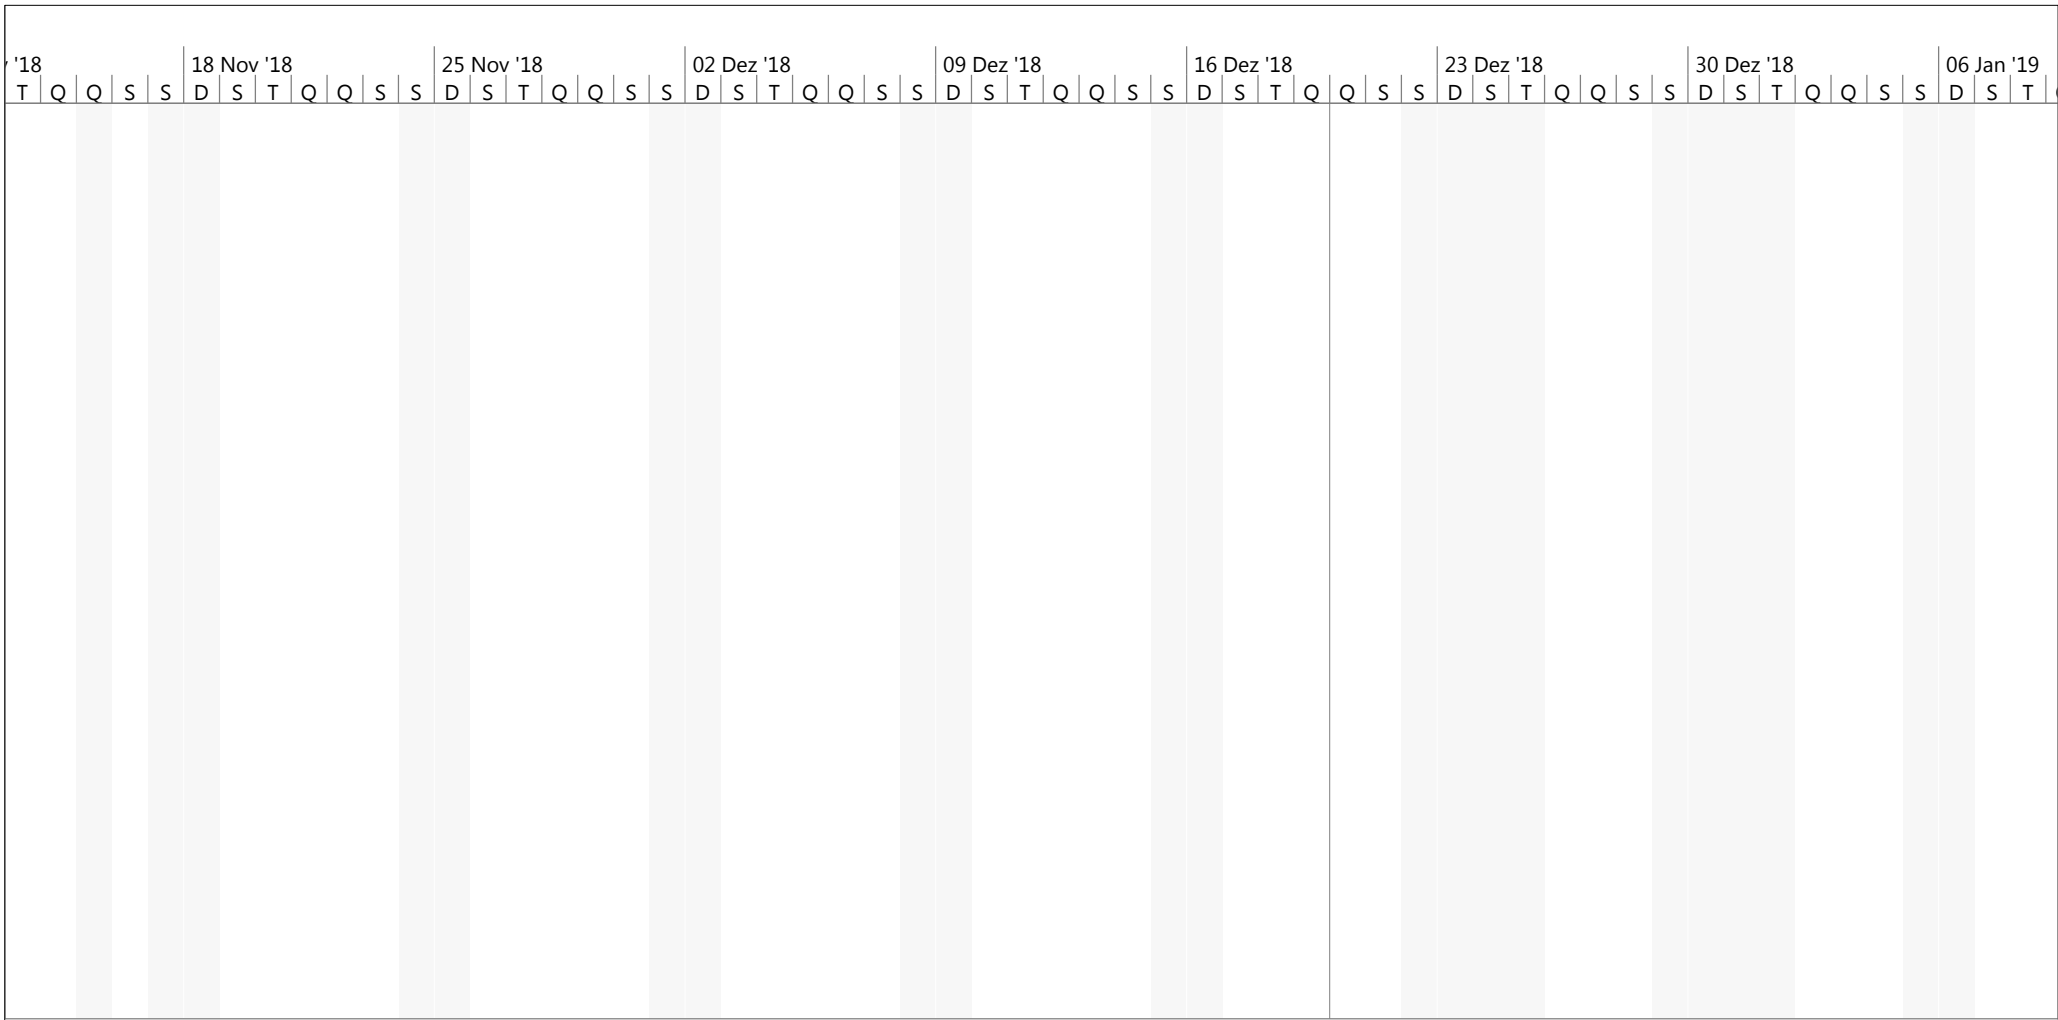


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

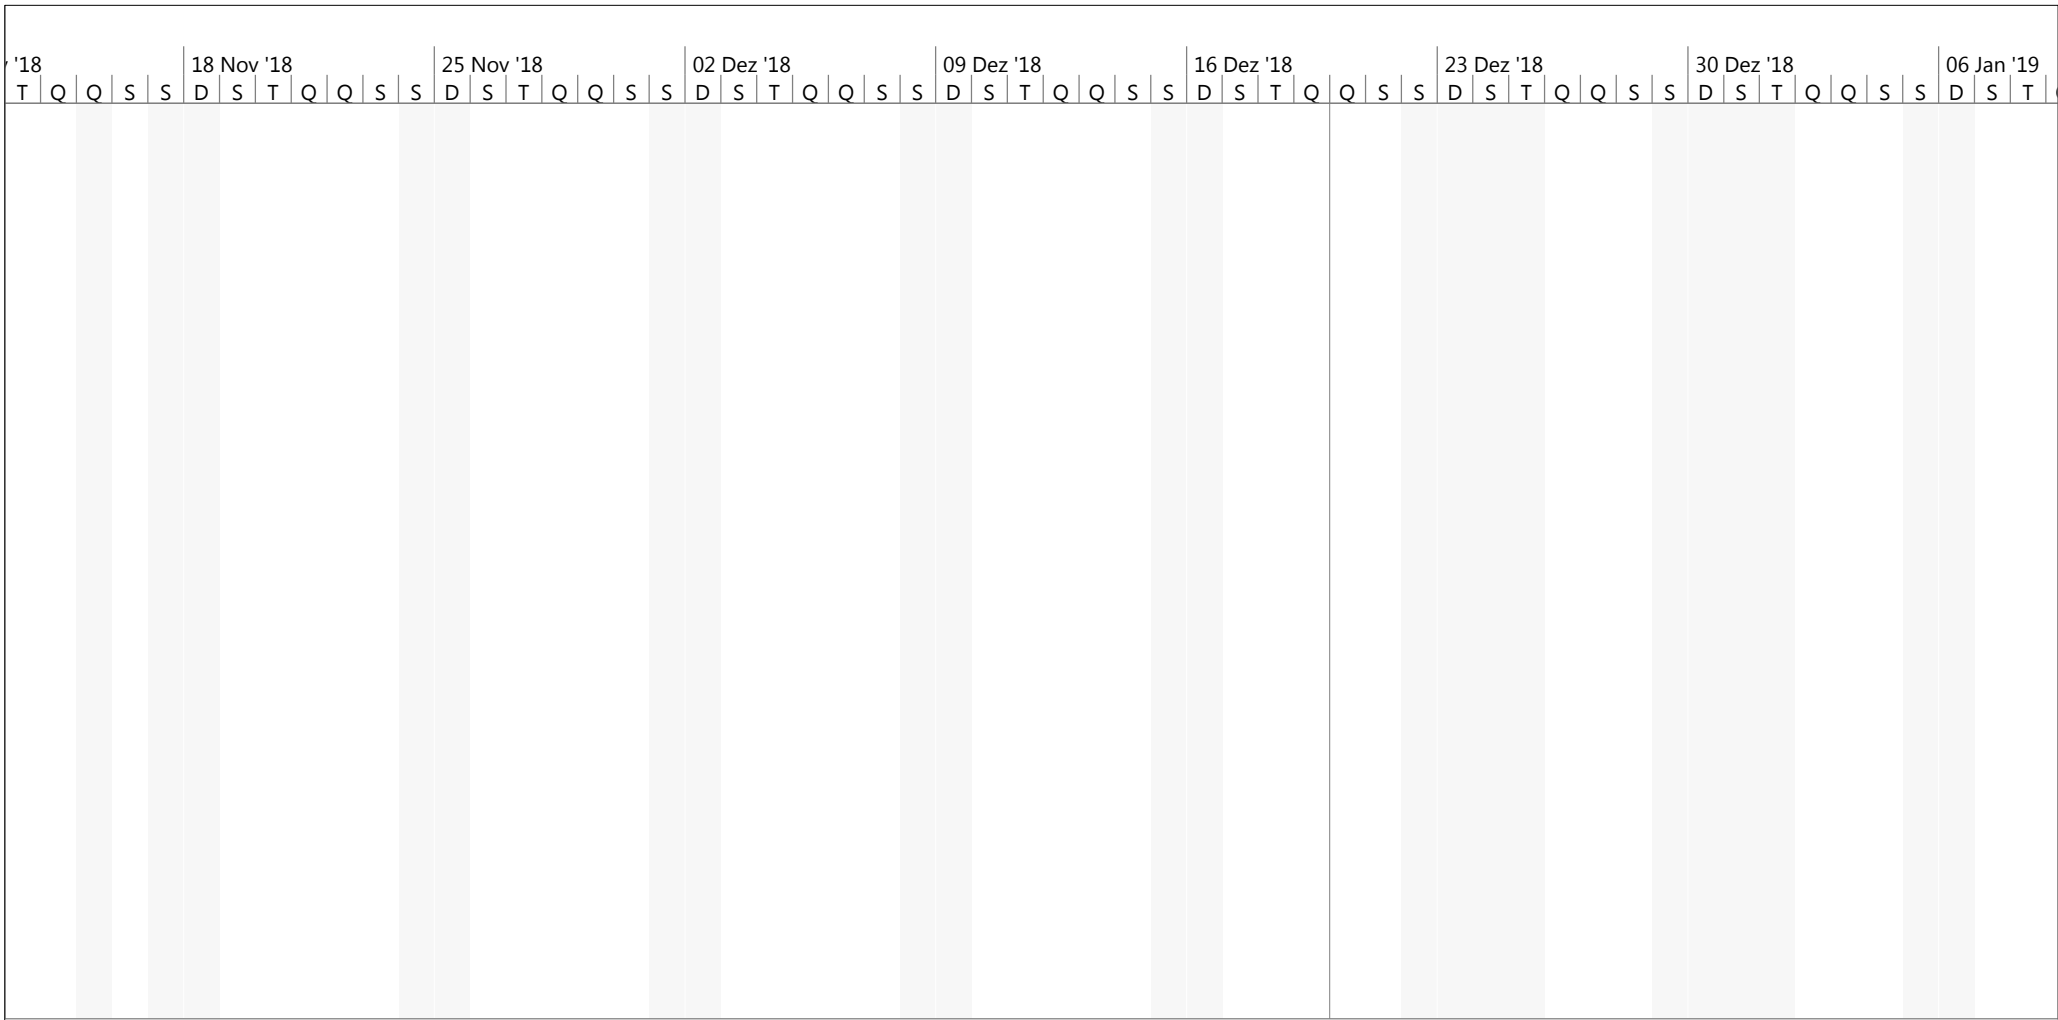


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

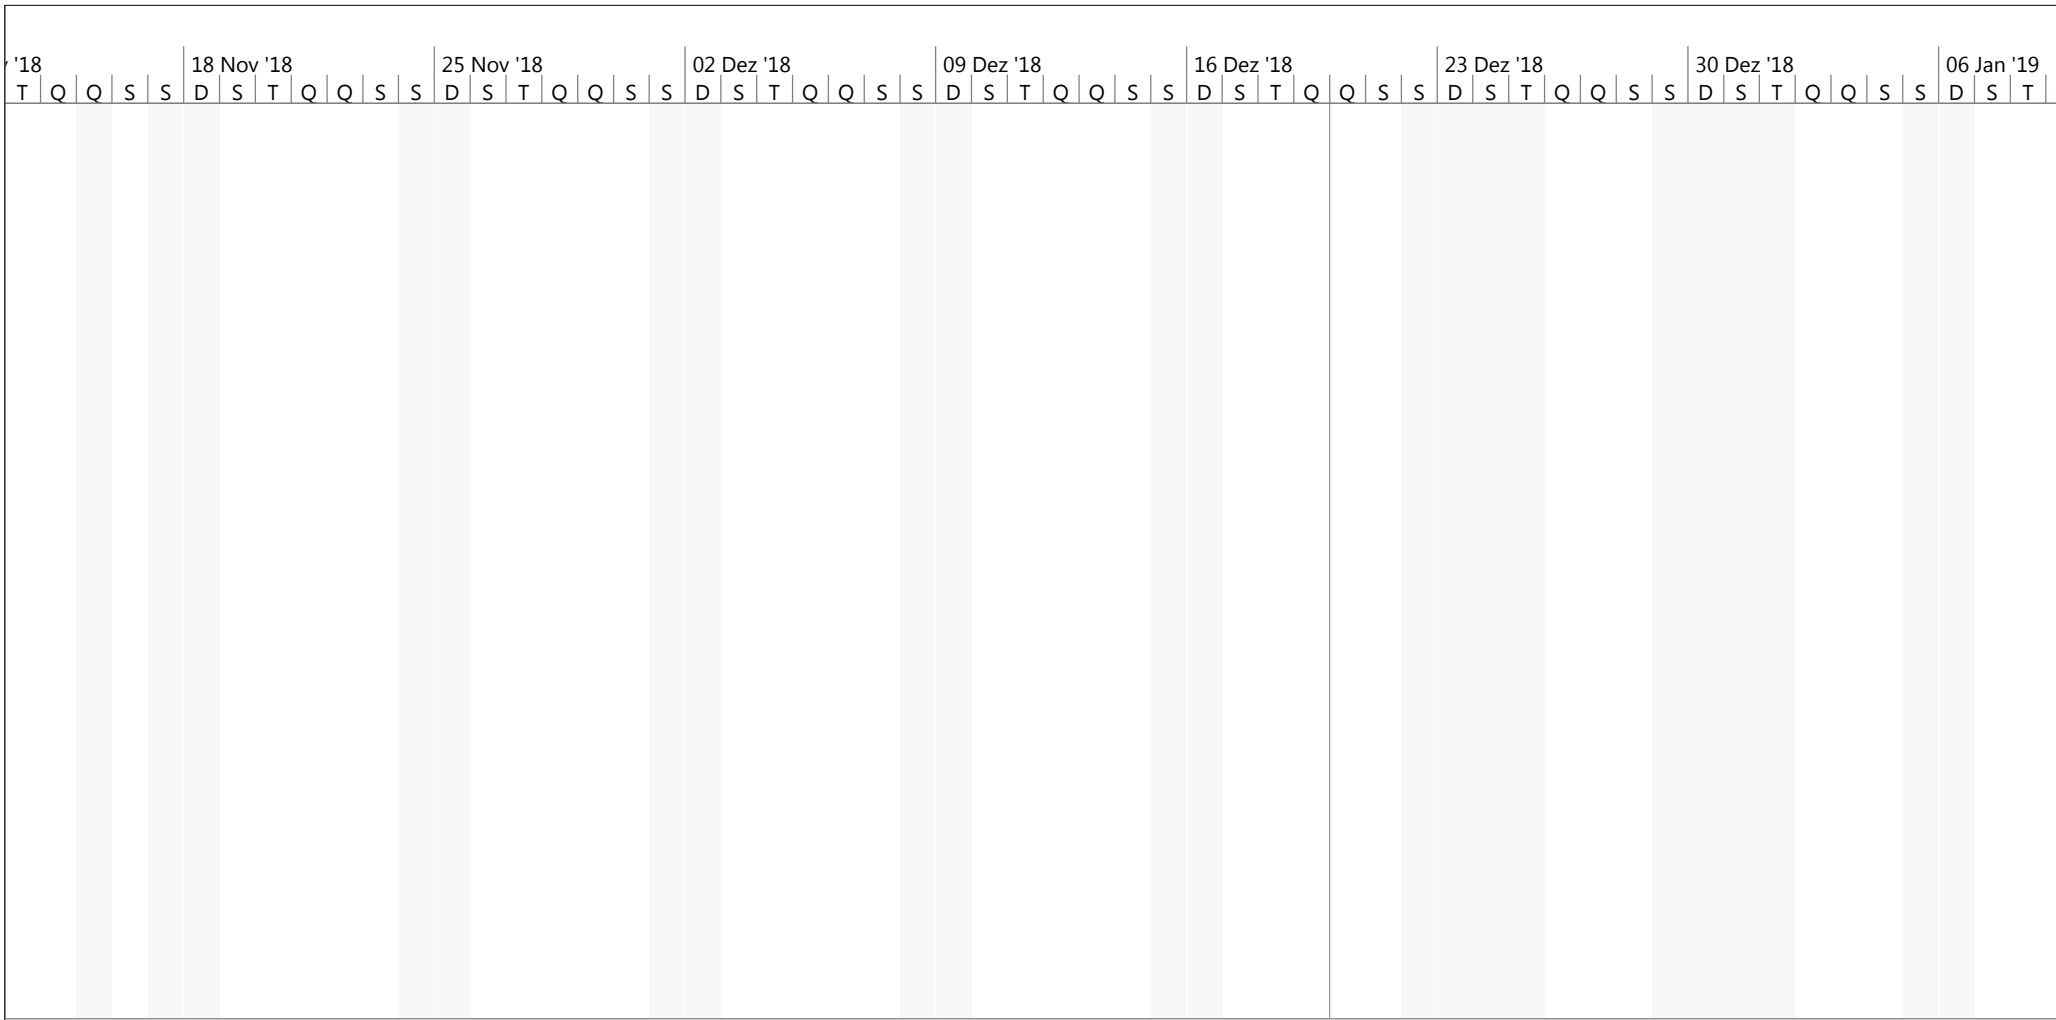


Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

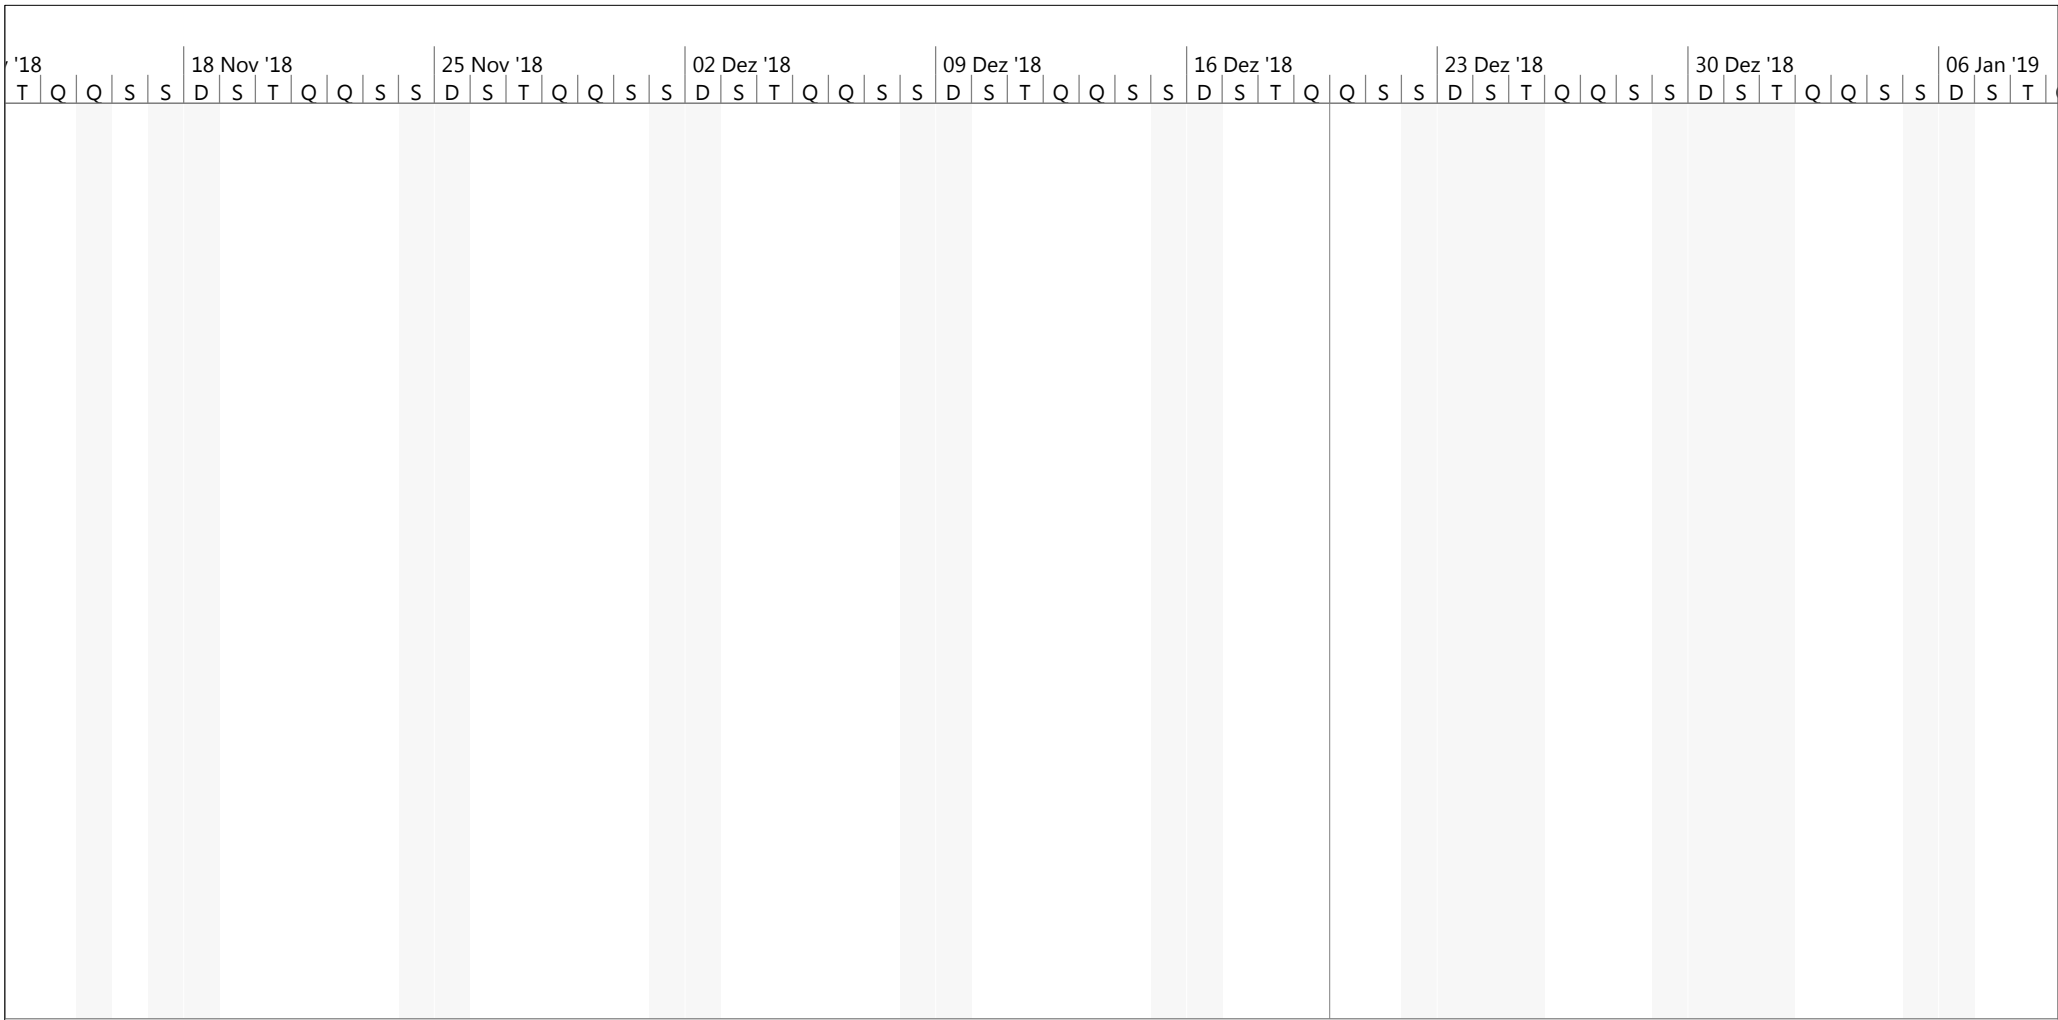

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

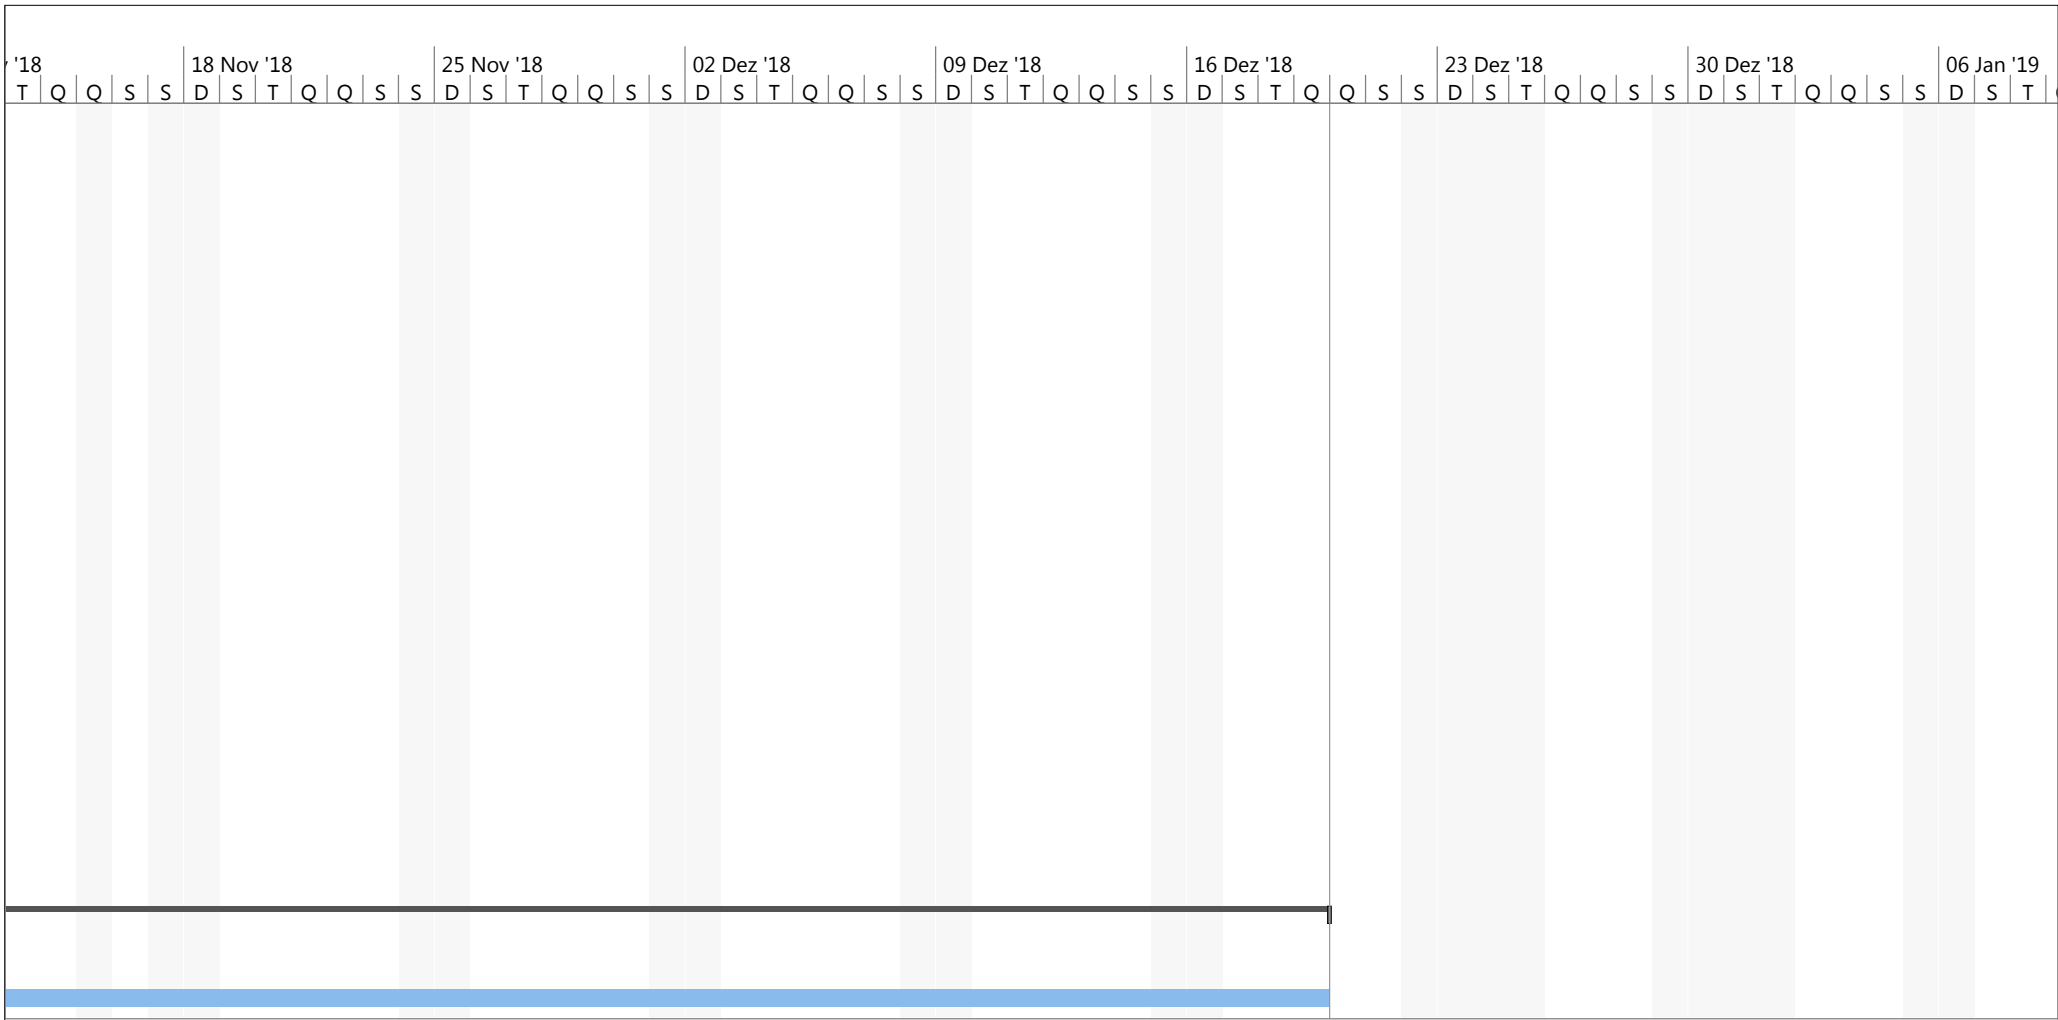

Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: SIGEP 10.06.2016 Data: Sex 02/03/18	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			
