



































































































































































ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração
0			<b>0</b>	<b>Cronograma - Projeto Governança em Auditoria Interna - out-2019</b>		<b>82%</b>	<b>224 dias</b>
1			<b>1</b>	NORMA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA		<b>57%</b>	<b>140 dias</b>
2			<b>1.1</b>	NORMA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO TRT-MG		<b>46%</b>	<b>140 dias</b>
3			1.1.1	LEVANTAMENTO DE NORMAS DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DE		100%	5 dias
4			1.1.2	ELABORAÇÃO DA MINUTA DA NORMA		100%	34 dias
5			1.1.3	APROVAÇÃO DA MINUTA DA NORMA PELO SECRETÁRIO DE CONTROLE		100%	5 dias
6			1.1.4	REVISÃO DA MINUTA DA NORMA PELA SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO		100%	11 dias
7			1.1.5	APROVAÇÃO DA MINUTA DA NORMA PELO PRESIDENTE DO TRT-MG		0%	41 dias
8			1.1.6	PUBLICAÇÃO DA NORMA PELO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO		0%	23 dias
9			1.1.7	NORMA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA PUBLICADA		100%	0 dias
10			<b>1.2</b>	VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE OUTROS ÓRGÃOS		<b>100%</b>	<b>30 dias</b>
11			1.2.1	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VISITAS TÉCNICAS		100%	10 dias
12			1.2.2	OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS/PROCEDIMENTOS DA ATIVIDADE		100%	20 dias
13			1.2.3	VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS		100%	0 dias
14			<b>2</b>	MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO		<b>95%</b>	<b>161 dias</b>
15			<b>2.1</b>	MAPEAMENTO DO PROCESSO: AUDITORIA		<b>92%</b>	<b>127 dias</b>
16			2.1.1	LEVANTAMENTO DE PROCESSOS DE AUDITORIA DE ÓRGÃOS DE		100%	35 dias
17			2.1.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		100%	34 dias
18			2.1.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		100%	34 dias
19			2.1.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		100%	34 dias
20			2.1.5	ELABORAÇÃO DO MANUAL DA ATIVIDADE DE AUDITORIA		85%	82 dias
21			2.1.6	TREINAMENTO DOS AUDITORES INTERNOS PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO		40%	10 dias




































































Projeto: Cronograma - Projeto  
Data: Qua 11/12/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



















ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração
22			2.1.7	PROCESSO DE AUDITORIA MAPEADO		100%	0 dias
23			2.2	MAPEAMENTO DO PROCESSO: ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AUDITORIA		71%	83 dias
24			2.2.1	LEVANTAMENTO DE PROCESSOS E TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE		100%	15 dias
25			2.2.2	DEFINIÇÃO DOS FLUXOS DOS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL		90%	19 dias
26			2.2.3	DEFINIÇÃO DAS TÉCNICAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO		90%	34 dias
27			2.2.4	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		100%	34 dias
28			2.2.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DOS		0%	34 dias
29			2.2.6	PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AUDITORIA MAPEADO		0%	0 dias
30			2.3	MAPEAMENTO DO PROCESSO: ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL		100%	82 dias
31			2.3.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
32			2.3.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		100%	32 dias
33			2.3.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		100%	32 dias
34			2.3.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		100%	32 dias
35			2.3.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		100%	31 dias
36			2.3.6	PROCESSO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL MAPEADO		100%	0 dias
37			2.4	MAPEAMENTO DO PROCESSO: RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO		100%	116 dias
38			2.4.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
39			2.4.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		100%	32 dias
40			2.4.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		100%	32 dias
41			2.4.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		100%	32 dias
42			2.4.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		100%	65 dias
43			2.4.6	PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO		100%	0 dias

Projeto: Cronograma - Projeto  
Data: Qua 11/12/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração
44			<b>2.5</b>	MAPEAMENTO DO PROCESSO: PARECERES NAS OBRAS E SERVIÇOS DE		<b>100%</b>	<b>82 dias</b>
45			2.5.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
46			2.5.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		100%	32 dias
47			2.5.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		100%	32 dias
48			2.5.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		100%	32 dias
49			2.5.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		100%	31 dias
50			2.5.6	PROCESSO DE ELABORAÇÃO PARECERES NAS OBRAS E SERVIÇOS DE		100%	0 dias
51			<b>2.6</b>	MAPEAMENTO DO PROCESSO: MONITORAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS		<b>100%</b>	<b>82 dias</b>
52			2.6.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
53			2.6.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		100%	32 dias
54			2.6.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		100%	32 dias
55			2.6.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		100%	32 dias
56			2.6.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		100%	31 dias
57			2.6.6	PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE		100%	0 dias
58			<b>2.7</b>	MAPEAMENTO DO PROCESSO: ORÇAMENTO E FINANÇAS		<b>100%</b>	<b>82 dias</b>
59			2.7.1	LEVANTAMENTO DO PROCESSO		100%	19 dias
60			2.7.2	DEFINIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO		100%	32 dias
61			2.7.3	DEFINIÇÃO DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)		100%	32 dias
62			2.7.4	DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROCESSO		100%	32 dias
63			2.7.5	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP DO		100%	31 dias
64			2.7.6	PROCESSO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS MAPEADO		100%	0 dias
65			<b>3</b>	<b>PLANO DE CAPACITAÇÃO</b>		<b>17%</b>	<b>82 dias</b>

Projeto: Cronograma - Projeto  
Data: Qua 11/12/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração
66			<b>3.1</b>	<b>PLANO DE CAPACITAÇÃO</b>		<b>17%</b>	<b>82 dias</b>
67			3.1.1	DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE		50%	19 dias
68			3.1.2	LEVANTAMENTO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO		30%	15 dias
69			3.1.3	ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		0%	10 dias
70			3.1.4	APRESENTAÇÃO DO PLANO PARA A ESCOLA JUDICIAL		0%	38 dias
71			3.1.5	METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DEFINIDA		0%	0 dias
72			<b>4</b>	<i>SITE SETORIAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NO PORTAL INSTITUCIONAL</i>		<b>23%</b>	<b>82 dias</b>
73			<b>4.1</b>	<i>SITE DA SECOI NO PORTAL INSTITUCIONAL DO TRT-MG</i>		<b>23%</b>	<b>82 dias</b>
74			4.1.1	DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E DAS INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS NO		100%	19 dias
75			4.1.2	CRIAÇÃO DA ESTRUTURA DO SITE DA SECOI NO PORTAL INSTITUCIONAL DO		0%	49 dias
76			4.1.3	DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE DA SECOI		0%	14 dias
77			4.1.4	<a href="#">SITE SETORIAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NO PORTAL</a>		0%	0 dias

Projeto: Cronograma - Projeto  
Data: Qua 11/12/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Gantt Chart						
				In	janeiro	In		In	Mai	In
Seg 07/01/19	Sex 29/11/19				[Task bar]					
Seg 07/01/19	Qua 31/07/19				[Task bar]					
Seg 07/01/19	Qua 31/07/19				[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 11/01/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz		[Task bar]					
Qui 07/02/19	Sex 29/03/19	3	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz		[Task bar]					
Seg 01/04/19	Sex 05/04/19	4	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		[Task bar]					
Qui 11/04/19	Ter 30/04/19	5	SEDOC - Secretaria de Documentação		[Task bar]					
Qui 02/05/19	Sex 28/06/19	6	Presidência - Marcus Moura Ferreira		[Task bar]					
Seg 01/07/19	Qua 31/07/19	7	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		[Task bar]					
Qua 31/07/19	Qua 31/07/19	8			[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 15/02/19				[Task bar]					
Seg 04/02/19	Sex 15/02/19		SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz;SECOI - Olavo de Oliveira Dantas		[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 01/02/19		SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz;SECOI - Olavo de Oliveira Dantas		[Task bar]					
Sex 01/02/19	Sex 01/02/19	12			[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 30/08/19				[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 12/07/19				[Task bar]					
Seg 07/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz		[Task bar]					
Seg 25/02/19	Ter 16/04/19	16	EPT - Escritório de Processos de Trabalho;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz		[Task bar]					
Seg 25/02/19	Ter 16/04/19	16	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz		[Task bar]					
Seg 25/02/19	Ter 16/04/19	16	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz		[Task bar]					
Seg 25/02/19	Sex 28/06/19	16	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz		[Task bar]					
Seg 01/07/19	Sex 12/07/19	20	SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz		[Task bar]					

Projeto: Cronograma - Projeto Data: Qua 11/12/19


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	In	janeiro	In	Mai	In
Sex 12/07/19	Sex 12/07/19	21				12/07		
<b>Seg 06/05/19</b>	<b>Sex 30/08/19</b>							
Seg 06/05/19	Sex 24/05/19	20	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI -		
Seg 27/05/19	Sex 21/06/19	24	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI -		
Seg 27/05/19	Sex 12/07/19	24	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI -		
Seg 27/05/19	Sex 12/07/19	24	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mino			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI -		
<b>Seg 15/07/19</b>	<b>Sex 30/08/19</b>	<b>27</b>	<b>SECOI - Antônio Cláudio dos</b>			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI -		
Sex 30/08/19	Sex 30/08/19	28				30/08		
<b>Ter 29/01/19</b>	<b>Sex 31/05/19</b>							
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	31	SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	31	SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	31	SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Hitalo Fernandes Mino;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Hitalo Fernandes Mino;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Seg 15/04/19	Sex 31/05/19	34	SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Ana Elisa Rodrigues Tavares;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Sex 31/05/19	Sex 31/05/19	35				31/05		
<b>Ter 29/01/19</b>	<b>Sex 19/07/19</b>							
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	38	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	38	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	38	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Seg 15/04/19	Sex 19/07/19	41	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa			SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa		
Sex 19/07/19	Sex 19/07/19	42				19/07		

Projeto: Cronograma - Projeto Data: Qua 11/12/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	In	janeiro	In	In	Mai	In
<b>Ter 29/01/19</b>	<b>Sex 31/05/19</b>								
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	45	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	45	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	45	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 15/04/19	Sex 31/05/19	48	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Sex 31/05/19	Sex 31/05/19	49							
<b>Ter 29/01/19</b>	<b>Sex 31/05/19</b>								
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	52	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	52	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	52	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 15/04/19	Sex 31/05/19	55	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Sex 31/05/19	Sex 31/05/19	56							
<b>Ter 29/01/19</b>	<b>Sex 31/05/19</b>								
Ter 29/01/19	Sex 22/02/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	59	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	59	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 25/02/19	Sex 12/04/19	59	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Seg 15/04/19	Sex 31/05/19	62	SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa						
Sex 31/05/19	Sex 31/05/19	63							
<b>Seg 05/08/19</b>	<b>Sex 29/11/19</b>								

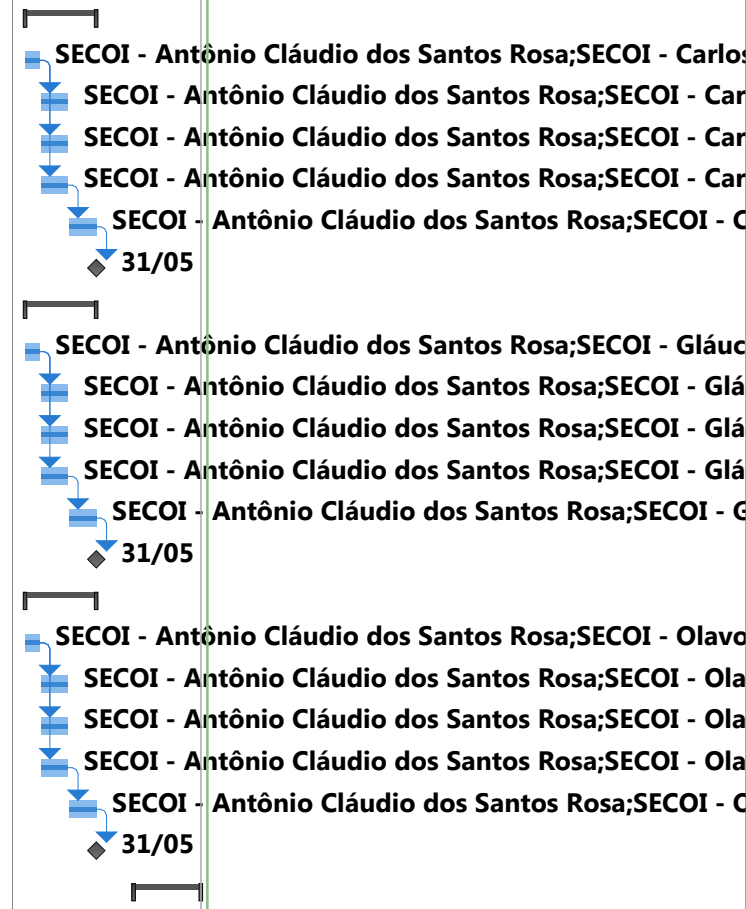

Projeto: Cronograma - Projeto  
Data: Qua 11/12/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	In	janeiro	In	In	Mai	In
<b>Seg 05/08/19</b>	<b>Sex 29/11/19</b>								
Seg 05/08/19	Sex 30/08/19		SECOI - Antônio Cláudio dos						
Seg 02/09/19	Sex 20/09/19	67	SECOI - Antônio Cláudio dos						
Seg 23/09/19	Sex 04/10/19	68	SECOI - Antônio Cláudio dos Sant						
Seg 07/10/19	Sex 29/11/19	69	SECOI - Antônio Cláudio dos Sant						
Sex 29/11/19	Sex 29/11/19	70							
<b>Seg 05/08/19</b>	<b>Sex 29/11/19</b>								
<b>Seg 05/08/19</b>	<b>Sex 29/11/19</b>								
Seg 05/08/19	Sex 30/08/19		SECOI - Antônio Cláudio dos Santos Rosa;SECOI - Hitalo Fernandes Mine						
Seg 02/09/19	Sex 08/11/19	74	SECOM - Secretaria de Comunicação						
Seg 11/11/19	Sex 29/11/19	75	SECOI - Hitalo Fernandes Mine Diniz						
Sex 29/11/19	Sex 29/11/19	76							

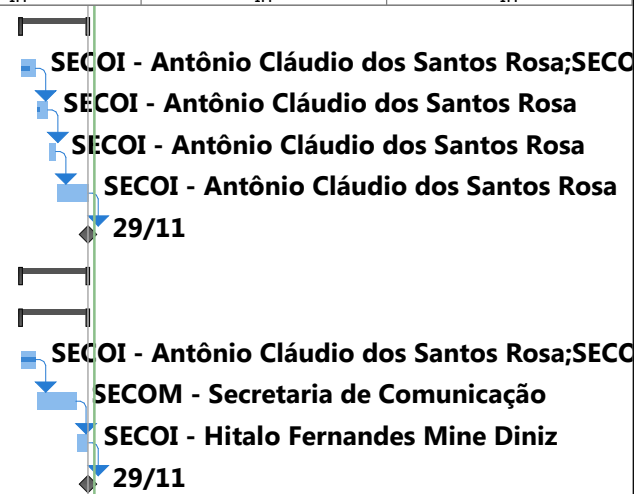

Projeto: Cronograma - Projeto Data: Qua 11/12/19

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			
